Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

CONTRATISTA:		**CONTRATANTE:**				**OBJETO:**	
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA				CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA " DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO.	
FECHA PRESENTE:							
29/11/2025		CONTRATO No.		064 DE 2025			
FECHA ACTA DE INICIO:	1/08/2025	VALOR CONTRATO:		$1.373.787.900,00			
Periodo Acta	26/08/2025	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$ 179.193.813,00	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	20	VR.ACTA ACTUAL (2)	**$531.959.394,00**
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:		**VALOR TOTAL CONTRATO:**	**$ 1.552.981.713,00**	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:		TOTAL PAGADO	$1.170.972.525,00
20/01/2026		ACTA No.	**2**	**TOTAL TIEMPO ADICIONES**	**20**	**SALDO ACTUAL CONTRATO**	**$382.009.188,00**

				CANTIDADES CONTRACTUALES			MODIFICACIÓN		TOTAL A EJECUTAR		Acta 1 $639.013.131,00		Acta 2 $531.959.394,00		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR			
ITEM	**ID**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA**	**VALOR**	**MAYORES Y MENORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**%**	
		CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA																			
		Adecuación baño PMR																			
1	PR-29	Retiro de tubería hidráulica existinte de 1/2	ML	5,02	$ 10.009,00	$ 50.245,00	-5,02	-$ 50.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
2	PR-35	Regatas en muros	ML	1,00	$ 18.365,00	$ 18.365,00	14,00	$ 257.110,00	15,00	$ 275.475,00	0,00	$ -	6,60	$ 121.209,00	6,60	$ 121.209,00	44%	8,40	$ 154.266,00	56%	ok
3	IH-23	Suministro e instalación de tapa registro de 15x15	UND	3,00	$ 37.333,00	$ 111.999,00	-1,00	-$ 37.333,00	2,00	$ 74.666,00	0,00	$ -	2,00	$ 74.666,00	2,00	$ 74.666,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
4	PR-07	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	64,01	$ 40.336,00	$ 2.581.867,00	10,53	$ 424.617,00	74,54	$ 3.006.484,00	74,27	$ 2.995.916,00	0,00	$ -	74,27	$ 2.995.916,00	100%	0,26	$ 10.568,00	0%	ok
5	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	16,94	$ 129.622,00	$ 2.196.341,00	30,36	$ 3.934.780,00	47,30	$ 6.131.121,00	0,00	$ -	36,83	$ 4.774.341,00	36,83	$ 4.774.341,00	78%	10,47	$ 1.356.780,00	22%	ok
6	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	21,56	$ 121.957,00	$ 2.629.661,00	1,08	$ 131.872,00	22,64	$ 2.761.533,00	0,00	$ -	22,64	$ 2.761.533,00	22,64	$ 2.761.533,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
7	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	6,00	$ 35.648,00	$ 213.888,00	10,00	$ 356.480,00	16,00	$ 570.368,00	0,00	$ -	16,00	$ 570.368,00	16,00	$ 570.368,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
8	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	1,00	$ 63.782,00	$ 63.782,00	-1,00	-$ 63.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
9	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye griferia)	UND	1,00	$ 370.168,00	$ 370.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.168,00	1,00	$ 370.168,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
10	AC-52	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	1,00	$ 383.890,00	$ 383.890,00	0,00	$ -	1,00	$ 383.890,00	0,00	$ -	1,00	$ 383.890,00	1,00	$ 383.890,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
11	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	5,10	$ 52.997,00	$ 270.285,00	0,90	$ 47.697,00	6,00	$ 317.982,00	0,00	$ -	5,80	$ 307.383,00	5,80	$ 307.383,00	97%	0,20	$ 10.599,00	3%	ok
12	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	2,00	$ 74.138,00	$ 148.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 148.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 148.276,00	2,00	$ 148.276,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
13	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	18,12	$ 32.388,00	$ 586.871,00	0,00	$ -	18,12	$ 586.871,00	0,00	$ -	18,12	$ 586.871,00	18,12	$ 586.871,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
14	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	5,00	$ 42.126,00	$ 210.630,00	-5,00	-$ 210.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
15	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	2,00	$ 70.623,00	$ 141.246,00	3,00	$ 211.869,00	5,00	$ 353.115,00	0,00	$ -	5,00	$ 353.115,00	5,00	$ 353.115,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
16	AP-04	Suministro e instalación de Griferia de Push para lavamanos	UND	1,00	$ 370.448,00	$ 370.448,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.448,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.448,00	1,00	$ 370.448,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
17	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	1,00	$ 108.686,00	$ 108.686,00	0,00	$ -	1,00	$ 108.686,00	0,00	$ -	3,00	$ 326.058,00	3,00	$ 326.058,00	300%	-2,00	-$ 217.372,00	-200%	ok
18	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	2,00	$ 57.558,00	$ 115.116,00	0,00	$ -	2,00	$ 115.116,00	0,00	$ -	2,00	$ 115.116,00	2,00	$ 115.116,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
19	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	21,56	$ 44.740,00	$ 964.693,00	1,08	$ 48.377,00	22,64	$ 1.013.070,00	22,64	$ 1.013.070,00	0,00	$ -	22,64	$ 1.013.070,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
20	PR-31	Desmontar y retiro las divisiones de baño existentes	UND	6,00	$ 71.858,00	$ 431.148,00	0,00	$ -	6,00	$ 431.148,00	6,00	$ 431.148,00	0,00	$ -	6,00	$ 431.148,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
21	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	16,20	$ 16.436,00	$ 266.263,00	3,80	$ 62.457,00	20,00	$ 328.720,00	20,00	$ 328.720,00	0,00	$ -	20,00	$ 328.720,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
22	AC-19	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	21,56	$ 88.884,00	$ 1.916.535,00	-21,56	-$ 1.916.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
23	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	22,40	$ 98.890,00	$ 2.215.136,00	-1,40	-$ 138.446,00	21,00	$ 2.076.690,00	13,20	$ 1.305.694,00	0,00	$ -	13,20	$ 1.305.694,00	63%	7,80	$ 770.996,00	37%	ok
24	AC-47	suministro y aplicación estuco relleno muros	M2	46,44	$ 21.655,00	$ 1.005.654,00	20,16	$ 436.569,00	66,60	$ 1.442.223,00	37,14	$ 804.371,00	0,00	$ -	37,14	$ 804.371,00	56%	29,46	$ 637.852,00	44%	ok
25	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1,00	$ 991.188,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	1,00	$ 991.188,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
26	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1,00	$ 1.337.014,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	1,00	$ 1.337.014,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
27	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1,00	$ 1.136.407,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	1,00	$ 1.136.407,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
28	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1,00	$ 276.297,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	1,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 276.297,00	100%	ok
29	CA-29	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 1.683.410,00	$ 1.683.410,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.683.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 1.683.410,00	100%	ok
30	CA-34	Suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación, según diseño	UND	2,00	$ 1.487.734,00	$ 2.975.468,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.975.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	2,00	$ 2.975.468,00	100%	ok
31	CA-37	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo	UND	1,00	$ 1.496.924,00	$ 1.496.924,00	1,00	$ 1.496.924,00	2,00	$ 2.993.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	2,00	$ 2.993.848,00	100%	ok
32	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	2,00	$ 126.364,00	$ 252.728,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.728,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.728,00	2,00	$ 252.728,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
		Tratamiento impermeabilización terraza																0,00	$ -		
33	PR-49	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	1411,77	$ 25.500,00	$ 36.000.135,00	-161,77	-$ 4.125.135,00	1.250,00	$ 31.875.000,00	1.250,00	$ 31.875.000,00	0,00	$ -	1250,00	$ 31.875.000,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
34	PR-47	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso)	M2	1411,77	$ 36.451,00	$ 51.460.428,00	-161,77	-$ 5.896.678,00	1.250,00	$ 45.563.750,00	1.250,00	$ 45.563.750,00	0,00	$ -	1250,00	$ 45.563.750,00	100%	0,00	$ -		error
35	DI-15	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	ML	141,18	$ 19.524,00	$ 2.756.340,00	608,82	$ 11.886.660,00	750,00	$ 14.643.000,00	0,00	$ -	404,00	$ 7.887.696,00	404,00	$ 7.887.696,00	54%	346,00	$ 6.755.304,00	46%	ok
36	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)	M2	358,92	$ 44.057,00	$ 15.812.938,00	-8,92	-$ 392.988,00	350,00	$ 15.419.950,00	129,96	$ 5.725.648,00	189,07	$ 8.330.046,00	319,03	$ 14.055.694,00	91%	30,97	$ 1.364.256,00	9%	ok
37	CC-22	Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante.	M2	358,92	$ 66.775,00	$ 23.966.883,00	-358,92	-$ 23.966.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
38	RI-08	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perfines de fijación)	M2	1052,85	$ 272.238,00	$ 286.625.778,00	-8,50	-$ 2.314.023,00	1.044,35	$ 284.311.755,00	0,00	$ -	805,63	$ 219.323.590,00	805,63	$ 219.323.590,00	77%	238,72	$ 64.988.165,00	23%	ok
39	AC-19	Suministro e instalación de enchape antideslizante	M2	358,92	$ 147.015,00	$ 52.766.624,00	0,00	$ -	358,92	$ 52.766.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	358,92	$ 52.766.624,00	100%	ok
		Arreglo y tratamiento de humedad en fachada Lateral													0,00			0,00	$ -		ok
40	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	116,49	$ 9.325,00	$ 1.086.245,00	-116,49	-$ 1.086.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
41	DI-26	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	M2	87,52	$ 161.612,00	$ 14.144.282,00	77,48	$ 12.521.698,00	165,00	$ 26.665.980,00	69,00	$ 11.151.228,00	0,00	$ -	69,00	$ 11.151.228,00	42%	96,00	$ 15.514.752,00	58%	ok
42	DI-27	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	ML	68,97	$ 113.262,00	$ 7.811.680,00	0,08	$ 9.061,00	69,05	$ 7.820.741,00	69,00	$ 7.815.078,00	0,00	$ -	69,00	$ 7.815.078,00	100%	0,05	$ 5.663,00	0%	ok
43	VA-07	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersion con hipoclorito (incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	620,73	$ 13.789,00	$ 8.559.246,00	0,27	$ 3.723,00	621,00	$ 8.562.969,00	621,00	$ 8.562.969,00	0,00	$ -	621,00	$ 8.562.969,00	100%	0,00	$ -	0%	ok

44	AC-02	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1	M2	620,73	$	46.972,00	$	29.156.930,00	0,27	$	12.682,00	621,00	$	29.169.612,00	525,00	$	24.660.300,00	0,00	$	-	525,00	$	24.660.300,00	85%	96,00	$	4.509.312,00	15%	ok
45	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica)	M2	68,97	$	58.167,00	$	4.011.778,00	-33,97	-$	1.975.933,00	35,00	$	2.035.845,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	35,00	$	2.035.845,00	100%	ok
		Tratamiento humedades internas																			0,00				0,00	$	-		
46	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	20,91	$	10.537,00	$	220.329,00	63,54	$	669.521,00	84,45	$	889.850,00	31,05	$	327.174,00	0,00	$	-	31,05	$	327.174,00	37%	53,40	$	562.676,00	63%	ok
47	RI-09	Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	20,91	$	49.635,00	$	1.037.868,00	64,80	$	3.216.348,00	85,71	$	4.254.216,00	31,05	$	1.541.167,00	0,00	$	-	31,05	$	1.541.167,00	36%	54,66	$	2.713.049,00	64%	ok
48	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	83,64	$	36.623,00	$	3.063.148,00	45,85	$	1.679.194,00	129,49	$	4.742.342,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	129,49	$	4.742.342,00	100%	ok
49	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	209,10	$	19.441,00	$	4.065.113,00	143,13	$	2.782.532,00	352,23	$	6.847.645,00	0,00	$	-	223,71	$	4.349.148,00	223,71	$	4.349.148,00	64%	128,52	$	2.498.497,00	36%	ok
		otros																			0,00				0,00	$	-		
50	DI-28	Suministro e instalación de fachaleta similiar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo	UND	30,00	$	106.766,00	$	3.202.980,00	0,00	$	-	30,00	$	3.202.980,00	0,00	$	-	15,00	$	1.601.490,00	15,00	$	1.601.490,00	50%	15,00	$	1.601.490,00	50%	ok
51	CA-02	Desmonte de puerta metálica	M2	6,72	$	49.327,00	$	331.477,00	0,00	$	-	6,72	$	331.477,00	0,00	$	-	6,72	$	331.477,00	6,72	$	331.477,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
52	SH-18	Suministro e instalación de puerta cortafuego metálica de doble hoja, certificación nacional, con dimensiones especiales de 2.40m de ancho por 2.69m de alto, con resistencia al fuego mínima de ciento ochenta (180) minuto (RF-180) , conforme a las normas NFPA 252, NFPA 80 y en cumplimiento del Reglamento técnico colombiano de construcción sismorresistente NSR-10, compuesta por hojas en acero cold rolled o galvanizado calibre 18 y marco en acero cold rolled o galvanizado calibre 16, con espesor aproximado de 45mm, relleno interior en lana	M2	6,72	$	2.381.238,00	$	16.001.919,00	0,00	$	-	6,72	$	16.001.919,00	0,00	$	-	6,46	$	15.373.273,00	6,46	$	15.373.273,00	96%	0,26	$	628.646,00	4%	ok
53	CA-45	Suministro e instalación de reja metalica (puerta) metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, cerradura argolla para candado, acabado de pintura y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	2,08	$	374.838,00	$	779.663,00	0,00	$	-	2,08	$	779.663,00	2,08	$	779.663,00	0,00	$	-	2,08	$	779.663,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
54	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	12,80	$	93.590,00	$	1.197.952,00	5,20	$	486.668,00	18,00	$	1.684.620,00	14,70	$	1.375.773,00	0,00	$	-	14,70	$	1.375.773,00	82%	3,30	$	308.847,00	18%	ok
55	PR-27	Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)	M2	1,00	$	65.476,00	$	65.476,00	5,00	$	327.380,00	6,00	$	392.856,00	4,12	$	269.761,00	1,20	$	78.571,00	5,32	$	348.332,00	89%	0,68	$	44.524,00	11%	ok
56	AC-21	Fundición de concreto estampado con color, espesor 10cm , incluye nivelación de piso y malla (color y diseño a definir en sitio)	M2	8,00	$	154.117,00	$	1.232.936,00	10,00	$	1.541.170,00	18,00	$	2.774.106,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	18,00	$	2.774.106,00	100%	ok
57	CA-46	Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)	ML	22,40	$	44.753,00	$	1.002.467,00	257,90	$	11.541.799,00	280,30	$	12.544.266,00	100,38	$	4.492.400,00	0,00	$	-	100,38	$	4.492.400,00	36%	179,92	$	8.051.866,00	64%	ok
58	CA-20	Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	80,80	$	94.379,00	$	7.625.823,00	166,51	$	15.715.236,00	247,31	$	23.341.059,00	247,31	$	23.341.059,00	0,00	$	-	247,31	$	23.341.059,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
59	CA-47	Suministro e instalación de reja metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye soldadura, acabado con pintura 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	9,50	$	267.750,00	$	2.543.625,00	-9,50	-$	2.543.625,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-		error
60	CA-48	Desmonte y retiro de vidrio existente	M2	1,57	$	50.106,00	$	78.907,00	2,05	$	102.514,00	3,62	$	181.421,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	3,62	$	181.421,00	100%	ok
61	CA-49	Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad 5 mm	M2	2,00	$	297.570,00	$	595.140,00	1,62	$	482.287,00	3,62	$	1.077.427,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	3,62	$	1.077.427,00	100%	ok
62	VA-05	Aseo general.	M2	214,80	$	6.251,00	$	1.342.715,00	1196,97	$	7.482.259,00	1.411,77	$	8.824.974,00	214,80	$	1.342.715,00	1.196,97	$	7.482.259,00	1411,77	$	8.824.974,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
63	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	Ml	6,36	$	16.436,00	$	104.533,00	-0,36	-$	5.917,00	6,00	$	98.616,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	6,00	$	98.616,00	100%	ok
64	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro de sobrantes	M2	7,95	$	40.336,00	$	320.671,00	2,05	$	82.689,00	10,00	$	403.360,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	10,00	$	403.360,00	100%	ok
65	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M3	7,95	$	497.309,00	$	3.953.607,00	-6,45	-$	3.207.643,00	1,50	$	745.964,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	1,50	$	745.964,00	100%	ok
66	PR-48	Relleno con rocamuerta 95% PM	M3	4,77	$	115.808,00	$	552.404,00	-1,27	-$	147.076,00	3,50	$	405.328,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	3,50	$	405.328,00	100%	ok
67	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	7,95	$	109.996,00	$	874.468,00	2,05	$	225.492,00	10,00	$	1.099.960,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	10,00	$	1.099.960,00	100%	ok
68	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	7,95	$	55.965,00	$	444.922,00	2,05	$	114.728,00	10,00	$	559.650,00	0,00	$	-	2,50	$	139.913,00	2,50	$	139.913,00	25%	7,50	$	419.737,00	75%	ok
69	AC-64	Suministro e instalación de piso en tableta de gress estoraque de 7cms x 24cms,	M2	7,95	$	127.374,00	$	1.012.623,00	2,05	$	261.117,00	10,00	$	1.273.740,00	0,00	$	-	2,50	$	318.435,00	2,50	$	318.435,00	25%	7,50	$	955.305,00	75%	ok
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																			0,00				0,00	$	-		
1,03	PR-26	Demolición mesones en concreto	ML	0,00	$	46.591,00	$	-	5,70	$	265.569,00	5,70	$	265.569,00	0,00	$	-	5,70	$	265.569,00	5,70	$	265.569,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
1,05	PR-28	Demolición de cielo raso	M2	0,00	$	21.680,00	$	-	33,88	$	734.475,00	33,88	$	734.475,00	0,00	$	-	22,64	$	490.911,00	22,64	$	490.911,00	67%	11,23	$	243.564,00	33%	ok
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	0,00	$	90.735,00	$	-	21,98	$	1.994.174,00	21,98	$	1.994.174,00	0,00	$	-	22,64	$	2.054.558,00	22,64	$	2.054.558,00	103%	-0,67	-$	60.384,00	-3%	ok
3,05	DI-02	Suministro e instalación muro en perfileria de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	0	$	148.796,00	$	-	4,00	$	595.333,00	4,00	$	595.333,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	4,00	$	595.333,00	100%	ok
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	0,00	$	62.454,00	$	-	13,70	$	855.620,00	13,70	$	855.620,00	0,00	$	-	13,22	$	825.642,00	13,22	$	825.642,00	96%	0,48	$	29.978,00	4%	ok
1,15	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	0,00	$	49.931,00	$	-	13,70	$	684.055,00	13,70	$	684.055,00	0,00	$	-	13,22	$	660.088,00	13,22	$	660.088,00	96%	0,48	$	23.967,00	4%	ok
48;	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	0	$	144.091,00	$	-	5,00	$	720.455,00	5,00	$	720.455,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	5,00	$	720.455,00	100%	ok
49;	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE_	ML	0	$	79.313,00	$	-	15,00	$	1.189.695,00	15,00	$	1.189.695,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	15,00	$	1.189.695,00	100%	ok
50;	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	0	$	17.484,00	$	-	10,00	$	174.840,00	10,00	$	174.840,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	10,00	$	174.840,00	100%	ok
51;	IE-02	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	0	$	36.606,00	$	-	15,00	$	549.090,00	15,00	$	549.090,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	15,00	$	549.090,00	100%	ok
52;	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	0	$	11.446,00	$	-	158,00	$	1.808.468,00	158,00	$	1.808.468,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	158,00	$	1.808.468,00	100%	ok
53;	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6°, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	0	$	81.290,00	$	-	5,00	$	406.450,00	5,00	$	406.450,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	5,00	$	406.450,00	100%	ok
54;	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	0	$	22.051,00	$	-	5,00	$	110.255,00	5,00	$	110.255,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	5,00	$	110.255,00	100%	ok
55;	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	0	$	41.103,00	$	-	5,00	$	205.515,00	5,00	$	205.515,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	5,00	$	205.515,00	100%	ok
56;	IE-05	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	0	$	122.044,00	$	-	5,00	$	610.220,00	5,00	$	610.220,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	5,00	$	610.220,00	100%	ok
57;	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	0	$	3.195.955,00	$	-	1,00	$	3.195.955,00	1,00	$	3.195.955,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	1,00	$	3.195.955,00	100%	ok
58;	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	0	$	554.127,00	$	-	1,00	$	554.127,00	1,00	$	554.127,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	1,00	$	554.127,00	100%	ok
1,43	IE-11	Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	0	$	100.115,00	$	-	3,00	$	300.345,00	3,00	$	300.345,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	3,00	$	300.345,00	100%	ok
7;	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	0	$	107.532,00	$	-	111,18	$	11.955.408,00	111,18	$	11.955.408,00	0,00	$	-	106,90	$	11.495.171,00	106,90	$	11.495.171,00	96%	4,28	$	460.237,00	4%	ok
8;	CC-17	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	0	$	85.685,00	$	-	58,00	$	4.969.730,00	58,00	$	4.969.730,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0%	58,00	$	4.969.730,00	100%	ok
1,50	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	0	$	101.820,00	$	-	9,00	$	916.380,00	9,00	$	916.380,00	0,00	$	-	4,00	$	407.280,00	4,00	$	407.280,00	44%	5,00	$	509.100,00	56%	ok
1,23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	0	$	108.706,00	$	-	4,00	$	434.824,00	4,00	$	434.824,00	0,00	$	-	4,00	$	434.824,00	4,00	$	434.824,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
1,36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	0	$	719.169,00	$	-	1,00	$	719.169,00	1,00	$	719.169,00	0,00	$	-	1,00	$	719.169,00	1,00	$	719.169,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
23;	RI-04	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	0	$	212.682,00	$	-	47,00	$	9.996.054,00	47,00	$	9.996.054,00	0,00	$	-	47,00	$	9.996.054,00	47,00	$	9.996.054,00	100%	0,00	$	-	0%	ok
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$**	**613.330.682,00**		**$**	**74.420.599,00**		**$**	**687.751.281,00**		**$**	**176.272.972,00**		**$**	**306.975.575,00**		**$**	**483.248.547,00**			**$**	**204.502.734,00**	0%	

ADMINISTRACION					27,00%	$	165.599.284,00			$	20.093.562,00		$	185.692.846,00			$	47.593.702,00			$	82.883.405,00			$	130.477.108,00				$	55.215.738,00			
IMPREVISTO					1,00%	$	6.133.307,00			$	744.206,00		$	6.877.513,00			$	1.762.730,00			$	3.069.756,00			$	4.832.485,00				$	2.045.028,00			
UTILIDAD					5,00%	$	30.666.534,00			$	3.721.030,00		$	34.387.564,00			$	8.813.649,00			$	15.348.779,00			$	24.162.427,00				$	10.225.137,00			
IVA SOBRE UTILIDAD					19,00%	$	5.826.641,00			$	706.996,00		$	6.533.637,00			$	1.674.593,00			$	2.916.268,00			$	4.590.861,00				$	1.942.776,00			
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)						**$**	**821.556.448,00**			**$**	**99.686.393,00**		**$**	**921.242.841,00**			**$**	**236.117.646,00**			**$**	**411.193.783,00**			**$**	**647.311.428,00**				**$**	**273.931.413,00**			
CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA																																
ITEM	***ID***	***DESCRIPCIÓN***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO***		***VALOR TOTAL***	***MAYORES Y MENORES***		***VALOR***	***CANT.***	***VALOR***		***CANT.***	***VALOR***		***CANT.***	***VALOR***		***CANT.***	***VALOR***		***CANT.***	***VALOR***	***%***	***CANT.***	***VALOR***	***%***		
Cubierta																																
1	PR-62	Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro	M2	171	$	15.535,00	$ 2.656.485,00	15,78	$	245.142,00	186,78	$ 2.901.627,00		186,78	$ 2.901.627,00		0,00	$ -		186,78	$ 2.901.627,00	100%	0,00	$ -	0%			ok
2	PR-63	Desmonte de teja termoacustica , incluye retiro	M2	184	$	16.885,00	$ 3.106.840,00	-184,00	-$	3.106.840,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -				error
3	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	43	$	68.320,00	$ 2.937.760,00	-29,00	-$	1.981.280,00	14,00	$ 956.480,00		12,00	$ 819.840,00		0,00	$ -		12,00	$ 819.840,00	86%	2,00	$ 136.640,00	14%			ok
4	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	UND	43	$	70.697,00	$ 3.039.971,00	-15,00	-$	1.060.455,00	28,00	$ 1.979.516,00		24,00	$ 1.696.728,00		4,00	$ 282.788,00		28,00	$ 1.979.516,00	100%	0,00	$ -	0%			ok
5	CC-24	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x100 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	158	$	119.598,00	$ 18.896.484,00	-158,00	-$	18.896.484,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -				error
6	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	122	$	114.763,00	$ 14.001.086,00	94,00	$	10.787.722,00	216,00	$ 24.788.808,00		190,54	$ 21.866.942,00		0,00	$ -		190,54	$ 21.866.942,00	88%	25,46	$ 2.921.866,00	12%			ok
7	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	207,81	$	107.532,00	$ 22.346.225,00	236,19	$	25.397.983,00	444,00	$ 47.744.208,00		436,10	$ 46.894.705,00		7,86	$ 845.202,00		443,96	$ 47.739.907,00	100%	0,04	$ 4.301,00	0%			ok
8	CC-17	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	332	$	85.685,00	$ 28.447.420,00	130,85	$	11.212.054,00	462,85	$ 39.659.474,00		452,15	$ 38.742.387,00		5,72	$ 490.118,00		457,87	$ 39.232.505,00	99%	4,98	$ 426.969,00	1%			ok
9	PR-12	Demolición muro existente incluye retiro	M3	1	$	198.421,00	$ 198.421,00	0,00	$	-	1,00	$ 198.421,00		0,40	$ 79.368,00		0,00	$ -		0,40	$ 79.368,00	40%	0,60	$ 119.053,00	60%			ok
10	PR-46	Retiro de manto impermeabilizante foil	M2	10	$	18.996,00	$ 189.960,00	23,00	$	436.908,00	33,00	$ 626.868,00		32,84	$ 623.829,00		0,00	$ -		32,84	$ 623.829,00	100%	0,16	$ 3.039,00	0%			ok
11	DI-24	Fabricación muro en mamposteria e:10cm	M2	6,002	$	152.856,00	$ 917.442,00	7,04	$	1.075.801,00	13,04	$ 1.993.243,00		11,91	$ 1.821.126,00		0,00	$ -		11,91	$ 1.821.126,00	91%	1,13	$ 172.117,00	9%			ok
12	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm	M2	6,002	$	40.772,00	$ 244.714,00	20,08	$	818.620,00	26,08	$ 1.063.334,00		23,83	$ 971.515,00		0,00	$ -		23,83	$ 971.515,00	91%	2,25	$ 91.819,00	9%			ok
13	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	66	$	44.740,00	$ 2.952.840,00	-41,55	-$	1.858.947,00	24,45	$ 1.093.893,00		17,71	$ 792.345,00		0,00	$ -		17,71	$ 792.345,00	72%	6,74	$ 301.548,00	28%			ok
14	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	66	$	44.057,00	$ 2.907.762,00	-33,40	-$	1.471.504,00	32,60	$ 1.436.258,00		17,71	$ 780.249,00		0,00	$ -		17,71	$ 780.249,00	54%	14,89	$ 656.009,00	46%			ok
15	PR-64	Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro.	M2	332	$	39.685,00	$ 13.175.420,00	-236,37	-$	9.380.185,00	95,63	$ 3.795.235,00		95,63	$ 3.795.235,00		0,00	$ -		95,63	$ 3.795.235,00	100%	0,00	$ -	0%			ok
16	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, ancho entre 30 y 45 cm ,incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	11,3	$	94.212,00	$ 1.064.596,00	-11,30	-$	1.064.596,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -				error
17	CC-25	Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación	ML	16	$	85.485,00	$ 1.367.760,00	3,26	$	278.681,00	19,26	$ 1.646.441,00		19,12	$ 1.634.473,00		0,00	$ -		19,12	$ 1.634.473,00	99%	0,14	$ 11.968,00	1%			ok
18	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	UND	4	$	193.400,00	$ 773.600,00	-2,00	-$	386.800,00	2,00	$ 386.800,00		1,00	$ 193.400,00		0,00	$ -		1,00	$ 193.400,00	50%	1,00	$ 193.400,00	50%			ok
19	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	15	$	62.409,00	$ 936.135,00	-8,00	-$	499.272,00	7,00	$ 436.863,00		7,00	$ 436.863,00		0,00	$ -		7,00	$ 436.863,00	100%	0,00	$ -	0%			ok
20	CC-26	Suministro e instalación de gárgolas prefabricadas cuyas medidas son 8 x12x 21 cm , incluye todo lo necesario correcta instalación)	UND	4	$	60.624,00	$ 242.496,00	-4,00	-$	242.496,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -				error
21	CC-27	Sumnistro e instalación de frescasa, incluye malla en alambre galvanizado de 20 cm x 20cm	M2	152	$	52.478,00	$ 7.976.656,00	-152,00	-$	7.976.656,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -				error
22	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	M2	10	$	58.167,00	$ 581.670,00	10,00	$	581.670,00	20,00	$ 1.163.340,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	20,00	$ 1.163.340,00	100%			ok
23	RI-04	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	24	$	212.682,00	$ 5.104.368,00	62,00	$	13.186.284,00	86,00	$ 18.290.652,00		71,67	$ 15.242.919,00		0,00	$ -		71,67	$ 15.242.919,00	83%	14,33	$ 3.047.733,00	17%			ok
Arreglo Fachada (acceso)																																
24	PR-50	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	ML	8	$	11.407,00	$ 91.256,00	0,00	$	-	8,00	$ 91.256,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	8,00	$ 91.256,00	100%			ok
25	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	7	$	9.325,00	$ 65.275,00	0,20	$	1.865,00	7,20	$ 67.140,00		0,00	$ -		7,20	$ 67.140,00		7,20	$ 67.140,00	100%	0,00	$ -	0%			ok
26	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	ML	33	$	7.956,00	$ 262.548,00	39,60	$	315.058,00	72,60	$ 577.606,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	72,60	$ 577.606,00	100%			ok
27	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	6,88	$	80.325,00	$ 552.636,00	0,32	$	25.704,00	7,20	$ 578.340,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	7,20	$ 578.340,00	100%			ok
28	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos	ML	35,1	$	47.878,00	$ 1.680.518,00	93,50	$	4.476.593,00	128,60	$ 6.157.111,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	128,60	$ 6.157.111,00	100%			ok
29	AC-09	Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U	ML	15	$	13.693,00	$ 205.395,00	15,00	$	205.395,00	30,00	$ 410.790,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	30,00	$ 410.790,00	100%			ok
30	CA-42	Suministro e instalación de alfajía metálica, incluye desmonte de ventana, retiro de alfajia en mal estado, e instalación de nueva alfajia	ML	5,4	$	75.137,00	$ 405.740,00	0,60	$	45.082,00	6,00	$ 450.822,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	6,00	$ 450.822,00	100%			ok
31	VA-03	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	12,5	$	27.972,00	$ 349.650,00	60,60	$	1.695.103,00	73,10	$ 2.044.753,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	73,10	$ 2.044.753,00	100%			ok
32	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	17	$	10.537,00	$ 179.129,00	5,07	$	53.444,00	22,07	$ 232.573,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	22,07	$ 232.573,00	100%			ok
33	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	28	$	23.186,00	$ 649.208,00	27,18	$	630.195,00	55,18	$ 1.279.403,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	55,18	$ 1.279.403,00	100%			ok
34	VA-09	Suministro y aplicación de pintura acrílica a tres manos para exterior Tipo 1 - incluye filos y dilataciones	M2	55	$	42.591,00	$ 2.342.505,00	0,18	$	7.666,00	55,18	$ 2.350.171,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	55,18	$ 2.350.171,00	100%			ok
Cuarto de residuos solidos																																
35	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	2	$	68.320,00	$ 136.640,00	0,00	$	-	2,00	$ 136.640,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	2,00	$ 136.640,00	100%			ok
36	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	UND	4	$	66.152,00	$ 264.608,00	2,00	$	132.304,00	6,00	$ 396.912,00		4,00	$ 264.608,00		0,00	$ -		4,00	$ 264.608,00	67%	2,00	$ 132.304,00	33%			ok
37	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	17,45	$	114.763,00	$ 2.002.614,00	4,95	$	568.077,00	22,40	$ 2.570.691,00		18,35	$ 2.105.901,00		0,00	$ -		18,35	$ 2.105.901,00	82%	4,05	$ 464.790,00	18%			ok
38	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	12	$	107.532,00	$ 1.290.384,00	42,00	$	4.516.344,00	54,00	$ 5.806.728,00		21,25	$ 2.285.055,00		0,00	$ -		21,25	$ 2.285.055,00	39%	32,75	$ 3.521.673,00	61%			ok
39	CC-19	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	13	$	80.484,00	$ 1.046.292,00	7,00	$	563.388,00	20,00	$ 1.609.680,00		0,00	$ -		17,00	$ 1.368.228,00		17,00	$ 1.368.228,00	85%	3,00	$ 241.452,00	15%			ok
40	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	4	$	94.212,00	$ 376.848,00	0,35	$	32.974,00	4,35	$ 409.822,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	4,35	$ 409.822,00	100%			ok
41	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	6,32	$	48.446,00	$ 306.179,00	1,68	$	81.389,00	8,00	$ 387.568,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	8,00	$ 387.568,00	100%			ok
42	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	3,2	$	62.409,00	$ 199.709,00	-0,20	-$	12.482,00	3,00	$ 187.227,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	3,00	$ 187.227,00	100%			ok
43	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	13,05	$	44.057,00	$ 574.979,00	4,35	$	191.613,00	17,40	$ 766.592,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	17,40	$ 766.592,00	100%			ok
44	AC-48	Suministro y aplicación de pintura epoxica (2 capas)	M2	23,50	$	42.111,00	$ 989.642,00	33,76	$	1.421.634,00	57,26	$ 2.411.276,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	57,26	$ 2.411.276,00	100%			ok
45	CA-10	Instalación de puerta existente en aluminio 2,40 mt x2,80 mt), incluye todo lo necesario para su correcta instaalción	UND	1	$	163.434,00	$ 163.434,00	0,00	$	-	1,00	$ 163.434,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0%	1,00	$ 163.434,00	100%			ok

46	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	0,72	$ 129.622,00	$ 93.328,00	2,16	$ 279.984,00	2,88	$ 373.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	2,88	$ 373.312,00	100%	ok
47	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	3,726	$ 80.325,00	$ 299.291,00	6,53	$ 524.844,00	10,26	$ 824.135,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	10,26	$ 824.135,00	100%	ok
		Adecuaciones Electricas																				
48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	7	$ 144.091,00	$ 1.008.637,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.008.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	7,00	$ 1.008.637,00	100%	ok
49	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE	ML	15	$ 79.313,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	15,00	$ 1.189.695,00	100%	ok
50	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	10	$ 17.484,00	$ 174.840,00	40,00	$ 699.360,00	50,00	$ 874.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	50,00	$ 874.200,00	100%	ok
51	IE-02	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	21	$ 36.606,00	$ 768.726,00	0,00	$ -	21,00	$ 768.726,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	21,00	$ 768.726,00	100%	ok
52	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	158	$ 11.446,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -	158,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	158,00	$ 1.808.468,00	100%	ok
53	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6°, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	7	$ 81.290,00	$ 569.030,00	1,00	$ 81.290,00	8,00	$ 650.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	8,00	$ 650.320,00	100%	ok
54	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	7	$ 22.051,00	$ 154.357,00	0,00	$ -	7,00	$ 154.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	7,00	$ 154.357,00	100%	ok
55	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	7	$ 41.103,00	$ 287.721,00	0,00	$ -	7,00	$ 287.721,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	7,00	$ 287.721,00	100%	ok
56	IE-05	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	7	$ 122.044,00	$ 854.308,00	0,00	$ -	7,00	$ 854.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	7,00	$ 854.308,00	100%	ok
57	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1	$ 3.195.955,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 3.195.955,00	100%	ok
58	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1	$ 554.127,00	$ 554.127,00	0,00	$ -	1,00	$ 554.127,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 554.127,00	100%	ok
		Tratamiento de humedades internas																				
59	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	4,55	$ 10.537,00	$ 47.943,00	0,25	$ 2.634,00	4,80	$ 50.577,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	4,80	$ 50.577,00	100%	ok
60	RI-09	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	4,55	$ 46.495,00	$ 211.552,00	0,25	$ 11.624,00	4,80	$ 223.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	4,80	$ 223.176,00	100%	ok
61	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	4,55	$ 34.790,00	$ 158.295,00	19,45	$ 676.666,00	24,00	$ 834.961,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	24,00	$ 834.961,00	100%	ok
62	AC-04	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	11,375	$ 21.984,00	$ 250.068,00	42,13	$ 926.076,00	53,50	$ 1.176.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	53,50	$ 1.176.144,00	100%	ok
63	AC-06	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2	M2	29,5	$ 16.149,00	$ 476.396,00	-29,50	-$ 476.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
64	PR-28	Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	M2	2,6	$ 17.596,00	$ 45.750,00	9,40	$ 165.402,00	12,00	$ 211.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	12,00	$ 211.152,00	100%	ok
		Baño PMR																				
65	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios, incluye todos los accesorios existentes y el respectivo retiro	UND	4	$ 35.648,00	$ 142.592,00	-2,00	-$ 71.296,00	2,00	$ 71.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	2,00	$ 71.296,00	100%	ok
66	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	12,6984	$ 40.336,00	$ 512.203,00	-6,32	-$ 254.859,00	6,38	$ 257.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	6,38	$ 257.344,00	100%	ok
67	PR-08	Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	36,64	$ 43.580,00	$ 1.596.771,00	-18,32	-$ 798.386,00	18,32	$ 798.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	18,32	$ 798.385,00	100%	ok
68	PR-61	Desmonte y retiro de espejo existente	UND	2	$ 35.615,00	$ 71.230,00	-1,00	-$ 35.615,00	1,00	$ 35.615,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 35.615,00	100%	ok
69	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	2	$ 1.255.599,00	$ 2.511.198,00	-1,00	-$ 1.255.599,00	1,00	$ 1.255.599,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 1.255.599,00	100%	ok
70	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	2	$ 1.085.697,00	$ 2.171.394,00	-1,00	-$ 1.085.697,00	1,00	$ 1.085.697,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 1.085.697,00	100%	ok
71	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	2	$ 276.297,00	$ 552.594,00	-1,00	-$ 276.297,00	1,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 276.297,00	100%	ok
72	AC-51	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	2	$ 925.591,00	$ 1.851.182,00	-1,00	-$ 925.591,00	1,00	$ 925.591,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 925.591,00	100%	ok
		Otros																				
73	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	3,8	$ 71.439,00	$ 271.468,00	0,20	$ 14.288,00	4,00	$ 285.756,00	0,00	$ -	4,00	$ 285.756,00	4,00	$ 285.756,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
74	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	3,8	$ 1.170.671,00	$ 4.448.550,00	0,70	$ 819.470,00	4,50	$ 5.268.020,00	0,00	$ -	4,50	$ 5.268.020,00	4,50	$ 5.268.020,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
75	VA-05	Aseo general.	M2	412,7	$ 5.868,00	$ 2.421.724,00	0,00	$ -	412,70	$ 2.421.724,00	412,70	$ 2.421.724,00	0,00	$ -	412,70	$ 2.421.724,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
76	SH-03	Suministro e instalación de placa de identificación	UND	1	$ 284.381,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	1,00	$ 284.381,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
77	SH-06	Entrega de certificado según Resolución 4272 de 2021.	UND	1	$ 2.752.740,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.752.740,00	1,00	$ 2.752.740,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
78	SN	Empaque de escombros en fibra	m3	3	$ 96.265,00	$ 288.795,00	3,00	$ 288.795,00	6,00	$ 577.590,00	6,00	$ 577.590,00	0,00	$ -	6,00	$ 577.590,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
79	SN	Cargue material manual	m3	6	$ 13.333,00	$ 79.998,00	0,00	$ -	6,00	$ 79.998,00	6,00	$ 79.998,00	0,00	$ -	6,00	$ 79.998,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
80	SN	Retiro acarreo material volqueta kilom	m3k	6	$ 2.350,00	$ 14.100,00	0,00	$ -	6,00	$ 14.100,00	6,00	$ 14.100,00	0,00	$ -	6,00	$ 14.100,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
81	SN	Disposición final de escombros y sobrantes	M3	6	$ 4.578,00	$ 27.468,00	0,00	$ -	6,00	$ 27.468,00	6,00	$ 27.468,00	0,00	$ -	6,00	$ 27.468,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
82	SN	Movimiento vertical de materiales - escombros	KG	1149	$ 149,00	$ 171.201,00	5857,00	$ 872.693,00	7.006,00	$ 1.043.894,00	4.748,83	$ 707.576,00	2.212,17	$ 329.613,00	6961,00	$ 1.037.189,00	99%	45,00	$ 6.705,00	1%	ok
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																			ok
1,05	PR-28	Demolición de cielo raso	M2	0,00	$ 21.680,00	$ -	181,80	$ 3.941.424,00	181,80	$ 3.941.424,00	0,00	$ -	163,35	$ 3.541.428,00	163,35	$ 3.541.428,00	90%	18,45	$ 399.996,00	10%	ok
48;	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 36.623,00	$ -	55,18	$ 2.020.857,00	55,18	$ 2.020.857,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	55,18	$ 2.020.857,00	100%	ok
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	0,00	$ 90.735,00	$ -	12,00	$ 1.088.820,00	12,00	$ 1.088.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	12,00	$ 1.088.820,00	100%	ok
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 180.519.376,00**		**$ 38.281.187,00**		**$ 218.800.563,00**		**$ 147.777.571,00**		**$ 15.515.414,00**		**$ 163.292.985,00**			**$ 55.507.578,00**		
		ADMINISTRACION			25,00%	$ 45.129.844,00		$ 9.570.297,00		$ 54.700.141,00		$ 36.944.393,00		$ 3.878.854,00		$ 40.823.246,00			$ 13.876.895,00		
		IMPREVISTO			2,00%	$ 3.610.388,00		$ 765.624,00		$ 4.376.011,00		$ 2.955.551,00		$ 310.308,00		$ 3.265.860,00			$ 1.110.151,00		
		UTILIDAD			5,00%	$ 9.025.969,00		$ 1.914.059,00		$ 10.940.028,00		$ 7.388.879,00		$ 775.771,00		$ 8.164.649,00			$ 2.775.379,00		
		IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 1.714.934,00		$ 363.671,00		$ 2.078.605,00		$ 1.403.887,00		$ 147.396,00		$ 1.551.283,00			$ 527.322,00		
		VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)				**$ 240.000.511,00**		**$ 50.894.838,00**		**$ 290.895.348,00**		**$ 196.470.281,00**		**$ 20.627.743,00**		**$ 217.098.023,00**			**$ 73.797.325,00**		

		CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO																				
ITEM	***ID***	***DESCRIPCIÓN***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO***	***VALOR TOTAL***	**MAYORES Y MENORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**%**		
		1. Baterías sanitarias - cocineta																				
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	42,01	$ 69.430,00	$ 2.916.754,00	16,39	$ 1.137.671,00	58,40	$ 4.054.425,00	42,01	$ 2.916.754,00	0,00	$ -	42,01	$ 2.916.754,00	72%	16,39	$ 1.137.671,00	28%	ok	
1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	6	$ 62.016,00	$ 372.096,00	2,00	$ 124.032,00	8,00	$ 496.128,00	6,00	$ 372.096,00	2,00	$ 124.032,00	8,00	$ 496.128,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,03	PR-26	Demolicion meson en concreto	ML	6,02	$ 46.591,00	$ 280.478,00	0,00	$ -	6,02	$ 280.478,00	5,88	$ 273.955,00	0,00	$ -	5,88	$ 273.955,00	98%	0,14	$ 6.523,00	2%	ok	
1,04	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	27,18	$ 26.991,00	$ 733.615,00	-22,00	-$ 593.667,00	5,19	$ 139.948,00	5,19	$ 139.948,00	0,00	$ -	5,19	$ 139.948,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,05	PR-28	Demolición de cieloraso	M2	15,87	$ 21.680,00	$ 344.062,00	-15,87	-$ 344.062,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error	
1,06	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	50,65	$ 27.449,00	$ 1.390.292,00	65,60	$ 1.800.750,00	116,25	$ 3.191.042,00	110,99	$ 3.046.482,00	0,00	$ -	110,99	$ 3.046.482,00	95%	5,27	$ 144.560,00	5%	ok	
1,07	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	40,52	$ 17.993,00	$ 729.076,00	0,00	$ -	40,52	$ 729.076,00	0,00	$ -	20,84	$ 374.974,00	20,84	$ 374.974,00	51%	19,68	$ 354.102,00	49%	ok	
1,08	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	9	$ 37.613,00	$ 338.517,00	9,00	$ 338.517,00	18,00	$ 677.034,00	18,00	$ 677.034,00	0,00	$ -	18,00	$ 677.034,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,09	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	11	$ 10.870,00	$ 119.570,00	1,00	$ 10.870,00	12,00	$ 130.440,00	12,00	$ 130.440,00	0,00	$ -	12,00	$ 130.440,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	13	$ 46.216,00	$ 600.808,00	2,00	$ 92.432,00	15,00	$ 693.240,00	15,00	$ 693.240,00	0,00	$ -	15,00	$ 693.240,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,11	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	42,01	$ 82.477,00	$ 3.464.859,00	16,39	$ 1.351.551,00	58,40	$ 4.816.410,00	32,10	$ 2.647.454,00	0,00	$ -	32,10	$ 2.647.454,00	55%	26,30	$ 2.168.956,00	45%	ok	
1,12	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	42,01	$ 47.974,00	$ 2.015.388,00	13,39	$ 642.228,00	55,40	$ 2.657.616,00	30,40	$ 1.458.280,00	14,30	$ 686.124,00	44,70	$ 2.144.404,00	81%	10,70	$ 513.212,00	19%	ok	
1,13	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	49,05	$ 41.029,00	$ 2.012.472,00	78,71	$ 3.229.286,00	127,76	$ 5.241.758,00	109,34	$ 4.486.196,00	18,42	$ 755.562,00	127,76	$ 5.241.758,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,14	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	10	$ 884.762,00	$ 8.847.620,00	-5,00	-$ 4.423.810,00	5,00	$ 4.423.810,00	5,00	$ 4.423.810,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.423.810,00	100%	0,00	$ -	0%	ok	
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	13,85	$ 148.796,00	$ 2.060.825,00	4,15	$ 617.503,00	18,00	$ 2.678.328,00	13,00	$ 1.934.348,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.934.348,00	72%	5,00	$ 743.980,00	28%	ok	

1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	3	$ 62.454,00	$ 187.362,00	-3,00	-$ 187.362,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	3	$ 49.931,00	$ 149.793,00	-3,00	-$ 149.793,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	29,98	$ 90.735,00	$ 2.720.235,00	-29,98	-$ 2.720.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	66,87	$ 119.952,00	$ 8.021.190,00	69,40	$ 8.325.209,00	136,27	$ 16.346.399,00	71,17	$ 8.536.864,00	60,78	$ 7.290.395,00	131,95	$ 15.827.259,00	97%	4,33	$ 519.140,00	3%	ok
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	21,75	$ 119.540,00	$ 2.599.995,00	18,12	$ 2.165.826,00	39,87	$ 4.765.821,00	17,86	$ 2.134.566,00	0,00	$ -	17,86	$ 2.134.566,00	45%	22,01	$ 2.631.255,00	55%	ok
1,21	AC-19	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	20,26	$ 105.806,00	$ 2.143.630,00	-9,26	-$ 979.764,00	11,00	$ 1.163.866,00	8,20	$ 867.271,00	0,00	$ -	8,20	$ 867.271,00	75%	2,80	$ 296.595,00	25%	ok
1,22	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	15,14	$ 51.104,00	$ 773.715,00	-9,14	-$ 467.091,00	6,00	$ 306.624,00	6,00	$ 306.624,00	0,00	$ -	6,00	$ 306.624,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	8	$ 108.706,00	$ 869.648,00	1,00	$ 108.706,00	9,00	$ 978.354,00	9,00	$ 978.354,00	0,00	$ -	9,00	$ 978.354,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,24	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	5	$ 74.679,00	$ 373.395,00	1,00	$ 74.679,00	6,00	$ 448.074,00	6,00	$ 448.074,00	0,00	$ -	6,00	$ 448.074,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,25	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	5	$ 27.544,00	$ 137.720,00	2,00	$ 55.088,00	7,00	$ 192.808,00	6,00	$ 165.264,00	1,00	$ 27.544,00	7,00	$ 192.808,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,26	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	55,28	$ 74.360,00	$ 4.110.621,00	-13,28	-$ 987.501,00	42,00	$ 3.123.120,00	25,00	$ 1.859.000,00	2,90	$ 215.644,00	27,90	$ 2.074.644,00	66%	14,10	$ 1.048.476,00	34%	ok
1,27	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	6	$ 126.364,00	$ 758.184,00	-4,00	-$ 505.456,00	2,00	$ 252.728,00	2,00	$ 252.728,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.728,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,28	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	42,5	$ 28.734,00	$ 1.221.195,00	-30,50	-$ 876.387,00	12,00	$ 344.808,00	12,00	$ 344.808,00	0,00	$ -	12,00	$ 344.808,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,29	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	14	$ 70.623,00	$ 988.722,00	-7,00	-$ 494.361,00	7,00	$ 494.361,00	7,00	$ 494.361,00	0,00	$ -	7,00	$ 494.361,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,3	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	5	$ 34.915,00	$ 174.575,00	0,00	$ -	5,00	$ 174.575,00	3,00	$ 104.745,00	2,00	$ 69.830,00	5,00	$ 174.575,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,31	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	5	$ 108.686,00	$ 543.430,00	3,00	$ 326.058,00	8,00	$ 869.488,00	6,00	$ 652.116,00	2,00	$ 217.372,00	8,00	$ 869.488,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,32	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	3,85	$ 1.000.961,00	$ 3.853.700,00	0,00	$ -	3,85	$ 3.853.700,00	1,93	$ 1.926.850,00	1,93	$ 1.926.850,00	3,85	$ 3.853.700,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,33	DI-07	suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación	ML	1,75	$ 306.701,00	$ 536.727,00	-0,55	-$ 168.686,00	1,20	$ 368.041,00	0,00	$ -	1,20	$ 368.041,00	1,20	$ 368.041,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,34	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	5	$ 439.566,00	$ 2.197.830,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.197.830,00	2,00	$ 879.132,00	3,00	$ 1.318.698,00	5,00	$ 2.197.830,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,35	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1	$ 1.136.407,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	1,00	$ 1.136.407,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5	$ 719.169,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00	1,00	$ 719.169,00	4,00	$ 2.876.676,00	5,00	$ 3.595.845,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,37	AP-05	Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1	$ 1.337.014,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	1,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,38	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2	$ 477.009,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00	1,00	$ 477.009,00	1,00	$ 477.009,00	2,00	$ 954.018,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,39	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	2,7	$ 408.065,00	$ 1.101.776,00	0,30	$ 122.420,00	3,00	$ 1.224.196,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.224.195,00	3,00	$ 1.224.195,00	100%	0,00	$ 1,00	0%	ok
1,4	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	6	$ 355.943,00	$ 2.135.658,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.135.658,00	3,00	$ 1.067.829,00	3,00	$ 1.067.829,00	6,00	$ 2.135.658,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,41	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	6	$ 57.558,00	$ 345.348,00	0,00	$ -	6,00	$ 345.348,00	2,00	$ 115.116,00	4,00	$ 230.232,00	6,00	$ 345.348,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,42	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1	$ 991.188,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	1,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,43	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1	$ 346.512,00	$ 346.512,00	0,00	$ -	1,00	$ 346.512,00	0,00	$ -	1,00	$ 346.512,00	1,00	$ 346.512,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,44	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento	UND	2	$ 2.408.660,00	$ 4.817.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.817.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.817.320,00	2,00	$ 4.817.320,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,45	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$ 876.659,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00	3,00	$ 2.629.977,00	2,00	$ 1.753.318,00	5,00	$ 4.383.295,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,46	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	12,3	$ 834.615,00	$ 10.265.765,00	-10,30	-$ 8.596.535,00	2,00	$ 1.669.230,00	2,00	$ 1.669.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.669.230,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,47	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2	$ 557.646,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00	1,00	$ 557.646,00	0,00	$ -	1,00	$ 557.646,00	50%	1,00	$ 557.646,00	50%	ok
1,48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	13	$ 125.536,00	$ 1.631.968,00	-8,00	-$ 1.004.288,00	5,00	$ 627.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	5,00	$ 627.680,00	100%	ok
1,49	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	5	$ 100.115,00	$ 500.575,00	0,00	$ -	5,00	$ 500.575,00	0,00	$ -	5,00	$ 500.575,00	5,00	$ 500.575,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,5	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25.000	UND	5	$ 101.820,00	$ 509.100,00	0,00	$ -	5,00	$ 509.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	5,00	$ 509.100,00	100%	ok
1,51	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30	$ 19.146,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	30,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	30,00	$ 574.380,00	100%	ok
1,52	CA-15	suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación, accesorios para su correcto funcionamiento y encimera en acero inoxidable con pozuelo .	MI	1,7	$ 973.256,00	$ 1.654.535,00	0,10	$ 97.326,00	1,80	$ 1.751.861,00	1,80	$ 1.751.861,00	0,00	$ -	1,80	$ 1.751.861,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,53	IE-45	Suministro e instalación toma electrico GFCI	UND	3	$ 117.403,00	$ 352.209,00	0,00	$ -	3,00	$ 352.209,00	1,00	$ 117.403,00	0,00	$ -	1,00	$ 117.403,00	33%	2,00	$ 234.806,00	67%	ok
1,54	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	14,4	$ 87.992,00	$ 1.267.085,00	0,00	$ -	14,40	$ 1.267.085,00	8,00	$ 703.936,00	6,40	$ 563.149,00	14,40	$ 1.267.085,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,55	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento	UND	2	$ 475.809,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	2,00	$ 951.618,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
		2. Losa tanques de agua																			ok
2,01	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	2	$ 103.260,00	$ 206.520,00	0,00	$ -	2,00	$ 206.520,00	0,00	$ -	1,40	$ 144.564,00	1,40	$ 144.564,00	70%	0,60	$ 61.956,00	30%	ok
2,02	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	9,02	$ 47.974,00	$ 432.725,00	0,00	$ -	9,02	$ 432.725,00	7,79	$ 373.717,00	0,00	$ -	7,79	$ 373.717,00	86%	1,23	$ 59.008,00	14%	ok
2,03	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	9,02	$ 119.540,00	$ 1.078.251,00	0,00	$ -	9,02	$ 1.078.251,00	7,79	$ 931.217,00	0,00	$ -	7,79	$ 931.217,00	86%	1,23	$ 147.034,00	14%	ok
2,04	IH-13	Desmonte y reinstalación tanques de almacenamiento de agua 500lts, incluye accesorios	Und	2	$ 169.660,00	$ 339.320,00	1,00	$ 169.660,00	3,00	$ 508.980,00	3,00	$ 508.980,00	0,00	$ -	3,00	$ 508.980,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,05	AC-13	Suministro e instalación de enchape cerámico para pared formato 20 cm x 20 cm	M2	13,19	$ 80.532,00	$ 1.062.217,00	-13,19	-$ 1.062.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
		3. Varios																			
3,01	CA-31	Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunnizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro	UND	1	$ 481.980,00	$ 481.980,00	0,00	$ -	1,00	$ 481.980,00	0,00	$ -	1,00	$ 481.980,00	1,00	$ 481.980,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
3,02	CA-17	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación	UND	8	$ 573.856,00	$ 4.590.848,00	8,00	$ 4.590.848,00	16,00	$ 9.181.696,00	0,00	$ -	8,00	$ 4.590.848,00	8,00	$ 4.590.848,00	50%	8,00	$ 4.590.848,00	50%	ok
3,03	CA-18	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer acorazada, con cobertura adicional contra apertura forzosa, bulón cuadrado de 35mm y cerrojo de tres (3) golpes para puerta en madera	UND	4	$ 265.780,00	$ 1.063.120,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.063.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	4,00	$ 1.063.120,00	100%	ok
3,04	CA-40	Suministro e instalación de cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana reversibles, backset de 70Mm, para puerta de madera.	UND	1	$ 219.712,00	$ 219.712,00	0,00	$ -	1,00	$ 219.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	1,00	$ 219.712,00	100%	ok
3,05	DI-02	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	9	$ 148.796,00	$ 1.339.164,00	-9,00	-$ 1.339.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
3,06	VA-05	Aseo general	M2	42,01	$ 6.251,00	$ 262.605,00	290,95	$ 1.818.728,00	332,96	$ 2.081.333,00	332,96	$ 2.081.333,00	0,00	$ -	332,96	$ 2.081.333,00	100%	0,00	$ -	0%	ok

4. Cubierta																						
4,01		Desmonte teja de barro (incluye el respectivo almacenamiento para conservar su estado y posterior reinstalación)	M2	150	$ 11.604,00	$ 1.740.600,00	8,01	$ 92.963,00	158,01	$ 1.833.563,00	158,01	$ 1.833.563,00	0,00	$ -	158,01	$ 1.833.563,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
4,02		Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)	M2	150	$ 67.690,00	$ 10.153.500,00	8,01	$ 542.285,00	158,01	$ 10.695.785,00	158,01	$ 10.695.785,00	0,00	$ -	158,01	$ 10.695.785,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
4,03		Reinstalación de teja de barro existente, con fijación	M2	60	$ 17.406,00	$ 1.044.360,00	-60,00	-$ 1.044.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
4,04		Suministro e instalación de teja de barro	M2	22,5	$ 43.515,00	$ 979.088,00	-22,50	-$ 979.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
4,05	10	Suministro e instalación caballete Colonial articulado rojo, similar a la teja de barro, incluye accesorios para su correcta instalación.	ML	10	$ 62.855,00	$ 628.550,00	40,00	$ 2.514.200,00	50,00	$ 3.142.750,00	50,00	$ 3.142.750,00	0,00	$ -	50,00	$ 3.142.750,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
4,06	CC-15	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias sección de 20 cm X 15 cm en lámina galvanizada calibre 22 (incluye los elementos de soporte y fijación)	ML	6	$ 87.030,00	$ 522.180,00	-6,00	-$ 522.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
4,07	IH-04	Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	6	$ 58.020,00	$ 348.120,00	-6,00	-$ 348.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
4,08		mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.	M2	50	$ 53.185,00	$ 2.659.250,00	347,72	$ 18.493.674,00	397,72	$ 21.152.924,00	397,72	$ 21.152.924,00	0,00	$ -	397,72	$ 21.152.924,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
4,09	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	6	$ 62.855,00	$ 377.130,00	-6,00	-$ 377.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
5. Seguridad Humana																						
5,01	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	4	$ 1.216.261,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.865.044,00	4,00	$ 4.865.044,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
5,02	SH-03	Suministro e instalación de Placa de Identificación	UND	1	$ 284.381,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	1,00	$ 284.381,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
5,03	SH-06	Entrega de Certificación según RESOLUCIÓN 4272 DE 2021	UND	1	$ 4.054.978,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.054.978,00	1,00	$ 4.054.978,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
5,04	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	4	$ 100.449,00	$ 401.796,00	0,00	$ -	4,00	$ 401.796,00	0,00	$ -	4,00	$ 401.796,00	4,00	$ 401.796,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 137.690.446,00**		**$ 20.671.253,00**		**$ 158.361.699,00**		**$ 96.008.441,00**		**$ 44.143.497,00**		**$ 140.151.938,00**			**$ 18.209.761,00**	0%	
ADMINISTRACION					23,00%	$ 31.668.803,00		$ 4.754.388,00		$ 36.423.191,00		$ 22.081.941,00		$ 10.153.004,00		$ 32.234.946,00			$ 4.188.245,00	0%	
IMPREVISTO					1,00%	$ 1.376.904,00		$ 206.713,00		$ 1.583.617,00		$ 960.084,00		$ 441.435,00		$ 1.401.519,00			$ 182.098,00	0%	
UTILIDAD					5,00%	$ 6.884.522,00		$ 1.033.563,00		$ 7.918.085,00		$ 4.800.422,00		$ 2.207.175,00		$ 7.007.597,00			$ 910.488,00	0%	
IVA					19,00%	$ 1.308.059,00		$ 196.377,00		$ 1.504.436,00		$ 912.080,00		$ 419.363,00		$ 1.331.443,00			$ 172.993,00	0%	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA						**$ 178.928.734,00**		**$ 26.862.294,00**		**$ 205.791.028,00**		**$ 124.762.968,00**		**$ 57.364.474,00**		**$ 182.127.443,00**			**$ 23.663.585,00**	0%	

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO																									
ITEM	ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		MAYORES Y MENORES		VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	
		1. Baterías sanitarias																						
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	20,17	$	69.430,00	$	1.400.403,00	8,28	$	574.533,00	28,45	$ 1.974.936,00	27,52	$ 1.910.366,00	0,93	$ 64.570,00	28,45	$ 1.974.936,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	1	$	62.016,00	$	62.016,00	0,00	$	-	1,00	$ 62.016,00	1,00	$ 62.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 62.016,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,03	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	1,8	$	37.822,00	$	68.080,00	-0,05	-$	1.891,00	1,75	$ 66.189,00	1,75	$ 66.189,00	0,00	$ -	1,75	$ 66.189,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,04	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	20,34	$	27.449,00	$	558.313,00	4,44	$	121.772,00	24,78	$ 680.085,00	24,77	$ 679.912,00	0,00	$ -	24,77	$ 679.912,00	100%	0,01	$ 173,00	0%	ok
1,05	PR-31	Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes	UND	4	$	79.110,00	$	316.440,00	3,00	$	237.330,00	7,00	$ 553.770,00	5,00	$ 395.550,00	2,00	$ 158.220,00	7,00	$ 553.770,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,06	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	4	$	21.377,00	$	85.508,00	0,00	$	-	4,00	$ 85.508,00	4,00	$ 85.508,00	0,00	$ -	4,00	$ 85.508,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,07	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	1,8	$	42.448,00	$	76.406,00	4,20	$	178.282,00	6,00	$ 254.688,00	6,00	$ 254.688,00	0,00	$ -	6,00	$ 254.688,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,08	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	6	$	18.365,00	$	110.190,00	-3,50	-$	64.278,00	2,50	$ 45.912,00	2,50	$ 45.913,00	0,00	$ -	2,50	$ 45.913,00	100%	0,00	-$ 1,00	0%	ok
1,09	PR-34	Regata en piso para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	18	$	17.969,00	$	323.442,00	0,00	$	-	18,00	$ 323.442,00	10,54	$ 189.393,00	0,00	$ -	10,54	$ 189.393,00	59%	7,46	$ 134.049,00	41%	ok
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	7	$	46.216,00	$	323.512,00	0,00	$	-	7,00	$ 323.512,00	6,00	$ 277.296,00	1,00	$ 46.216,00	7,00	$ 323.512,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,11	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	2	$	54.827,00	$	109.654,00	0,00	$	-	2,00	$ 109.654,00	2,00	$ 109.654,00	0,00	$ -	2,00	$ 109.654,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,12	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	11,1	$	82.477,00	$	915.495,00	16,42	$	1.353.860,00	27,52	$ 2.269.355,00	27,52	$ 2.269.355,00	0,00	$ -	27,52	$ 2.269.355,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,13	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	11,1	$	47.974,00	$	532.511,00	16,42	$	787.493,00	27,52	$ 1.320.004,00	27,52	$ 1.320.005,00	0,00	$ -	27,52	$ 1.320.005,00	100%	0,00	-$ 1,00	0%	ok
1,14	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	42,66	$	41.029,00	$	1.750.297,00	1,66	$	68.067,00	44,32	$ 1.818.364,00	37,74	$ 1.548.558,00	6,58	$ 269.806,00	44,32	$ 1.818.364,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	7,3	$	148.796,00	$	1.086.211,00	2,10	$	312.472,00	9,40	$ 1.398.683,00	7,60	$ 1.130.850,00	1,80	$ 267.833,00	9,40	$ 1.398.683,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	3	$	62.454,00	$	187.362,00	6,00	$	374.724,00	9,00	$ 562.086,00	5,00	$ 312.270,00	4,00	$ 249.816,00	9,00	$ 562.086,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	3	$	49.931,00	$	149.793,00	8,00	$	399.448,00	11,00	$ 549.241,00	8,00	$ 399.448,00	3,00	$ 149.793,00	11,00	$ 549.241,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	20,17	$	90.735,00	$	1.830.125,00	11,10	$	1.006.705,00	31,27	$ 2.836.830,00	0,00	$ -	31,27	$ 2.836.830,00	31,27	$ 2.836.830,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	42,66	$	119.952,00	$	5.117.152,00	-0,72	-$	86.965,00	41,94	$ 5.030.187,00	45,07	$ 5.405.877,00	0,00	$ -	45,07	$ 5.405.877,00	107%	-3,13	-$ 375.690,00	-7%	ok
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	20,17	$	119.540,00	$	2.411.122,00	7,35	$	878.021,00	27,52	$ 3.289.143,00	27,52	$ 3.289.143,00	0,00	$ -	27,52	$ 3.289.143,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,21	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	5,22	$	51.104,00	$	266.763,00	0,78	$	39.861,00	6,00	$ 306.624,00	6,00	$ 306.624,00	0,00	$ -	6,00	$ 306.624,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,22	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	3	$	108.706,00	$	326.118,00	1,00	$	108.706,00	4,00	$ 434.824,00	4,00	$ 434.824,00	0,00	$ -	4,00	$ 434.824,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,23	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	1	$	74.679,00	$	74.679,00	0,00	$	-	1,00	$ 74.679,00	1,00	$ 74.679,00	0,00	$ -	1,00	$ 74.679,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,24	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	2	$	27.544,00	$	55.088,00	0,00	$	-	2,00	$ 55.088,00	2,00	$ 55.088,00	0,00	$ -	2,00	$ 55.088,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,25	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	3,31	$	74.360,00	$	246.132,00	11,69	$	869.268,00	15,00	$ 1.115.400,00	15,00	$ 1.115.400,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.115.400,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,26	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	3	$	126.364,00	$	379.092,00	0,00	$	-	3,00	$ 379.092,00	3,00	$ 379.092,00	0,00	$ -	3,00	$ 379.092,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,27	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	10,73	$	28.734,00	$	308.316,00	7,27	$	208.896,00	18,00	$ 517.212,00	18,00	$ 517.212,00	0,00	$ -	18,00	$ 517.212,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,28	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	11	$	70.623,00	$	776.853,00	1,00	$	70.623,00	12,00	$ 847.476,00	12,00	$ 847.476,00	0,00	$ -	12,00	$ 847.476,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,29	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	2	$	34.915,00	$	69.830,00	0,00	$	-	2,00	$ 69.830,00	2,00	$ 69.830,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.830,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,3	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	2	$	108.686,00	$	217.372,00	0,00	$	-	2,00	$ 217.372,00	2,00	$ 217.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 217.372,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,31	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	2	$	1.000.961,00	$	2.001.922,00	0,00	$	-	2,00	$ 2.001.922,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.001.922,00	2,00	$ 2.001.922,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,32	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	3	$	439.566,00	$	1.318.698,00	0,00	$	-	3,00	$ 1.318.698,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.318.698,00	3,00	$ 1.318.698,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,33	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5	$	719.169,00	$	3.595.845,00	0,00	$	-	5,00	$ 3.595.845,00	5,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,34	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	5	$	370.448,00	$	1.852.240,00	0,00	$	-	5,00	$ 1.852.240,00	2,00	$ 740.896,00	3,00	$ 1.111.344,00	5,00	$ 1.852.240,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,35	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	5	$	57.558,00	$	287.790,00	0,00	$	-	5,00	$ 287.790,00	5,00	$ 287.790,00	0,00	$ -	5,00	$ 287.790,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,36	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	4	$	346.512,00	$	1.386.048,00	0,00	$	-	4,00	$ 1.386.048,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.386.048,00	4,00	$ 1.386.048,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,37	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalacion y correcto funcionamiento	UND	2	$	2.408.660,00	$	4.817.320,00	-1,00	-$	2.408.660,00	1,00	$ 2.408.660,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.408.660,00	1,00	$ 2.408.660,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,38	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$	876.659,00	$	4.383.295,00	0,00	$	-	5,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00	5,00	$ 4.383.295,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,39	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	13,92	$	834.615,00	$	11.617.841,00	0,00	$	-	13,92	$ 11.617.841,00	0,00	$ -	13,92	$ 11.617.841,00	13,92	$ 11.617.841,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,4	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2	$	557.646,00	$	1.115.292,00	0,00	$	-	2,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00	2,00	$ 1.115.292,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,41	CA-29	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	5	$	1.492.089,00	$	7.460.445,00	0,00	$	-	5,00	$ 7.460.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	5,00	$ 7.460.445,00	100%	ok
1,42	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	4	$	125.536,00	$	502.144,00	0,00	$	-	4,00	$ 502.144,00	0,00	$ -	1,00	$ 125.536,00	1,00	$ 125.536,00	25%	3,00	$ 376.608,00	75%	ok
1,43	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	2	$	100.115,00	$	200.230,00	0,00	$	-	2,00	$ 200.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.230,00	2,00	$ 200.230,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,44	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	2	$	101.820,00	$	203.640,00	4,00	$	407.280,00	6,00	$ 610.920,00	0,00	$ -	6,00	$ 610.920,00	6,00	$ 610.920,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,45	IE-45	Suministro e instalación toma electrico GFCI	UND	1	$	117.403,00	$	117.403,00	0,00	$	-	1,00	$ 117.403,00	0,00	$ -	1,00	$ 117.403,00	1,00	$ 117.403,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,46	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30	$	19.146,00	$	574.380,00	0,00	$	-	30,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	30,00	$ 574.380,00	100%	ok
1,47	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	5,65	$	90.410,00	$	510.817,00	0,45	$	40.684,00	6,10	$ 551.501,00	6,10	$ 551.501,00	0,00	$ -	6,10	$ 551.501,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,48	PR-04	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2", incluye retiro	UND	8	$	118.253,00	$	946.024,00	-5,00	-$	591.265,00	3,00	$ 354.759,00	2,00	$ 236.506,00	1,00	$ 118.253,00	3,00	$ 354.759,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,49	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	UND	5	$	161.641,00	$	808.205,00	-2,00	-$	323.282,00	3,00	$ 484.923,00	3,00	$ 484.923,00	0,00	$ -	3,00	$ 484.923,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,5	IH-14	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 6", incluye retiro	UND	1	$	216.868,00	$	216.868,00	-1,00	-$	216.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
1,51	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalacion y correcto funcionamiento	UND	2	$	475.809,00	$	951.618,00	0,00	$	-	2,00	$ 951.618,00	2,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
1,52	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2	$	477.009,00	$	954.018,00	0,00	$	-	2,00	$ 954.018,00	2,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
		2. Hundimiento hall de acceso																						
2,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	49,35	$	69.430,00	$	3.426.371,00	11,66	$	809.366,00	61,01	$ 4.235.737,00	61,01	$ 4.235.737,00	0,00	$ -	61,01	$ 4.235.737,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,02	PR-17	Excavación en tierra a mano	M3	67,09	$	104.451,00	$	7.007.618,00	-36,59	-$	3.821.481,00	30,50	$ 3.186.137,00	30,50	$ 3.186.137,00	0,00	$ -	30,50	$ 3.186.137,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,03	PR-48	Relleno rocamuerta compactado 95%PM	M3	67,09	$	93.764,00	$	6.290.627,00	-36,59	-$	3.430.483,00	30,50	$ 2.860.144,00	30,50	$ 2.860.144,00	0,00	$ -	30,50	$ 2.860.144,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,04	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	5,1	$	21.377,00	$	109.023,00	-5,10	-$	109.023,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
2,05	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	40,57	$	82.477,00	$	3.346.092,00	20,44	$	1.685.607,00	61,01	$ 5.031.699,00	61,01	$ 5.031.699,00	0,00	$ -	61,01	$ 5.031.699,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,06	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	40,57	$	47.974,00	$	1.946.305,00	20,44	$	980.459,00	61,01	$ 2.926.764,00	61,01	$ 2.926.764,00	0,00	$ -	61,01	$ 2.926.764,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,07	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	6	$	884.762,00	$	5.308.572,00	-4,00	-$	3.539.048,00	2,00	$ 1.769.524,00	2,00	$ 1.769.524,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.769.524,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,08	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	40,57	$	119.540,00	$	4.849.738,00	20,44	$	2.443.075,00	61,01	$ 7.292.813,00	61,01	$ 7.292.813,00	0,00	$ -	61,01	$ 7.292.813,00	100%	0,00	$ -	0%	ok

2,09	AC-16	Suministro e instalación guaradaescobas en PVC, color a definir por la Entidad	ML	26,19	$ 31.032,00	$ 812.728,00	10,75	$ 333.594,00	36,94	$ 1.146.322,00	0,00	$ -	36,94	$ 1.146.322,00	36,94	$ 1.146.322,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,1	IH-18	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento	ML	7,92	$ 84.123,00	$ 666.254,00	-4,92	-$ 413.885,00	3,00	$ 252.369,00	3,00	$ 252.369,00	0,00	$ -	3,00	$ 252.369,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,11	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	9	$ 41.724,00	$ 375.516,00	6,00	$ 250.344,00	15,00	$ 625.860,00	15,00	$ 625.860,00	0,00	$ -	15,00	$ 625.860,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,12	IH-12	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	5,42	$ 28.734,00	$ 155.738,00	-5,42	-$ 155.738,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
2,13	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	5,42	$ 33.453,00	$ 181.315,00	-5,42	-$ 181.315,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		error
2,14	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	10,36	$ 87.992,00	$ 911.597,00	18,44	$ 1.622.572,00	28,80	$ 2.534.169,00	28,80	$ 2.534.170,00	0,00	$ -	28,80	$ 2.534.170,00	100%	0,00	-$ 1,00	0%	ok
2,15	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	38,01	$ 20.840,00	$ 792.128,00	17,68	$ 368.451,00	55,69	$ 1.160.579,00	0,00	$ -	55,69	$ 1.160.579,00	55,69	$ 1.160.579,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
2,16	VA-05	Aseo general	M2	70,97	$ 6.251,00	$ 443.633,00	25,53	$ 159.582,00	96,50	$ 603.215,00	88,53	$ 553.372,00	7,97	$ 49.843,00	96,50	$ 603.215,00	100%	0,00	$ -	0%	ok
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 102.579.613,00**		**$ 1.346.893,00**		**$ 103.926.506,00**		**$ 62.841.274,00**		**$ 32.915.270,00**		**$ 95.756.544,00**			**$ 8.169.962,00**	0%	
ADMINISTRACIÓN					23,00%	$ 23.593.311,00		$ 309.785,00		$ 23.903.096,00		$ 14.453.493,00		$ 7.570.512,00		$ 22.024.005,00			$ 1.879.091,00	0%	
IMPREVISTO					1,00%	$ 1.025.796,00		$ 13.469,00		$ 1.039.265,00		$ 628.413,00		$ 329.153,00		$ 957.565,00			$ 81.700,00	0%	
UTILIDAD					5,00%	$ 5.128.981,00		$ 67.345,00		$ 5.196.325,00		$ 3.142.064,00		$ 1.645.764,00		$ 4.787.827,00			$ 408.498,00	0%	
IVA					19,00%	$ 974.506,00		$ 12.796,00		$ 987.302,00		$ 596.992,00		$ 312.695,00		$ 909.687,00			$ 77.615,00	0%	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA						**$ 133.302.207,00**		**$ 1.750.288,00**		**$ 135.052.494,00**		**$ 81.662.236,00**		**$ 42.773.394,00**		**$ 124.435.628,00**			**$ 10.616.866,00**	0%	

SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 1.034.120.117,00**		**$ 134.719.932,00**		**$ 1.168.840.049,00**		**$482.900.258,00**		**$399.549.756,00**		**$882.450.014,00**			**$ 286.390.035,00**		ok
ADMINISTRACIÓN	18,50%					$ 265.991.242,00		$ 34.728.032,00		$ 300.719.274,00		$121.073.529,00		$104.485.775,00		$225.559.305,00			$ 75.159.969,00		ok
IMPREVISTO	2,00%					$ 12.146.395,00		$ 1.730.012,00		$ 13.876.407,00		$6.306.778,00		$4.150.652,00		$10.457.429,00			$ 3.418.977,00		error
UTILIDAD	4,50%					$ 51.706.006,00		$ 6.735.997,00		$ 58.442.003,00		$24.145.014,00		$19.977.489,00		$44.122.500,00			$ 14.319.502,00		error
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%					$ 9.824.140,00		$ 1.279.840,00		$ 11.103.980,00		$4.587.552,00		$3.795.722,00		$8.383.274,00			$ 2.720.706,00		ok
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)						**$ 1.373.787.900,00**		**$ 179.193.813,00**		**$ 1.552.981.713,00**		**$639.013.131,00**		**$531.959.394,00**		**$1.170.972.522,00**			**$382.009.189,00**		error
										100%		**41,15%**		**34,25%**		**75,40%**			**25%**		

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Representante Legal - JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

MARIA CLAUDIA GARCIA CARDENAS
Directora de Obra

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Supervisión

JUAN JOSE MONSALVE OSPINA
Apoyo Supervisión

PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ
Apoyo Supervisión

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

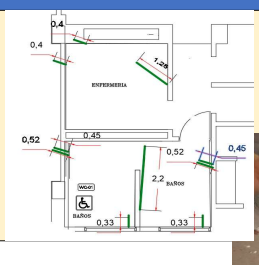
DESCRIPCIÓN: Regatas en muros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
2	6,60	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
regata	lavamanos	2		0,52		1,04
regata	lavamanos tubo de 2"	2		0,45		0,90
regata	sanitarios	2		0,33		0,66
regata	ducha	1		2,2		2,20
regata	enfermeria para electricidad	2		0,4		0,80
regata	enfermeria para electricidad	1				0,00
regata	baño	1		1		1,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tapa registro de 15x15

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
3	2,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
tapa reg.	baño	2				2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
5	36,83	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
enchape	baños	2	2,95		2,06	12,15
enchape	baños	1	3,55		2,06	7,31
enchape	baños	2	1,95		2,06	8,03
enchape	baños	1	4,53		2,06	9,33

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
6	22,64	M2


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
piso ceramico	emfermeria	1	2,9	3,2		9,28
piso ceramico	baños	1	2,95	4,53		13,36

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO




María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye griferia)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
9	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
lavamanos	baño	1				1



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
10	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
espejo	baño	1				1



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	5,8	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
tubo 2"	sotano bajo baño	3		0,6		1,8
tubo 2"	sotano bajo baño	2		2		4



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
12	2	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
sosco 2"	baños	2				2

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
13	18,12	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
tuberia 1/2"	baño discapacitado	1	3,12			3,12
tuberia 1/2"	baño discapacitado	1	2,97			2,97
tuberia 1/2"	baño discapacitado	1	1,84			1,84
tuberia 1/2"	subida sanitario	1	0,30			0,30
tuberia 1/2"	subida lavamanos	1	0,50			0,50
	baño y ducha	1	0,84			0,84
	baño y ducha	1	1,47			1,47
	baño y ducha	1	2,12			2,12
	baño y ducha	1	2,31			2,31
	baño y ducha	1	0,65			0,65
	subida ducha	1	2,00			2,00
	subida sanitario		0,30			0,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
15	5	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
punto de 1/2"	baños lavamanos	2				2
punto de 1/2"	baños sanitario	2				2
punto de 1/2"	baño ducha	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
16	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
griferia	baño discapacitados lavamanos	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
17	3	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
registro	baños	2				2
registro	sotano	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

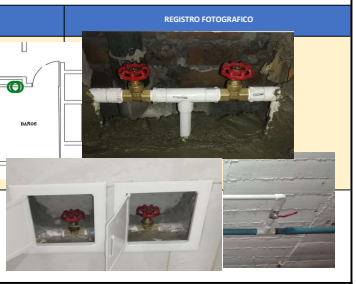

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
18	2	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
acople	sanitarios baños	2				2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
25	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
barra seg.	baño discapasitado	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
26	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
sanitario	baño discapacitado	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
27	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
lavamanos	baño discapacitados	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
32	2	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puntos 4"	Baño	2				2

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
35	404,00	ML

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Resane	Terraza	1		2,20		2,20
Resane	Terraza	1		3,70		3,70
Resane	Terraza	1		0,50		0,50
Resane	Terraza	1		4,50		4,50
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		3,50		3,50
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		1,30		1,30
Resane	Terraza	1		1,40		1,40
Resane	Terraza	1		2,20		2,20
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		1,80		1,80
Resane	Terraza	1		2,50		2,50
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		2,80		2,80
Resane	Terraza	1		3,50		3,50
Resane	Terraza	1		5,50		5,50
Resane	Terraza	1		6,40		6,40
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		1,30		1,30
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		2,60		2,60
Resane	Terraza	1		3,50		3,50
Resane	Terraza	1		3,50		3,50
Resane	Terraza	1		6,10		6,10
Resane	Terraza	1		5,00		5,00
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		6,60		6,60
Resane	Terraza	1		6,40		6,40
Resane	Terraza	1		4,50		4,50
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		2,40		2,40
Resane	Terraza	1		1,60		1,60
Resane	Terraza	1		2,40		2,40
Resane	Terraza	1		2,80		2,80
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		1,60		1,60
Resane	Terraza	1		2,50		2,50
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		0,90		0,90
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		3,10		3,10
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		1,20		1,20
Resane	Terraza	1		3,80		3,80
Resane	Terraza	1		4,00		4,00
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		1,30		1,30
Resane	Terraza	1		2,60		2,60
Resane	Terraza	1		4,50		4,50
Resane	Terraza	1		9,00		9,00
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		2,80		2,80
Resane	Terraza	1		3,30		3,30
Resane	Terraza	1		6,00		6,00
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		5,30		5,30
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		4,00		4,00
Resane	Terraza	1		2,70		2,70
Resane	Terraza	1		8,00		8,00
Resane	Terraza	1		3,40		3,40
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		1,10		1,10
Resane	Terraza	1		1,80		1,80
Resane	Terraza	1		6,00		6,00
Resane	Terraza	1		1,90		1,90
Resane	Terraza	1		1,90		1,90
Resane	Terraza	1		3,70		3,70
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		2,20		2,20
Resane	Terraza	1		3,50		3,50
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		2,60		2,60
Resane	Terraza	1		1,70		1,70
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		3,20		3,20
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		2,70		2,70
Resane	Terraza	1		1,70		1,70
Resane	Terraza	1		4,70		4,70
Resane	Terraza	1		5,00		5,00
Resane	Terraza	1		4,50		4,50
Resane	Terraza	1		2,60		2,60
Resane	Terraza	1		5,20		5,20
Resane	Terraza	1		6,80		6,80
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		3,20		3,20
Resane	Terraza	1		2,10		2,10
Resane	Terraza	1		5,00		5,00
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		6,00		6,00
Resane	Terraza	1		3,90		3,90
Resane	Terraza	1		1,40		1,40
Resane	Terraza	1		4,00		4,00
Resane	Terraza	1		6,40		6,40
Resane	Terraza	1		3,20		3,20
Resane	Terraza	1		2,60		2,60
Resane	Terraza	1		2,90		2,90
Resane	Terraza	1		3,90		3,90
Resane	Terraza	1		1,70		1,70

PLANO DE CANTIDADES









REGISTRO FOTOGRAFICO










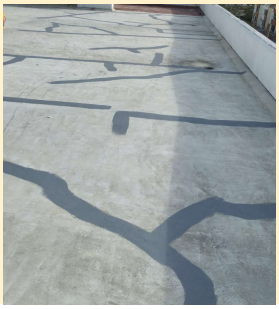

Resane	Terraza	1		5,00		5,00
Resane	Terraza	1		5,30		5,30
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		1,20		1,20
Resane	Terraza	1		1,20		1,20
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		2,50		2,50
Resane	Terraza	1		4,50		4,50
Resane	Terraza	1		4,20		4,20
Resane	Terraza	1		2,10		2,10
Resane	Terraza	1		6,10		6,10
Resane	Terraza	1		2,70		2,70
Resane	Terraza	1		2,50		2,50
Resane	Terraza	1		5,80		5,80
Resane	Terraza	1		3,50		3,50
Resane	Terraza	1		3,00		3,00
Resane	Terraza	1		1,00		1,00
Resane	Terraza	1		7,50		7,50
Resane	Terraza	1		2,00		2,00
Resane	Terraza	1		1,50		1,50
Resane	Terraza	1		1,30		1,30


María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
36	189,07	M2

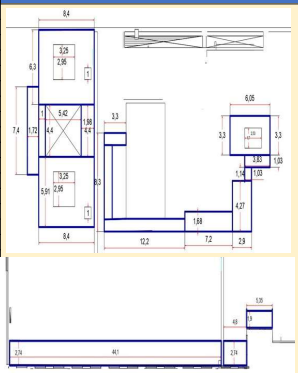PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mortero	Terraza	1	6,05	3,30		19,97
descuento	condensadoras	1	-1,70	2,53		-4,30
Mortero	Terraza	1	1,03	3,83		3,94
Mortero	Terraza	1	1,03	1,14		1,17
Mortero	Terraza	1	4,27	2,90		12,38
Mortero	Terraza	1	1,68	7,20		12,10
Mortero	Terraza	1	1,03	12,20		12,57
Mortero	Terraza	1	1,03	6,24		6,43
Mortero	Terraza	1	1,03	3,30		3,40
Mortero	Terraza	1	5,91	8,40		49,64
descuento	condensadoras	1	-2,95	3,25		-9,59
descuento	condensadoras	1	-1,00	1,00		-1,00
Mortero	Terraza	1	1,98	4,40		8,71
Mortero	Terraza	1	1,00	4,40		4,40
Mortero	Terraza	1	1,72	7,40		12,73
Mortero	Terraza	1	6,30	8,40		52,92
descuento	condensadoras	1	-2,95	3,25		-9,59
descuento	condensadoras	1	-1,00	1,00		-1,00
Mortero	Terraza	1	2,74	44,10		120,83
Mortero	Terraza	1	1,90	5,35		10,17
Mortero	Terraza	1	2,74	4,80		13,15
descuento	corte parcial No. 1	1	-1,00	129,96		-129,96

María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
38	805,63	M2

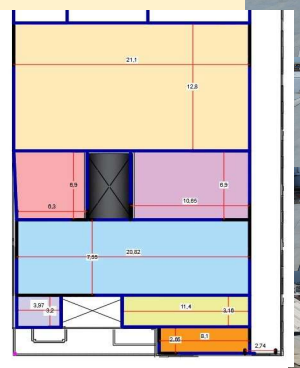PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO





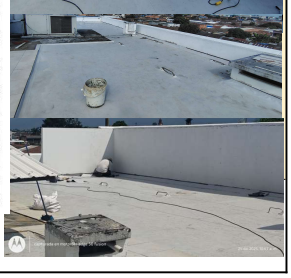

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
membrana	terraza	1	6,05	8,3		50,22
membrana	terraza	1	14,9	2,25		33,53
membrana	terraza	1	10,86	2,83		30,73
membrana	terraza	1	5,45	12,7		69,22
membrana	terraza	1	2,2	3,42		7,52
membrana	terraza	1	21,1	12,8		270,08
membrana	terraza	1	6,3	6,9		43,47
membrana	terraza	1	10,65	6,9		73,49
membrana	terraza	1	20,82	7,55		157,19
membrana	terraza	1	3,97	3,2		12,70
membrana	terraza	1	11,4	3,16		36,02
membrana	terraza	1	8,1	2,65		21,47

María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y dilataciones)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
49	223,71	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura	Enfermeria	2	3,2		2,6	16,64
Pintura	Enfermeria	2	2,9		2,6	15,08
descuento	Puerta Enfermeria	1	-0,9		2	-1,80
Pintura	Enfermeria Techo	1	2,9	3,20		9,28
Pintura	Baños	2	4,53		0,62	5,62
Pintura	Baños	2	1,95		0,62	2,42
Pintura	Baños	2	2,95		0,62	3,66
Pintura	Baños	1	0,2		0,62	0,12
Pintura	Baños Techo	1	2,95	4,53		13,36
Pintura	Auditorio paredes laterales	2	3,90		14,5	112,96
descuento	Ventanas	4	-2,06		1,35	-11,12
descuento	Puerta auditorio	1	-2,06		1,5	-3,09
Pintura	Muro posterior	1	8,00		3,11	24,88
Pintura	Muro frontal	1	7,63		4,68	35,71

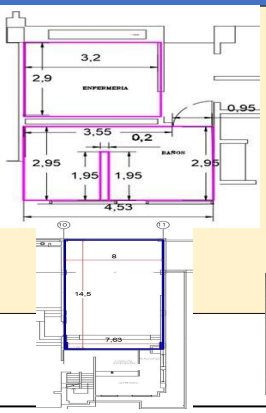



María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de fachaleta similiar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
50	15	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fachaleta	General	15				15








María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Desmonte de puerta metálica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
51	6,72	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Cuarto electrico		2,4		2,8	6,72



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de puerta cortafuego metálica de doble ala, certificación nacional, con dimensiones especiales de 2.40m de ancho por 2.69m de alto, con resistencia al fuego mínima de ciento ochenta (180) minuto (RF-180) , conforme a las normas NFPA 252, NFPA 80 y en cumplimiento del Reglamento técnico colombiano de construcción sismorresistente NSR-10, compuesta por hojas en acero cold rolled o galvanizado calibre 18 y marco en acero cold rolled o galvanizado calibre 16, con espesor aproximado de 45mm, relleno interior en lana mineral o lana de roca resistente a temperaturas superiores a 1000ºC, refuerzos internos en acero hot rolled para cerraduras y cierrapuertas, refuerzos en bisagras de acero calibre 7, canales de cierre superior e inferior en acero calibre 16, bisagras de uso pesado de 4 ½" con balineras, sellos intumiscentes perimetrales contra fuego y humo, acabado final en pintura electrostática en polvo epóxica-poliester, incluye barra antipánico tipo Push, cerradura corta fuego, selector de cierre y cierrapuertas, incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
52	6,46	M2	  	  

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puerta cortafuego	Cuarto electrico		2,4		2,69	6,46


María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
55	1,2	M2	   	  

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DEMOLICION	mocheta jardinera	2	1		0,6	0,6
DEMOLICION	mocheta jardinera 2	2	1		0,6	0,6




María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN | Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
62	1196,97	M2	   	

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO	CUBIERTA	1	21,00	12,74		267,54
DESCUENTO	PUNTO FIJO	1	-4,90	5,60		-27,44
ASEO	CUBIERTA	1	23,85	41,30		985,01
DESCUENTO	VACIO CUBIERTA	2	-6,80	4,30		-58,48
DESCUENTO	VACIO CUBIERTA	1	-3,10	5,70		-17,67
ASEO	CUBIERTA	1	2,40	10,70		25,68
ASEO	CUBIERTA	1	2,85	5,40		15,39
ASEO	BAÑOS	1	2,90	2,39		6,94

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

NO SE ESTA COBRANDO, LO BLANCO ES LO DEL CORTE ANTERIOR


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Alistado piso 5cm mortero 1:3		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
68	2,5	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Alistado	Pasillo acceso		2,50	1,00		2,50





María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de piso en tableta de gress estoraque de 7cms x 24cms, incluye fragua en mortero y sellador de piso, según diseño similar en sitio		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
69	2,5	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Alistado	Pasillo acceso		2,50	1,00		2,50





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Demolición mesones en concreto		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,03	5,7	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
LAVAMANOS	BAÑOS MUJ.	1		4,2		4,2
LAVAMANOS	BAÑOS HOMB.	1		1,5		1,5





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Demolición de cielo raso		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,05	22,64	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Demolicion	BAÑOS		4,53	2,95		13,36
Demolicion	NUEVO ENFERMERIA		3,2	2,9		9,28





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,18	22,64	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Instalación	BAÑOS		4,53	2,95		13,36
Instalación	NUEVO ENFERMERIA		3,2	2,9		9,28

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,16	13,22	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cartera	Antiguo archivo puerta	1		0,9		0,90
Cartera	Antiguo archivo puerta	2		2,06		4,12
Cartera	Antiguo archivo ventanas	2		1,2		2,40
Cartera	Antiguo archivo ventanas	2		1,0		2,00
Cartera	Antiguo archivo ventanas	2		0,9		1,80
Cartera	Antiguo archivo ventanas	2		1,0		2,00

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,15	13,22	M2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
alma	Antiguo archivo puerta	1		0,9		0,90
alma	Antiguo archivo puerta	2		2,06		4,12
alma	Antiguo archivo ventanas	2		1,2		2,40
alma	Antiguo archivo ventanas	2		1,0		2,00
alma	Antiguo archivo ventanas	2		0,9		1,80
alma	Antiguo archivo ventanas	2		1,0		2,00

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
7;	106,90	ML

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RECTANGULAR	PUNTO FIJO TERRAZA	2		8,8		17,60
RECTANGULAR	CORREAS	2		8,05		16,10
RECTANGULAR	CORREAS	2		7,25		14,50
RECTANGULAR	CORREAS	2		6,45		12,90
RECTANGULAR	CORREAS	2		5,6		11,20
RECTANGULAR	CORREAS	2		4,9		9,80
RECTANGULAR	PIE DE AMIGOS	8		3,1		24,80

María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
8;	0	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Teja	Punto fijo					

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,5	4	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lamparas	Enfermeria	2				2
Lamparas	Baños	2				2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de puntos sanitario de 2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,23	4	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Ducha baños	1				1
	lavamanos baños	2				2
	sifón baños	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Clarita García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,36	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Sanitario	Baños	1				1


María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
23;	47	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Terraza	1	4	8,25		33,00
	Terraza	1	2	7,00		14,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	4,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Platinas	Cubierta sobre escalera gato	4				4

María Cladia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación

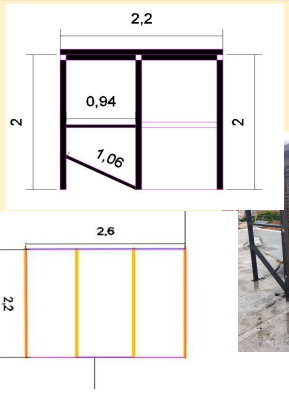ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
7	7,86	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tubo de 80*40	Cubierta sobre escalera gato	1		2,2		2,2
Tubo de 80*41	Cubierta sobre escalera gato	1		2,6		2,6
Tubo de 80*43	Cubierta sobre escalera gato	1		2,0		2,0
Tubo de 80*45	Cubierta sobre escalera gato	1		1,06		1,06




María Cladia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
8	5,72	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Teja UPVC	Cubierta sobre escalera gato	1	2,60	2,20		5,72

María Cladia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
25	7,20	M2

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Fachada acceso		0,8		9	7,2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
39	17,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Teja UPVC	Patio (futuro Uars)		4,25	4		17

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
73	4,00	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
desmonte	Terraza	1		4		4

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
74	4,50	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Escalera gato	Terraza	1		4,5		4,5

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO








María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa de identificación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
76	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Placa	Escalera Gato	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN Entrega de certificado según Resolución 4272 de 2021.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
77	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Certificación		1				1

ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

CERTIFICADO DE CALIDAD



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN Movimiento vertical de materiales - escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
82	2212,17	KG		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tubo Rect 80*40	Estructura cubierta	3,716666667	kg	370		1375,17
Tubo Rect 100*50	Estructura cubierta	4,65	kg	180		837

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	**INMUEBLE**	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Demolición de cielo raso

ITEM	**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**	**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
1,05	**163,35**	**M2**		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
YUMBOLON	BAJO CUBIERTA 3		6,60	16,3		107,58
YUMBOLON	BAJO CUBIERTA 4		6,60	8,45		55,77









María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN Desmonte de puertas en madera

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,02	2,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Baños funcionarios	2				2

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Claudia García
VoBo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN Corte de piso en concreto con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,07	20,84	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
corte piso	Baños	2		0,39		0,78
corte piso	Baños	2		1,13		2,26
corte piso	Baños	2		1,26		2,52
corte piso	Baños	2		1,64		3,28
corte piso	Baños	2		1,15		2,30
corte piso	lavatraperos	2		1,17		2,34
corte piso	lavatraperos	2		0,29		0,58
corte piso	Cocineta	2		2,23		4,46
corte piso	Cocineta	2		1,16		2,32

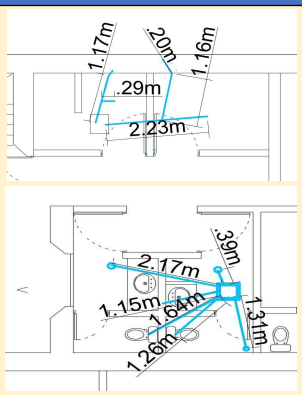PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
VoBo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN Alistado piso 5cm mortero 1:3

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,12	14,30	M2


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
alistado	baño funcionario damas	1	2,3	3,45		7,94
alistado	baño funcionario caballeros	1	2,3	3,45		7,94
descuento		1	-0,98	1,60		-1,57

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





María Claudia García
VoBo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,13	18,42	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mortero	Baños damas	1	1,57		2,08	3,27
Mortero	Baños damas	1	2,00		2,08	4,16
Mortero	Baños damas	1	0,60		2,08	1,25
Mortero	Baños damas	1	1,30		2,08	2,70
Mortero	Baños damas	1	2,38		2,08	4,95
Mortero	Baños damas	1	1,00		2,08	2,08



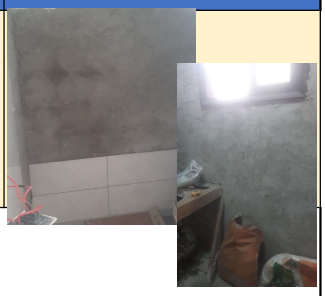

María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,19	60,78	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	1	1,58		2,08	3,29
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	1	2		2,08	4,16
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	2	0,6		2,08	2,50
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	4	1,3		2,08	10,82
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	1	2,38		2,08	4,95
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	1	1,0		2,08	2,08
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	1	0,8		2,08	1,66
Enchape Pared	Baño Funcionario homb	3	0,15		2,08	0,94
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	1	1,58		2,08	3,29
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	1	2,00		2,08	4,16
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	2	0,60		2,08	2,50
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	4	1,30		2,08	10,82
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	1	2,38		2,08	4,95
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	1	1,00		2,08	2,08
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	1	0,80		2,08	1,66
Enchape Pared	Baño Funcionario Damas	3	0,15		2,08	0,94

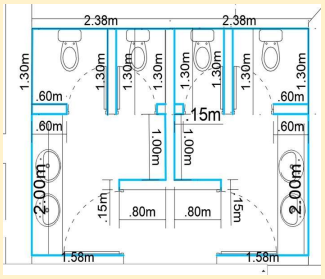



María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de C

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES
1,25	1,00	UND	

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
rejilla	Baños funcionarios damas	1				1





María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,26	2,90	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tubo 4"	Baños	1		1,64		1,64
Tubo 4"	Baños	1		1,26		1,26


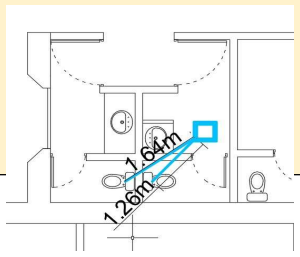




María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,3	2,00	UND		 


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tapa registro	Baño funcionario damas	1				1
Tapa registro	Baño funcionario hombres	1				1

María Claudia García
Vo|Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,31	2,00	UND		



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
registro	Baño funcionario damas	1				1
registro	Baño funcionario hombres	1				1

María Claudia García
Vo|Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,32	1,93	ML		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Meson	Baños funcionarios damas	1		1,93		1,93

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,33	1,20	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Meson	Cocineta	1		1,2		1,2

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,34	3,00	UND		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lavamanos	Baños funcionarios damas	2				2
Lavamanos	Baños publico hombres	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,35	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lavamanos	Baños discapacitados	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,36	4,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Sanitario	Baños funcionarios	4				4

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,38	1,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
GRIFERIA	Baños	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,39		3,00	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
Espejos	Baños	3				3		







María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,4		3,00	UND					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
GRIFERIA	Baños discapacitados	1				1		
GRIFERIA	Baños funcionarios damas	2				2		






María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,41		4,00	UND					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
Valvulas	Baños funcionarios	4				4		






María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,43		1,00	UND					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
Espejo	Baño discapacitados	1				1		





María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco,		


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,44	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puertas	Baños publicos	2				2







María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,45	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puertas	Baños funcionarios damas	2				2





María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,49	5,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Interruptor	Baños	4				4
Interruptor	Cocineta	1				1

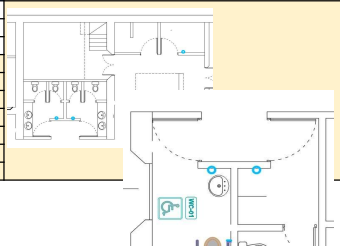



María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,54	6,40	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESCOMBROS	baños funcionarios	6,4				6,4








María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,55	2,00	M3		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Orinal	Baños funcionarios	2				2

María Claudia García

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,01	1,40	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pasamanos	Tanques	1		1,4		1,4

María Claudia García

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunnizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,01	1,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	TOTAL
Dindel	Juzgado	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,02	8,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	PASILLOS PATIO PRINCIPAL	8				8

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
5,01	4,00	ML		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Escalera Gato	Tanques	1		4		4

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Placa de Identificación		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
5,02	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Placa	Escalera Gato	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
5,03	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Certificación		1				1


María Claudia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
5,04	4,00	ML		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Tanques	1		4		4

María Claudia García



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,01	0,93	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
demolición	piso 2 - dobde se demolio muro	1,00	0,33	1,30		0,43
demolición	piso 2 - boca puerta baño	1,00	0,25	1,00		0,25
demolición	piso 2 - boca puerta bodega	1,00	0,25	1,00		0,25



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,05	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
demonte	Baños orinales	2				2,00


María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Desmonte aparatos sanitarios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,1	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
desmonte	poceta baño existente	1				1,00


María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,14	6,58	M2		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
mortero	Donde se demolio mocheta	2	0,3		2,50	1,50
mortero	dintel	1	0,15		1,29	0,19
mortero	Resane gusdaescoba frente baño	1	0,15		1,02	0,15
mortero	Resane gusdaescoba frente baño	1	0,15		3,00	0,45
mortero	Resane gusdaescoba frente baño	1	0,15		1,60	0,24
mortero	Resane gusdaescoba frente lact	1	0,15		0,34	0,05
mortero	Resane gusdaescoba frente lact	1	0,15		3,76	0,56
mortero	Resane gusdaescoba frente lact	1	0,15		3,95	0,59
mortero	Resane gusdaescoba frente lact	1	0,15		1,47	0,22
mortero	Resane gusdaescoba frente lact	1	0,15		0,34	0,05
mortero	Resane gusdaescoba frente lact	1	0,15		2,91	0,44
mortero	Resane gusdaescoba pasillo	1	0,15		3,40	0,51
mortero	Resane gusdaescoba pasillo	1	0,15		7,16	1,07
mortero	Resane gusdaescoba pasillo	1	0,15		2,02	0,30
mortero	Resane gusdaescoba pasillo	1	0,15		0,42	0,06
mortero	Resane gusdaescoba pasillo	1	0,15		1,16	0,17

María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,15	1,80	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
perfileria	bajante tubo lactancia	2	0,26	3,5		1,80

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,16	4,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
cartera	meson	1		2		2
cartera	meson	2		0,6		1,2
cartera	Apoyo a piso	1		0,8		0,8
cartera	Muro ventana					

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,17	3,00	ML		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
alma	Refuerzo muro venta baño nuevo	2		1,5		3

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,18	31,27	M		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
cielo	Bateria sanitaria a restaurar - piso 2	1		2,45	3,70	9,07
cielo	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		3,00	3,70	11,10
cielo	Lactancia	1		3,00	3,70	11,10

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,31	2,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
meson	Baño nuevo	1		2		2,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,32	3,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
lavamanos	Baño nuevo	3				3,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,34	3,00	UND		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Griferia	Baño nuevo	3				3,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,36	4,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
espejo	Baño nuevo	3				3,00
espejo	Baño antiguo	1				1,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalacion y correcto funcionamiento

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,37	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
puerta	Entrada baño nuevo	1				1,00


María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,38	5,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
puertas	Baño nuevo	3				3,00
puertas	Baño antiguo	2				2,00


María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,39	13,92	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
division	Panel interior	1	1,42		2,00	2,84
division	Panel frontal baño antiguo	1	2,45		2,00	4,90
descuento	puertas	2	-0,55		2,00	-2,20
division	Panel interior	2	1,42		2,00	5,68
division	Panel frontal baño nuevo	1	3,00		2,00	6,00
descuento	puertas	3	-0,55		2,00	-3,30


María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,4	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
division	Baño aniguo	2				2,00


María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,42	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Salida	Baño nuevo	1				1,00



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,43	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Interruptor	Baños 2do piso	2				2,00



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

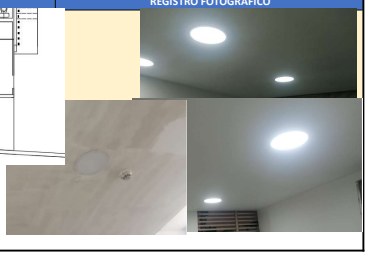DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,44	6,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lampara	Baños 2do piso	5				5,00
Lampara	Lactancia	1				1,00


María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación toma electrico GFCI

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,45	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Toma	Baño nuevo	1				1,00



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2", incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,48	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
perforacion	Cambio tuberia orinales	1				1,00

María Yadira García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación guaradaescobas en PVC, color a definir por la Entidad		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,09	36,94	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Guardaescoba	Hall acceso principal			7,00		7,00
Guardaescoba	Hall acceso principal			5,80		5,80
Guardaescoba	Hall acceso principal			2,20		2,20
Guardaescoba	Hall acceso principal			3,40		3,40
Guardaescoba	Hall acceso principal			1,00		1,00
Guardaescoba	Lactancia			2,00		2,00
Guardaescoba	Lactancia			3,70		3,70
Guardaescoba	Lactancia			3,00		3,70
Guardaescoba	Lactancia			3,70		3,70
Guardaescoba	Hall acceso principal			0,40		0,40
Guardaescoba	Hall acceso principal			2,00		2,00
Guardaescoba	Baños 2do piso			2,74		2,74




María Yadira García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,15	55,69	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura	Techos baño antiguo	1	2,75	3,70		10,18
Pintura	Techos baño nuevo	1	3,00	3,70		11,10
Pintura	Techo Lactancia	1	3,00	3,70		11,10
Pintura	Baño antiguo	2	1,65	0,60		1,98
Pintura	Baño antiguo	2	3,7	0,60		4,44
Pintura	Baño nuevo	2	3,7	0,60		4,44
Pintura	Baño nuevo	1	3,00	0,60		1,80
Pintura	Lactancia	1	3,7	2,88		10,65






María Yadira García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
DESCRIPCIÓN	Aseo general		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,16	7,97	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños 2do piso	1	6,98	1,14		7,97





María Yadira García
Vo Bo Director Obra
