ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. --	INFORME DE VISITA (consecutivo)	No. 01

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 1430

CONSECUTIVO N°. 5677

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	18 de noviembre de 2025	MUNICIPIO:	TOCAIMA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	DE LA VEREDA COPO QUE CONDUCE A LA VEREDA VASQUEZ SECTOR BATEA BAJA	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	4°33'24.22"N 74°37'17.80"W

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-534-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	2/09/2025
		FECHA INCIO	8/10/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	MUNICIPIO DE TOCAIMA		
NIT	800.093.439-1		
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA COPO QUE CONDUCE A LA VEREDA VASQUEZ SECTOR BATEA BAJA DEL MUNICIPIO TOCAIMA CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	10 MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)	11/04/2026		
FORMA DE PAGO	El 100% se girará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 100.000.000
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO			

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)				
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se reliza la visita de localización del tramo que se proyecta intervenir la placa huella del convenio ICCU-534-2025 SECTOR BATEA BAJA; EREDA COPO QUE CONDUCE A LA VEREDA VASQUEZ . Por parte de la visita acompaño la visita la ingeniera Alejandra Rodriguez quien brinda apoyo a la Secretaria de Infraestructura del Municipio.

Se realizó la verificación de las coordenadas del proyecto presentado por la administración y viabilizado por el ICCU.

Se toma registro fotografico en sitio dejando en en evidencia el estado actual del tramo.


7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS


Valor Total de convenio	$ 100.000.000,00			
N° de Pagos Realizados	1			
Pago No. 1				
Pago No. 2	*N/A*			
Pago No. 3	*N/A*			
Valor Ejecutado	-			
Saldo Pendiente por Cancelar	$ -			
Porcentaje de ejecución	0%			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	X

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NO PRESENTA	Chalecos	NO PRESENTA
	Cascos	NO PRESENTA	Otros	NO PRESENTA
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	X

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

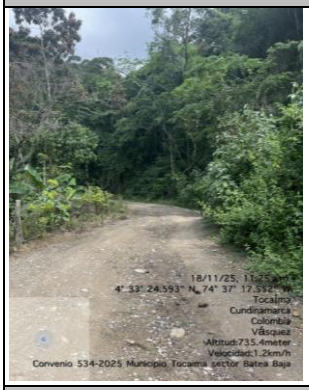

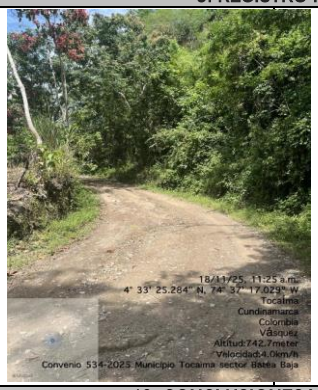



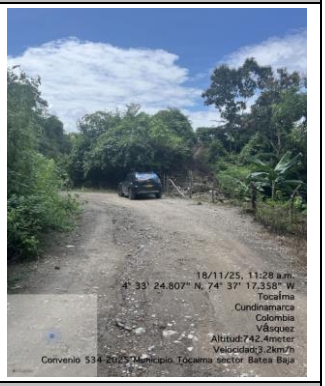

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa una vía con de alta pendiente en material granular.

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	26/11/2025	
