C.M.15378 – 522

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025.

Radicado R:2025010698679
Fecha:2025/12/22 11:57:35 AM
Tpo:OFICIO
Responsable:BEATRIZ ELENA OSPINA MON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Radicado #. 543

Señora:
DIANA MARCELA BEDOYA GARZÓN
Directora de Gestión Social Ambiental y Prec
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

REFERENCIA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **LOTE 3**

CON 15378: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

ASUNTO: INFORME MENSUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

Cordial saludo,

Adjunto encontrará el Informe Social No.15 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025 para su revisión y consideración. Quedamos a la espera de cualquier observación o comentario.

Agradecemos de antemano su tiempo y atención.

Anexos:
Copia en CD del Informe mensual social número 15.

Cordialmente,

Diana M. Ortega R.
DIANA MARCELA ORTEGA RENGIFO
Directora de Interventoría
CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378

Elaboró: Paola Giraldo Mayo – Profesional Social

Recib. original
Duelly Pangoy V.
22-12-2025
ofic. 908.

ARCHIVO SIF
2025 DIC 29 14:38:18

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801

Informe mensual
Gestión social #.15

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

Contrato de Interventoría No: 23SS111B1465 de 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PERIODO:
1 al 30 DE NOVIEMBRE 2025

Elaborado por:
Paola Andrea Giraldo Mayo
Profesional del área social
Consorcio Mejoramiento 15378

Municipio Cocorná y San Carlos – Antioquia
NOVIEMBRE 2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
No: 4600016585 de 2023

CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No: 23SS111B1465 de 2023

Firma:	Firma:	Firma:
Paola GM	Diana M. Ortega R.	Lucelly Penagos Valencia
PAOLA ANDREA GIRALDO MAYO Profesional Social Interventoría	DIANA MARCELA ORTEGA RENGIFO Directora de Interventoría	LUCELLY PENAGOS Apoyo Supervisión Social SIF
Elaboró	Aprobó	Recibe en la SIF

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
4. ALCANCE 8
5. LOCALIZACIÓN 9

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 13

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 14

6.1. Tramo San Carlos 14

6.1.1 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto .. 15

6.1.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 18

6.1.3 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 18

6.2 Tramo Cocorná 19

6.2.1 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto .. 19

6.2.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 26

Programa para la Contratación de Mano de Obra. 27

6.2.4 Programa de Comunicación y Divulgación. 29

6.2.5 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 34

6.2.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural 37

6.2.7 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria 37

6.2.8 Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 40

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 42

7.1 CONTROL DE INVERSIÓN PRESUPUESTO SOCIAL 43

7.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 43

8. Listado de Anexos 44

9. Listado de tablas 44

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene el balance de la gestión social realizada en el mes de noviembre del año 2025, de los dos tramos que integran el proyecto Mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia. Lote 3: Oriente. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Este documento pretende dar cuenta de las actividades del componente social a la luz del desarrollo de la Gestión social establecida por la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura y que se encuentra establecida en el anexo técnico como obligación del contratista de la siguiente manera: "El contratista de obra deberá formular un Plan de manejo de gestión social, este plan busca informar, atender y generar espacios de participación de la comunidad que se encuentra aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de resolver inquietudes, solicitudes generadas a partir de la ejecución de las obras que comprenden el proyecto, de acuerdo, a lo contenido en la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, actividades que ya se cuentan contempladas en el presupuesto" (Gobernación de Antioquia, anexo técnico 2023).

En el presente informe se brinda información general del proyecto como contexto, el balance de ejecución de cada uno de los programas integrados en el Plan de Gestión Social, con descripciones de los avances y seguimiento a indicadores de gestión y finalmente las actividades de la Interventoría en el marco del seguimiento y acompañamiento correspondiente en los dos tramos incluidos; San Carlos y Cocorná.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante la Resolución No. 2023060334616 del 06 octubre de 2023 la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia adjudicó el Contrato 4600016585 de 2023, de la Licitación Pública N° LIC-15372, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", Lote 3: Oriente al Consorcio Cocorná 15372, conformado por las empresas Ingetierras de Colombia S.A e IDC Pavimentos S.A.S, mediante el cual se otorgan los tramos:

- SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.
- COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente.

El valor del contrato es: cinco mil doscientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($5.253.733.694,00) y cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses.

La interventoría del proyecto es llevada a cabo por el Consorcio Mejoramiento 15378, con número de contrato 23SS111B1465 de 2023 celebrado con la Gobernación de Antioquia.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a la Resolución 1917 de la Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia, del junio 15 de 2018, existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y acciones inmediatas que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías en las diferentes subregiones en el Departamento.

Con el estado actual de deterioro de las vías, la movilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan las vías.

Por lo anterior, con ánimo de mejorar la capa de rodadura y brindar mayor seguridad a las personas que transitan por el corredor vial denominado Cocorná - San Carlos y buscando mejorar un tramo que no presenta problemática geológica y que no requiere de una intervención especial en la vía, se propone un proyecto que beneficia a una población aproximada de 30.000 habitantes entre los municipios de Cocorná y San Carlos, permitiendo así una reducción de tiempos y costos en los desplazamientos, mejorando la economía de la Subregión.

4. ALCANCE

Cocorná

El tramo de mejoramiento Cocorná - El Ramal (60AN17- 1), obedece a una vía de segundo orden, el cual inicia en inicio en el K1+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41"W), y finaliza en el K03+205 (Latitud:06°04 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente, así como sus aproximaciones y obras complementarias necesarias para el efectivo funcionamiento del tramo a intervenir. Dicho tramo tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros.

San Carlos

El tramo de mejoramiento San Carlos: Cruces – Narices (60AN20-1-1), obedece a una vía de tercer orden, el cual inicia en K18+840 (Latitud: 06° 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82" W), y finaliza en el K19+835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

Dentro del presente informe de Gestión Social se contemplan actividades que permitirán prevenir, dar respuesta oportuna y/o atender los posibles impactos que se pudieran generar con la ejecución del proyecto y, promoverán la participación de los diversos grupos de interés del área de influencia, en sus diferentes momentos.

5. LOCALIZACIÓN

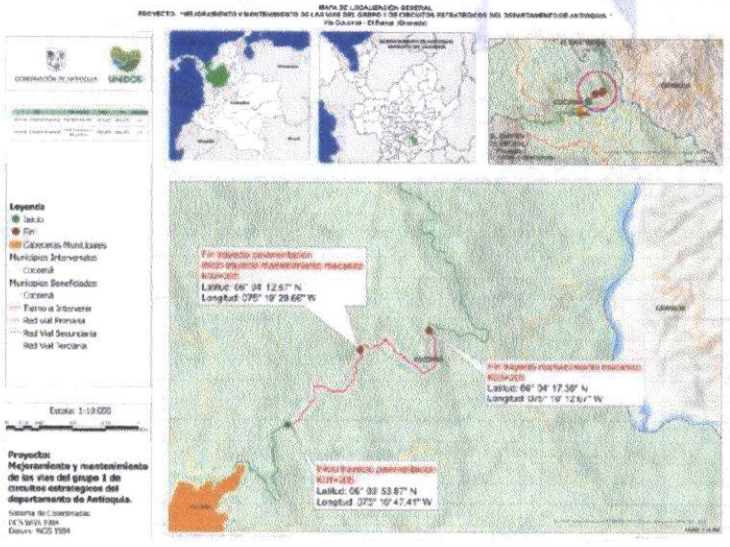


Figura 1.9. Localización de la vía – Cocorná - El Ramal (Granada), (60AN17-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10' 12.67" W) aproximadamente.

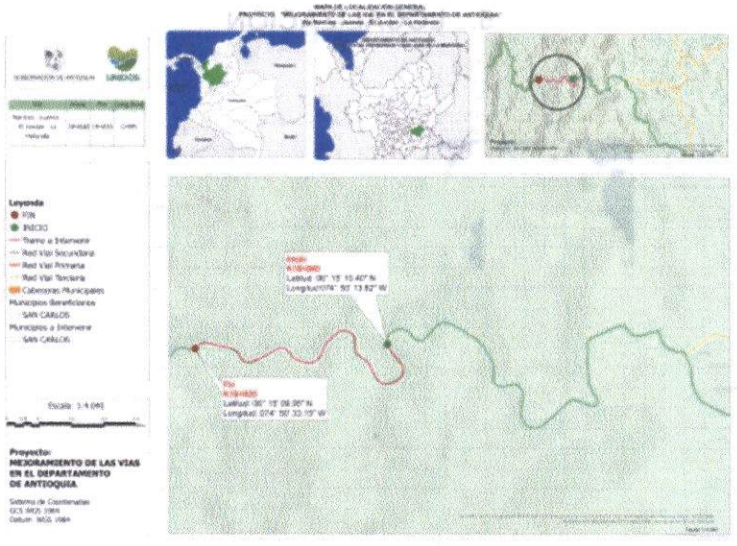


Figura 1.8. Localización de la vía – Cruces – Narices (60AN20-1-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información del Contrato de obra

ENTIDAD CONCEDENTE	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.**
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE**
CONTRATISTA	**CONSORCIO COCORNA 15372, NIT 901.762.294-6**
CONTRATO Nº	**4600016585 DE 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($5.253.733.694,00) y un A.I.U. de TREINTA DOS PUNTO CERO SEIS POR CIENTO (A.I.U: 32,06 %).**
ADICIÓN 1	**SEISCIENTOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($602.176.279)**
PLAZO INICIAL	**DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**
PRORROGA 1	**TREINTA (30) DÍAS, del 25/12/2023 al 24/01/2024**
PRORROGA 2	**Dos (2) meses del 24/01/2024 al 24/03/2024**
PRORROGA 3	**TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO DEL 22/05/2024. AL 23/06/2024**
SUSPENSIÓN No 1	**VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2024, HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUIDAS**
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	**DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 8 ABRIL HASTA EL 23 DE ABRIL, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 1	**OCHO DÍAS (08) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 24 DE ABRIL, HASTA EL 1 DE MAYO DE 2024, AMBAS**

	FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO. 1	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 2 DE MAYO, HASTA EL 16 DE MAYO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
SUSPENSIÓN No 2	**DOS (02) MESES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 2	**UN (01) MES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO, HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 2	**TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE, HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO. 2	**TREINTA Y TRES (33) DÍAS A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE, HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
AMPLIACIÓN NO. 4 SUSPENSIÓN NO. 2	**TREINTA Y SIETE (37) DIAS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**
AMPLIACIÓN NO. 5 SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**
AMPLIACIÓN NO. 6 SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 1 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**
AMPLIACIÓN NO. 7 SUSPENSIÓN NO. 2	**DEL 1 DE MARZO DE 2025, HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2025. AMBAS FECHAS INCLUSIVE**
REANUDACIÓN 2	**2 DE ABRIL DE 2025**
PRORROGA 5	**DEL 5 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 2 Información contrato de interventoría.

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3.**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378 NIT 901.763.954-3**
CONTRATO Nº	**23SS111B1465 de 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$445.039.517 IVA INCLUIDO.**
FECHA DE INICIO	**03/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**25/12/2023**
PLAZO	**Dos (2.0) meses sin sobrepasar el 25/12/2023**
PLAZO PRORROGA 1	**Treinta (30) días del 26/12/2023 al 24/01/2024**
PLAZO PRORROGA 2	**Dos (2) meses del 25/01/2024 al 24/03/2024**
PLAZO PRORROGA 3	**Cuarenta y siete (47) días calendario del 22/05/2024 al 08/072024**
SUSPENSIÓN 1	**Del 19/03/2024 al 8/04/2024**
ADICIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	**Del 8/04/2024 al 24/04/2024**
ADICIÓN 2 SUSPENSIÓN 1	**Del 24/04/2024 al 2/05/2024**
ADICIÓN 3 SUSPENSIÓN 1	**Del 2/05/2024 al 17/05/2024**
SUSPENSIÓN 2	**Del 21/06/2024 al 22/08/2024**
ADICIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	**Del 22/08/2024 al 23/09/2024**
ADICIÓN 2	**Del 23/09/2024 al 23/10/2024**

SUSPENSIÓN 2	
ADICIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	**Del 23/10/2024 al 25/11/2024**
ADICIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	**Del 25/11/2024 al 01/01/2025**
ADICIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	**Del 01/01/2025 al 01/02/2025**
ADICIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	**Del 01/02/2025 al 01/03/2025**
ADICIÓN 7 SUSPENSIÓN 2	**Del 01/03/2025 al 02/04/2025**
PRORROGA 5	**Del 02/11/2025 al 31/12/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31/12/2025**

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En este apartado se desglosan las actividades realizadas por el contratista, esta información se organizó a partir del informe presentado por el mismo y se incluyen las actividades realizadas, indicadores de gestión y el balance desde la Interventoría. Es de aclarar que el informe comprende las fechas entre el 1 al 30 de noviembre de 2025, periodo en el cual el plan de gestión social fue ajustado teniendo en cuenta la prórroga n°5 del contrato que tiene como plazo 31 de diciembre de 2025.

6.1. Tramo San Carlos

En este frente de obra en particular se culminaron las labores de obra en el mes de junio del 2024, sin embargo, teniendo en cuenta que hace parte integral del proyecto y que hace falta que el contratista culmine unas actividades de instalación de señalización en la vía, este tramo aún no se ha cerrado.

Por esta razón, se continúa a la espera de que el contratista lleve a cabo las actividades de obra pendientes para así dar paso a la realización de la reunión de finalización. Es importante mencionar que se encuentran cerradas las actas de vecindad; está pendiente el cierre del

permiso de ocupación en predio privado y el cierre del acta de entorno posterior a las intervenciones, así mismo, el contratista avanza en la consolidación de la información para la liquidación del frente de obra.

6.1.1 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto

Para este tramo el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para la correcta aplicación del plan de gestión social, tal como se relaciona a continuación.

- Actas de vecindad

A la fecha se cuenta con el levantamiento de las actas de vecindad de cierre, se realizó la visita a las 10 viviendas y se obtuvo el cierre de la totalidad de las actas de vecindad.

Tabla 3. Relación actas de vecindad de cierre Tramo San Carlos

Relación actas de vecindad Tramo San Carlos		
N° Acta	**Nombre propietario**	**Cierre**
Acta N°1	Gloria Irene Herrera Daza	Junio 2024
Acta N°2	Leonardo de Jesús Rojas Jiménez	Mayo 2024
Acta N°3	Luz Arely Arboleda Zuleta	Junio 2024
Acta N°4	Juan de Jesús Díaz Buitrago	Junio 2024
Acta N°5	Juan de Jesús Jaramillo	Junio 2024
Acta N°6	Sonia Carolina Giraldo Giraldo	Junio 2024
Acta N°7	Rosiris del Carmen Mercado Doria	Junio 2024
Acta N°8	Jesús María Castaño M	Junio 2024
Acta N°9	Javier Arturo Higuita	Junio 2024
Acta N°10	Omar Antonio Urrea Morales	Junio 2024

Desde la Interventoría se realizó el debido acompañamiento al proceso de levantamiento de actas de vecindad para verificar el correcto desarrollo de la actividad.

- Actas de Entorno

A la fecha del presente informe continúa pendiente la elaboración del acta de entorno de cierre, debido a que aún hace falta que culminen las actividades de obra.

Tabla 4. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices

Actas de entorno			
N°	**N° de acta de entorno**	**Abierta**	**Cerrada**
1	Acta de entorno n° 1	X	

- Actas permisos intervención en predios privados

Durante la ejecución del proyecto para el frente San Carlos, se levantó un permiso de intervención en predios privados, el cual a la fecha del presente informe se encuentra abierto.

Tabla 5. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró y relaciono la base de datos con la información del total de las actas de vecindad de apertura y de cierre.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados	10	

Indicador	%	Observaciones
por el área técnica en zona de influencia directa x 100	10	Se encuentran realizadas y cerradas
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	1 1	Se encuentran realizadas
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. actas de permiso de intervención a predios privados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	1 1	Se realizo según necesidad del proyecto, para este periodo no fue necesario abrir más permisos
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	10 10	Se encuentran realizadas
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Se realizará el cierre del acta de entorno cuando la obra esté finalizada.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	1 1	El contratista informa que ya cerro el permiso, pendiente que aporte la evidencia en el siguiente periodo
Porcentaje cumplimiento	100%	

Ver en el Anexo 1 base de datos actas de vecindad Tramo San Carlos

6.1.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

La Reunión de Inicio de obra se realizó el día 29/11/2023 para el tramo Cruces – Narices (San Carlos) en la sede de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Jordán perteneciente al municipio de San Carlos. En ella se contó con la asistencia de 26 personas de la comunidad, además del personal de la Interventoría y el contratista de obra.

La Reunión de Finalización de obra se tenía proyectada para el mes de junio de 2024, sin embargo, por la suspensión no se llevó a cabo. Teniendo en cuenta que, pese a la reactivación del contrato el contratista tiene proyectado realizar la actividad una vez se realice la intervención del área técnica.

Tabla 6Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 29/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.1.3 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

Durante el periodo del informe el contratista no desarrolló actividades correspondientes a este programa, sin embargo, tiene planteada la estrategia de convocatoria, difusión y comunicación para asegurar el correspondiente cierre del frente de obra en cumplimiento del Plan de Gestión Social.

Tabla 7. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
1 Punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 Punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.	1 0 N/A	El PAC no estuvo activo durante el periodo
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	20 20	Se cuenta con el insumo de la tabulación de las encuestas aplicadas
Porcentaje cumplimiento	100%	

6.2 Tramo Cocorná

En este frente de obra durante el periodo el contratista realizó la debida aplicación del plan de gestión social, con el cual buscó mitigar el impacto a la comunidad del área de influencia, el mantenimiento del relacionamiento con la comunidad y fomentar la participación del proceso, a continuación, se detallan los avances desde cada programa.

6.2.1 Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto

A continuación se detalla el estado actual de las actas de vecindad, entorno y permisos de intervención de predio en cumplimiento del programa correspondiente en el Plan de Gestión Social el cual pretende "implementar medidas de manejo que permitan reconocer el entorno

en el cual se desarrolla el proyecto, a través de actividades con las que se pueda identificar el estado actual del área de influencia de la obra, y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa":

- Actas de vecindad:

El número total de predios identificados como línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 inmuebles. De estos, 39 corresponden al tramo de mejoramiento y 9, al tramo de mantenimiento. El levantamiento de estas actas contribuirá a prevenir, mitigar y facilitar la atención en caso de posibles reclamaciones que se pudieran generar por las actividades de obra. En su elaboración se diligenció el formato FO-M2-P2-035 y se levantó el respectivo registro fotográfico de cada predio.

En este periodo se avanza en el cierre de nuevas actas de vecindad debido al alcance de las obras que se están desarrollando, para un total de 22 actas de vecindad cerradas

Tabla 8 Relación actas de vecindad de cierre Tramo Cocorná

Relación actas de vecindad Tramo Cocorná			
N° Acta	**Nombre propietario**	**Abierta**	**Cerrada**
Acta N°1	Carlos Efrén Montoya Ramírez	X	
Acta N°2	Aida García Ramírez		X
Acta N°3	Carlos Danilo Correa Posada	X	
Acta N°4	Cemida Amaya	X	
Acta N°5	Orlando Arroyave Agudelo	X	
Acta N°6	Sandra Patricia Gómez Villegas		X
Acta N°7	José Gildardo Jaramillo Aristizábal	X	
Acta N°8	Argiro Montoya Muñoz	X	
Acta N°9	Jorge Alberto Franco	X	
Acta N°10	Jorge Alberto Franco	X	
Acta N°11	Juan Guillermo Hoyos	X	
Acta N°12	Orlando Rosso Castañeda	X	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Acta N°13	Gerces Pelaez Gómez		X
Acta N°14	María Ofelia Quintero Quintero		X
Acta N°15	Gabriela López de Ramírez	X	
Acta N°16	Flor Adela Gómez		X
Acta N°17	Hortensia Socorro Alzate	X	
Acta N°18	Victor Emilio Quintero Quintero		X
Acta N°19	Nicolás Arturo Soto Ramírez		X
Acta N°20	Luis Carlos Pineda Villegas		X
Acta N°21	Claver Antonio Vargas Quintero		X
Acta N°22	Jadier Alberto Agudelo Gómez		X
Acta N°23	Jesús Chamorro Morán	X	
Acta N°24	Rubiela Aristizábal - Manuel José Montoya		X
Acta N°25	Casa abandonada		X
Acta N°26	Teresa de Jesús Gómez Zuluaga - Francisco Javier Echeverry		X
Acta N°27	Manuel José Montoya		X
Acta N°28	Darío Cardona - María Irene Muñoz		X
Acta N°29	Antonio José Marín Ramírez		X
Acta N°30	Belisario Marín González - Antonio Marín		X
Acta N°31	Jorge Alberto Franco		X
Acta N°32	Olga Rosa Nieto Marulanda		X
Acta N°33	Néstor Julio Giraldo A	X	
Acta N°34	Junta de Acción Comunal vereda San Juan - Argiro Montoya		X
Acta N°35	Casa abandonada		X
Acta N°36	Javier Alonso Saldarriaga	X	
Acta N°37	Javier Alberto Pérez Z.	X	
Acta N°38	Luis Alfredo Valencia M.	X	
Acta N°39	Claver Antonio Vargas Quintero		X

Acta N°40	Sin información	X	
Acta N°41	Aracely Valencia	X	
Acta N°42	Aracely Valencia	X	
Acta N°43	Luis Alfonso Arias	X	
Acta N°44	María del Socorro Posada Montoya	X	
Acta N°45	María del Socorro Posada Montoya	X	
Acta N°46	Ubaldo de Jesús Vargas	X	
Acta N°47	Mariela Bustamante Blandón	X	
Acta N°48	Joaquín Emilio Quintero	X	

- Actas de Entorno:

Entre los meses de noviembre de 2023 y enero de 2024 fueron levantadas 7 actas de entorno de diferentes tramos de la vía y del ZODME ubicado en el predio El Recreo, las cuales a la fecha del presente informe continúan abiertas.

A continuación, se relaciona la tabla con la información y estado de las actas de entorno.

Tabla 9 Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná

Actas de entorno levantadas y entregadas				
N°	**N° de acta de entorno**	**Abierta Nov 2023**	**Abierta Dic 2023**	**Abierta Ene 2024**
1	Acta de entorno n° 1	X		
2	Acta de entorno n° 2	X		
3	Acta de entorno n° 3		X	
4	Acta de entorno n° 4	X		
5	Acta de entorno n° 5		X	
6	Acta de entorno n° 6			X
7	Acta de entorno n° 7			X

- Actas permisos intervención en predios privados:

A lo largo de la ejecución del proyecto se han elaborado 24 actas de "Autorización para intervenir predios privados", esto mediante aplicación del formato establecido por parte de la Gobernación de Antioquia.

Para el corte del presente informe, el contratista adelantó el cierre de dos permisos de intervención. A continuación, se relacionan los permisos que se han diligenciado.

Tabla 10 Permisos levantados tramo Cocorná

	Permisos de intervención en predios privados Tramo Cocorná			
N° Permiso	**Nombre propietario**	**KM**	**Abierto**	**Cerrado**
1	Carlos Efrén Montoya	Km1 Vía	X	
2	Gabriela López	K1+515	X	
3	Orlando Rosso Castañeda	K1+ 380 a K1+.437	X	
4	Olga Rosa Nieto	K1+660 a K1+720		X
5	Luis Alfredo Valencia	K1+490 a K1+525.	X	
6	Javier Alberto Pérez	K1+660 a K1+720.		X
7	Rubiela Aristizábal	K1+045		X
8	Flor Adela Gómez	K1+557	X	
9	Luis Carlos Pineda	K1+740 a K1+745		X
10	Antonio Marín	K1+630		X
11	Antonio Marín	K1+676	X	
12	Olga Rosa Nieto	K1+676		X
13	Javier Saldarriaga	K1+640	X	
14	Claver Vargas	K1+ 820	X	
15	Julio Jaramillo	K1+640	X	
16	Dideison Ocampo	K1+210	X	
17	María Irene Muñoz	K1+700		X

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

18	Carlos Danilo Correa	K1+117	X	
19	Jexica Maira Vanegas - Orlando Arroyave	K1+117	X	
20	Jorge Franco	K1+255	X	
21	Joaquín Quintero	K1+480	X	
22	Ruth Elena Torres	K1+820	X	
23	Jorge Franco	K1+743	X	
24	Jorge Franco	K1+735	X	

Tabla 11 Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	**%**	**Observaciones**
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 / 1	Se elaboró la base de datos de actas de vecindad, esta se ha ido actualizando de manera permanente, a medida que ha ido avanzando el proceso.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	48 / 48	La línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 predios (39 del tramo de mejoramiento y 9 del tramo de mantenimiento). De estos, 46 han sido entregadas y firmadas por la Interventoría; las otras 2, se encuentran pendiente de firma por parte de los propietarios, a la espera de ser firmadas por el presidente de la junta de acción comunal

Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	7 7	Se levantaron 7 actas de entorno de la vía; 6 de ellas corresponden a partes de los tramos de mejoramiento y mantenimiento y 1, al ZODME ubicado en el predio El Recreo.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. actas de permiso de intervención a predios privados levantados y firmados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	24 24	A la fecha se han levantado 24 permisos de intervención, Se encuentra pendiente, contactar a los 2 propietarios incluidos dentro de los permisos de intervención elaborados previamente por parte de la Gobernación de Antioquia.
Porcentaje de cumplimiento	**100%**	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	22 48	En el periodo del informe se avanza con el cierre de actas de vecindad
Porcentaje cumplimiento	**45,83%**	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.

Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	7 24	Durante el periodo se avanzo en el cierre de permisos, de acuerdo al avance de la etapa final
Porcentaje cumplimiento	**25%**	

Ver en el Anexo 1 Informe contratista

6.2.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

Durante el periodo del presente informe el contratista no realizó actividades para el cumplimiento de los objetivos de este programa, no obstante, en el marco de desarrollo de este programa se realizó la reunión de inicio el 15 de noviembre de 2023 y en el informe del mismo periodo fue reportado.

Tabla 12 Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 15/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra. Esta información fue reportada en el mes de noviembre.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Programa para la Contratación de Mano de Obra.

- Actividades para promover la contratación de mano de obra

Este programa busca establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma.

Durante el periodo del informe la contratista continua con la implementación de estrategias para la vinculación de nuevo personal, con la definición de perfiles y mecanismos de recepción de hojas de vida; reportan 27 personas activas en el contrato.

En la siguiente tabla se discrimina esta información.

Tabla 13 Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná

ÍTEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	1	6	8	12
	7		20	

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 14. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	8 27	De las 27 personas que se encuentran activas en el proyecto, 8 corresponden a MONC del AID
Porcentaje cumplimiento	**34,3%**	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	22 27	De los 27 vinculados, residen en el municipio de Cocorná 22 lo que representa un 81%.
Porcentaje cumplimiento	**81%**	
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total de trabajadores contratados x 100.	3 27	De los 27 empleados que se encuentran activos a la fecha, 5 son mujeres. De estas, 3 son del AID (11%).
Porcentaje cumplimiento	**11%**	

Ver en el Anexo 2 formato de empleabilidad noviembre

6.2.4 Programa de Comunicación y Divulgación.

Este programa busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin"

Actividades desarrolladas en el período:

- Afiches Informativos


Durante el periodo del informe se instalaron los afiches en los sitios definidos como estratégicos para lograr la difusión con información de los cierres de vía programados de manera semanal, durante el mes se entregaron 5 piezas que también fueron compartidas por medio de la línea de atención mediante estados y grupos como el CPC, habitantes de la comunidad, presidentes de las JAC y residentes de las veredas San Juan, El Chocó, Las Playas y Buenos Aires del municipio; finalmente, se entregaron piezas físicas en los puntos de inicio de cierre de vía.

Durante el periodo anterior se implementaron pautas radiales con la emisora comunitaria Cascada Estéreo, del municipio de Cocorná para socializar la implantación de cierres totales; en el presente informe se anexa el certificado que quedo pendiente en el periodo anterior.

Además, se envío boletín informativo donde se socializan los hechos más significativos del periodo por área, esta pieza tiene como finalidad asegurar la entrega de información a las personas del área de influencia.


Piezas comunicacionales



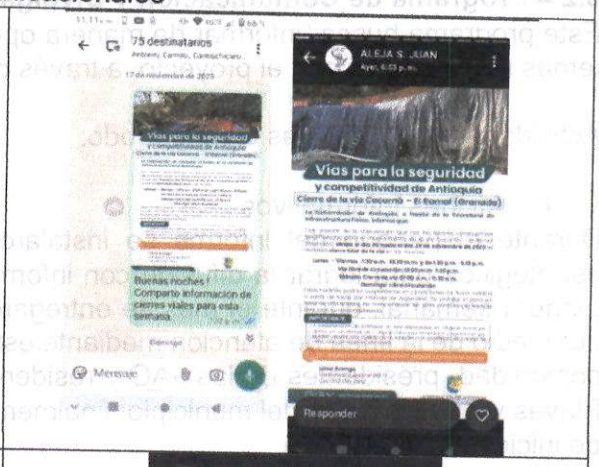





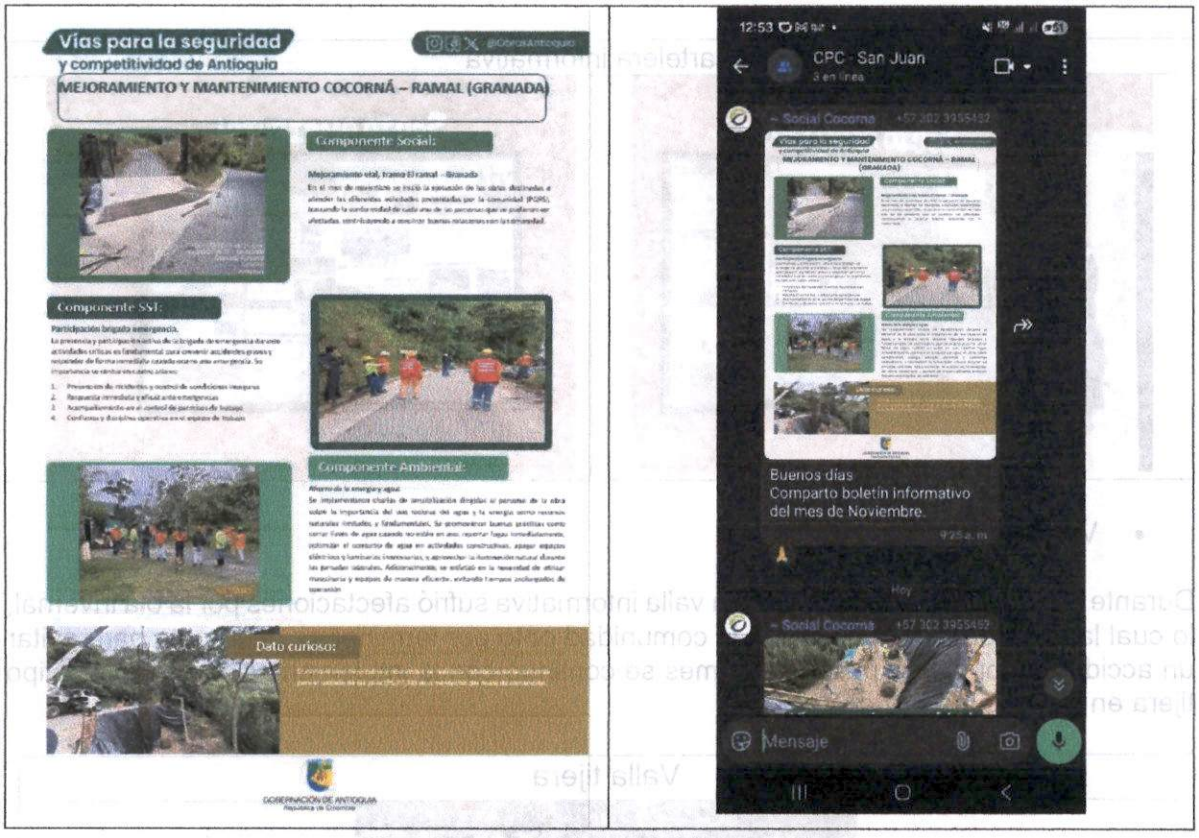

- Cartelera informativa

La cartelera informativa se encuentra ubicada en el Punto de Atención a la Comunidad y durante el periodo fue publicada información referente a los avances presentados en los componentes técnico, social, ambiental y SST del proyecto.

Cartelera informativa





- Valla informativa

Durante la suspensión del contrato, la valla informativa sufrió afectaciones por la ola invernal, lo cual la deterioro a tal punto que la comunidad opto por terminar su desmonte para evitar un accidente por su desplome, este mes se continuó con la implementación de la valla tipo tijera en el cierre de la vía.

Valla tijera



Dificultades en el proceso:
Durante el periodo no se evidencian dificultades para la implementación del programa.

Tabla 15. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1 1	La valla se instaló al inicio del proyecto, sin embargo, actualmente no se encuentra debido a las razones mencionadas anteriormente
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	1 1	Se realizó la instalación de una valla tipo tijera en el cierre de la vía
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de pasacalles, sin embargo, este material será incluido en el próximo periodo.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	100 100	Se entregaron 200 volantes, significa en promedio se entregó la misma cantidad de volantes más con respecto al periodo anterior
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	10 10	Durante el periodo se contrataron 10 pautas radiales, con la emisora

		comunitaria Cascada Estéreo, del municipio de Cocorná.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	1 1	Durante el periodo se actualizó la cartelera informativa
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	2 2	Los buzones se encuentran instalados
Porcentaje cumplimiento	100%	

6.2.5 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

Este programa tiene como objetivo Garantizar una participación amplia y efectiva de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, donde se generen espacios adecuados para la exposición, conocimiento y solución de dudas, expectativas y reclamos, presentados como consecuencia de las diferentes actividades que componen el proyecto.

Durante el periodo del informe el contratista aseguro la atención en el PAC y divulgo la disponibilidad de este mediante los canales dispuestos para ello, se realizó seguimiento a las PQRS abiertas que se encuentran en espera de cierre por cuenta del área técnica a una de ellas se le dio atención y cierre durante el periodo.

Tabla PQRS				
N°	**Peticionario**	**Abierta**	**Cerrada**	**Solución incompleta**
1	Juan Guillermo Hoyos		X	

2	Sandra Milena Mosquera		X	
3	Francisco Javier Ramirez		X	
4	Miriam Ramirez Hoyos	X		
5	Claver Antonio Vargas		X	
6	Luis Alfredo Valencia	X		
7	Oriana Guarín		X	

- **Buzón de sugerencias**

Durante el periodo se cumplió con la revisión semanal del buzón de sugerencias, ubicado en el PAC y en la sede de la JAC de la vereda San Juan, de manera conjunta entre interventoría y contratista, en estas revisiones se evidenció que no se recibieron PQRS. De la apertura de estos se levantaron las actas donde se deja constancia del proceso efectuado.

Ilustración 1 Registro fotográfico Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto Tramo Cocorná


Buzón de sugerencias	
	

Tabla 16. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	En el periodo no se recibieron PQRS
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	15 15	Se encuentran aplicadas las encuestas y se presentó informe de tabulación
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Punto de atención a la comunidad



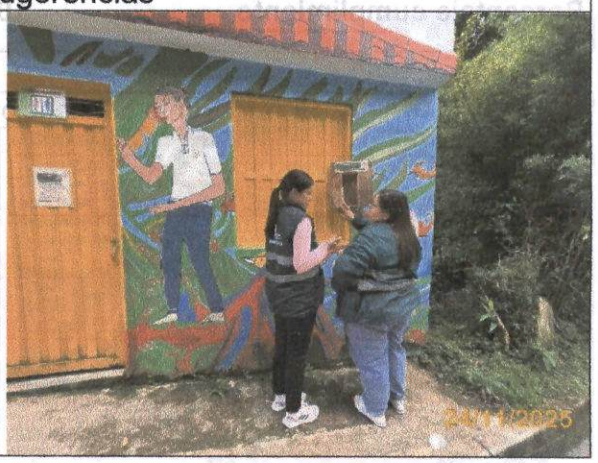

6.2.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

Este programa busca "contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico, en caso de encontrar un hallazgo fortuito". En el período, no se presentaron hallazgos arqueológicos.

Tabla 17. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	0	El 29/01/2024 se realizó una capacitación con el personal sobre "Arqueología Preventiva y Patrimonio Arqueológico", a esta asistieron 29 personas vinculadas al proyecto. La información correspondiente a la misma fue presentada en el informe correspondiente al mes de enero del presente año.
	0	A la fecha no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. En las inducciones realizadas a los trabajadores que ingresan a laborar en el período, se manifiesta la importancia de seguir el protocolo en caso de un hallazgo fortuito en el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.2.7 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria

Este programa está encaminado a "crear un espacio de participación comunitaria, en el cual se brindará información de los avances de las actividades de obra y a su vez serán abordados los cambios generados en la dinámica del territorio y las proyecciones futuras con la operación del proyecto, con el fin de que los integrantes del comité aporten en la

construcción de alternativas para atender las problemáticas identificadas y finalmente se conviertan en multiplicadores de la información".

Durante el periodo se realizó reunión con el Comité de Participación Comunitaria el martes 24 de noviembre de 2025, la cual conto con la asistencia de 10 de los integrantes del comité a las 2:00 p.m., el desarrollo de la reunión se dio en términos positivos en la medida en que se resolvieron todas las dudas de los asistentes.

Es importante mencionar que el compromiso adquirido en el CPC del mes de octubre, con relación a llevar a cabo la reunión en la vereda el Chocó, no fue posible por circunstancias de seguridad en el desplazamiento, debido al desprendimiento de banca en la vía. Sin embargo, el área social del proyecto busco brindar alternativas a esta población para allegar la información relevante del avance de obra.

Después de explorar la opción de realizar la reunión de manera virtual y ante la negativa del presidente de la junta se implementó además del boletín informativo, un video donde el residente de obra socializo los avances de obra, así mismo las dificultades que se han presentado a lo largo de la ejecución de obra.

Tabla 18 Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	12 / 12	Las doce reuniones con el CPC han sido efectuadas los días 07/12/2023, 18/01/2024, 15/02/2024, 14/03/2024 y 28/04/2024, 28/05/2025, 26/06/2025, 30/07/2025, 27/08/2025, 24/09/2025, 28/10/2025, 24/11/2025 A estas asistieron 10, 25, 32, 20, 12, 8, 8, 10,12, 8, 10 y 10 personas, respectivamente.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Ilustración 2 Registro fotográfico programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Comité de Participación Comunitaria









Envío del video informativo	Envío de boletín
	

6.2.8 Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Este programa tiene como fin "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia".

Durante el periodo el contratista desarrollo la capacitación al personal de obra, el 26 de noviembre de 2025, donde abordo la temática "La convivencia", buscando hacer fortalecer esta habilidad de manera lúdica.

Tabla 19. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	1 1	Se desarrollo capacitación
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	20 27	Se conto con buena participación para el desarrollo de la actividad
Porcentaje cumplimiento	**74%**	

Ilustración 3 Registro fotográfico programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Capacitación personal noviembre 2025	
	

Ver en el Anexo 1 Informe contratista

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Desde el área social de la Interventoría durante el periodo en referencia se realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades implementadas por el contratista para el desarrollo de cada programa.

Por otro lado, se atendió el llamado por parte de la gobernación para sustentar la labor que se viene realizando de socialización y divulgación, esto debido a una queja presentada por la comunidad, debido a esto se trasladaron al contratista los requerimientos por parte de la supervisión en temas de divulgación y se realizo estricto seguimiento a la implementación de las medidas correspondientes por parte del contratista.

Para el tramo San Carlos, se cuenta con la aprobación de la presentación para la reunión de finalización que se llevará a cabo una vez el contratista finalice las actividades de obra que tiene pendientes. El informe final se encuentra pre aprobado, pendiente del desarrollo de las actividades de cierre.

7.1 CONTROL DE INVERSIÓN PRESUPUESTO SOCIAL

Teniendo en cuenta la importancia de asegurar los recursos necesarios para la aplicación de los programas durante toda la etapa de ejecución, desde el área social se realiza un control de la inversión la cual se relaciona a continuación, la cual continúa igual dado a que el contratista no ha presentado acta de cobro.

Durante el mes de noviembre se le recomendó al contratista presentar memorias con el acta de cobro para tener claridad del gasto social, sin embargo, el contratista no presento acta social

	PRESUPUESTO	ACTA 1				TOTAL COBRADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
SAN CARLOS	$ 13.674.900	$ 7.619.719				$ 7.619.719	$ 6.055.181
	PRESUPUESTO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	TOTAL COBRADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
COCORNÁ	$ 13.674.900	$ 6.789.441	$ 1.352.800	$ 440.816	$ 1.114.570	$ 9.697.627	$ 3.977.273
		TOTAL SALDO PRESUPUESTO SOCIAL					10.032.454

7.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general se recomienda que el contratista continuar con la correcta implementación de los programas contenidos en el plan de gestión social y continúe con el cumplimiento de los indicadores

- Se debe continuar con el proceso de levantamiento de actas de vecindad de cierre.
- El contratista continuar las estrategias que venía planteando para la vinculación de personal de la zona.
- Se debe continuar con la socialización asertiva los cierres y demás actividades de obra que generen impacto a la comunidad.

- Instalación de pasacalle para el refuerzo de la socialización de los cierres viales
- El contratista debe asegurar la entrega del boletín informativo de manera mensual
- Continuar con la programación regular del CPC de manera mensual
- Se recomienda continuar con las capacitaciones al personal y con la implementación de dinámicas que favorezcan el aprendizaje
- Se continúa con la recomendación de que se debe llevar a cabo lo más pronto posible la reunión de socialización final de obra en el tramo San Carlos, sin embargo, el cumplimiento de este objetivo depende del área técnica.
- El contratista debe presentar acta de cobro para llevar un correcto seguimiento al gasto del presupuesto social

8. Listado de Anexos

- Anexo 1. Informe mensual # 14 contratista
- Anexo 2. Empleabilidad noviembre

9. Listado de tablas

Tabla 1 Información del Contrato de obra 11
Tabla 2 Información contrato de interventoría..... 13
Tabla 3. Relación actas de vecindad de cierre Tramo San Carlos..... 15
Tabla 4. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices..... 16
Tabla 5. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices..... 16
Tabla 6Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices..... 18

Tabla 7. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 19
Tabla 8 Relación actas de vecindad de cierre Tramo Cocorná 20
Tabla 9 Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná 22
Tabla 10 Permisos levantados tramo Cocorná 23
Tabla 11 Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná 24
Tabla 12 Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná 26
Tabla 13 Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná 27
Tabla 14. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná . 28
Tabla 15. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná 33
Tabla 16. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 36
Tabla 17. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná 37
Tabla 18 Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 38
Tabla 19. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 41

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION SOCIAL

Datos Generales

Entidad contratante:	Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.
Interventor:	Consorcio Mejoramiento 15378
Contrato de Interventoría No:	23SS111B1465 de 2023
Contratista:	Consorcio Cocorná 15372
Contrato de Obra No:	4600016585 de 2023
Periodo reportado:	Informe #15 de 1 al 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio del contrato	03 de noviembre de 2023
Fecha final del contrato	31 de diciembre de 2025

Programa social	Actividades Sociales
Programa para el Reconocimiento del Entorno	***Tramo San Carlos***: **Actas de vecindad:** A la fecha del periodo presentado en el informe, se levantan Actas de Vecindad de Cierre, se realizaron 10 visitas a viviendas y se obtuvieron cierre de la totalidad de las Actas de Vecindad. En el informe presentado por la interventoría se anexa la relación de actas de vecindad de cierre en el tramo. **Actas de entorno**: Según los anexos de las actas levantadas y entregadas, aún continua pendiente la elaboración del acta de entorno de cierre, debido a que aún hace falta que culminen las actividades de obra. **Permisos de intervención de predios**: Se levantó 1 permiso de intervención, pendiente cierre de la mismo ***Tramo Cocorná***: **Actas de vecindad**: No se registraron cierres de nuevas Actas de Vecindad debido al alcance de las obras que se están desarrollando. Se anexa relación de 48 Actas de Vecindad. A la fecha se han cerrado 22, pendiente por cerrar 26. **Actas de entorno**: Se han levantado 7 actas de entorno en los diferentes tramos y aún se encuentran abiertas. **Permisos de intervención de predios**: Se han levanto 24 permiso de intervención de los cuales se tiene 17 abiertos y 7 cerrados.

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria	***Tramo San Carlos***: Se tiene pendiente la reunión de finalización de obra, una vez se realice la intervención del área técnica. ***Tramo Cocorná*** No se realizaron actividades relacionados con el programa. Sin embargo, se realizó la reunión de inicio el 15 de noviembre de 2023.
Programa para la Contratación de Mano de Obra	***Tramo Cocorná*** Se continúa con la implementación de estrategias para la vinculación de nuevo personal. Se reporta vinculación de un total de 27 personas.
Programa de Comunicación y Divulgación	Se desarrollaron diferentes actividades del programa como instalación de afiches informativos, cartelera informativa, revisión de buzón de sugerencias, valla informativa y difusión de cuñas radiales para cierres parciales de vía
Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados del Proyecto	Durante el periodo del informe se realizó la atención en el PAC y a la fecha se cuenta con 7 PQRS, 5 de ellas cerradas y 3 pendientes así: Miriam Ramírez Hoyos PQRS abierta Luis Alfredo Valencia PQRS abierta Se cumplió con revisión semanas del buzón de sugerencias. Se adjunta registro fotográfico como evidencia de los volantes, cartelera informática, puntos del buzón de sugerencias.
Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural	En el período, no se presentaron hallazgos arqueológicos.
Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria	Se realizó Comité de Participación Comunitaria el 24 de noviembre de 2025 y se informó a la comunidad los avances del proyecto. Se contó con la participación de 10 personas.
Programa para la Educación y Capacitación al personal vinculado al Proyecto	Durante el periodo del informe se desarrolló capacitación al personal de obra sobre la temática "*La convivencia*". Se adjunta como evidencia registro fotográfico de la capacitación.
Gestión Social Interventoría	Desde el área social de la Interventoría durante el mes de noviembre del 2025, se atendió el llamado por parte de la gobernación para sustentar la labor que se viene realizando de socialización y divulgación, esto debido a una queja presentada por la comunidad, debido a esto se trasladaron al contratista los requerimientos por parte de la supervisión en temas de divulgación y se realizó estricto seguimiento a la implementación de las medidas correspondientes por parte del contratista. Se cuenta con la aprobación de la presentación para la reunión de finalización cuando se lleven a cabo las actividades de obra pendientes específicamente para el tramo de San Carlos. **Presupuesto social**: Se cuenta con un saldo a la fecha del presente informe de $ 10.032.454

	Finalmente, se presentó a la supervisión la empleabilidad correspondiente al mes de octubre, mediante correo electrónico emitido el 4 de noviembre de 2025

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el apoyo a la supervisión social, se acepta el informe # 15 correspondiente al mes de noviembre de 2025, presentado por la Interventoría Consorcio Mejoramiento 15378, el cual se encuentra acorde con la Guía de manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

Los soportes de las actividades ejecutadas para cada programa se pueden consultar en medio físico, los cuales hacen parte de la información entregada por el Consorcio Mejoramiento 15378.

Firma apoyo a la supervisión social
Dirección gestión Social, Ambiental y Predial
Secretaria de Infraestructura Física

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO

EN ESTE FOLIO VA UN

VER EXPEDIENTE FISICO

