INFORME SUPERVISIÓN LOTE BACOF.

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUADRÓN DE INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 05. Mes: 01. Año: 2026.

CONTRATO N°. 152-00-B-COFAC-BACOF-2025.

CONTRATISTA: SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA, cédula de ciudadanía No. 80.053.874, en su calidad de representante legal de ABSICOL SAS., identificada con NIT. 900.974.300-9.

VALOR DEL CONTRATO: $ 38.360.000 IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO:
Primer pago parcial: lo ejecutado con corte 31 de diciembre 2025 y/o hasta por valor de $ 3.360.000,00 M/CTE para ser cancelado con cuentas por pagar 2025, pagaderas el primer trimestre 2026.

Segundo pago parcial: lo ejecutado con corte 29 marzo 2026, para ser cancelado con cargo al PAC mayo 2026.

Pago final: lo ejecutado con corte 31 julio 2026, para ser cancelado con cargo al PAC septiembre 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 16. Mes 12. Año 2025.
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIAS: Día 18. Mes 12. Año 2025.
FECHA ACTA DE INICIO: Día 22. Mes 12. Año 2025.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Para la vigencia 2025: Desde la suscripción del acta de inicio previa aceptación de la oferta y cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para la vigencia 2026: Desde el 01 de enero 2026 hasta el 31 de julio 2026, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

OBJETO DEL CONTRATO:
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY Y REGULADORES MARCAS VARIAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. BACOF Y GRUPOS AÉREOS GACAS Y GAAMA".

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001
FECHA DE FIRMA: N/A
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A
CUENTA FINAL: N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002
FECHA DE FIRMA: N/A
REDUCCIÓN CONTRATO: N/A
VALOR FINAL: N/A

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Porcentaje Avance en tiempo: 4.07 %
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 8,76%
Recursos ejecutados: $ 3.360.000,00
Pagos realizados: $0,00
Porcentaje de pagos realizados: 0,00%
Porcentaje pagos pendientes por realizar: 100,00%
Pagos pendientes por realizar: $38.360.000,00

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	CORTE	PAC	VALOR	FECHA DE PAGO	No. ORDEN DE PAGO
PRIMER PAGO PARCIAL, CUENTAS POR PAGAR 2025.	31-DIC-25	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026.	$ 3.360.000,00 R10	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MILTON JESÚS MOSQUERA GUTIÉRREZ	INGENIERO ELECTRÓNICO	INGENIERO ELECTRÓNICO
SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA
DOUGLAS JAVIER TORRES HERNANDEZ	TECNÓLOGO ELECTRICISTA INDUSTRIAL	TECNÓLOGO ELECTRICISTA INDUSTRIAL

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DICIEMBRE 2025	CANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, UPS POWER CONTROL de 20 KVA	1	UN	$ 320.789,00	$ 320.789,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, LIEBERT de 15 KVA	1	UN	$ 263.646,00	$ 263.646,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, TITAN de 10KVA	1	UN	$ 235.075,00	$ 235.075,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, TITAN de 6KVA	1	UN	$ 206.503,00	$ 206.503,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, UPS POWEST TITAN DE 20 KVA	1	UN	$ 320.789,00	$ 320.789,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, UPS APC (AMERICAN POWER CONVERSION) 20 KVA	1	UN	$ 320.789,00	$ 320.789,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EATON PEI 30KVA	1	UN	$ 392.218,00	$ 392.218,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, UPS NETION 20 KVA	1	UN	$ 320.789,00	$ 320.789,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, REGULADOR DE VOLTAJE 60 KVA	1	UN	$ 520.789,00	$ 520.789,00
SUBTOTAL					$ 2.901.387,00
IVA					$ 551.263,53
TOTA					$ 3.452.650,53

Teniendo en cuenta que el valor disponible para ejecutar en la vigencia 2025 es de $3.360.000,00 y el valor real ejecutado fue de $3.452.650,53 el contratista procede a realizar una nota crédito por valor de $92.650,53

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	**Capitán RINCON MACHADO ERNESTO ANDRÉS**
FIRMA:	
C.C. No.	1.047.390.867
DEPENDENCIA:	COMANDANTE ESCUADRILLA SERVICIOS PÚBLICOS BACOF

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		

7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**N/A**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**NO HAY INCUMPLIMIENTO**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**AUN NO SE HA REALIZADO**

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 30 de diciembre de 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA BASE AEREA COFAC
Atn: **CAPITÁN ERNESTO RINCÓN**
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento preventivo a todas las UPS se realizan las siguientes actividades:

- Limpieza general del equipo, se destapo la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo.
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras, terminales y cables).
- Suministro y reemplazo de elementos menores como son: (borneras, terminales, tornillería).
- Toma de temperatura en puntos de conexión.
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección.
- Medición de los principales parámetros eléctricos (corriente, tensión, etc.).
- Revisión y verificación del estado de los filtros (condensadores) que hacen parte de cada uno de los equipos.
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Verificación de los componentes de estado sólido (tarjetas y transistores de potencia) de las siguientes etapas: rectificador, conversor AC-DC, búster DC-DC, cargador de baterías e inversor, y monitoreo.
- Revisión y chequeo de etapa de control.
- Revisión y chequeo de etapa de medición y señalización.
- Revisión y chequeo de etapa de potencia.
- Arranque del equipo, chequeo y ajuste de los parámetros de funcionamiento.
- Verificación de calibración y parámetros normales y buffer de software del equipo.
- Prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS interno o externo. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).

A- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Subina piso 1

Marca: Titan

Capacidad: 6Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento, banco de baterías compuesto por 20 unid 12V-7AH.

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ABSICOL S.A.S








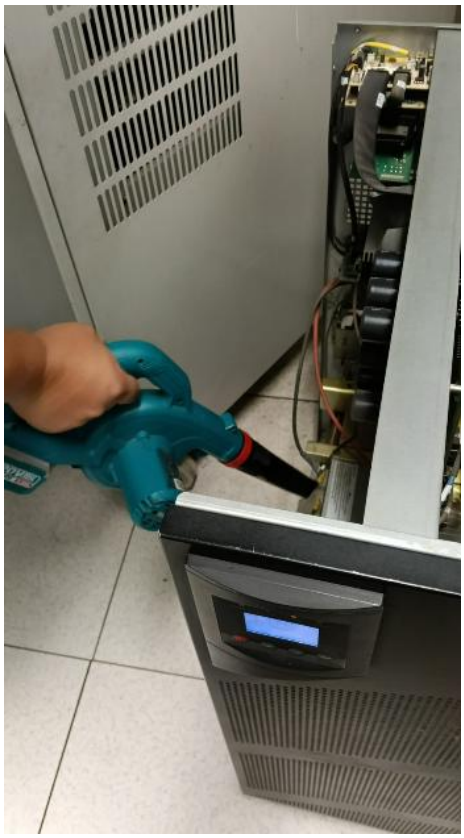

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S




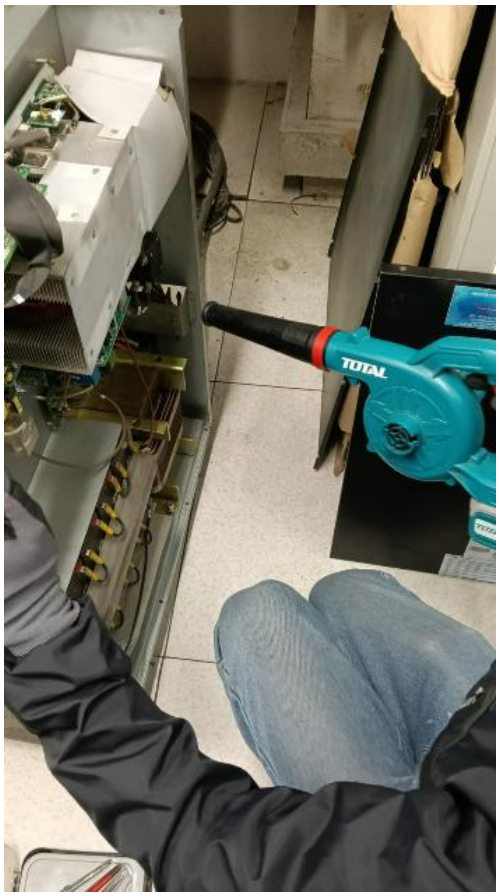






NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

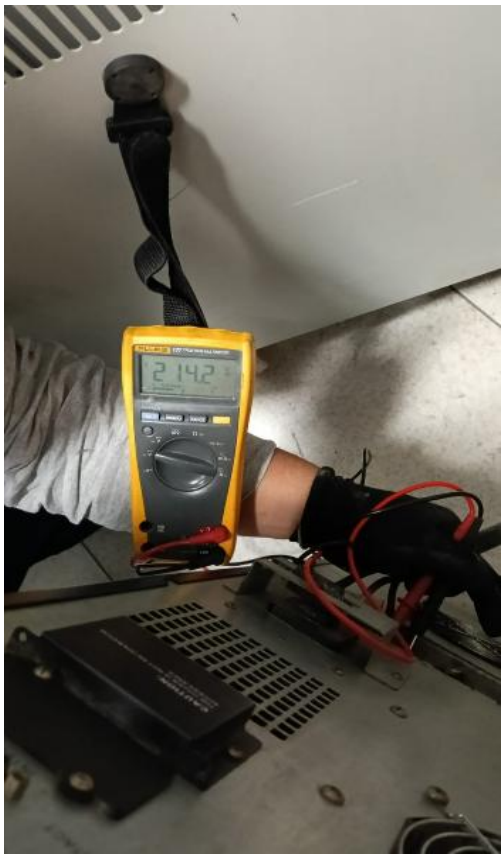



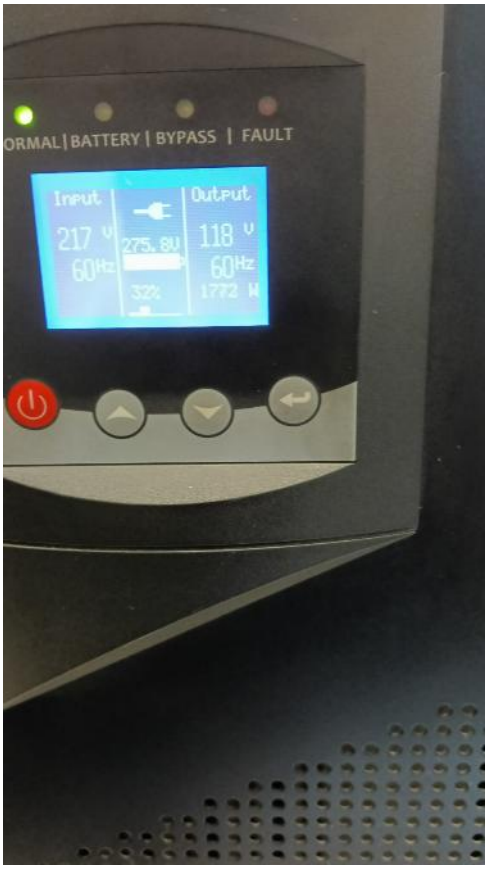

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

B- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Subina piso 1

Marca: Titan


Capacidad: 10Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento, banco de baterías compuesto por 20 unid 12V-9AH.

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.

REGISTRO FOTOGRAFICO

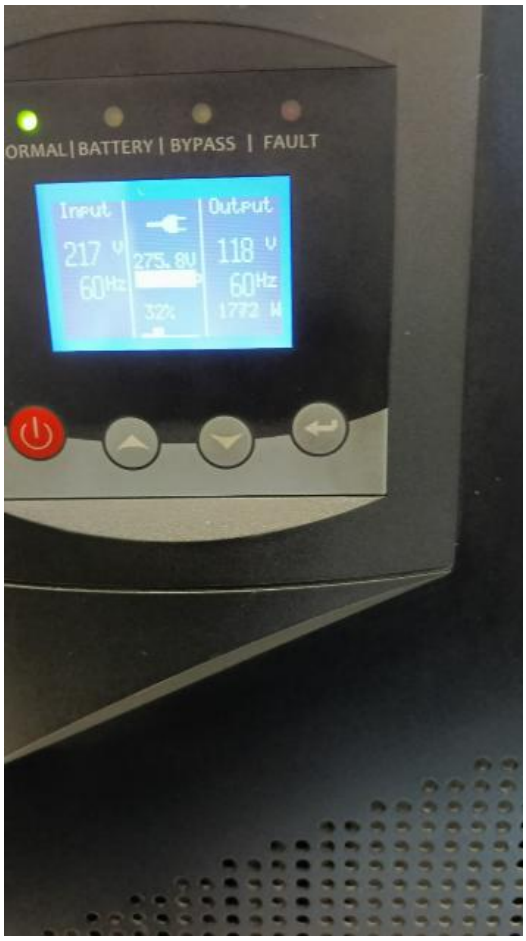




MODELO.: TITAN 10K
ENTRADA: 240VAC; 41.6A
60HZ/BIFASICA
SALIDA: 10000VA/9000W
120X2/240 VAC/60HZ;
37.5AXFASE/BIFASICA
CIDET
RETIE
CAUTION:
See Installation Instructions before connecting to the supply.
Do not remove cover.This unit may be opened by authorized technicians only. No user parts inside.
Equipment powered more than one source.
Before working on this circuit, isolate Uninterruptible Power System(UPS). Then check for Hazardous Voltage between all terminals including the protective earth.
HIGH LEAKAGE CURRENT. Earth connection essential before connecting supply.
An easily accessible disconnect device shall be incorporated in the fixed wiring.
Lead acid batteries inside of the enclosure.




13.67


13.69

ABSICOL S.A.S










NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

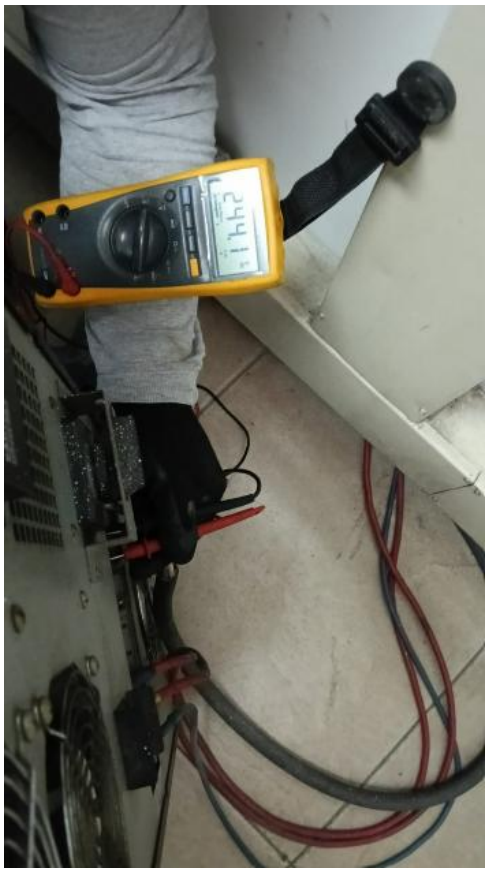



C- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Subina piso 3

Marca: Eaton

Capacidad: 30Kva


Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento,

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.

ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

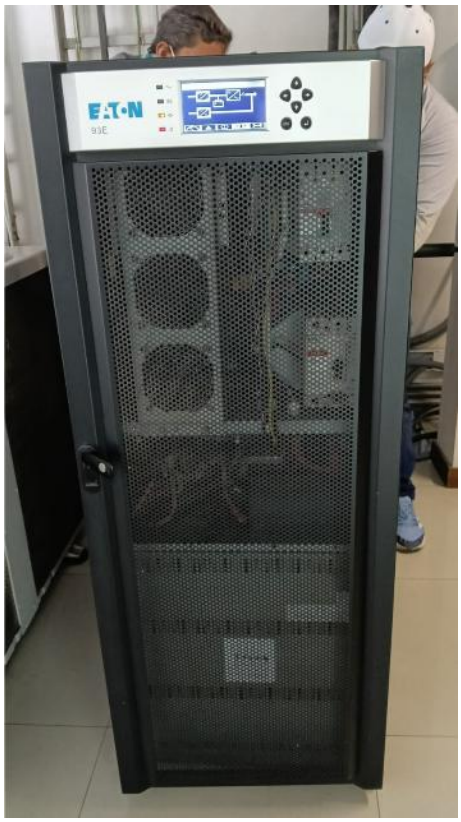









NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

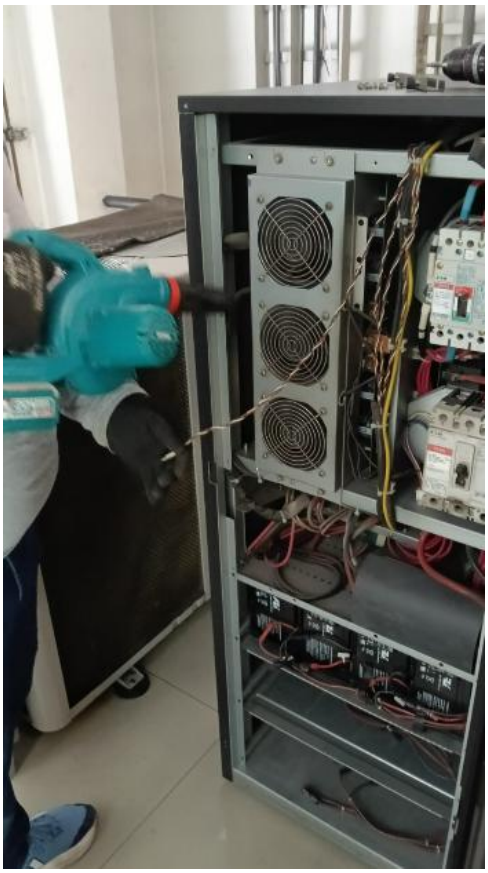






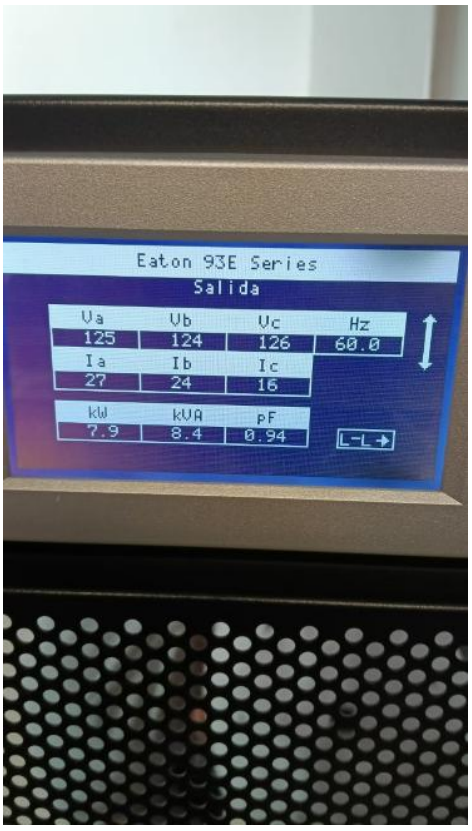

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S



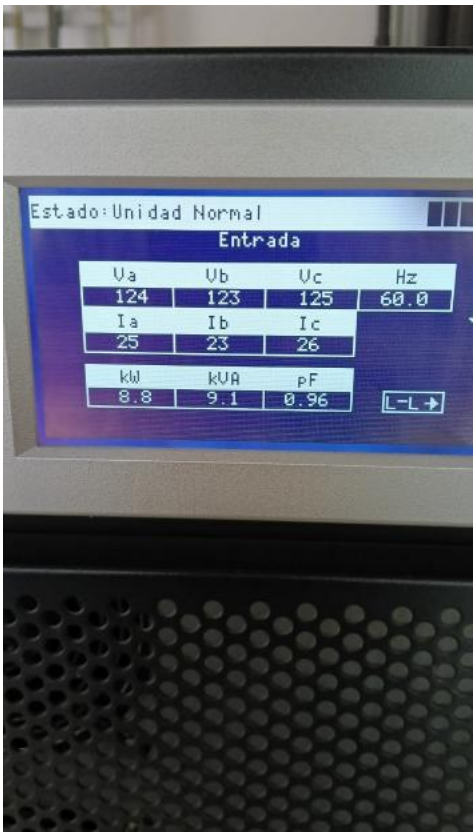



NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

D- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Dirección apoyo y control

Marca: PowerControl

Capacidad: 20Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento, banco de baterías compuesto por 32 unid 12V-9AH.

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ABSICOL S.A.S









NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S







NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

E- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Dirección medicina aeroespacial

Marca: Regulador

Capacidad: 60Kva

Estado inicial del equipo: Regulador encendido.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: Se encuentra en funcionamiento,

- Tras la intervención, el regulador quedó en condiciones operativas adecuadas, garantizando su correcto funcionamiento y estabilidad en la entrega de energía.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ABSICOL S.A.S





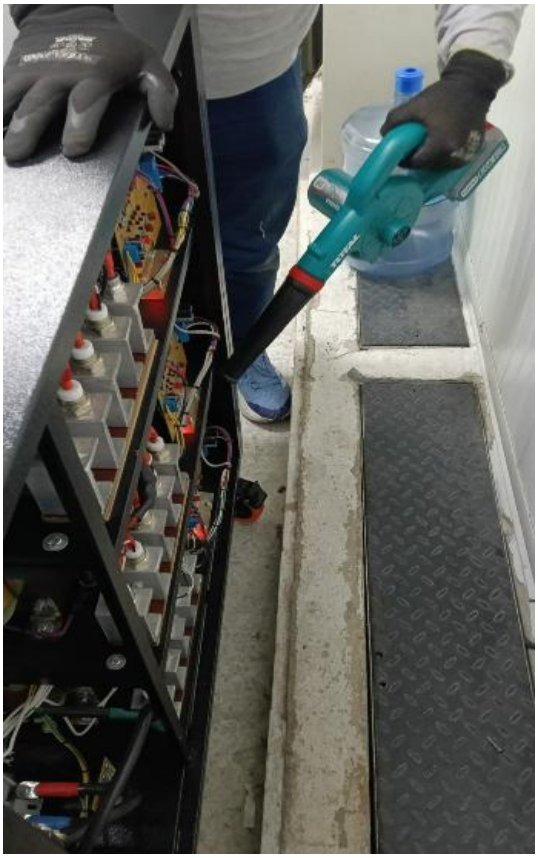

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

F- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Centro de medicina aeroespacial

Marca:

Capacidad: 30Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento,

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ABSICOL S.A.S










NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S






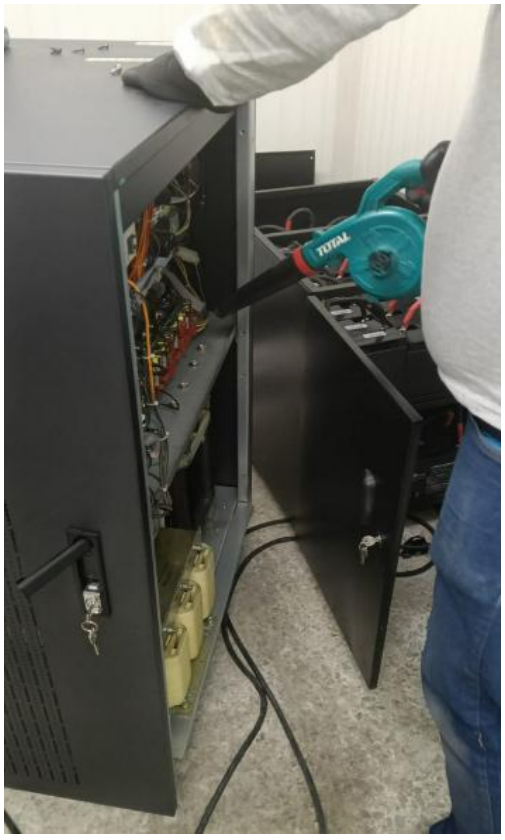



NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

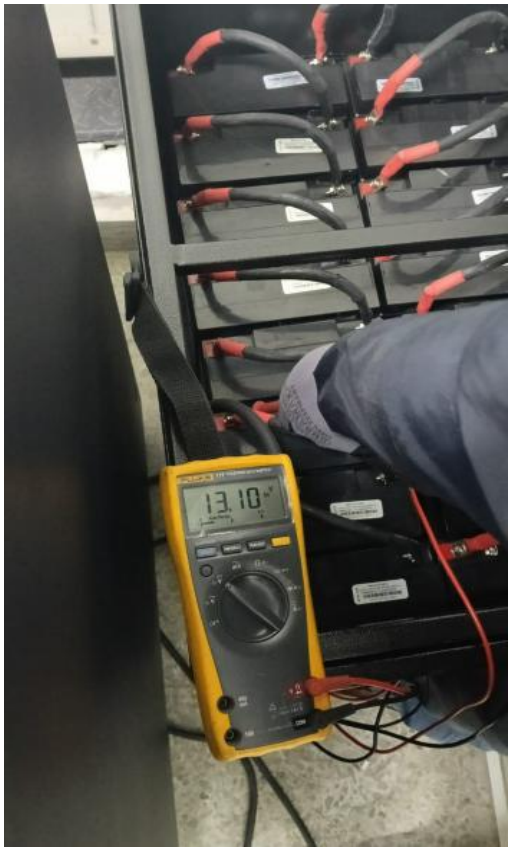



G- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Edificio Ícaro oficina difra

Marca: Powest

Capacidad: 30Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento,


- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías


ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO






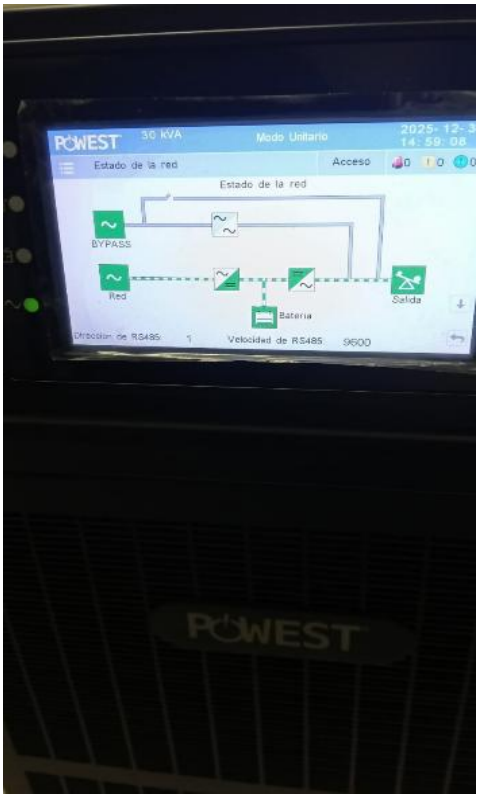


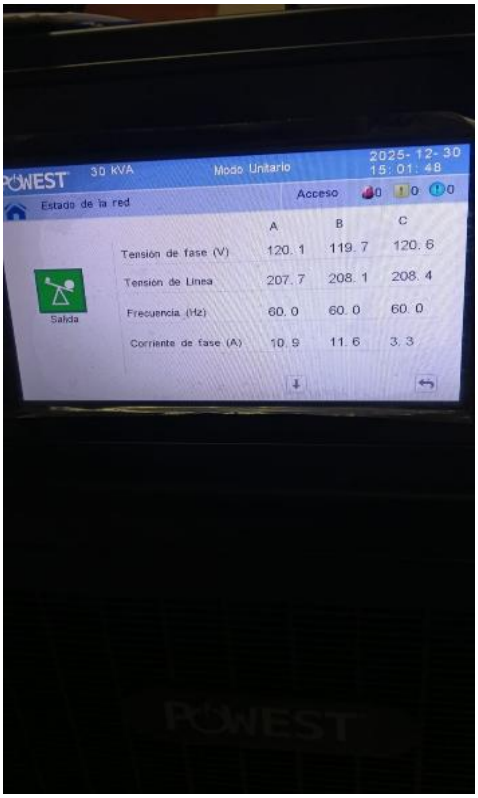

ABSICOL S.A.S

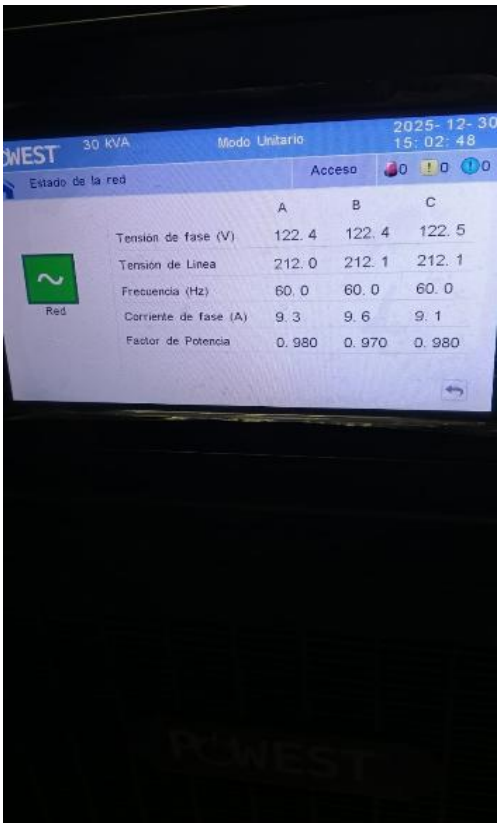



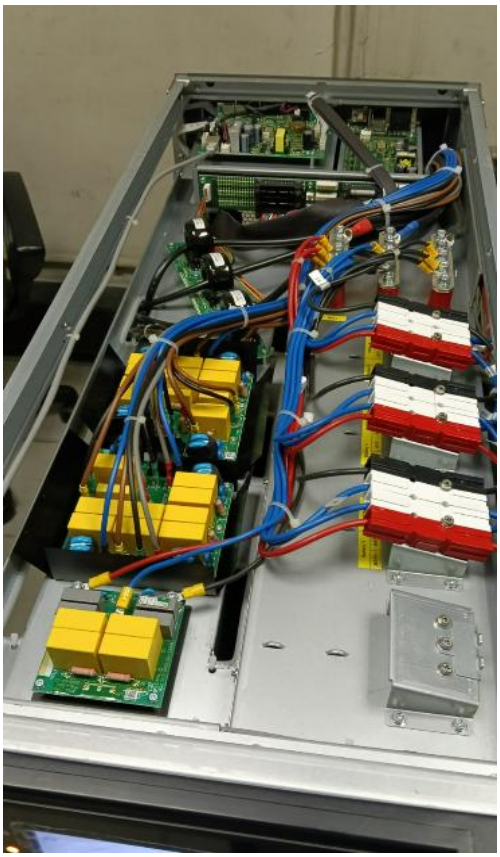



NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO





H- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Edificio Ícaro oficina difra

Marca: Liebert

Capacidad: 15Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento, banco de baterías compuesto por 20 unid 12V-9AH.

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.

ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO










NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

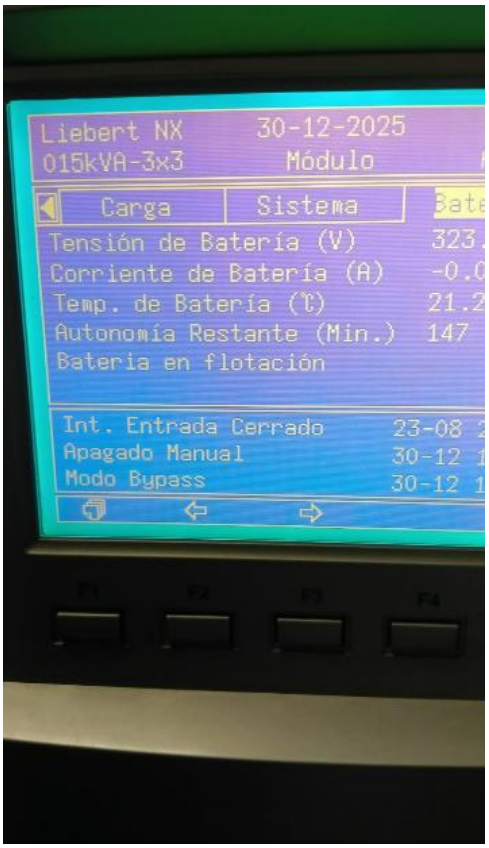








NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO



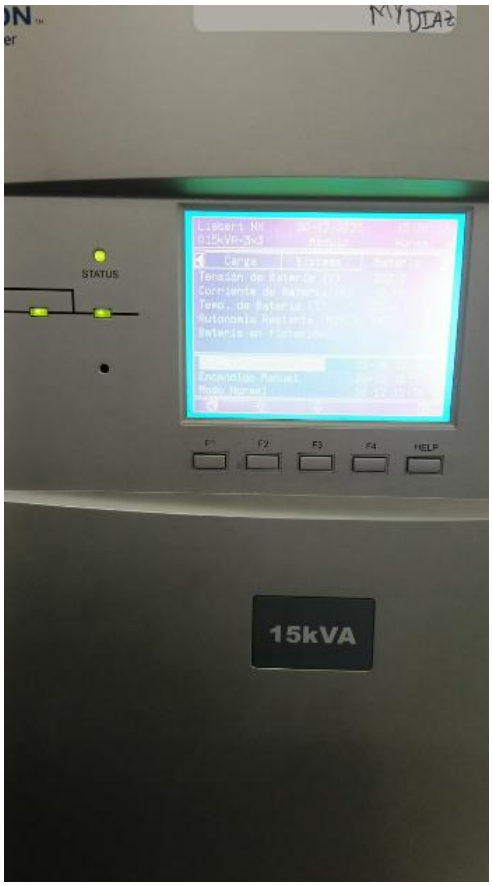

I- Datos del equipo intervenido:

Ubicación: Edificio Ícaro oficina difra sotano

Marca: APC

Capacidad: 20Kva

Estado inicial del equipo: Ups encendida.

Dictamen, observaciones y recomendaciones: La UPS se encuentra en funcionamiento, banco de baterías compuesto por 96 unid 12V-9AH.

- La UPS se deja en funcionamiento con carga sobre inversor, sin anomalías.


ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO








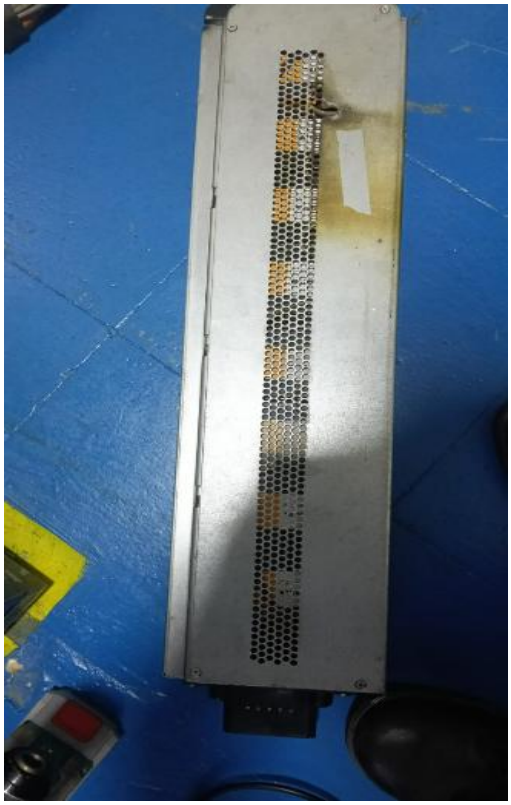

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO



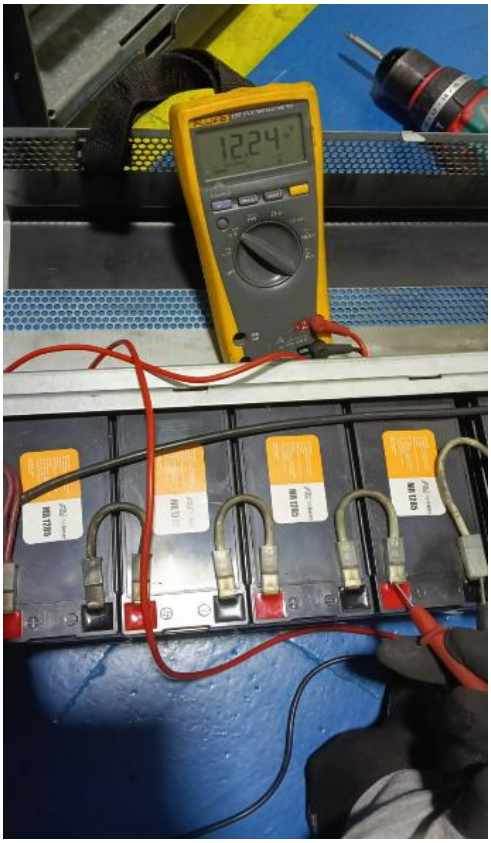





NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

Atentamente,



SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874
