ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Acta reunión comité de seguimiento convenio 001 APC Colombia – Red ADELCO

ACTA DE REUNIÓN No. 4 de 2025

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 20 de octubre de 2025

HORA DE INICIO: 08:30 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 09:30 a.m.

LUGAR: Link de reunión Microsoft Teams

ASISTENTES:

Carolina Mora - Subdirección financiera; **RED ADELCO**

Luis Fernando Vargas – Supervisor de proyecto; **RED ADELCO**

Aldo Nicolas Díaz - Formulador de proyectos; **RED ADELCO**

Christian Jose León Durán - Profesional especializado y supervisor del convenio 001; **APC Colombia**

Daniela Alejandra González Hernández - Pasante; **APC Colombia**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Hacer seguimiento técnico y financiero a los avances del mes de octubre del convenio N.° 001 entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) y la RED ADELCO, revisar los avances en la instalación de los paneles solares en la planta de procesamiento de cacao de la organización Chocoamazonic, definir fechas para presentación de informes, agenda para la segunda visita de supervisión y la reinaguración de la planta, así como establecer compromisos en temas de visibilidad, documentación y participación en próximos espacios de institucionales.

ORDEN DEL DÍA:

1. Avances en la ejecución técnica del convenio
2. Avances en la ejecución financiera del convenio (segundo desembolso)
3. Programación visita en terreno para reinauguración de planta Chocoamazonic
4. Participación de Chocoamazonic en evento del Sistema Nacional de Cooperación en Bogotá
5. Varios

DESARROLLO:

1. **Avances en la ejecución técnica del convenio**

Desde la coordinación técnica del proyecto por parte de la RED ADELCO se presentaron los avances en materia de ejecución del proyecto de energía solar en la planta de procesamiento de cacao de la organización Chocoamazonic. En primera medida han indicado que llevaron a cabo una visita en campo para supervisar la instalación de los paneles solares la cual ya se ha desarrollado, quedando ubicados en en la parte superior de la planta. Asimismo, informaron que ha iniciado el tendido de cableado hacia los inversores para asegurar el flujo de energía.

Como aspecto importante a tener en cuenta, durante la visita ha surgido la necesidad de construir un lugar fuera de la planta que albergue el cuarto técnico para las baterías e inversores de los paneles, por ello, desde la Red ADELCO, realizaron adición presupuestal al contrato suscrito con Solar Energy para que se realizara esta obra, la

cual ya se encuentra en ejecución. Desde la RED ADELCO informaron que la adición presupuestal al contrato en mención, se realiza con los recursos ya establecidos en el marco del convenio, sin necesidad de realizar adiciones al mismo.

2. Avances en la ejecución financiera del convenio (segundo desembolso)

Desde la subdirección financiera de la RED ADELCO se informaron los avances en la ejecución financiera del convenio. Se informó que el segundo desembolso ya fue recibido y en bancos hay un saldo aproximado de 168 millones, con ejecución acumulada cercana a 115 millones. Desde APC Colombia se recordó que todos los avances técnicos y financieros deben estar debidamente documentados y anexados a los informes solicitados por la supervisión toda vez que estos hacen parte del repositorio documental del convenio que se encuentra en la plataforma SECOP II. Se acordó que el informe técnico y financiero con corte al 30 de octubre deberá entregarse en la primera o segunda semana de noviembre, definiendo como fecha límite el 10 de noviembre de 2025. Para el segundo informe se incluirá, además, una descripción de las actividades que constituyen la contrapartida de Red ADELCO, acompañada de registro fotográfico y evidencias.

En cuanto a temas de visibilidad y comunicaciones de la ejecución del proyecto, se acordó producir contenidos audiovisuales (reels y notas) para dar visibilidad al mismo; RED ADELCO preparará una propuesta de piezas y el equipo de Comunicaciones de APC coordinará la publicación y el etiquetado a APC Colombia. Se espera tener versiones finales durante la última semana de octubre.

3. Programación visita en terreno para reinauguración de planta Chocoamazonic

Sobre la reinauguración de la planta de procesamiento de cacao, se planteó realizar el acto protocolario de entrega de los paneles solares en funcionamiento entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025, con el jueves 20 como fecha tentativa para facilitar la posible asistencia de la directora general de APC Colombia al encuentro; en caso de ausencia, la delegación institucional estaría encabezada por la Directora de la Dirección de Coordinación Interinstitucional. El acto incluirá el corte de cinta y la instalación de una placa conmemorativa. Como compromiso, desde la RED ADELCO remitirán invitación formal a la directora general e indicarán los invitados al evento conmemorativo, entre los que posiblemente se encuentren la Embajada de Portugal, representantes del Instituto Camões, la gobernación del Caquetá entre otros. Desde APC Colombia se recordó que, de acuerdo a lo previsto en el convenio, una vez entregado el sistema de energía solar, se debe suscribir un acta de entrega, entre la RED ADELCO y Chocoamazonic, por lo cual se propuso realizar la firma de esta acta en el marco del evento. Todos estos aspectos se establecerán una vez se establezca una fecha definitiva de entrega de los paneles y la agenda del encuentro. Para cerrar este apartado, desde APC Colombia se aclaró que no habrá visitas intermedias adicionales por parte de la entidad por tanto el seguimiento en terreno del avance en la obra para la entrega de los paneles solares es responsabilidad de RED ADELCO a través de sus enlaces en territorio.

4. **Participación de Chocoamazonic en evento del Sistema Nacional de Cooperación en Bogotá**

Finalmente, se confirmó la participación de Chocoamazonic en el evento del Sistema Nacional de Cooperación Internacional el 2 de diciembre en Bogotá, en el cual se espera participen con sus productos en la feria que se realizará. En este sentido, se informó que APC Colombia cubrirá los gastos asociados al traslado, hospedaje y alimentación de las dos personas de la organización que asistirán. Se acordó coordinar los aspectos logísticos para el traslado de estas personas desde el Paujil con el apoyo de la RED ADELCO.

CONCLUSIONES:

La obra de instalación de paneles avanza conforme al cronograma y el cuarto técnico está en proceso de construcción; la adición de recursos se formaliza una vez se reciban las fichas técnicas de los inversores. El informe técnico y financiero con corte al 30 de octubre se entregará a más tardar el 10 de noviembre de 2025. La reinauguración de la planta queda prevista para la semana del 18 al 21 de noviembre, con posible acto central el 20 de noviembre; se consolidará la agenda e invitados por escrito.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No	Compromiso	Responsable	Dirección / Proceso	Entidad	Fecha de cumplimiento
1	Formalizar adición para la construcción del cuarto técnico e instalación de inversores.	**RED ADELCO / Solar energy**		**RED ADELCO**	**30 de octubre de 2025**
2	Entrega de segundo informe financiero y técnico con evidencias	**RED ADELCO /**		**RED ADEDLCO**	**10 de noviembre de 2025**
3	Definir agenda e invitados para evento de reinauguración	**RED ADELCO**			**7 de noviembre de 2025**

	de la planta de Chocoamazonic				

FIRMAS:





_____ _____

Firma

Luis Fernando Vargas

Supervisor

RED ADELCO

Firma


Christian Jose León Durán

Supervisor de convenio 001

APC Colombia

ANEXOS


CM
LA
DH
CD
Aldo Nicolas Diaz Useche
Carolina Mora - Red Adelco
Luis Vargas Red Adelco
Daniela Alejandra Gonzalez Hernandez
Christian Jose Leon Duran

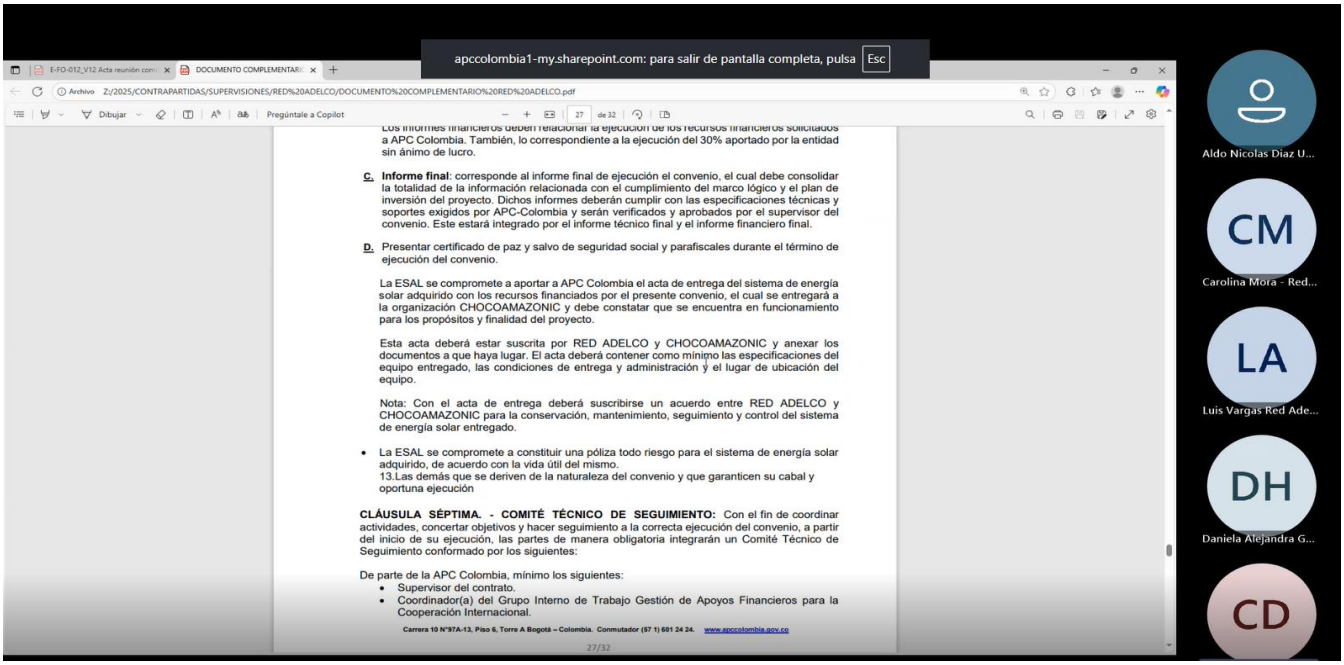

ELABORÓ: Daniela Alejandra González Hernández
