ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Acta reunión comité de seguimiento convenio 001 APC Colombia – Red ADELCO

ACTA DE REUNIÓN No. 3 de 2025

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2025

HORA DE INICIO: 09:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 a.m.

LUGAR: Enlace de conexión Microsoft Teams

ASISTENTES:

- Carolina Mora – Subdirectora financiera; **Red ADELCO**
- Luis Fernando Vargas – Supervisor de proyecto; **Red ADELCO**
- Aldo Nicolas Díaz – Formulador de proyectos; **Red ADELCO**
- Christian Jose León Durán – Profesional especializado APC Colombia, Supervisor Convenio 001; **APC Colombia**
- Laura Patricia Pernia Saade – Contratista**; APC Colombia**
- Daniela Alejandra González Hernández – Pasante; **APC Colombia**

ORDEN DEL DÍA:

1. Avances en la ejecución del convenio
2. Cronograma de cierre del convenio e informes finales
3. Avances en posibles alianzas multiactor

4. Varios

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar avances técnicos y administrativos del convenio suscrito entre APC Colombia y la RED ADELCO, especialmente en lo relacionado con el avance en la obra de instalación de paneles solares en la planta de transformación de cacao de la organización Chocoamazonic y revisar posibles alianzas multiactor que fortalezcan el proceso de comercialización de la organización beneficiaria.

DESARROLLO:

La reunión inició con la presentación de los avances en la instalación de los paneles solares en la planta de transformación de cacao de Chocoamazonic y las adecuaciones en su infraestructura física para esto mismo. Desde la RED ADELCO Se indicó que las actividades se encuentran dentro de los tiempos previstos y que la instalación completa, junto con las pruebas correspondientes, estaría finalizada a finales de noviembre. No obstante, se mencionó que el reforzamiento del techo podría retrasar algunos procesos menores, aunque no compromete la entrega final de la obra. El principal reto identificado corresponde a los trámites administrativos con la electrificadora, necesarios para autorizar la inyección de energía excedente al sistema, lo cual podría darse después de la finalización del convenio.

En relación con la entrega de la obra y la finalización del convenio, se planteó la posibilidad de realizar una visita final y un evento de reinauguración de la planta de

trasformación de cacao en la última semana de noviembre, con la participación de la embajada de Portugal y APC Colombia, siempre y cuando las condiciones de seguridad en el territorio lo permitan.

Posteriormente, se abordó el tema de los informes de seguimiento que desde la RED ADELCO deben presentar según se menciona en el convenio. En este sentido, se acordó que el segundo informe técnico y financiero será presentado entre finales de octubre y la primera semana de noviembre, incluyendo un mayor detalle de actividades y los soportes requeridos. El informe final se entregará tras la culminación del convenio en diciembre.

Sobre el componente de visibilidad y comunicaciones, se destacó la importancia de sistematizar publicaciones y registros fotográficos de las visitas, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y el soporte de la ejecución.

Finalmente, se socializaron los avances en la estrategia de alianzas multiactor que desde APC Colombia se espera impulsar, se reiteró el interés en fortalecer alianzas con el sector privado, mientras que la Red ADELCO expuso los avances logrados con almacenes Éxito, Crepes & Waffles y mercados regionales. También se discutieron las limitaciones actuales en capacidad de almacenamiento y producción, así como la posibilidad de explorar distribuidores internacionales de menor escala.

CONCLUSIONES:

- La obra de instalación de paneles avanza y se estima su culminación para finales de noviembre de 2025.

- El evento de reinauguración de la planta de transformación de cacao de Chocoamazonic tentativamente se realizará en la última semana de noviembre, sujeto a confirmación y condiciones de seguridad.

- El segundo informe técnico y financiero deberá presentarse entre finales de octubre e inicios de noviembre.

- Se requiere fortalecer la estrategia de visibilidad con apoyo de los equipos de comunicaciones de APC y Red ADELCO.

- Se identificó la necesidad de avanzar en nuevas alianzas de comercialización, tanto nacionales como internacionales.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No	Compromiso	Responsable	Dirección / Proceso	Entidad	Fecha de cumplimiento
1	Finalizar instalación de paneles solares y reforzamiento de infraestructura.	Red ADELCO	Coordinación	Red ADELCO	Noviembre 2025
2	Coordinar visita de entrega y posible reinauguración de planta	APC Colombia / Red ADELCO	Coordinación	APC Colombia / Red ADELCO	Última semana noviembre 2025

3	Presentar segundo informe técnico y financiero con soportes.	Red ADELCO	Coordinación	Red ADELCO	Finales Oct – 1ra semana Nov. 2025

FIRMAS:







Firma
Christian Jose León Durán
Supervisor Convenio 001
Profesional especializado
APC Colombia

Firma
Luis Fernando Vargas
Coordinador de Proyecto
Red ADELCO

ANEXOS:


Microsoft Teams
Reunión comité técnico de seguimiento SEPTIEMBRE Convenio 001 de 2025 A...
2025-09-29 14:05 UTC
Recorded by
Christian Jose Leon Duran
Organized by
Christian Jose Leon Duran

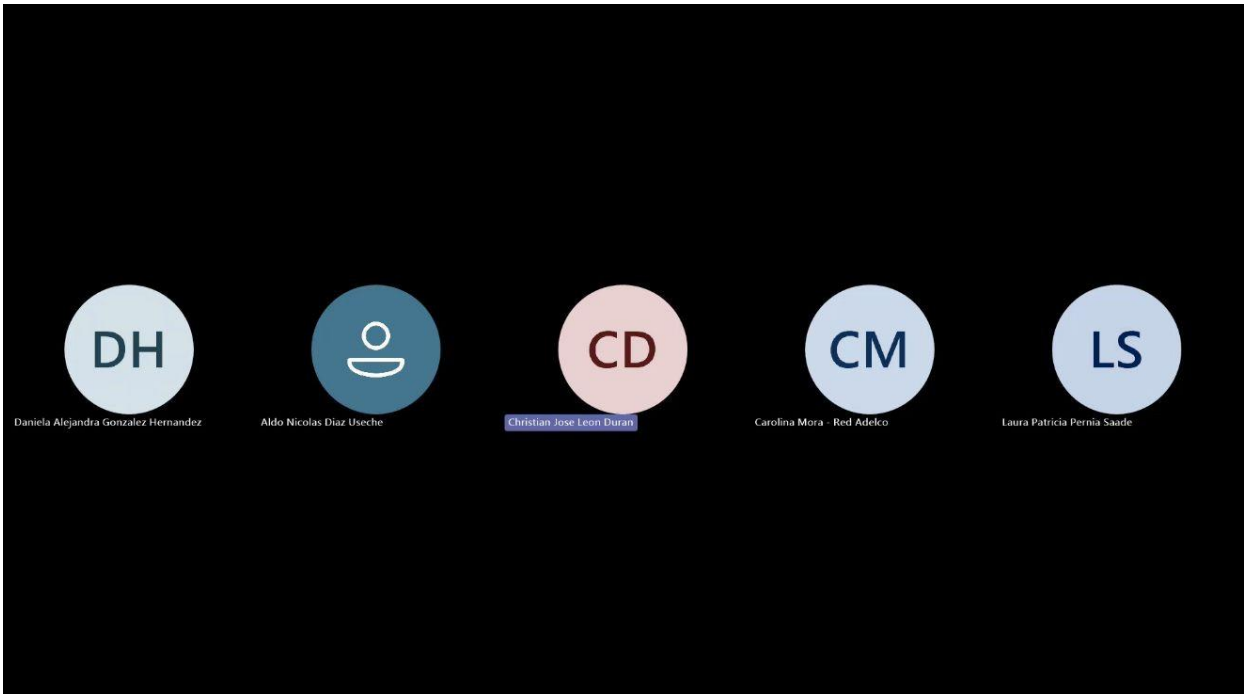
DH
Daniela Alejandra Gonzalez Hernandez
Aldo Nicolas Diaz Useche
CD
Christian Jose Leon Duran
CM
Carolina Mora - Red Adelco
LS
Laura Patricia Pernia Saade

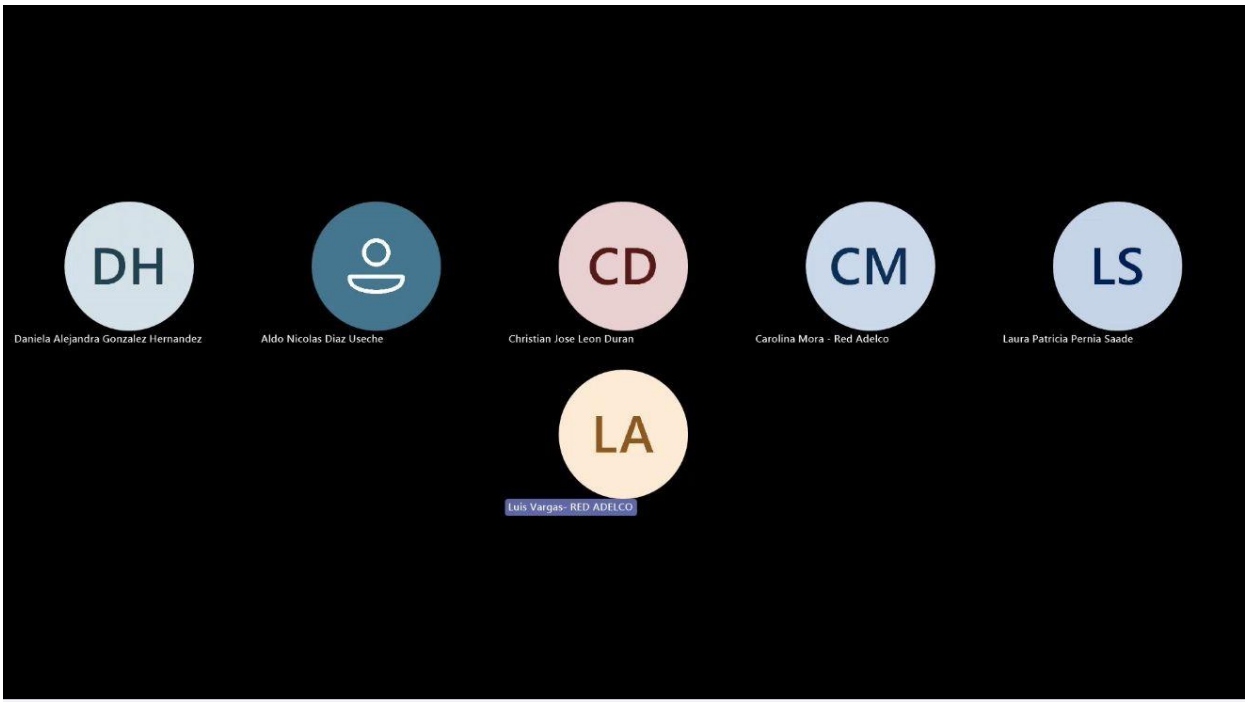

ELABORÓ: Daniela Alejandra Gonzalez Hernández
