PERIODO REPORTE	**DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025**		**CONTRATO**	**363 – 2025 Modificatorio No.1**	
FECHA INICIACIÓN	**27/11/2025**	**FECHA TERMINACIÓN:**	**20/12/2025**	**Informe No.**	**01**
CONTRATISTA:	**FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S**		**SUPERVISOR:**	**LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA DOTAR DE MOBILIARIO Y GENERAR ESPACIOS ÓPTIMOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2025**				

I. REPORTE DEL CONTRATISTA					**II. REPORTE DEL SUPERVISOR**			
ITEM	**OBLIGACIÓN ESPECIFICAS CONTRACTUALES**	**CANTIDAD (SI APLICA)**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**EVIDENCIA**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
					T	**P**	**N**	
2	**PUESTO OPERATIVO RECTO**	8	Dimensiones 1,20 m x 0,60 m x 0,73 m. Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1. Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas	VER ANEXO	**X**			Cumplió Satisfactoriamente

			con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.					
3	**PUESTO OPERATIVO RECTO**	5	Dimensiones 1,50 m x 0,60 m x 0,73 m. Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1. Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	VER ANEXO	**X**			Cumplió Satisfactoriamente
4	**PUESTO OPERATIVO EN L**	7	Dimensiones 1,50 m x 150 CM X 0,60 m x 0,73 m DE ALTURA Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 150 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1. Superficies de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo)	VER ANEXO	**X**			Cumplió Satisfactoriamente

			Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro, incluye faldero en 15 mm y viga horizontal de refuerzo.					
5	**MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3**		Características: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con película intermedia, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes. Dimensiones: 0.50mts de ancho x 0.45 mts de alto.	VER ANEXO	**X**			Cumplió Satisfactoriamente
7	**MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3**		Características: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con película intermedia, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes. Dimensiones: 1.40mts de ancho x 0.45 mts de alto.	VER ANEXO	**X**			Cumplió Satisfactoriamente
T: Cumple totalmente las actividades pactadas - P: Cumple parcialmente las actividades pactadas - N: No cumplió las actividades pactadas								

III. REPORTE DEL CONTRATISTA		
CUMPLIMIENTO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y RIESGO LABORALES	De conformidad con la norma vigente adjunto el reporte de pago de salud, pensión y ARL de conformidad correspondiente a los últimos seis (6) meses del año 2025	**No PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL** Certificación de parafiscales
PAGO APORTES SALUD	Salud:	
PAGO APORTES PENSIÓN	Pensión:	

PAGO APORTES ARL	Riesgos Laborales:

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades y obligaciones efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES:

I. REPORTE Y SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE	
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA	**VALOR**
Valor del contrato	$ 39.300.000,00
Valor adicional contratado	$ 0.00
Anticipo	$ 0.00
Amortización del anticipo	$ 0.00
Sumatorias actas parciales	$ 0,00
Valor a pagar presente acta final	$ 39.281.900,00
Saldo a favor del municipio	$ 18.100,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN	**SON: TREINTA NUEVE MILLONES DOSCINETOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. $ 39.281.900,00**

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	**FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S RL. JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL C.C.No. 6.770.634 de TUNJA (BOYACÁ)**	**NOMBRE:**	**LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**
		CARGO:	**SECRETARIO GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
CONTRATISTA		SUPERVISOR	

ANEXOS.

A continuación, se anexan las evidencias de cada uno de Las actividades realizadas en cumplimento de las obligaciones establecidas dentro del CPS: No.363 -2025

ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

INFORME DEL CONTRATISTA

CONTRATO No. 363 DE 2025

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA DOTAR DE MOBILIARIO Y GENERAR ESPACIOS ÓPTIMOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2025"

ALCALDÍA DE Villa de Leyva

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

www.megaproyectos.com.co
318 4159877 - Info@megaproyectos.com.co Av. Norte No. 50- Tunja - Boyacá - Colombia

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

1. INTRODUCCIÓN.

Teniendo en cuenta las actividades contratadas para el **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA DOTAR DE MOBILIARIO Y GENERAR ESPACIOS ÓPTIMOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2025"**, a continuación, se presenta informe de las actividades ejecutadas con el fin de poner en su conocimiento las mismas y llevar acabo la entrega a satisfacción.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

2.1. OBJETO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA DOTAR DE MOBILIARIO Y GENERAR ESPACIOS ÓPTIMOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2025"

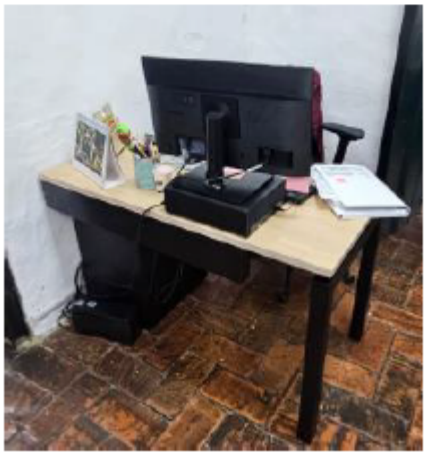
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 20 de diciembre de 2025

2.3. PERIODO DE EJECUCIÓN: del 27 de noviembre al 18 de diciembre

2.4. VALOR TOTAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.300.000,00).

2.5. VALOR EJECUTADO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS. ($39.281.900,00).

3. CANTIDADES E ITEMS EJECUTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN
2	**PUESTO OPERATIVO RECTO** Dimensiones 1,20 m x 0,60 m x 0,73 m. Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1. Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática	8	

	color gris, blanco o negro.		
3	**PUESTO OPERATIVO RECTO** Dimensiones 1,50 m x 0,60 m x 0,73 m. Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1. Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	5	
4	**PUESTO OPERATIVO EN L** Dimensiones 1,50 m x 150 CM X 0,60 m x 0,73 m DE ALTURA Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 150 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1. Superficies de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro, incluye faldero en 15 mm y viga horizontal de refuerzo.	7	 

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

5	**MAMPARA DIVISIORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3** Características: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con película intermedia, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes. Dimensiones: 0.50mts de ancho x 0.45 mts de alto.	6	
7	**MAMPARA DIVISIORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3** Características: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con película intermedia, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes. Dimensiones: 1.40mts de ancho x 0.45 mts de alto.	2	 

Cordialmente.

JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREL
REP. LEGAL DE FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
