TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GF-FO-142
NOMBRE:	GESTIÓN FINANCIERA / CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGOS	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	ÁREAS INTERNAS DE TODOS LOS PROCESOS	Página 1 de 3

CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Seleccione con x según corresponda:

Contrato: ____ Aceptación de oferta: ____ Orden de compra: ____ Convenio: __X__

La suscrita **JULIETTE CAROLINA CRUZ MOLINA,** Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo, en su condición de supervisora del Convenio Interadministrativo No. 005 del 25 de julio de 2025, suscrito con el municipio de **PUERTO LEGUÍZAMO** identificado con NIT: 891200513, cuyo objeto es; "*Aunar esfuerzos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Municipio de Puerto Leguizamo, para el mejoramiento de la placa deportiva en el barrio Martha Lucia Lotero*" certifica que el municipio de Puerto Leguízamo, ha cumplido con las obligaciones del convenio, presentando los productos requeridos para el primer desembolso, establecidos en la cláusula quinta del convenio, los cuales fueron aprobados en el Comité Técnico No. 7 realizado el 18 de diciembre de 2025.

- Mensualidad: Segundo desembolso equivalente al 50% del total.

VIGENCIA ACTUAL Y/O RESERVA: (Diligencie este cuadro solo para los contratos suscritos en la vigencia actual y/o que tengan saldos en reserva).

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / ACEPTACIÓN DE OFERTA			
A **VALOR TOTAL VALOR + ADICIÓN (Si aplica)**	**B** **SALDO ACTUAL**	**C** **VALOR A PAGAR**	**D** **NUEVO SALDO DEL CONTRATO (B-C)**
$295.871.869,00	$147.935.934,50	$147.935.934,50	$0,00

Por lo anterior, solicito se realice el segundo desembolso de la vigencia 2025 correspondiente a la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($147.935.934,50)**, conformidad con la FORMA DE PAGO, establecida en el convenio citado.

En caso de que se requiera liberar saldos, relaciónelo aquí:
Valor para liberar (si aplica) $_____

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GF-FO-142
NOMBRE:	GESTIÓN FINANCIERA / CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGOS	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	ÁREAS INTERNAS DE TODOS LOS PROCESOS	Página 2 de 3

Nota: Certifico que los servicios fueron prestados en el Municipio y/o Ciudad de: **Puerto Leguízamo del Departamento de Putumayo**

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

JULIETTE CAROLINA CRUZ MOLINA
Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo
Supervisora

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad dejar evidencia delos documentos recibidos para el pago el primer pago. El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87036ad7bf8e90bc2590ca64b95a453eb7d27ce0e1943b460981c72ac32d5c1fc53d5669a33a4b6793c230f13698f7da

Número de Factura: FEV-21
Fecha de Emisión: 19/12/2025
Fecha de Vencimiento: 19/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
Nit del Emisor: 891200513
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Leguízamo
Dirección: CL 6 2 125 BRR EL CENTRO
Teléfono / Móvil: 3203038751
Correo: alcaldia@puertoleguizamo-putumayo.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860511071
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	2 PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 005-2025	94	1,00	$ 147.935.934,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 147.935.934,50

Notas Finales

#$11-02-00;CONVENIO005-2025;juliette.cruz@cancilleria.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2025 11:04:08
Documento validado por la DIAN:
19/12/2025 11:04:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	147935934.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	147935934.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	147935934.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 147935934.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	147.935.934,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	147.935.934,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	147.935.934,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	**COP** $147.935.934,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083298250 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-13

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO ALCALDE LUIS EMILIO BUSTOS MORALES CC 97.447.800 Y CONTADOR PÚBLICO BRYAN ANDRES VALENCIA ROA CC 1.117.530.134 TP 270703-T

CERTIFICA QUE

El **MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO**, identificado con Nit No. 891.200.513-8, ha cumplido con los pagos de los aportes parafiscales y seguridad social, correspondientes a la nómina de los últimos seis meses; Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2025, de todos sus empleados vinculados. Se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

LUIS EMILIO BUSTOS MORALES
CC 97.447.800
ALCALDE MUNICIPIO LEGUIZAMO

Bryan Andrés Valencia Roa
CONTADOR PÚBLICO
ESP. GERENCIA TRIBUTARIA
TP 270703-T

BRYAN ANDRES VALENCIA ROA
CC 1.117.530.134 Florencia
CONTADOR PUBLICO
TP 270703-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 6 0 D 5 8 E 3 E 5 4 4 4 B 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BRYAN ANDRES VALENCIA ROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117530134 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 270703-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

270703-T



BRYAN ANDRES
VALENCIA ROA
C.C. 1117530134
RES. INSCRIPCION 818 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

291346 304698

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceimos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

ACTA No. 7					
CONVENIO	Convenio Interadministrativo No. 005 del 2025.	**MODALIDAD**			
FECHA	18 de diciembre de 2025	**PRESENCIAL**		**VIRTUAL**	X
OBJETO	Validar los requisitos para el segundo desembolso del convenio y revisar el estado actual de la obra.				

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de cuórum.
2. Prórroga del convenio.
3. Validar los requisitos para el segundo desembolso.
4. Varios.

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD / CARGO	MIEMBRO o INVITADO
Juliette Carolina Cruz Molina	Ministerio de Relaciones Exteriores - Supervisora y Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo	Miembro
Francy Rivera Burbano	Ministerio de Relaciones Exteriores – Asesora y Apoyo a la Supervisión del GIT de Desarrollo Fronterizo.	Miembro
John Jairo Lizcano	Alcaldía de Puerto Leguizamo - Secretario de Obras e Infraestructura.	Miembro
Simón Pantoja	Alcaldía de Puerto Leguizamo - Profesional de la Secretaria de Gobierno.	Invitado
Diego Cedeño	Ministerio de Relaciones Exteriores – Ingeniero Civil del GIT de Desarrollo Fronterizo.	Invitado
Eivi Mnauel Pipicano	Alcaldía de Puerto Leguizamo - Interventoría	Invitado

Diego Rodríguez	Ministerio de Relaciones Exteriores – Enlace para Nariño y Putumayo del GIT de Desarrollo Fronterizo.	Invitado

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

TEMAS	RESULTADOS
1. Verificación de cuórum.	Se confirmó que como miembros del comité técnico se encuentran, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Juliette Carolina Cruz Molina Supervisora y Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo, por parte de la alcaldía de Puerto Leguízamo el delegado, John Jairo Lizcano Secretario de Obras e Infraestructura. Como invitados participaron; Francy Rivera Burbano y Diego Andrés Cedeño del GIT de Desarrollo Fronterizo, y por parte del municipio Simón Pantoja profesional de la secretaria de Gobierno. Así mismo por parte de la firma de interventoría participó el señor
2. Prórroga del convenio.	Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) explicó que el comité fue convocado con el fin de validar los avances de la obra y realizar la aprobación del segundo desembolso, dio la palabra al supervisor por parte del municipio para informar el estado actual de la obra, teniendo en cuenta que los requisitos incluyen la entrega del informe de interventoría donde se indique el alcance del 60% de la obra. John Jairo Lizcano (Alcaldía de Puerto Leguizamo) explicó que la ejecución del proyecto comenzó con el objetivo de finalizar entre el 23 y 24 de diciembre. Señaló que no se pudo avanzar en la adquisición del material correspondiente a la estructura metálica para la cubierta, dado que algunos elementos no estaban disponibles en ferreterías y debieron ser fabricados. Indicó que el avance actual del proyecto es del 60,42%, según lo verificado por la supervisión y la interventoría, aunque se han presentado retrasos por la sequía en el Putumayo, lo que dificultó el transporte del material desde Puerto Asís a Puerto Leguízamo. Añadió que parte del material aún se encuentra en embarcación y se espera su llegada el 20 o 21 de diciembre.

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

	Precisó que, el contratista decidió transportar los materiales por el río Putumayo, evitando mayores retrasos ocasionados por un paro en la zona del Caquetá. Recalcó que el contratista ha asumido el costo para la terminación del contrato, sin recibir pagos parciales, y que existe evidencia fotográfica del armado de las cerchas para la estructura metálica. Indicó que, una vez llegue el material, se realizará un comité el 22 de diciembre con el fin de realizar las actuaciones a que haya lugar; suspensión de obra, actualizar pólizas, esperando la entrega total de la obra entre el 10 y el 15 de enero. Señaló que los concretos, zapatas, pedestales y bancas están ejecutados al 100%, y que se ha avanzado en la instalación de platinas y tornillería, quedando pendiente la colocación de columnas metálicas en los 14 puntos del diseño. Finalmente, reiteró que no se ha girado dinero al contratista y que este se comprometió a entregar la obra completa con recursos propios. Concluyó que, una vez terminada la obra, se procederá a la liquidación del convenio y quedó atento a resolver inquietudes. Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) preguntó si en este momento se está ejecutando la obra. Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) aclaró que, la obra continúa ejecutándose con el material disponible, específicamente en el armado de las cerchas. Agregó que se está trabajando en la estructura de la cubierta y que únicamente se está a la espera de dos materiales: las columnas y las correas donde se soportará la teja. Indicó que estos elementos son los únicos pendientes. El señor Eivi Manuel Pipicano, representante por parte de la interventoria de obra, interviene y confirma; el avance de la obra actualmente es del 60.4%, parte de los materiales se encuentran en obra y una parte viene vía fluvial, actualmente se continúa laborando en la obra como pudo ser constatado por Diego Cedeño, Profesional asignado por Cancillería para realizar la visita.

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

	Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) pregunto si esos materiales son los que se espera recibir entre el 20 y 21 de diciembre. Propuso que, dado que la obra sigue en ejecución y hay personal trabajando, no se proceda a suspender el contrato. Sugirió continuar con las actividades hasta el domingo y que el lunes se informe si el material llegó. En caso de que no haya llegado, se evaluaría la suspensión en ese momento. Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) aceptó la propuesta y acordó dejar la decisión abierta: si el material llega, se continuará con la ejecución y no se suspenderá el contrato. Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) señaló que, además de la suspensión, debe considerarse la prórroga, dado que existen retrasos en el cronograma. Consultó si sería posible cumplir con la entrega antes del 31 de diciembre. Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) respondió que la idea es terminar entre el 10 y el 15 de enero, por lo que se requerirá una ampliación del contrato. Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) preguntó por la fecha estimada para la prórroga, a lo que Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) indicó que podría ser desde el 29 de diciembre hasta el 15 de enero. Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) propuso que la suspensión quede supeditada a la entrega del material entre 20 y 21 de diciembre, dependiendo del informe que se reciba. Añadió que, independientemente de la suspensión, se debe proceder con la prórroga. Sugirió fijar la prórroga hasta el 31 de enero para evitar inconvenientes por falta de tiempo. Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) indicó que, en caso de confirmarse la necesidad de suspensión el lunes, la Alcaldía deberá enviar un oficio justificando la situación, debidamente soportado, para proceder con la suspensión por el tiempo que se demore la llegada de los materiales. Señaló que se trata de una posible suspensión.

Elaboró	Giovanna Vásquez


FV: XX/XX/XXXX

	Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) informó que, por parte del municipio, se enviará por escrito la solicitud de prórroga del convenio hasta el 31 de enero de 2026, firmada por el señor alcalde. agregó que la solicitud ya está lista y será enviada por correo electrónico. Juliette Carolina Cruz Molina (Cancillería) preguntó si se había realizado alguna suspensión en la plataforma. Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) respondió que no, aclarando que el contrato sigue en ejecución. Indicó que se consolidará la decisión después del domingo y que, además, se hará la ampliación del contrato para permitir su terminación entre el 10 y el 15 de enero, dejando tiempo para la liquidación del convenio, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de enero de 2026. Se aprueba prorroga del convenio Interadministrativo No. 005 de 2025 teniendo las condiciones puestas en conocimiento del presente comité técnico.
3. Validar los requisitos para el segundo desembolso.	Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería), procedió con la validación de los requisitos para el segundo desembolso, señaló que, era necesario validar el informe donde se plasmara la información suministrada por el ingeniero, así como la certificación requerida para aprobar el segundo desembolso. Indicó que daría paso a la interventoría para la proyección del informe. Representante de la Interventoría Elvi Pipicano, manifestó que el avance actual de la obra es del 60,4%, confirmando lo informado por el supervisor de la Alcaldía. Explicó que parte de los materiales se encuentra en obra y otra parte en Puerto Asís, a la espera del aumento del nivel del río para su transporte. Aseguró que las labores continúan y que el delegado presente puede dar fe de ello. Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) solicitó proyectar el informe para validarlo en el comité, dado que es requisito para aprobar el segundo desembolso junto con la prórroga. Indicó que se requiere la revisión y aprobación del informe de interventoría, previa presentación del contratista.

Eivi (Interventoría), explicó los datos soportes del proyecto y del contrato, mientras que en la segunda parte se refleja información del contrato de obra. Señaló que existe un error en las fechas de inicio y terminación, el cual será corregido, y que la suspensión registrada también debe ser ajustada porque el contrato no ha sido suspendido. Destacó que la ejecución es equivalente al 60,42% de avance.

Agregó que en la siguiente sección se describen las actividades ejecutadas, incluyendo la estructura en concreto para la cubierta, graderías y pedestales, las cuales están terminadas al 100%. Informó que ya llegó la teja arquitectónica y los perfiles para la cubierta, mientras que otros materiales permanecen en Puerto Asís, esperando el aumento del nivel del río para su transporte.

Posteriormente, explicó el balance presupuestal, detallando las actividades contratadas, unidades, cantidades, precios unitarios y totales, así como las cantidades ejecutadas y el porcentaje de avance por actividad.

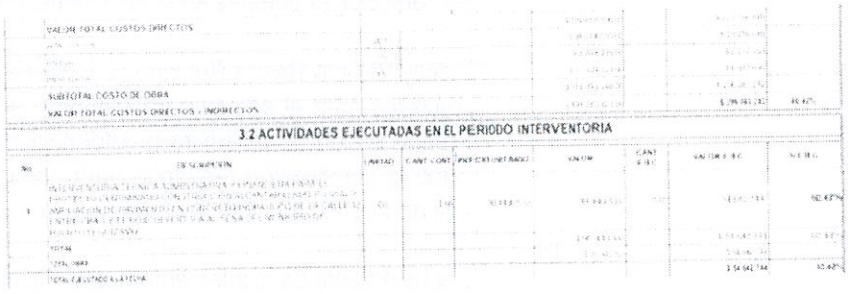

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO INTERVENTORIA

Indicó que la mayoría de los ítems relacionados con concretos y aceros están al 100%. Reiteró que el valor ejecutado es de $296.083.242, equivalente al 60,42% de la obra.

Finalmente, señaló que el informe incluye información legal sobre pólizas y actas, aclarando que debe eliminarse la referencia al acta de suspensión. Confirmó que no se han realizado adicionales en valor ni en plazo, ni en el contrato de obra ni en el de interventoría, y que no se ha efectuado ningún pago al contratista.

Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) indicó que estaba validando el informe y señaló la necesidad de incluir una nota sobre la sugerencia de

	suspensión, así como la referencia a la prórroga, que no aparecía en el documento. Explicó que, dado que el informe corresponde a la fecha actual, debe reflejar la situación planteada sobre la posible suspensión del contrato y la solicitud de prórroga. Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) respondió que el tema de la prórroga se está definiendo en el comité y que, en caso de que los materiales no lleguen la próxima semana, se procederá con la prórroga. Confirmó que la solicitud de prórroga ya está incluida en el documento que revisan. Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) aclaró que la suspensión y la prórroga son procesos distintos y que, en caso de aprobarse la prórroga, se debe elaborar un informe adicional que contemple la suspensión. Reiteró que la prórroga corresponde al convenio y que la solicitud está siendo presentada por la Alcaldía. Explicó que la solicitud de prórroga presentada por la Alcaldía debe basarse en el informe emitido por la interventoría, ya que esta es la encargada de certificar las condiciones actuales del proyecto. Indicó que la interventoría debe remitir un informe a la Alcaldía señalando que la obra no alcanzará los tiempos previstos, lo cual permitirá validar y autorizar la solicitud de prórroga. Agregó que se debe contemplar la prórroga del contrato de obra, considerando que no se cumplirán los plazos establecidos, y adicionalmente dejar constancia sobre la posible suspensión del contrato, supeditada a la verificación de la entrega de materiales. Señaló que la interventoría es la responsable de garantizar y certificar esta información, por lo que es urgente que se realice el proceso para evitar inconvenientes. Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) añadió que también debe incluirse el registro fotográfico que evidencie el avance en obra, como soporte adicional en el informe. Diego Andrés Cedeño (Cancillería) informó que, según la visita realizada en la mañana al proyecto, se evidenció que la obra civil correspondiente a las graderías y pedestales está completamente terminada, como se aprecia en las fotografías.

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

	Indicó que el material para las cerchas ya se encuentra en la obra y está siendo sometido a procesos de soldadura y armado por el personal especializado en metalurgia. Señaló que el material faltante corresponde a las columnas y correas, que son el soporte final de la cubierta, la cual también está en el sitio de la obra. Agregó que se solicitó incluir en el informe soportes adicionales, como imágenes fotográficas, actas de recibo y especificaciones técnicas de los elementos presentes en obra. Recomendó anexar un compendio sólido que justifique la solicitud de prórroga, argumentando los retrasos ocasionados por la disminución del nivel del río, situación que pudo constatar durante los últimos dos días. Indicó que el informe está siendo ajustado y será remitido nuevamente con los soportes requeridos para sustentar la prórroga. Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) solicitó al municipio que, se corrijan todas las observaciones indicadas y se remitan los informes ajustados el 18 de diciembre, tanto de obra como de interventoría. Explicó que esto es fundamental para cumplir con la cláusula relacionada con la aprobación del segundo desembolso, el cual corresponde a la suma de $147.935.934,50, previa presentación del informe de interventoría que acredite y apruebe el informe del contratista, evidenciando un avance físico del 60%, junto con el informe financiero sobre la ejecución de los recursos transferidos en el primer desembolso. Indicó que, según lo informado por el Secretario de Obras del Puerto Leguizamo, no se ha realizado ningún pago al contratista, por lo que es necesario que el municipio allegue un informe financiero que confirme que los recursos permanecen en la cuenta destinada para el manejo del convenio. Señaló que, bajo estas condiciones y correcciones, se aprobaría el segundo desembolso. Respecto a la prórroga, manifestó que, una vez se incluyan las correcciones y la información adicional por parte de la interventoría, junto con el oficio que remitirá la Alcaldía y los soportes que acrediten las demoras, se validará y

	aprobará la solicitud de prórroga, la cual deberá ser elevada a trámite contractual y registrada en el aplicativo correspondiente. Simón Pantoja (Alcaldía de Puerto Leguizamo) consultó si la solicitud de prórroga debía remitirse el mismo día o el 22 de diciembre. Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) respondió que debía enviarse el 18 de diciembre, aclarando que lo único pendiente para el 22 sería la definición de la suspensión de la obra, la cual se revisará en un comité extraordinario. Explicó que la prórroga queda aprobada en este comité, pero depende de otras instancias técnicas para completar los soportes requeridos, señalando que son procesos diferentes que deben gestionarse por separado. preguntó si había algún comentario adicional por parte del municipio. Francy Viviana Rivera Rubiano (Cancillería) dio por terminado el comité, indicando que todos quedaban atentos a los pendientes y que el lunes se comunicarán para definir la suspensión y realizar el comité extraordinario para su aprobación.
4. Varios.	Francy indica, se encuentra pendiente establecer fecha de entrega del proyecto, situación que dependerá de los avances y entrega de la obra.

CONCLUSIONES

1. Avance físico de la obra: Se verificó que el proyecto presenta un avance del 60,42%, conforme al informe de interventoría y la inspección realizada en campo. Las actividades de obra civil, como graderías y pedestales, están terminadas al 100%, y se continúa con el armado de cerchas. El material faltante corresponde a columnas y correas, cuya llegada se espera entre el sábado y domingo.
2. Segundo desembolso: Se aprobó el segundo desembolso siempre y cuando el municipio remita el informe de interventoría ajustado, incluyendo soportes fotográficos, actas y especificaciones técnicas, así como el informe financiero que certifique que no se han realizado pagos al contratista y que los recursos permanecen en la cuenta del convenio. Cumplidos estos requisitos.
3. Solicitud de prórroga: Se aprobó la solicitud de prórroga del convenio hasta el 31 de enero de 2026, la cual será formalizada por la Alcaldía mediante oficio firmado por el alcalde y soportada con el informe técnico que justifique las demoras ocasionadas por la disminución del nivel del río.

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

4. Suspensión del contrato: Se definió que la suspensión queda supeditada a la llegada del material pendiente. Si el lunes se confirma que no llegó, se convocará un comité extraordinario para aprobar la suspensión por el tiempo necesario.
5. Cumplimiento contractual: Se reiteró la obligación de seguir el procedimiento establecido en las cláusulas del convenio, notificando previamente cualquier suspensión y garantizando la legalidad de las modificaciones contractuales.

COMPROMISOS

No.	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
1	Remitir el informe ajustado.	18 de diciembre de 2025	Alcaldía de Puerto Leguizamo.
2	Enviar el oficio de solicitud de prórroga firmado por el alcalde y soportado con el informe técnico.	22 de diciembre de 2025	Alcaldía de Puerto Leguizamo.

ANEXOS

Ninguno.

Firma miembro Comité Técnico
Nombre: John Jairo Lizcano
Entidad: Alcaldía de Puerto Leguizamo

Firma miembro Comité Técnico
Nombre: Juliette Carolina Cruz Molina
Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores

Firma del invitado
Nombre: Simón Pantoja
Entidad: Alcaldía de Puerto Leguizamo

Firma miembro Comité Técnico
Nombre: Francy Rivera Burbano
Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

Firma del invitado
Nombre: Elvi Manuel Pipicano
Entidad: Represéntate de Interventoría -

Firma del invitado
Nombre: Diego Cedeño
Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó.

El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico: contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia, dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Más información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co

CERTIFICACION AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DEL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO, PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO

Teniendo en cuenta la visita realizada el 19 de diciembre a la obra del proyecto de la Construcción de la cubierta de la Cancha del Barrio Martha Lucia Lotero, en Puerto Leguizamo, se logro evidenciar mediante el recorrido dentro de la obra, un avance físico en actividades del 60,42%, soportado mediante el informe de la visita con el registro fotográfico y las actividades ejecutadas en su totalidad desarrolladas de la siguiente manera:

Replanteo, excavación para zapatas, excavación para graderías, armado de acero para zapatas, armado de acero de refuerzo para graderías, fundida de zapatas, pedestales y graderías en concreto, armado y soldadura de estructura metálica para cerchas de cubierta.

Adicional a esto se evidenció que la cubierta ya se encuentra en sitio. Por otra parte, las actividades pendientes son corresponden a la instalación de columnas para estructura de la cubierta sobre la cancha, instalación de cerchas, correas y cubierta, con lo cual se dará por terminada la obra objeto del proyecto.

De acuerdo con lo anterior se procede a certificar que el avance reportado en el último informe es consecuente con las actividades ejecutadas según lo evidenciado en la ultima vista mencionada.

Diego A. Cedeño H.

Diego Andrés Cedeño Hurtado

Contratista GIT Desarrollo Fronterizo

Ingeniero civil

Especialista en estructuras y en Gerencia de Proyectos

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141183699323

(415)7707212489984(8020) 000014118369932 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 5 1 3	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Leguízamo 5 7 3

41. Dirección principal
CL 6 2 125 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico alcaldia@puertoleguizamo-putumayo.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 1 3 6 3 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 5 8 0 2 1 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	9	1 4	5 2																						

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BUSTOS MORALES LUIS EMILIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 29-07-2025 04:47:52PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183699323

(415)7707212489984(8020) 000014118369932 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 5 1 3	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	3 0
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	0 1
72. Número	1 3 2	0 0 1
73. Fecha	1 9 5 8 0 2 1 3	2 0 0 8 0 1 0 1
74. Número de notaría		0 1
75. Entidad de registro	0 7	2 0 0 8 0 1 0 1
76. Fecha de registro	1 9 5 8 0 2 1 3	8 6
77. No. Matrícula mercantil		5 7 3
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	1 9 5 8 0 2 1 3	2 0 0 8 0 1 0 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría Municipal 1 6

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141183699323

(415)7707212489984(8020) 000014118369932 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 5 1 3	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 7 4 4 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUSTOS	MORALES	LUIS	EMILIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 9 1 2 0 0 5 1 3	8	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141183699323

(415)7707212489984(8020) 000014118369932 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 5 1 3		Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 7 5 3 0 1 3 4	8	2 7 0 7 0 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VALENCIA	ROA	BRYAN	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 5 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE OBRA 1

DICIEMBRE 2025

"ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".

CONTRATO DE OBRA No. PS-LP-006-2025
DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA
ARCOING SAS.

PUERTO LEGUIZAMO
DICIEMBRE 17 DE 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471 Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES	3
2.	FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	4
3.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
3.1	Localización	10
3.2	Características Del Proyecto	12
3.3	Componentes Básicos Del Proyecto	13
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	14
4.1	Control pólizas	14
5.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	15
5.1	Avance Físico	17
5.2	Programación y seguimiento de Obra	17
5.3	Modificación al Contrato de Obra	17
6.	ASPECTOS TECNICOS CONTRATO DE OBRA	18
7.	Recomendaciones	
8.	observaciones	

1. INTRODUCCIÓN

La ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO, contrato a ARCOING SAS, Mediante contrato de obra Nº PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO". La obra civil se encuentra en ejecución, según el contrato debidamente legalizado por las partes.

Por lo tanto, se presenta en este informe los aspectos necesarios para comprender el desarrollo del contrato correspondiente al informe de avance de obra No 1.

Dicho informe contiene la situación inicial encontrada en los sectores trabajados hasta la fecha en mención. Igualmente, se presentan los aspectos contractuales del proyecto, el alcance e impacto del mismo, así como información relacionada con las actividades desarrolladas por el contratista con sus respectivos registros fotográficos de la obra por sectores y anexos del personal vinculado a la misma. Donde podemos describir las actividades realizadas de acuerdo a los ítems ejecutados en las veredas de la cocha cristalina y cocha afuera.

2. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NO	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO NIT: 891988015-8
SUPERVISOR	JHON JAIRO LIZCANO
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA	ARCOING SA
REORESENTANTE LEGAL	FREYDER JHONATTAN AGUILAR RODRIGUEZ
NIT	900988015-1
No DE CEDULA CONTRATISTA	1.036.931.315 DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE TRES PESOS ($ 490.070.823) M/CTE
PLAZO EJECUCION	CUARENTA Y TRES DÍAS (43).
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INFORME	17 DE DICIEMBRE DE 2025

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objetivo	Expandir la integridad deportiva en las habitantes del municipio de puerto Leguizamo e integración de su comunidad para eventos deportivos y sociales con la construcción de una cubierta
Ubicación	Esta iniciativa se encuentra localizado en el barrio Martha lucia lotero en el municipio de Puerto Leguizamo en el departamento del Putumayo
Beneficiarios Directos	Se beneficiarán a un total de (1500) personas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
2			
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	598,00
2,2	DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL E =10CM	M2	295,20
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	30,80
2,4	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	19,96
2,5	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0,05 CM	M3	0,70
3			
3,1	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA CIMENTACIÓN	KG	176,00
3,2	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA PEDESTAL	KG	234,66
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS BASE DE ACERO DE 30 x 30 CM de 14MM	UNI	14,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE 5/8" DE L= 50 CM INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS (VER DE TALLE DE PERNOS)	UNI	84,00
4			
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA DE 1,00 MT X 1,00 MT X0,35 MT	M3	4,90
4,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL DE 40 x 40 CM	M3	2,80
5			


5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA CURVA CALIBRE 28 TERMOACÚSTICA CON ACABADO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 (180 G/M2).	M2	651,00
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	KG	8.450,00
6			
6,1	SUMINISTRO E INSTALALCION DE PORTERIA MULTIPLE FIJA INCLUYE MALLA 100% NYLON COLOR NEGRO PINTURA EN ESMALTE TRES MANOS	UNI	2,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARALES PARA VOLEIBOL (INCLUYE PARAL GALV DE 3" EN TUBERÍA CON MALLA 100% NYLON Y PINTURA ESMALTADA	UND	1,00
6,3	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE MICROFÚTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRÁFICO ALTO ANCHO 10 CM DE ACUERDO AL DISEÑO	ML	390,00
7			,
7,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE GRADERÍAS	M3	12,00
7,2	LOSAS DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERÍAS	M3	3,33
7,3	ACERO PARA GRADERÍAS DE 60000 PSI	KG	1.480,50
7,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PARA GRADERÍAS	M2	145,28
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DE 30 *17 CON SALIDA DE 4"	ML	60,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BAJANTES EN PVC DE 4"	ML	118,80

3.1 Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo, en el Municipio de Puerto Leguizamo. Barrio Martha lucia lotero.

El municipio Puerto Leguizamo está localizado en la subregión del Bajo Putumayo de la Amazonia Noroccidental, al sur de la República de Colombia. Limita 84,24 km al sur-oriente con el departamento del Amazonas; 600 m al sur con Perú de por medio el río Putumayo (aunque la distancia más corta está entre los 105 m o 120 m también por el río Putumayo); 56,16 km al sur-occidente con Ecuador como lindero el río Putumayo; 206,54 km al occidente con el municipio de Puerto Asís; 221,53 km al nor-occidente con el municipio de Puerto Guzmán y 16,35 km al norte con el departamento del Caquetá.

Extensión total: 11 640 km²
Extensión área urbana: 640 km²
Extensión área rural: 11 000 km²
Altitud de la cabecera municipal (sobre el nivel del mar): 114 metros.
Temperatura media: 30° centígrados, con humedad del 85 %
Distancia de referencia: 400 km aproximadamente (Puerto Asís)
La totalidad de sus territorios son planos o ligeramente ondulados, pertenecientes a la Amazonia, y por la conformación de su relieve, únicamente ofrecen el piso térmico cálido.
La ejecución del proyecto se realizará en el departamento del Putumayo, municipio de Puerto Leguizamo, corregimiento de puerto Ospina

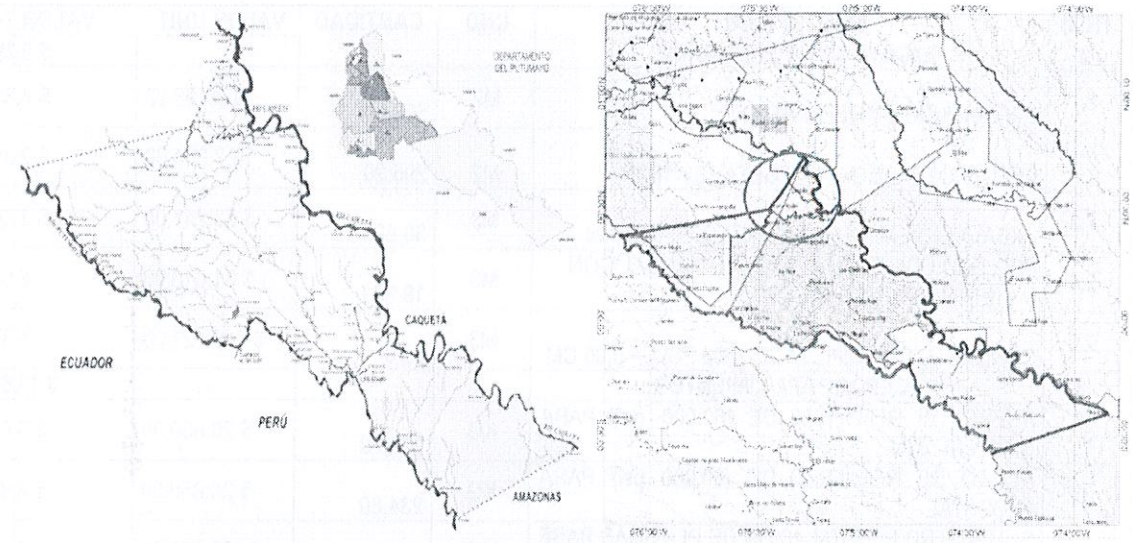



3.2 Características o alcance del proyecto

El alcance del presente proyecto es de aumentar el desarrollo deportivo e integración social de la comunidad del municipio de puerto Leguizamo teniendo en cuenta que la educación deportiva desde temprana edad aumenta la socialización de nuestros grupos de pobladores.

A continuación, se relaciona el presupuesto del proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	**EXCAVACION Y PRELIMINAR**				**$ 9.291.358,00**
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	598,00	$ 7.196,00	$ 4.303.208,00
2,2	DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL E =10CM	M2	295,20	$ 7.964,00	$ 2.350.973,00
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	30,80	$ 53.247,00	$ 1.640.008,00
2,4	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	19,96	$ 31.010,00	$ 619.084,00
2,5	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0,05 CM	M3	0,70	$ 540.121,00	$ 378.085,00
3	**ACEROS PARA CIMIENTOS**				**$ 11.617.061,00**
3,1	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA CIMENTACIÓN	KG	176,00	$ 20.850,00	$ 3.669.600,00
3,2	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA PEDESTAL	KG	234,66	$ 20.850,00	$ 4.892.661,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS BASE DE ACERO DE 30 x 30 CM de 14MM	UNI	14,00	$ 128.500,00	$ 1.799.000,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE 5/8" DE L= 50 CM INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS (VER DE TALLE DE PERNOS)	UNI	84,00	14.950	$ 1.255.800,00
4	**CONCRETOS**				**$ 9.021.488,00**
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA DE 1,00 MT X 1,00 MT X0,35 MT	M3	4,90	$ 1.097.440,00	$ 5.377.456,00
4,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL DE 40 x 40 CM	M3	2,80	$ 1.301.440,00	$ 3.644.032,00
5	**CUBIERTAS**				**$ 254.704.620,00**
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA CURVA CALIBRE 28 TERMOACÚSTICA CON ACABADO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 (180 G/M2).	M2	651,00	$ 80.120,00	$ 52.158.120,00
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	KG	8.450,00	$ 23.970,00	$ 202.546.500,00
6	**PINTURA Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS**				**$ 12.309.980,00**

6,1	SUMINISTRO E INSTALALCION DE PORTERIA MULTIPLE FIJA INCLUYE MALLA 100% NYLON COLOR NEGRO PINTURA EN ESMALTE TRES MANOS	UNI	2,00	$ 2.865.700,00	$ 5.731.400,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARALES PARA VOLEIBOL (INCLUYE PARAL GALV DE 3" EN TUBERÍA CON MALLA 100% NYLON Y PINTURA ESMALTADA	UND	1,00	$ 412.680,00	$ 412.680,00
6,3	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE MICROFÚTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRÁFICO ALTO ANCHO 10 CM DE ACUERDO AL DISEÑO	ML	390,00	$ 15.810,00	$ 6.165.900,00
7	**GRADERIA Y CANALES**		,		**$ 80.033.049,00**
7,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE GRADERÍAS	M3	12,00	$ 1.301.440,00	$ 15.617.280,00
7,2	LOSAS DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERÍAS	M3	3,33	$ 1.301.440,00	$ 4.331.192,00
7,3	ACERO PARA GRADERÍAS DE 60000 PSI	KG	1.480,50	$ 20.850,00	$ 30.868.425,00
7,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PARA GRADERÍAS	M2	145,28	$ 106.741,00	$ 15.507.332,00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DE 30 *17 CON SALIDA DE 4"	ML	60,00	$ 118.822,00	$ 7.129.320,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BAJANTES EN PVC DE 4"	ML	118,80	$ 55.383,00	$ 6.579.500,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 376.977.556,00**
ADMINISTRACION				**26,00%**	$ 98.014.164,00
IMPREVISTOS				**1,00%**	$ 3.769.776,00
UTILIDAD				**3,00%**	$ 11.309.327,00
COSTO TOTAL INDIRECTO				**30,00%**	**$ 113.093.267,00**
TOTAL, COSTO DE OBRA					**$ 490.070.823,00**

3.3 Componentes Básicos Del Proyecto

- **Población beneficiada**: Con la construcción de este proyecto el cual satisface una necesidad planteada, en este caso por la comunidad del municipio de Puerto Leguizamo, en especial la de los habitantes del sector, genera gran expectativa en sus habitantes ya un proyecto de esta magnitud beneficia a una población aproximada de 1600 habitantes.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CONTRATO DE OBRA

4.1 Relación De Vigencias De Pólizas

Uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del Riesgo. El artículo 17 del Decreto 1510 de 2013 dispone que la Entidad Estatal deba evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Las garantías son instrumentos de cobertura de Riesgos comunes en Procesos de Contratación.

EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
TIPO DE GARANTIA:	Responsabilidad Civil Extracontractual
POLIZA No:	560-74-994000036471 ANEXO 0
FECHA DE EXPEDICION:	18 DE NOV 2025
LUGAR DE EXPEDICION:	NEIVA

AMPARO	**FECHA INICIO AMPARO**	**FECHA FINALIZACIÓN AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/11/2025	05/01/2026	$ 284.700.000,00	Vigente

EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
TIPO DE GARANTIA:	Responsabilidad Civil Extracontractual
POLIZA No:	560-74-994000036471 ANEXO 0
FECHA DE EXPEDICION:	18 DE NOV 2025
LUGAR DE EXPEDICION:	NEIVA

AMPARO	**FECHA INICIO AMPARO**	**FECHA FINALIZACIÓN AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
Cumplimiento	12/11/2025	02/05/2026	$ 49.007.082,30	Vigente
Prestaciones sociales	12/11/2025	02/01/2029	$ 24.503.541,15	
Estabilidad De La Obra	12/11/2025	5 AÑOS	$ 49.007.082,30	

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

Durante la etapa de ejecución del proyecto denominado ADECUACIÓN DE CANCHA, GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, se realizó la siguiente actividad de acuerdo al presupuesto.

El contratista realizó la compra de los materiales necesarios para la ejecución de la cimentación concretos y graderías, materiales que se adquirieron en el municipio de puerto Leguizamo. de acuerdo a lo descripto en cada una de las actividades a ejecutar.

Se realiza el transporte de los materiales para la cubierta donde fue necesario mandar a hacer los perfiles de soporte de la cubierta teniendo en cuenta que ya no son comerciales en nuestro territorio, estos materiales se transportaron desde el interior del país en tracto camiones hasta la ciudad de puerto asís, en Puerto asís se fueron embarcados en botes de carga quien los transportó hasta el municipio de puerto Leguizamo vía fluvial sobre el rio putumayo, teniendo en cuenta que los perfiles se demoraron en su fabricación llegaron al municipio de puerto asís y por la temporada de sequía que se está presentando los niveles del río putumayo no son aptos para la navegabilidad de este tipo de embarcaciones por esta razón parte del material se encuentra en puerto asís a la espera que el nivel del rio aumente.

Se realizan actividades de ubicación del sitio de ejecución de la cimentación para la estructura de la nueva cubierta, por medio de georefenciacion.

Se realizan actividades de localización y replanteo para la cimentación de la estructura.

Se realizan actividades de excavación manual en sitio con personal del contratista.

Se realizan actividades de corte figurado y amarre de acero para la cimentación zapata, pedestales, y placa de piso de soporte de graderías, de acuerdo a los diseños entregados por el ente contratante.

Se realizan actividades de colocación de solado de limpieza en concreto de 2500 psi para zapatas de estructura de cimentación.

Instalación de concreto para catorce zapatas en concreto 20.7 mpa (3000 psi) mezcla en sitio de obra de la misma manera se realiza la fundición en concreto de 20.7 mpa (3000 psi) para los catorce pedestales, concreto de placa de soporte de graderías, 20 soportes de graderías y losas para gradería.

El suministro e instalación de portería múltiple fija incluye malla 100% nylon color negro pintura en esmalte tres manos se encuentran en elaboración.

Se realizo limpieza al sitio de obra,

En el sitio de obra se encuentran las tejas arquitectónicas para la cubierta.

5.1 AVANCE FISICO

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, inicialmente se realizó el transporte del material de acero de refuerzo cemento y material de rio necesario para la ejecución del presente proyecto.

Hasta la fecha del presente informe el avance de ejecución del presente contrato es del 60.04%.

5.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

CDP	**No 162225** de fecha 04 de abril de 2025 por un valor de $ 295.871.869 No **2025000297** de fecha 25 de marzo de 2025 por un valor de 228.503.912 expedido por el área de presupuesto de puerto Leguizamo por valor total de $ 524.375.781,00
RP	**No. 346** de fecha 30 de Julio de 2025 expedido por el área de presupuesto de EMPULEG E.S.P, sector energía 7501, fuente 1.2.1.0.00- ingresos corrientes de libre destinación.

- **Pagos realizados hasta la fecha del contrato de obra.**

Durante el presente periodo no se han realizado ningún pago al contratista de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra en mención.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA		
descripción	**Valor**	**Valor programado**
Valor del Contrato	$ 490.070.823	$ 0.00
Valor total cancelado a la fecha	$ 0,00	$ 0.00

En el cuadro anterior se determina que hasta la fecha no se ha realizado ningún desembolso.

5.3 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Durante el transcurso de la ejecución del presente contrato de obra en el proceso constructivo de la estructura de soporte para la cubierta y las graderías no se presentaron retrasos.

se han presentado retrasos en la ejecución de la estructura metálica de la cubierta por temas de transporte de material y la compra de los perfiles de soporte de la cubierta.

el contrato hasta la fecha se encuentra vigente, se hace recomendación a la interventoría y a la supervisión del presente contrato tener en cuenta que si los materiales que se encuentran en puerto asís no llegan este fin de semana se vea la necesidad de realizar una posible prorroga al presente contrato de obra.

5.4 MODIFICACIONES CONTRATO DE OBRA

Hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de modificación al contrato de obra ni en cantidades ni en valores en referencia a lo contratado inicialmente.

5.5 PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Aguilar Rodríguez freyder	1.036.931.315	Representante legal
Casanova jurado geni	36.756.748	auxiliar
Rubiano Carvajal Francy	1.123.200.992	Ing. Amb – tl salud ocup
Navisoy leidy	1.123.206.320	administrativa
Ortiz cachala olga	55.157.455	administrativa
Álvaro ríos	9.149.555	obrero
Leonardo charry	7.714.318	inspector de obra
Juan parra	1.118.025.458	obrero
Cristian Fernando Galeano	1.007.345.180	obrero
Duran Parra luis	1.122.732.051	Oficial

5.6 EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

Los equipos utilizados en obra para el desarrollo del presente contrato son los siguientes.

EQUIPO	
GPS garmin	Utilizado para la verificación de las coordenadas.
RADIOS BAOFEN	Utilizado en la comunicación entre el personal que se encuentra en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que la señal vía celular es muy irregular y hay sitios donde no se recibe esta.
CELULARES	Este tipo de comunicación se utiliza estando en la cabecera del corregimiento e informar al personal administrativo las labores ejecutadas.
MAQUINARIA	Fue necesario la utilización de equipos mecánicos como mezcladora, tronzadora, planta eléctrica, pulidoras.
HERRAMIENTA MENOR	Cuando se habla de herramienta menor se describe las herramientas para la instalación de los concreto, tales como son palustre, martillo, bichiroque, plomadas formaletas, palas palines, barra, cizalla.

5.7 APORTE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los pagos se han realizado de acuerdo al personal utilizado en la ejecución de las actividades del proyecto. Se anexa copia de la seguridad del personal afiliado a las empresas que conforman el consorcio:

RAZON SOCIAL	NIT	V/CANCELADO	PLANILLA No
ARCOING SAS	900988015	$ 2.958.700	9495437923

6. ASPECTOS TECNICOS DEL CONTRATO DE OBRA

Se establecieron las localizaciones y el replanteo de la cimentación de la estructura de acuerdo al diseño presentado en el proyecto con las indicaciones suministradas por el supervisor y el ente contratante, mediante visitas al sitio de ejecución de la obra, resolviendo inquietudes sobre la correcta ejecución de los trabajos.

Se verifica la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la estructura de cimentación para la nueva cubierta.

6. RECOMENDACIONES.

teniendo en cuenta los bajos niveles del rio putumayo afluente por el cual se transporta todo tipo de insumos y materiales para el municipio, no ha permitido que la embarcación donde se encuentran los materiales restantes para la estructura de la cubierta pueda salir del puerto de puerto asís putumayo, se realiza la recomendación al interventor y al supervisor del presente contrato sea necesaria una posible prorroga al contrato de obra, ya que sin estos materiales no puede dar un avance continuo a las actividades faltantes por ejecutar y dar una terminación dentro los plazos del contrato.

7. OBSERVACIONES.

Hasta la fecha no se han presentado observaciones en la parte técnica,
Los materiales faltantes en obra se encuentran embarcados en bote en puerto asís putumayo.

ATENTAMENTE

FREYDER JHONATTAN AGUILAR RODRIGUEZ
Representante Legal
ARCOING SAS
NIT: 900988015-1
CC. 1.036.931.315 de Rionegro

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO

BALANCE PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE OBRA

MES

DICIEMBRE

ARCOING

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Proyecto	ADECUACIÓN DE CANCHA, GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	Localización	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
Contrato Nº:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	Contratista:	ARCOING SAS.
Periodo:	20 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	R/I	FREYDER JHONATTAN AGUILAR RODRIGUEZ

BALANCE PARCIAL DE OBRA MES 1 - CONTRATO DE OBRA Nº 003 - 2025

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad contrato	Valor unitario	Valor Total	Acumulad Anterior	Acumulad Mes	Acumulado total	Acumulado Mes Ant	Acumulado Mes diciembre	Acumulado total	Cantidad	Valor
2	**EXCAVACION Y PRELIMINAR**												
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	598,00	$ 7.196	$ 4.303.208		598,00	598,00	-	4.303.208	4.303.208	-	-
2,2	DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL E =10CM	M2	295,20	$ 7.964	$ 2.350.973		295,20	295,20	-	2.350.973	2.350.973	-	-
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	30,80	$ 53.247	$ 1.640.008		30,80	30,80	-	1.640.008	1.640.008	-	-
2,4	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	19,96	$ 31.010	$ 619.084		19,96	19,96	-	619.084	619.084	-	-
2,5	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0,05 CM	M3	0,70	$ 540.121	$ 378.085		0,70	0,70	-	378.085	378.085	-	-
3	**ACEROS PARA CIMIENTOS**						0,00						
3,1	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA CIMENTACIÓN	KG	176,00	$ 20.850	$ 3.669.600		176,00	176,00	-	3.669.600	3.669.600	-	-
3,2	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA PEDESTAL	KG	234,66	$ 20.850	$ 4.892.661		234,66	234,66	-	4.892.661	4.892.661	-	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS BASE DE ACERO DE 30 x 30 CM de 14MM	UNI	14,00	$ 128.500	$ 1.799.000		7,00	7,00	-	899.500	899.500	7,00	899.500
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE 5/8" DE L= 50 CM INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS (VER DE TALLE DE PERNOS)	UNI	84,00	$ 14.950	$ 1.255.800		84,00	84,00	-	1.255.800	1.255.800	-	-
4	**CONCRETOS**						0,00						
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA DE 1,00 MT X 1,00 MT X0,35 MT	M3	4,90	$ 1.097.440	$ 5.377.456		4,90	4,90	-	5.377.456	5.377.456	-	-
4,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL DE 40 x 40 CM	M3	2,80	$ 1.301.440	$ 3.644.032		2,80	2,80	-	3.644.032	3.644.032	-	-
5	**CUBIERTAS**						0,00						
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA CURVA CALIBRE 28 TERMOACÚSTICA CON ACABADO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 (180 G/M2).	M2	651,00	$ 80.120	$ 52.158.120		325,50	325,50	-	26.079.060	26.079.060	325,50	26.079.060
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	KG	8.450,00	$ 23.970	$ 202.546.500		4.225,00	4.225,00	-	101.273.250	101.273.250	4.225,00	101.273.250
6	**PINTURA Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS**				$ -		0,00	0,00	-	-	-	-	-
6,1	SUMINISTRO E INSTALALCION DE PORTERIA MULTIPLE FIJA INCLUYE MALLA 100% NYLON COLOR NEGRO PINTURA EN ESMALTE TRES MANOS	UNI	2,00	$ 2.865.700	$ 5.731.400		1,00	1,00	-	2.865.700	2.865.700	1,00	2.865.700

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO

BALANCE PRESUPUESTAL

INFORME PRESUPUESTAL DE OBRA

MES

DICIEMBRE

ARCOING

6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARALES PARA VOLEIBOL (INCLUYE PARAL GALV DE 3" EN TUBERÍA CON MALLA 100% NYLON Y PINTURA ESMALTADA	UND	1,00	$ 412.680	$ 412.680		0,00	0,00	-	-	-	1,00	412.680
6,3	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE MICROFÚTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRÁFICO ALTO ANCHO 10 CM DE ACUERDO AL DISEÑO	ML	390,00	$ 15.810	$ 6.165.900		195,00	195,00	-	3.082.950	3.082.950	195,00	3.082.950
7	**GRADERIA Y CANALES**						0,00						
7,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE GRADERÍAS	M3	12,00	$ 1.301.440	$ 15.617.280		12,00	12,00	-	15.617.280	15.617.280	-	-
7,2	LOSAS DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERÍAS	M3	3,33	$ 1.301.440	$ 4.331.192		3,33	3,33	-	4.331.192	4.331.192	-	-
7,3	ACERO PARA GRADERÍAS DE 60000 PSI	KG	1.480,50	$ 20.850	$ 30.868.425		1.480,50	1.480,50	-	30.868.425	30.868.425	-	-
7,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PARA GRADERÍAS	M2	145,28	$ 106.741	$ 15.507.332		72,64	72,64	-	7.753.666	7.753.666	72,64	7.753.666
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DE 30 *17 CON SALIDA DE 4"	ML	60,00	$ 118.822	$ 7.129.320		30,00	30,00	-	3.564.660	3.564.660	30,00	3.564.660
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BAJANTES EN PVC DE 4"	ML	118,80	$ 55.383	$ 6.579.500		59,40	59,40	-	3.289.750	3.289.750	59,40	3.289.750
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 376.977.556,00				-	227.756.340,00	227.756.340,00		149.221.216,00
	ADMINISTRACION	26%			$ 98.014.164,56					59.216.648,40	59.216.648,40		38.797.516,16
	IMPREVISTOS	1%			$ 3.769.775,56					2.277.563,40	2.277.563,40		1.492.212,16
	UTILIDAD	3%			$ 11.309.326,68					6.832.690,20	6.832.690,20		4.476.636,48
	COSTO TOTAL INDIRECTO				$ 113.093.266,80					296.083.242,00	296.083.242,00		193.987.580,80
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 490.070.823,00				-	296.083.242,00	296.083.242,00		193.987.581,00
									% EJECUTADO	**60,42%**		**% PENDIENTE**	**39,58%**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO	**MES**
	BALANCE PRESUPUESTAL **INFORME PRESUPUESTAL DE OBRA**	**DICIEMBRE**

ARCOING

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº 003-2025

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 490.070.823,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 490.070.823,00**		

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	TOTAL			$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%


EN ELSIGUIENTE BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA EN MENCION SE EVIDENCIA QUE EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DEL 60,42% TENIENDO EN CUENTA QUE SE ESTA DANDO VALOR A LOS MATERIALES COMPRADOS POR EL CONTRATISTA, ESTO HACE REFERENCIA QUE ELVALOR EJECUTADO DE ACUERDO AL ANTERIOR BALANCE ES DE $ 296.083.242 PESOS MDA/CTE, QUEDANDO COMO SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL 39,58% POR UN VALOR DE $193.987.581 PESOS MDA/CTE. HASTA LA FECHA NO SE REALIZADO NINGUN COBRO DE ACTAS PARA PAGO,


Contratista:			
FREYDER JHONATTAN [illegible] RODRIGUEZ ARCOING SAS Contratista	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA INTERVENTOR		Elaborado: 17/12/2025

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME 1 DICIEMBRE 2025	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (1-2)

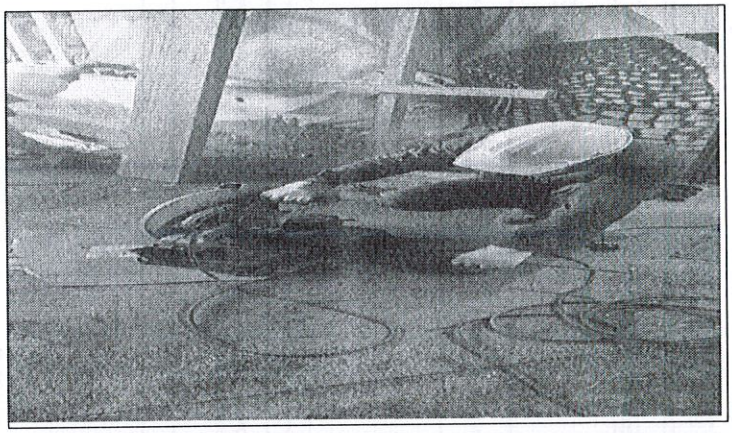

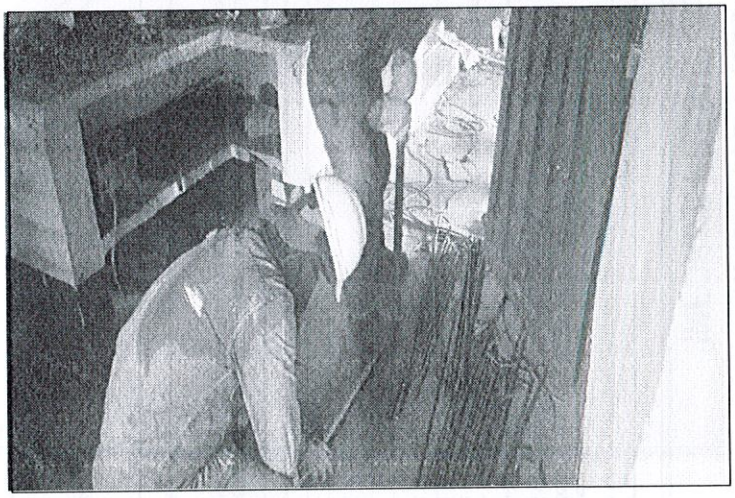


CORTE DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS EN ACERO DE ½ DE ACUERDO A DISEÑOS


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (3-4)

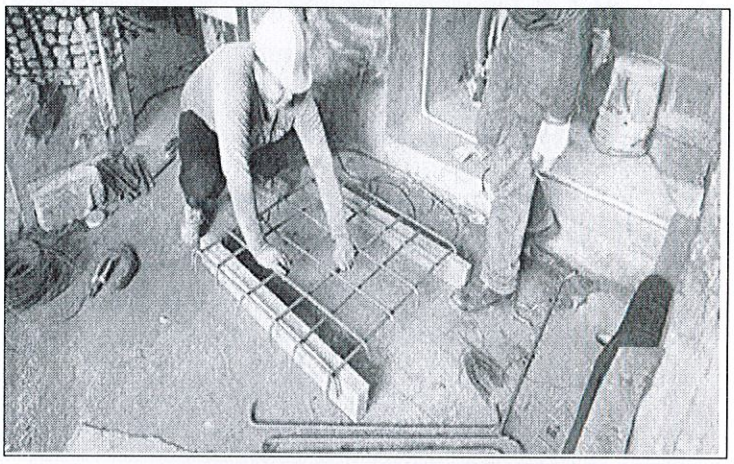

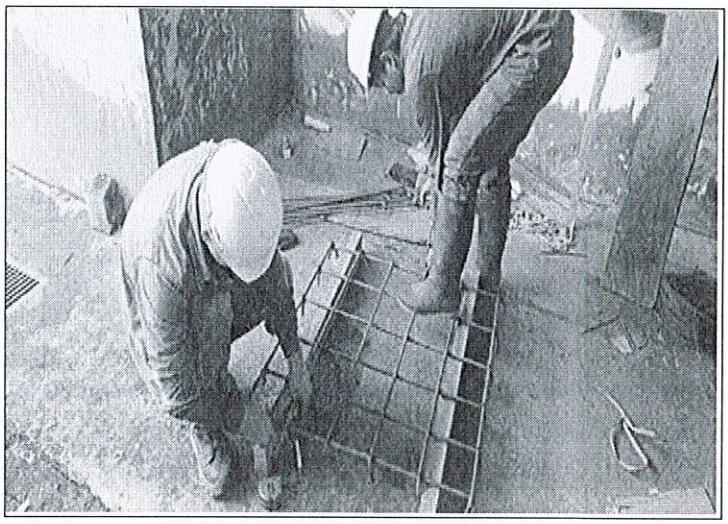

ACERO DE REFUERZO CANASTILLA DE REFUERZO DE ZAPATA EN ACERO
DE ACUERDO A DISEÑOS

16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1851 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (5-6)



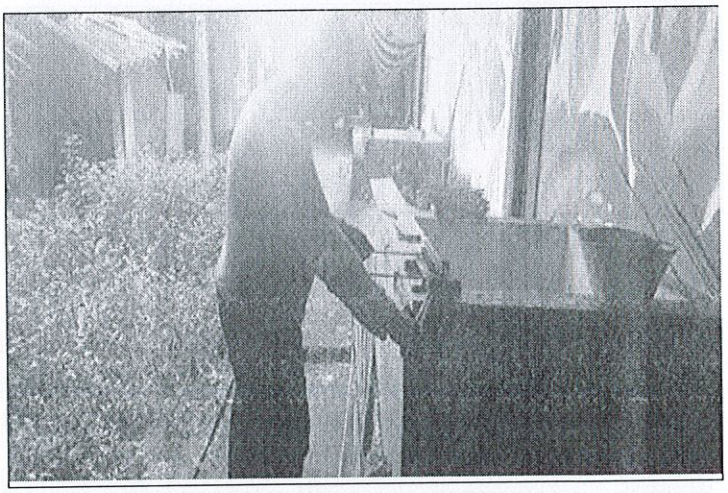

FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN 3/8 PARA ESTRIBOS DE PEDESTALES DE ACUERDO A DISEÑO


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (7-8)

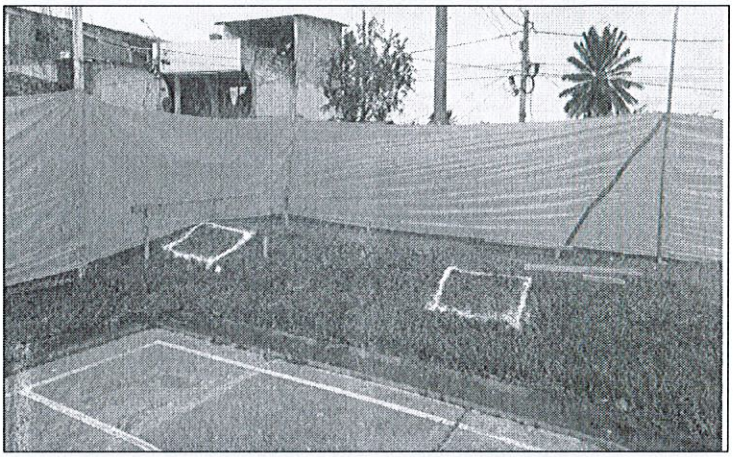

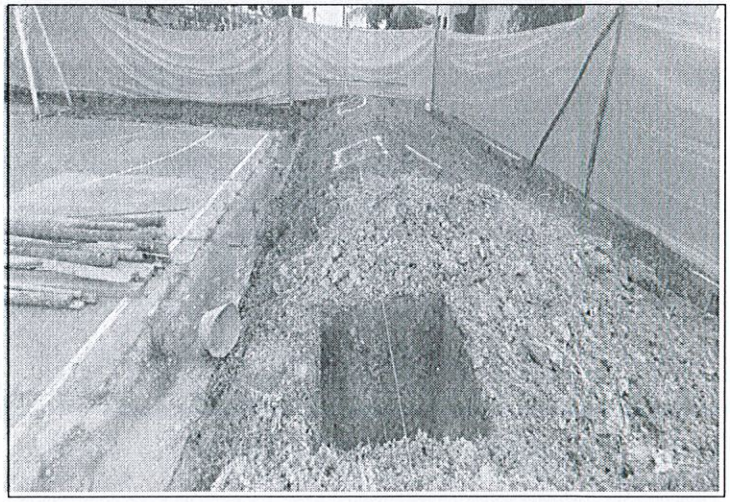

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ZAPATAS PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA, DE ACUERDO A DISEÑOS ESTRUCTURALES


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (9-10)

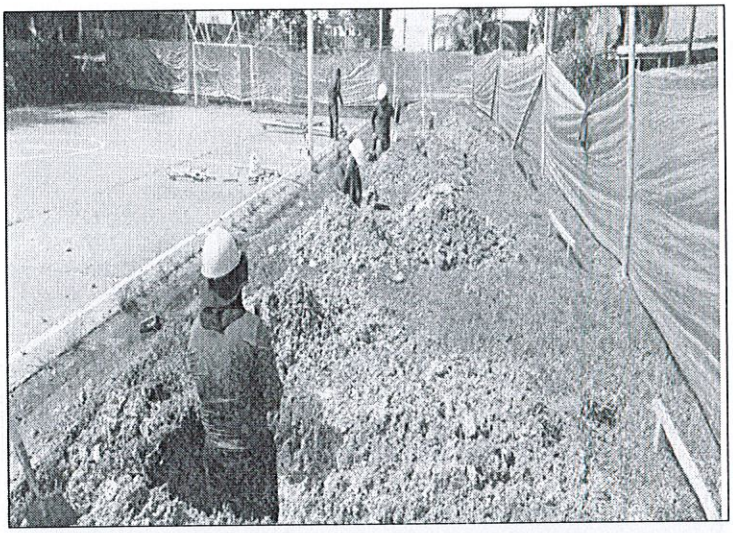

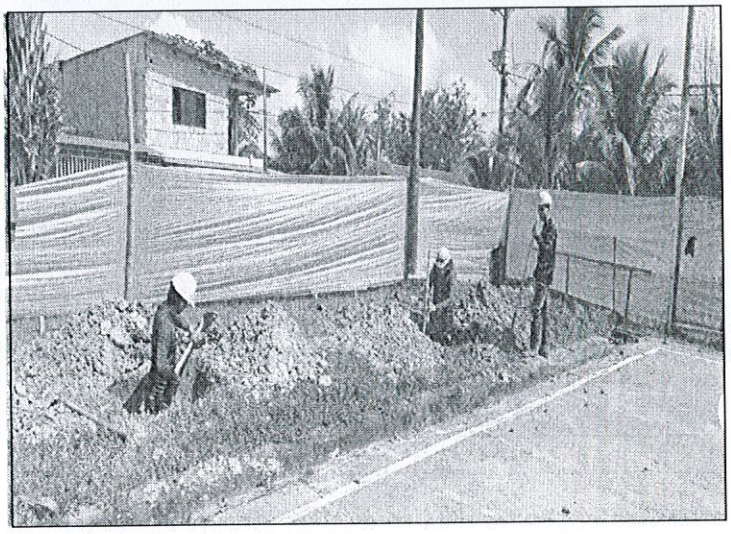

EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS

16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (11-12)





FUNDICIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA CON MEZCLADORA, DE ACUERDO A DISEÑO


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (13-14)

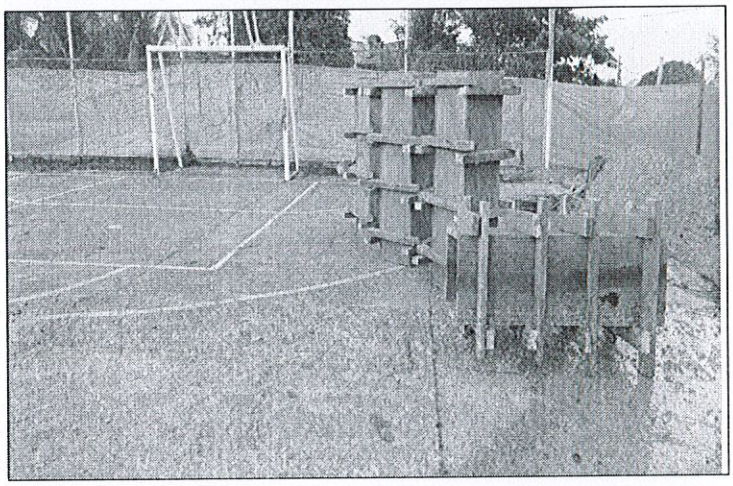

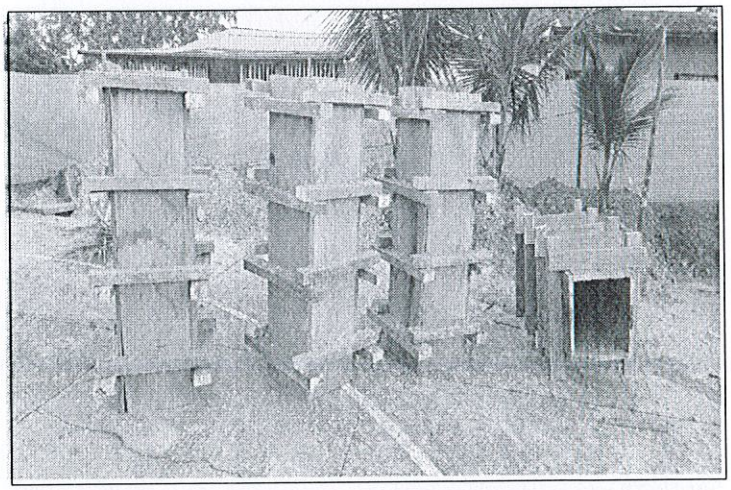

FORMALETAS EN MADERA PARA PEDESTALES DE .40*.40


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1854 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (15-16)

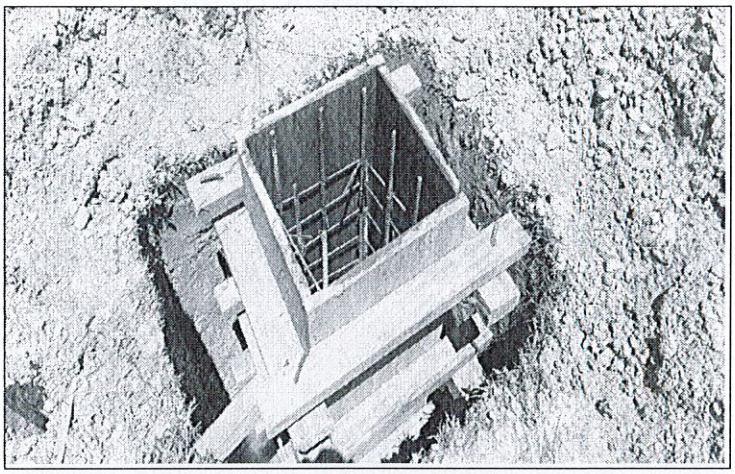

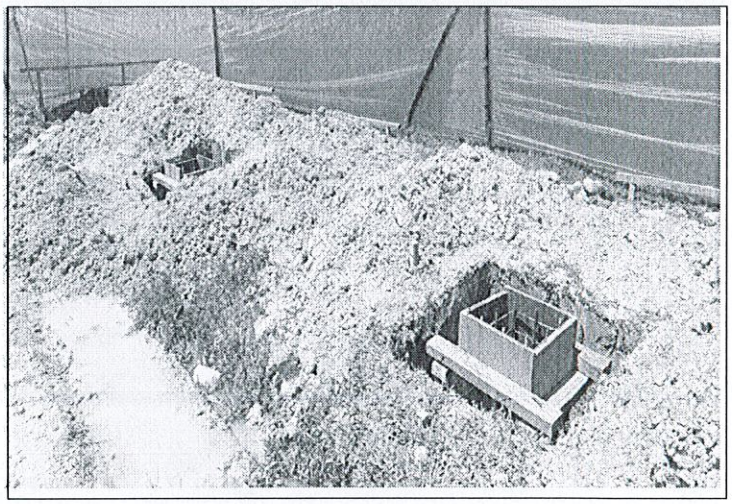

FORMALETAS COLOCADAS PARA VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES


16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (17-18)

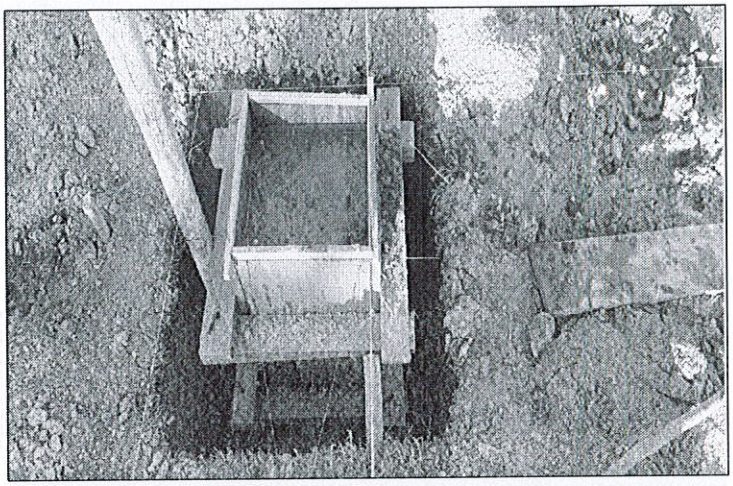



Fundición de pedestales en concreto hecho en obra de 3000 psi de acuerdo a diseños, con sus respectivos pernos de 5/8 en acero.


16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1851 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (19-20)

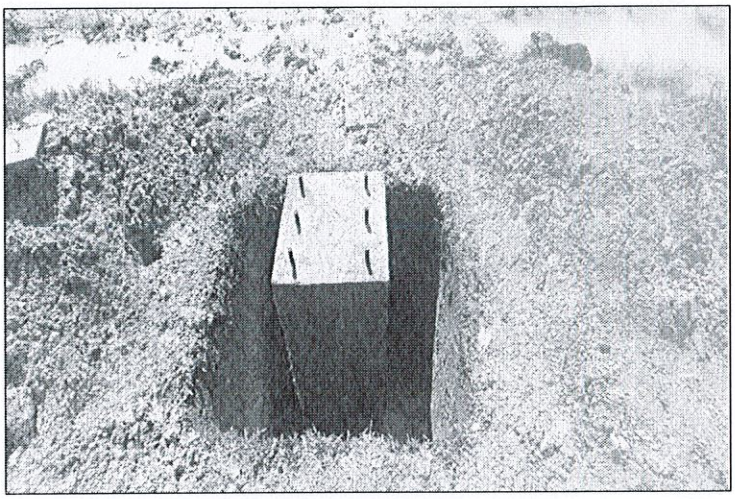



DESENCOFRADO DE PEDESTALES EN CONCRETO


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20 #15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (21-22)

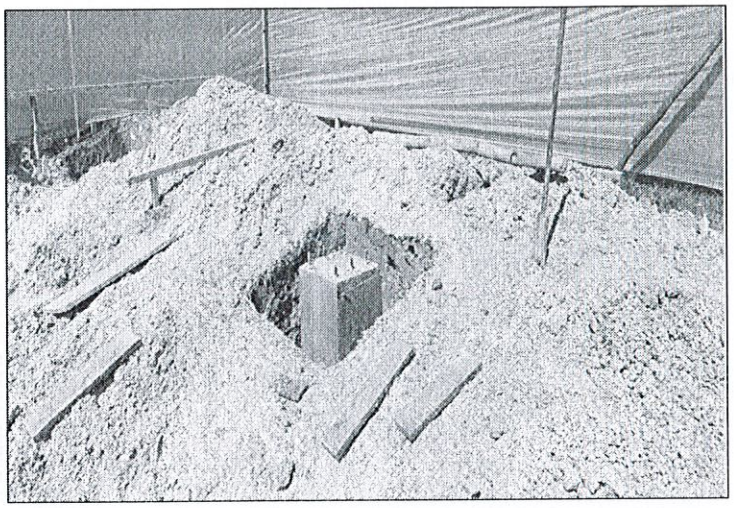

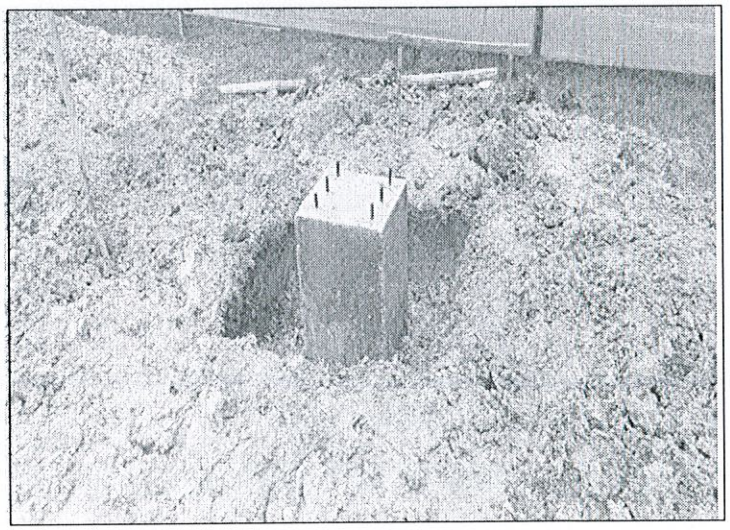

RELLENO DE EXCAVACION DE PEDESTALES CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION

16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (23-24)



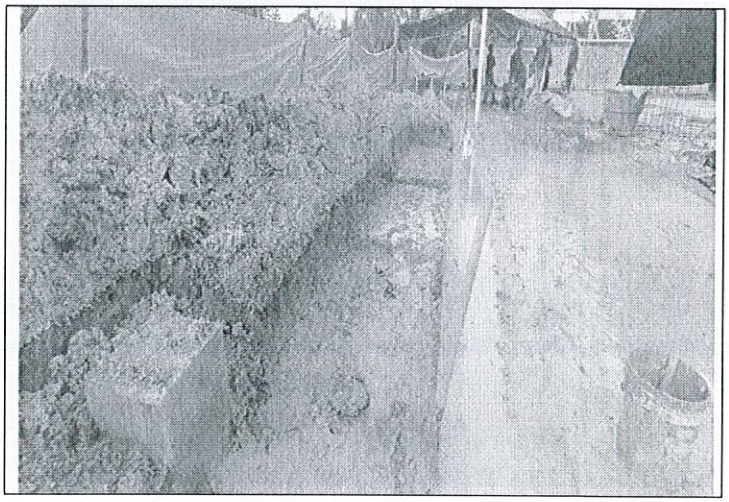

EXCAVACION MANUAL PARA CONTRAPISO DE SOPORTE PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS

16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (25-26)



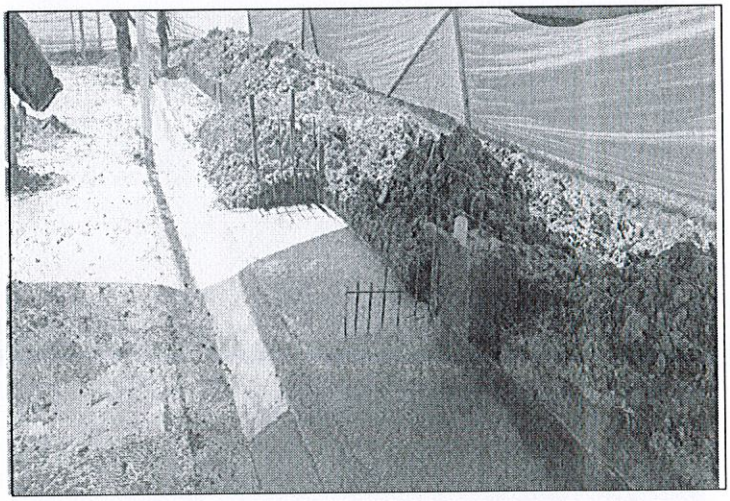

INSTALACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO SOPORTE ESTRUCTURA DE GRADERIA


16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Futumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (27-28)

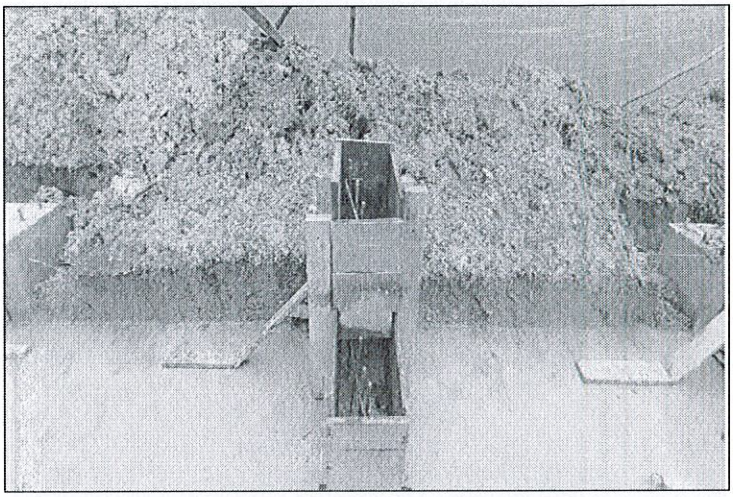



AMARRE DE ACERO Y ENCOFRADO EN MADERA PARA ESCALA SOPORTE PARA PLACA DE GRADERÍA


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 – 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (29-30)

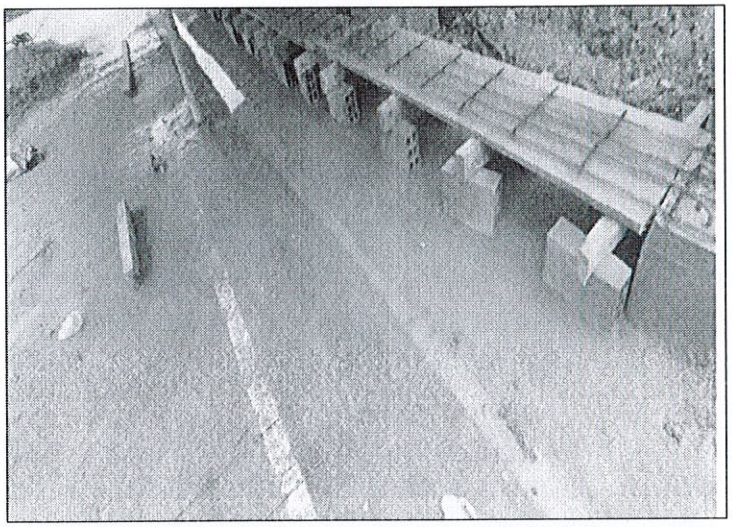

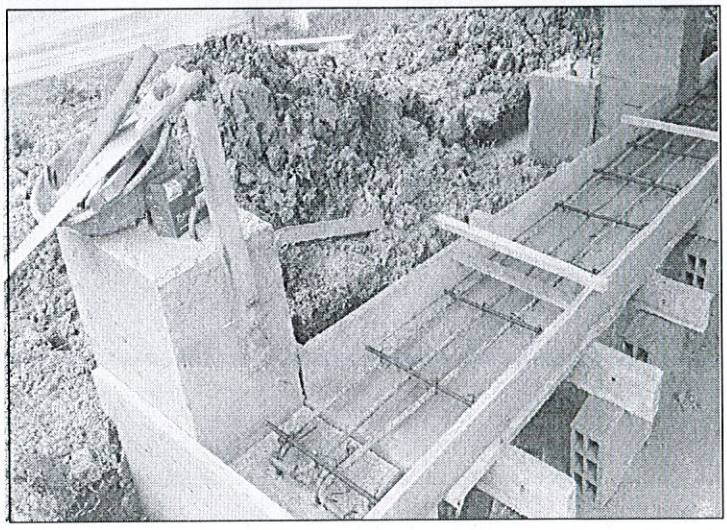

AMARRE DE ACERO Y ENCOFRADO EN MADERA PARA PLACA DE GRADERÍA


16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (31-32)

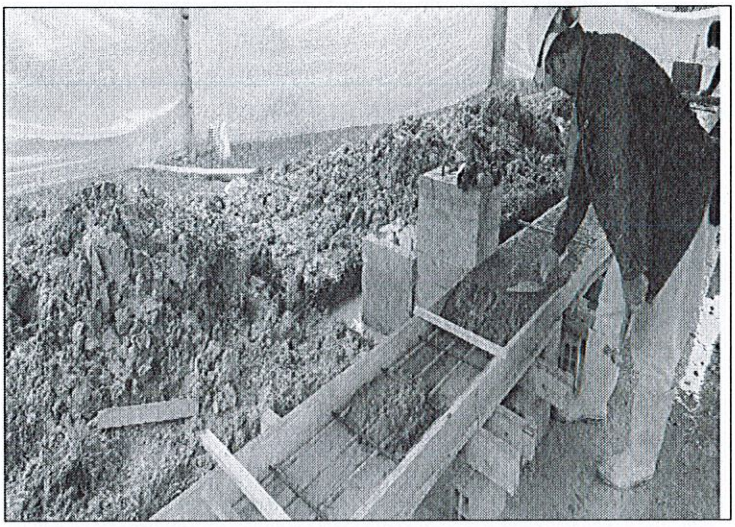





FUNDICIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA Llosas DE GRADERÍA

16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

FOTOGRAFÍA (33-34)

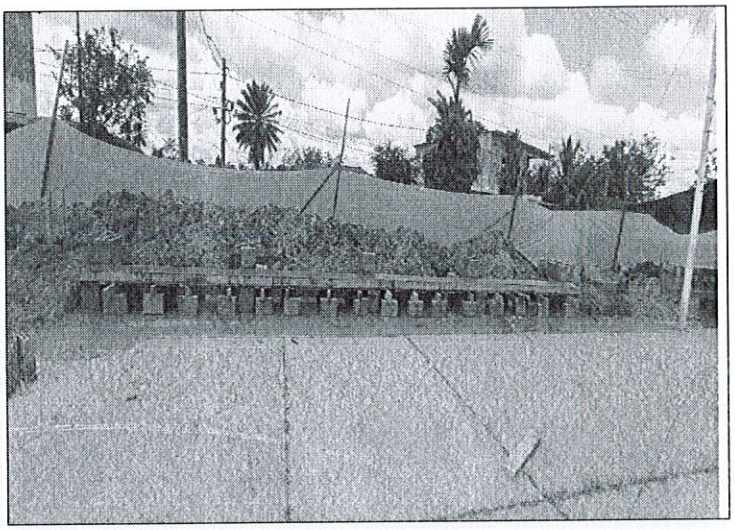

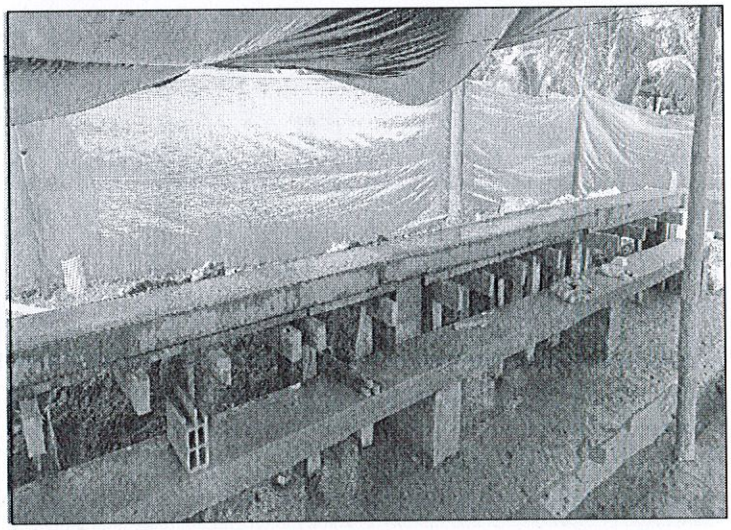


FUNDICIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA LOSAS DE GRADERÍA


16 de Diciembre de 2025

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (35-36)

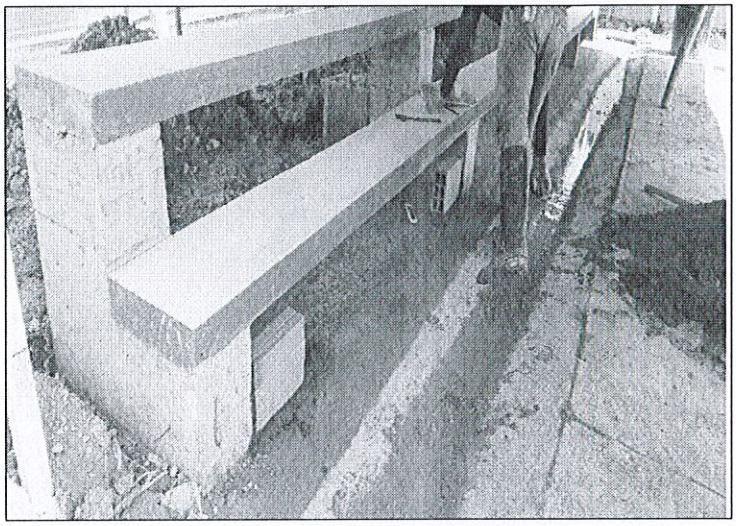

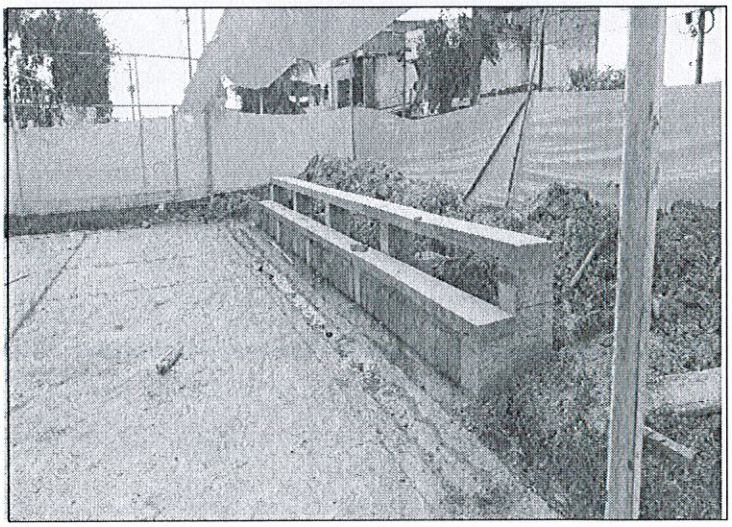

PEGA DE LADRILLO No 4 ENTRE EL ESPACIO ENTRE PLACA DE CONTRAPISO Y LA PRIMERA LOSA DE GRADERIA


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (37-38)

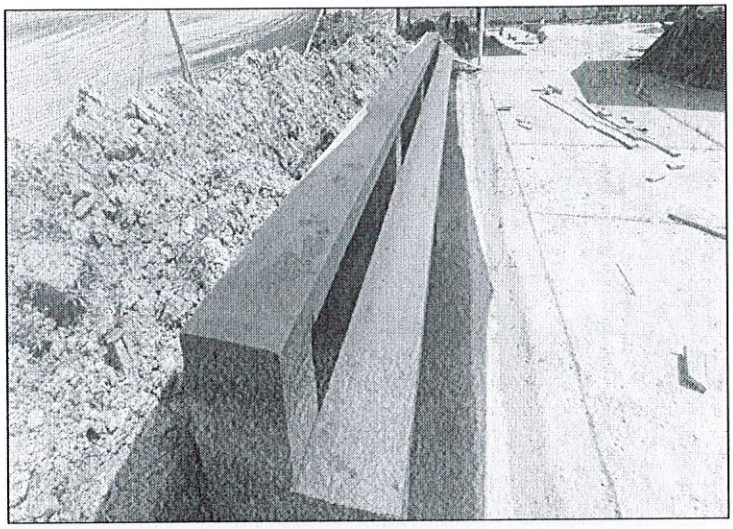

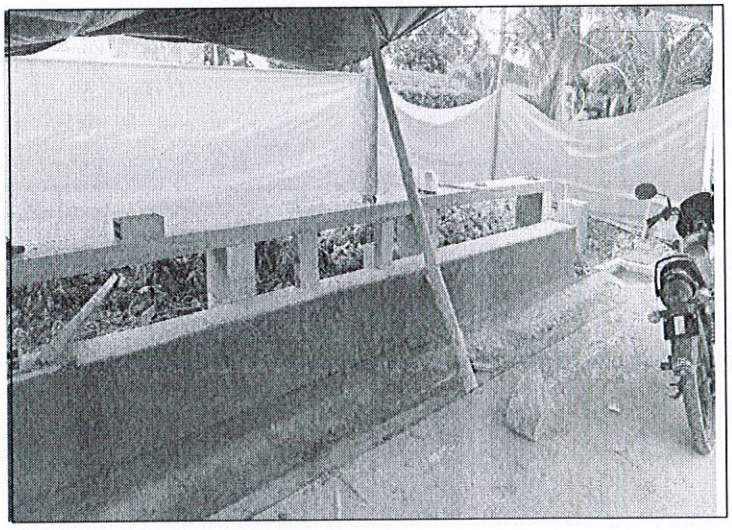

REPELLO DE MURO EN LADRILLO


16 de Diciembre de 2025


Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 220 1850 - 310 2524210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

ARCOING	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ANEXO	CONTRATO DE OBRA	Leguizamo
	Vigencia a partir de: 19-08-2018	2	INFORME MES 1	

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO".
CONTRATISTA:	ARCOING SAS.
CONTRATO No.:	PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

FOTOGRAFÍA (39-40)

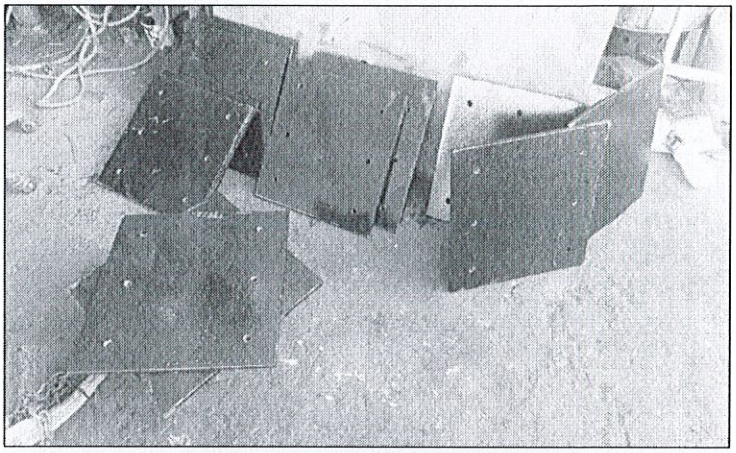

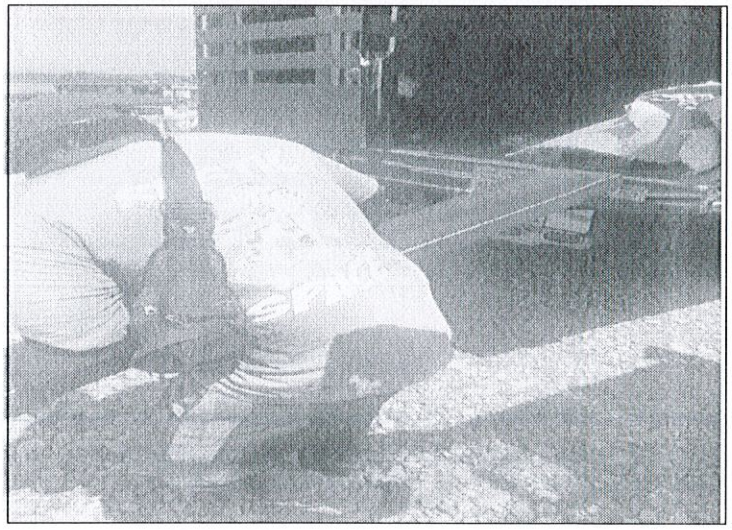



MATERIALES PARA ESTRUCTURA EN ACERO DE CUBIERTA EMBARCADOS EN BOTE EN EL PUERTO DE PUERTOS A ESPERA DE AUMENTO DEL NIVEL DEL RÍO

16 de Diciembre de 2025

Puerto Asís Putumayo - Cra 20#15-471
Barrio la pista, diagonal a la torre de control
Celular 320 226 1850 - 310 252 4210
email: gerencia.arcoingsas@gmail.com

FOTOGRAFÍA (41-42)

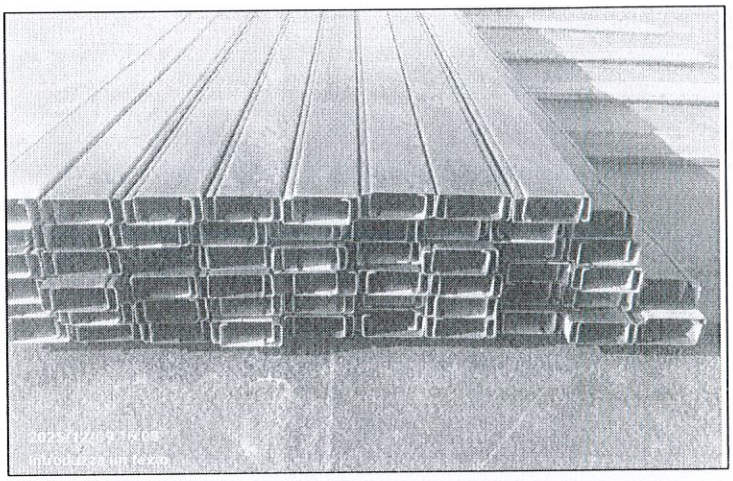

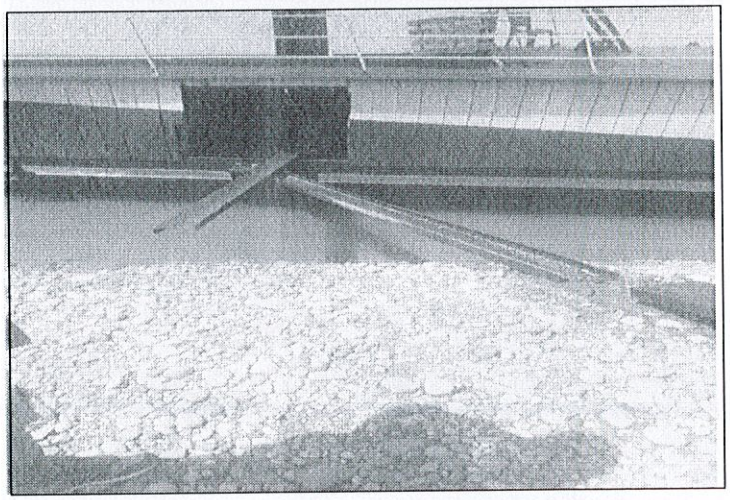

MATERIALES PARA ESTRUCTURA EN ACERO DE CUBIERTA EMBARCADOS EN BOTE EN EL PUERTO DE PUERTOS A ESPERA DE AUMENTO DEL NIVEL DEL RÍO

16 de Diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA

INGENIERO CIVIL


1.1 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRATO OBRA	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			CONTRATO No	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SA			PLAZO	CUARENTA Y TRES DÍAS (43).
INTERVENTOR	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA			VALOR CONTRATO	490.070.823
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	PUERTO LEGUIZAMO	VALOR ADICION	-
BARRIO				VALOR TOTAL OBRA	490.070.823

1.2 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			CONTRATO No	070-2025
CONTRATISTA	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA			PLAZO	CUARENTA Y TRES DÍAS (43).
SUPERVISOR	ING. JHON JAIRO LIZCANO			VALOR CONTRATO	34.304.958
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	PUERTO LEGUIZAMO	VALOR ADICION	-
BARRIO				VALOR TOTAL OBRA	34.304.958



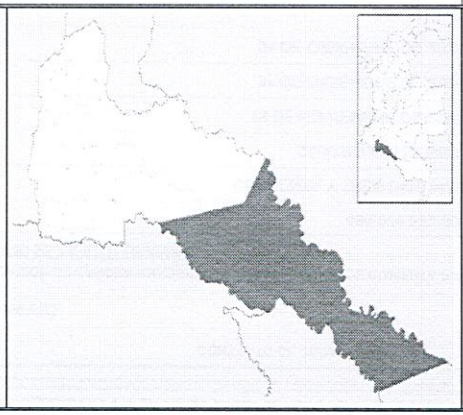



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO


MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA

E.M.P. INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No	PS-LP-006-2025	FECHA	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO		
VALOR CONTRATO OBRA	$ 490.070.823,00	VALOR ADICIONAL	$ -
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y TRES DÍAS (43).	FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO (04) MESES	FECHA TERMINACION 1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	296.083.242		
VALOR POR EJECUTAR:	193.987.581		
AVANCE FISICO:	60,42%		
AVANCE FINANCIERO:	60,42%		

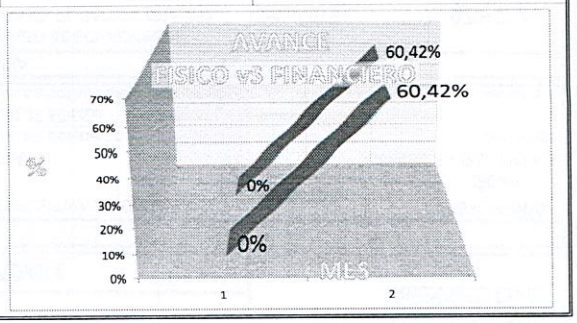

2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZO SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL TECNICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIO DE GOBIERNO Y PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SECTOR DE INTERVENCION DE LA OBRA

LLEGADA DE MATERIALES DE ACERO PERNOS Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA A BODEGA, SE VERIFICA LAS DIMENCIONES DEL ACERO A UTILIZAR.

SE INICIAN ACTIVIDADES DE EJECUCION EN OBRA CON LA LOCALIZACION Y REPLANTEO, SE MARCO CON CAL LOSSITIOS DONDE SE VA HA REALIZAR LAEXCAVACION MANUAL PARA LA ZAPATA.

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CORTE FIGURADO Y AMARRE DE PARILLAS PARA ZAPATAS Y PEDESTALES EN ACERO DE 1/2 DE ACUERDO AL DISEÑO, DE ESTA MISMA MANERA SE REALIZO CORTE FIGURADO DE ACERO DE 3/8 PARA ESTRIBOS PARA PEDESTALES DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA

SE REALIZO LA APLICACION DE CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS CONCRETO ELABORADO EN OBRA UTILIZANDO EQUIPO MECANICO MEZCLADORA DE 10Hp CON MATERIAL DE RIO ENCONTRADO EN EL SECTOR, (BALASTRO)

SE REALIZO LAINSTALACION DE LAS PARRILLAS EN ACERO DE 1/2 PARA ZAPATAS, SE AMARRO CANASTILLA PARA PEDESTALES A LA PARRILLA DE ZAPATA, SE REALIZO LLENADO DE ZAPATA CON CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA

SE REALIZO ENCOFRADO EN MADERA PARA PEDESTALES, SE FUNDEN PEDESTALES CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE 3000 PSI DE ACUERDO A DISEÑO, SE UTILIZO EQUIPO MECANICO COMO MEZCLADORA Y VIBRADOR PARA CONCRETO, SE COLOCAN (06) PERNOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURA EN 5/8, POR PEDESTAL.

SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA PLACA DE SOPORTE DE GRADERIAS, AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Y SU RESPECTIVO FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ACUERDO AL DISEÑO.

SE REAALIZAN ACTIVIDADES DE CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA ESTRUCTURA ESCALA DE SOPORTE DE GRADERIA

SE REALIZA ENCOFRADO EN MADERA PARA LA ESTRUCTURA ESCALA DE SOPORTE DE GRADERIAS, FUNDICION DE SOPORTES EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA.

SE REALIZA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA PLACA DE GRADERIAS, SE ENCOFRA EN MADERA Y SE FUNDE CON CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA.

SE REALIZO ACTIVIDADES DE PEGA DE LADRILLO EN GRADERIA, SE REPELLA

LLEGADA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA PERFILES PARA CORREAS, TEJAS ARQUITECTONICA AL SITIO DE OBRA.

SE VERIFICA EN ELMUNICIPIO DE PUERTO ASIS LO INFORMADO POREL CONTRATISTA QUE EL MATERIAL RESTANTE PARA LAESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SE ENCUENTRA ENBARCADO EN UN BOTE PARA SU RESPECTIVO TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, EL CUAL NO HA ARRANCADO DEL EMBARCADERO POR NIVELES BAJOS DEL RIO PUTUMAYO.
DE ACUERDO A LO INFORMADO POR PARTE DEL CONTRATISTA AL OBSERVAR QUE HASTA LA FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 EL BOTE QUE TRANSPORTA LOS MATERIALES FALTANTES PARA LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, NO HA PODIDO SALIR DEL PUERTO DE PUERTO ASIS HACE REFERENCIA DE REALIZAR UNA POSIBLE PRORROGA AL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PARA NO AFECTAR EN EL PROCESO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE LA OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT CONT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT. EJEC.	VALOR EJEC.	% EJEC. POR ITEM
2	EXCAVACION Y PRELIMINAR							
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	598	$ 7.196,00	$ 4.303.208,00	598,00	$ 4.303.208,00	100,00%
2,2	DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL E =10CM	M2	295,2	$ 7.964,00	$ 2.350.973,00	295,20	$ 2.350.973,00	100,00%
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	30,8	$ 53.247,00	$ 1.640.008,00	30,80	$ 1.640.008,00	100,00%
2,4	RELLENO CON COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	19,964	$ 31.010,00	$ 619.084,00	19,96	$ 619.084,00	100,00%
2,5	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0,05 CM	M3	0,7	$ 540.121,00	$ 378.085,00	0,70	$ 378.085,00	100,00%
3	ACEROS PARA CIMIENTOS							
3,1	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA CIMENTACIÓN	KG	176	$ 20.850,00	$ 3.669.600,00	176,00	$ 3.669.600,00	100,00%
3,2	ACERO DE REFUERZO DE (60.000 psi) PARA PEDESTAL	KG	234,66	$ 20.850,00	$ 4.892.661,00	234,66	$ 4.892.661,00	100,00%
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS BASE DE ACERO DE 30 x 30 CM de 14MM	UNI	14	$ 128.500,00	$ 1.799.000,00	7,00	$ 899.500,00	50,00%
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE 5/8" DE L= 50 CM INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS (VER DE TALLE DE PERNOS)	UNI	84	$ 14.950,00	$ 1.255.800,00	84,00	$ 1.255.800,00	100,00%
4	CONCRETOS							
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA DE 1,00 MT X 1,00 MT X0,35 MT	M3	4,9	$ 1.097.440,00	$ 5.377.456,00	4,90	$ 5.377.456,00	100,00%
4,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL DE 40 x 40 CM	M3	2,8	$ 1.301.440,00	$ 3.644.032,00	2,80	$ 3.644.032,00	100,00%
5	CUBIERTAS							
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA CURVA CALIBRE 28 TERMOACÚSTICA CON ACABADO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 (180 G/M2).	M2	651	$ 80.120,00	$ 52.158.120,00	325,50	$ 26.079.060,00	50,00%
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE CORTE E INSTALACIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	KG	8450	$ 23.970,00	$ 202.546.500,00	4.225,00	$ 101.273.250,00	50,00%
6	PINTURA Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS							

6,1	SUMINISTRO E INSTALALCION DE PORTERIA MULTIPLE FIJA INCLUYE MALLA 100% NYLON COLOR NEGRO PINTURA EN ESMALTE TRES MANOS	UNI	2	$ 2.865.700,00	$ 5.731.400,00	1,00	$ 2.865.700,00	50,00%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARALES PARA VOLEIBOL (INCLUYE PARAL GALV DE 3" EN TUBERÍA CON MALLA 100% NYLON Y PINTURA ESMALTADA	UND	1	$ 412.680,00	$ 412.680,00	0,00	$ -	0,00%
6,3	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE MICROFÚTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRÁFICO ALTO ANCHO 10 CM DE ACUERDO AL DISEÑO	ML	390	$ 15.810,00	$ 6.165.900,00	195,00	$ 3.082.950,00	50,00%
7	GRADERIA Y CANALES							
7,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE GRADERÍAS	M3	12	$ 1.301.440,00	$ 15.617.280,00	12,00	$ 15.617.280,00	100,00%
7,2	LOSAS DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERÍAS	M3	3,328	$ 1.301.440,00	$ 4.331.192,00	3,33	$ 4.331.192,00	100,00%
7,3	ACERO PARA GRADERÍAS DE 60000 PSI	KG	1480,5	$ 20.850,00	$ 30.868.425,00	1.480,50	$ 30.868.425,00	100,00%
7,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PARA GRADERÍAS	M2	145,28	$ 106.741,00	$ 15.507.332,00	72,64	$ 7.753.666,00	50,00%
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO DE 30 *17 CON SALIDA DE 4"	ML	60	$ 118.822,00	$ 7.129.320,00	30,00	$ 3.564.660,00	50,00%
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BAJANTES EN PVC DE 4"	ML	118,8	$ 55.383,00	$ 6.579.500,00	59,40	$ 3.289.750,00	50,00%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 376.977.556,00		$ 227.756.340	
	ADMISTRACION	26%			$ 98.014.165,00		$ 59.216.648	
	UTILIDAD	1%			$ 3.769.776,00		$ 2.277.563	
	IMPREVISTOS	3%			$ 11.309.327,00		$ 6.832.690	
	SUBTOTAL COSTO DE OBRA				$ 113.093.268,00		$ 296.083.242	
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 490.070.823,00		**$ 296.083.242**	**60,42%**

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT CONT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT. EJEC.	VALOR EJEC.	% EJEC.
1	INTERVENTORIA TECNICA ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AMPLIACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 ENTRE CRA 3 Y EL BOXCULVERT VIA AL SENA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	GL	1,00	90.443.533	90.443.533	0,60	54.642.744	**60,42%**
	TOTAL				$ 90.443.533		$ 54.642.744	60,42%
	TOTAL OBRA				$ 90.443.533		$ 54.642.744	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA						**$ 54.642.744**	**60,42%**

4.1 INFORMACIÓN LEGAL OBRA

POLIZAS PRESENTADAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPARO	VIGENCIA INICIAL DESDE	VIGENCIA INICIAL HASTA					
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/11/2025	5/01/2026	VIGENTE				560-74-994000036471 ANEXO 0
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	12/11/2025	2/05/2026	VIGENTE				560-74-994000036471 ANEXO 0

4.2 INFORMACIÓN LEGAL INTERVENTORIA

POLIZAS PRESENTADAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

AMPARO	VIGENCIA INICIAL DESDE	VIGENCIA INICIAL HASTA					
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14/11/2025	30/04/2026	VIGENTE				CHU-100062633 ANEXO 0

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

NOMBRE	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE VISITA TECNICA INICIAL	18 de NOV 2025		
ACTA DE INICIO	18 de NOV 2025		
ACTA ADICION			
ACTA DE VISITA TECNICA	02 de DICIEMBRE de 2025		
ACTA DE VISITA TECNICA	18 de DICIEMBRE de 2025		

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA

INGENIERO CIVIL

CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR			
No.	VALOR	FECHA	CAUSALES
1	$ -		

CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO			
No.	TIEMPO PRORROGA	FECHA	CAUSALES
1			

5.1 INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA

VALOR ANTICIPO ENTREGADO: $ 0

No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMOTIZACIÓN ANTICIPO	ACUMULADO
TOTAL					

NO SE LE HAN REALIZADO PAGO DE NINGUN TIPO DE ACTA TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NOS HABLA DE UN PAGO PARCIAL DEL 80% DE EJECUCION

5.2 INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

VALOR ANTICIPO ENTREGADO: $ 0

No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMOTIZACIÓN ANTICIPO	ACUMULADO
TOTAL					

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA HA SIDO GARANTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LE CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

SOBRE LOS REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS PERMANENTES EN LA OBRA SE DEJA COMO CONSIGNA PRINCIPAL DEJAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO EL SUPERVISOR REALIZO VISITAS AL SITIO DE OBRA VERIFICANDO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO, POR INTERMEDIO DE EL SECRETARIO DE INFREESTRUCTURA REALIZO VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, PARA ASI VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIADES DE LA OBRA, SE DEJA EN EVIDENCIA QUE ELPORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA ES DE UN 60.42% TENIENDO EN CUENTA DE PORCENTAJE DE LOS MATERIALES COMPRADOS Y EN OBRA.

SE REALIZA RECOMENDACIÓN EN LA VISITA TECNICA DE PARTE DE LOS ENTES CONTRATANTES TENER EN CUENTA UNA POSIBLE PORROGA AL PRESENTE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA SI LOS NIVELES DEL RIO PUTUMAYO NO AUMENTA, YA QUE AFECTA AL DESARROLLO NORMAL EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.

HASTA LAFECHA NO SE HAN REALIZADO DESEMBOLSOS AL CONTRATISTA NI AL INTERVENTOR, DE ESTA MISMA MANERA NO SE HAN REALIZADO NINGUN TIPO DE SUSPENCIONES NI PRORROGAS NI ACTAS DE MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO DE OBRA.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

SE DEBEN ANEXAR EN LA SIGUIENTE HOJA, FOTOGRAFIAS A COLOR


EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INGENIERO CIVIL


1. INFORMACION GENERAL					
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

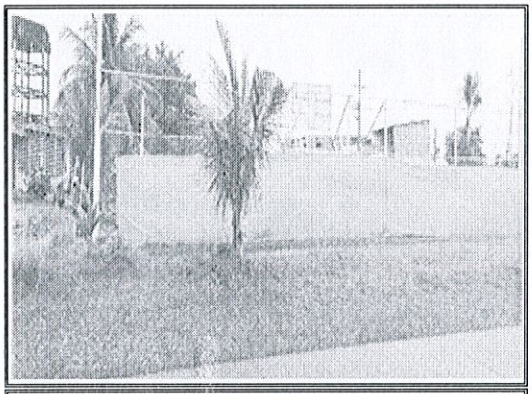


CERRAMIENTO OBRA CON LONA



CERRAMIENTO OBRA CON LONA

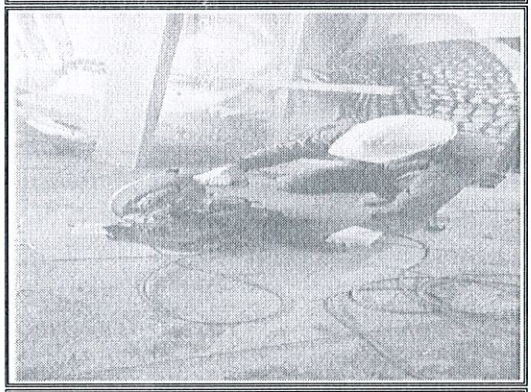


CORTE DE ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

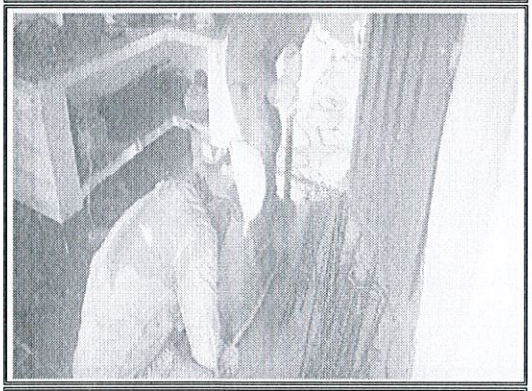

FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2 PARA ZAPATAS Y PEDESTALES



ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI CANASTILLAS PARA ZAPATAS

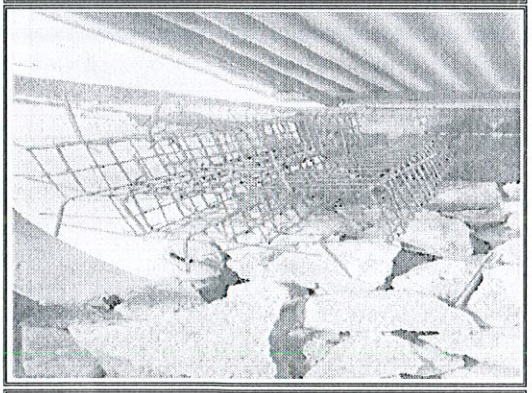

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI CANASTILLAS PARA PEDESTALES


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO


INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL


OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

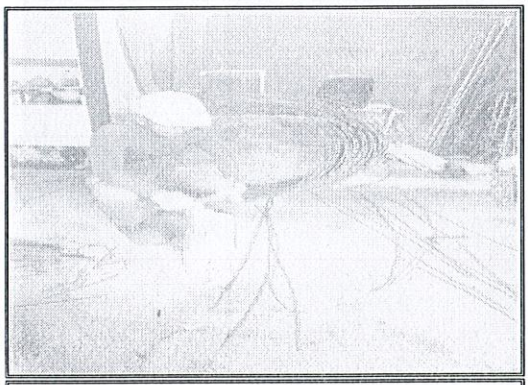


CORTE DE ACERO DE REFUERZO PARA ESTRIBOS DE PEDESTALES

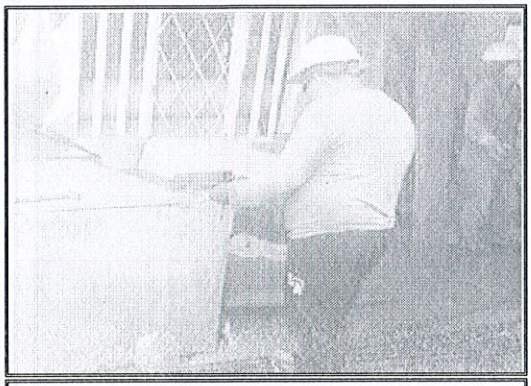


FIGURADO DE ACERO DE 3/8 PARA ESTRIBOS DE PEDESTALES

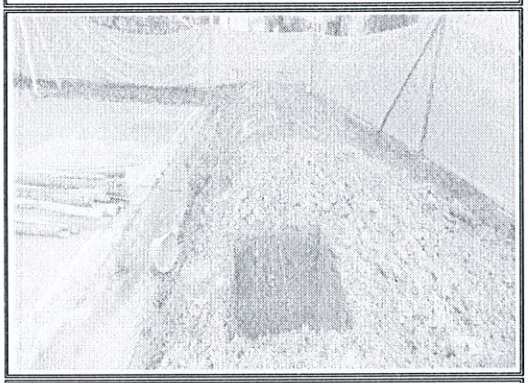


LOCALIZACION REPLANTEO DE AREAS DE ZAPATAS Y EXCAVACION MANUAL

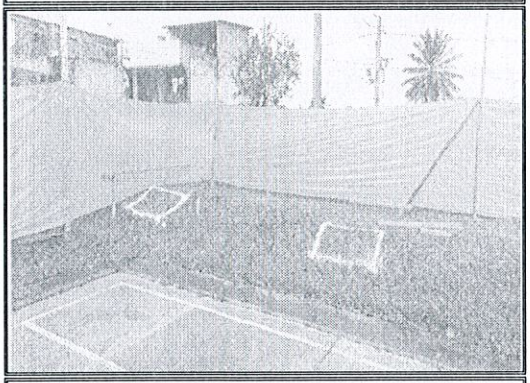

LOCALIZACION REPLANTEO DE AREAS DE ZAPATAS

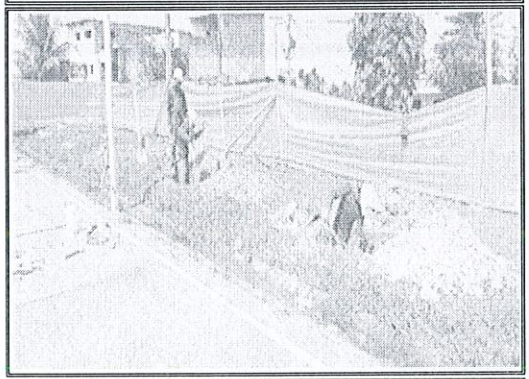

EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS

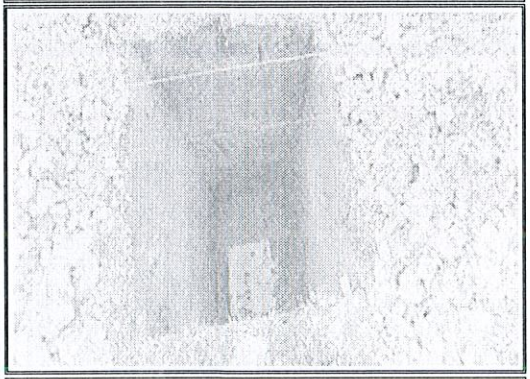

EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE ACUERDO A DISEÑO


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO


INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL


OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

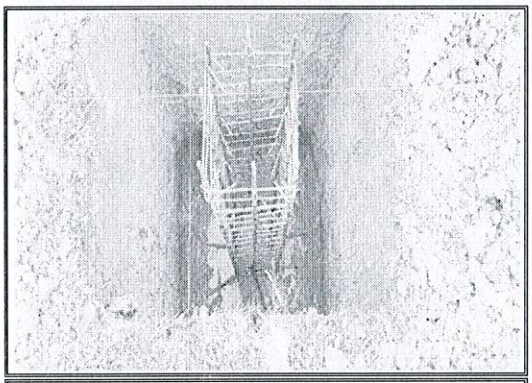

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZOPARA ZAPATAS Y FUNDICION DE ZAPATAS EN CONCRETO

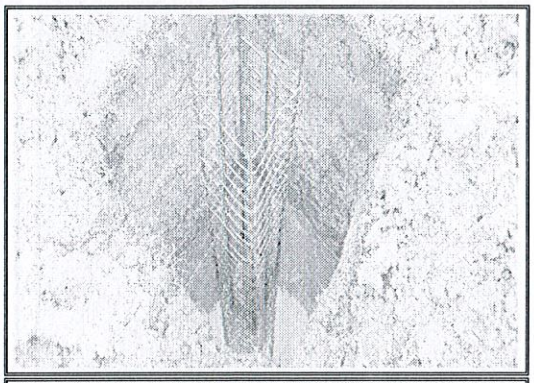


INSTALACION DE ACERO DE REFUERZOPARA ZAPATAS Y FUNDICION DE ZAPATAS EN CONCRETO

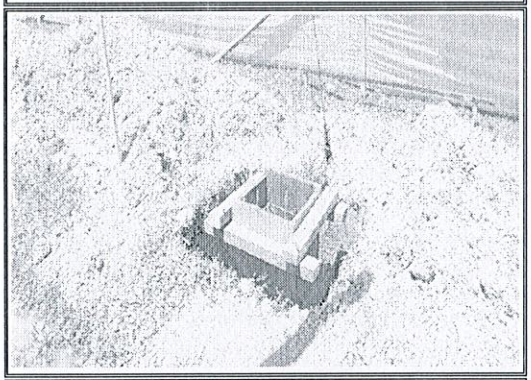


FORMALETAS EN MADERA PARA PEDESTALES DE ,40*,40



FORMALETAS EN MADERA PARA PEDESTALES DE ,40*,40

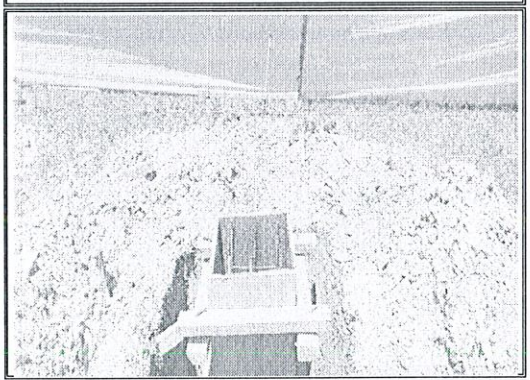

FORMALETAS EN MADERA PARA PEDESTALES DE ,40*,40

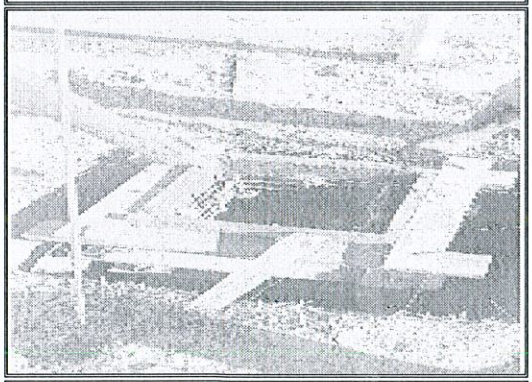

FORMALETAS EN MADERA PARA PEDESTALES DE ,40*,40


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO


INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL


OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

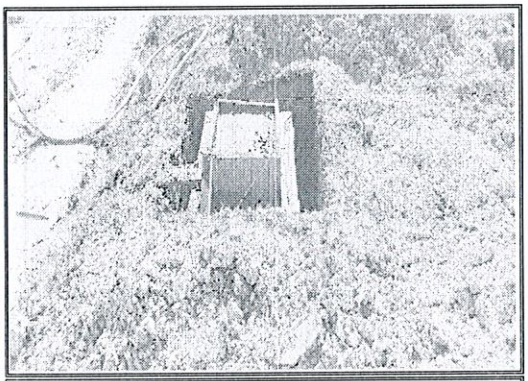


FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI

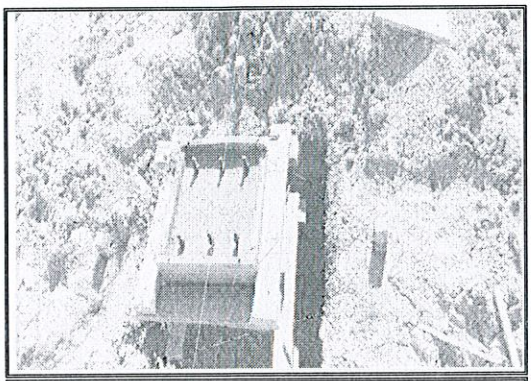


FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

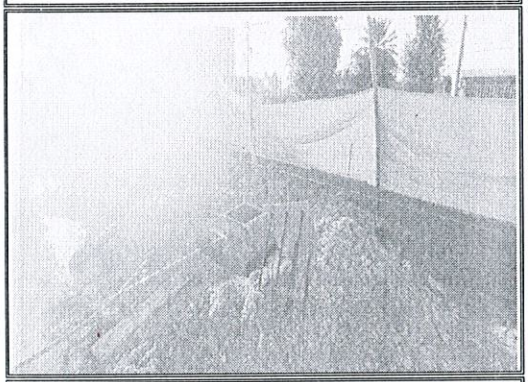


FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

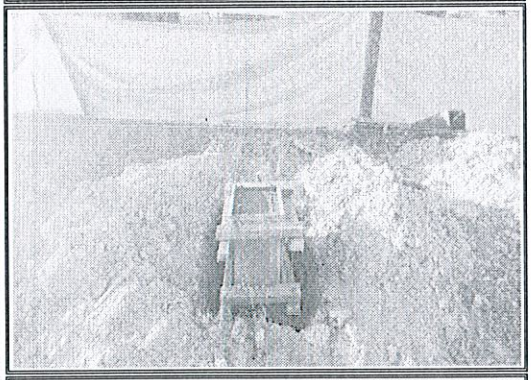

FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

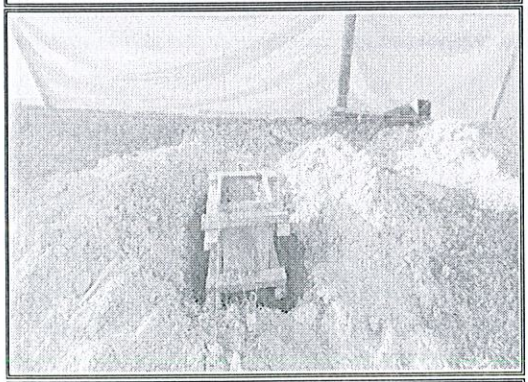

FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

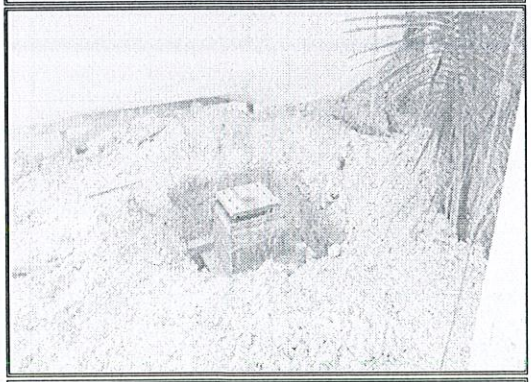

FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO


INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL


OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				




FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

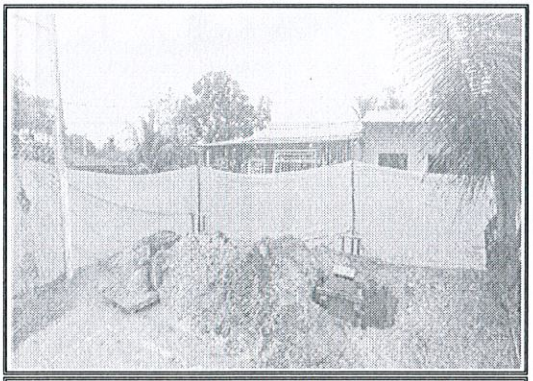


FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI E INSTALACION DE PERNOS DE 5/8

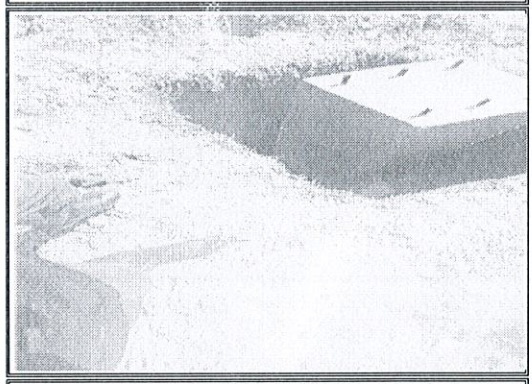


DECENCOFRADO DE PEDESTALES

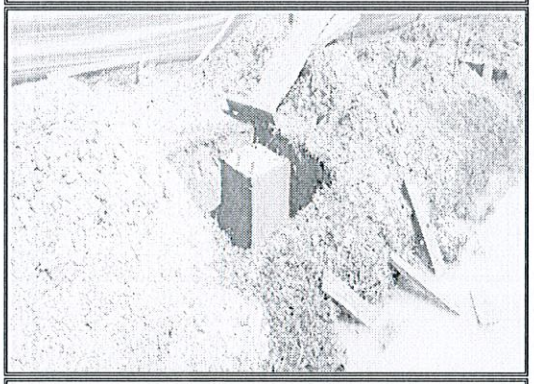

DECENCOFRADO DE PEDESTALES

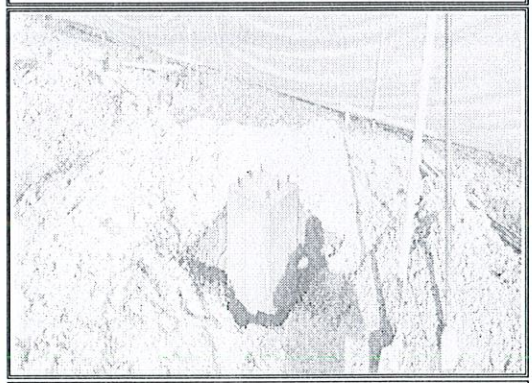

DECENCOFRADO DE PEDESTALES

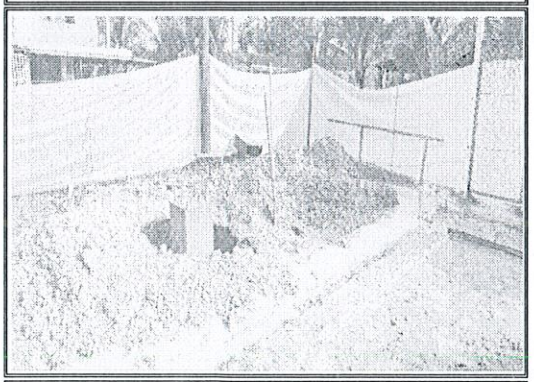


DECENCOFRADO DE PEDESTALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


REGISTRO FOTOGRAFICO

INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL					
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

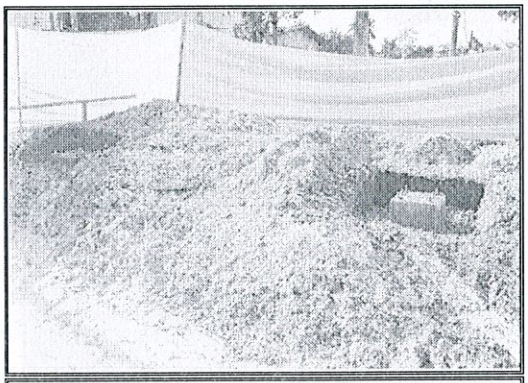


RELLENO DE EXCAVACION DE PEDESTALES CON MATERIALSOBRANTE DE EXCAVACION

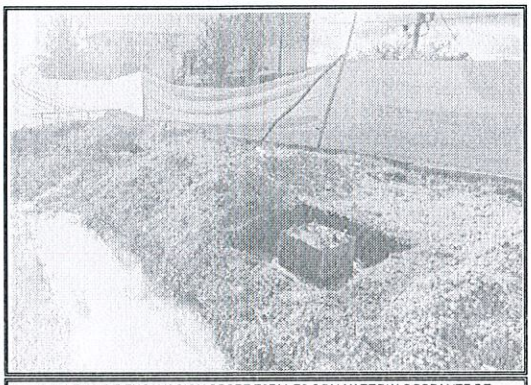


RELLENO DE EXCAVACION DE PEDESTALES CON MATERIALSOBRANTE DE EXCAVACION





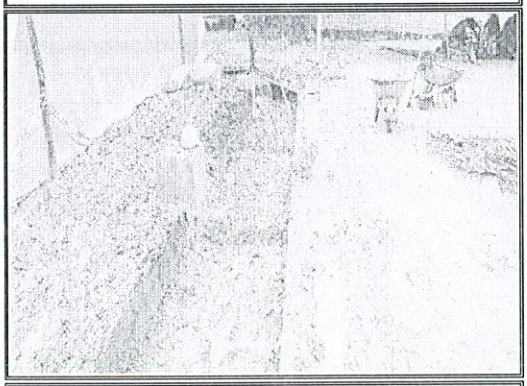

EXCAVACION MANUAL PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA SOPORTE DE GRADERIA

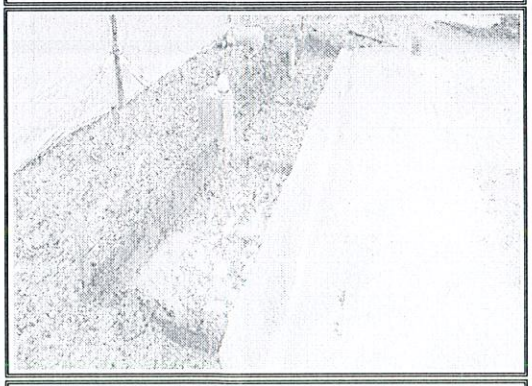


EXCAVACION MANUAL PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA SOPORTE DE GRADERIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL					
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				



INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO SOPORTE DE GRADERIAS




INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO SOPORTE DE GRADERIAS




INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO SOPORTE DE GRADERIAS



INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO SOPORTE DE GRADERIAS

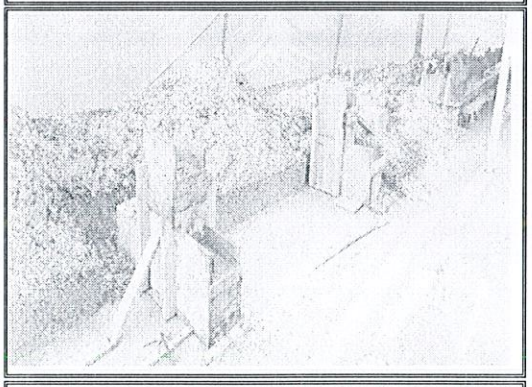

ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

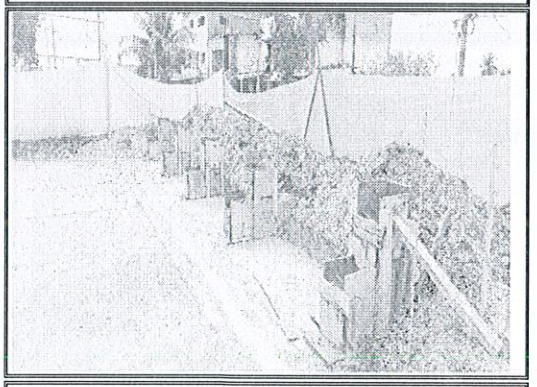

ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO


INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL


OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

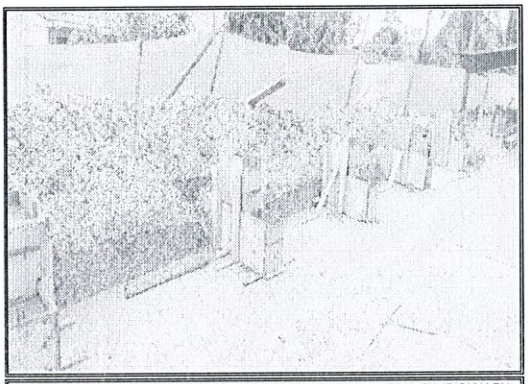


ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

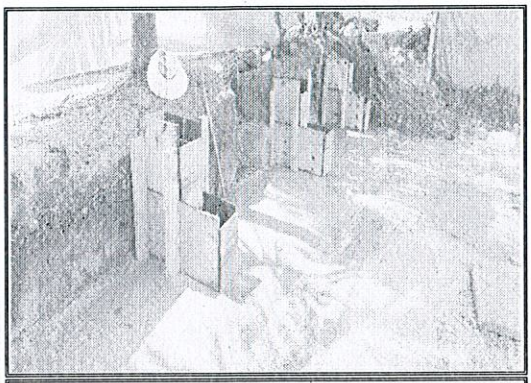


ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

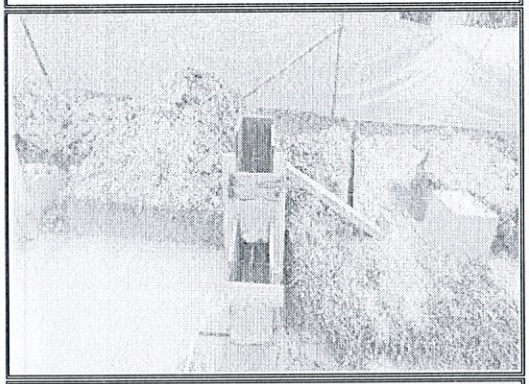


ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

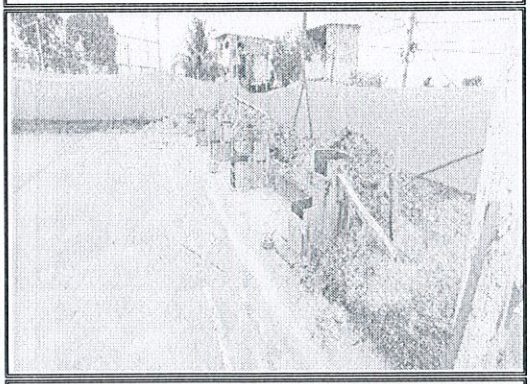

ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

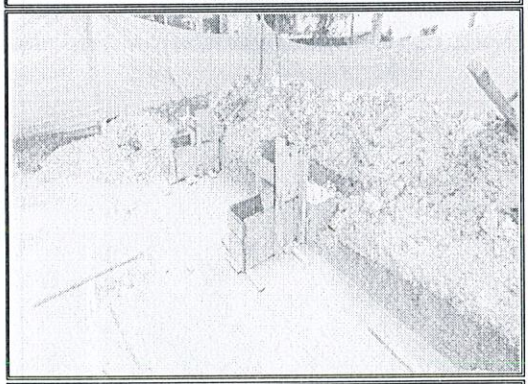


ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

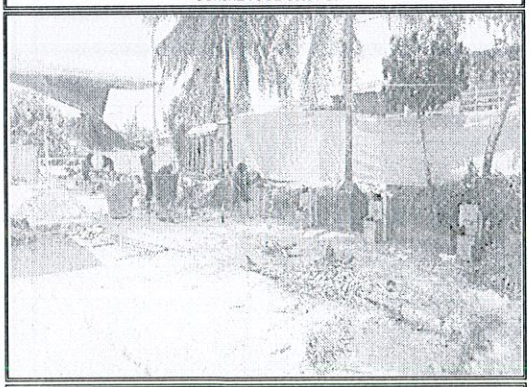


ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALASOPORTE DE GRADERIA,FUNDICION EN CONCRETO DE 3000 PSI

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	INGENIERO CIVIL


1. INFORMACION GENERAL					
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

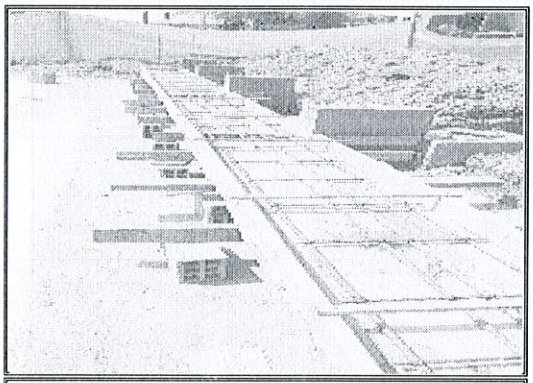


ENCOFRADO EN MADERA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA GRADERIA

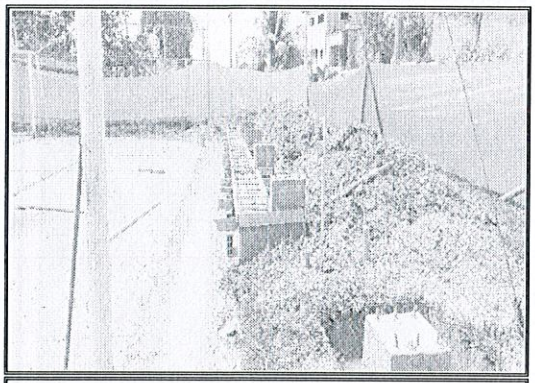


ENCOFRADO EN MADERA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA GRADERIA

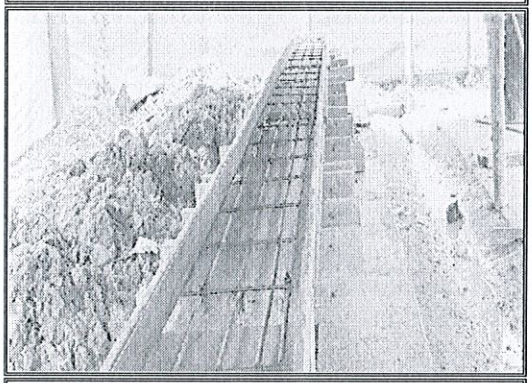


ENCOFRADO EN MADERA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA GRADERIA

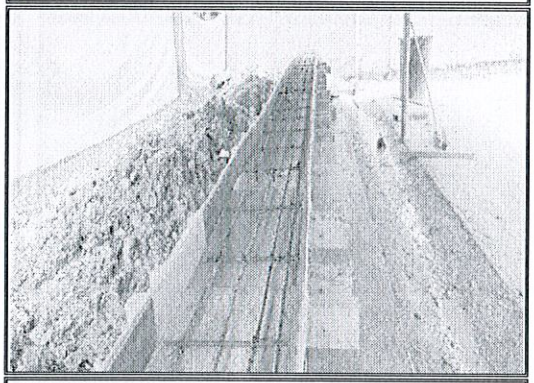

ENCOFRADO EN MADERA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA GRADERIA

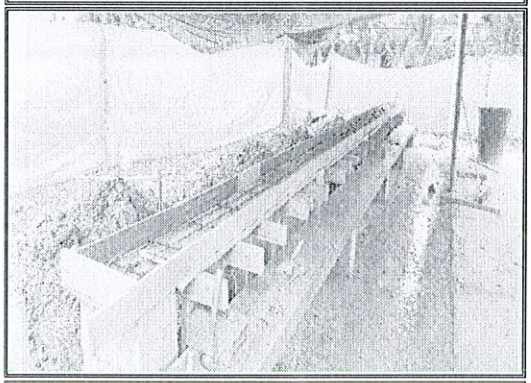

ENCOFRADO EN MADERA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA GRADERIA

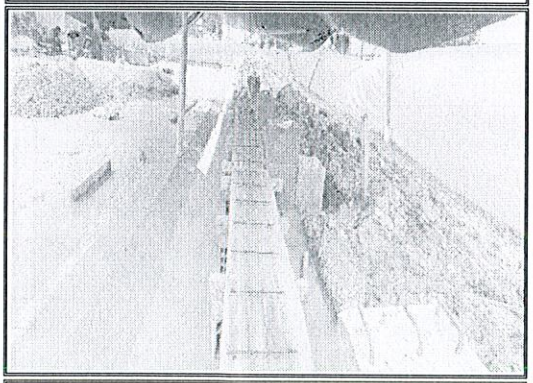

ENCOFRADO EN MADERA CORTE FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA GRADERIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO


INGENIERO CIVIL

1. INFORMACION GENERAL


OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			**CONTRATO No**	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			**PLAZO**	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			**FECHA INICIO**	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	**MUNICIPIO**	PTO LEGUIZAMO	**FECHA TERM 01**	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

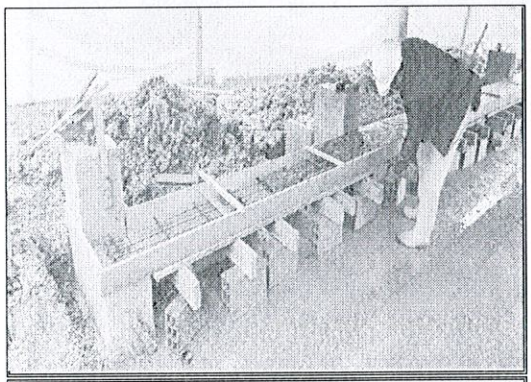


FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

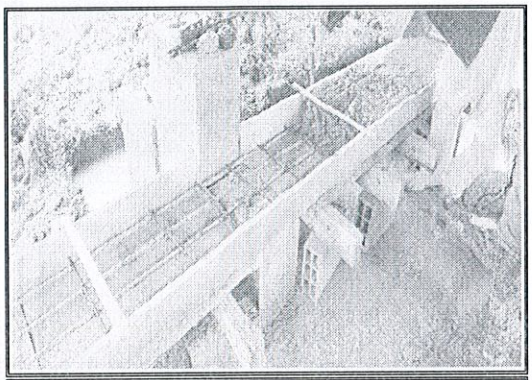


FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

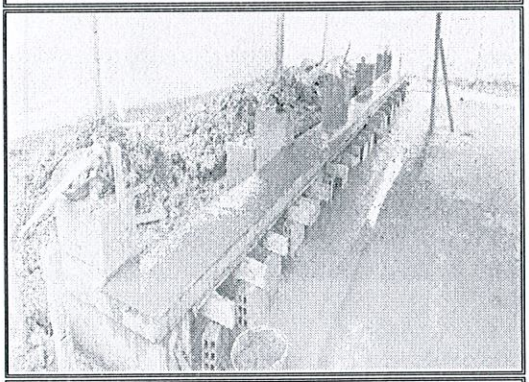


FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

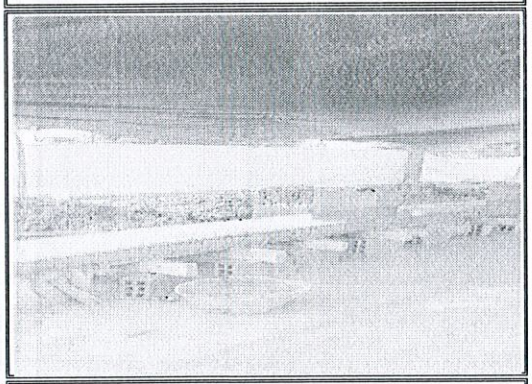

FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

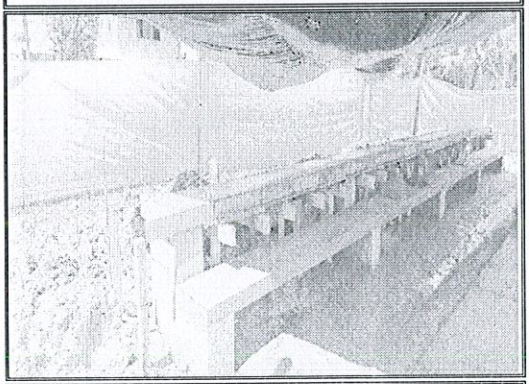

FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

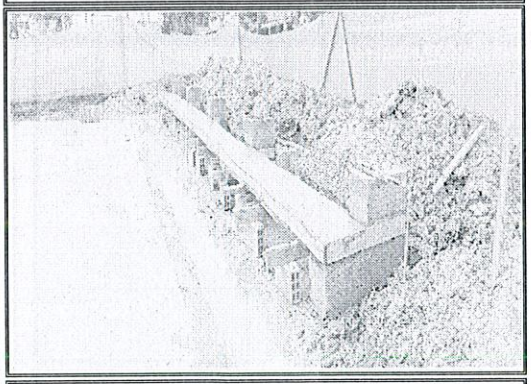


FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


REGISTRO FOTOGRAFICO

INGENIERO CIVIL


1. INFORMACION GENERAL					
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO			CONTRATO No	PS-LP-006-2025
CONTRATISTA	ARCOING SAS			PLAZO	43 DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEGUIZAMO			FECHA INICIO	18-nov-25
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	PTO LEGUIZAMO	FECHA TERM 01	31-dic-25
BARRIO	CENTRO				

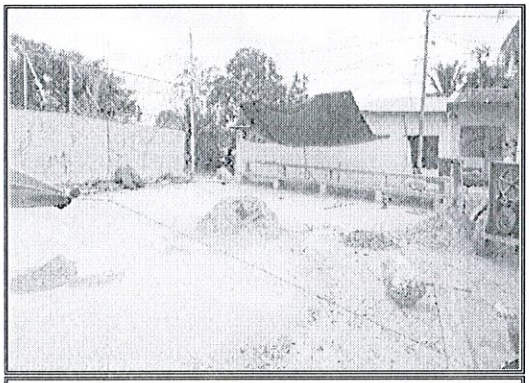


FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

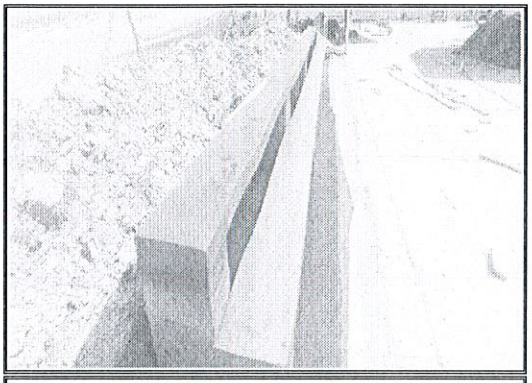


FUNDICION ENCONCRETO DE 3000 PSI DE LOSA PARA GRADERIA

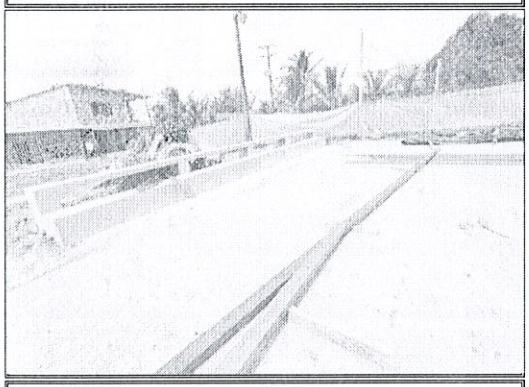


MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA

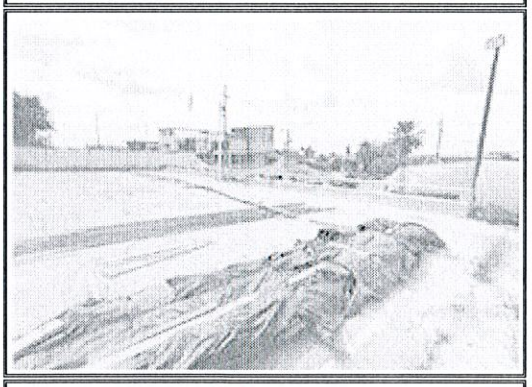

MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA

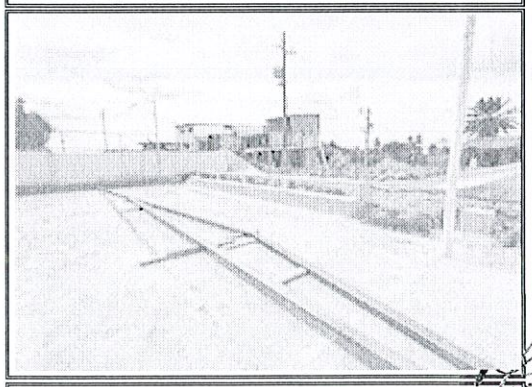

MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA

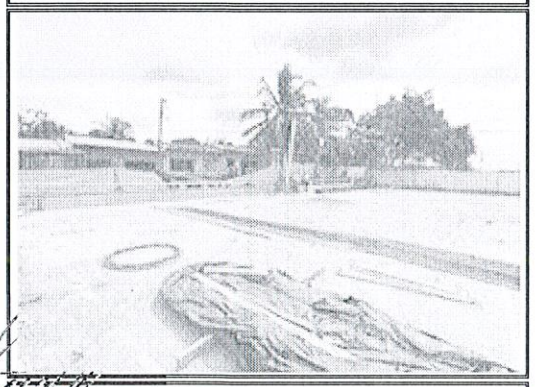

MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CONTRATISTA INTERVENTOR

INFORME FINANCIERO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005-2025
MEJORAMIENTO PLACA DEPORTIVA BARRIO MARTHA LUCÍA LOTERO
CORTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025

1. Antecedentes

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Municipio de Puerto Leguízamo – Putumayo suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 005-2025, con el objeto de aunar esfuerzos para el mejoramiento de la placa deportiva del barrio Martha Lucía Lotero, en el marco del programa Plan Fronteras para la Prosperidad. El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y contempla la ejecución de obras de infraestructura deportiva y su interventoría, orientadas a fortalecer el acceso de la comunidad a espacios adecuados para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

La Alcaldía Municipal de Puerto Leguízamo suscribió el contrato de obra No. PS-LP-006-2025 del 12 de noviembre de 2025 con la firma ARCOING SA, cuyo objeto es la "Adecuación de cancha, graderías y construcción de cubierta para la placa deportiva ubicada en el barrio Martha Lucía Lotero del municipio de Puerto Leguízamo"

La Alcaldía Municipal de Puerto Leguízamo suscribió el contrato de interventoría N° 070-2025 con el señor EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN DE CANCHA GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO MARTHA LUCIA LOTERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Procesos de Contratación Derivada

Contratista	Valor del contrato	Valor Pagado	Valor Pendiente por Pagar
Obra: *ARCOING SA* *PS-LP-006-2025 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025*	$ 490.070.823	00,00	$ 490.070.823

Interventoría: *EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA* *N° 070-2025*	$ 34.304.958	00,00	$ 34.304.958

Observaciones

A la fecha no se evidencia avance financiero correspondiente al convenio interadministrativo 005-2025, teniendo en cuenta que no se ha recibido cuenta por parte de los contratistas tanto de obra como de interventoría.
Para constancia de lo anterior se firma en Puerto Leguizamo a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

LUIS EMILIO BUSTOS MORALES
Alcalde Municipal
