.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Que el contratista BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.S.con Nit. 901.357.168-1, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato que tiene como objeto: la "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE REGIONAL TOLIMA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADA EN LA CALLE 20 #7-48 BARRIO EL CARMEN, IBAGUÉ, TOLIMA" y que entregó en debida forma los anexos requeridos: balance de mayores y menores cantidades, informe semanal, manual de mantenimiento, memorias de cantidades.

La intervención finaliza en términos generales de la siguiente manera:

- Demolicion De Muro (E= 0.10mts/0.15mts) Incluye Corte Con Pulidora
- S/I Mampostería En Ladrillo Medio De 0.12m X 0.12m X 0.06m Con Pega Mortero 1:4 Para Balcones
- Dovela En Grouting Concreto Fluido 21 Mpa (3000 Psi) Para Bloque 0.12m X 0.12m X 0.06m Incluye Anclaje Con Epoxico Y Acero 3/8 Para Dovelas (Para Balcones)
- Viga De Confinamiento Relleno En Mampostería En Ladrillo Medio De 0.12m X 0.12m X 0.06m Con Pega Mortero 1:4 Y Refuerzo De #3 (Para Balcones)
- Impermeabilzante A Dos Manos Que Actue Como Reparador En Muro En Mal Estado Por Humedad Incluye Remocion Y Reposicion De Pintura, Estuco Y/O Pañete Por Presencia De Moho Y Hongos
- Estuco Sobre Pañete Muros Interiores
- Pintura En Vinilo Tipo 1 Para Muros (A 3 Manos)
- Pintura En Vinilo Tipo 1 Para Muros (A 2 Manos)
- S/I Cinta Antideslizante De 50mm
- S/I Pasamano Empotrado A Pared Incluye Apoyo Cada 1 Metro
- Mantenimiento Y Reparacion De Barandas Metalicas Incluye Pintura Tipo Esmalte
- Mantenimiento Y Reparacion De Sanitarios Incluye Cambio Kit Grifería De Tanque
- Mantenimiento Y Reparacion De Puerta Acceso Vehicular, Incluye Trabajos De Soldadura, Anticorrosivo Y Pintura Tipo Esmalte
- Suministro, Instalacion Y Montaje En Dry Wall De Luminaria Panel Led De 60x60, 40 Watt
- Impermeabilizacion Bajo Placa
- Lijado Y Pelada De Muros

- S/I Pintura Tipo Coraza 2 Manos
- Mantenimiento Tuberia 2"
- Demolicion De Superboard
- Instalacion Ventana
- Reparacion De Cielo Raso Exterior En Super Board

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN














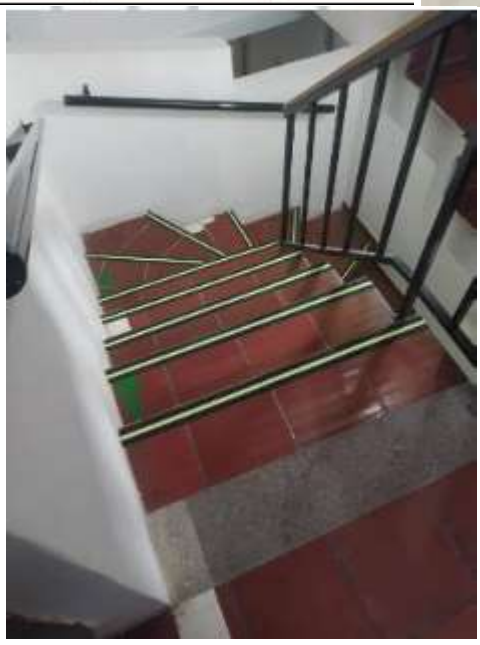







De acuerdo al acta de recibo con observaciones del 30 de septiembre en donde se estipularon actividades de posventa para subsanar el 21 de octubre del presente año, el supervisor da cumplimiento a satisfacción de las actividades contempladas en el contrato

Dada al día 22 del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

JAHAM M. CORDOBA BULA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO,
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
