
CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
PRESUPUESTO DE OBRA					ENERO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS			$ 7,297,487,951.66		$ -
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29	$ 2,116,271,505.58		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS			$ 9,413,759,457.24		$ -
	DIFERENCIA POR AJUSTE					
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS			$ 62,828,082,698.40		$ 234,129,891.27
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023			$ 1,200,000,000.00		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087			$ 64,028,082,699.20		$ 234,129,891.27

Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 31 enero de 2025.

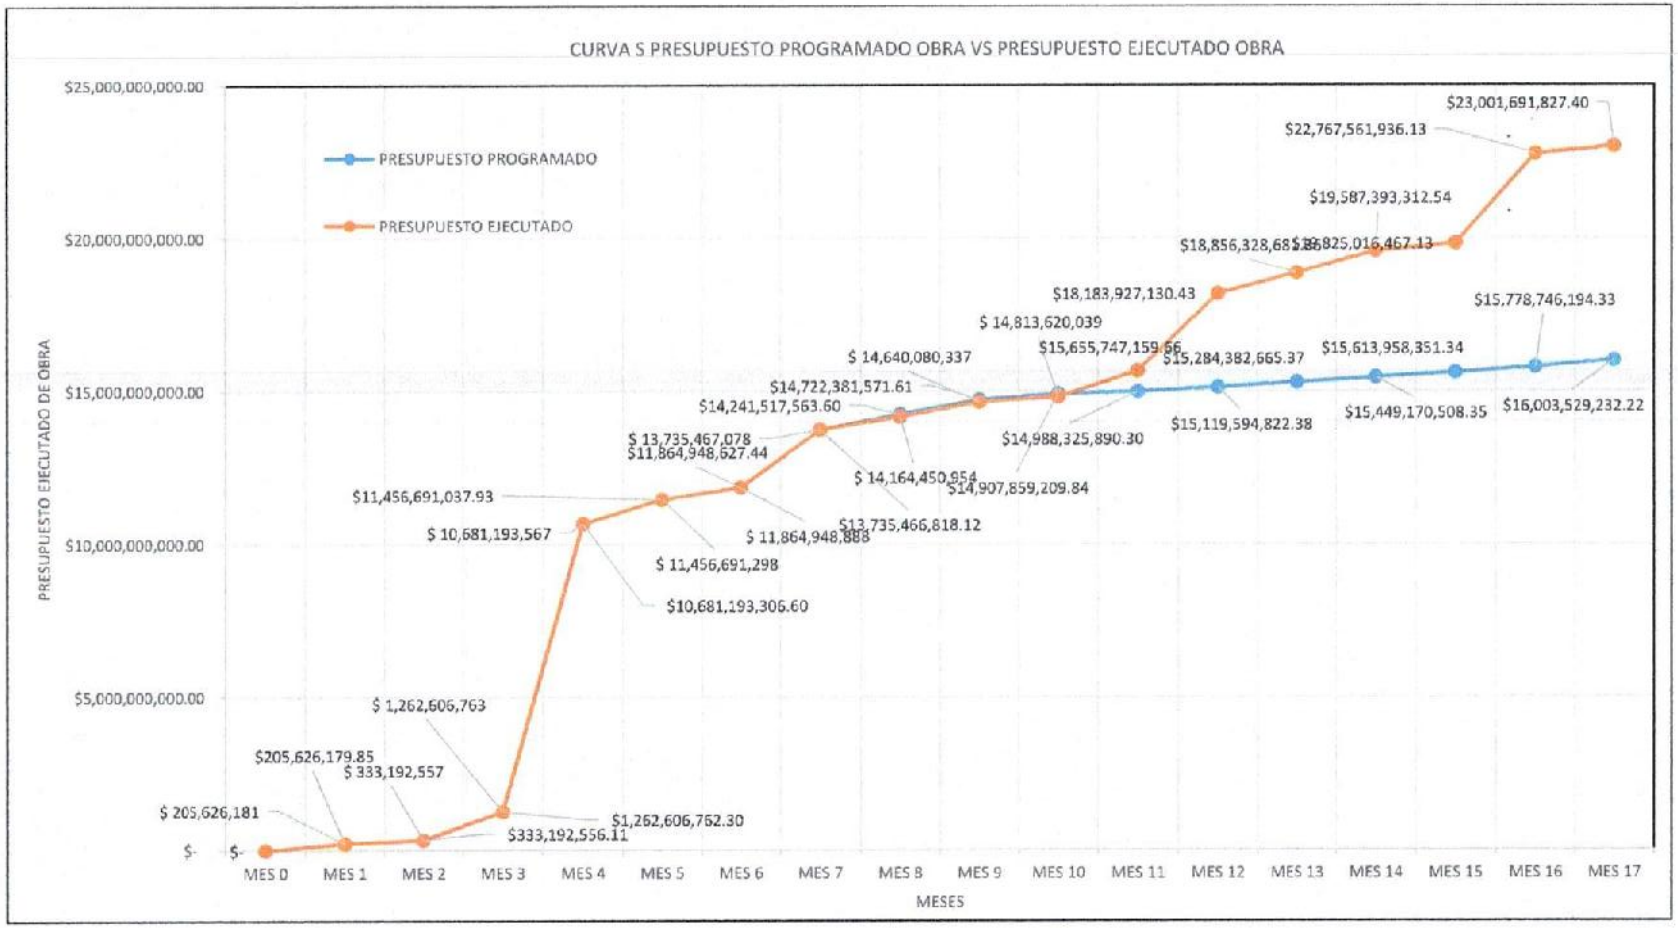

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 31 enero de 2025

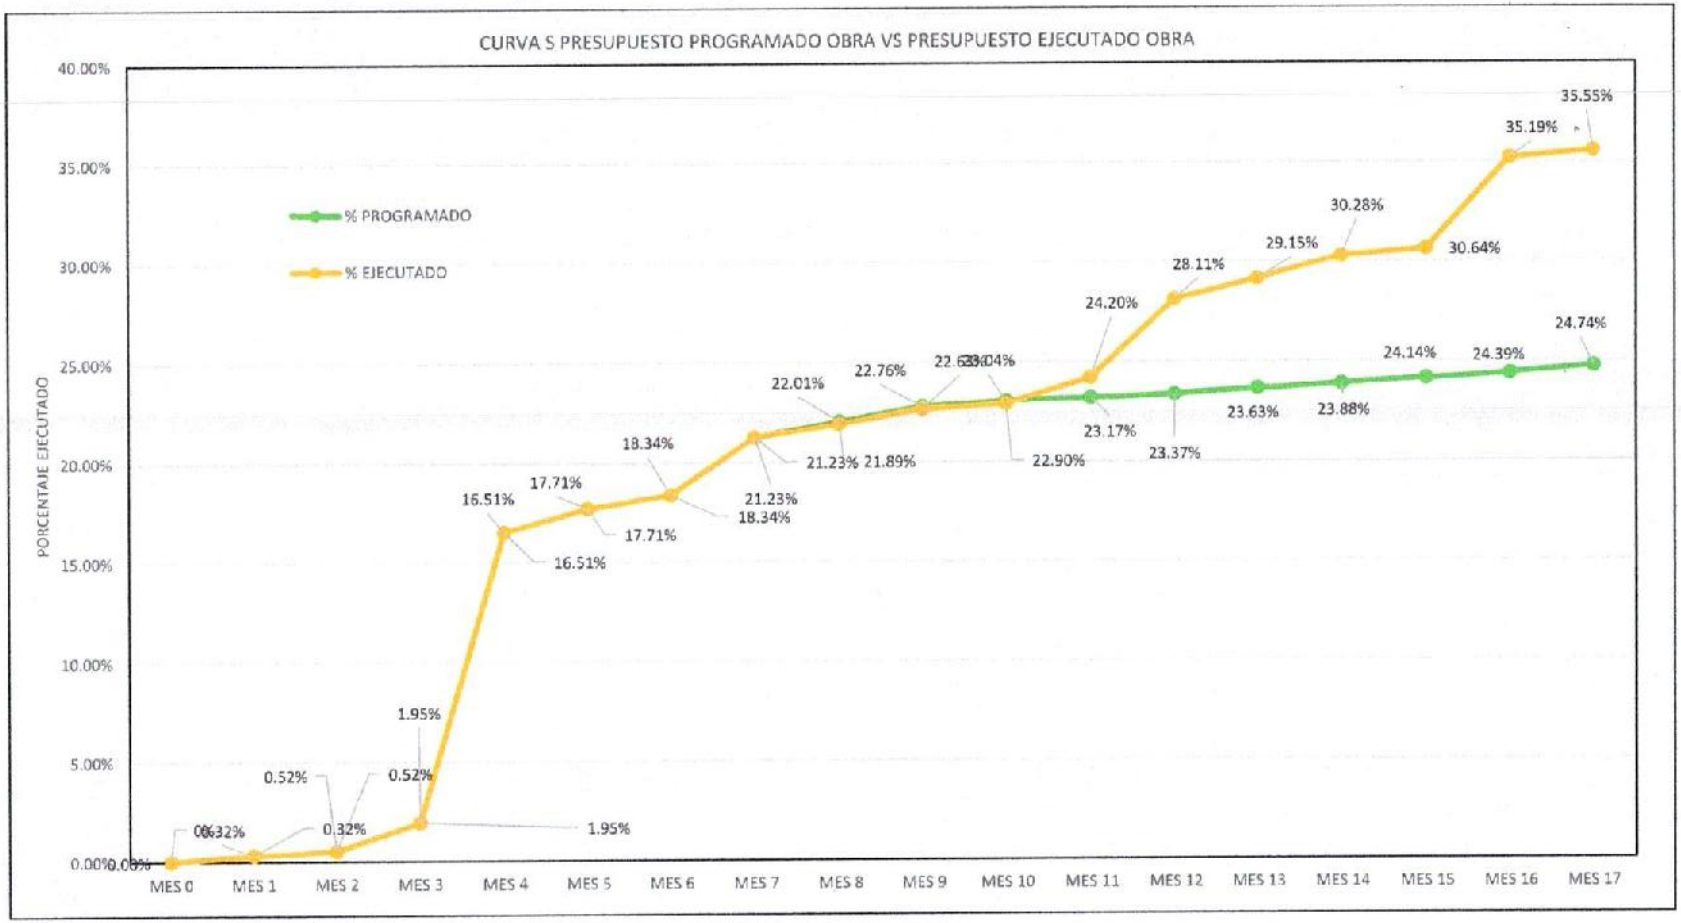

12 Sh

En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 24.74% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 35.55% acumulado, presentando 10.81% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se demolieron estructuras existentes, como muros, placas de piso, vigas, columnas, cubiertas y tuberías, permitiendo la adecuación del espacio requerido para realizar la excavación de la zarpa del muro de contención que se encuentra sobre el eje 1.
- Se realizo el retiro del cableado de datos que se encontraba entre las columnas del módulo D.
- Es importante brindar capacitaciones continuas al personal operativo en nuevas técnicas de construcción y acabados, así como en el manejo adecuado de materiales y equipos especializado para cumplir con las especificaciones requeridas en cada actividad.
- Es impórtate seguir realizando inspecciones en el área de seguridad y salud en el trabajo, minimizando los riegos de cualquier incidente laboral por parte de algún operativo del consorcio.

7. TABLA DE ANEXOS

No DE ANEXOS	DESCRIPCION
Anexo 1	Presupuesto ejecutado enero
Anexo 2	Memoria de cantidades corte 31 enero de 2025
Anexo 3	Curva S – Presupuesto programado vs presupuesto ejecutado.
Anexo 4	Cursa S – Porcentaje programado vs porcentaje ejecutado.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante Legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
PRESUPUESTO DE OBRA					ENERO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**			**$ 289,929,652.24**		**$ 4,818,290.00**
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 68,500.00	$ 23,975,000.00	70.34	$ 4,818,290.00
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**			**$ 2,215,201,283.92**		**$ 31,117,080.03**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	$ 63,401,186.43	2307.36	$ 31,117,080.03
7.0	**INSTALACIONES SANITARIAS**			**$ 766,844,613.48**		**$ 1,065,592.80**
	REDES DE PVC SANITARIA AGUAS RESIDUALES					
7.59	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE	UN	$ 532,796.40	$ 3,196,778.40	2.00	$ 1,065,592.80
8.0	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			**$ 656,978,087.14**		**$ 175,590.48**
	ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR					
	PUNTOS HIDRÁULICOS					
8.93	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS	UN	$ 43,897.62	$ 21,904,912.38	4.00	$ 175,590.48
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**			**$ 5,019,100,465.75**		**$ 6,273,479.40**
	ILUMINACIÓN					
10.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	UND	$ 273,969.40	$ 493,144,920.00	18.00	$ 4,931,449.20


10.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UND	$ 134,203.02	$ 131,518,959.60	10.00	$ 1,342,030.20
10.81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W	UND	$ 185,911.50	$ 27,886,725.00		$ -
11.0	**PISOS-BASES**			**$ 1,277,595,606.78**		**$ 663,563.00**
11.02	ALISTADO PISO 4CM	M2	$ 36,085.76	$ 450,530,713.60	18.39	$ 663,563.00
14.0	**ACABADOS MUROS**			**$ 1,093,767,074.15**		**$ 20,250,537.02**
14.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PARED BLANCO RECTIFICADA TIPO HOSPITALARIO JUNTA PERDIDA 30X60CM, TIPO - CORONA O SIMILAR	M2	$ 130,171.61	$ 890,741,937.71	155.57	$ 20,250,537.02
17	**PINTURA**			**$ 550,717,236.18**		**$ 2,046,464.00**
17.03	FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 12,800.00	$ 52,480,000.00	159.88	$ 2,046,464.00
18.0	**CIELOS RASOS**			**$ 897,641,089.40**		**$ 4,799,655.00**
18.07	PERORACIONES PARA ROCIADORES Y BALAS DE ILUMINACION DIAMETRO MAX. 15 CM	UN	$ 9,200.00	$ 13,984,000.00	10.00	$ 92,000.00
18.08	MEDIA CAÑA EN YESO CON MALLA, ENTRE MUROS Y ENTRE CIELO RAZO Y MUROS	ML	$ 44,500.00	$ 25,676,500.00	105.79	$ 4,707,655.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ -**		**$ 102,219,297.36**
NP1	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCIO 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	$ 570,506.00	$ -	36.86	$ 21,028,851.16
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	$ 795,530.16	$ -	10.25	$ 8,154,184.14
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	$ 1,006,167.28	$ -	54.58	$ 54,917,701.74
NP67	ESTUCO PREPARADO PARA EXTERIOR	M2	$ 59,294.08	$ -	62.05	$ 3,679,197.66
NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	$ 1,304,797.65	$ -	4.62	$ 6,028,165.14
NP93	SUMINISTRO ,TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA	M2	$ 98,000.00		62.94	$ 6,168,120.00

NP156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS 4X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	$ 560,769.38		4.00	$ 2,243,077.52
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 39,566,165,363.82**		**$ 173,429,549.09**
	ADMINISTRACIÓN		29%	$ 11,474,187,955.51		$ 50,294,569.24
	IMPREVISTOS		1%	$ 395,661,653.64		$ 1,734,295.49
	UTILIDAD		5%	$ 1,978,308,268.19		$ 8,671,477.45
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			$ 13,848,157,877.34		$ 60,700,342.18
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN			**$ 53,414,323,241.16**		**$ 234,129,891.27**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS			**$ 7,297,487,951.66**		**$ - **
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29	$ 2,116,271,505.58		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS			**$ 9,413,759,457.24**		**$ - **
	DIFERENCIA POR AJUSTE					
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS			**$ 62,828,082,698.40**		**$ 234,129,891.27**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023			**$ 1,200,000,000.00**		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087			**$ 64,028,082,699.20**		**$ 234,129,891.27**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
2.01	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SOBRANTES				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	10944.28
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Volumen	SUBTOTAL
MODULO A						
EXCAVACION ZAPATAS						
EJE E-2	2.50	2.50	3.00		18.75	18.75
EJE E-3	2.50	2.50	3.00		18.75	18.75
EXCAVACION MUROS DE CONTENCION						
ZARPA MURO CONTENCION 5.90 MTS	4.10	18.3	3.50		14.35	14.35
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION						
VIGA EJE 2 ENTRE EJE B - C	0.40	4.26	0.50		0.85	0.85
VIGA EJE 2 ENTRE EJE C - D	0.40	1.93	0.50		0.39	0.39
VIGA EJE 2 ENTRE EJE D - E	0.40	4.56	0.50		0.91	0.91
VIGA EJE 2 ENTRE EJE E - F	0.40	5.49	0.50		1.10	1.10
VIGA EJE 2 ENTRE EJE F - G	0.40	5.85	0.50		1.17	1.17
					PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL SUELO 25%	2188.86
					ACUMULADO	10944.28
					ACTA MODIFICATORIA 4	12049.47
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1105.19
					COBRADAS PARCIAL No 1	1241.77
					COBRADAS PARCIAL No 2	3937.07
					COBRADAS PARCIAL No 3	2837.53
					COBRADAS PARCIAL No 4	12.22
					COBRADAS PARCIAL No 5	2845.35
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	70.34
OBSERVACIONES:						

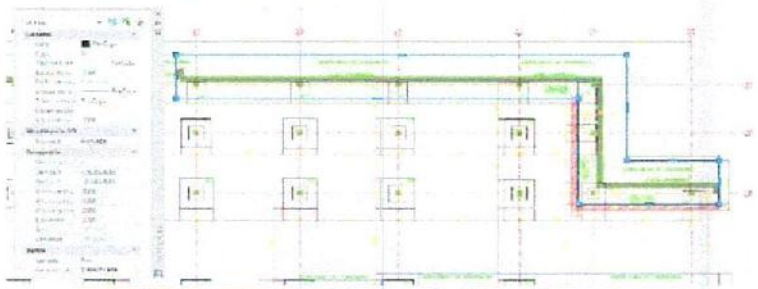



UBICACIÓN PLANO







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	174498.52
		No Varilla	Largo (M)	Peso ml/kg	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
	MODULO A						
Zapata tipo 1	Zapata tipo 1						
	RLx	5	2.85	1.56	34	17	2569.8
	RLy	5	2.85	1.56	34	17	2569.8
	Refuerzo ciclopeo	4	1.2	0.996	16	17	325.1
Zapata tipo 3							
	RLx	5	2.35	1.56	28	3	285.9
	RLy	5	2.35	1.56	28	3	285.9
	Refuerzo ciclopeo	4	1.2	0.996	16	3	57.4
Pedestales tipo 1							
	Verticales	8	1.65	3.975	32	18	3777.6
	Flejes	4	4.66	0.996	9	18	751.9
	Ganchos	3	1.31	0.56	72	18	950.7
Pedestales tipo 3							
	Verticales	8	1.65	3.975	22	3	432.9
	Flejes	4	3.66	0.996	9	3	98.4
	Ganchos	3	1.06	0.56	72	3	128.2
						ACUMULADO	174498.52
						ACTA MODIFICATORIA 4	199229.86
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	24731.34
						COBRADAS PARCIAL No 1	32716.10
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	101151.69
						COBRADAS PARCIAL No 4	27209.05
						COBRADAS PARCIAL No 5	11114.32
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	2307.36
OBSERVACIONES:							

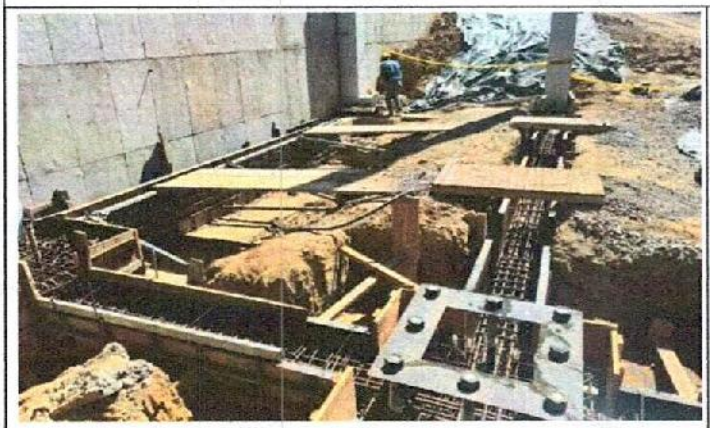

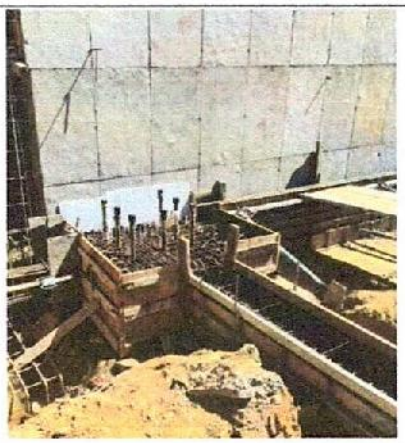



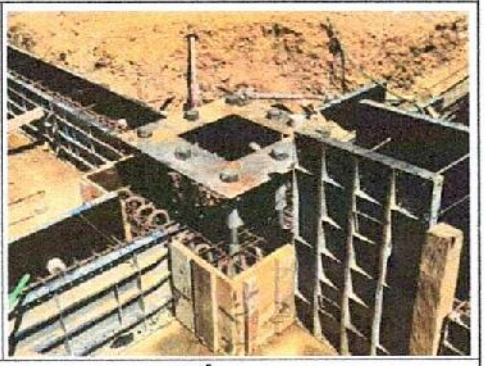

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RÁNGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


7529

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
7.59	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE					UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	20.00
		Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
CENTRAL DE RESIDUOS							
CAJAS SANITARIAS					2		2.00
						ACUMULADO	20.00
						ACTA MODIFICATORIA 4	28.00
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	8.00
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	4.00
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	14.00
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	2.00
OBSERVACIONES:							

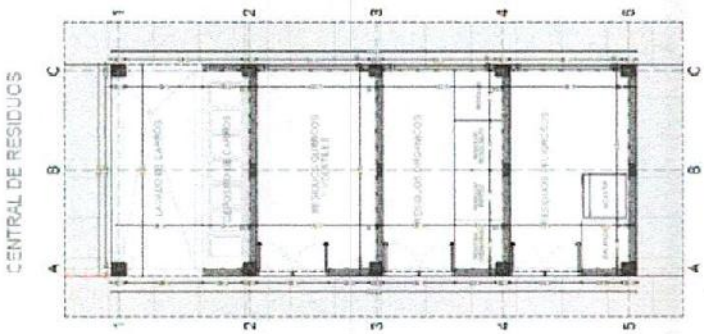

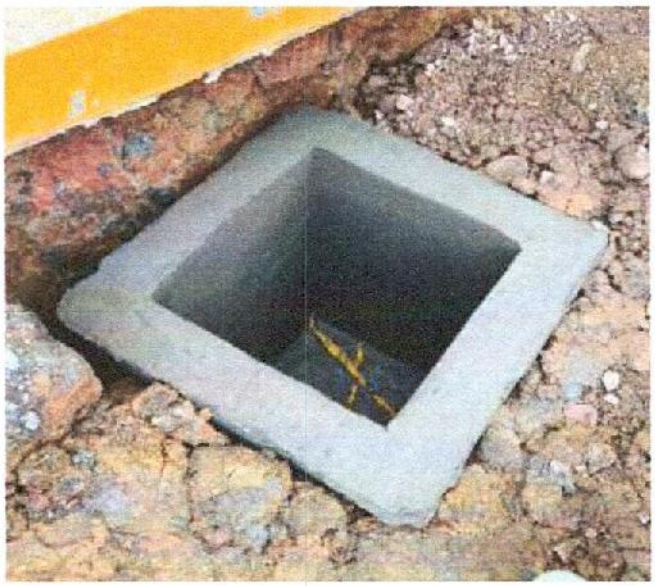

UBICACIÓN PLANO

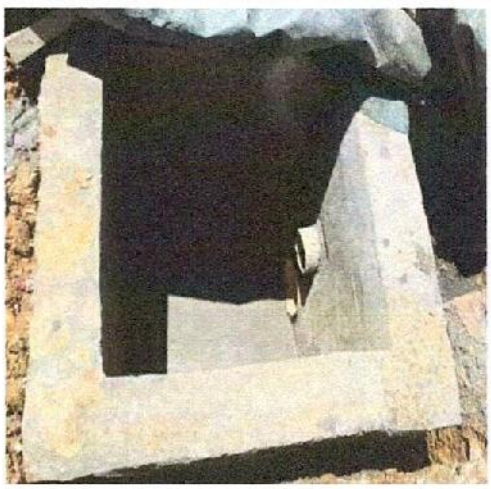



IMÁGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
8.93	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS					UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	28.00
		Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
CENTRAL DE RESIDUOS							
PUNTO DE AGUA					4.00		4.00
						ACUMULADO	28.00
						ACTA MODIFICATORIA 4	154.00
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	126.00
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	20.00
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	4.00
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	4.00

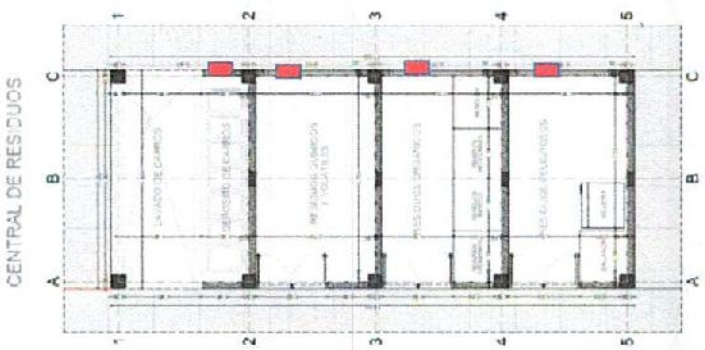








UBICACIÓN PLANO

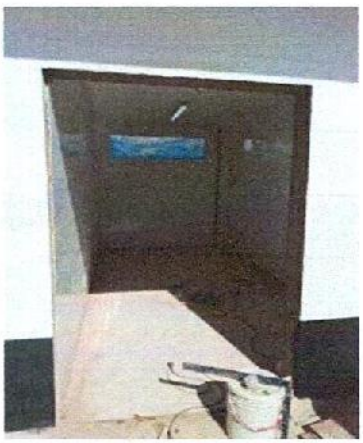

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7530


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
10.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	TOTAL	159.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				ML	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
CENTRAL DE RESIDUOS						
PUNTOS INTERNOS				8.00		8.00
PUNTOS EXTERNOS				10.00		10.00

ACUMULADO	159.00
ACTA MODIFICATORIA 4	1428.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1269.00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	102.00
COBRADAS PARCIAL No 5	39.00
CANTIDADES PRESENTE ACTA	18.00

OBSERVACIONES:

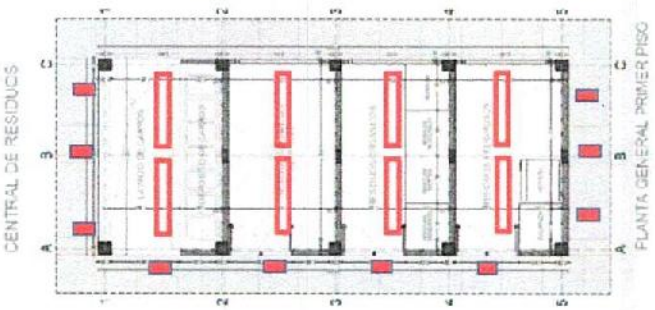

UBICACIÓN PLANO




IMÁGENES





UBICACIÓN PLANO

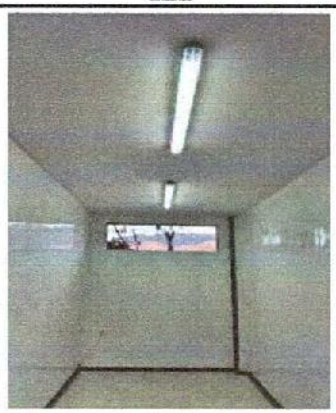

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7531

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
10.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W
UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	206.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cantidad	
CENTRAL DE RESIDUOS						
PUNTOS EXTERNOS				10.00		10.00


ACUMULADO	206.00
ACTA MODIFICATORIA 4	698.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	492.00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	196.00
CANTIDADES PRESENTE ACTA	10.00

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN PLANO

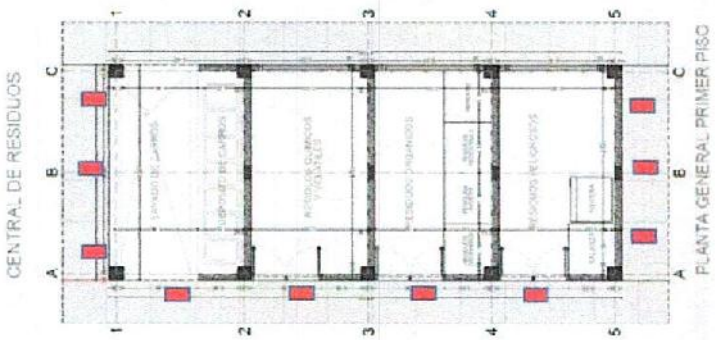

IMÁGENES

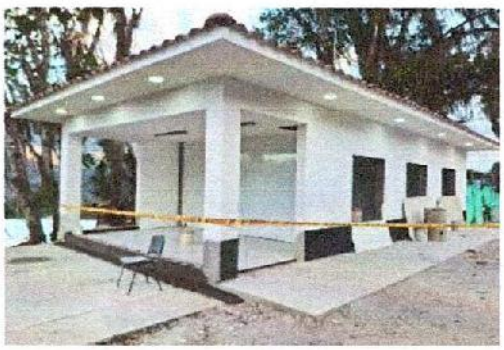

IMÁGENES



IMÁGENES

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


7032

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
11.02	ALISTADO PISO 4CM				TOTAL	162.73
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				M2	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
CENTRAL DE RESIDUOS						
AREA	3.45	5.33				18.39
					ACUMULADO	162.73
					ACTA MODIFICATORIA 4	4047.24
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	3884.51
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					COBRADAS PARCIAL No 4	
					COBRADAS PARCIAL No 5	144.34
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	18.39

OBSERVACIONES

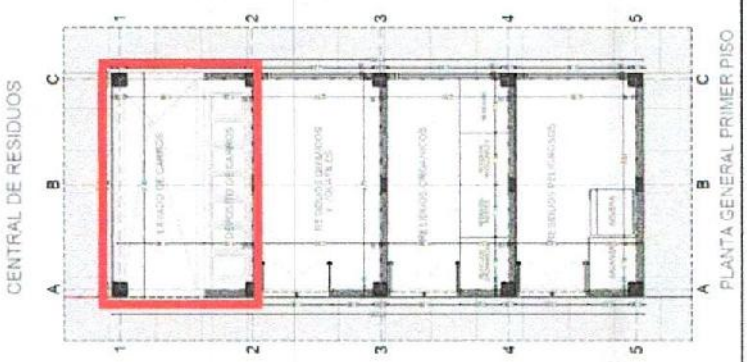

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7033

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
14.01	SUMINISTRO ,TRANSPORTE Y COLOCACION DE BALDOSA EN CERAMICA PARA BAÑO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	512.77
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
CENTRAL DE RESIDUOS						
LAVADO DE CARROS						
M1		5.33	2.7		1.00	14.39
M2		1.45	2.7		1.00	3.92
M3		1.45	2.7		1.00	3.92
RESIDUOS QUIMICOS Y VOLATILES						
M4		5.50	2.7		1.00	14.85
M5		2.70	2.7		1.00	7.29
DESCUENTO VENTANA		2.00	-0.5		1.00	-1.00
M6		2.70	2.7		1.00	7.29
DESCUENTO PUERTA		1.50	-2.17		1.00	-3.26
M7		5.30	2.7		1.00	14.31
RESIDUOS ORGANICOS						
M8		5.50	2.7		1.00	14.85
M9		2.70	2.7		1.00	7.29
DESCUENTO VENTANA		2.00	-0.5		1.00	-1.00
M10		2.70	2.7		1.00	7.29
DESCUENTO PUERTA		1.50	-2.17		1.00	-3.26
M11		5.30	2.7		1.00	14.31
RESIDUOS PELIGROSOS						
M12		5.50	2.7		1.00	14.85
M13		2.70	2.7		1.00	7.29
DESCUENTO VENTANA		2.00	-0.5		1.00	-1.00
M14		2.70	2.7		1.00	7.29
DESCUENTO PUERTA		1.50	-2.17		1.00	-3.26
M15		5.30	2.7		1.00	14.31
M16		1.65	0.6		1.00	0.99
M17		1.38	0.6		1.00	0.82
M18		1.41	0.6		1.00	0.85
M19		1.43	0.6		1.00	0.86
M20		5.77	0.6		1.00	3.46
M21		10.40	0.6		1.00	6.24
COL 1		0.35	0.6		4.00	0.84
COL 2		0.35	0.6		4.00	0.84
					ACUMULADO	512.77
					ACTA MODIFICATORIA 3	1640.04
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1127.27
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					COBRADAS PARCIAL No 4	357.20
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	155.57
OBSERVACIONES:						

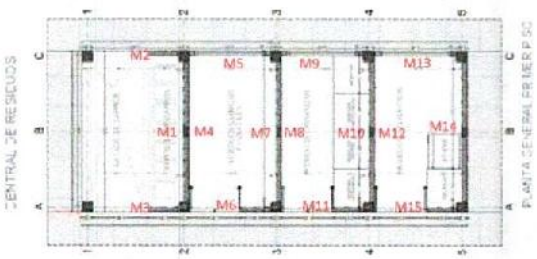

UBICACION PLANO





IMAGENES





UBICACION PLANO





IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
17.01	FILOS Y DILATACIONES
UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	578.26
	Ancho	Largo (M)	Alto	Elementos		
CENTRAL DE RESIDUOS						
FACHADA FRONTAL HORIZONTALES		2.60			7.00	18.20
FACHADA FRONTAL HORIZONTALES		1.10			12.00	13.20
FACHADA FRONTAL HORIZONTALES		1.35			5.00	6.75
FACHADA FRONTAL VERTICALES		2.50			4.00	10.00
FACHADA LATERAL IZQUIERDA HORIZONTALES		5.05			1.00	5.05
FACHADA LATERAL IZQUIERDA VERTICALES		0.30			2.00	0.60
FACHADA LATERAL DERECHA HORIZONTALES		2.40			12.00	28.80
FACHADA LATERAL DERECHA VERTICALES		2.50			4.00	10.00
FACHADA POSTERIOR HORIZONTALES		2.60			16.00	41.60
FACHADA POSTERIOR HORIZONTALES		0.28			6.00	1.68
FACHADA POSTERIOR HORIZONTALES		1.30			5.00	6.50
FACHADA POSTERIOR VERTICALES		2.50			7.00	17.50

ACUMULADO	578.26
ACTA MODIFICATORIA 4	4170.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	3591.74
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	270.78
COBRADAS PARCIAL No 5	147.60
CANTIDADES PRESENTE ACTA	159.88


OBSERVACIONES:

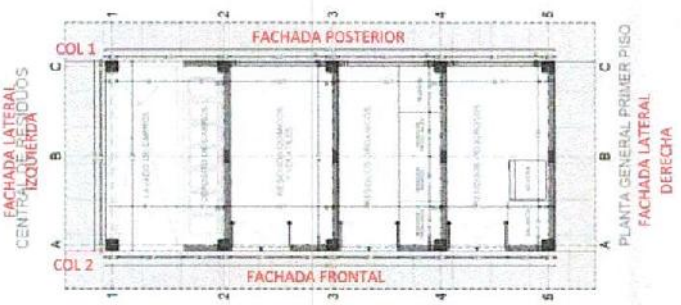

UBICACIÓN PLANO



IMAGENES

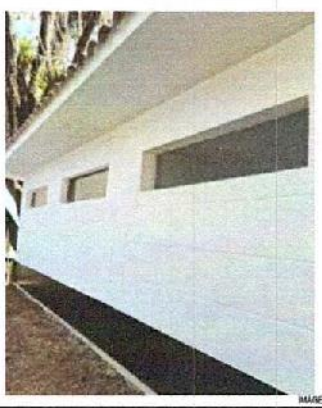



IMAGENES



IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
18.07	PERORACIONES PARA ROCIADORES Y BALAS DE ILUMINACION DIAMETRO MAX. 15 CM
UNIDAD	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	81.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	UND	Elementos	SUBTOTAL
CENTRAL DE RESIDUOS						
PUNTOS EXTERNOS				10.00		10.00

ACUMULADO	81.00
ACTA MODIFICATORIA 4	1520.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1439.00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
COBRADAS PARCIAL No 4	35.00
COBRADAS PARCIAL No5	36.00
CANTIDADES PRESENTE ACTA	10.00

OBSERVACIONES:

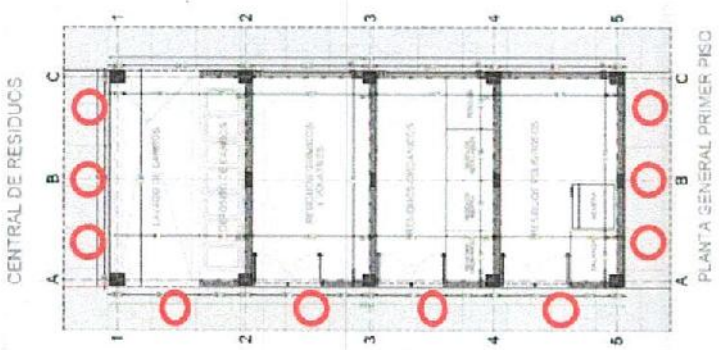

UBICACIÓN PLANO

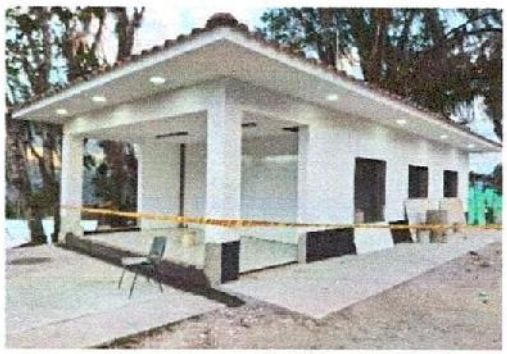

IMÁGENES



IMÁGENES

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7036

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS
UNIDAD	M3
TOTAL	168.44


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE C-2	2.50	2.50	0.50	1	1	3.13
EJE D-2	2.00	2.00	0.50	1	1	2.00
EJE E-2	2.50	2.50	0.50	1	1	3.13
EJE F-2	2.00	2.00	0.50	1	1	2.00

ACUMULADO	168.44
ACTA MODIFICATORIA 3	212.97
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	44.53
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	65.54
COBRADAS PARCIAL No3	86.85
COBRADAS PARCIAL No 4	5.80
COBRADAS PARCIAL No 5	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	10.25



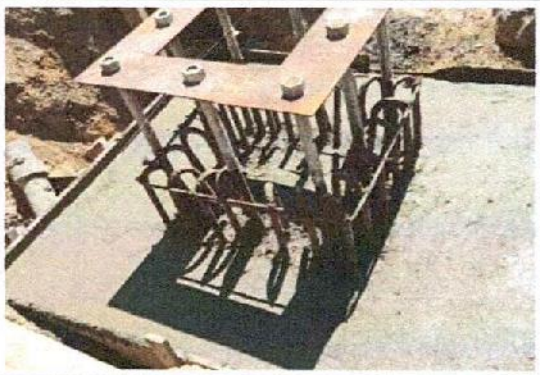



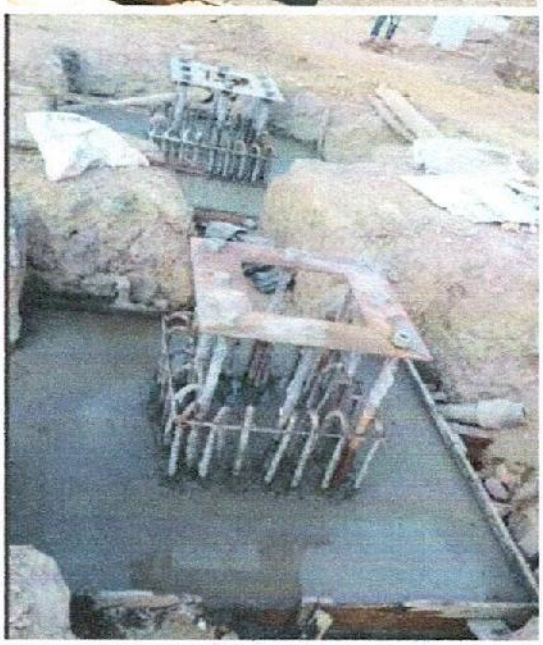

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7537

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	141.44
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE C ENTRE 2-3	4.27	0.40	0.50			0.85
EJE D ENTRE 2-3	4.39	0.40	0.50			0.88
EJE E ENTRE 2-3	4.27	0.40	0.50			0.85
EJE F ENTRE 2-3	4.27	0.40	0.50			0.85
EJE 1 ENTRE F-G	6.97	0.40	0.50			1.39
EJE 2 ENTRE B-C	5.51	0.40	0.50			1.10
EJE 2 ENTRE C-D	3.05	0.40	0.50			0.61
EJE 2 ENTRE D-E	5.69	0.40	0.50			1.14
EJE 2 ENTRE E-F	7.22	0.40	0.50			1.44
					ACUMULADO	141.44
					ACTA MODIFICATORIA 4	212.97
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	71.53
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	20.09
					COBRADAS PARCIAL No 3	52.38
					COBRADAS PARCIAL No 4	9.86
					COBRADAS PARCIAL No 5	4.53
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	54.58

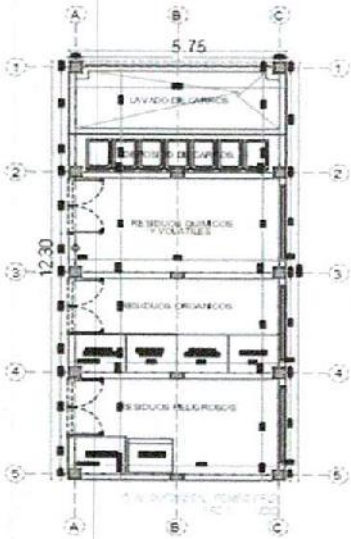

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
NP67	ESTUCO PREPARADO PARA EXTERIOR — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	569.52
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
CENTRAL DE RESIDUOS						
FACHADA FRONTAL		12.40	2.5		1.00	31.00
DESCUENTA VANO PRINCIPAL		1.63	-2.63		1.00	-4.29
DESCUENTA PUERTAS		1.50	-2.17		3.00	-9.77
FACHADA LATERAL IZQUIERDA		5.77	2.5		1.00	14.43
DESCUENTA VANO		5.07	-2.05		1.00	-10.39
FACHADA LATERAL DERECHA		5.77	2.5		1.00	14.43
FACHADA POSTERIOR		12.40	2.5		1.00	31.00
DESCUENTA VANO		1.66	-2.63		1.00	-4.37
DESCUENTA VENTANAS		2.00	-0.5		3.00	-3.00
COL 1		0.35	2.15		2.00	1.51
COL 2		0.35	2.15		2.00	1.51


ACUMULADO	569.52
ACTA MODIFICATORIA 4	2677.54
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2108.02
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
COBRADAS PARCIAL No 4	311.80
COBRADAS PARCIAL No 5	195.67
CANTIDADES PRESENTE ACTA	62.05
OBSERVACIONES:	

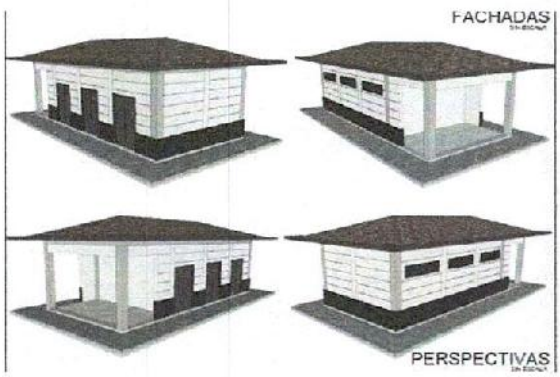

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

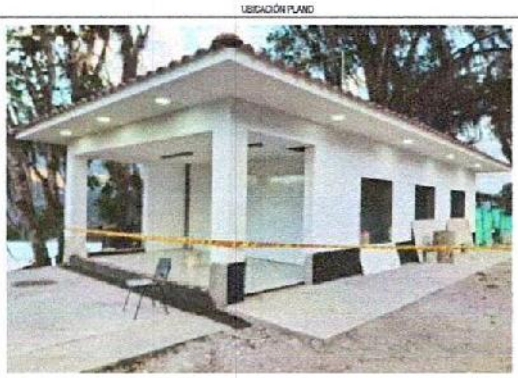

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP 75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	89.14
		Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
EJE C-2		1.25	1.25	0.50	1	1	0.78
EJE D-2		1.00	1.00	0.70	1	1	0.70
EJE E-2		1.25	1.25	0.50	1	1	0.78
EJE F-1		1.50	1.50	0.70	1	1	1.58
EJE F-2		1.25	1.25	0.50	1	1	0.78
						ACUMULADO	89.14
						ACTA MODIFICATORIA 3	111.63
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	22.49
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	82.79
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	1.73
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	4.62



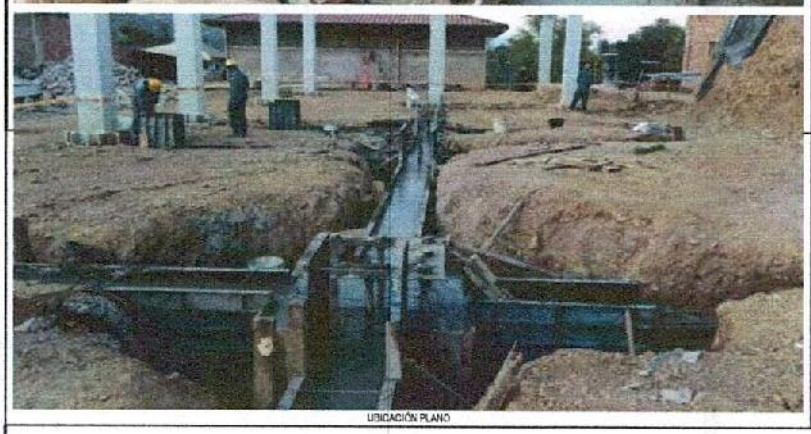

UBICACIÓN PLANO

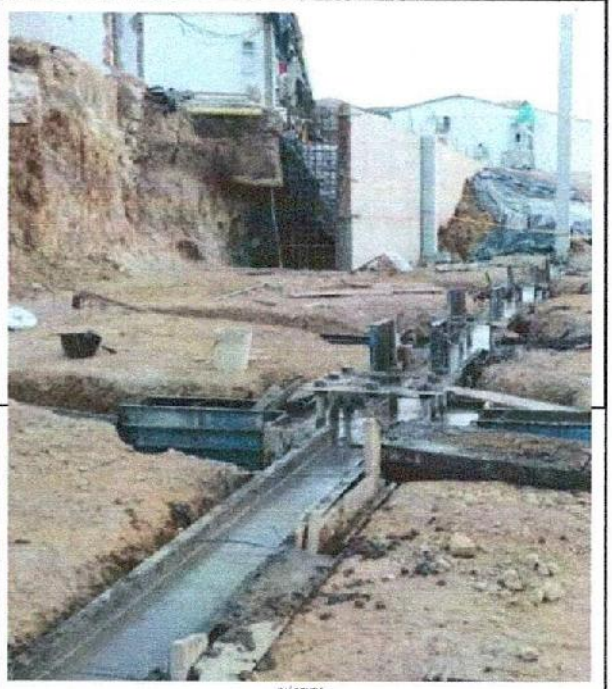

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7540

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP93	SUMINISTRO ,TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	62.94
	Ancho (m)	Largo (m)	Alto		CANTIDAD	
CENTRAL DE RESIDUOS						
LAVADO DE CARROS	3.45	5.33			1.00	18.39
RESIDUOS QUIMICOS Y VOLATILES	2.70	5.50			1.00	14.85
RESIDUOS ORGANICOS	2.70	5.50			1.00	14.85
RESIDUOS PELIGROSOS	2.70	5.50			1.00	14.85

ACUMULADO	62.94
ACTA MODIFICATORIA 4	1147.28
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1084.34
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
CANTDADES PRESENTE ACTA	62.94


OBSERVACIONES: Se adjunta planimetria de los modulos existentes

CENTRAL DE RESIDUOS

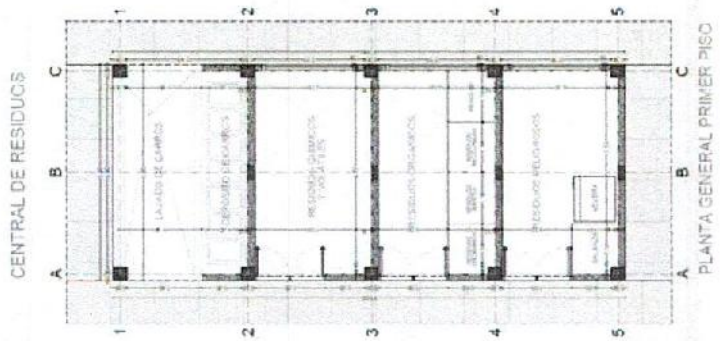



CENTRAL DE RESIDUOS

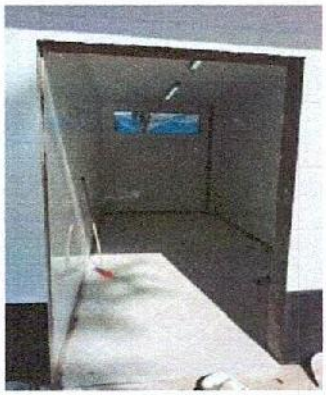





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS 4X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UNIDAD	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	32.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
CENTRAL DE RESIDUOS						
RESIDUOS ORGANICOS					1.00	1.00
RESIDUOS PELIGROSOS					3.00	3.00

	ACUMULADO	32.00
	ACTA MODIFICATORIA 4	33.00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.00
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No3	
	COBRADAS PARCIAL No 4	
	COBRADAS PARCIAL No 5	28.00
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	4.00
OBSERVACIONES:		

UBICACIÓN PLANO

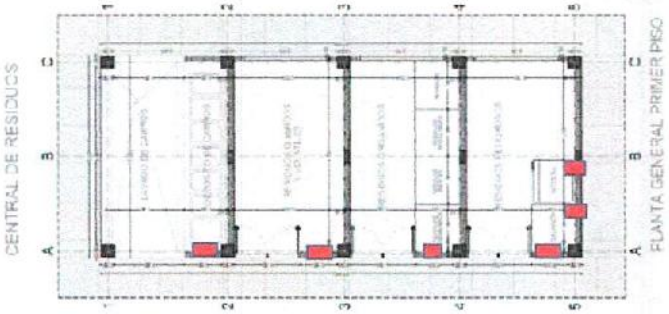


IMAGENES

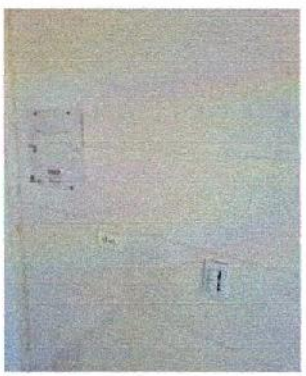

UBICACIÓN PLANO



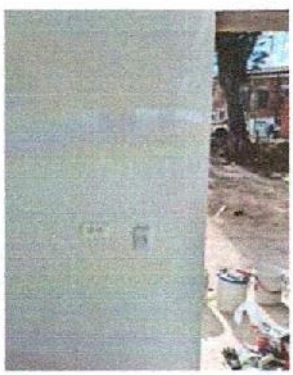



IMAGENES



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

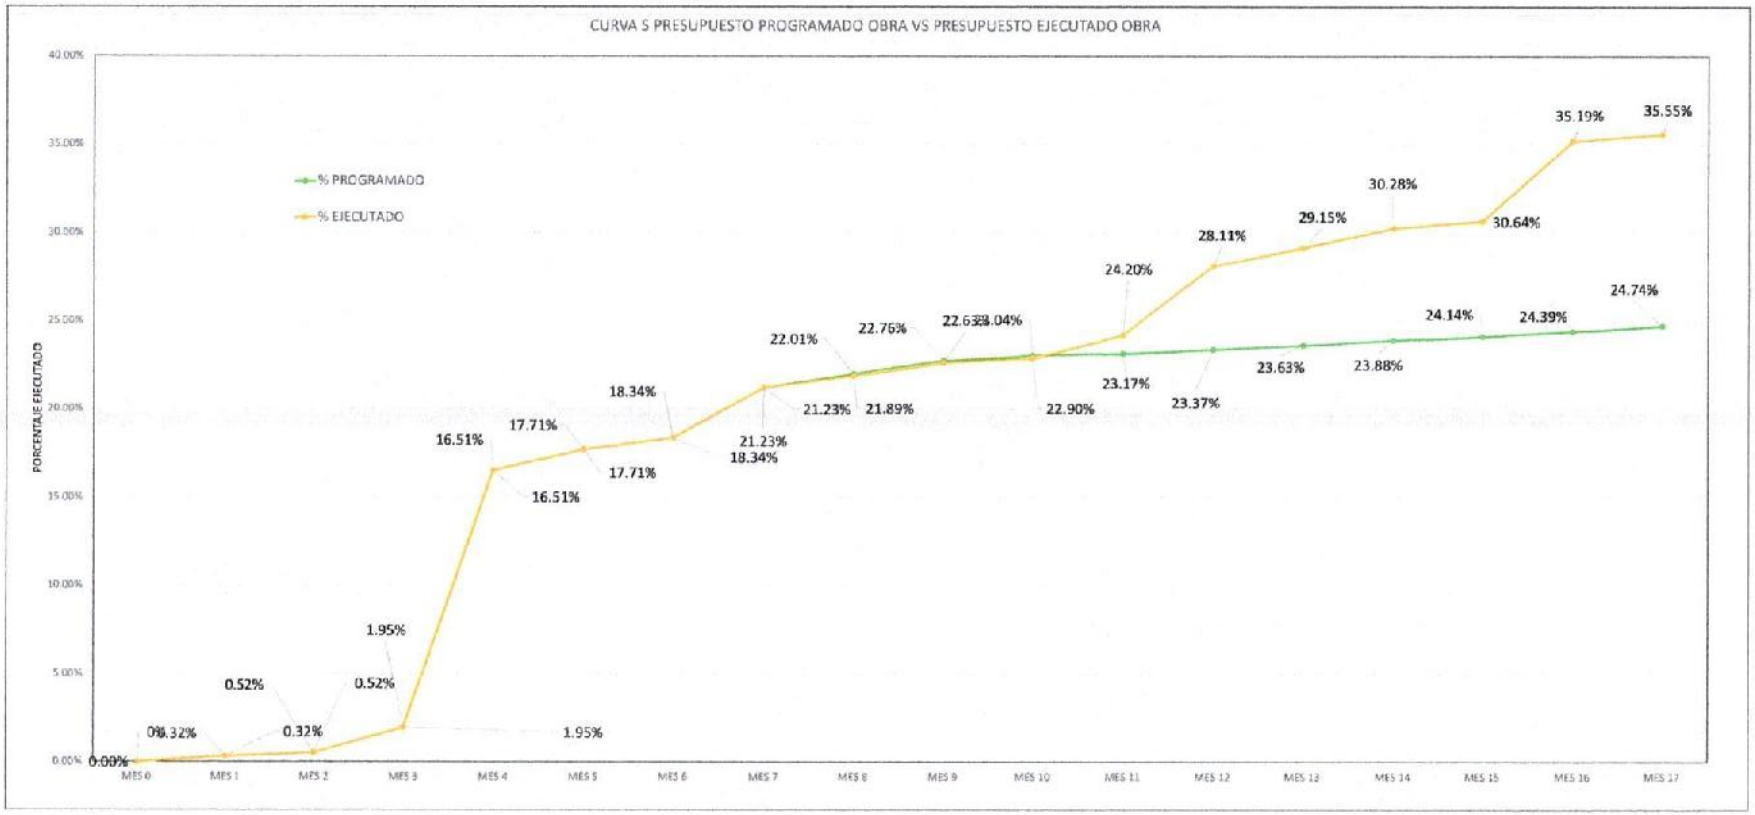
CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
% PROGRAMADO
% EJECUTADO
PORCENTAJE EJECUTADO
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
0.00%
0.32%
0.52%
1.95%
16.51%
17.71%
18.34%
21.23%
21.89%
22.76%
23.04%
22.90%
23.17%
23.37%
23.63%
23.88%
24.14%
24.39%
24.74%
24.20%
28.11%
29.15%
30.28%
30.64%
35.19%
35.55%

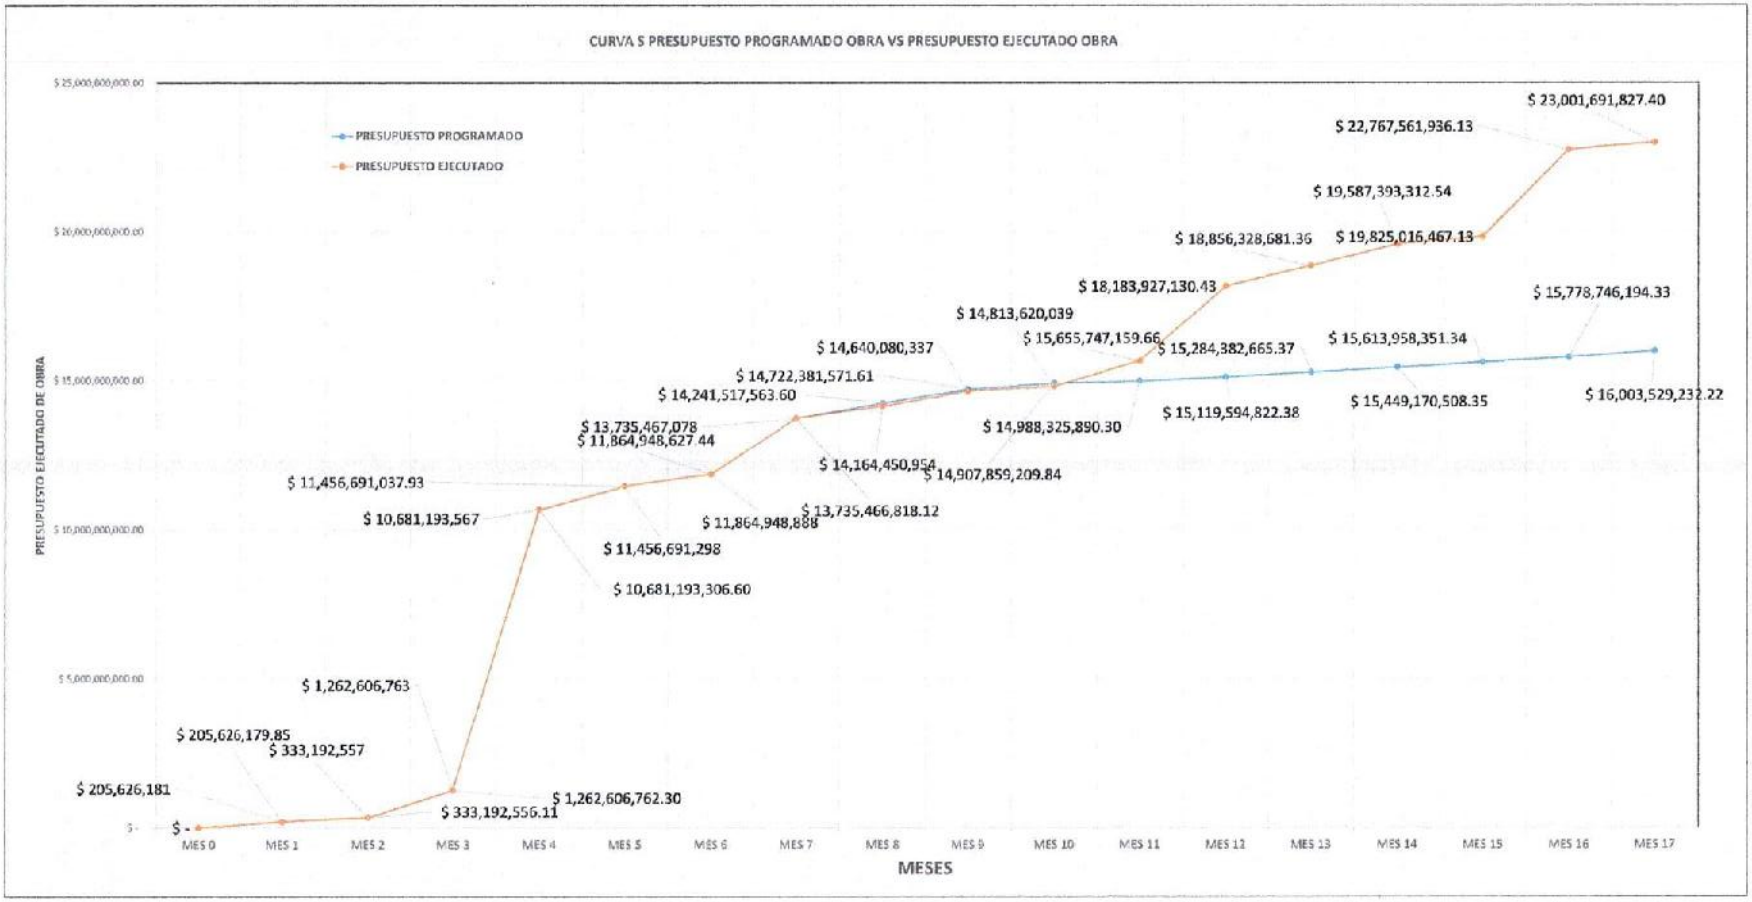
CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA
MESES
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
$ -
$ 205,626,181
$ 205,626,179.85
$ 333,192,557
$ 1,262,606,763
$ 333,192,556.11
$ 1,262,606,762.30
$ 10,681,193,567
$ 10,681,193,306.60
$ 11,456,691,037.93
$ 11,456,691,298
$ 11,864,948,627.44
$ 11,864,948,888
$ 13,735,467,078
$ 13,735,466,818.12
$ 14,164,450,954
$ 14,241,517,563.60
$ 14,640,080,337
$ 14,722,381,571.61
$ 14,807,859,209.84
$ 14,813,620,039
$ 14,988,325,890.30
$ 15,119,594,822.38
$ 15,284,382,665.37
$ 15,449,170,508.35
$ 15,613,958,351.34
$ 15,655,747,159.66
$ 15,778,746,194.33
$ 16,003,529,232.22
$ 18,183,927,130.43
$ 18,856,328,681.36
$ 19,587,393,312.54
$ 19,825,016,467.13
$ 22,767,561,936.13
$ 23,001,691,827.40

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1243574273	9481335964	E	2025/02/04	2025/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,270,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingret	tdet	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	f-i	v/p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (46 Afiliados)																						$91,074,135	$14,650,300			$91,074,135	$3,645,100			$90,810,635	$3,634,500			$91,074,135		$6,340,700		$0	$0		$28,270,600
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (46 Afiliados)																						$91,074,135	$14,650,300			$91,074,135	$3,645,100			$90,810,635	$3,634,500			$91,074,135		$6,340,700		$0	$0		$28,270,600
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (46 Afiliados)																						$91,074,135	$14,650,300			$91,074,135	$3,645,100			$90,810,635	$3,634,500			$91,074,135		$6,340,700		$0	$0		$28,270,600
1	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS007	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	13986579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO							X										25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
3	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO							X										25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
4	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1005479080	CACERES HERNANDEZ YEISON JAVIER	X																23030 1	18	$1,324,512	$212,000	EPS005	18	$1,324,512	$53,000	CCF39	18	$1,324,512	$53,000	14-4	18	$1,324,512	6.960%	$92,200	18	$0	$0	SI	$410,200
6	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																	23020 1	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS002	30	$7,616,000	$304,700	CCF39	30	$7,616,000	$304,700	14-4	30	$7,616,000	6.960%	$530,100	30	$0	$0	SI	$2,434,300
7	CC	5609540	CASTELLANOS BARRERA FILEMON							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1093748517	CELIS RICO JAIRO		X					X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO							X										23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WILMER ALDAY							X										23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
12	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES	X																23030 1	29	$1,778,280	$284,600	EPS037	29	$1,778,280	$71,200	CCF39	29	$1,778,280	$71,200	14-4	29	$1,778,280	6.960%	$123,800	29	$0	$0	SI	$550,800
13	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	13444433	DIAZ CASTELLANOS JOSE HERNAN							X										25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL							X										25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO							X										25-14	30	$2,207,520	$353,300	EPS037	30	$2,207,520	$88,400	CCF39	30	$2,207,520	$88,400	14-4	30	$2,207,520	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,800
17	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER							X										25-14	30	$2,945,600	$471,300	EPS037	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-4	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
18	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO							X										25-14	30	$4,611,439	$737,900	EPS037	30	$4,611,439	$184,500	CCF39	30	$4,611,439	$184,500	14-4	30	$4,611,439	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
19	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
20	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS	X						X										23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
21	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																	25-14	30	$1,987,689	$318,100	EPS010	30	$1,987,689	$79,600	CCF39	30	$1,987,689	$79,600	14-4	30	$1,987,689	6.960%	$138,400	30	$0	$0	SI	$615,700
23	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE							X										23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
24	CC	5609131	JAIMES JAIMES LIBARDO							X										23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900

2025/02/05 03:12 PM

25	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES							X											231001	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
26	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER	X																	25-14	10	$613,200	$98,200	EPS041	10	$613,200	$24,600	CCF39	10	$613,200	$24,600	14-4	10	$613,200	6.960%	$42,700	10	$0	$0	SI	$190,100
27	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES							X											230301	30	$1,631,550	$261,100	EPS002	30	$1,631,550	$65,300	CCF39	30	$1,631,550	$65,300	14-4	30	$1,631,550	6.960%	$113,600	30	$0	$0	SI	$505,300
28	CC	13929148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO							X											25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
29	CC	5612659	NIÑO CARVAJAL EDRAS																		230301	30	$2,891,184	$462,600	EPS037	30	$2,891,184	$115,700	CCF39	30	$2,891,184	$115,700	14-4	30	$2,891,184	6.960%	$201,300	30	$0	$0	SI	$895,300
30	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER							X											25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
31	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO							X											230301	30	$2,945,600	$471,300	EPS002	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-4	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
32	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID							X											230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
33	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
34	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
35	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY																		230301	30	$2,782,765	$445,300	EPS002	30	$2,782,765	$111,400	CCF39	30	$2,782,765	$111,400	14-4	30	$2,782,765	6.960%	$193,700	30	$0	$0	SI	$861,800
36	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
37	CC	13927795	RODRIGUEZ JAIMES PEDRO VICENTE							X											231001	30	$1,839,600	$294,400	EPS007	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
38	CC	1098780824	ROJAS ORTIZ HENRY ALBERTO																		230301	30	$4,611,430	$737,900	EPS002	30	$4,611,430	$184,500	CCF39	30	$4,611,430	$184,500	14-4	30	$4,611,430	6.960%	$321,000	30	$0	$0	SI	$1,427,900
39	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO							X											25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
40	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
41	CC	1096957230	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
42	CC	1096951842	SEPULVEDA CASTELLANOS WILMER LEONARDO							X											230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
43	CC	1095925867	SERRANO CACERES JULIAN MATEO	X																	230301	22	$3,381,716	$541,100	EPS041	22	$3,381,716	$135,300	CCF39	22	$3,381,716	$135,300	14-4	22	$3,381,716	6.960%	$235,400	22	$0	$0	SI	$1,047,100
44	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$430,300
45	CC	13922707	TUTIRA DIAZ LIBARDO							X											230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-4	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
46	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA							X											230301	30	$1,473,500	$227,800	EPS037	30	$1,473,500	$57,000	CCF39	30	$1,473,500	$57,000	14-4	30	$1,473,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		Afiliados(46)																					$91,074,135	$14,650,300			$91,074,135	$3,645,100			$90,810,635	$3,634,500			$91,074,135		$6,340,700		$0	$0		$28,270,600

3545

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1243574273	9481335964	E	2025/02/04	2025/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,270,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$14,650,300	$0	$0	$14,650,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$588,800	$0	$0	$588,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,454,200	$0	$0	$4,454,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$7,856,900	$0	$0	$7,856,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,750,400	$0	$0	$1,750,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$6,340,700	$0	$0	$6,340,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	46	$6,340,700	$0	$0	$6,340,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$3,634,500	$0	$0	$3,634,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	46	$3,634,500	$0	$0	$3,634,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				46	$3,645,100	$0	$0	$3,645,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,600	$0	$0	$159,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$986,100	$0	$0	$986,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$292,400	$0	$0	$292,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,330,000	$0	$0	$1,330,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$877,000	$0	$0	$877,000
TOTAL				46	$28,270,600	$0	$0	$28,270,600

2025/02/05 03:12 PM

296

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91018686
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOHN JAIRO RIVERA PINZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 35 17 58	TELÉFONO:	6343488
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Instalaciones eléctricas,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7958967173		TIPO DE PLANILLA:			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	enero AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/04	NUMERO AUTORIZACION:			1242203311

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230501	230501-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																													PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EPS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 91018686	RIVERA PINZA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.800.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 513.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

3547

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13811301
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXIS RONDÓN MUÑOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV. JARDIN CASA 49	TELÉFONO:	3167725
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7955484831	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	122686917

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCIÓN	1	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480,000	$ 0	$ 480,000
SUBTOTALES										$ 480,000	$ 0	$ 480,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375,000	$ 0	$ 0	$ 375,000
SUBTOTALES													$ 375,000	$ 0	$ 0	$ 375,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15,700	$ 15,700	$ 0	$ 0	$ 15,700
SUBTOTALES									$ 15,700	$ 0	$ 0	$ 15,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETORNO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SUP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC-13811301	RONDON MUÑOZ ALEXIS	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3,500,000			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3,000,000	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3,000,000	$ 375,000	$ 0	$ 375,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3,000,000	$ 13511301	$ 15,700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 870,700

Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S. identificado(a) con NI 901424605 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO identificado(a) con CC 91273201

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30
9481335954	1243543274	E	2025-02-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30

Este certificado se expide el día 2025-02-24 a las 11:07.

349

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91232527		RAMIREZ RIVERO SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 27 105 250	FLORIDABLANCA-SANTANDER	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1256945989	9480447738	I	2025/02/07	2025/02/10	BANCOLOMBIA	3	$506,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91232527	RAMIREZ RIVERO SERGIO							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

2025/02/10 04:54 PM

858

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91232527		RAMIREZ RIVERO SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 27 105 250	FLORIDABLANCA-SANTANDER	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1256945989	9480447738	I	2025/02/07	2025/02/10	BANCOLOMBIA	3	$506,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$200	$0	$99,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				1	$504,900	$1,100	$0	$506,000

2025/02/10 04:54 PM

1556

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-14, 12:09:29 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76037242

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 14/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098640695	VICTOR MANUEL PEÑA PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(251001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098847063	EDWAR ALEXIS ANTOLINEZ JAIMES	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 142.350	$ 22.800	(MIN003) ADRES MIN002	$ 142.350	$ 5.700	6.960	$ 142.350	$ 10.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200
CC 1098130365	EDINSON MANUEL PEÑA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.989.350	$ 2.989.350	$ 2.989.350	$ 2.989.350	$ 478.400	$ 119.700	$ 208.200	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 926.000	$ 0	$ 926.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 597 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

352

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-18, 11:33:45 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059678527

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 18/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOB INGENIERIA SAS		
Documento	NI901478369	**Dirección**	TV 112 #20 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3232196491
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	**Identificación**	CC 1098728354
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005337262	JENIFER PAOLA GOMAJOA CABALLERO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF39) CAJASAN	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1005444013	ANDRES FELIPE CORDERO GOMEZ	01	00	X																	0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 400.000	$ 16.000	6.960	$ 400.000	$ 27.960	(CCF36) CAJASAN	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.960
CC 1087715719	EDINSON ENRIQUE DIAZ MAZA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098725962	GENNINER AURIO CHIQUILLO DIAZ	01	00	X																	0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 998.450	$ 159.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 998.450	$ 39.800	6.960	$ 998.450	$ 69.400	(CCF33) CAJASAN	$ 998.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 1098728354	JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	6.960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 1117528369	JUAN SEBASTIAN NUÑOZ MUÑOZ	01	00	X																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 998.450	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 998.450	$ 39.800	6.960	$ 998.450	$ 69.400	(CCF39) CAJASAN	$ 998.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 12161161	GENTIL ANIBAL CAMPOS SOTELO	01	00	X																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 998.450	$ 159.500	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 998.450	$ 39.800	6.960	$ 998.450	$ 69.400	(CCF39) CAJASAN	$ 998.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 77156825	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91357061	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91436454	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91530859	BREINER MEJIA PORTILLO	01	00	X																	0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.043.900	$ 167.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.043.900	$ 130.500	6.960	$ 1.043.900	$ 72.700	(CCF39) CAJASAN	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 26.900	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 464.400
PT 8159919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00	X																	0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 9.500	6.960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF39) CAJASAN	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

453

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.014.500	$ 15.014.500	$ 15.014.500	$ 15.014.500	$ 2.402.800	$ 689.700	$ 1.045.500	$ 601.000	$ 20.900	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.791.300	$ 4.000	$ 4.795.300

7555

FEBRERO

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"



INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 de febrero de 2025 – 28 de febrero de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"
	Revisión: 0 / Código: CGR-ITM-087-001

TIPO DE CONTRATO: 4

INTRODUCCION 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 5

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 5

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6

Construcción módulo A: 6
Construcción módulo B: 7
Construcción módulo C: 7
Construcción módulo E: 7
Construcción módulo F 7
Adecuación área de UCI 8

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 9

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 9

1.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 22

1.5 CONDICIONES CLIMATICAS 22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 23

PRESUPUESTO DE OBRA 25

1.6 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE FEBRERO DE 2025 25

Programación de obra 27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

TABLA DE ANEXOS 30

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 6
Ilustración 2 Central de residuos 9
Ilustración 3 Central de residuos 9
Ilustración 4 Excavación hasta llegar a suelo competente 10
Ilustración 5 Mejoramiento en concreto ciclópeo 10
Ilustración 6 Muro contención cierre costado norte modulo F 11
Ilustración 7 Instalación de acero de refuerzo y formaleta metálica de muro de contención 12
Ilustración 8 Plano arquitectónico - Punto fijo modulo A 12
Ilustración 9 Fabricación y armado de estructura metálica 13
Ilustración 10 Plano estructura metálica modulo A 13
Ilustración 11 Instalación elementos estructural - columna B-4 14
Ilustración 12 Modulo A - instalación de estructura metálica 15
Ilustración 13 Estructura metálica modulo A 15
Ilustración 14 Instalación de estructura metálica modulo A 16
Ilustración 15 Instalación de estructura metálica 16

Ilustración 16 Aplicación de cromato de zinc en elementos estructurales 17
Ilustración 17 Elementos estructurales 17
Ilustración 18 Elementos instalados módulo D 18
Ilustración 19 Instalación viga IPE 400 entre ejes 9´1´y 8´ 19
Ilustración 20 Instalación de viga IPE 500 entre ejes 10´1´-´9´1 19
Ilustración 21 Instalación de viga IPE 400 entre ejes O1 - P1 sobre eje 10´1´ 20
Ilustración 22 Colocación de tornillería de anclaje sobre el eje 10´1´-P1 20
Ilustración 23 Estructura metálica módulo D 21
Ilustración 24 Estructura metálica módulo D 21
Ilustración 25 Día lluvioso 23
Ilustración 26 Amanece con lluvia moderada 23
Ilustración 27 Día lluvioso en horas de la mañana 24
Ilustración 28 Dia lluvioso en horas de la madrugada y mañana 24

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"
	Revisión: 0 — **Código: CGR-ITM-087-001**

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	N/A		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido de 01 de febrero de 2025 hasta la elaboración de este informe 28 de febrero de 2025.

Este proyecto representa un hito significativo en el campo de la construcción civil, no solo por s magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuevo equipo de trabajo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento con los servicios de comedor, cocina, lavandería, mantenimiento, oficinas administrativas y hospitalización. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente se encuentra facturación, pediatría, consultorios, cuarto técnico (RACK). Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra ingresando por la plazoleta principal y cuenta con el servicio de urgencias, además colinda con el tomógrafo del hospital existente. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parto, recuperación de pacientes y parte de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización

- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo comprendido por este informe se avanzaron actividades en los siguientes módulos.

CENTRAL DE RESIDUOS

Durante el mes de febrero se continuó mejorando el acabado final de la central de residuos, actualmente se están elaborando las celosías y puertas de ingreso para cada uno de los cuartos, para así realizar la entrega formal a la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira y darle uso al espacio.



Ilustración 2 Central de residuos

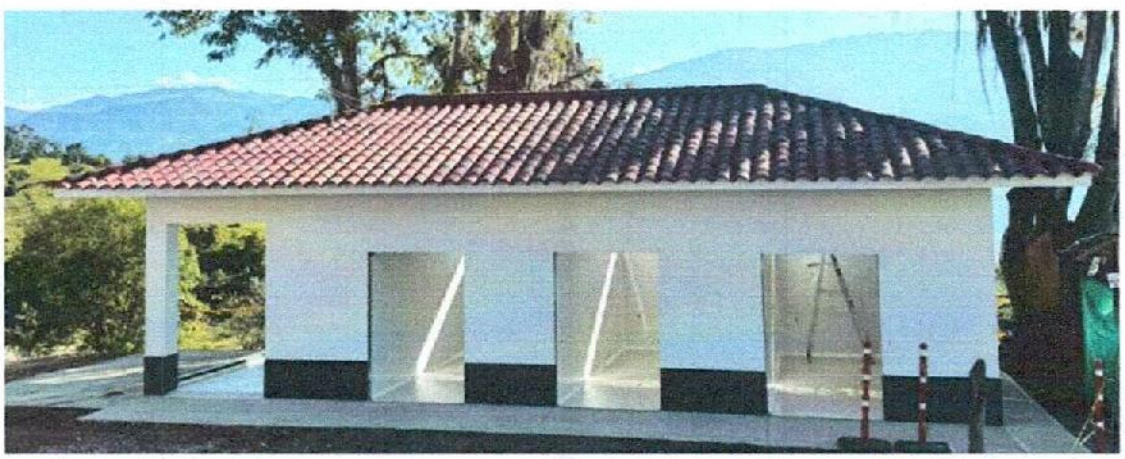


Ilustración 3 Central de residuos

MODULO A

En el mes de febrero continuo la actividad de excavación mecánica llegando a suelo competente como se indica en los estudios de suelos, de igual forma se realizó el mejoramiento del terreno con el concreto ciclópeo, posteriormente y se continuo con el armado de acero figurado y construcción de la zarpa de muro de contención como lo indica el diseño estructural, esto con el fin evitar algún tipo de asentamiento.



Ilustración 4 Excavación hasta llegar a suelo competente



Ilustración 5 Mejoramiento en concreto ciclópeo

Se realizaron aproximadamente 33 metros longitudinales de concreto ciclópeo con su respectivo refuerzo de anclaje en la estructura de zarpa y continuamente se venia armando con acero PDR 60 las zapatas, zarpa de muro y pedestales ya que estos elementos se deben fundir en una sola capa teniendo en cuenta que las zapatas y una parte de los pedestales están embebidos en la zarpa del muro.



Ilustración 6 Muro contención cierre costado norte modulo F

Se realizo la fundida del muro de contención con una altura de 5.90 metros para así dar por culminado el muro longitudinal que soportara el talud de los módulos E y F, de igual manera se ve la necesita de realizar un muro de contención sobre el costado norte entre el módulo F y tanque de almacenamiento de agua potable. Este muro esta en planificación y diseño, teniendo en cuenta que sobre este costado se encuentra actualmente la central de gases medicinales, oficinas, pasillo de ingreso a la central de gases, descanso médico y corredores de conexión del área de cirugía el cual se encuentra en servicio en este momento.

Por lo cual se está analizando que actividad podríamos realizar para mitigar el riesgo y estabilizar el talud que se generaría si iniciamos el corte para este tramo final de muro de contención que va a ayudar a contener el terreno en el futuro modulo F, y la conexión con el modulo A.



Ilustración 7 Instalación de acero de refuerzo y formaleta metálica de muro de contención

Es importante mencionar que en la actualidad se requiere el traslado del área de descanso médico y observación de urgencias ya que se intercepta la estructura nueva (el área de las escaleras y ascensores) y la existente. Teniendo en cuenta que en el diseño arquitectónico se encuentra ubicado entre los ejes C1 – D1 como se muestra en la siguiente ilustración. Por lo cual se está analizando la forma de poder reubicar estas áreas que nos intervienen y que por necesidad del módulo A para poder prestar el servicio correctamente para su ingreso de pacientes y administrativos de la salud a sus diferentes pisos se debe construir el punto fijo.

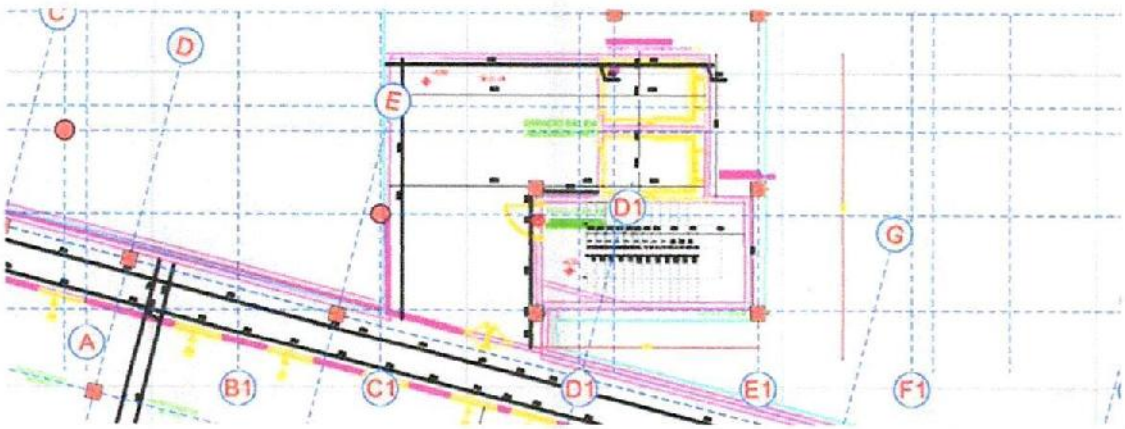


Ilustración 8 Plano arquitectónico - Punto fijo modulo A

Teniendo en cuenta que la cimentación del módulo A esta totalmente culminada y que tuvo demoras mientras se planeaba y construida la contingencia de quirófanos y farmacia para no interrumpir el servicio y que el hospital estuviera de acuerdo con las acciones que se iban a ejecutar. Se fueron fabricando elementos estructurales según lo indicado en el diseño estructural y se realizó el traslado a un lote conjunto del hospital. El cual ya se inició el proceso de limpieza de su superficie, aplicación de un fondo para protegerlo de los cambios de clima el cual afectan este tipo de elementos y poder iniciar corte y armado final para su ubicación en el módulo A.

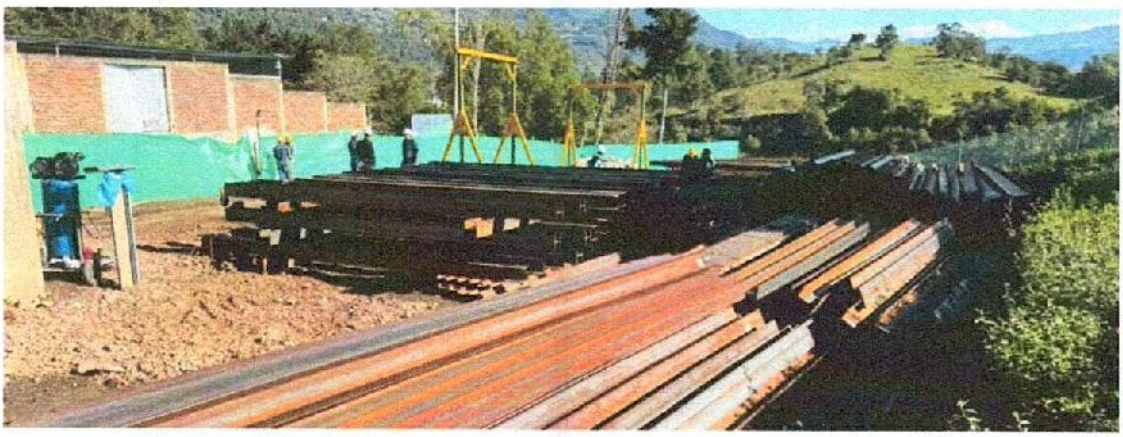


Ilustración 9 Fabricación y armado de estructura metálica

También se ejecutaron trabajos de izaje de la estructura metálica de los elementos que estaba fabricados, y que llegaron al proyecto como la columna del eje B-4, con la cual abrió campo para realizar el izaje de 15 elementos de vigas en pórtico como se debe ejecutar cuando se tiene estructura en estos elementos como se muestra en la siguiente ilustración.



Ilustración 10 Plano estructura metálica modulo A



Ilustración 11 Instalación elementos estructural - columna B-4

Antes de realizar la izada de la columna B-4 se realizó limpieza y engrase de los pernos de anclaje entre elemento estructural y cimentación en concreto, esto con el fin facilitar la rotación de las tuercas y poder nivel la placa base de la columna y darle la verticalidad óptima para su conexión con las vigas en los otros niveles.



Ilustración 12 Modulo A - instalación de estructura metálica

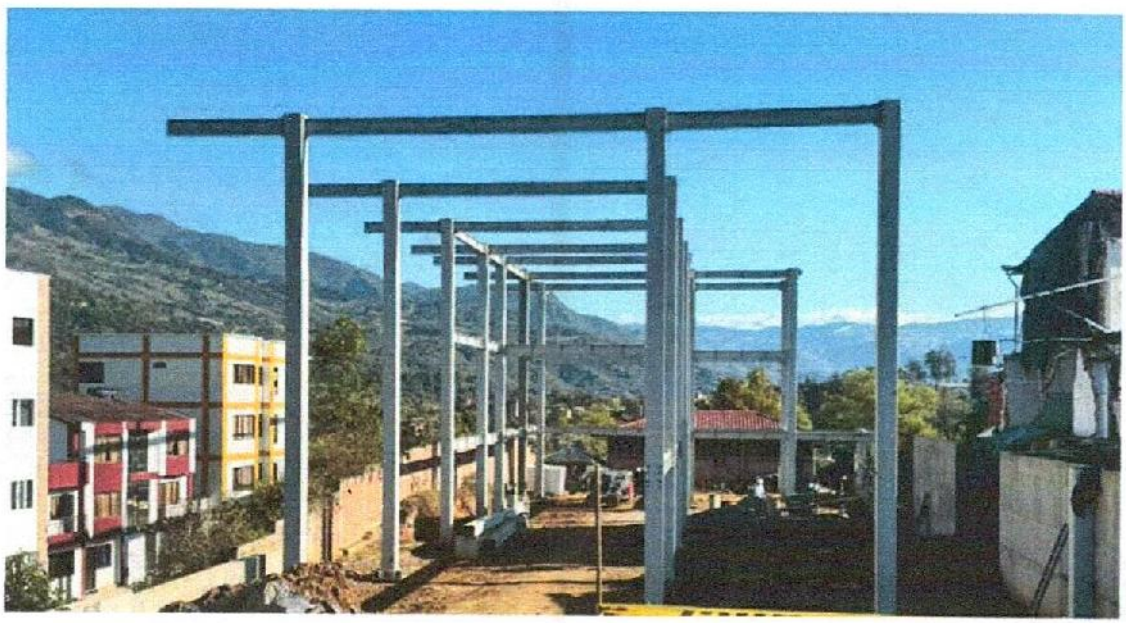


Ilustración 13 Estructura metálica modulo A



Ilustración 14 Instalación de estructura metálica modulo A



Ilustración 15 Instalación de estructura metálica



Ilustración 16 Aplicación de cromato de zinc en elementos estructurales

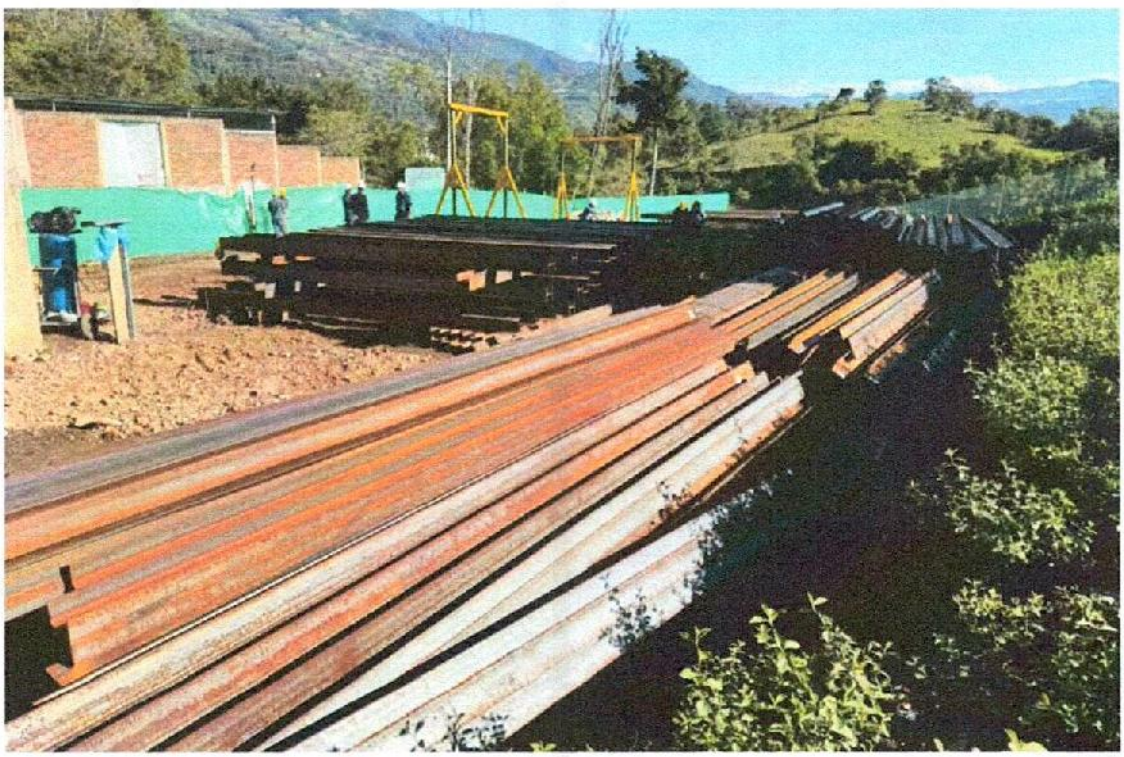


Ilustración 17 Elementos estructurales

MODULO D

En el módulo D se realizaron actividades de montaje de estructura metálica de los elementos ya fabricados, se instaló el pórtico establecido entre los ejes O1-P1 y 10´1 Y 9´1 para darle rigidización a las 4 columnas que se encuentran sobre estos ejes con el entrepiso y elementos IPE200 como base para la instalación del metal-deck, como se muestra en la siguiente ilustración.

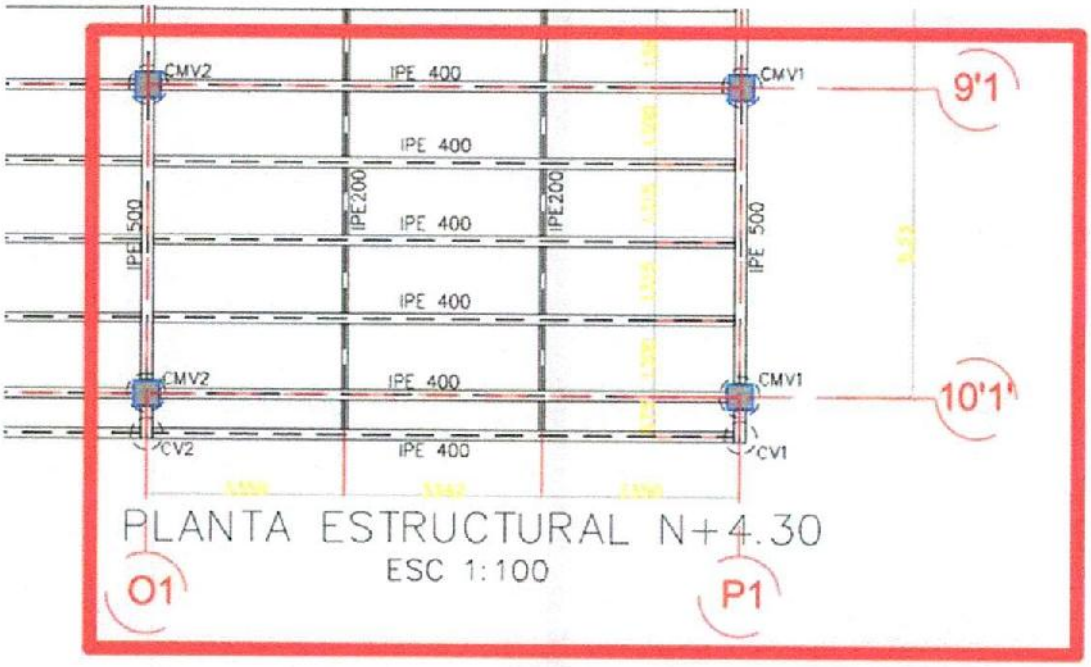


Ilustración 18 Elementos instalados módulo D

La fabricación y organización de los elementos del módulo D igualmente que en el módulo A se está realizando en el lote continuo a la E.S.E Hospital de García Rovira, el cual ya se iniciaron actividades de aplicación fondo de cromato de zinc para su protección por las variaciones del clima y que será elementos que estarán en el exterior.

Ahí mismo se hará la fabricación de elementos conectores de columnas, rigidizadores de elementos horizontales, conectores tipo cartera para la instalación de vigas todo elemento especificado según los planos estructurales de este módulo.

En la ejecución del izaje de este módulo se hizo en jornada nocturna para agilizar en proceso en simultaneo con el módulo A.

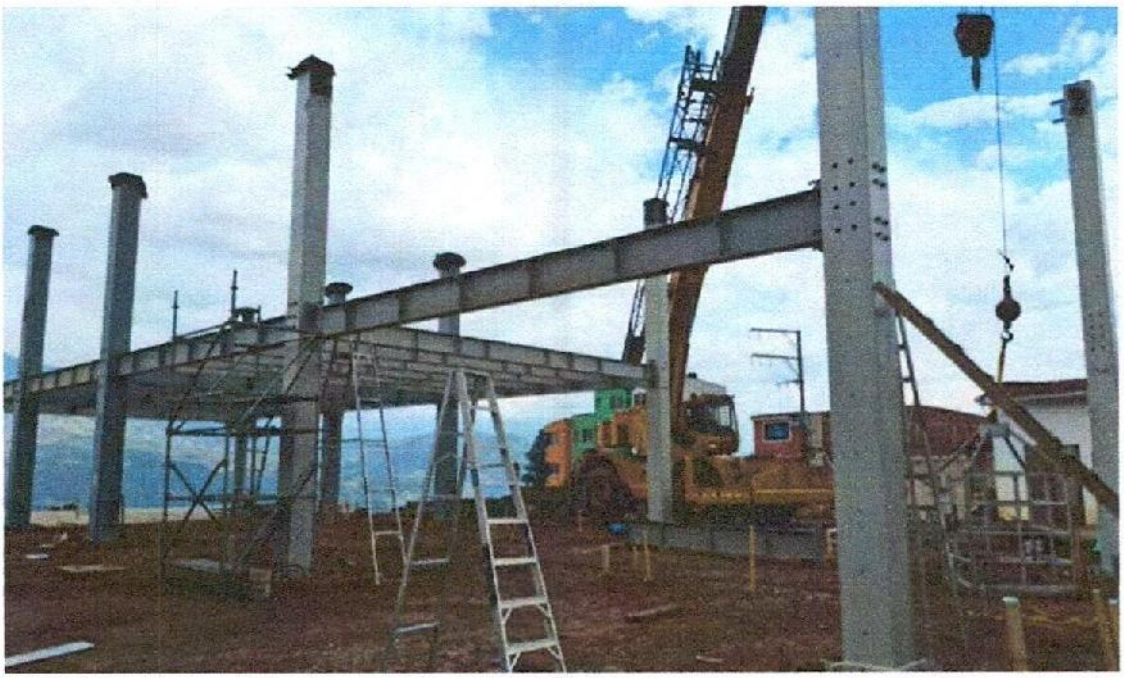


Ilustración 19 Instalación viga IPE 400 entre ejes 9´1´y 8´



Ilustración 20 Instalación de viga IPE 500 entre ejes 10´1´ -´9´1



Ilustración 21 Instalación de viga IPE 400 entre ejes O1 - P1 sobre eje 10´1´

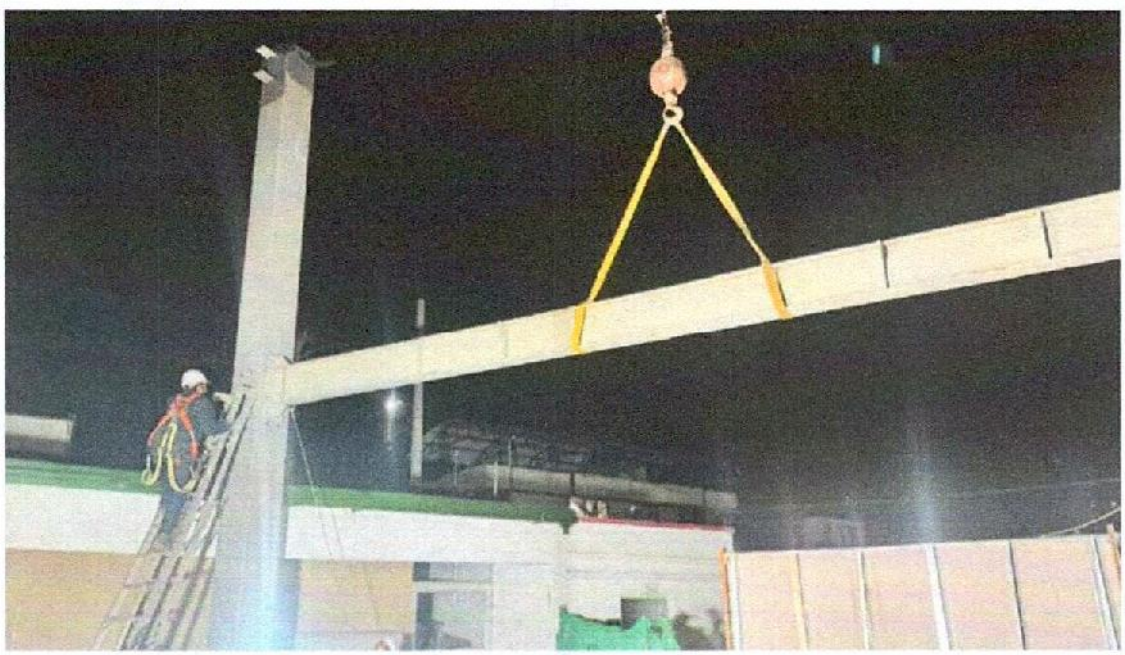


Ilustración 22 Colocación de tornillería de anclaje sobre el eje 10´1´-P1



Ilustración 23 Estructura metálica módulo D



Ilustración 24 Estructura metálica módulo D

1.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.
- Planeación de nuevos campos de acción incluyendo las posibles contingencias para el continuo avance de obra civil en el proyecto.

1.5 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales. A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario. Mes de febrero.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																												
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	16	21	24	24	18	14	24	24	19	22	19	24	24	16	24	17	24	24		
Lluvia moderada									8	3			6	10			3	2	5			8		7				
Lluvia intensa																	2											
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Ilustración 25 Día lluvioso



Ilustración 26 Amanece con lluvia moderada



Ilustración 27 Día lluvioso en horas de la mañana



Ilustración 28 Dia lluvioso en horas de la madrugada y mañana

PRESUPUESTO DE OBRA

1.6 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE FEBRERO DE 2025


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER									
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		FEBRERO		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**				**$ 973,395,942.44**		**$ 42,411,775.00**		**$ 830,366,216.88**
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 68,500.00	12049.47	$ 825,388,678.73	619.15	$ 42,411,775.00	11563.43	$ 792,094,928.29
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 4,517,645,010.41**		**$ 254,617,463.63**		**$ 3,777,842,749.83**
3.01	BASE CONCRETO POBRE 5CM	M2	$ 46,378.69	359.92	$ 16,692,618.10		$ -	267.05	$ 12,385,429.16
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	7865.10	$ 106,068,817.25	197121.51	$ 2,658,382,590.39
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1,609,411.12	730.88	$ 1,176,286,399.39	92.30	$ 148,548,646.38	562.52	$ 905,329,966.75
17	**PINTURA**				**$ 707,112,188.04**		**$ 1,799,450.00**		**$ 145,822,047.64**
17.06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA	M2	$ 29,000.00	2866.10	$ 83,116,900.00	62.05	$ 1,799,450.00	1569.68	$ 45,520,720.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 18,200,340,385.55**		**$ 12,024,716.75**		**$ 9,042,938,255.33**
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	$ 1,006,187.28	237.04	$ 238,506,632.85	5.83	$ 5,866,071.84	147.27	$ 148,181,200.73

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER


PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		FEBRERO		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	$ 1,304,797.65	111.63	$ 145,654,561.67	4.72	$ 6,158,644.91	93.86	$ 122,468,307.43
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.12**		**$ 310,853,405.38**		**$ 15,524,124,873.62**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 90,147,487.56		$ 4,501,996,242.35
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 3,108,534.05		$ 155,241,249.74
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 15,542,670.27		$ 776,206,248.68
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 108,798,691.88		$ 5,433,443,740.77
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 419,652,097.26**		**$ 20,957,568,714.39**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ -**		**$ 979,670,705.64**
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ -		$ 284,104,504.64
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ -**		**$ 1,263,775,210.28**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**				
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 419,652,097.26**		**$ 22,221,343,924.67**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**				**$ 1,200,000,000.00**
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**		**$ 419,652,097.26**		**$ 23,421,343,924.67**

Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 28 febrero de 2025.

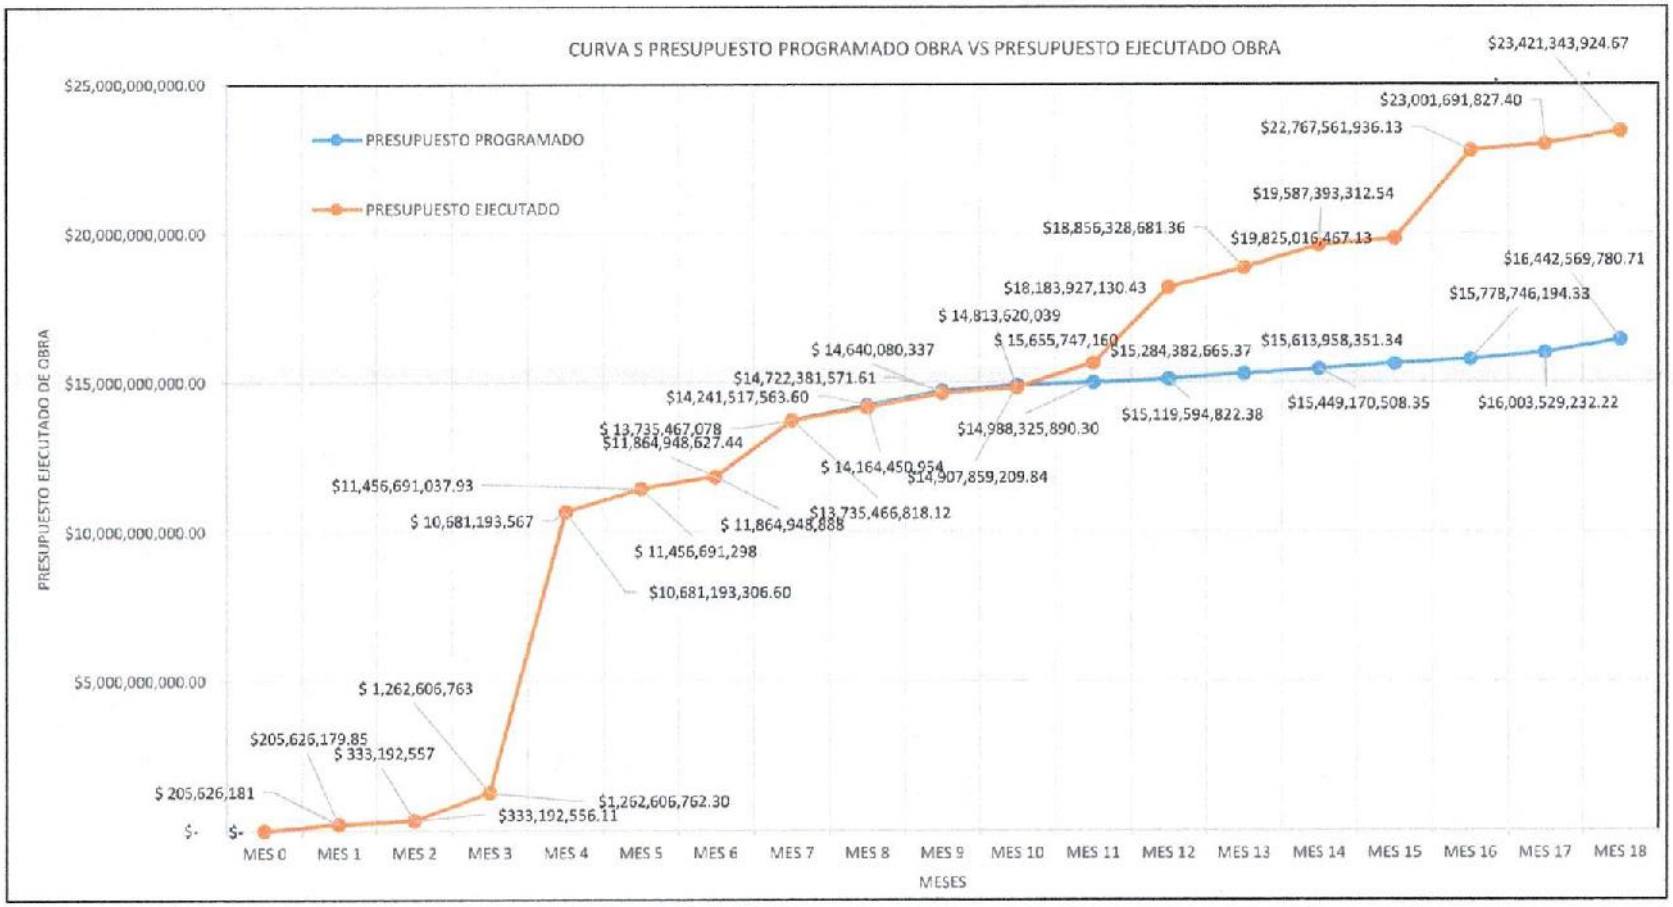

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 28 febrero de 2025

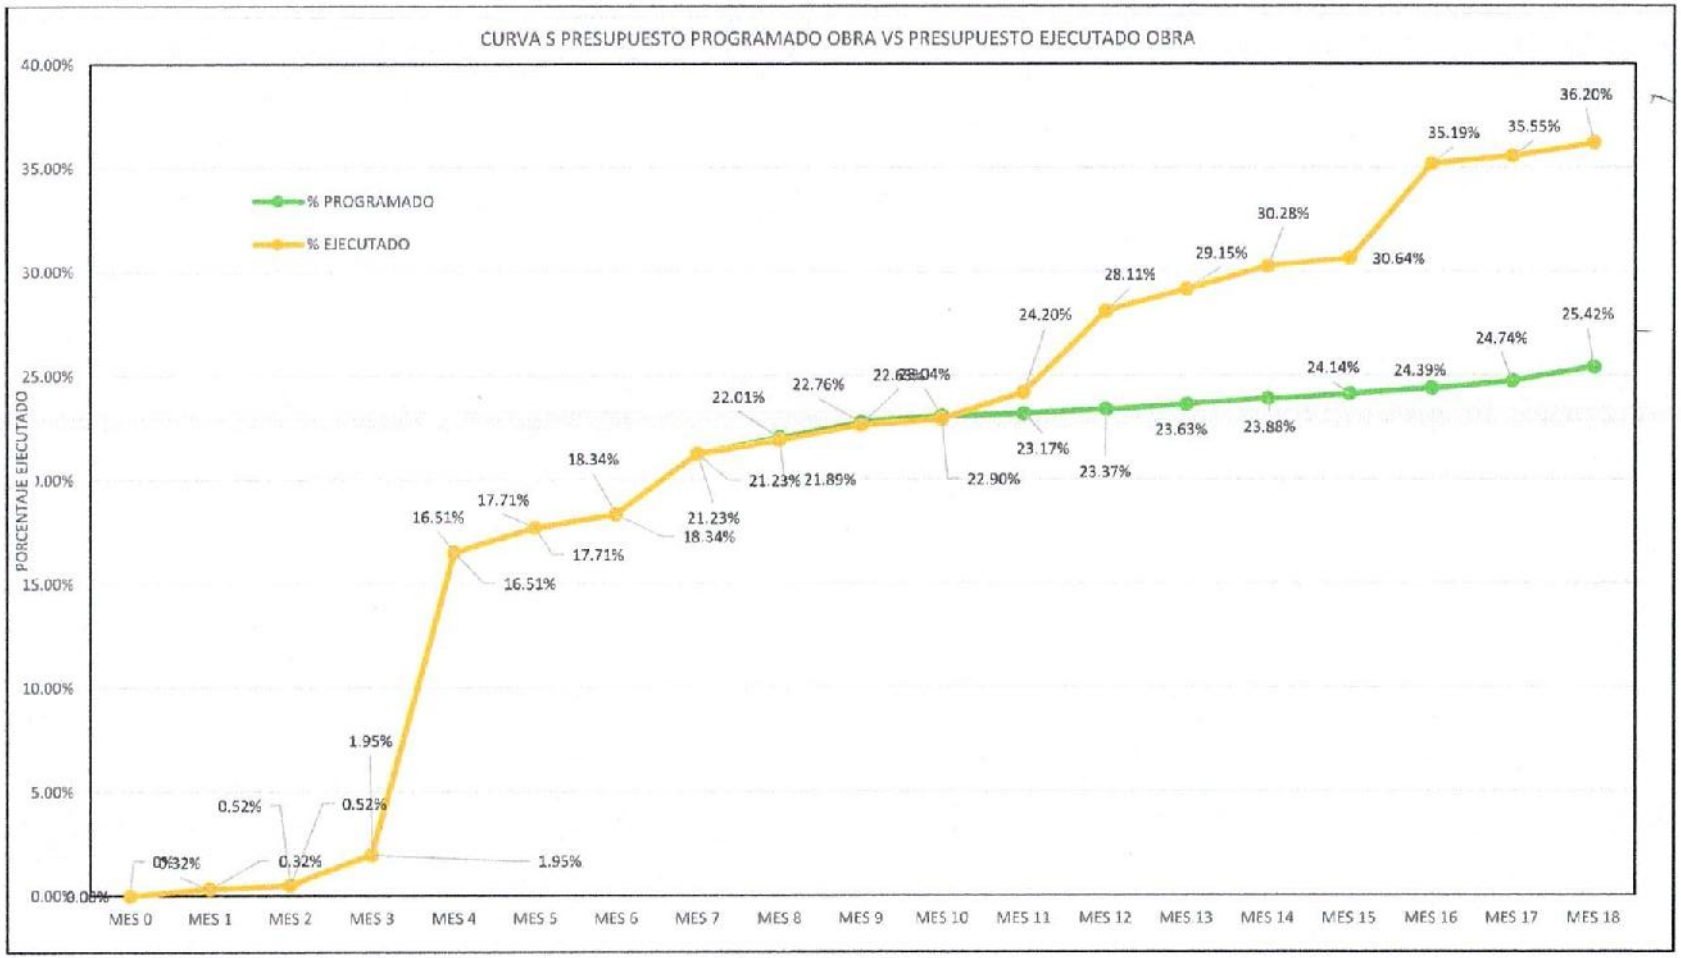

En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 25.42% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 36.20% acumulado, presentando 10.79% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está realizando la planificación y creación de un plan de contingencia para la reubicación del área de observación de urgencias y descanso medico de quirófanos para poder continuar con la construcción del punto fijo del modulo

- Se está realizando el plan de contingencia eléctrico teniendo en cuenta que las redes existentes de conexión con el tablero de distribución general del hospital y la subestación eléctrica deberán ser reubicadas a un sitio donde no interfiera con ninguno de los módulos que se irán construyendo.

- Se está brindando capacitación continua al personal operativo que ejecuta labores de alto riesgo como el izaje de la estructura metálica y que está ejecutando actividades en jornada nocturna, esto con el fin de minimizar los riesgos.

- Teniendo en cuenta el acta modificatoria No 4 avalada en el mes de diciembre de 2024, el porcentaje de ejecución programado en el mes de febrero es de 25.42% esto equivale presupuestalmente a $16.003.529.232,22; en este informe el porcentaje ejecutado es de 36.20% que equivale a $23.421.343.924,67; por lo tanto, en relación a lo anterior el Consorcio de García Rovira se encuentra presentando 10.79% por encima de lo programado en este mes.

- Se recomienda continuar priorizando la coordinación de actividades entre la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, interventoría y Consorcio de García Rovira para la ejecución de actividades en los diferentes campos de intervención y así poder evitar retrasos mejorando la eficiencia en la planeación y ejecución del proyecto.

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

TABLA DE ANEXOS

No DE ANEXOS	DESCRIPCION
Anexo 1	Presupuesto ejecutado febrero
Anexo 2	Memoria de cantidades corte 28 febrero de 2025
Anexo 3	Curva S – Presupuesto programado vs presupuesto ejecutado.
Anexo 4	Cursa S – Porcentaje programado vs porcentaje ejecutado.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante Legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER									
PRESUPUESTO DE OBRA					ACTA DE MODIFICACION 4	FEBRERO		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**				**$ 973,395,942.44**		**$ 42,411,775.00**		**$ 830,366,216.88**
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 68,500.00	12049.47	$ 825,388,678.73	619.15	$ 42,411,775.00	11563.43	$ 792,094,928.29
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 4,517,645,010.41**		**$ 254,617,463.63**		**$ 3,777,842,749.83**
3.01	BASE CONCRETO POBRE 5CM	M2	$ 46,378.69	359.92	$ 16,692,618.10		$ -	267.05	$ 12,385,429.16
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	7865.10	$ 106,068,817.25	197121.51	$ 2,658,382,590.39
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTE	M3	$ 1,609,411.12	730.88	$ 1,176,286,399.39	92.30	$ 148,548,646.38	562.52	$ 905,329,966.75
17	**PINTURA**				**$ 707,112,188.04**		**$ 1,799,450.00**		**$ 145,822,047.64**
17.06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA	M2	$ 29,000.00	2866.10	$ 83,116,900.00	62.05	$ 1,799,450.00	1569.68	$ 45,520,720.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 18,200,340,385.55**		**$ 12,024,716.75**		**$ 9,042,938,255.33**
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	$ 1,006,187.28	237.04	$ 238,506,632.85	5.83	$ 5,866,071.84	147.27	$ 148,181,200.73
NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	$ 1,304,797.65	111.63	$ 145,654,561.67	4.72	$ 6,158,644.91	93.86	$ 122,468,307.43
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.12**		**$ 310,853,495.38**		**$ 15,524,124,973.62**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 90,147,487.58		$ 4,501,996,242.35
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 3,108,534.05		$ 155,241,249.74
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 15,542,670.27		$ 776,206,248.68
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 108,798,691.88		$ 5,433,443,740.77
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 419,652,097.26**		**$ 20,957,568,714.39**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ -**		**$ 979,670,705.64**
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ -		$ 284,104,504.64
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ -**		**$ 1,263,775,210.28**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**				
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 419,652,097.26**		**$ 22,221,343,924.67**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**				**$ 1,200,000,000.00**
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**		**$ 419,652,097.26**		**$ 23,421,343,924.67**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
2.01	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SOBRANTES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	M3
					TOTAL	11563.43
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Volumen	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE E-2	2.50	2.50	3.00		18.75	18.75
EJE E-3	2.50	2.50	3.00		18.75	18.75
EXCAVACION MUROS DE CONTENCION						
ZARPA MURO CONTENCION 5,90 MTS	4.10	78.2	3.50		1122.60	1122.60
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION						
VIGA EJE 2 ENTRE EJE B - C	0.40	4.26	0.50		0.85	0.85
VIGA EJE 2 ENTRE EJE F - G	0.40	5.85	0.50		1.17	1.17
VIGA EJE 2 ENTRE EJE G - H	0.40	6.58	0.50		1.32	1.32
VIGA EJE C ENTRE EJE 2 - 3	0.40	4.27	0.50		0.85	0.85
VIGA EJE D ENTRE EJE 2 - 3	0.40	4.39	0.50		0.88	0.88
VIGA EJE E ENTRE EJE 2 - 3	0.40	4.27	0.50		0.85	0.85
VIGA EJE F ENTRE EJE 2 - 3	0.40	4.27	0.50		0.85	0.85

PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL SUELO 25%	2312.69
ACUMULADO	11563.43
ACTA MODIFICATORIA 4	12049.47
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	486.04
COBRADAS PARCIAL No 1	1241.77
COBRADAS PARCIAL No 2	3937.07
COBRADAS PARCIAL No 3	2837.53
COBRADAS PARCIAL No 4	12.22
COBRADAS PARCIAL No 5	2845.35
EJECUTADA MES DE ENERO	70.34
CANTIDADES PRESENTE ACTA	619.15

OBSERVACIONES:

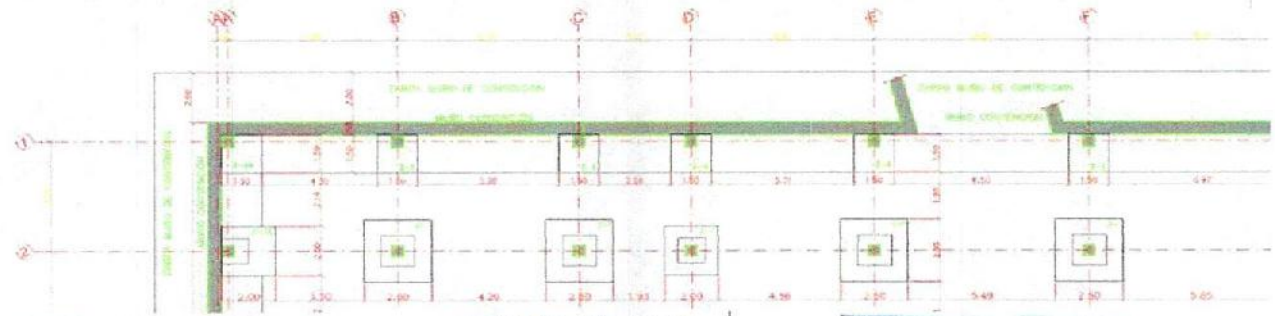



UBICACIÓN PLANO



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	182363.62
		No Varilla	Largo (M)	Peso ml/kg	Canticad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
MUROS DE CONTENCION - MODULO A							
MURO DE CONTENCION H=5.90 MTS							
ZARPA	Longitud total muro	73.79					0.00
	Horizontal superior	6.00	4.45	2.25	492	1.00	4925.5
	Horizontal Inferior	6.00	4.45	2.25	492	1.00	4925.5
	Longitudinal superior	5.00	81.99	1.56	14	1.00	1790.8
	Longitudinal Inferior	5.00	81.99	1.56	14	1.00	1790.8
MURO	Vertiical Exterior	5.00	6.45	1.56	295	1.00	2969.9
	Vertical Interior	8.00	6.85	3.975	492	1.00	13590.3
	Longitudinal Exterior	5.00	81.99	1.56	20	1.00	2558.1
	Longitudinal Interior	5.00	81.99	1.56	20	1.00	2558.1
Anclajes ciclopeo	Ganchos	4.00	1.40	0.996	738	1.00	1028.9
MURO DE CONTENCION H=5.90 MTS SOLO ZARPA ADICIONAL							0.00
ZARPA	Longitud total muro	6.44					0.00
	Horizontal superior	6.00	4.45	2.25	43	1.00	429.9
	Horizontal Inferior	6.00	4.45	2.25	43	1.00	429.9
	Longitudinal superior	5.00	7.16	1.56	14	1.00	156.3
	Longitudinal Inferior	5.00	7.16	1.56	14	1.00	156.3
Anclajes ciclopeo	Ganchos	4.00	1.40	0.996	64	1.00	89.8
Descuento por kg/m3							-4284.34
						ACUMULADO	182363.62
						ACTA MODIFICATORIA 4	199229.86
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	16866.24
						COBRADAS PARCIAL No 1	32716.10
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	101151.89
						COBRADAS PARCIAL No 4	27209.05
						COBRADAS PARCIAL No 5	11114.32
						EJECUTADAS EN ENERO	2307.36
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	7865.10

OBSERVACIONES:







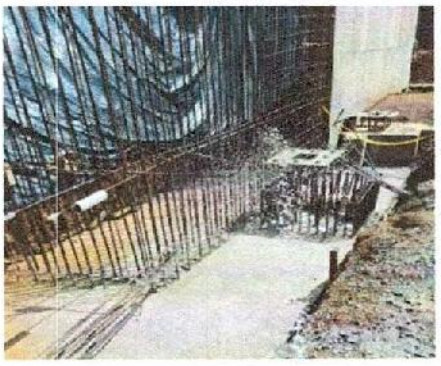

ALEXIS RONCON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


7579

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	562.52
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area		Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
MURO DE CONTENCION 5.90 MTS DESDE EL EJE K HASTA EL H		71.79		4.74			340.28
ADICIONAL DE ZARPA EN EL PUNTO FIJO		6.44		2.60			16.74
						ACUMULADO	562.52
						ACTA MODIFICATORIA 4	730.88
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	168.36
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	53.33
						COBRADAS PARCIAL No 3	295.48
						COBRADAS PARCIAL No 4	75.09
						COBRADAS PARCIAL No 5	46.32
						EJECUTADO ENERO	
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	92.30
OBSERVACIONES:							

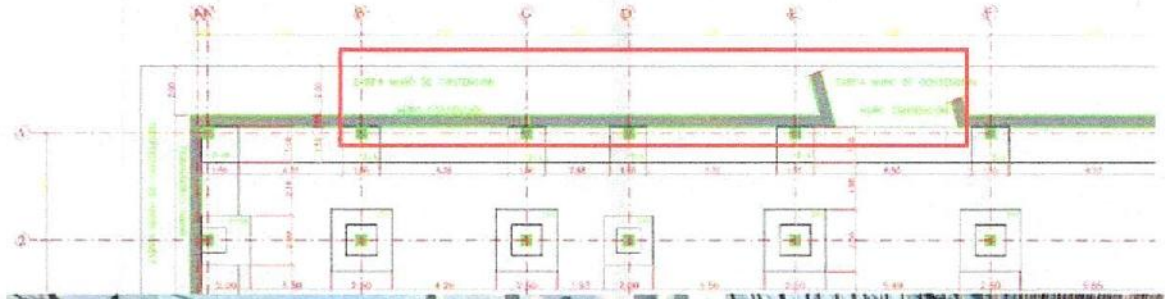

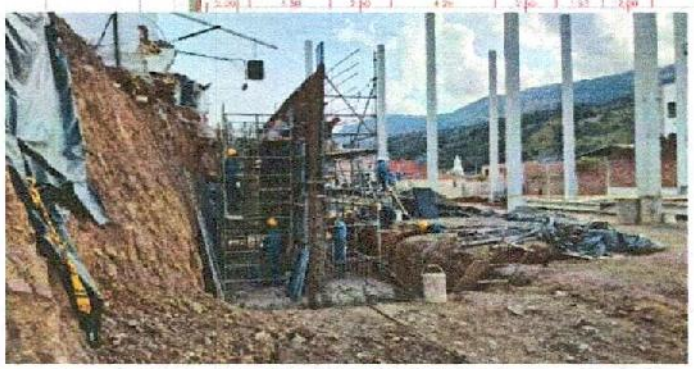



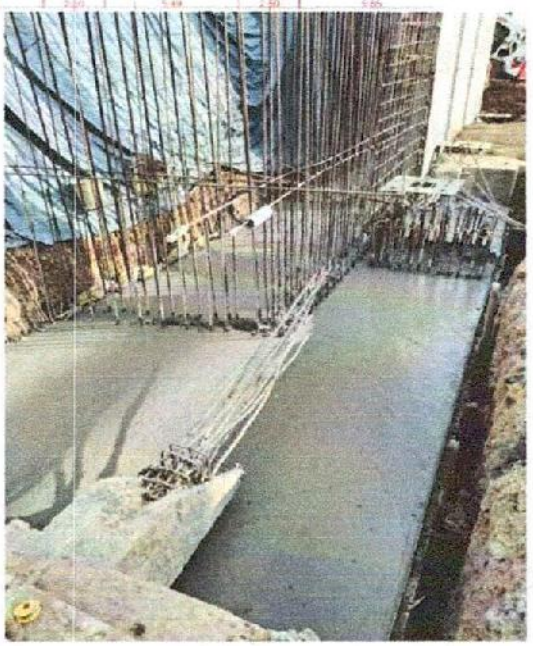

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
17.06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	1569.68
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
CENTRAL DE RESIDUOS						
FACHADA FRONTAL		12.40	2.5		1.00	31.00
DESCUENTA VANO PRINCIPAL		1.63	-2.63		1.00	-4.29
DESCUENTA PUERTAS		1.50	-2.17		3.00	-9.77
FACHADA LATERAL IZQUIERDA		5.77	2.5		1.00	14.43
DESCUENTA VANO		5.07	-2.05		1.00	-10.39
FACHADA LATERAL DERECHA		5.77	2.5		1.00	14.43
FACHADA POSTERIOR		12.40	2.5		1.00	31.00
DESCUENTA VANO		1.66	-2.63		1.00	-4.37
DESCUENTA VENTANAS		2.00	-0.5		3.00	-3.00
COL 1		0.35	2.15		2.00	1.51
COL 2		0.35	2.15		2.00	1.51


ACUMULADO	1569.68
ACTA MODIFICATORIA 4	2866.10
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1296.42
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	311.80
COBRADAS PARCIAL No 5	1195.83
EJECUTADAS FEBRERO	62.05


OBSERVACIONES:

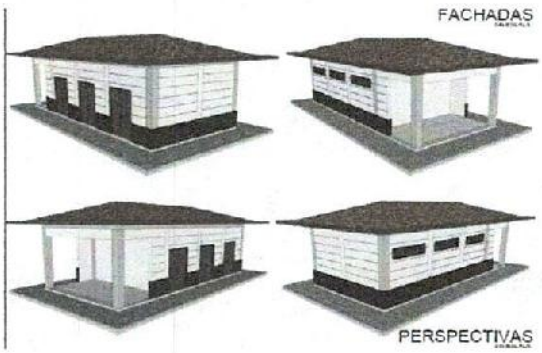

UBICACIÓN PLANO



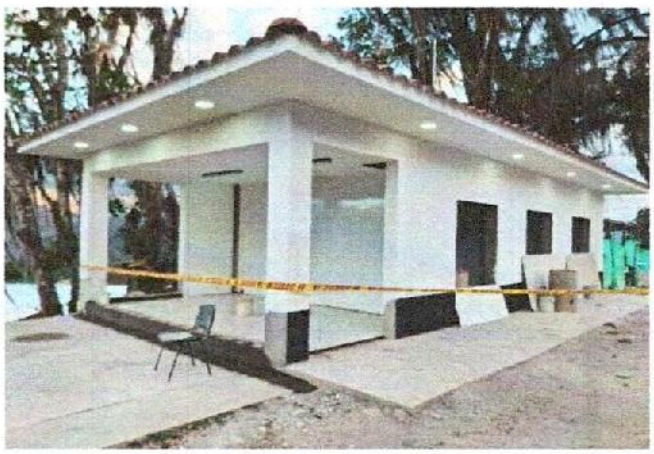

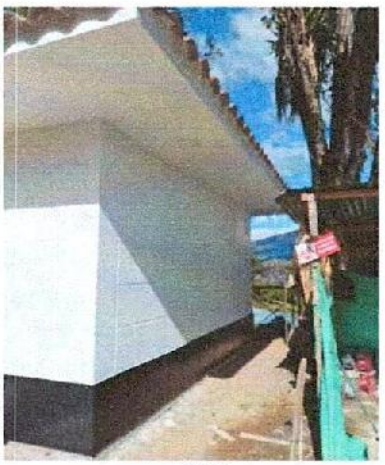

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7591

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	147.27
		Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
EJE D ENTRE 1-2		2.65	0.40	0.50			0.53
EJE E ENTRE 1-2		2.65	0.40	0.50			0.53
EJE F ENTRE 1-2		2.65	0.40	0.50			0.53
EJE G ENTRE 1-2		2.65	0.40	0.50			0.53
EJE 1 ENTRE D-E		5.31	0.40	0.50			1.06
EJE 1 ENTRE E-F		6.50	0.40	0.50			1.30
EJE 2 ENTRE F-G		7.22	0.40	0.50			1.44
						ACUMULADO	147.27
						ACTA MODIFICATORIA 4	212.97
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	65.70
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	20.09
						COBRADAS PARCIAL No 3	52.38
						COBRADAS PARCIAL No 4	9.86
						COBRADAS PARCIAL No 5	4.53
						EJECUTADOS ENERO	54.58
						CANTDADES PRESENTE ACTA	5.83

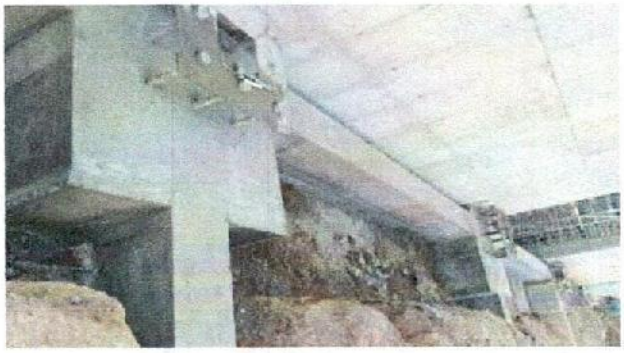





UBICACION PLANO



IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7592

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP 75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	93.86
		Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
EJE D-1		1.50	1.50	0.70	1	1	1.58
EJE E-1		1.50	1.50	0.70	1	1	1.58
EJE G-1		1.50	1.50	0.70	1	1	1.58
						ACUMULADO	93.86
						ACTA MODIFICATORIA 3	111.63
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	17.77
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	82.79
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	1.73
						EJECUTADA ENERO	4.62
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	4.72





UBICACIÓN PLANO

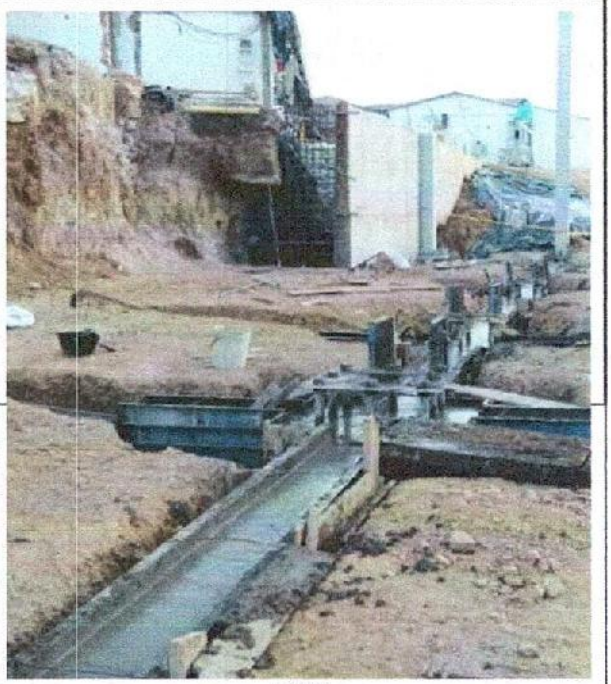

IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1311848548	9482712207	E	2025/03/04	2025/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$31,105,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (45 Afiliados)																						$100,137,398	$16,129,300							$100,137,398	$4,007,500			$99,873,898	$3,996,900			$100,137,398	$6,971,600			$0	$0		$31,105,300
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (45 Afiliados)																						$100,137,398	$16,129,300							$100,137,398	$4,007,500			$99,873,898	$3,996,900			$100,137,398	$6,971,600			$0	$0		$31,105,300
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (45 Afiliados)																						$100,137,398	$16,129,300							$100,137,398	$4,007,500			$99,873,898	$3,996,900			$100,137,398	$6,971,600			$0	$0		$31,105,300
1	CC	1095816853	ANAYA RODRIGUEZ ERVIN GIOVANNY	X																23020 1	28	$1,378,600	$212,600	EPS037	28	$1,378,600	$53,200	CCF39	28	$1,378,600	$53,200	14-25	28	$1,378,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
2	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO																	25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
4	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO																	25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
5	CC	1096956280	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1005479020	CACERES HERNANDEZ YEISON JAVIER																	23030 1	30	$2,207,520	$353,300	EPS005	30	$2,207,520	$88,400	CCF39	30	$2,207,520	$88,400	14-25	30	$2,207,520	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,800
7	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO							X										23020 1	30	$10,520,000	$1,788,400	EPS002	30	$10,520,000	$420,800	CCF39	30	$10,520,000	$420,800	14-25	30	$10,520,000	6.960%	$732,200	30	$0	$0	SI	$3,362,200
8	CC	5609540	CASTELLANOS BARRERA FILEMON																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1098680177	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY																	23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
12	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES																	23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
13	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	13444403	DIAZ CASTELLANOS JOSE HERNAN																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO																	25-14	30	$2,207,520	$353,300	EPS037	30	$2,207,520	$88,400	CCF39	30	$2,207,520	$88,400	14-25	30	$2,207,520	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,800
17	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER																	25-14	30	$2,945,600	$471,300	EPS037	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
18	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO							X										25-14	30	$5,509,146	$881,500	EPS037	30	$5,509,146	$220,400	CCF39	30	$5,509,146	$220,400	14-25	30	$5,509,146	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
19	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
20	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
21	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																	25-14	30	$1,987,689	$318,100	EPS010	30	$1,987,689	$79,600	CCF39	30	$1,987,689	$79,600	14-25	30	$1,987,689	6.960%	$138,400	30	$0	$0	SI	$615,700
22	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																	23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
23	CC	5609131	JAIMES JAIMES LIBARDO																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
24	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																	23100 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700

2025/03/05 10:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

25	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
26	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
27	CC	13979148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
28	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS		230301	30	$2,891,184	$462,600	EPS037	30	$2,891,184	$115,700	CCF39	30	$2,891,184	$115,700	14-25	30	$2,891,184	6.960%	$201,300	30	$0	$0	Si	$895,300
29	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
30	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO		230301	30	$2,945,600	$471,300	EPS002	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	Si	$912,200
31	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
32	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
33	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
34	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY		230301	30	$2,782,765	$445,300	EPS002	30	$2,782,765	$111,400	CCF39	30	$2,782,765	$111,400	14-25	30	$2,782,765	6.960%	$193,700	30	$0	$0	Si	$861,800
35	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
36	CC	13927795	RODRIGUEZ JAIMES PEDRO VICENTE		231001	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
37	CC	1098780824	ROJAS ORTIZ HENRY ALBERTO	X	230301	30	$5,509,137	$881,500	EPS002	30	$5,509,137	$220,400	CCF39	30	$5,509,137	$220,400	14-25	30	$5,509,137	6.960%	$383,500	30	$0	$0	Si	$1,705,800
38	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
39	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
40	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
41	CC	1096951842	SEPULVEDA CASTELLANOS WILMER LEONARDO		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
42	CC	1095925867	SERRANO CACERES JULIAN MATEO	X	230301	30	$5,509,137	$881,500	EPS041	30	$5,509,137	$220,400	CCF39	30	$5,509,137	$220,400	14-25	30	$5,509,137	6.960%	$383,500	30	$0	$0	Si	$1,705,800
43	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$430,300
44	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$569,700
45	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total		Afiliados(45)					$100,137,398	$16,129,300			$100,137,398	$4.007,500			$99,873,898	$3,996,900			$100,137,398		$6,971,600		$0	$0		$31,105,300

7594

 2025/03/05 10:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERÍA,CONSULTORÍA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1311848548	9482712207	E	2025/03/04	2025/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$31,105,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$16,129,300	$0	$0	$16,129,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$588,800	$0	$0	$588,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,794,000	$0	$0	$4,794,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$8,289,900	$0	$0	$8,289,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,456,600	$0	$0	$2,456,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$6,971,600	$0	$0	$6,971,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	45	$6,971,600	$0	$0	$6,971,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$3,996,900	$0	$0	$3,996,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	45	$3,996,900	$0	$0	$3,996,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				45	$4,007,500	$0	$0	$4,007,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,600	$0	$0	$159,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,077,600	$0	$0	$1,077,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$424,600	$0	$0	$424,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$912,400	$0	$0	$912,400
TOTAL				45	$31,105,300	$0	$0	$31,105,300

2025/03/05 10:38 AM

9654

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13511301
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXIS RONDÓN MUÑOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV. JARDIN CASA 48	TELÉFONO:	3187726
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7958242411	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1310127576

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										$ 480.000	$ 0	$ 480.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES:													$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.700	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 15.700
SUBTOTALES:									$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 15.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 13511301	RONDON MUÑOZ ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.000.000			NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDU	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000	13511301	$ 15.700

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 870.700

3096

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-18, 05:55:35 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 76219166

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096946096		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30			F	$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	0	0.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-18, 05:56:48 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 76219166

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento							Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
	CC 1096947063		Residente		Exonerado	S				
Tipo Cotizante	01	00					ANTOLINEZ JAIMES EDWAR ALEXIS	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Cécigo ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	M1N002		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	0.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ADRES M1N002	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

454

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-18, 05:56:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 76219166

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098130385		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PEÑA CARVAJAL EDINSON MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	0.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-17, 06:51:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1070511764

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 16/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOB INGENIERIA SAS		
Documento	NI901478369	**Dirección**	TV 112 #20 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3232196491
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	**Identificación**	CC 1098728354
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1005337252	JENIFER PAOLA GOMAJOA CABALLERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF39) CAJASAN	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1005441013	ANDRES FELIPE CORDERO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1007337824	CRISTIAN OLIVAN GUANIN ARENALES	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 521.950	$ 83.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF39) CAJASAN	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.900
CC 1007715719	EDINSON ENRIQUE DIAZ MAZA	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF39) CAJASAN	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 1090434281	BREINER STIWAR AREVALO RICO	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 616.850	$ 98.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 616.850	$ 24.700	6,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF39) CAJASAN	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.500
CC 1098618856	JONATHAN BECERRA FLOREZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 1.020.000	$ 163.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.020.000	$ 40.800	6,960	$ 1.020.000	$ 71.000	(CCF39) CAJASAN	$ 1.020.000	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.600
CC 1098725902	GENNINER ALIRIO CHICURLO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098728354	JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	6,960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 1100502462	DIANA ALEXANDRA SUAREZ GONZALEZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 396.667	$ 63.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 396.667	$ 15.900	6,960	$ 396.667	$ 27.700	(CCF39) CAJASAN	$ 396.667	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.000
CC 1116734569	JAVIER ANTONIO PARALES CHAPARRO	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 616.850	$ 98.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 616.850	$ 24.700	6,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF39) CAJASAN	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.500
CC 1117528369	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 12181151	GENTIL ANIBAL CAMPOS SOTELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 77156329	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91469164	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91530839	BREINER MEJIA PORTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 6189915	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.922.067	$ 21.922.067	$ 21.922.067	$ 21.922.067	$ 3.508.000	$ 877.500	$ 1.526.400	$ 877.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.789.400	$ 0	$ 6.789.400

109

7602

MARZO

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"



INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 de marzo de 2025 – 31 de marzo de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

TIPO DE CONTRATO: 4

INTRODUCCION 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 5

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 5

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6

Construcción módulo A: 6
Construcción módulo B: 7
Construcción módulo C: 7
Construcción módulo E: 7
Construcción módulo F 7
Adecuación área de UCI 8

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 9

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 9

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS 21

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 21

PRESUPUESTO DE OBRA 24

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE FEBRERO DE 2025 24

Programación de obra 26

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 6
Ilustración 2 Central de residuos fachada principal 9
Ilustración 3 Central de residuos 9
Ilustración 4 Columnas instaladas en el módulo A 10
Ilustración 5 Organización de elementos metálicos para su instalación 10
Ilustración 6 Columnas instaladas en los ejes C1-C2-D1 11
Ilustración 7 Mejoramiento en concreto ciclópeo de 3000 PSI 11
Ilustración 8 Mejoramiento en concreto ciclópeo muro perimetral 12
Ilustración 9 Colocación de acero de refuerzo - zarpa muro de contención perimetral 12
Ilustración 10 Inicio fundida en concreto de zarpa y vigas cimentación muros de contención - Modulo A 13
Ilustración 11 Aplicación de anti-sol al terminar la fundida de la zarpa 13
Ilustración 12 Instalación de acero de refuerzo muro de contención sobre el eje 3 del módulo A 14
Ilustración 13 Instalación de formaleta metálica para la fundida en concreto de 4000 PSI 14
Ilustración 14 Almacenamiento de estructura metálica 15
Ilustración 15 Limpieza y preparación de elementos estructura para aplicación de capa de pintura anticorrosiva 15
Ilustración 16 Aplicación de pintura anticorrosiva en los elementos estructurales 16
Ilustración 17 Colocación de carteras para soporte de viguería 16

Ilustración 18 Perforación de elementos estructurales para su conexión con tornillería 17
Ilustración 19 Elementos estructura con pintura anticosorriva 17
Ilustración 20 Descargue de elementos estructurales módulo D 18
Ilustración 21 Instalación de viga de conexión entre columnas 18
Ilustración 22 Instalación de columna sobre el eje Ñ1 19
Ilustración 23 Instalación de elementos estructurales módulo D 19
Ilustración 24 Instalación de columnas y vigas de conexión entre los ejes Ñ1 y O1 20
Ilustración 25 Día lluvioso 21
Ilustración 26 Amanece con lluvia fuerte 22
Ilustración 27 Día lluvioso en horas de la mañana 22
Ilustración 28 Dia lluvioso en horas de la madrugada y mañana 23
Ilustración 29 Jornada laborar con fuerte lluvia 23

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido de 01 de marzo de 2025 hasta la elaboración de este informe 31 de marzo de 2025.

Este proyecto representa un hilo significativo en el campo de la construcción civil, no solo por s magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuevo equipo de trabajo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento con los servicios de comedor, cocina, lavandería, mantenimiento, oficinas administrativas y hospitalización. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente se encuentra facturación, pediatría, consultorios, cuarto técnico (RACK). Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra ingresando por la plazoleta principal y cuenta con el servicio de urgencias, además colinda con el tomógrafo del hospital existente. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parto, recuperación de pacientes y parte de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización

- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo comprendido por este informe se avanzaron actividades en los siguientes módulos.

CENTRAL DE RESIDUOS

Durante el mes de marzo se realizó la instalación de las puertas de ingreso sobre la entrada principal y las celosías en la parte posterior de la central de residuos. También se instalo la canal sobre el perímetro de la cubierta para la recolección de agua lluvia, se está realizando últimos acabos de pintura sobre la carpintería metálica y sobre los muros.

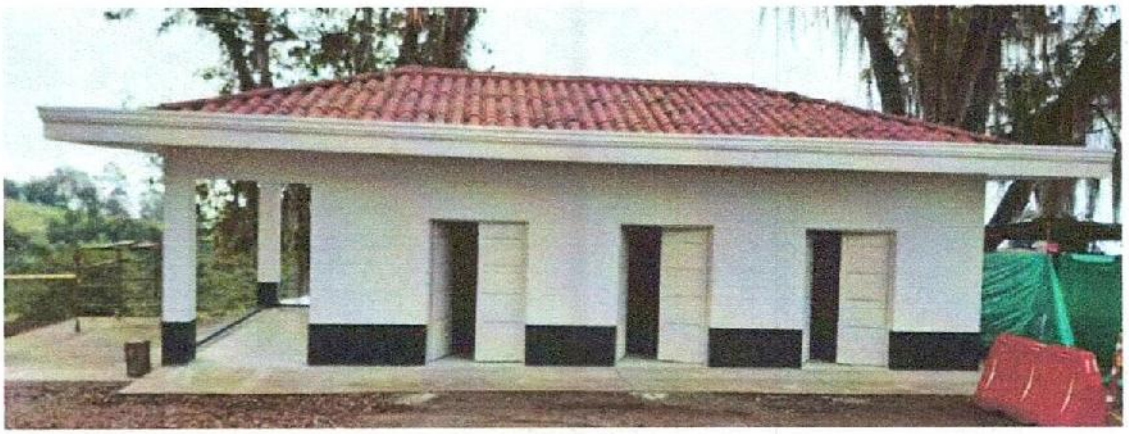


Ilustración 2 Central de residuos fachada principal

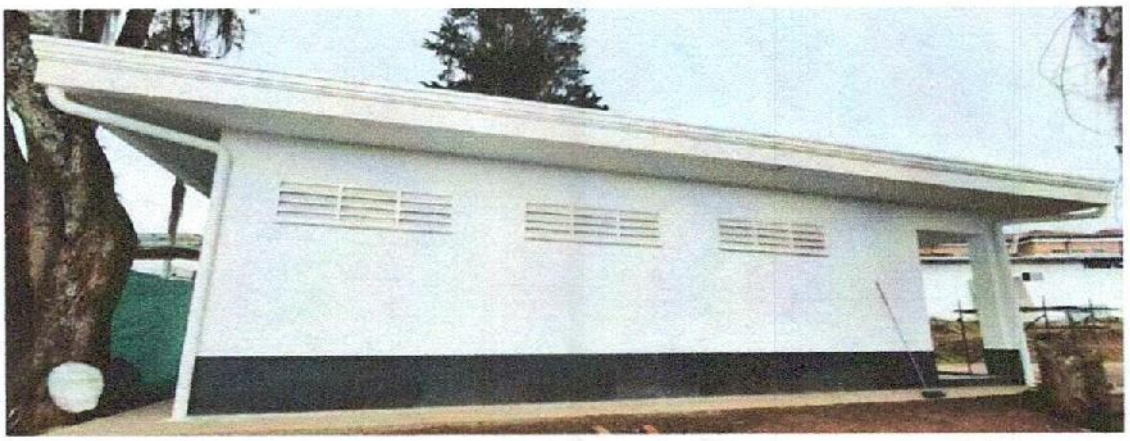


Ilustración 3 Central de residuos

MODULO A

Durante este periodo se realizó la instalación de 3 columnas sobre los ejes C1 – C2 – D2 en estructura metálica como se muestra en las siguientes ilustraciones.

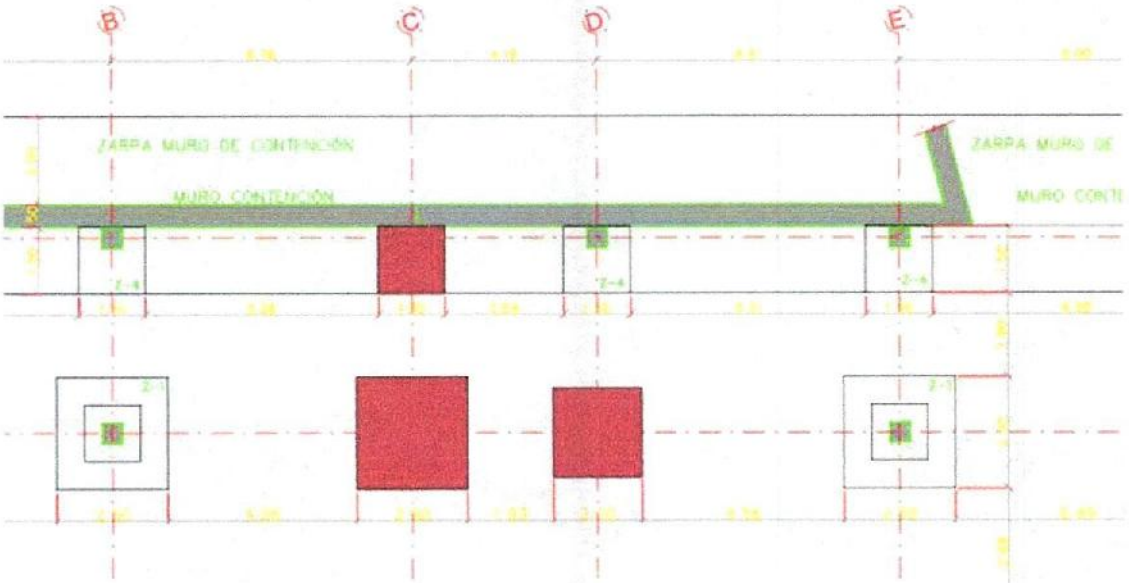


Ilustración 4 Columnas instaladas en el módulo A

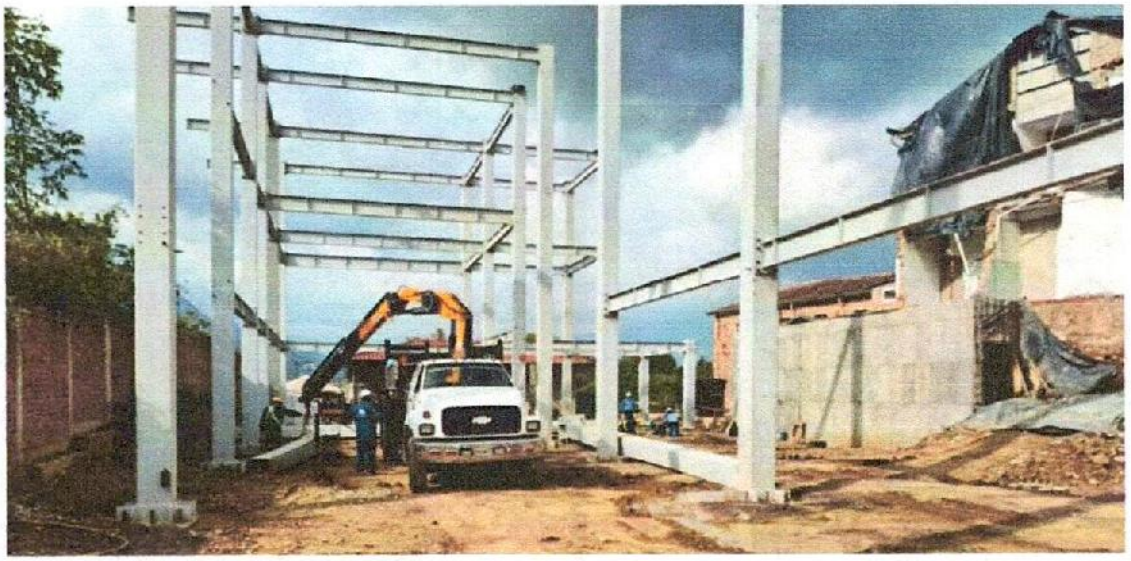


Ilustración 5 Organización de elementos metálicos para su instalación



Ilustración 6 Columnas instaladas en los ejes C1-C2-D1

Adicional se continuaron los trabajos sobre la zona de ambulancias del modulo A y se continuo con el mejoramiento en concreto ciclópeo para el muro de contención perimetral, esto con el fin de poder iniciar la colocación de acero de refuerzo de la zarpa de muro de contención y poder entrelazar la cimentación entre muro de contención del eje 3 y muro de contención perimetral, teniendo en cuenta las indicaciones del ingeniero estructural.



Ilustración 7 Mejoramiento en concreto ciclópeo de 3000 PSI

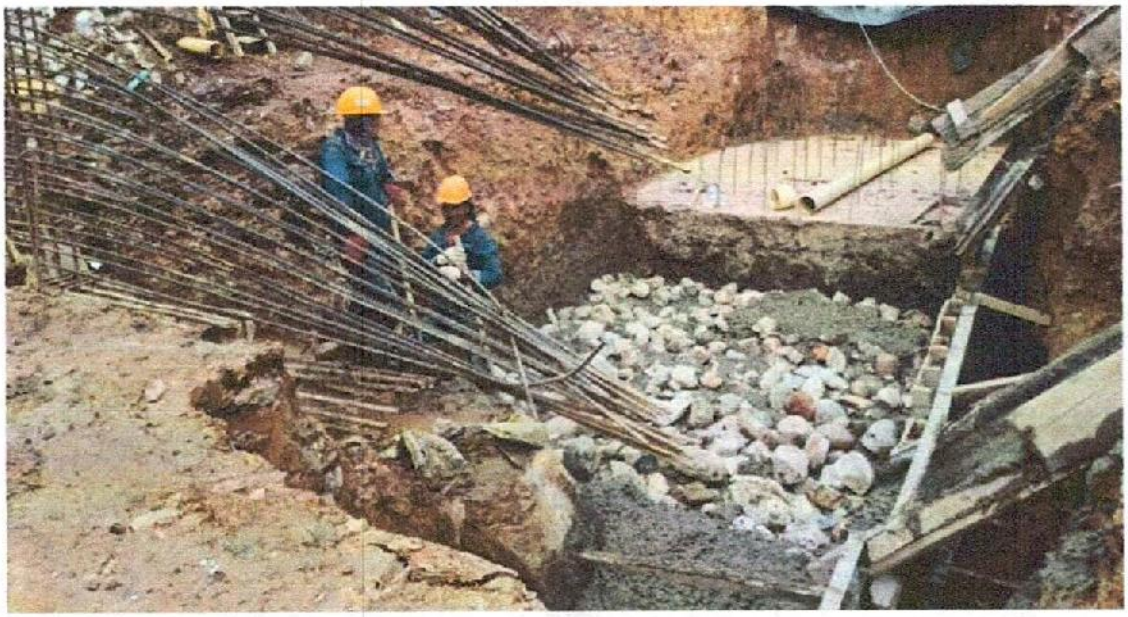


Ilustración 8 Mejoramiento en concreto ciclópeo muro perimetral



Ilustración 9 Colocación de acero de refuerzo - zarpa muro de contención perimetral

Una vez se realizó la continuación de la colocación del acero de refuerzo sobre la zarpa muro de contención perimetral y muro de contención y vigas de cimentación sobre el eje 3. Se verifican los aceros con la interventoría según diseños y se avala continuar con la fundida de la zarpas y viga de cimentación.



Ilustración 10 Inicio fundida en concreto de zarpa y vigas cimentación muros de contención - Modulo A



Ilustración 11 Aplicación de anti-sol al terminar la fundida de la zarpa

Una vez terminado la fundida de la zarpa y viga de cimentación se continua con la colocación del acero de refuerzo del muro de contención sobre el eje 3, ya terminado se verifican aceros con la interventoría y se procede a formatear los primeros 2.4 metros de altura del muro para poder realizar la fundida del mismo.



Ilustración 12 Instalación de acero de refuerzo muro de contención sobre el eje 3 del módulo A



Ilustración 13 Instalación de formaleta metálica para la fundida en concreto de 4000 PSI

MODULO D

En el módulo D se continua con la fabricación de los elementos estructurales (columnas, vigas y conexiones), la construcción de estas piezas se esta realizando en el lote conjunto al hospital que el consorcio alquilo para tener un almacenamiento de elementos estructurales y su fabricación.

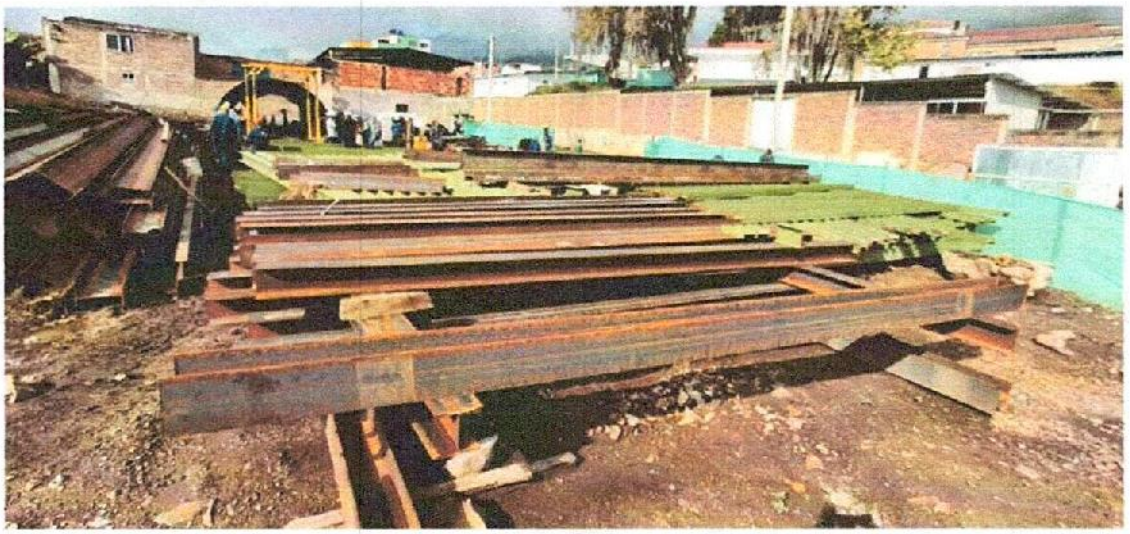


Ilustración 14 Almacenamiento de estructura metálica

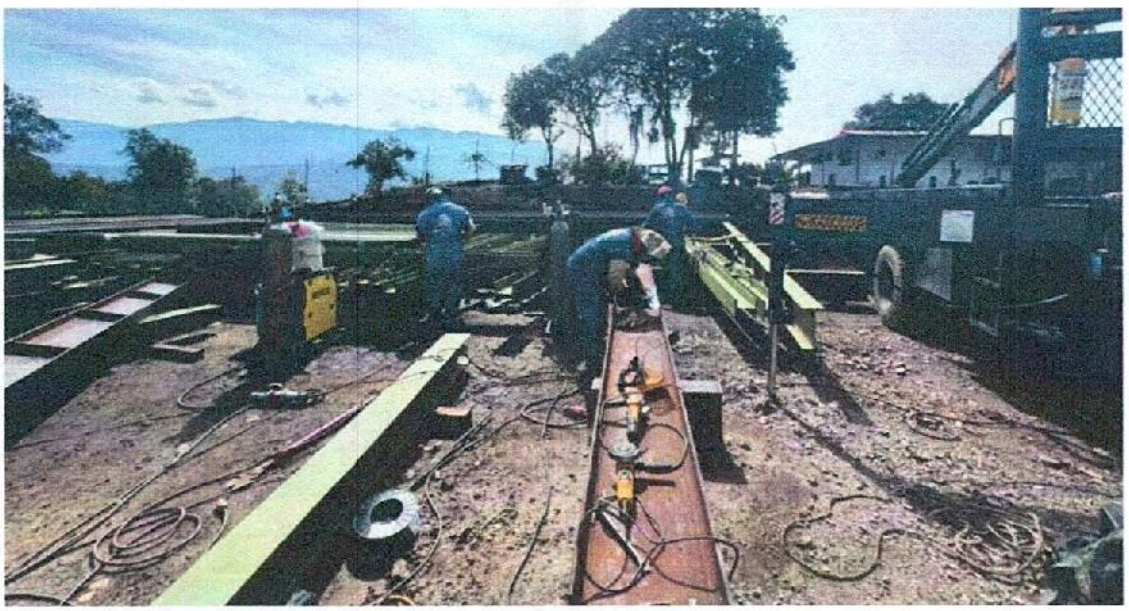


Ilustración 15 Limpieza y preparación de elementos estructura para aplicación de capa de pintura anticorrosiva

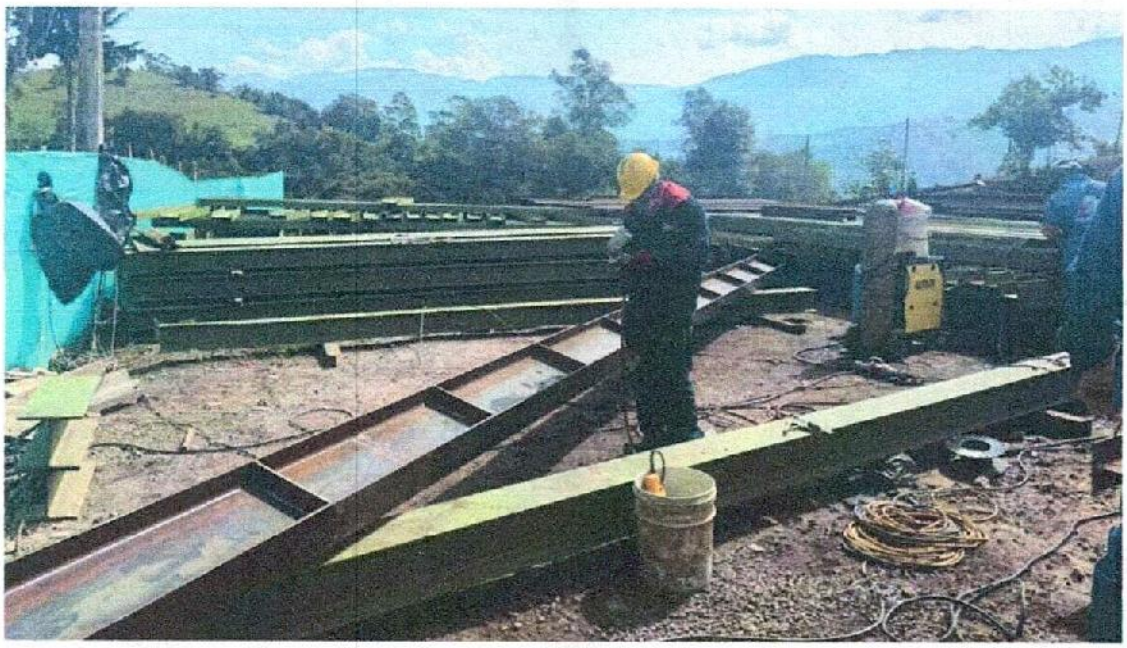


Ilustración 16 Aplicación de pintura anticorrosiva en los elementos estructurales



Ilustración 17 Colocación de carteras para soporte de viguería



Ilustración 18 Perforación de elementos estructurales para su conexión con tornillería

Una vez fabricado los elementos del modulo D en taller se transportaron al modulo para realizar su respectivo izaje. Para este movimiento de elementos de esta longitud se solicito el acompañamiento de agentes de transito del municipio el cual nos permitieron efectuar el cierre de la calle que queda sobre el perímetro del modulo D para poder hacer el descargue del material con mayor seguridad.



Ilustración 19 Elementos estructura con pintura anticosorriva



Ilustración 20 Descargue de elementos estructurales módulo D

Una vez puesto en piso el material sobre el modulo se inicia la instalación de 4 columnas sobre el eje Ñ1 y la instalación de las vigas de conexión entre ellas con las del eje O1 como se muestran en las siguientes ilustraciones.



Ilustración 21 Instalación de viga de conexión entre columnas



Ilustración 22 Instalación de columna sobre el eje Ñ1

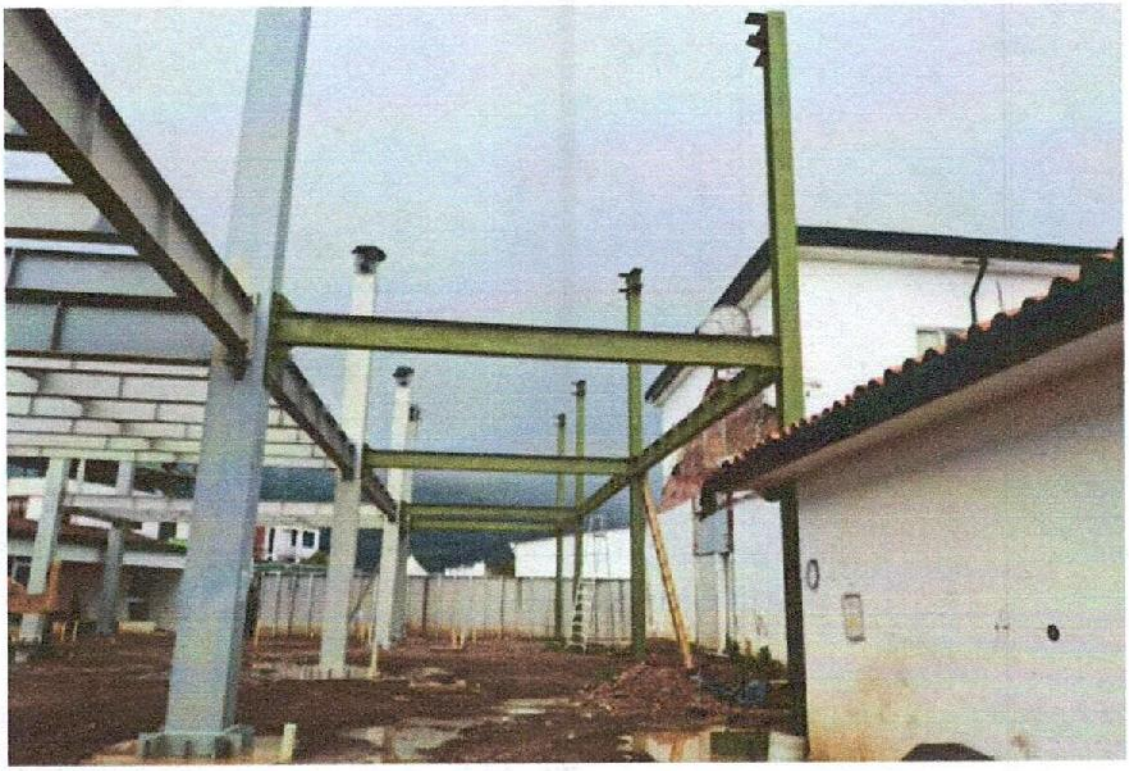


Ilustración 23 Instalación de elementos estructurales módulo D



Ilustración 24 Instalación de columnas y vigas de conexión entre los ejes Ñ1 y O1

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.
- Planeación de nuevos campos de acción incluyendo las posibles contingencias para el continuo avance de obra civil en el proyecto.

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales. A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de marzo.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Seco	24	24	24	18	24	19	24	24	24	24	24	24	17	24	24	24	24	20	22	17	24	24	24	19	21	22	20	21	24	19	24
Lluvia moderada				6		5							5					1		7				5		2	4			5	
Lluvia intensa													2					3	2						3			3			
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

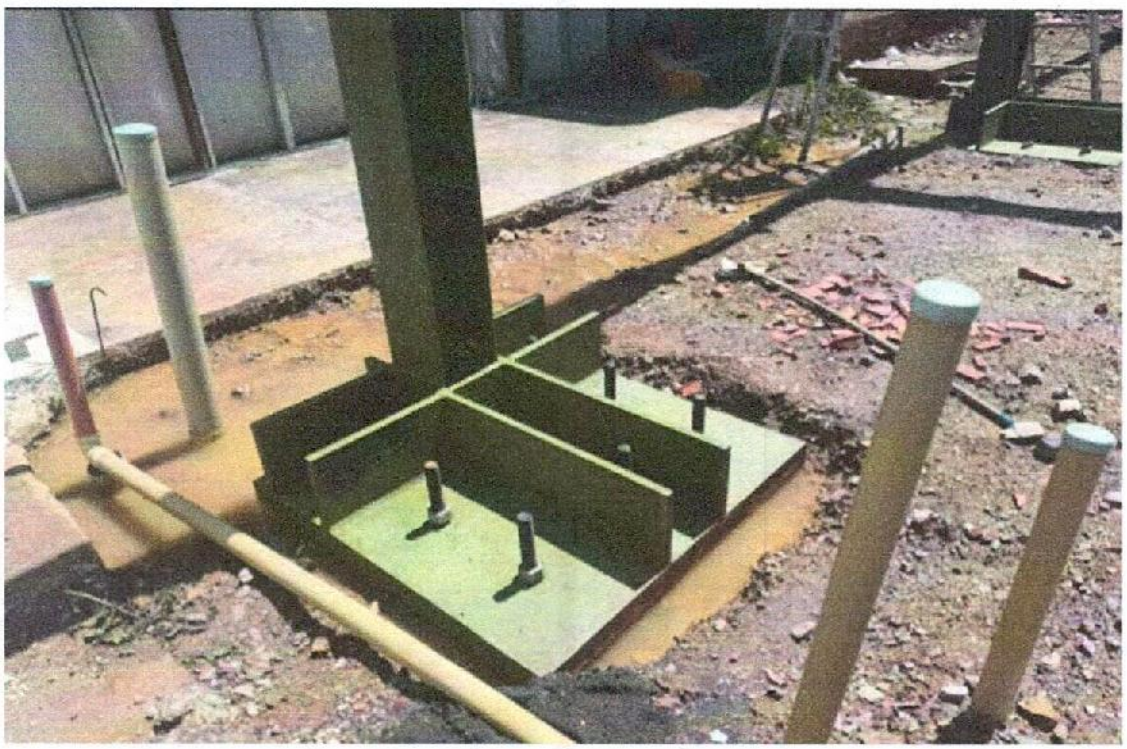


Ilustración 25 Día lluvioso



Ilustración 26 Amanece con lluvia fuerte



Ilustración 27 Día lluvioso en horas de la mañana

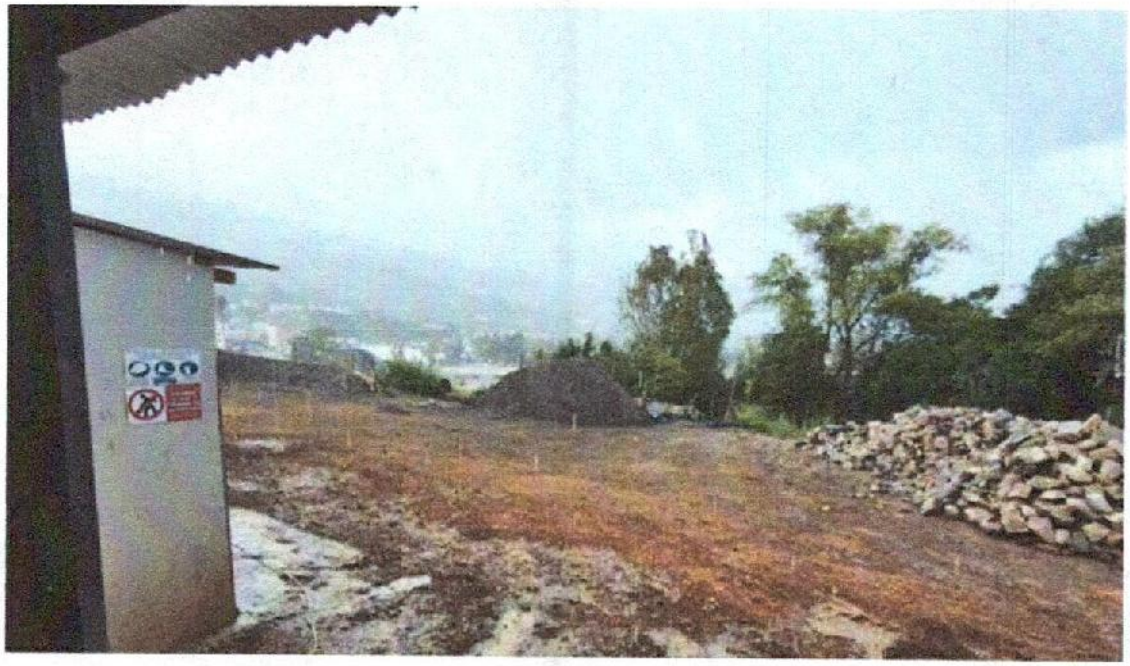


Ilustración 28 Dia lluvioso en horas de la madrugada y mañana



Ilustración 29 Jornada laborar con fuerte lluvia

PRESUPUESTO DE OBRA

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE FEBRERO DE 2025


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA						MARZO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES**				**$ 289,929,652.24**		**$ 18,643,645.00**
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	350	$ 68,500.00	$ 23,975,000.00	272.17	$ 18,643,645.00
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 2,215,201,283.92**		**$ 56,744,538.26**
3.01	BASE CONCRETO POBRE 5CM	M2	2100	$ 46,378.69	$ 97,395,249.00	36.64	$ 1,699,315.20
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	4701.256074	$ 13,486.01	$ 63,401,186.43	441.80	$ 5,958,183.90
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	200	$ 1,609,411.12	$ 321,882,224.00	30.50	$ 49,087,039.16
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				$ 10,833,097,500.00		
5.0	**CUBIERTA**				**$ 5,065,500,000.00**		**$ 89,850,000.00**
5.01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	6754	$ 750,000.00	$ 5,065,500,000.00	119.80	$ 89,850,000.00
13.0	**PAÑETES**				**$ 932,022,578.57**		**$ 21,876,500.00**
13.04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	ML	33.5	$ 950,000.00	$ 31,825,000.00	23.03	$ 21,876,500.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ -**		**$ 11,631,183.35**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER


PRESUPUESTO DE OBRA						MARZO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3		$ 795,530.16	$ -	2.91	$ 2,314,992.77
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3		$ 1,006,187.28	$ -	7.21	$ 7,254,610.29
NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3		$ 1,304,797.65	$ -	1.58	$ 2,061,580.29
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 39,566,165,363.82**		**$ 198,747,866.61**
	ADMINISTRACIÓN			29%	$ 11,474,187,955.51		$ 57,636,881.32
	IMPREVISTOS			1%	$ 395,661,653.64		$ 1,987,478.67
	UTILIDAD			5%	$ 1,978,308,268.19		$ 9,937,393.33
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 13,848,157,877.34		$ 69,561,753.32
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 53,414,323,241.16**		**$ 268,309,619.93**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 7,297,487,951.66**		$ -
	ADMINISTRACIÓN			$ 0.29	$ 2,116,271,505.58		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 9,413,759,457.24**		$ -
	DIFERENCIA POR AJUSTE						
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 62,828,082,698.40**		**$ 268,309,619.93**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,028,082,699.20**		**$ 268,309,619.93**

Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 31 marzo de 2025.

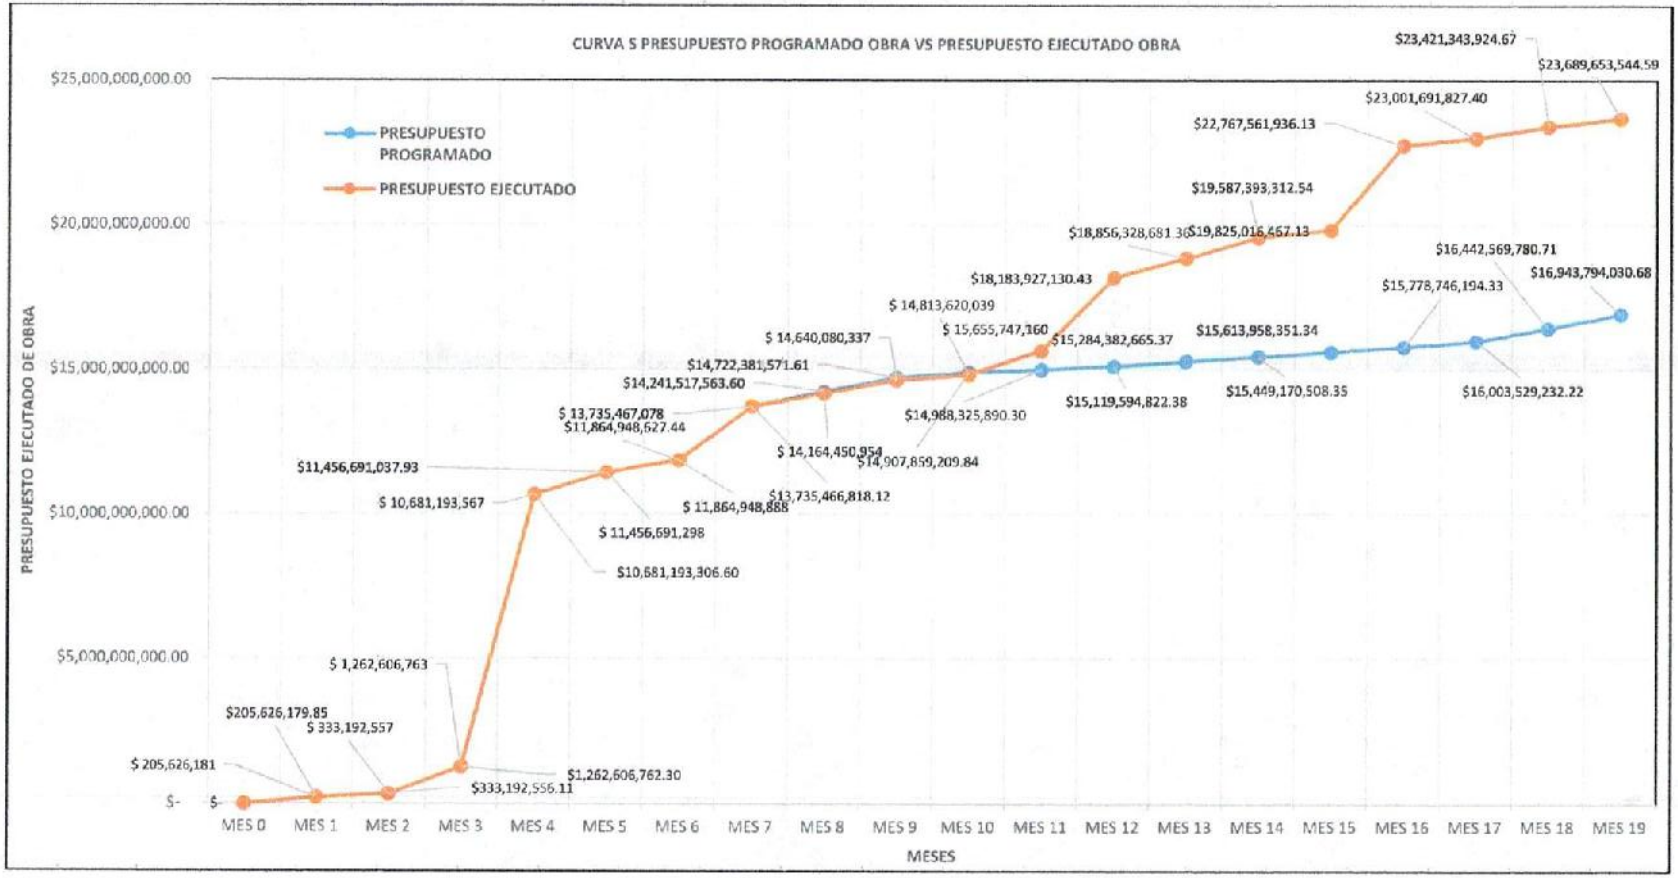

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 31 de marzo de 2025.

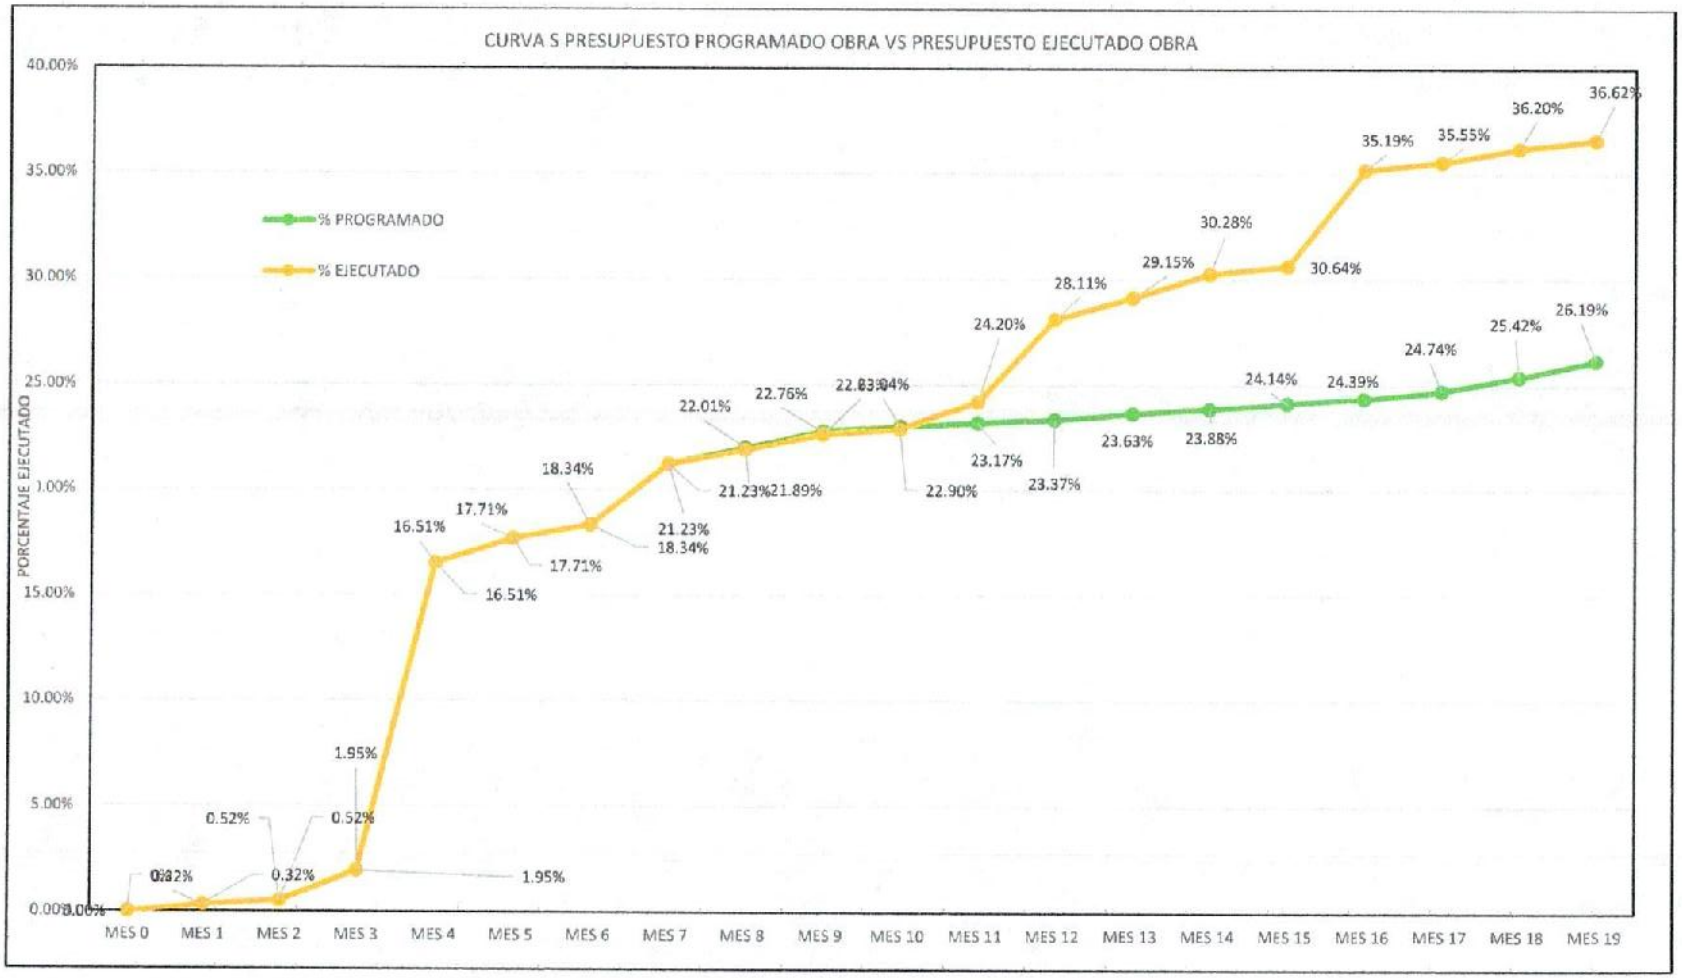

En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 26.19% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 36.62% acumulado, presentando 10.43% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se reitera a la E.S.E. Hospital de Regional de García Rovira que deberá retirar el cable de red que se encuentra pasando por el módulo D ya que interfiere en los trabajos que se están ejecutando.

- Se está brindando capacitación continua al personal operativo que ejecuta labores de alto riesgo como el izaje y trabajo en caliente de la estructura metálica del modulo D.

- El porcentaje de ejecución programado en el mes de marzo es de 26.19 % esto equivale presupuestalmente a $16.943.794.030,68; en este informe el porcentaje ejecutado es de 36.62% que equivale a $23.689.653.544.59; por lo tanto, en relación a lo anterior el Consorcio de García Rovira se encuentra presentando 10.43% por encima de lo programado en este mes.

- El Consorcio de García Rovira se encuentra trabajando en el lote vecino del hospital en el corte, fabricación y pintura inicial de los elementos estructurales que se están elaborando para el modulo D.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante Legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

7631


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
2.01	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE SOBRANTES				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	11835.60
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Volumen	SUBTOTAL
MODULO A						
ZONA DE AMBULANCIAS						
ZAPATA EJE 3 - O	2.20	2.20	2.02		9.78	9.78
VIGA EJE 3 ENTRE N-O	3.45	0.80	1.90		5.24	5.24
MURO DE CONTENCION PERIMETRAL						
MURO PERIMETRAL ZARPA	3.45	8.75	1.50		45.28	45.28
MURO PERIMETRAL	4.90	9.00	5.90		130.10	130.10
					PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DEL SUELO 25%	2367.12
					ACUMULADO	11835.60
					ACTA MODIFICATORIA 4	12049.47
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	213.87
					COBRADAS PARCIAL No 1	1241.77
					COBRADAS PARCIAL No 2	3937.07
					COBRADAS PARCIAL No 3	2837.53
					COBRADAS PARCIAL No 4	12.22
					COBRADAS PARCIAL No 5	2845.35
					EJECUTADA MES DE ENERO	70.34
					EJECUTADA MES DE FEBRERO	619.15
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	272.17
OBSERVACIONES:						





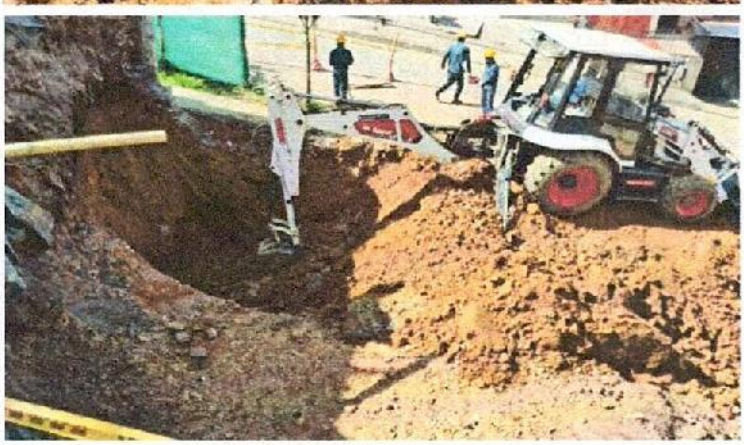

UBICACIÓN PLANO

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
3.01	BASE CONCRETO POBRE 5CM


					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	303.69
	Longitud (m)	Ancho (M)	Alto (m)	Area (m2)		SUBTOTAL
MODULO A						
EJE C ENTRE 1-2	2.51	0.40				1.00
EJE C ENTRE 2-3	4.27	0.40				1.71
EJE D ENTRE 1-2	2.64	0.40				1.06
EJE D ENTRE 2-3	4.39	0.40				1.76
EJE E ENTRE 1-2	2.51	0.40				1.00
EJE E ENTRE 2-3	4.26	0.40				1.70
EJE F ENTRE 1-2	2.51	0.40				1.00
EJE F ENTRE 2-3	4.26	0.40				1.70
EJE G ENTRE 1-2	2.51	0.40				1.00
EJE 1 ENTRE B-C	5.26	0.40				2.10
EJE 2 ENTRE B-C	5.51	0.40				2.20
EJE 1 ENTRE C-D	2.93	0.40				1.17
EJE 2 ENTRE C-D	3.10	0.40				1.24
EJE 1 ENTRE D-E	5.31	0.40				2.12
EJE 2 ENTRE D-E	5.69	0.40				2.28
EJE 1 ENTRE E-F	6.50	0.40				2.60
EJE 2 ENTRE E-F	6.75	0.40				2.70
EJE 1 ENTRE F-G	6.97	0.40				2.79
EJE 2 ENTRE F-G	7.22	0.40				2.89
EJE 1 ENTRE G-H	6.50	0.40				2.60

7633

	ACUMULADO	303.69
	ACTA MODIFICATORIA 3	359.92
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	56.23
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No 3	262.85
	COBRADAS PARCIAL No 4	4.20
	COBRADAS PARCIAL No 5	
	EJECUTADA MES DE ENERO	
	EJECUTADA MES DE FEBRERO	
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	36.64
OBSERVACIONES:		





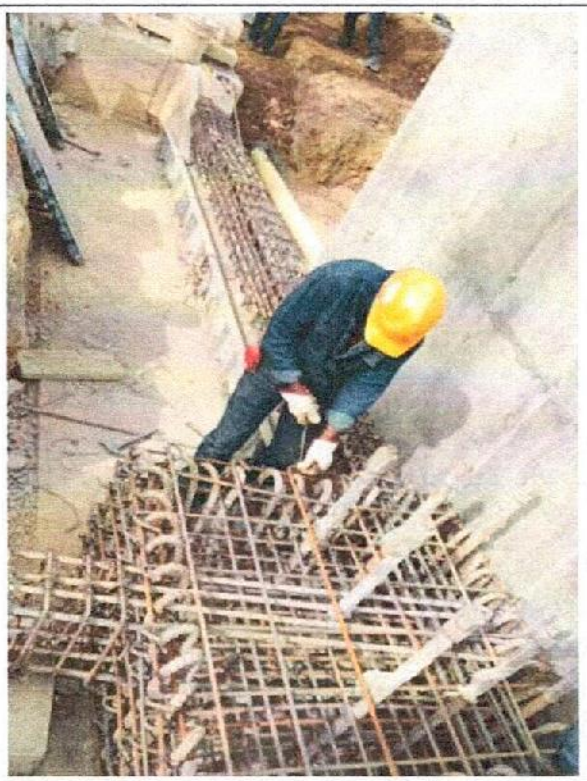

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7634

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	197563.31
		No Varilla	Largo (M)	Peso m/kg	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MUROS DE CONTENCION - MODULO A							
MURO DE CONTENCION H=5.90 MTS							
ZARPA	Longitud total muro	76.00					0.00
	Horizontal superior	6.00	4.45	2.25	507	1.00	5073.0
	Horizontal Inferior	6.00	4.45	2.25	507	1.00	5073.0
	Longitudinal superior	5.00	84.44	1.56	14	1.00	1844.3
	Longitudinal inferior	5.00	84.44	1.56	14	1.00	1844.3
						Factor traslapo	
	Traslapos varilla No 6 X ML	6.00	152.00	1.56	14.00	0.15	451.6
MURO	Vertical Exterior	5.00	6.45	1.56	304	1.00	3956.8
	Vertical Interior	6.00	5.95	3.975	507	1.00	13997.3
	Longitudinal Exterior	5.00	84.44	1.56	20	1.00	2634.7
	Longitudinal Interior	5.00	84.44	1.56	20	1.00	2634.7
Anclajes ciclopeo	Ganchos	4.00	1.40	0.996	760	1.00	1059.7
						Factor traslapo	
	Traslapos varilla No 6 X ML	5.00	152.00	1.56	28.00	0.15	516.5
ZONA DE AMBULANCIAS							
Muro de contencion eje 3							
	Longitud total muro	26.50					
	Horizontal exterior	6.00	26.50	2.25	38	1.00	2295.8
	Horizontal interior	6.00	26.50	2.25	38	1.00	2295.8
	Vertical exterior	5.00	6.35	3.975	265	1.00	6686.9
	Vertical Interior	5.00	6.35	3.975	177	1.00	4458.3
						Factor traslapo	
	Traslapos varilla No 6 X ML	6.00	53.00	2.25	38.33	0.15	731.4
Descuento por kg/m3							-819.41
Muro perimetral							0.00
ZARPA		9.00					0.00
	Horizontal superior	6.00	3.96	2.25	90	1.00	801.90
	Horizontal Inferior	6.00	3.96	2.25	38	1.00	320.76
	Longitudinal superior	6.00	9.00	2.25	14	1.00	283.50
	Longitudinal Inferior	6.00	9.00	2.25	14	1.00	283.50
						Factor traslapo	
	Traslapos varilla No 6 X ML	6.00	18.00	2.25	14.00	0.15	80.7
Anclajes ciclopeo	Ganchos	4.00	1.40	0.996	90	1.00	125.50
MURO		9.00					
	Horizontal Interior	6.00	5.85	2.25	80	1.00	789.75
	Horizontal exterior	6.00	5.75	1.56	35	1.00	313.95
	Longitudinal superior	6.00	9.90	2.25	22	1.00	445.50
	Longitudinal Inferior	6.00	9.90	2.25	22	1.00	445.50
						Factor traslapo	
	Traslapos varilla No 6 X ML	6.00	18.00	2.25	22.00	0.15	142.6
Descuento por kg/m3							-216.00
Zapata							
ZAPATA TIPO 1							
	Rx	5	2.55	1.56	30	9	1074.1
	Ry	5	2.55	1.56	30	9	1074.1
						ACUMULADO	197563.31
						ACTA MODIFICATORIA 4	199229.86
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1666.55
						COBRADAS PARCIAL No 1	32716.10
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	115909.56
						COBRADAS PARCIAL No 4	27229.05
						COBRADAS PARCIAL No 5	11154.52
						EJECUTADAS EN ENERO	3307.36
						EJECUTADA MES DE FEBRERO	7855.10
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	441.66
OBSERVACIONES:							



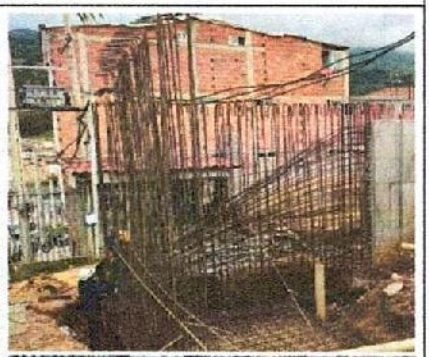





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


7635

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
3.07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO				UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	593.02
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
ZONA DE AMBULANCIAS						
MURO EJE 3 ENTRE N-O	0.40	5.78	4.00			9.25
MURO DE CONTENCION PERIMETRAL						
ZARPA MURO PERIMETRAL L=8.75ML	3.45	8.75	0.40			12.08
					ACUMULADO	593.02
					ACTA MODIFICATORIA 4	730.88
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	137.86
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	53.33
					COBRADAS PARCIAL No 3	295.48
					COBRADAS PARCIAL No 4	75.09
					COBRADAS PARCIAL No 5	46.32
					EJECUTADO ENERO	
					EJECUTADA MES DE FEBRERO	92.30
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	30.50
OBSERVACIONES:						

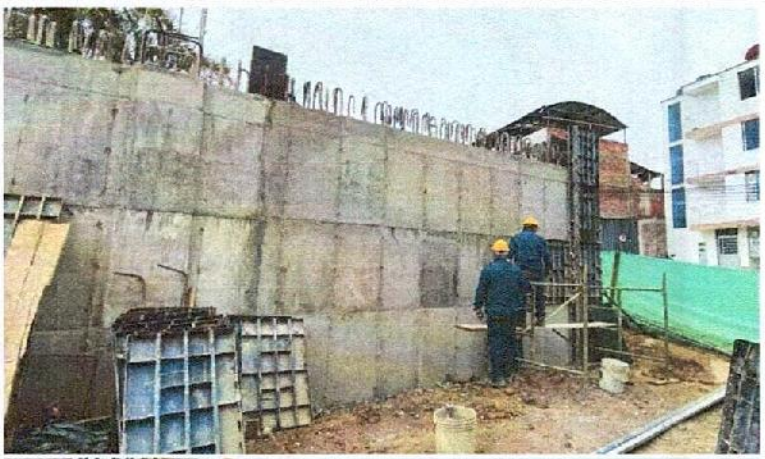

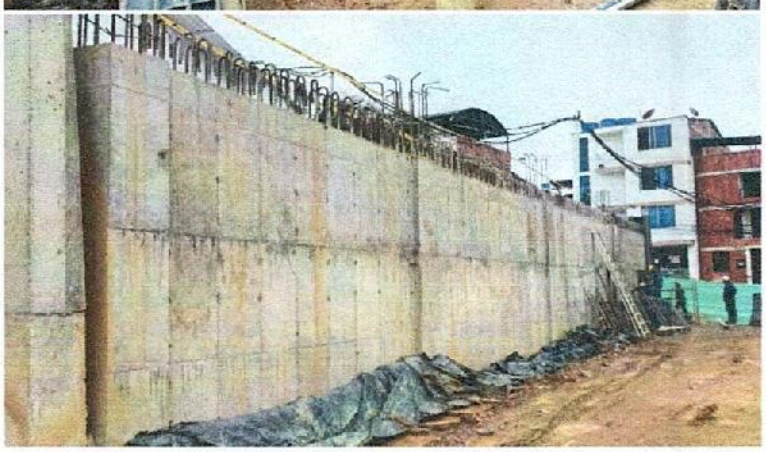



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7636

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
5.01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS
UNIDAD	M2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	352.32
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area	Cant	SUBTOTAL
CUARTO DE SUBESTACION ELECTRICA						
CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA CUARTO ELECTRICO				56.91	2.00	113.82
				59.35	2.00	118.70
CENTRAL DE RESIDUOS						
A 1 área rectangular				16.98	2.00	33.96
A2 área rectangular				42.92	2.00	85.84

ACUMULADO	352.32
ACTA MODIFICATORIA 3	3068.21
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2716.89
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	150.00
COBRADAS PARCIAL No 3	82.52
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	119.80

OBSERVACIONES:

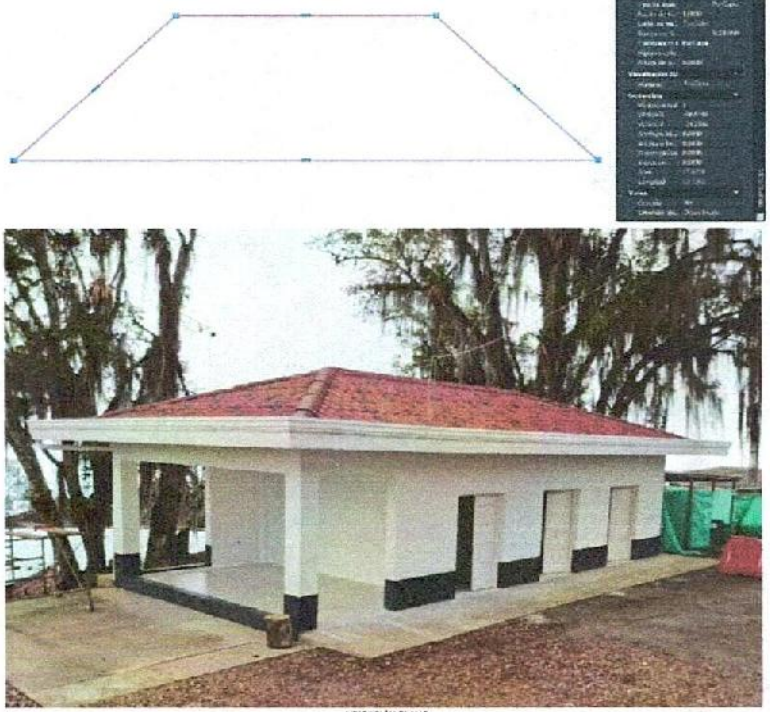

UBICACIÓN PLANO

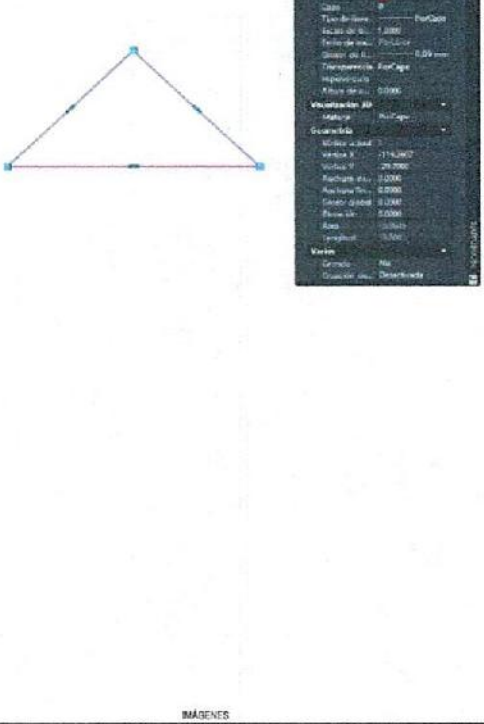

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


7637

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
13.04	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE RETIRO					UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	459.38
		Ancho	Largo (M)	Alto	Elementos	Caras	SUBTOTAL
HOSPITALIZACION							
VIGA PLACA			9.03				9.03
COLUMNAS			3.5		4		14.00
						ACUMULADO	459.38
						ACTA MODIFICATORIA 4	572.75
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	113.37
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	89.50
						COBRADAS PARCIAL No 4	126.90
						COBRADAS PARCIAL No 5	219.95
						CANTDADES PRESENTE ACTA	23.03
OBSERVACIONES							

HOSPITALIZACIÓN

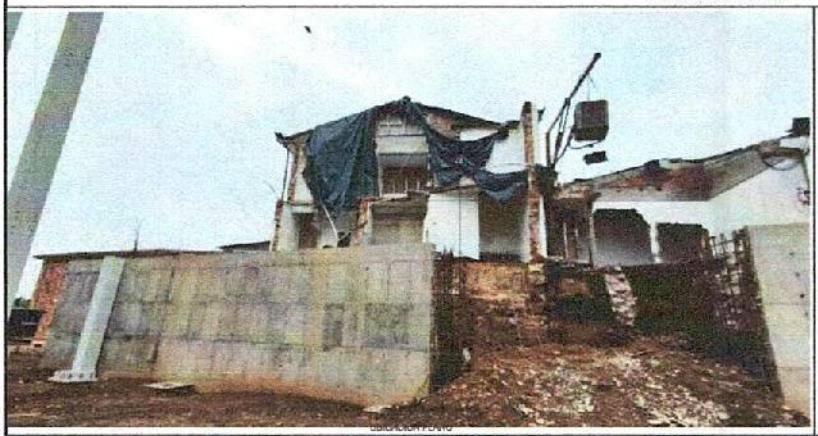

UBICACION PLANO

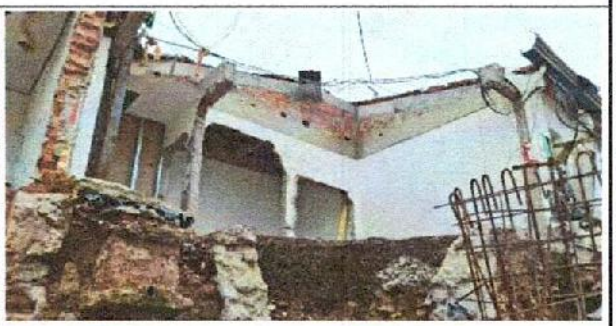

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	171.35
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad		Elementos	SUBTOTAL
ZAPATAS ZONA DE AMBULACION							
EJE O-3	2.20	2.20	0.60	1		1	2.90

ACUMULADO	171.35
ACTA MODIFICATORIA 3	212.97
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	41.62
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	65.54
COBRADAS PARCIAL No3	86.85
COBRADAS PARCIAL No 4	5.80
COBRADAS PARCIAL No 5	
EJECUTADO ENERO	10.25
CANTIDADES PRESENTE ACTA	2.91

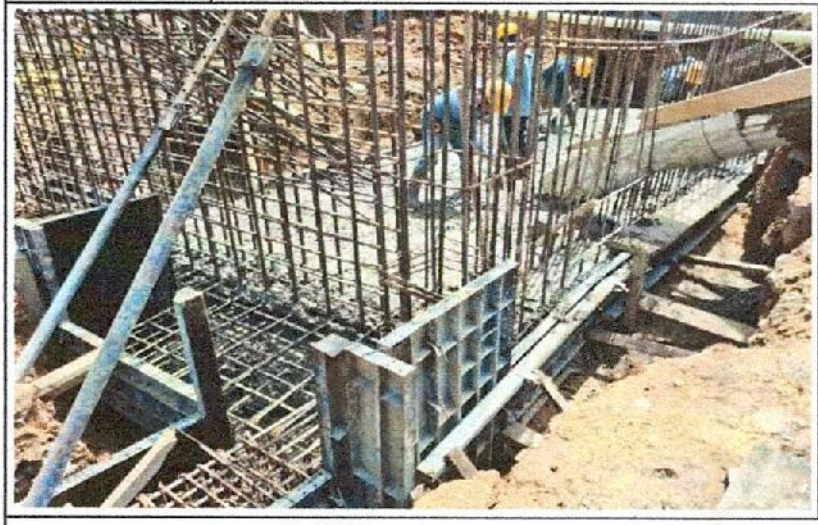



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION


UNIDAD	M3
TOTAL	154.48


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
EJE C ENTRE 1-2	2.52	0.40	0.50			0.60
EJE 1 ENTRE B-C	5.26	0.40	0.50			1.05
EJE 1 ENTRE C-D	2.68	0.40	0.50			0.54
EJE 1 ENTRE F-G	6.97	0.40	0.50			1.39
ZAPATAS ZONA DE AMBULACION						
VIGA EJE 3 ENTRE M-N	5.30	0.80	0.60			2.54
VIGA EJE 3 ENTRE N-O	3.45	0.80	0.60			1.66

ACUMULADO	154.48
ACTA MODIFICATORIA 4	212.97
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	58.49
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	20.09
COBRADAS PARCIAL No 3	52.38
COBRADAS PARCIAL No 4	9.86
COBRADAS PARCIAL No 5	4.53
EJECUTADOS ENERO	54.58
EJECUTADA MES DE FEBRERO	5.83
CANTDADES PRESENTE ACTA	7.21



UBICACIÓN PLANO

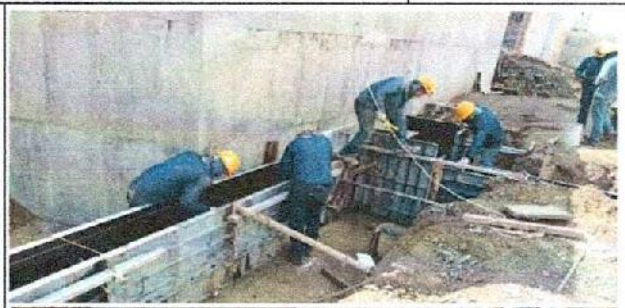

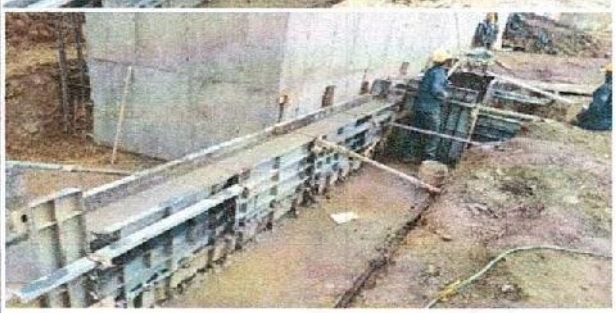

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7640

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP 75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	95.44
		Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
EJE C-1		1.50	1.50	0.70	1	1	1.58
						ACUMULADO	95.44
						ACTA MODIFICATORIA 3	111.63
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	16.19
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	82.79
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	1.73
						EJECUTADA ENERO	4.62
						EJECUTADA MES DE FEBRERO	4.72
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	1.58



UBICACIÓN PLANO

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1386890611	9484149855	E	2025/04/02	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$28,585,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (45 Afiliados)																								$91,976,976	$14,823,500			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976		$6,362,900			$0	$0		$28,548,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (45 Afiliados)																								$91,976,976	$14,823,500			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976		$6,362,900			$0	$0		$28,548,000
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (45 Afiliados)																								$91,976,976	$14,823,500			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976		$6,362,900			$0	$0		$28,548,000
1	CC	1095816853	ANAYA RODRIGUEZ ERVIN GIOVANNY																			23070 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	13979972	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO																			25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
4	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO																			25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
5	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1005479020	CACERES HERNANDEZ YEISON JAVIER																			23030 1	30	$2,207,520	$353,300	EPS005	30	$2,207,520	$88,400	CCF39	30	$2,207,520	$88,400	14-25	30	$2,207,520	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,800
7	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																			23020 1	30	$10,520,000	$1,788,400	EPS002	30	$10,520,000	$420,800	CCF39	30	$10,520,000	$420,800	14-25	30	$10,520,000	6.960%	$732,200	30	$0	$0	SI	$3,362,200
8	CC	5605940	CASTELLANOS BARRERA FILEMON		X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
9	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO		X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
10	CC	1098103480	CHAVARRIA CHAPARRO JOHNSON ALBERTO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY																			23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
12	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES		X																	23030 1	15	$919,800	$147,200	EPS037	15	$919,800	$36,800	CCF39	15	$919,800	$36,800	14-25	15	$919,800	6.960%	$64,100	15	$0	$0	SI	$284,900
13	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	13444433	DIAZ CASTELLANOS JOSE HERNAN		X																	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
15	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL		X																	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
16	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO																			25-14	18	$1,324,512	$212,000	EPS037	18	$1,324,512	$53,000	CCF39	18	$1,324,512	$53,000	14-25	18	$1,324,512	6.960%	$92,200	18	$0	$0	SI	$410,200
17	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO											X								25-14	12	$588,672	$94,200	EPS037	12	$588,672	$23,600	CCF39	12	$588,672	$23,600	14-25	12	$588,672	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$141,400
18	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER																			25-14	30	$2,945,600	$471,300	EPS037	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
19	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO																			25-14	30	$5,509,146	$881,900	EPS037	30	$5,509,146	$220,400	CCF39	30	$5,509,146	$220,400	14-25	30	$5,509,146	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
20	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
21	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																			25-14	30	$1,987,689	$318,100	EPS010	30	$1,987,689	$79,600	CCF39	30	$1,987,689	$79,600	14-25	30	$1,987,689	6.960%	$138,400	30	$0	$0	SI	$615,700
23	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																			23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
24	CC	5609131	JAIMES JAIMES EUBARDO		X																	23020 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500

2025/04/07 07:51 AM

25	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																		23100 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
26	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
27	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
28	CC	13929148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
29	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS																		23030 1	30	$2,891,184	$462,600	EPS037	30	$2,891,184	$115,700	CCF39	30	$2,891,184	$115,700	14-25	30	$2,891,184	6.960%	$201,300	30	$0	$0	SI	$895,300
30	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
31	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO		X																23030 1	15	$1,472,800	$235,700	EPS002	15	$1,472,800	$59,000	CCF39	15	$1,472,800	$59,000	14-25	15	$1,472,800	6.960%	$107,600	15	$0	$0	SI	$456,300
32	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
33	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
34	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
35	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY							X											23030 1	30	$3,324,479	$532,000	EPS002	30	$3,324,479	$133,000	CCF39	30	$3,324,479	$133,000	14-25	30	$3,324,479	6.960%	$231,400	30	$0	$0	SI	$1,029,400
36	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID		X																23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
37	CC	13927795	RODRIGUEZ JAIMES PEDRO VICENTE		X																23100 1	15	$919,800	$147,200	EPS002	15	$919,800	$36,800	CCF39	15	$919,800	$36,800	14-25	15	$919,800	6.960%	$64,100	15	$0	$0	SI	$284,900
38	CC	1098780824	ROJAS ORTIZ HENRY ALBERTO																		23030 1	30	$5,509,137	$881,500	EPS002	30	$5,509,137	$220,400	CCF39	30	$5,509,137	$220,400	14-25	30	$5,509,137	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
39	CC	1096950990	ROJAS SANGUINO LEONARDO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
40	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
41	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
42	CC	1096951842	SEPULVEDA CASTELLANOS WILMER LEONARDO		X																23030 1	15	$919,800	$147,200	EPS005	15	$919,800	$36,800	CCF39	15	$919,800	$36,800	14-25	15	$919,800	6.960%	$64,100	15	$0	$0	SI	$284,900
43	CC	1095925867	SERRANO CACERES JULIAN MATEO																		23030 1	30	$5,509,137	$881,500	EPS041	30	$5,509,137	$220,400	CCF39	30	$5,509,137	$220,400	14-25	30	$5,509,137	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
44	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
45	CC	13927207	TUTIRA DIAZ LIBARDO																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$178,100	30	$0	$0	SI	$569,700
46	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		Afiliados(45)																					$91,976,976	$14,823,500			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976	$3,680,800			$91,976,976		$6,362,900		$0	$0		$28,548,000

7642

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1386890611	9484149855	E	2025/04/02	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$28,585,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$14,823,500	$19,400	$0	$14,842,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$441,600	$600	$0	$442,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,519,100	$5,900	$0	$4,525,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$7,504,900	$9,700	$0	$7,514,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,357,900	$3,200	$0	$2,361,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$6,362,900	$8,300	$0	$6,371,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	45	$6,362,900	$8,300	$0	$6,371,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$3,680,800	$4,800	$0	$3,685,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	45	$3,680,800	$4,800	$0	$3,685,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				45	$3,680,800	$5,000	$0	$3,685,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,600	$300	$0	$159,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,032,800	$1,400	$0	$1,034,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$424,600	$600	$0	$425,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,302,200	$1,700	$0	$1,303,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$761,600	$1,000	$0	$762,600
TOTAL				45	$28,548,000	$37,500	$0	$28,585,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1386876634	9484029745	Y	2025/04/02	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$612,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TGA RIESGO V (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$142,350		$10,000		$0	$0		$10,000
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$142,350		$10,000		$0	$0		$10,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$142,350		$10,000		$0	$0		$10,000
1	CC	1095946093	FAJARDO UNIVIO JHULY DAYANNA X	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	3	$142,350	6.960%	$10,000	0	$0	$0	No	$10,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,847,000		$407,000		$0	$0		$407,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,847,000		$407,000		$0	$0		$407,000
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,847,000		$407,000		$0	$0		$407,000
2	CC	91275443	GONZALEZ GRANADOS CHRISTIAN EDUARDO	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
3	CC	91018696	RIVERA ARIZA JOHN JAIRO	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	13511301	RONDON MUÑOZ ALEXIS	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO SAN MARTIN (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,799,550		$195,000		$0	$0		$195,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO SAN MARTIN (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,799,550		$195,000		$0	$0		$195,000
Ciudad: SAN MARTIN Depto: CESAR (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,799,550		$195,000		$0	$0		$195,000
5	CC	1098793889	ARIAS QUINTERO JORDAN ESTIVEN X	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	8	$379,600	6.960%	$26,500	0	$0	$0	No	$26,500
6	CC	1098817714	PARDO GIL NELSON DAVID X	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	21	$996,450	6.960%	$69,400	0	$0	$0	No	$69,400
7	CC	91232527	RAMIREZ RIVERO SERGIO	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total Afiliados(7)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,788,900		$612,000		$0	$0		$612,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1388876634	948402945	Y	2025/04/02	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$612,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$612,000	$800	$0	$612,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$612,000	$800	$0	$612,800
TOTAL				7	$612,000	$800	$0	$612,800

2025/04/07 07:50 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-22, 12:01:30 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072083840

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 22/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOB INGENIERIA SAS		
Documento	NI901478369	**Dirección**	TV 112 #20 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3232196491
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	**Identificación**	CC 1098728354
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IBC	RET	INGR P	RDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065337262	JENIFER PAOLA GOMAJOA CABALLERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 100.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 100.000	0,960	$ 2.600.000	$ 174.000	(CCF39) CAJASAN	$ 2.600.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1065444913	ANDRES FELIPE CORDERO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.600.000	$ 390.000	(EPS091) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	0,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.600.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689.200
CC 1067332634	CRISTIAN DUVAN GUARIN ARENALES	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 189.800	$ 30.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 189.800	$ 0	0,000	$ 189.800	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 1067337634	CRISTIAN DUVAN GUARIN ARENALES	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PROTECCION	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.233.700	$ 49.400	0,960	$ 1.233.700	$ 85.000	(CCF39) CAJASAN	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 1090434281	BREINER STIWAR ARDILA RICO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 142.350	$ 0	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1090434281	BREINER STIWAR ARDILA RICO	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.281.150	$ 51.300	0,960	$ 1.281.150	$ 88.500	(CCF39) CAJASAN	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.500
CC 1095894116	JOHN ALEXANDER TOLOZA DELGADO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 63.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 427.050	$ 17.100	0,960	$ 427.050	$ 29.600	(CCF39) CAJASAN	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1098618868	JONATHAN BECERRA FLOREZ	01	00		X															0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 840.000	$ 134.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 840.000	$ 33.600	0,960	$ 840.000	$ 58.500	(CCF39) CAJASAN	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.100
CC 1098725902	GEHINNER ALIRIO CHIQUILLO DIAZ	01	00											X						0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 284.700	$ 45.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 1098725902	GEHINNER ALIRIO CHIQUILLO DIAZ	01	00																	0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	0,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1098728354	JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	0,960	$ 2.150.000	$ 149.760	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.760
CC 1100560462	ELIANA ALEXANDRA SUAREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1110774590	JAVIER ANTONIO PARALES CHAPARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1117578369	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ MUÑOZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 332.150	$ 13.300	0,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 12161151	GENTIL ANIBAL CAMPOS BOTELO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 332.150	$ 13.300	0,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 77156325	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00											X						0	6	6	6	6	(230301) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 77156325	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PROTECCION	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	0,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94.900	$ 0	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.328.600	$ 53.200	0,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF39) CAJASAN	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

2496

Pagado: 22/04/2025 | Empresa NI901478369 JOB INGENIERIA SAS | Planilla Nro: 1072083840 | Periodo Cotización: marzo de 2025 | Periodo Servicio: abril de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91499154	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00										X							0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS009) EPS SANITAS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 91499154	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS009) EPS SANITAS	$ 1.138.800	$ 45.600	0,960	$ 1.138.800	$ 76.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.600
CC 91536639	BRENER MEJIA PORTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0,960	$ 1.423.500	$ 96.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 8159919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
PT 8159919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	0,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF39) CAJASAN	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 3.695.700	$ 873.000	$ 1.502.300	$ 863.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.934.500	$ 32.000	$ 6.966.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-14, 10:21:08 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77193884

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento							Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	CC 1096946096		Residente		Exonerado	S	PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER
	01	00								

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
P/D	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

2648

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-14, 10:19:11 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77193884

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	CC 1096947063					S	ANTOLINEZ JAIMES EDWAR ALEXIS	68432000 - 68		SANTANDER
	01	00								

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud							Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1,423,500	230201		16 %	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	14-7	5	9.960 %	$ 1,423,500	$ 99,100	CCF40	4 %	$ 1,423,500	$ 57,000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 99,100	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-14, 10:20:34 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77193884

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				S	PEÑA CARVAJAL EDINSON MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91232527		RAMIREZ RIVERO SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 27 105 250	FLORIDABLANCA-SANTANDER	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1396412943	9483687498	I	2025/04/07	2025/04/08	BANCOLOMBIA	1	$505,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ilt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91232527	RAMIREZ RIVERO SERGIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91232527		RAMIREZ RIVERO SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 27 105 250	FLORIDABLANCA-SANTANDER	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1396412943	94836874 98	1	2025/04/07	2025/04/08	BANCOLOMBIA	1	$505,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$100	$0	$99,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$100	$0	$99,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$504,900	$500	$0	$505,400


2025/04/08 09:58 AM

767

ABRIL

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"

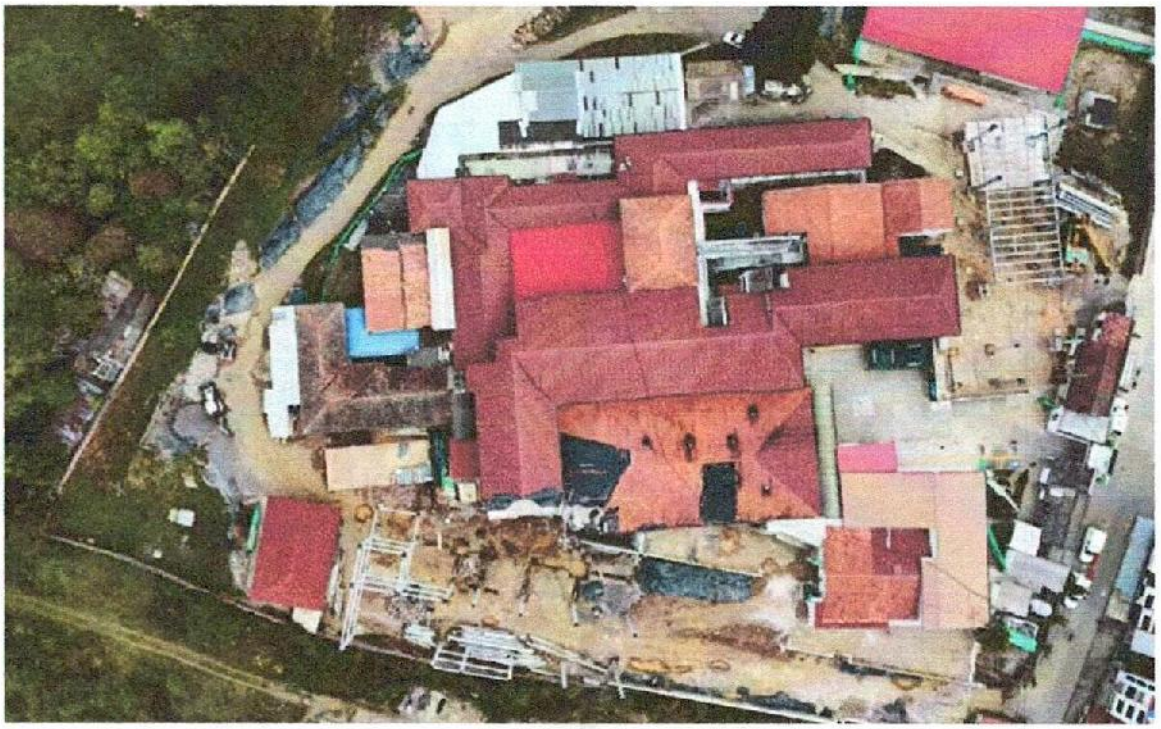

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 de abril de 2025 – 30 de abril de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

TIPO DE CONTRATO: 3

INTRODUCCION 4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 4

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 4

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5

Construcción módulo A: 5
Construcción módulo B: 6
Construcción módulo C: 6
Construcción módulo E: 6
Construcción módulo F 6
Adecuación área de UCI 7

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 8

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 8

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS 12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 12

PRESUPUESTO DE OBRA 14

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE ABRIL DE 2025 14

Programación de obra 16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 5
Ilustración 2 Puertas (descanso de personal, medicamentos, equipos, trabajo sucio) 8
Ilustración 3 Puerta trabajo limpio y ropa limpia 9
Ilustración 4 Relleno costado posterior muro de contención perimetral 9
Ilustración 5 Relleno muro contención perimetral 10
Ilustración 6 Instalación de metaldeck sobre el segundo nivel módulo D 10
Ilustración 7 Instalación de metaldeck entre los ejes O1 - P1 del modulo D 11
Ilustración 8 Instalación de elementos estructurales en el nivel 8.60 11
Ilustración 9 Día lluvioso 12
Ilustración 10 Dia lluvioso en el mes de abril 13
Ilustración 11 Dia lluvioso - módulo D 13

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido de 01 de abril de 2025 hasta la elaboración de este informe 30 de abril de 2025.

Este proyecto representa un hilo significativo en el campo de la construcción civil, no solo por s magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuevo equipo de trabajo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento con los servicios de comedor, cocina, lavandería, mantenimiento, oficinas administrativas y hospitalización. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente se encuentra facturación, pediatría, consultorios, cuarto técnico (RACK). Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra ingresando por la plazoleta principal y cuenta con el servicio de urgencias, además colinda con el tomógrafo del hospital existente. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parto, recuperación de pacientes y parte de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización

- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo comprendido por este informe se avanzaron actividades en los siguientes módulos.

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Durante el mes abril se realizaron actividades de fabricación e instalación de puertas para todas las áreas teniendo en cuenta la normativa vigente sobre esta área. Se instalaron 23 puertas de 1.0 mt X 2.17 mt, 4 puertas con mirilla en el acceso de uci y pacientes aislados en las áreas estipulados en los diseños arquitectónicos.

Adicional, se instaló una puerta como un segundo filtro para el acceso principal.

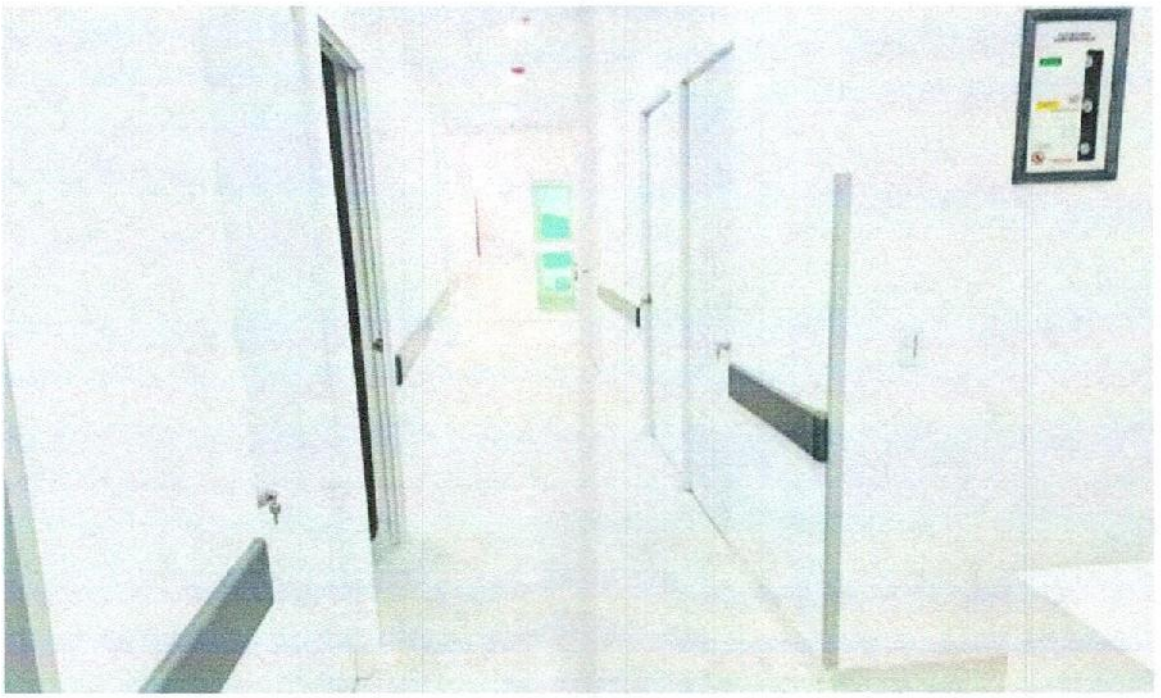


Ilustración 2 Puertas (descanso de personal, medicamentos, equipos, trabajo sucio)



Ilustración 3 Puerta trabajo limpio y ropa limpia

MODULO A

Durante este periodo se inicio con el relleno en material seleccionado tipo recebo sobre el costado posterior del muro de contención perimetral.

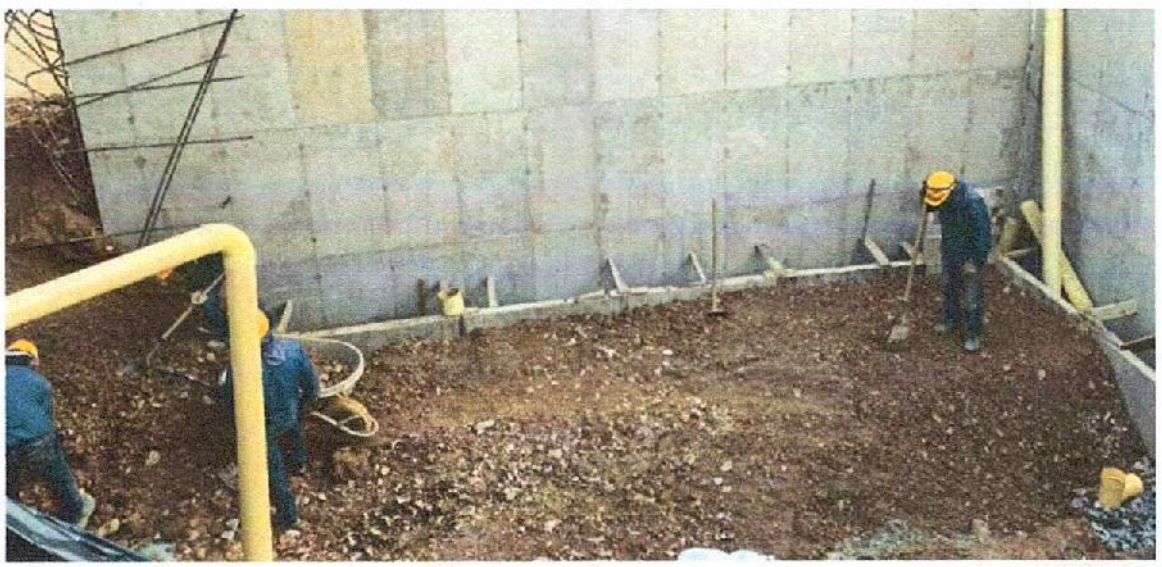


Ilustración 4 Relleno costado posterior muro de contención perimetral



Ilustración 5 Relleno muro contención perimetral

MODULO D

En el módulo D se continua con la fabricación de los elementos estructurales (vigas y conexiones) del nivel 8.60 y con la fabricación de la estructura de la cubierta del módulo. Se continuo con la instalación de elementos estructurales del nivel 4.30 y se dejó terminado toda la vigueteria para proceder con la instalación de 156 m2 de metaldeck en la placa del segundo piso de edificio con sus debidos refuerzos a cortante.



Ilustración 6 Instalación de metaldeck sobre el segundo nivel módulo D

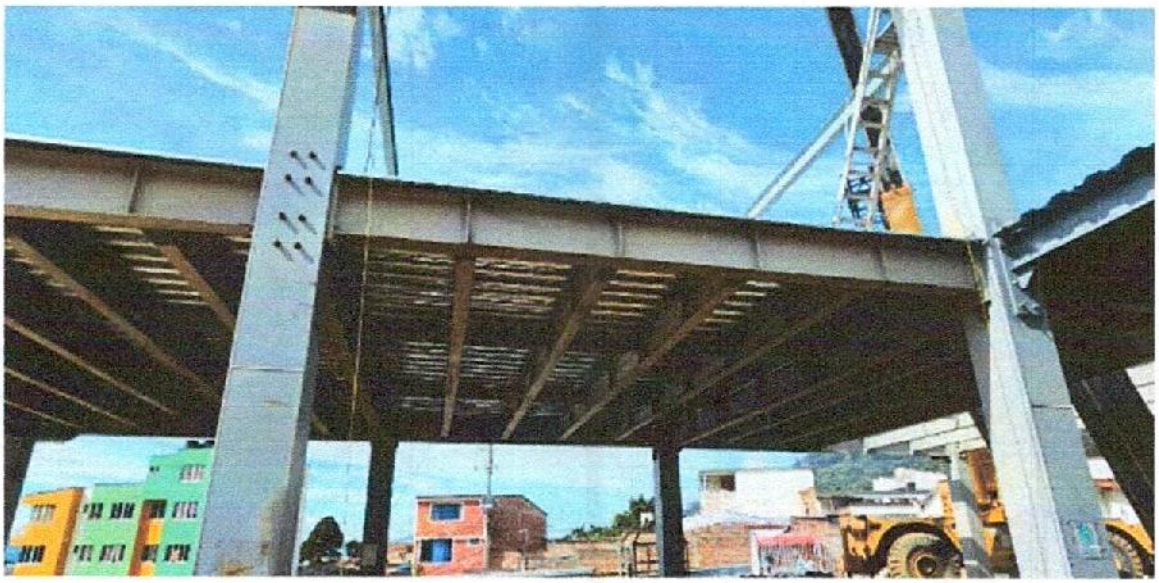


Ilustración 7 Instalación de metaldeck entre los ejes O1 - P1 del modulo D



Ilustración 8 Instalación de elementos estructurales en el nivel 8.60

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales. A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de abril.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																														
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Seco	24	24	20	20	24	24	19	20	19	21	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	18	19	20	20	18	19	21	24	24
Lluvia moderada			4	4			5		7		5											6	5	4		6	5	3		
Lluvia intensa								4		3											5				4					
Total, de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

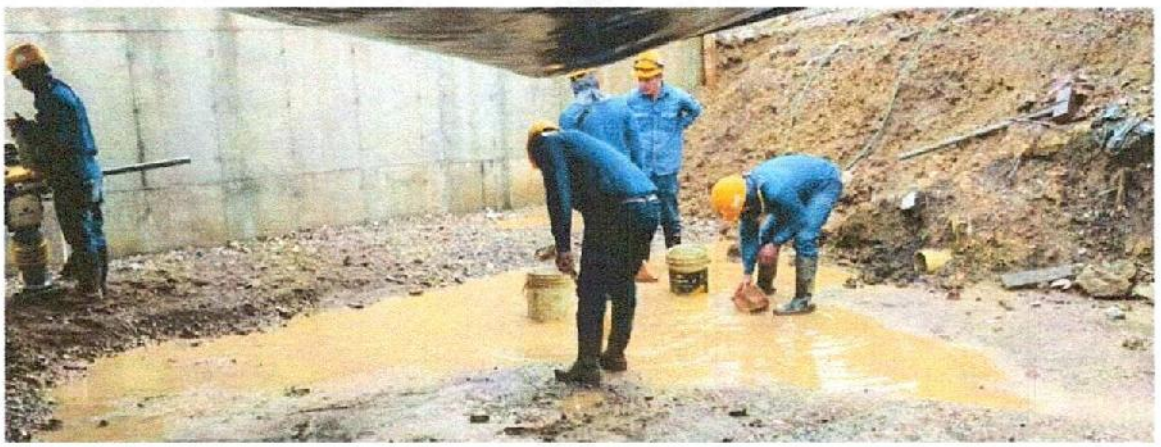


Ilustración 9 Día lluvioso



Ilustración 10 Dia lluvioso en el mes de abril



Ilustración 11 Dia lluvioso - módulo D

PRESUPUESTO DE OBRA

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE ABRIL DE 2025


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
PRESUPUESTO DE OBRA				ABRIL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR TOTAL	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			$	**106,771,111.64**
NP10	MONTAJE DE PUERTAS	UND	1.00	$	440,000.00
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	156.17	$	36,938,310.97
NP80	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE HASTA EL 95%	M3	40.50	$	5,741,999.69
NP147	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH), TERMINADA EN SU BORDE CON CANTO RIGIDO EN PVC. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE POMA Y BISAGRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	49.91	$	55,067,342.54
NP149	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH) TIPO VAIVEN, INCLUYE (MIRILLA SI SE REQUIERE, MARCO, Y BISAGRAS PLATEADA PUERTA VAIVEN)	M2	8.68	$	8,583,458.44
	VALOR COSTOS DIRECTOS			$	**106,771,111.64**
	ADMINISTRACIÓN			$	30,963,622.38
	IMPREVISTOS			$	1,067,711.12
	UTILIDAD			$	5,338,555.58
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			$	37,369,889.08
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN			$	**144,141,000.72**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS			$	-
	ADMINISTRACIÓN			$	-
	VALOR TOTAL EQUIPOS			$	-
	DIFERENCIA POR AJUSTE				
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS			$	**144,141,000.72**

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER				
PRESUPUESTO DE OBRA				ABRIL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR TOTAL
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023			
	VALOR TOTAL CONTRATO 087			$ 144,141,080.72
	% EJECUTADO MENSUAL			0.22%
	% EJECUTADO ACUMULADO			36.84%
	% PROGRAMADO ACUMULADO			26.97%

Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 30 abril de 2025.

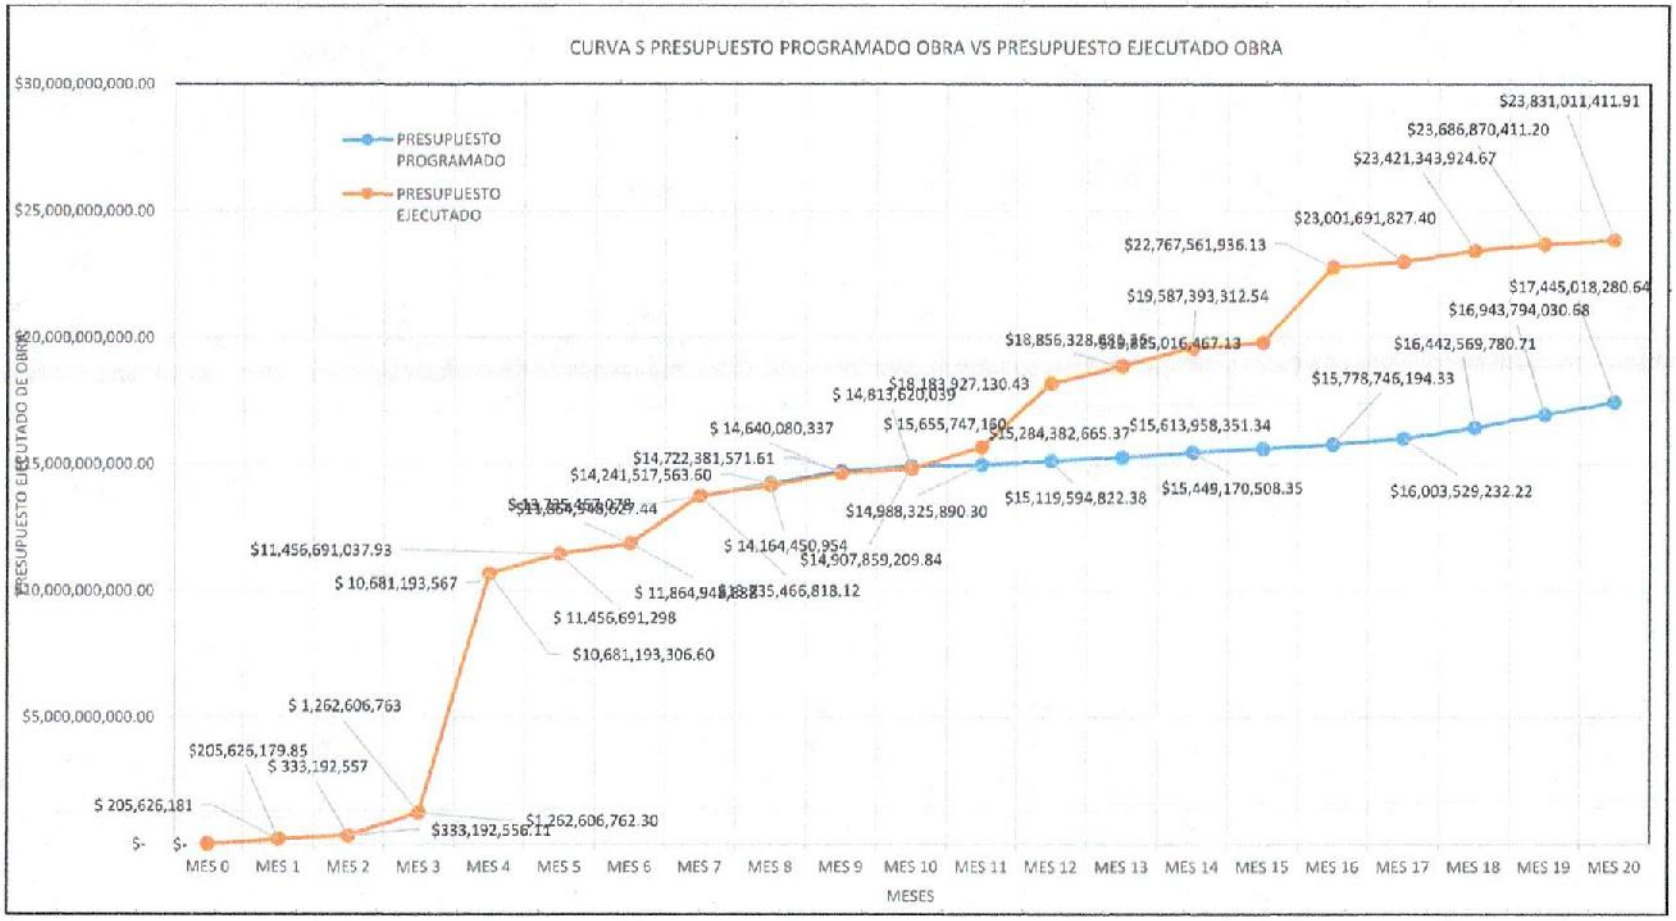

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 30 de abril de 2025.

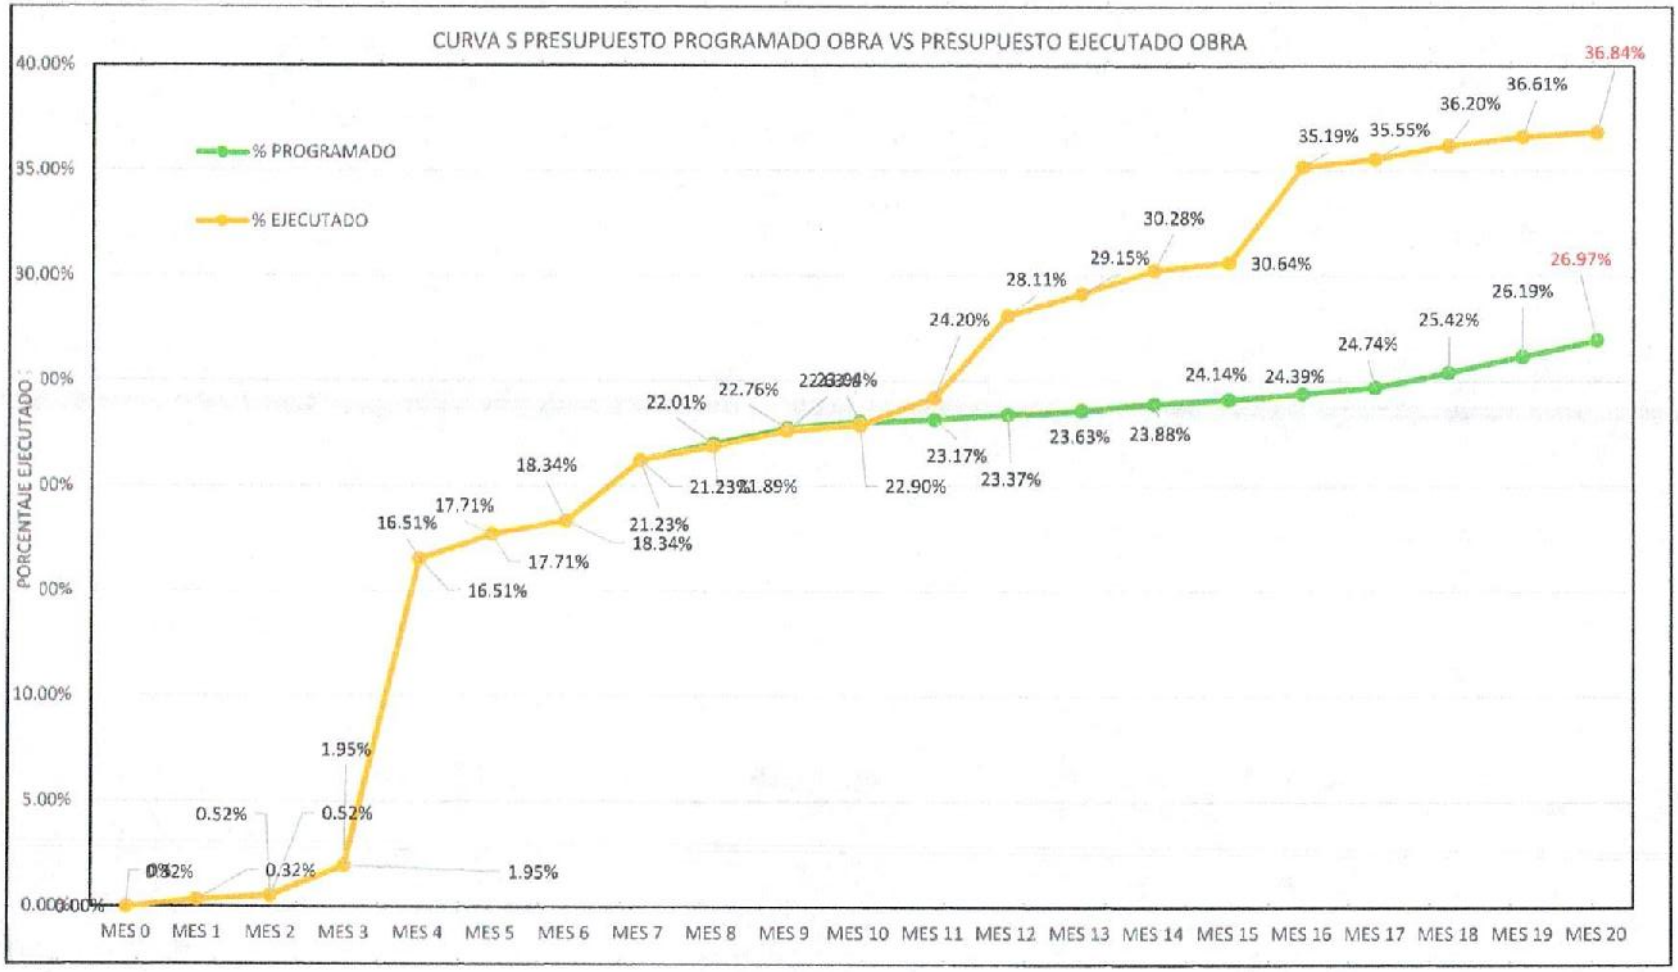

En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 26.97% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 36.84% acumulado, presentando 9.87% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está brindando capacitación continua al personal operativo que ejecuta labores de alto riesgo como el izaje y trabajo en caliente de la estructura metálica del módulo D.

- Las constantes lluvias durante este mes han afectado el izaje de elementos estructurales en el módulo D y colocación de metaldeck en el nivel 4.30 teniendo que suspender actividades durante la jornada laboral mientras se encuentra lloviendo.

- El porcentaje de ejecución programado en el mes de abril es de 26.97 % esto equivale presupuestalmente a $17,445,018,280.64; en este informe el porcentaje ejecutado es de 36.84% que equivale a $23,831,011,411.91; por lo tanto, en relación a lo anterior el Consorcio de García Rovira se encuentra presentando 9.87% por encima de lo programado acumulado.

- El Consorcio de García Rovira durante el comité técnico realizado el día 16 de abril de 2025 se comprometió terminar de realizar el balance general de obra y enviarlo a la interventoría para su revisión, este fue entregado durante los plazos acordados y se envió por medio de correo eléctrico para su verificación.

- Se realizaron las proyecciones de planeación de obra para poder alcanzar la ejecución del 70% en el mes de diciembre del año 2025, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el ministerio y la reprogramación de actividades de los modulo A y D para agilizar los procesos constructivos de cada módulo.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
R/L Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
NP10	MONTAJE DE PUERTAS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	UND
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	TOTAL Cantidad	15.00
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PUERTA FILTRO ENTRADA PRINCIPA.					1.00	1.00

ACUMULADO	15.00
ACTA MODIFICATORIA 4	36.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	21.00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	14.00
CANTIDADES PRESENTE ACTA	1.00

OBSERVACIONES:

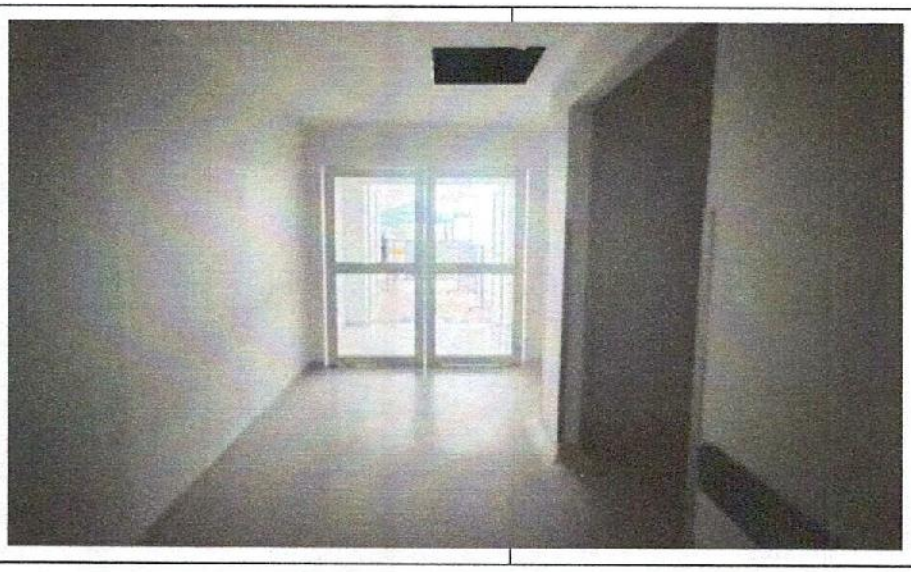

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	277.75
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D							
SEGUNDA PLANTA					105		156.17
						ACUMULADO	277.75
						ACTA MODIFICATORIA 4	3169.96
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2892.21
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No 3	
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	121.58
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	156.17



UBICACIÓN PLANO

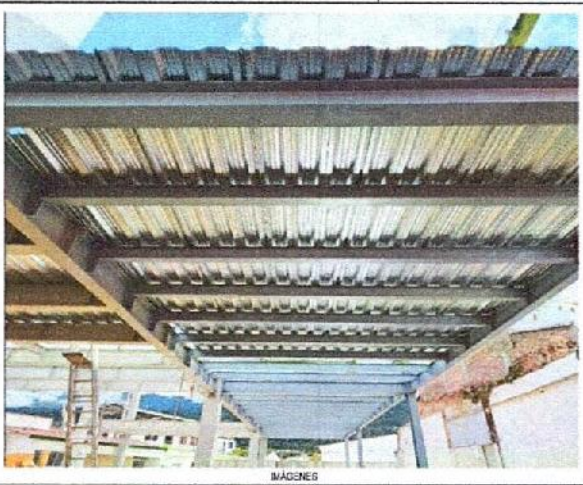

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP 80	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE HASTA EL 95%

UNIDAD	M3
TOTAL	1347.72

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Area (m2)	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
RELLENO MURO DE CONTENCION PERIMETRAL						
MODULO A - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5.00	9.00	0.900			40.50

ACUMULADO	1347.72
ACTA MODIFICATORIA 3	1349.29
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.57
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	1307.22
CANTIDADES PRESENTE ACTA	40.50



UBICACIÓN PLANO

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP147	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH), TERMINADA EN SU BORDE CON CANTO RIGIDO EN PVC. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE POMA Y BISAGRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION
UNIDAD	M2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	131.47
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS						
FILTRO INGRESO DE VISITAS	1.00		2.17		1.00	2.17
U.S MASCULINO	1.00		2.17		1.00	2.17
U.S FEMENINO	1.00		2.17		1.00	2.17
DESCANSO DE PERSONAL	1.00		2.17		1.00	2.17
DEPOSITO DE EQUIPOS	1.00		2.17		1.00	2.17
TRABAJO SUCIO	1.00		2.17		1.00	2.17
MEDICAMENTOS	1.00		2.17		1.00	2.17
TRABAJO LIMPIO	1.00		2.17		1.00	2.17
ROPA LIMPIA	1.00		2.17		1.00	2.17
BAÑO DE PACIENTE DISCAPACITADOS 1 Y 2	1.00		2.17		2.00	4.34
FILTRO SALIDA DE VISITAS	1.00		2.17		2.00	4.34
CUARTO DE ASEO	1.00		2.17		1.00	2.17
D. RESIDUOS	1.00		2.17		1.00	2.17
PUERTA SALIDA EXTERIOR AREA DE ASEO	1.00		2.17		1.00	2.17
INGRESO INTERIOR AREA DE ASEO	1.00		2.17		1.00	2.17
BAÑO PACIENTE AISLADO 1	1.00		2.17		1.00	2.17
BAÑO PACIENTE AISLADO 2	1.00		2.17		1.00	2.17
BAÑO PERSONAL	1.00		2.17		1.00	2.17
INGRESO AREA ADMINISTRATIVA	1.00		2.17		1.00	2.17
BAÑO PTO DE CONTROL	1.00		2.17		1.00	2.17
ADMINISIONES Y FACTURACION	1.00		2.17		1.00	2.17

ACUMULADO	131.47
ACTA MODIFICATORIA 4	153.68
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	72.12
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	81.56
CANTIDADES PRESENTE ACTA	49.91

OBSERVACIONES:

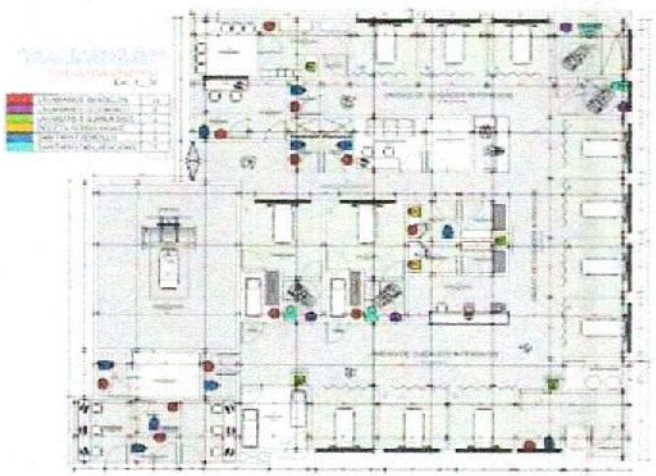

UBICACIÓN PLANO

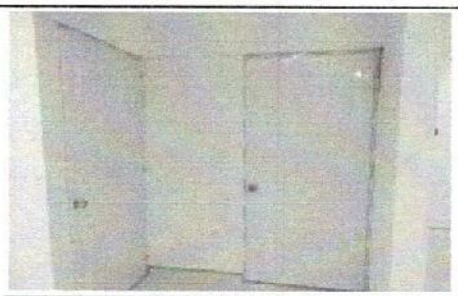



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP149	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH) TIPO VAIVEN, INCLUYE (MIRILLA SI SE REQUIERE, MARCO, Y BISAGRAS PLATEADA PUERTA VAIVEN)
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	8.68
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS						
PACIENTE AISLADO 1	1.00		2.17		1.00	2.17
PACIENTE AISLADO 2	1.00		2.17		1.00	2.17
ACCESO A UCI	1.00		2.17		2.00	4.34

ACUMULADO	8.68
ACTA MODIFICATORIA 4	40.25
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	40.25
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	8.68

OBSERVACIONES:

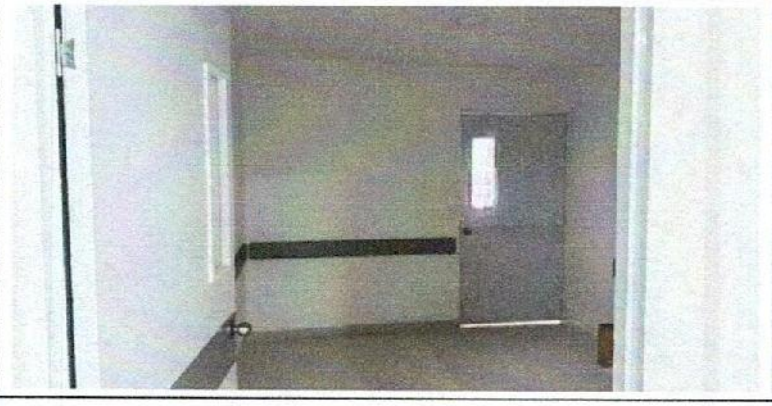

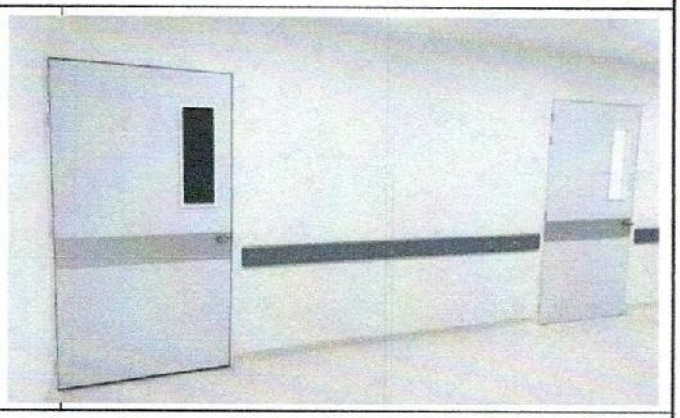

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451135787	9485512424	E	2025/05/05	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,012,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (34 Afiliados)																							$75,507,804	$12,188,200			$75,507,804	$3,443,800			$74,416,454	$2,978,100			$75,507,804		$5,153,500		$4,965,132	$248,400		$24,012,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (34 Afiliados)																							$75,507,804	$12,188,200			$75,507,804	$3,443,800			$74,416,454	$2,978,100			$75,507,804		$5,153,500		$4,965,132	$248,400		$24,012,000
Ciudad: MALAGA Deptm: SANTANDER (34 Afiliados)																							$75,507,804	$12,188,200			$75,507,804	$3,443,800			$74,416,454	$2,978,100			$75,507,804		$5,153,500		$4,965,132	$248,400		$24,012,000
1	CC	1095816853	ANAYA RODRIGUEZ ERVIN GIOVANNY																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	13929922	BARABAS ANAYA MARCO ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
4	CC	5613984	BASTO MURILLO BADY ROBERTO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
5	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1005479020	CACERES HERNANDEZ YEISON JAVIER		X																23030 1	7	$515,088	$82,500	EPS005	7	$515,088	$20,700	CCF39	7	$515,088	$20,700	14-25	7	$515,088	6.960%	$35,900	7	$0	$0	SI	$159,800
7	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																		23020 1	30	$10,520,000	$1,788,400	EPS002	30	$10,520,000	$420,800	CCF39	30	$10,520,000	$420,800	14-25	30	$10,520,000	6.960%	$732,200	30	$0	$0	SI	$3,362,200
8	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
10	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO												X						25-14	8	$392,448	$62,800	EPS037	8	$392,448	$15,700	CCF39	8	$392,448	$15,700	14-25	8	$392,448	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$94,700
12	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO																		25-14	22	$1,618,848	$259,100	EPS037	22	$1,618,848	$64,800	CCF39	22	$1,618,848	$64,800	14-25	22	$1,618,848	6.960%	$112,700	22	$0	$0	SI	$501,400
13	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER																		25-14	30	$2,945,600	$471,300	EPS037	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
14	CC	91275443	GONZALEZ GRANADOS CHRISTIAN EDUARDO		X																23030 1	23	$4,965,132	$794,500	EPS017	23	$4,965,132	$620,700	CCF39	23	$4,965,132	$198,700	14-25	23	$4,965,132	6.960%	$345,600	23	$4,965,132	$248,400	No	$2,207,900
15	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO																		25-14	30	$5,509,146	$881,500	EPS037	30	$5,509,146	$220,400	CCF39	30	$5,509,146	$220,400	14-25	30	$5,509,146	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
16	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
17	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																		25-14	30	$1,987,689	$318,100	EPS010	30	$1,987,689	$79,600	CCF39	30	$1,987,689	$79,600	14-25	30	$1,987,689	6.960%	$138,400	30	$0	$0	SI	$615,700
19	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
20	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																		23100 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
21	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
22	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
23	CC	13929148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
24	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS																		23030 1	30	$2,891,184	$462,600	EPS037	30	$2,891,184	$115,700	CCF39	30	$2,891,184	$115,700	14-25	30	$2,891,184	6.960%	$201,300	30	$0	$0	SI	$895,300

2025/05/02 03:51 PM

25	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER																		25-14	7	[illegible]29,240	$68,700	EPS002	7	$429,240	$17,200	CCF39	7	$429,240	$17,200	[illegible]-25	7	$429,240	6.960%	$29,900	7	$0	$0	SI	$133,000
26	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER												X						25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF39	0	$0	$0	14-25	23	$1,091,350	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$218,400
27	CC	1099662572	PINZON NOVA CRISTIAN YESID																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
28	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
29	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
30	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY																		230301	30	$3,324,479	$532,000	EPS002	30	$3,324,479	$133,000	CCF39	30	$3,324,479	$133,000	14-25	30	$3,324,479	6.960%	$231,400	30	$0	$0	SI	$1,029,400
31	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
32	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
33	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
34	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
35	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
36	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		Afiliados(34)																					$75,507,804	$12,188,200			$75,507,804	$3,443,800			$74,416,454	$2,978,100			$75,507,804		$5,153,500		$4,965,132	$748,400		$74,012,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451135787	9485512424	E	2025/05/05	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,012,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$12,188,200	$0	$0	$12,188,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,256,000	$0	$0	$4,256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,393,800	$0	$0	$5,393,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,244,000	$0	$0	$2,244,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$5,153,500	$0	$0	$5,153,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	$5,153,500	$0	$0	$5,153,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$2,978,100	$0	$0	$2,978,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	34	$2,978,100	$0	$0	$2,978,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	$3,443,800	$0	$0	$3,443,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,600	$0	$0	$159,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$620,700	$0	$0	$620,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$999,900	$0	$0	$999,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$204,200	$0	$0	$204,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$916,300	$0	$0	$916,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$543,100	$0	$0	$543,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$149,000	$0	$0	$149,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$149,000	$0	$0	$149,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,400	$0	$0	$99,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$99,400	$0	$0	$99,400
TOTAL				34	$24,012,000	$0	$0	$24,012,000

2025/05/02 03:51 PM

2676

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-22, 12:01:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072083840

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 22/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOB INGENIERIA SAS		
Documento	NI901478369	**Dirección**	TV 112 #20 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3232196491
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	**Identificación**	CC 1098728354
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006837262	JENIFER PAOLA GOMAJOA CABALLERO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF59) CAJASAN	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1005444013	ANDRES FELIPE CORDERO GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	0,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1007337634	CRISTIAN DUVAN GUARIN ARENALES	01	00											X							0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 189.800	$ 30.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 189.800	$ 0	0,000	$ 189.800	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 1007337634	CRISTIAN DUVAN GUARIN ARENALES	01	00																		0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.233.700	$ 49.400	0,960	$ 1.233.700	$ 85.800	(CCF39) CAJASAN	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.800
CC 1098434281	BREINER STIWAR ARDILA RICO	01	00											X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 142.350	$ 0	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1098434281	BREINER STIWAR ARDILA RICO	01	00																		0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.281.150	$ 51.200	0,960	$ 1.281.150	$ 89.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.281.150	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.500
CC 1095894115	JOHN ALEXANDER TOLOZA DELGADO	01	00	X																	0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 427.050	$ 17.100	0,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF39) CAJASAN	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1098618868	JONATHAN BECERRA FLOREZ	01	00		X																0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 840.000	$ 134.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 840.000	$ 33.600	0,960	$ 840.000	$ 58.600	(CCF39) CAJASAN	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.100
CC 1098725902	GEHINNER AURIO CHIQUILLO DIAZ	01	00											X							0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 284.700	$ 45.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 1098725902	GEHINNER AURIO CHIQUILLO DIAZ	01	00																		0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	0,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1098728354	JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	0,960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 1100580462	ELIANA ALEJANDRA SUAREZ GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1110074690	JAVIER ANTONIO PARALES CHAPARRO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.425.500	$ 227.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.425.500	$ 57.000	0,960	$ 1.425.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1117578369	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ MUÑOZ	01	00		X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 332.150	$ 13.300	0,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 12191151	GENTIL ANIBAL CAMPOS SOTELO	01	00		X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 332.150	$ 13.300	0,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 77156325	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00											X							0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 77156325	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																		0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	0,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00											X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94.900	$ 0	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00																		0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.328.600	$ 53.200	0,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF39) CAJASAN	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

620

Pagado: 22/04/2025 | Empresa NI901478369 JOB INGENIERIA SAS | Planilla Nro: 1072083840 | Periodo Cotización: marzo de 2025 | Periodo Servicio: abril de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91499154	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00											X						0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 91499154	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.800
CC 91530830	BRENNER MEJIA PORTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 8188919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 237.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
PT 8188919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF39) CAJASAN	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 3.695.700	$ 673.000	$ 1.502.300	$ 863.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.934.500	$ 32.000	$ 6.966.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-15, 10:08:16 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77755221

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-05-15 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	20
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098130385		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PEÑA CARVAJAL EDINSON MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
SNO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-15. 10:09:54 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77755221

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-05-15 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	20
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
	CC 1096946096									
Tipo Cotizante	01	00				S	PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					23100 1		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES


Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

MAYO

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"

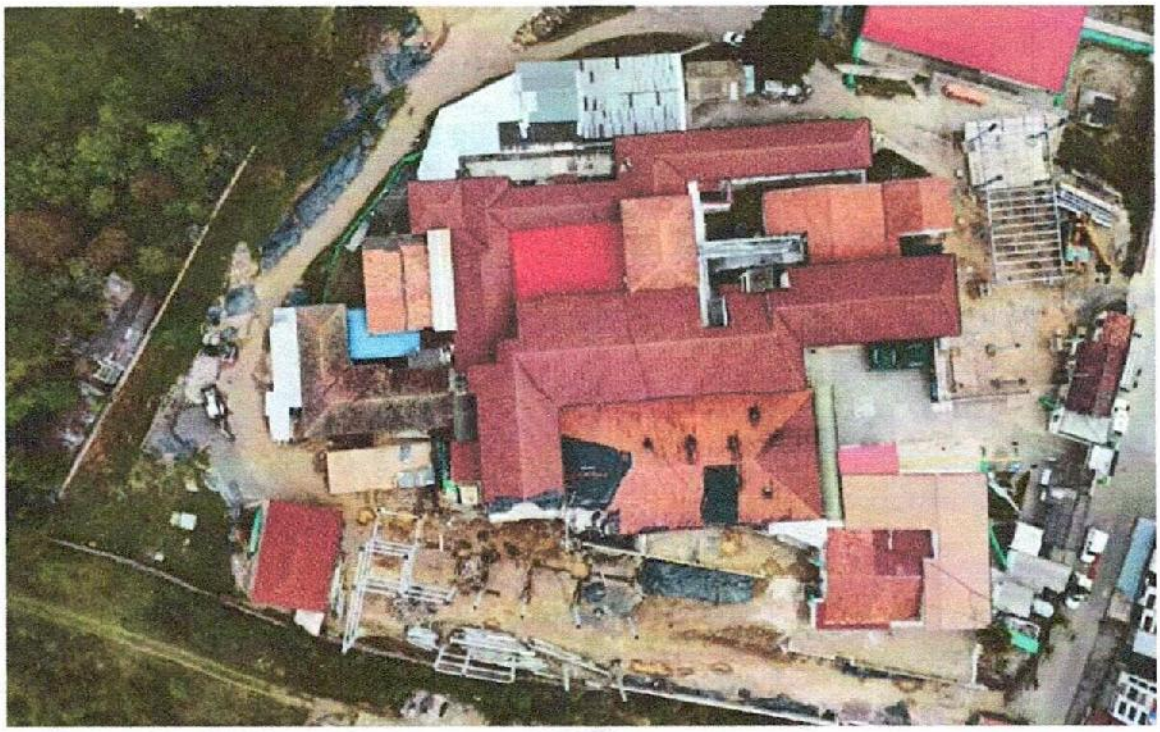

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 de mayo de 2025 – 25 de mayo de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

TIPO DE CONTRATO: 4

INTRODUCCION 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 5

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 5

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6

Construcción módulo A: 6
Construcción módulo B: 7
Construcción módulo C: 7
Construcción módulo E: 7
Construcción módulo F 7
Adecuación área de UCI 8

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 9

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 9

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS 22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 22

PRESUPUESTO DE OBRA 24

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE ABRIL DE 2025 24

Programación de obra 27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 6
Ilustración 2 Caja de corte de gases medicinales en la estación de enfermería 2 – Unidad de cuidados intensivos 10
Ilustración 3 Estación de enfermería 2 (Caja de corte de gases medicinales y termostato de aire acondicionado) 10
Ilustración 4 Caja de corte de gas medicinal y alarma digital - Estación de enfermería 1 11
Ilustración 5 Alarma digital gases medicinales - estación de enfermería 2 11
Ilustración 6 Fundida de placa de entrepiso en concreto de 4000 psi 12
Ilustración 7 Placa de entrepiso modulo D nivel 4.30 mt 12
Ilustración 8 Elementos estructurales nivel 8.60 mt 13
Ilustración 9 Nivelación de placa de contrapiso módulo D 13
Ilustración 10 Instalación de doble parrilla en malla electrosoldada en la placa de contrapiso 14
Ilustración 11 Placa de contrapiso módulo D - 4000 psi 14
Ilustración 12 Instalación de mampostería y fundida de columnas compuestas en concreto de 4000 psi segunda placa módulo D 15
Ilustración 13 Colocación de mampostería y fundida de concreto en columnas mixtas en el segundo piso módulo D 16
Ilustración 14 Instalación de muro en mampostería bloque interior y exterior en el primer piso módulo D 16

Ilustración 15 Muro perimetral en mampostería módulo D - segunda placa 17
Ilustración 16 Fabricación de elementos estructurales 17
Ilustración 17 Fabricación de elementos de estructurales 18
Ilustración 18 Fabricación de elementos estructurales modulo A 18
Ilustración 19 Instalación de elementos estructurales 19
Ilustración 20 Replanteo e instalación de placa base para columnas del módulo A 19
Ilustración 21 Fabricación de elementos estructurales - modulo A 20
Ilustración 22 Instalaciones de elementos estructurales modulo A 20
Ilustración 23 Construcción de cajas de inspección red de agua lluvia 21
Ilustración 24 Excavación de red de agua lluvia modulo A eje 4 21
Ilustración 25 Lluvias durante la madrugada 22
Ilustración 26 Día lluvioso mes de mayo 23
Ilustración 27 Dia lluvioso en el mes de mayo 23

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido de 01 de mayo de 2025 hasta la elaboración de este informe 25 de mayo de 2025.

Este proyecto representa un hilo significativo en el campo de la construcción civil, no solo por s magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuevo equipo de trabajo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento con los servicios de comedor, cocina, lavandería, mantenimiento, oficinas administrativas y hospitalización. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente se encuentra facturación, pediatría, consultorios, cuarto técnico (RACK). Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra ingresando por la plazoleta principal y cuenta con el servicio de urgencias, además colinda con el tomógrafo del hospital existente. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parto, recuperación de pacientes y parte de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización

- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo comprendido por este informe se entregó a la interventoría el plan de choque solicitado en mesa técnica en el mes de abril con el fin de aumentar el avance de obra mensual en el restante del año del 2025 y cumplir con los compromisos pactados, por lo tanto se desarrolló un ajuste a la programación actual del proyecto y poder disponer de una planificación que nos ayudara a gestionar de una forma diferentes aquellas actividades que son ruta crítica en la ejecución.

Por lo cual el contratista desarrollo un plan de choque para la recuperación del cronograma de obra de manera efectiva y a costos razonables; que permita aumentar el rendimiento que se tuvo en el mes de abril y poder impactar positivamente sobre el porcentaje de obra ejecutado, haciendo uso de las herramientas de gestión donde se involucren todos los componentes que conlleven a una mejora continua en la ejecución de las actividades de obra.

En el presente mes se intervinieron las siguientes áreas.

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Durante el mes mayo se realizaron actividades de instalaron 2 puertas con mirilla que estaban pendientes en los cuartos de aislados 1 y 2, se instalo una puerta filtro de vaivén sobre el acceso que se encuentra a tomografía y 1 puerta en los baños de admisiones y factura.

Teniendo en cuenta la visita realizada por parte de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira y las observaciones que se realizaron por parte de los especialistas se corrigió el vacuómetro de la caja de corte de la red de gas medicinal sitiado en las dos estaciones de enfermería. Adicional se instalaron las alarmas digitales tres gases que tenía el área en su momento de intervención.

Se instalo el termostato que regulará la temperatura en la cual estará funcionando el paquete condensador y se dejo instalado sobre la estación de enfermería 2.

A continuación, se muestran imágenes de lo ejecutado en el mes de mayo en el área de unidad de cuidados intensivos.

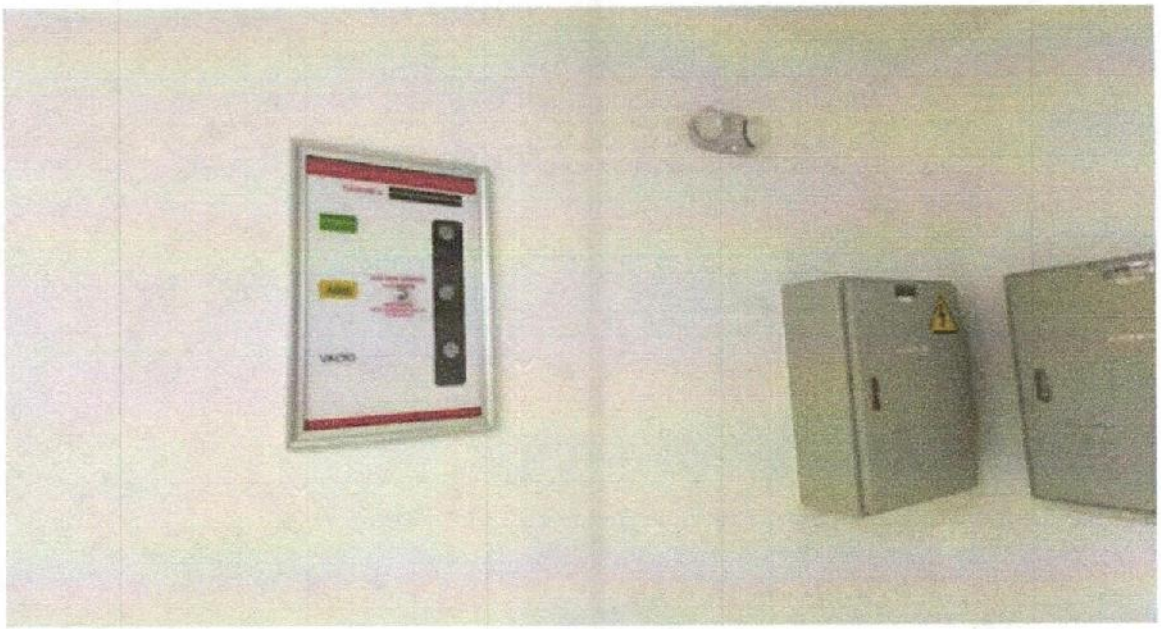


Ilustración 2 Caja de corte de gases medicinales en la estación de enfermería 2 – Unidad de cuidados intensivos



Ilustración 3 Estación de enfermería 2 (Caja de corte de gases medicinales y termostato de aire acondicionado)

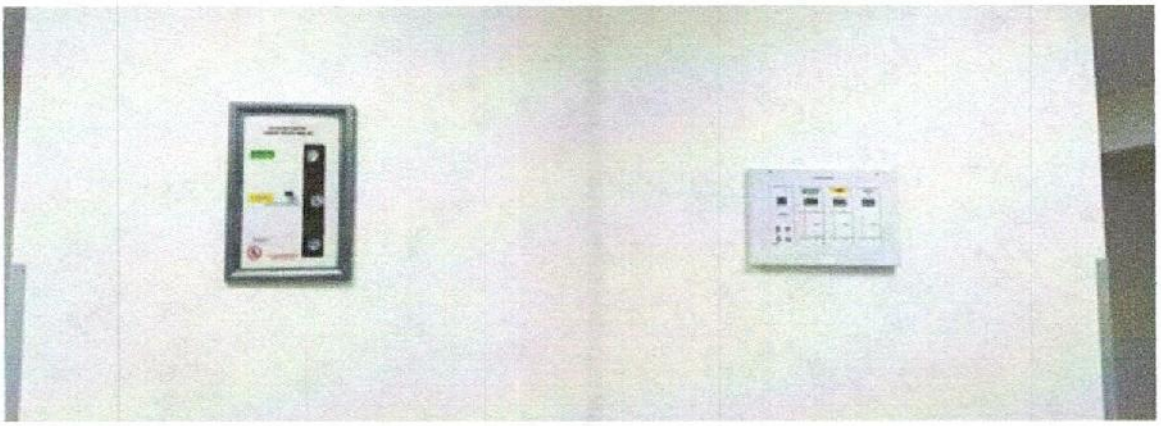


Ilustración 4 Caja de corte de gas medicinal y alarma digital - Estación de enfermería 1

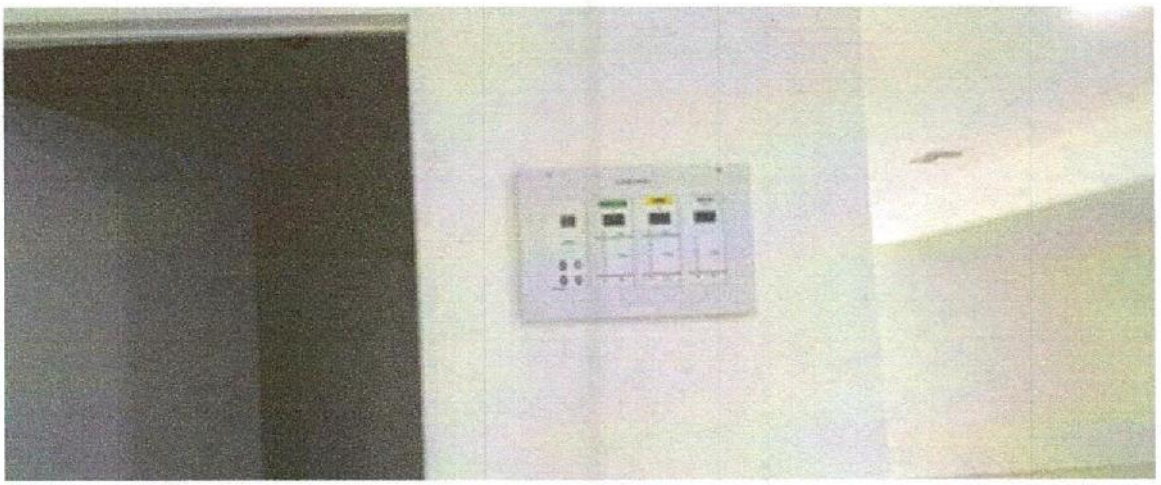


Ilustración 5 Alarma digital gases medicinales - estación de enfermería 2

MODULO D

En el módulo D se continuo con la fabricación e instalación de elementos estructurales del nivel 8.6 y adicional se instalo toda la superficie de la placa colaborante en metaldeck sobre el nivel 4.30 mt e ir colocando los cortantes durante toda la placa sujetándola a la estructura de este nivel.

Simultáneamente, hemos estado colocando la formaleta perimetral e instalación de la malla electrosoldada de toda la placa para ejecutar la fundida en concreto de 4000 psi teniendo en cuenta los diseños estructurales como se muestra en las siguientes imágenes.



Ilustración 6 Fundida de placa de entrepiso en concreto de 4000 psi



Ilustración 7 Placa de entrepiso modulo D nivel 4.30 mt

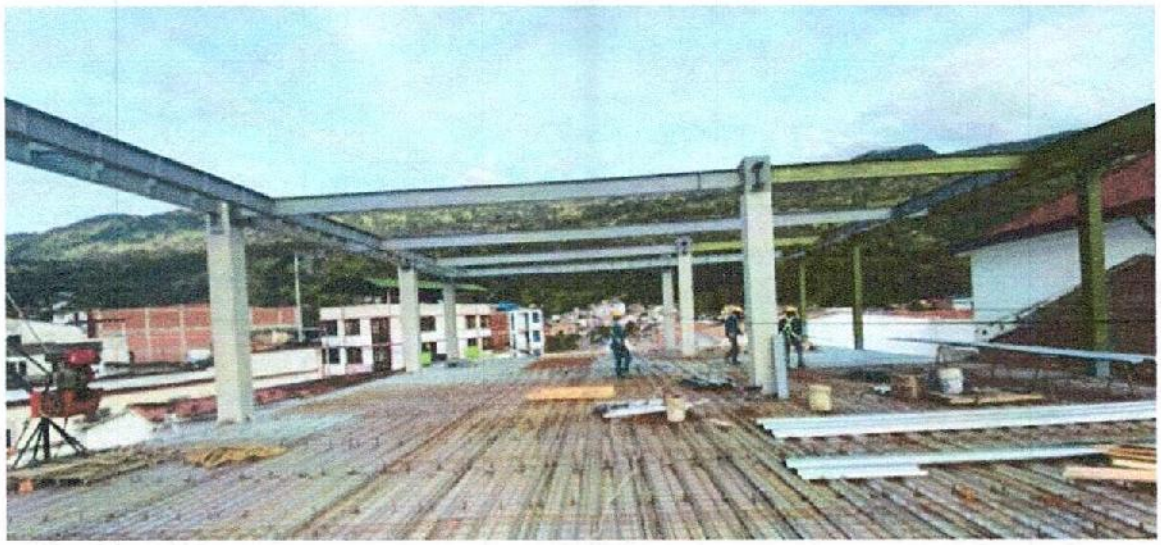


Ilustración 8 Elementos estructurales nivel 8.60 mt

Realizada la fundida de la placa de entrepiso se continuo con el replanteo en la placa de contrapiso verificando niveles de suelo para la fundida de concreto con espesor de 15 cm según diseños estructurales.

Se realizo la verificación con el topógrafo de toda el área de intervención del modulo D y se continuo con la instalación de la doble malla electroldada en los sectores donde se avala el nivel con el topógrafo. Continuamente, se inició formaletear el perímetro del modulo para la organizar la fundida en concreto de 4000 psi.



Ilustración 9 Nivelación de placa de contrapiso módulo D



Ilustración 10 Instalación de doble parrilla en malla electrosoldada en la placa de contrapiso



Ilustración 11 Placa de contrapiso módulo D - 4000 psi
