Posterior a la fundida de la placa se aplica antisol para formar una película impermeable en el concreto fresco y protegerla de los cambios bruscos de temperatura, así mismo se realizó el debido curado de la placa.

Se inician actividades de replanteo de muros en las placas del módulo D y las dilataciones en frio de toda la placa teniendo en cuenta las recomendaciones del diseñador estructural. Se empieza a levantar muros en mampostería exterior e interior en las dos placas y simultáneamente se empieza a colocar el acero de las columnetas de refuerzo para el confinamiento de la mampostería.

A su vez se empiezan a fundir las columnas combinadas del modulo D, para estas se realiza el concreto mezclado en obra de 4000 psi según especificación del diseñador y se deberá realizar en las 12 columnas compuestas del módulo. Sobre este concreto reposara las plantinas de conexión que soportaran la estructura metálica de la cubierta. Como se muestra en las siguientes ilustraciones.



Ilustración 12 Instalación de mamposteria y fundida de columnas compuestas en concreto de 4000 psi segunda placa módulo D

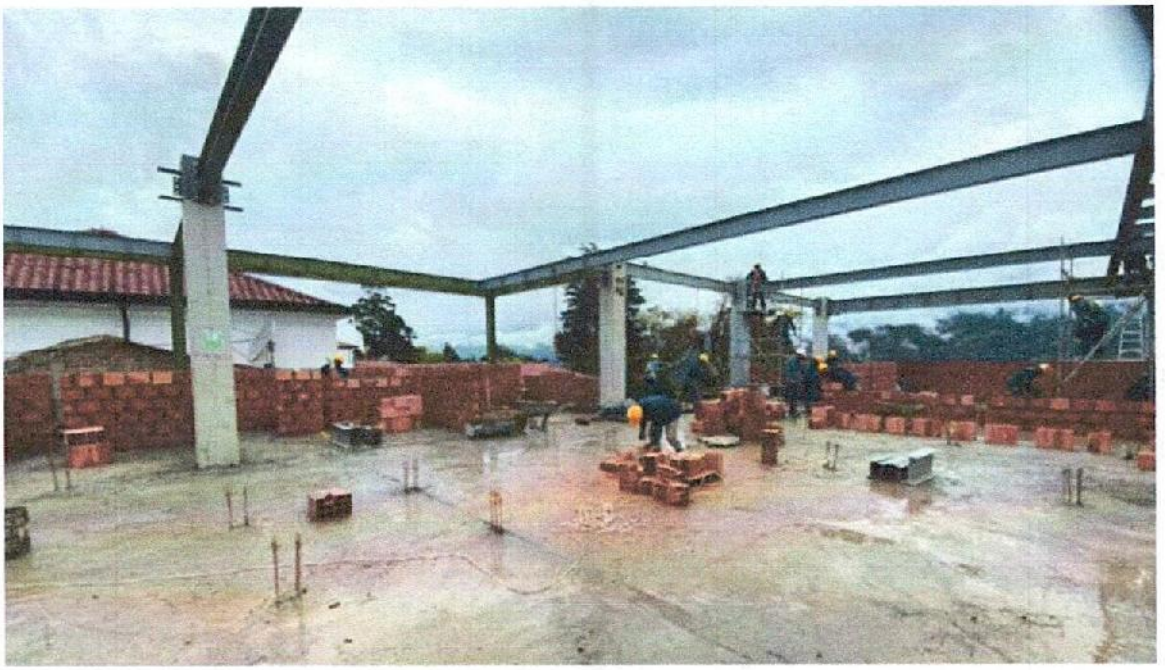


Ilustración 13 Colocación de mampostería y fundida de concreto en columnas mixtas en el segundo piso módulo D



Ilustración 14 Instalación de muro en mampostería bloque interior y exterior en el primer piso módulo D



Ilustración 15 Muro perimetral en mampostería módulo D - segunda placa

MODULO A

En el modulo A se continuo con la fabricación e instalación de estructura metálica del módulo, se realiza el replanteo y nivelación de las columnas y vigas que se han instalado durante este mes. También se avanza en la instalación de la red de recolección de agua lluvia sobre el costado del eje 4 en su tramo final, realizando la excavación, replanteo, colocación de tubería y construcción de cajas de inspección sobre todo el tramo.



Ilustración 16 Fabricación de elementos estructurales

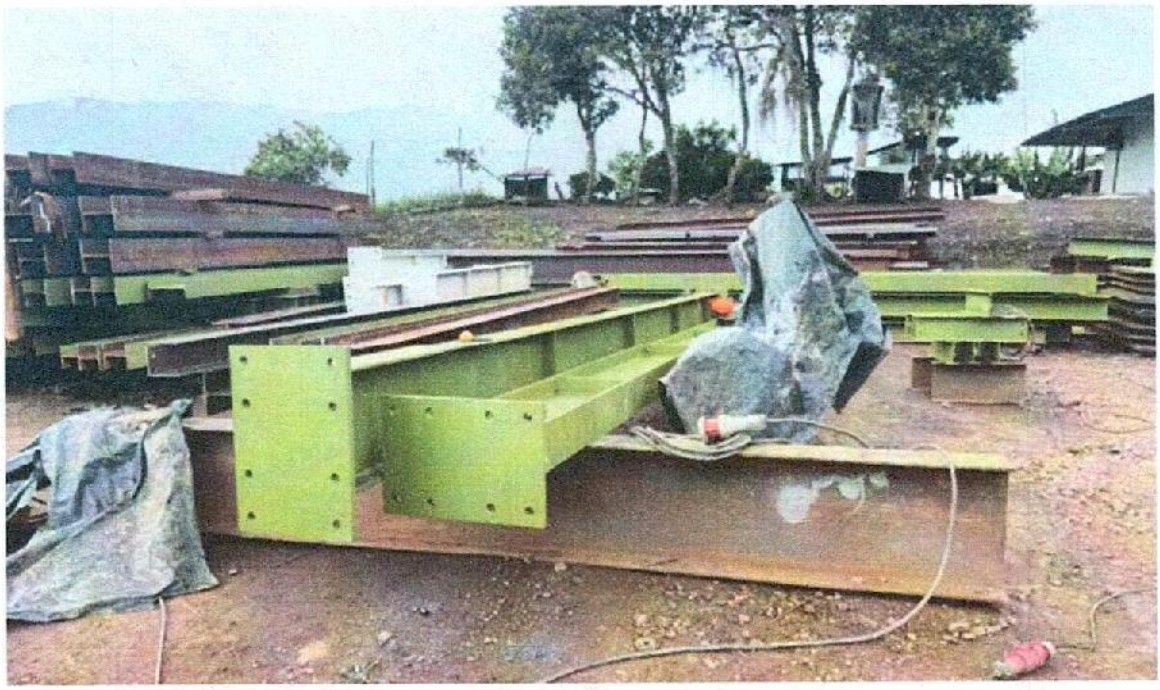


Ilustración 17 Fabricación de elementos de estructurales



Ilustración 18 Fabricación de elementos estructurales modulo A



Ilustración 19 Instalación de elementos estructurales



Ilustración 20 Replanteo e instalación de placa base para columnas del módulo A

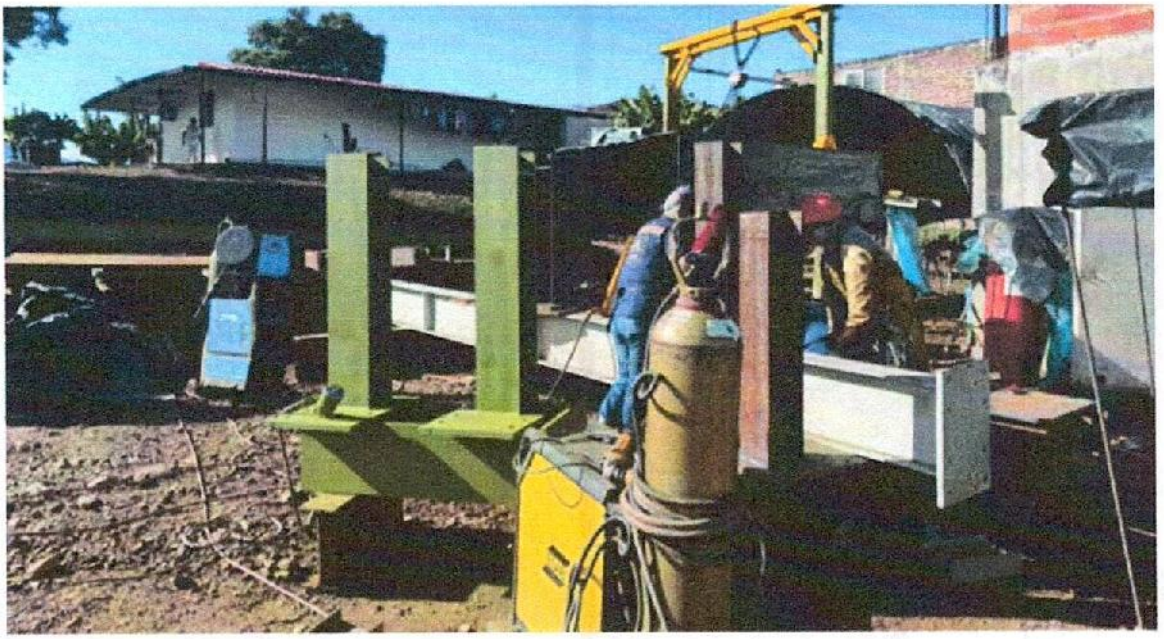


Ilustración 21 Fabricación de elementos estructurales - modulo A



Ilustración 22 Instalaciones de elementos estructurales modulo A

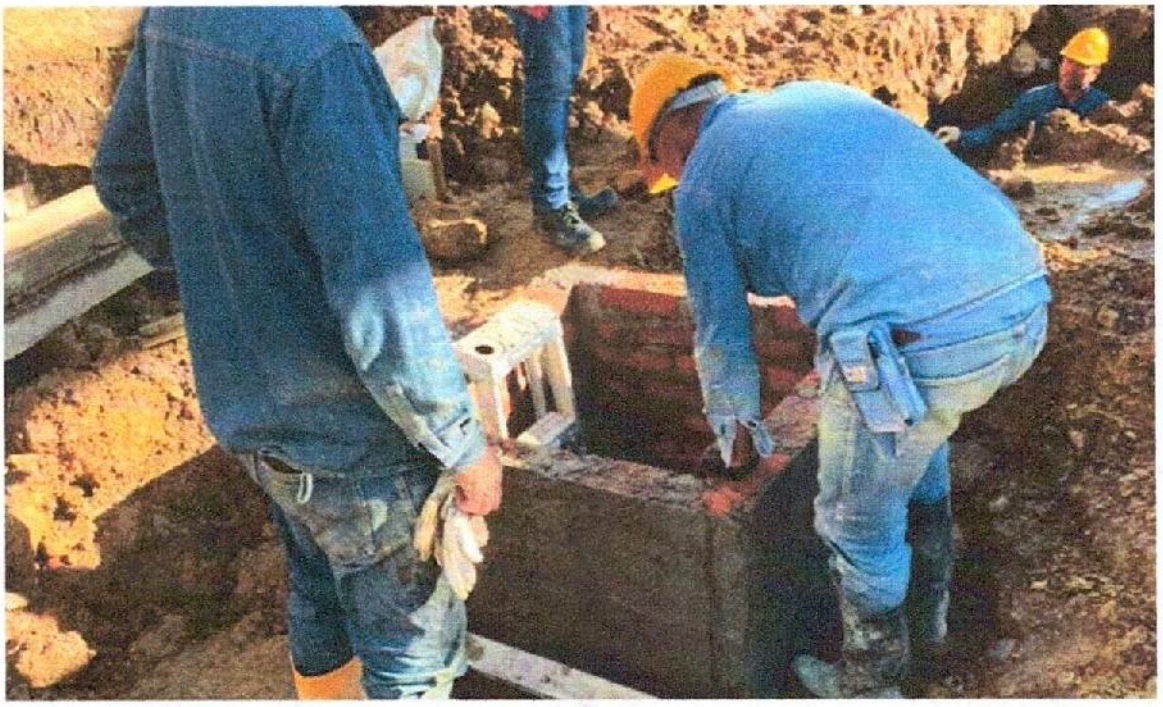


Ilustración 23 Construcción de cajas de inspección red de agua lluvia



Ilustración 24 Excavación de red de agua lluvia modulo A eje 4

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales. A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de mayo.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MAYO)																									
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Seco	17	19	24	20	20	12	24	24	20	24	11	19	24	21	18	18	24	24	24	12	18	16	11	16	24
Lluvia moderada	7			4		12			4		13	5		3	6	6				12	6	8	13	8	
Lluvia intensa		5			4																				
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

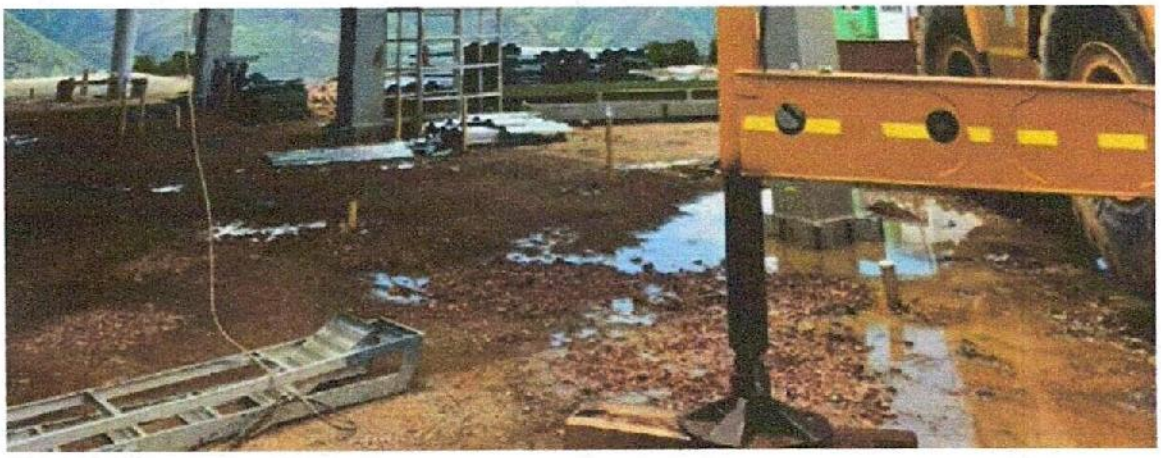


Ilustración 25 Lluvias durante la madrugada

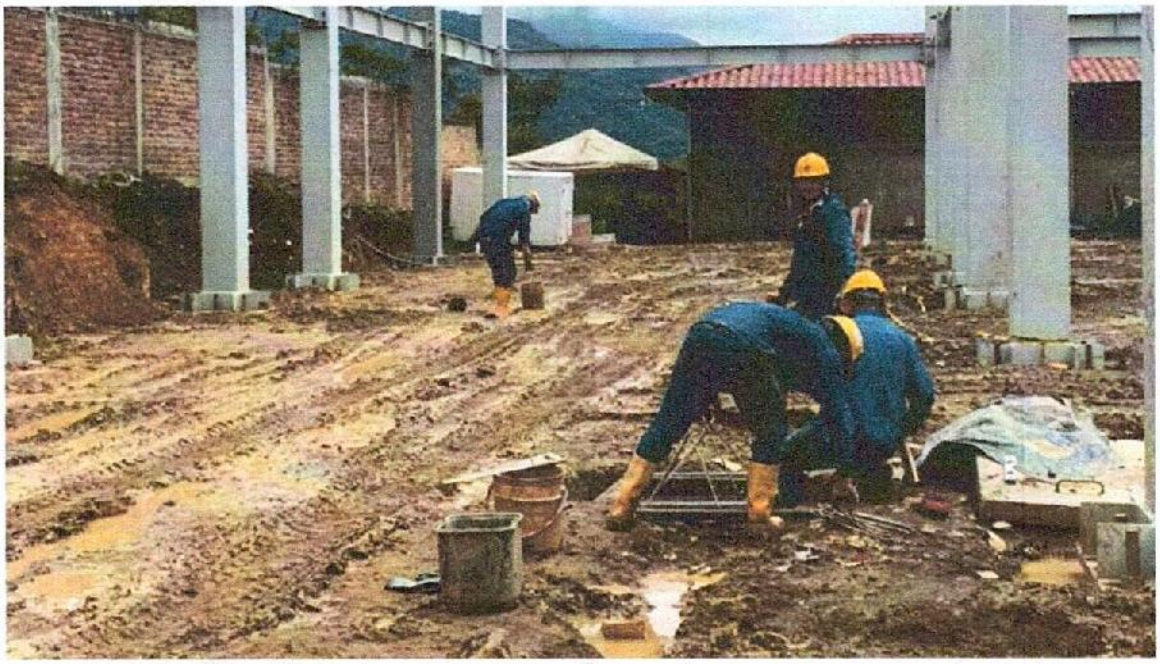


Ilustración 26 Dia lluvioso mes de mayo



Ilustración 27 Dia lluvioso en el mes de mayo

PRESUPUESTO DE OBRA

1.5PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE MAYO DE 2025

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		MAYO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 4,517,645,010.41**		**$ 33,677,137.95**
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.61	$ 106,197,118.05	1726.59	$ 33,677,137.95
6.0	**MAMPOSTERÍA**				**$ 372,253,277.51**		**$ 17,164,041.60**
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 89,396.05	3016.79	$ 269,689,109.68	192.00	$ 17,164,041.60
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 18,200,340,385.55**		**$ 370,845,226.39**
NP10	MONTAJE DE PUERTAS	UND	$ 440,000.00	36.00	$ 15,840,000.00	1.00	$ 440,000.00
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	409.08	$ 96,761,599.87
NP77	PLACA CONCRETO 4000 PSI, DE ENTREPISO e= 15 CM	M2	$ 293,277.03	3293.25	$ 965,834,579.05	888.00	$ 260,430,002.64
NP129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO 1 ETAPA DIGITAL No PROGRAMABLE VERTICAL (PRO 1000) HONEYWELL TH1110DV1009	UND	$ 664,040.50	1.00	$ 664,040.50	1.00	$ 664,040.50

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER


PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		MAYO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP139	DESMONTE E INSTALACION DE ALARMAS DIGITALES FABRICACION NACIONAL DE TRES GASES (O2, AIRE Y VACIO)	UND	$ 224,732.38	3.00	$ 674,197.14	2.00	$ 449,464.76
NP140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE TRIPLEVÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS (O2-1";AIR-1";VAC-1-1/2") INCLUYE (1 VALVULA DE BOLA DE 1" Y 2 VALVULA DE BOLA DE 1-1/2" DE 4 TORNILLOS ACERO INOXIDABLE)	UND	$ 2,707,078.56	3.00	$ 8,121,235.68	2.00	$ 5,414,157.12
NP147	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH), TERMINADA EN SU BORDE CON CANTO RIGIDO EN PVC. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE POMA Y BISAGRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	$ 1,103,332.85	153.68	$ 169,559,089.06	2.17	$ 2,394,232.28
NP149	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH) TIPO VAIVEN, INCLUYE (MIRILLA SI SE REQUIERE, MARCO, Y BISAGRAS PLATEADA PUERTA VAIVEN)	M2	$ 988,877.70	40.25	$ 39,802,327.43	4.34	$ 4,291,729.22
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.12**		**$ 421,686,405.94**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 122,289,057.72
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 4,216,864.06
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 21,084,320.30
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 147,590,242.08
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 569,276,648.02**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		MAYO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				$ 6,608,850,125.95		$ -
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS				$ 8,525,416,662.48		$ -
	DIFERENCIA POR AJUSTE				$ 0.01		
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				$ 63,493,471,857.35		$ 569,276,648.02
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				$ 1,200,000,000.00		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				$ 64,693,471,857.35		$ 569,276,648.02
	% EJECUTADO MENSUAL						0.88%
	% EJECUTADO ACUMULADO						37.72%
	% PROGRAMADO ACUMULADO						27.98%


Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 25 mayo de 2025.

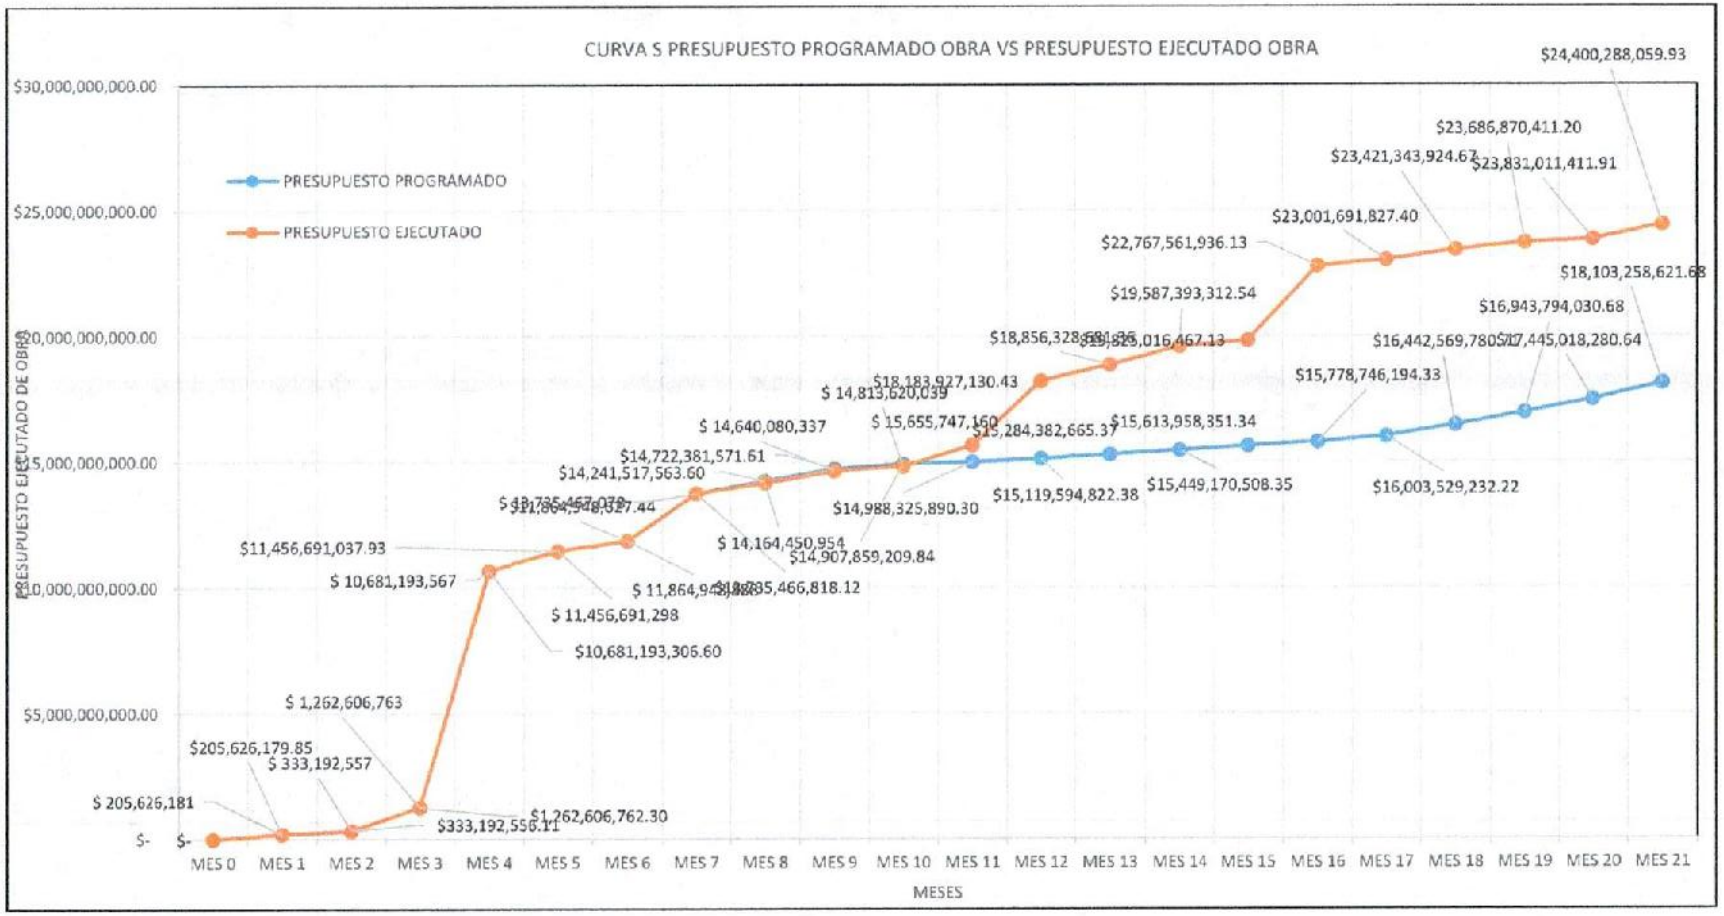

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 25 mayo de 2025.

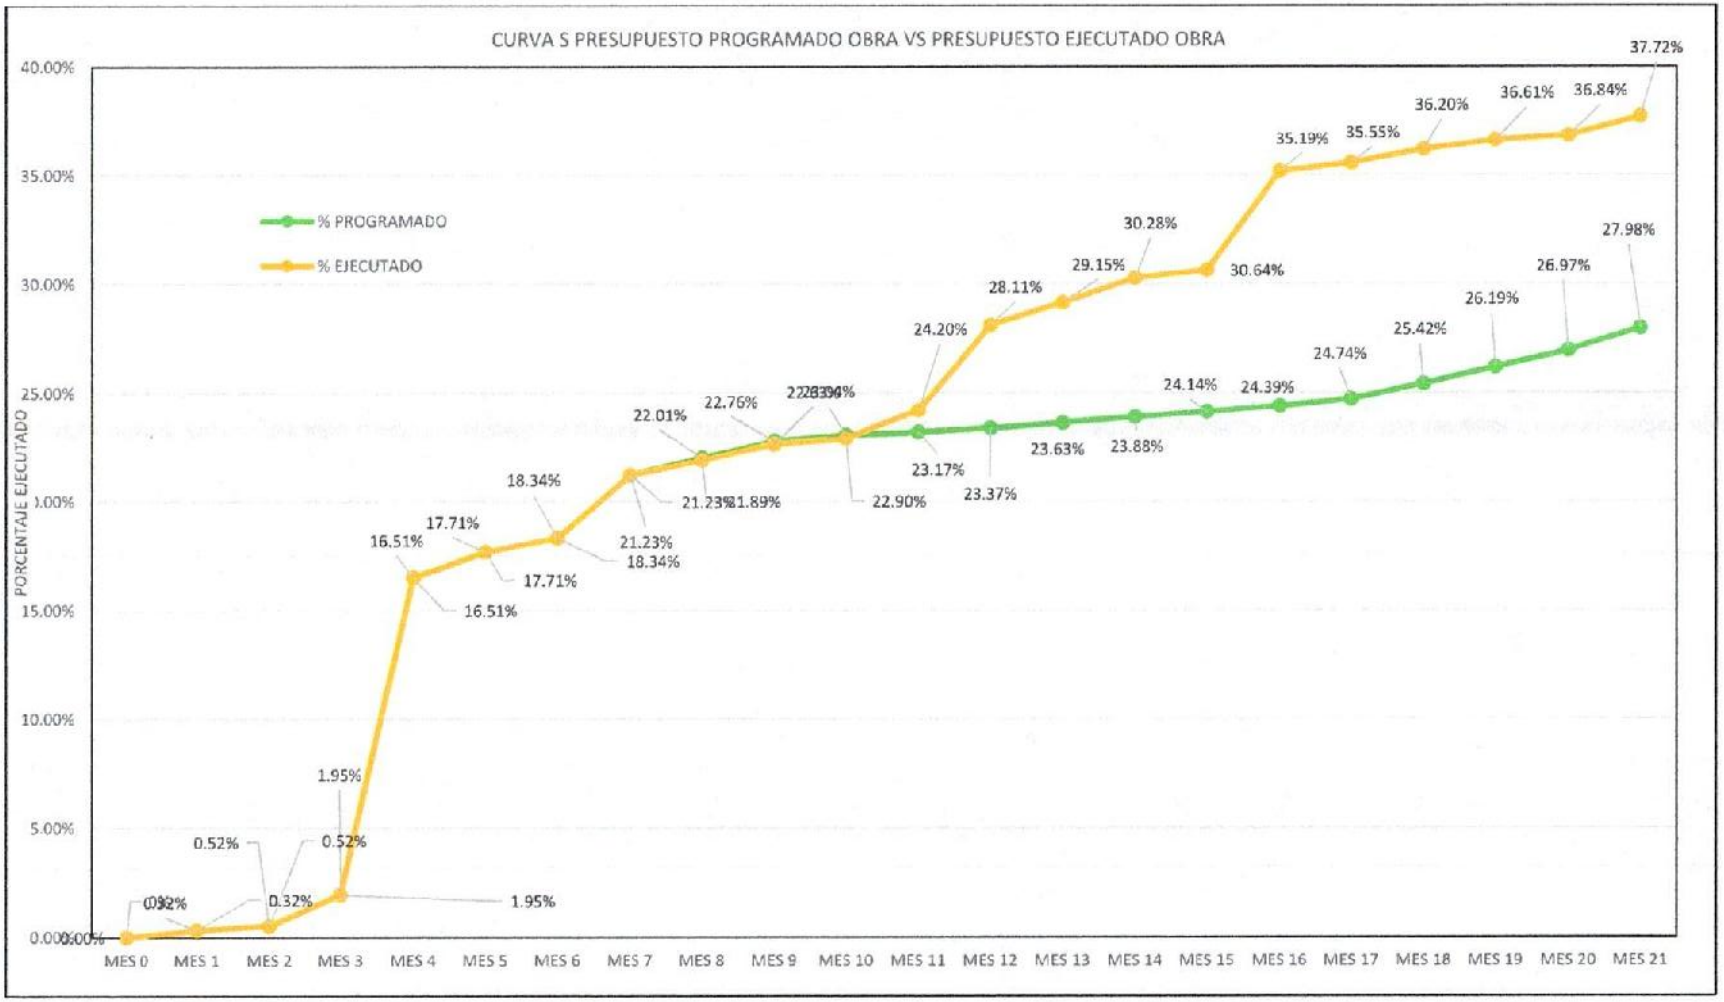

En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 27.98% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 37.72% acumulado, presentando 9.74% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está brindando capacitación continua al personal operativo que ejecuta labores de alto riesgo como el izaje y trabajo en caliente de la estructura metálica del módulo D.

- La ejecución del proyecto ha avanzado de manera satisfactoria durante el periodo evaluado, cumpliendo los plazos establecidos en el cronograma general y respetando los estándares de calidad definidos en la planificación inicial. Las actividades realizadas han seguido los lineamientos técnicos y normativos vigentes, y se han implementado las medidas de seguridad y control necesarias para garantizar la integrad del personal y el correcto desarrollo de las actividades.

- Las constantes lluvias durante el mes de mayo han afectado las actividades de izaje de estructura metálica en los módulos, teniendo en cuenta que la grúa con la que se está realizando la colocación de estalos elementos no se puede maniobrar mientras haya posibilidad de lluvia o truenos. Al igual el riesgo de realizar actividades de soldadura y posición de elementos en alturas no es el indicado cuando se presenten lloviznas.

- El proyecto se encuentra en una fase obra gris, con avances significativos en la estructura, mampostería y cubierta. A pesar de algunos contratiempos menores, como el clima y demora en la llegada de materiales por falta de la vía principal a la ciudad de Bucaramanga, el proceso de avance es positivo y se espera que las actividades planificadas se completen dentro del tiempo estimado.

- El porcentaje de ejecución programado en el mes de mayo es de 27.98 % esto equivale presupuestalmente a $18,103,258,621.68; en este informe el porcentaje ejecutado es de 37.72% que equivale a $24,400,288,059.93; por

lo tanto, en relación a lo anterior el Consorcio de García Rovira se encuentra presentando 9.74% por encima de lo programado acumulado.

- El Consorcio de García Rovira durante el mes de mayo ha realizado un avance significado en la estructura metálica del módulo D logrando abrir más campos de acción sobre este edificio y así poder ingresar personal de obra para las actividades posteriores de la estructura metálica.

- Se desarrollo un plan de choque para avanzar en el cronograma de obra a través de la incorporación de personal específicamente fabricación e instalación de estructura metálica y extensión de las horas de trabajo en esta actividad para dar un avance a las necesitades específicas de la problemática actual del proyecto.

- Al efectuar un estudio diagnostico de la ruta critica actual del proyecto, se identificaron las fortalezas y debilidades en los procesos constructivos y las actividades que mas estaban impactando en el cronograma para así poder ser ajustadas.

- Dado que ahora se deberá dirigir la planeación de la obra con el plan de choque y su ajuste en el cronograma de obra, se deberá garantizar el seguimiento continuo a la proyección propuesta y aplicar los correctivos necesarios velando por una mejora continua en la ejecución de las actividades.

- El consorcio de García Rovira esta evaluado iniciar un proceso de solicitud con la ESSA de una provisional eléctrica para realizar actividades de soldadura con equipos especializados, teniendo en cuenta que las cargas actuales del hospital podrían estar afectadas si se llegara a conectar estos equipos a la red existente.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA					ACTA DE MODIFICACION 4	MAYO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 4,517,645,010.41**		**$ 33,677,137.95**
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.81	$ 106,197,118.05	1726.59	$ 33,677,137.95
6.0	**MAMPOSTERÍA**				**$ 372,253,277.51**		**$ 17,164,041.60**
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 99,396.05	3016.79	$ 299,889,109.66	192.00	$ 17,164,041.60
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 18,200,340,385.55**		**$ 370,845,226.39**
NP10	MONTAJE DE PUERTAS	UND	$ 440,000.00	36.00	$ 15,840,000.00	1.00	$ 440,000.00
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,796,088.21	409.08	$ 96,761,599.67
NP77	PLACA CONCRETO 4000 PSI, DE ENTREPISO e= 15 CM	M2	$ 293,277.03	3293.25	$ 965,834,579.05	888.00	$ 260,430,002.64
NP129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO 1 ETAPA DIGITAL No PROGRAMABLE VERTICAL (PRO 1000) HONEYWELL TH1110DV1009	UND	$ 664,040.50	1.00	$ 664,040.50	1.00	$ 664,040.50
NP138	DESMONTE E INSTALACION DE ALARMAS DIGITALES FABRICACION NACIONAL DE TRES GASES (O2, AIRE Y VACIO)	UND	$ 224,732.38	3.00	$ 674,197.14	2.00	$ 449,464.76
NP140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE TRIPLEVÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS (O2-1";AIR-1";VAC-1-1/2") INCLUYE (1 VALVULA DE BOLA DE 1" Y 2 VALVULA DE BOLA DE 1-1/2" DE 4 TORNILLOS ACERO INOXIDABLE)	UND	$ 2,707,078.56	3.00	$ 8,121,235.68	2.00	$ 5,414,157.12
NP147	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH), TERMINADA EN SU BORDE CON CANTO RIGIDO EN PVC. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE POMA Y BISAGRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	$ 1,100,332.85	153.68	$ 169,559,089.06	2.17	$ 2,394,232.28
NP149	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH) TIPO VAIVEN. INCLUYE (MIRILLA SI SE REQUIERE, MARCO, Y BISAGRAS PLATEADA PUERTA VAIVEN)	M2	$ 986,877.70	40.25	$ 39,802,327.43	4.34	$ 4,291,729.22
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.12**		**$ 421,686,405.94**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 122,289,057.72
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 4,216,864.06
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 21,084,320.30
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 147,590,242.08
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 569,276,648.02**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ -**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**		
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 569,276,648.02**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**		**$ 569,276,648.02**
	% EJECUTADO MENSUAL						**0.88%**
	% EJECUTADO ACUMULADO						**37.72%**
	% PROGRAMADO ACUMULADO						**27.98%**

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q8					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	1986.24
		Largo	Ancho	ÁreaColum	ÁreaCo	Cant	Area	SUBTOTAL
MODULO D								
PRIMER PISO						2	567.90	1135.80
SEGUNGO PISO						1	567.90	567.90
SEGUNGO PISO VOLADO		10.87	2.35			1	25.54	25.54
DESCUENTO AREA COLUMNAS 0.45X0.45		0.45	0.45			-11	-2.23	-2.23
DESCUENTO AREA COLUMNA CIRCULAR						-1	-0.20	-0.20
DESCUENTO AREA COLUMNA HEB		0.24	0.23			-4	-0.22	-0.22
							ACUMULADO	1986.24
							ACTA MODIFICATORIA 4	5444.61
							SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	3458.37
							COBRADAS PARCIAL No 1	
							COBRADAS PARCIAL No 2	
							COBRADAS PARCIAL No 3	
							COBRADAS PARCIAL No 4	
							COBRADAS PARCIAL No 5	259.65
							CANTIDADES PRESENTE PRESENTE ACTA	1726.59
OBSERVACIONES:								



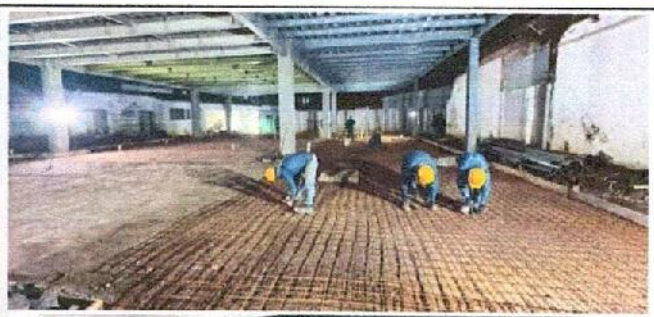





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7717

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

5.01	MURO EN BLOQUE NO 5				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	623.95
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
MODULO D						
MURO PERIMETRAL SEGUNDA PLACA		80	2.4	192.00	1.00	192.00

ACUMULADO	623.95
ACTA MODIFICATORIA 4	3016.79
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2392.84
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	385.90
COBRADAS PARCIAL No 3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	46.05
CANTIDADES PRESENTE ACTA	192.00

OBSERVACIONES:



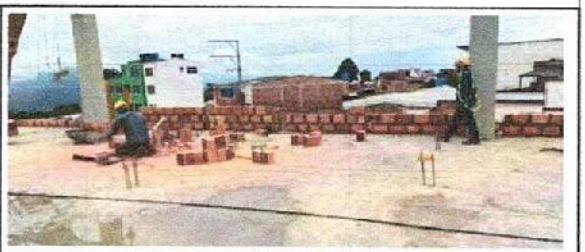



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7718

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
NP10	MONTAJE DE PUERTAS				UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	16.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cantidad	
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
PUERTA FILTRO TOMOGRAFO					1.00	1.00
	ACUMULADO					16.00
	ACTA MODIFICATORIA 4					36.00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD					20.00
	COBRADAS PARCIAL No 1					
	COBRADAS PARCIAL No 2					
	COBRADAS PARCIAL No 3					
	COBRADAS PARCIAL No 4					
	COBRADAS PARCIAL No 5					14.00
	MES DE ABRIL					1.00
	CANTIDADES PRESENTE ACTA					1.00
OBSERVACIONES:						



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7719


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	686.83
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
SEGUNDA PLANTA				567.9		567.90
DESCUENTO AREA COLUMNAS 0.45X0.45	0.45	0.45			-11	-2.23
DESCUENTO AREA COLUMNA CIRCULAR					-1	-0.20
DESCUENTO AREA COLUMNA HEB	0.24	0.23			-4	-0.22
					ACUMULADO	686.83
					ACTA MODIFICATORIA 4	3169.96
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2892.21
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No 3	
					COBRADAS PARCIAL No 4	
					COBRADAS PARCIAL No 5	121.58
					MES DE ABRIL	156.17
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	409.08

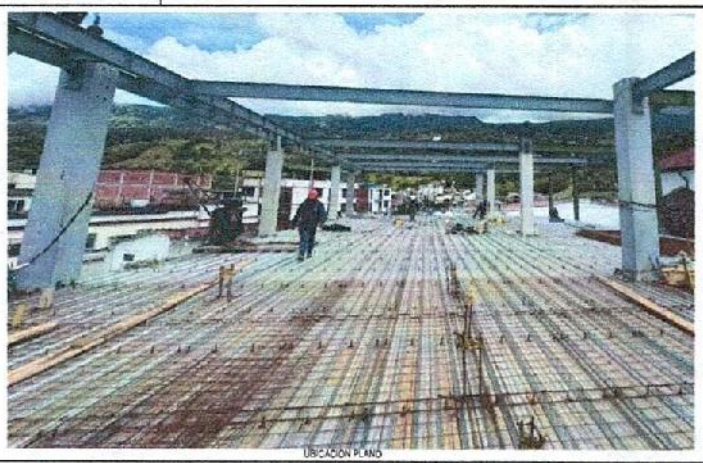

UBICACION PLANO

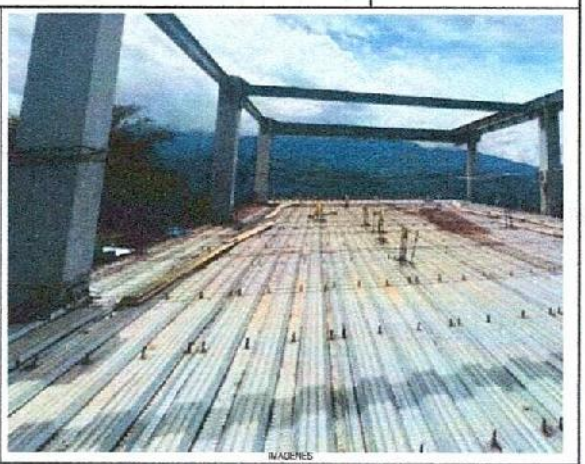

IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7770


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP77	PLACA CONCRETO 4000 PSI, DE ENTREPISO e= 15 CM					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	888.00
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares		Elementos	SUBTOTAL
MODULO D							
PRIMERA PLANTA				444			444.00
SEGUNDA PLANTA				444			444.00

	ACUMULADO	888.00
	ACTA MODIFICATORIA 4	3169.96
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	3169.96
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	
	COBRADAS PARCIAL No 3	
	COBRADAS PARCIAL No 4	
	COBRADAS PARCIAL No 5	
	MES DE ABRIL	
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	888.00

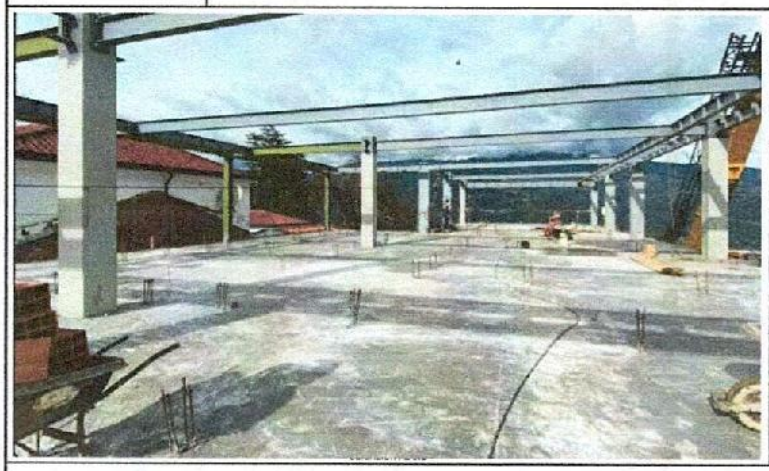

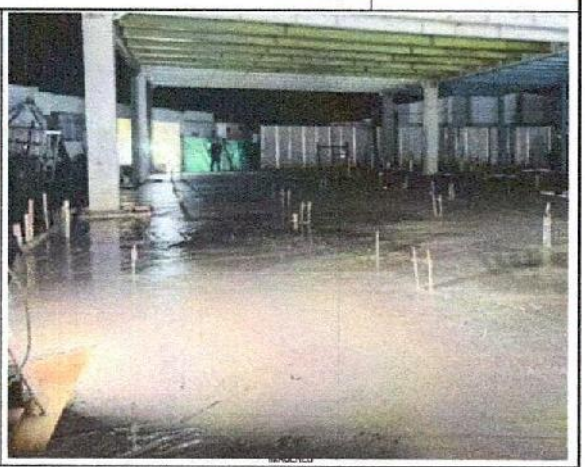

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7721

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
NP129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO 1 ETAPA DIGITAL No PROGRAMABLE VERTICAL (PRO 1000) HONEYWELL TH1110DV1009					UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	1.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS							
ESTACION DE ENFERMERIA 2						1.00	1.00
						ACUMULADO	1.00
						ACTA MODIFICATORIA 4	1.00
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0.00
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	
						COBRADAS PARCIAL No 4	
						COBRADAS PARCIAL No 5	
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	1.00
OBSERVACIONES:							



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7722

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP139	DESMONTE E INSTALACION DE ALARMAS DIGITALES FABRICACION NACIONAL DE TRES GASES (O2, AIRE Y VACIO)


UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	2.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS						
ESTACION DE ENFERMERIA 1					1.00	1.00
ESTACION DE ENFERMERIA 2					1.00	1.00

ACUMULADO	2.00
ACTA MODIFICATORIA 4	3.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.00
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	
CANTIDADES PRESENTE ACTA	2.00

OBSERVACIONES:

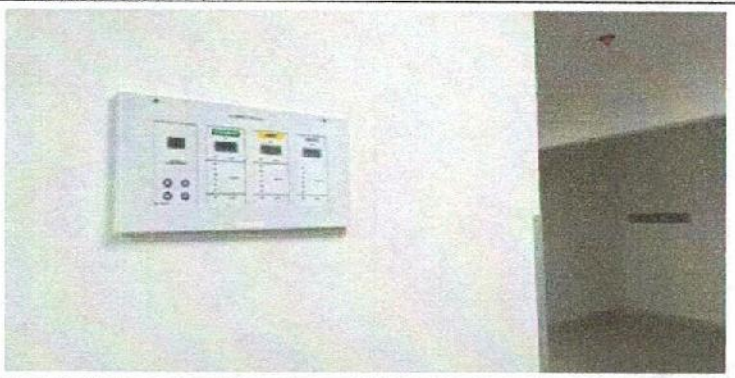

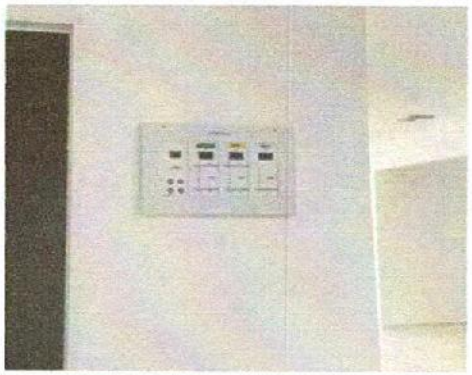

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
NP140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE TRIPLEVÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS (O2-1";AIR-1";VAC-1-1/2") INCLUYE (1 VALVULA DE BOLA DE 1" Y 2 VALVULA DE BOLA DE 1-1/2" DE 4 TORNILLOS ACERO INOXIDABLE)				UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	2.00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS						
ESTACION DE ENFERMERIA 1					1.00	1.00
ESTACION DE ENFERMERIA 2					1.00	1.00
					ACUMULADO	2.00
					ACTA MODIFICATORIA 4	3.00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.00
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No3	
					COBRADAS PARCIAL No 4	
					COBRADAS PARCIAL No 5	
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	2.00
OBSERVACIONES:						





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7724

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

NP147	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH), TERMINADA EN SU BORDE CON CANTO RIGIDO EN PVC. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE POMA Y BISAGRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	133.64
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS						
BAÑO ADMISIONES Y FACTURACION	1.00		2.17		1.00	2.17

ACUMULADO	133.64
ACTA MODIFICATORIA 4	153.68
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	72.12
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	81.56
MES DE ABRIL	49.91
CANTIDADES PRESENTE ACTA	2.17

OBSERVACIONES:

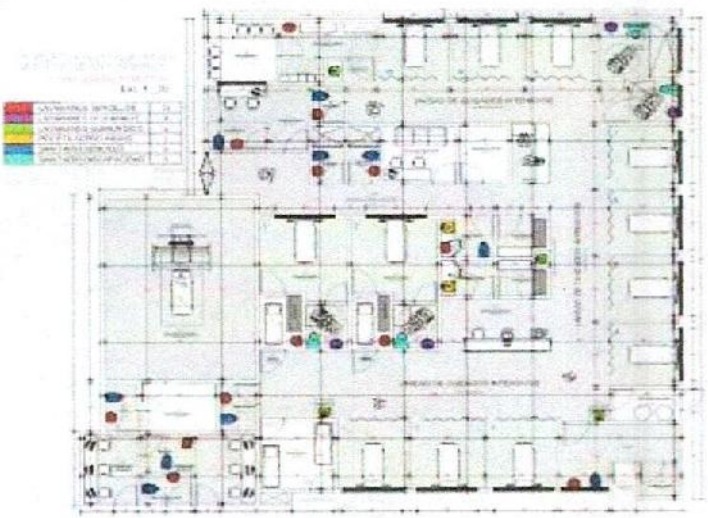

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7725

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP149	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH) TIPO VAIVEN, INCLUYE (MIRILLA SI SE REQUIERE, MARCO, Y BISAGRAS PLATEADA PUERTA VAIVEN)
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	13.02
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS						
PACIENTE AISLADO 1 FILTRO	1.00		2.17		1.00	2.17
PACIENTE AISLADO 2 FILTRO	1.00		2.17		1.00	2.17

ACUMULADO	13.02
ACTA MODIFICATORIA 4	40.25
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	40.25
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	
MES DE ABRIL	8.68
CANTIDADES PRESENTE ACTA	4.34

OBSERVACIONES:



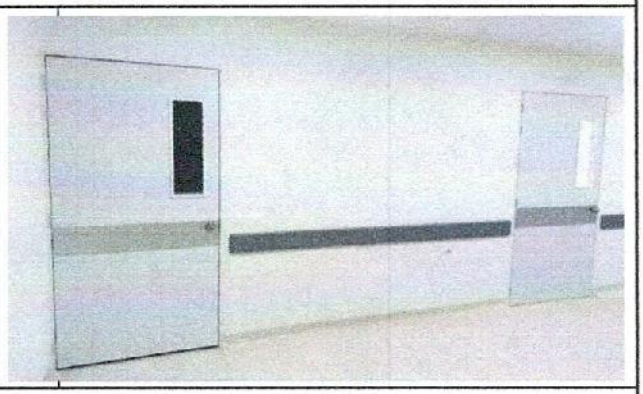

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1542038053	9487210772	E	2025/06/04	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	5	$29,590,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	sln	tae	tap	cp	tap	vsp	cer	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (57 Afiliados)																								$95,426,377	$15,441,300			$95,732,977	$3,831,600			$93,218,127	$3,730,900			$95,732,977		$6,491,000		$0	$0		$29,494,800
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (57 Afiliados)																								$95,426,377	$15,441,300			$95,732,977	$3,831,600			$93,218,127	$3,730,900			$95,732,977		$6,491,000		$0	$0		$29,494,800
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (57 Afiliados)																								$95,426,377	$15,441,300			$95,732,977	$3,831,600			$93,218,127	$3,730,900			$95,732,977		$6,491,000		$0	$0		$29,494,800
1	CC	1095816853	ANAYA RODRIGUEZ ERVIN GIOVANNY																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	13929589	BARAJAS HERNANDEZ JOSE EULISES	X																		23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-25	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
3	CC	13929932	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO																			25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
5	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO																			25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
6	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																			23020 1	30	$10,520,000	$1,788,400	EPS002	30	$10,520,000	$420,800	CCF39	30	$10,520,000	$420,800	14-25	30	$10,520,000	6.960%	$732,200	30	$0	$0	SI	$3,362,200
8	CC	1098946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER	X																		23020 0	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
9	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO	X																		23030 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
10	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO												X							23020 1	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF39	0	$0	$0	14-25	21	$996,450	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$199,400
11	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO																			23020 1	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF39	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
12	CC	5613736	CONDE OJEDA RAUL	X																		23030 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
13	CC	1096960660	CORREA MOGOLLON GERZON ARTURO	X																		23030 1	24	$1,471,680	$235,500	EPS005	24	$1,471,680	$58,900	CCF39	24	$1,471,680	$58,900	14-25	24	$1,471,680	6.960%	$102,500	24	$0	$0	SI	$455,800
14	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY																			23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
15	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES	X																		23030 1	12	$735,840	$117,800	EPS037	12	$735,840	$29,500	CCF39	12	$735,840	$29,500	14-25	12	$735,840	6.960%	$51,300	12	$0	$0	SI	$228,100
16	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	13927880	ESPINEL IBAÑEZ CARLOS JULIO	X																		23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF39	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
18	CC	13928984	ESPINEL IBAÑEZ JAIME	X																		23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF39	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
19	CC	13930526	FAJARDO MURILLO JAVIER	X																		25-14	12	$735,840	$117,800	EPS037	12	$735,840	$29,500	CCF39	12	$735,840	$29,500	14-25	12	$735,840	6.960%	$51,300	12	$0	$0	SI	$228,100
20	CC	29183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL	X																		25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
21	CC	91352509	GARAVITO VASQUEZ JAIRO																			25-14	30	$2,207,520	$353,300	EPS037	30	$2,207,520	$88,400	CCF39	30	$2,207,520	$88,400	14-25	30	$2,207,520	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,800
22	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER																			25-14	30	$2,945,600	$471,300	EPS037	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
23	CC	91275443	GONZALEZ GRANADOS CHRISTIAN EDUARDO																			23030 1	30	$6,476,259	$1,101,100	EPS017	30	$6,476,259	$259,100	CCF39	30	$6,476,259	$259,103	14-25	30	$6,476,259	6.960%	$450,800	30	$0	$0	SI	$2,070,100
24	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO																			25-14	30	$5,509,146	$881,500	EPS037	30	$5,509,146	$220,400	CCF39	30	$5,509,146	$220,400	14-25	30	$5,509,146	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800

2025/06/12 09:52 AM

7733

JUNIO

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"



INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

26 de mayo de 2025 – 25 de junio de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

25	CC	91218910	GOVENECHE ROJAS ULICER	X																		0	$0	$0	EPS037	5	$306,600	$12,300	CCF39	5	$306,600	$12,300	14-25	5	$306,600	6.960%	$21,400	5	$0	$0	SI	$46,000
26	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN HORBEY																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
27	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS	X																	230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-25	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
28	PT	2356563	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO																		230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF39	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800
29	PT	2356563	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO											X							230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF39	0	$0	$0	14-25	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$28,500
30	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO							X											25-14	30	$2,334,789	$373,600	EPS010	30	$2,334,789	$93,400	CCF39	30	$2,334,789	$93,400	14-25	30	$2,334,789	6.960%	$162,600	30	$0	$0	SI	$723,000
31	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
32	CC	1098150989	HUERTAS TARAZONA JUAN ANTONIO	X																	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$352,800
33	CC	1100504012	JAIMES ORTIZ PABLO ANTONIO	X																	230301	5	$306,600	$49,100	EPS005	5	$306,600	$12,300	CCF39	5	$306,600	$12,300	14-25	5	$306,600	6.960%	$21,400	5	$0	$0	SI	$95,100
34	CC	1099302101	LIZARAZO SANABRIA EDGAR ALFONSO	X																	230301	5	$237,250	$38,000	CCFC55	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
35	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																		231001	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
36	CC	5609784	LOZANO DUARTE RICARDO	X																	25-14	5	$306,600	$49,100	EPS037	5	$306,600	$12,300	CCF39	5	$306,600	$12,300	14-25	5	$306,600	6.960%	$21,400	5	$0	$0	SI	$95,100
37	PT	6197959	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
38	CC	1096957709	MENDOZA CARRILLO FARID JHOAN CAMILO	X																	230201	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
39	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
40	CC	13929148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
41	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS							X											230301	30	$3,310,914	$529,800	EPS037	30	$3,310,914	$132,500	CCF39	30	$3,310,914	$132,500	14-25	30	$3,310,914	6.960%	$230,500	30	$0	$0	SI	$1,025,300
42	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER											X							25-14	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF39	0	$0	$0	14-25	7	$332,150	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$66,500
43	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER																		25-14	1	$61,320	$9,900	EPS002	1	$61,320	$2,500	CCF39	1	$61,320	$2,500	14-25	1	$61,320	6.960%	$4,300	1	$0	$0	SI	$19,200
44	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER											X							25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS002	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	0	$0	$0	14-25	22	$1,043,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$208,900
45	CC	1044605940	ORTIZ ORTIZ JULIO ENRIQUE	X																	230201	5	$306,600	$49,100	EPS002	5	$306,600	$12,300	CCF39	5	$306,600	$12,300	14-25	5	$306,600	6.960%	$21,400	5	$0	$0	SI	$95,100
46	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO	X																	230301	12	$1,178,240	$188,600	EPS002	12	$1,178,240	$47,200	CCF39	12	$1,178,240	$47,200	14-25	12	$1,178,240	6.960%	$82,100	12	$0	$0	SI	$365,100
47	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
48	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
49	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI	X																	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-25	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
50	CC	1127914204	RAVELO RODRIGUEZ DOMINGO	X																	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
51	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
52	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY																		230301	30	$3,324,479	$532,000	EPS002	30	$3,324,479	$133,000	CCF39	30	$3,324,479	$133,000	14-25	30	$3,324,479	6.960%	$231,400	30	$0	$0	SI	$1,029,400
53	CC	1093885835	RODRIGUEZ ALVARADO LUIS CARLOS	X																	230301	12	$569,400	$91,200	ESSC24	12	$569,400	$22,800	CCF39	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
54	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
55	CC	1096950990	ROJAS SANGUINO LEONARDO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
56	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
57	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
58	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900

2025/06/12 09:52 AM

7727

Planilla Resumen

aportes en línea

59	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF39	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
60	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
61	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(57)																						$95,426,377	$15,441,300			$95,732,977	$3,831,600			$93,218,127	$3,730,900			$95,732,977		$6,491,000		$0	$0		$29,494,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1542038053	9487210272	E	2025/06/04	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	5	$29,590,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	$15,441,300	$50,100	$0	$15,491,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$1,000	$0	$295,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,694,000	$15,200	$0	$4,709,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$7,742,000	$25,100	$0	$7,767,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,710,900	$8,800	$0	$2,719,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$6,491,000	$20,900	$0	$6,511,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	57	$6,491,000	$20,900	$0	$6,511,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,730,900	$12,100	$0	$3,743,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	57	$3,730,900	$12,100	$0	$3,743,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				57	$3,831,600	$12,700	$0	$3,844,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$9,500	$100	$0	$9,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$22,800	$100	$0	$22,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$173,400	$600	$0	$174,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$259,100	$900	$0	$260,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,216,500	$4,000	$0	$1,220,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$240,300	$800	$0	$241,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,080,800	$3,500	$0	$1,084,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$829,200	$2,700	$0	$831,900
TOTAL				57	$29,494,800	$95,800	$0	$29,590,600

1128

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-22, 12:01:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072083840

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 22/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOB INGENIERIA SAS		
Documento	NI901478369	**Dirección**	TV 112 #20 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3232196491
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	**Identificación**	CC 1098728354
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005337262	JENIFER PAOLA GOMAJOA CABALLERO	01	00																		6	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 465.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF39) CAJASAN	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1005444013	ANDRES FELIPE CORDERO GOMEZ	01	00																		9	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.800	$ 372.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	6.960	$ 2.000.800	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1007337636	CRISTIAN DUVAN GUARIN ARENALES	01	00											X							0	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 189.800	$ 30.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 189.800	$ 0	0.000	$ 189.800	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 1007337634	CRISTIAN DUVAN GUARIN ARENALES	01	00																		0	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.233.700	$ 49.400	6.960	$ 1.233.700	$ 85.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 1090434281	BREINER STIWAR ARDILA RICO	01	00											X							0	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 142.350	$ 0	0.000	$ 142.350	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1090434281	BREINER STIWAR ARDILA RICO	01	00																		0	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.281.150	$ 51.300	6.960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.500
CC 1095804115	JOHN ALEXANDER FOLOZA DELGADO	01	00	X																	6	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 427.050	$ 17.100	6.960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF39) CAJASAN	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1098618658	JONATHAN BECERRA FLOREZ	01	00		X																0	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 840.600	$ 134.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 840.000	$ 33.600	6.960	$ 840.600	$ 58.500	(CCF39) CAJASAN	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.100
CC 1098725992	GEHINNER AURIO CHIQUILLO DIAZ	01	00											X							0	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 284.700	$ 45.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 284.700	$ 0	0.000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 1098725992	GEHINNER AURIO CHIQUILLO DIAZ	01	00																		0	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6.960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1098728354	JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	6.960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 1100502462	ELIANA ALEXANDRA SUAREZ GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	6.960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1116774590	JAVIER ANTONIO PARALES CHAPARRO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1117528363	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ MUÑOZ	01	00	X																	0	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 332.150	$ 13.300	6.960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 1216351	SENTIL ANIBAL CAMPOS SOTELO	01	00	X																	0	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPSC034) RECAUDO SCP CAPITAL SALUD	$ 332.150	$ 13.300	6.960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 77156329	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00											X							0	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 0	0.000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 77156325	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																		0	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6.960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00											X							0	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94.900	$ 0	0.000	$ 94.900	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 91357081	JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00																		0	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.328.600	$ 53.200	6.960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF39) CAJASAN	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 22/04/2025 | **Empresa NI901478369 JOB INGENIERIA SAS** | **Planilla Nro: 1072083840** | **Periodo Cotización: marzo de 2025** | **Periodo Servicio: abril de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91469164	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00											K						D	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 91469164	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																	D	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 91536559	BREINER MEJIA PORTILLO	01	00																	D	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
PT 8158919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	D	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 237.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
PT 8158919	HECTOR ALEJANDRO MORENO LEDEZMA	01	00																	D	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.500	(CCF39) CAJASAN	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 23.092.850	$ 3.695.700	$ 873.000	$ 1.502.300	$ 863.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.934.500	$ 32.000	$ 6.966.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

436

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-15, 10:08:16 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77755221

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-05-15 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	20
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1098130385										
Tipo Cotizante	01	00				S	PEÑA CARVAJAL EDINSON MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

1347

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-15, 10:09:54 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77755221

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-05-15 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	20
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096946096		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30							23100		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

TIPO DE CONTRATO: 4

INTRODUCCION 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 5

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 5

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6

Construcción módulo A: 6
Construcción módulo B: 7
Construcción módulo C: 7
Construcción módulo E: 7
Construcción módulo F 7
Adecuación área de UCI 8

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 9

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 9

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS 20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

PRESUPUESTO DE OBRA 22

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE ABRIL DE 2025 22

Programación de obra 24

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 6
Ilustración 2 Mampostería perimetral módulo D 11
Ilustración 3 Mampostería interna módulo D, segundo piso 11
Ilustración 4 Mampostería interna módulo D, primer piso 12
Ilustración 5 Pañete en muros de mampostería 12
Ilustración 6 Pañete en muros módulo D 13
Ilustración 7 Columnetas y viguetas de confinamiento de mampostería 13
Ilustración 8 Instalación de cubierta módulo D 14
Ilustración 9 Instalación de elementos de cubierta módulo D 14
Ilustración 10 Instalación tubería sanitaria módulo D 15
Ilustración 11 Instalación de red sanitaria modulo D 15
Ilustración 12 Instalación de cubierta módulo D 16
Ilustración 13 Instalación de placa metaldeck módulo D y pañete en muros de mampostería 16
Ilustración 14 Autonivelante tipo grouting placa base modulo A 17
Ilustración 15 Aplicación de autonivelante en las placas bases modulo A 17
Ilustración 16 Montaje elementos metálicos modulo A 18
Ilustración 17 Platina de cierre columna módulo D 18
Ilustración 18 Instalación elementos estructurales modulo A 19

Ilustración 19 Lluvia constante sobre el mes de junio 20
Ilustración 20 Lluvias durante el mes de junio 21
Ilustración 21 Lluvias durante el mes de junio 21

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido de 26 de mayo de 2025 hasta la elaboración de este informe 25 de junio de 2025.

Este proyecto representa un hilo significativo en el campo de la construcción civil, no solo por s magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuevo equipo de trabajo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento con los servicios de comedor, cocina, lavandería, mantenimiento, oficinas administrativas y hospitalización. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente se encuentra facturación, pediatría, consultorios, cuarto técnico (RACK). Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra ingresando por la plazoleta principal y cuenta con el servicio de urgencias, además colinda con el tomógrafo del hospital existente. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parto, recuperación de pacientes y parte de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización

- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.3 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades ejecutadas durante el mes de junio. Durante este periodo se continuo con la ejecución de trabajos según el cronograma establecido, alcanzando un avance físico acumulado 39.23% a la fecha de este informe, lo cual refleja un desarrollo sostenido de la obra dentro de los plazos previstos.

Durante junio, se ejecutaron labores en distintos frentes constructivos, destacándose los trabajos de mampostería y friso, estructura metálica de cubierta y la colocación del sistema de entrepiso tipo metaldeck. Asimismo, se llevaron a cabo actividades de demolición de estructuras existentes, necesarias para la adecuación del nuevo diseño de la central de gases medicinales y se continuo con el montaje de la estructura metálica correspondiente al módulo A, consolidando un aumento en el rendimiento clave en la ejecución del proyecto.

Este informe detalla las actividades realizadas, los recursos utilizados, el avance por capitulo, así como las condiciones generales de ejecución y las proyecciones para el siguiente mes, con el fin de brindar una visión clara del estado actual de la obra, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos y normativos vigentes, así como las medidas de seguridad y control de calidad estipulados para esta clase de proyectos.

Las labores se desarrollaron sin mayor contratiempo técnico pero si logístico, debido a que durante a lo corrido del mes se han presentado lluvias constantes durante todo el mes y han dificultado realizar actividades en altura como el montaje de las estructuras debido al alto riesgo que es ejecutarlas.

MODULO D

Durante el periodo reportado en el modulo D se continuo con el replanteo de los muros de mampostería, incluyendo las juntas de dilatación en frio a lo largo de toda la placa de entrepiso, teniendo en cuenta los diseños y las recomendaciones del diseñador estructural.

De manera simultánea, se continuo con la construcción de muros en mampostería en las dos plantas, y la colocación de acero correspondiente a las columnas y viguetas de confinamientos de la mampostería, conforme a los planos de elementos no estructurales.

Asimismo, se continua con el vaciado de las columnetas y viguetas se utilizó concreto preparado en obra con la resistencia especificadas, a su vez se realizó el fundido de las 12 columnas en concreto de 4000 psi preparado in situ de las

columnas principales del módulo. Sobre el cabezal de estas columnas se instalaron las platinas de cierre y de anclaje diseñadas para soportar las columnas de la estructura de la cubierta, la cual ya se esta realizando el montaje de esta estructura.

MODULO A

Durante el periodo evaluado en el presente informe, se ha dado continuidad a la fabricación de los elementos estructurales correspondientes al modulo en ejecución. Paralelamente, se ha avanzado en el montaje de dichos elementos, lo cual ha representado un progreso significativo en el desarrollo de la obra.

A la fecha, se han completado la instalación de la totalidad de las placas bases de las columnas, y se ha iniciado el montaje de las columnas estructurales respectivas. Estas actividades se realizaron con el objetivo de cerrar progresivamente cada uno de los pórticos del módulo, permitiendo así el avance en la instalación de los elementos de entrepiso.

Una vez completados los pórticos, se continuará con la colocación del sistema metal deck en los diferentes niveles, conforme a la secuencia constructiva establecida y cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad requerido para este tipo de estructuras.

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

REGISTRO FOTOGRAFICO

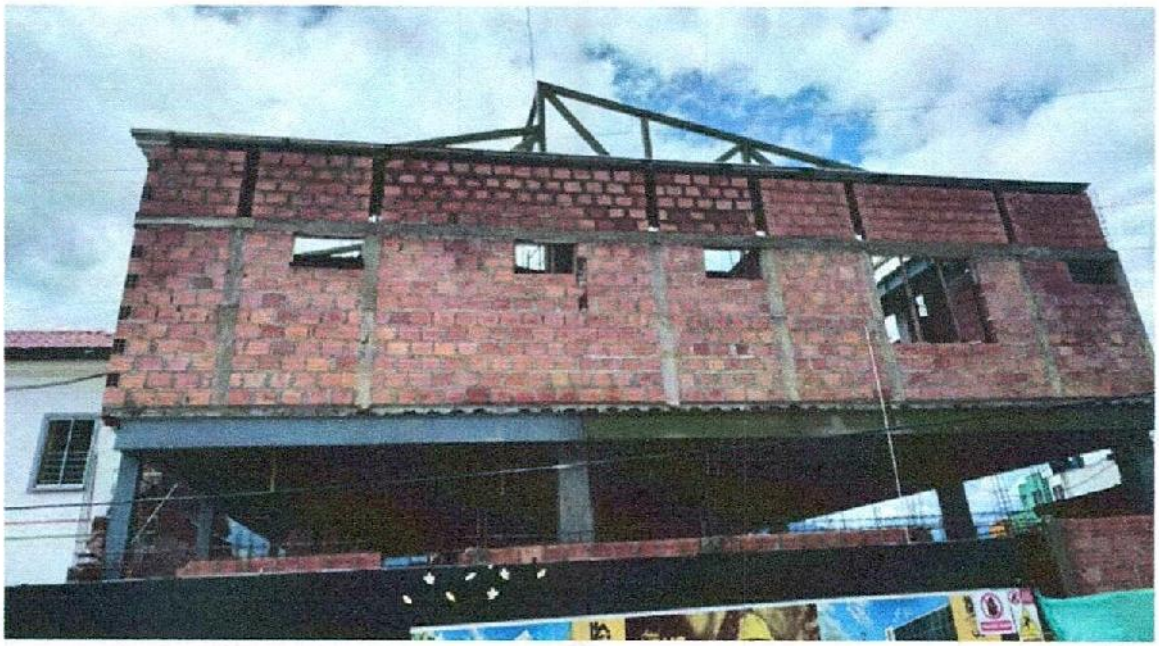


Ilustración 2 Mampostería perimetral módulo D

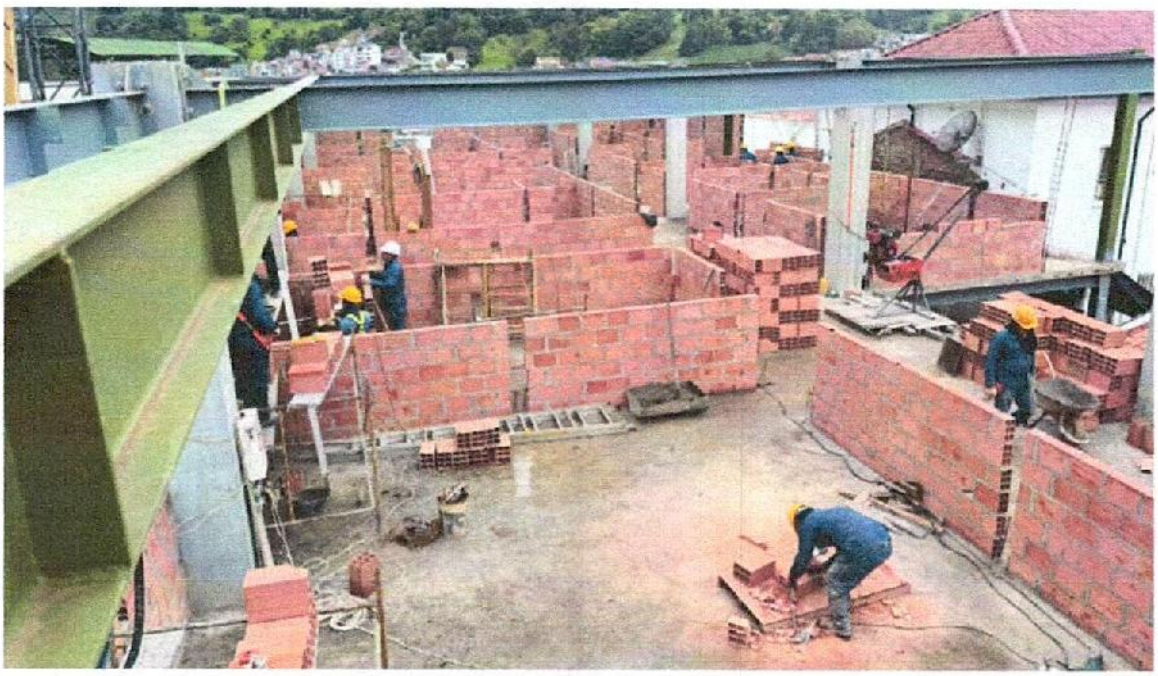


Ilustración 3 Mamposteria interna módulo D, segundo piso

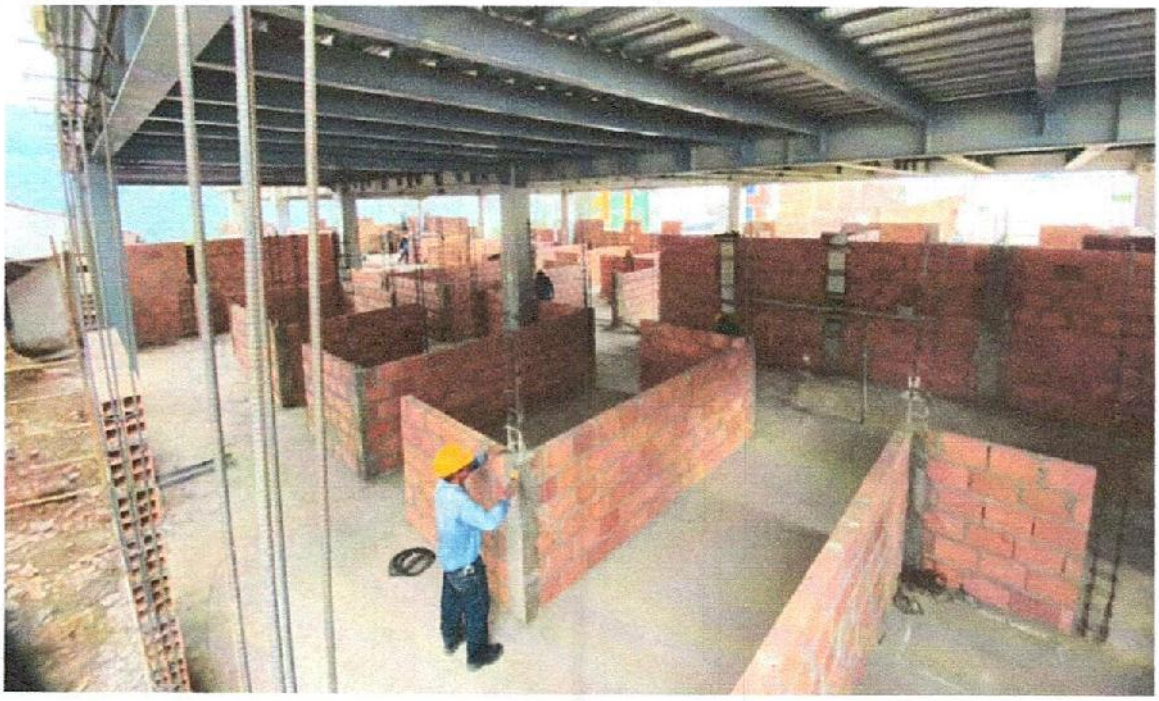


Ilustración 4 Mampostería interna módulo D, primer piso

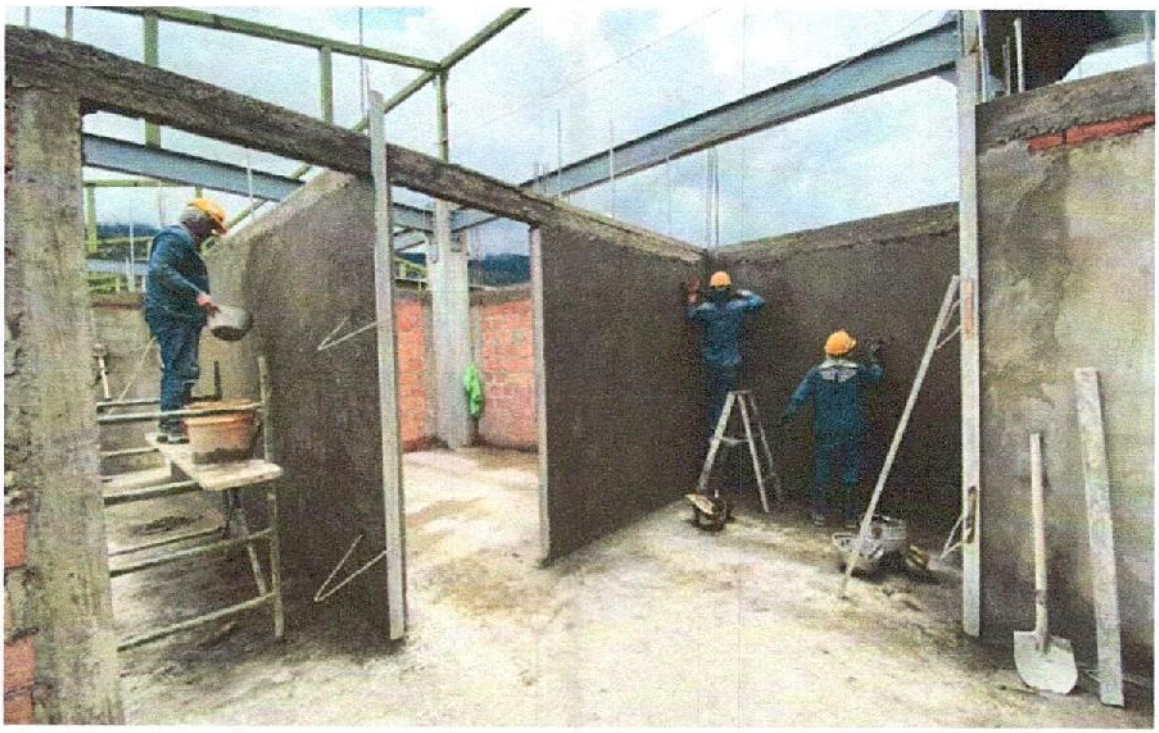


Ilustración 5 Pañete en muros de mampostería

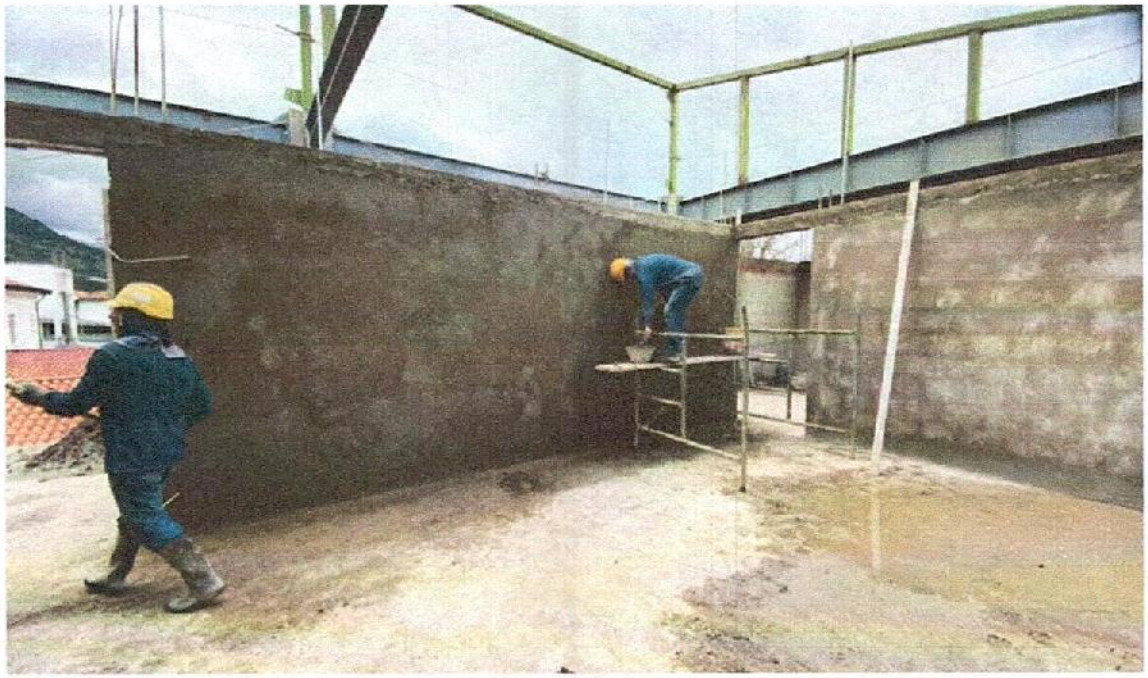


Ilustración 6 Pañete en muros módulo D



Ilustración 7 Columnetas y viguetas de confinamiento de mampostería

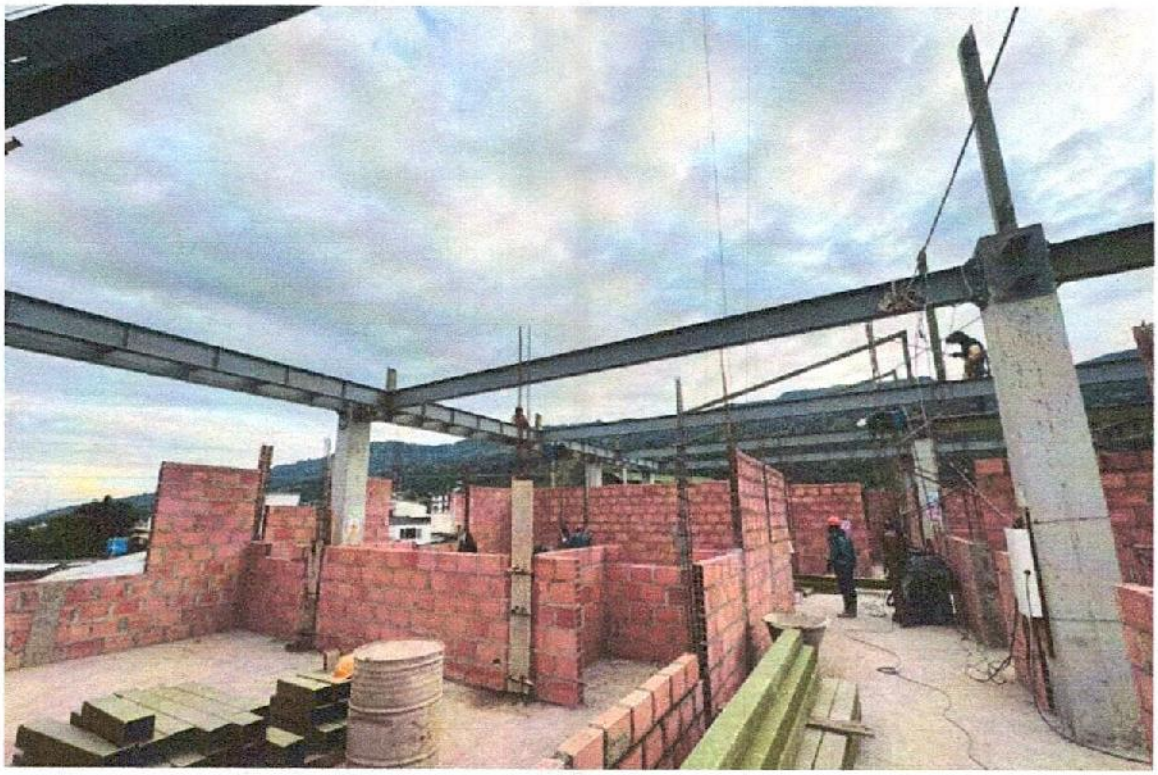


Ilustración 8 Instalación de cubierta módulo D

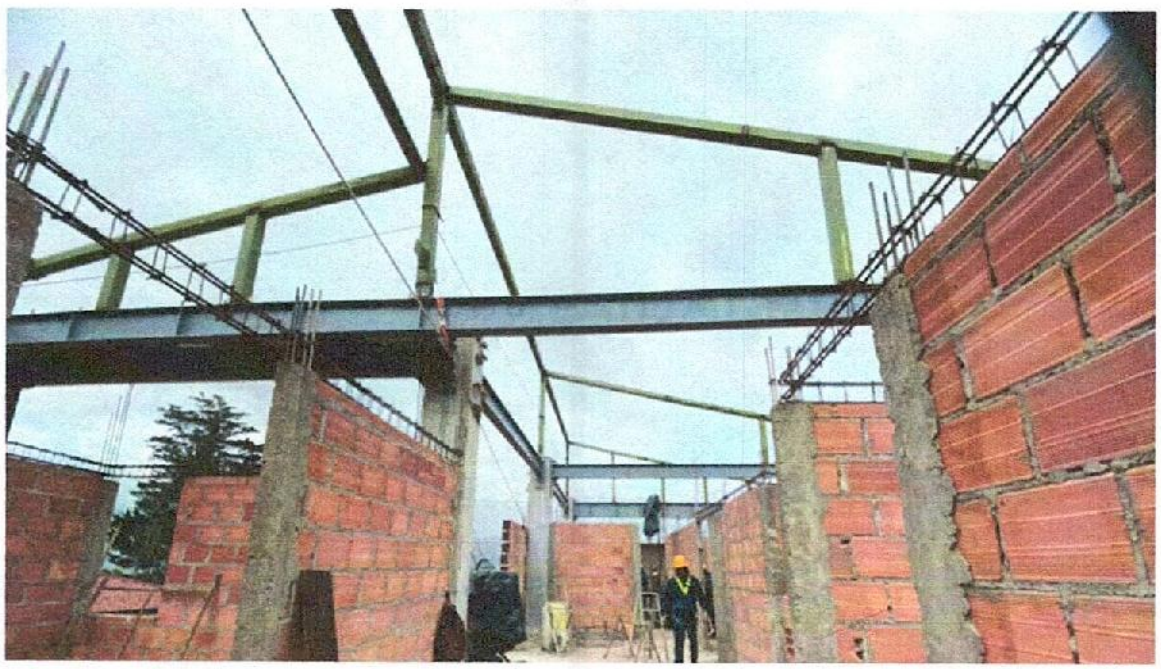


Ilustración 9 Instalación de elementos de cubierta módulo D



Ilustración 10 Instalación tubería sanitaria módulo D

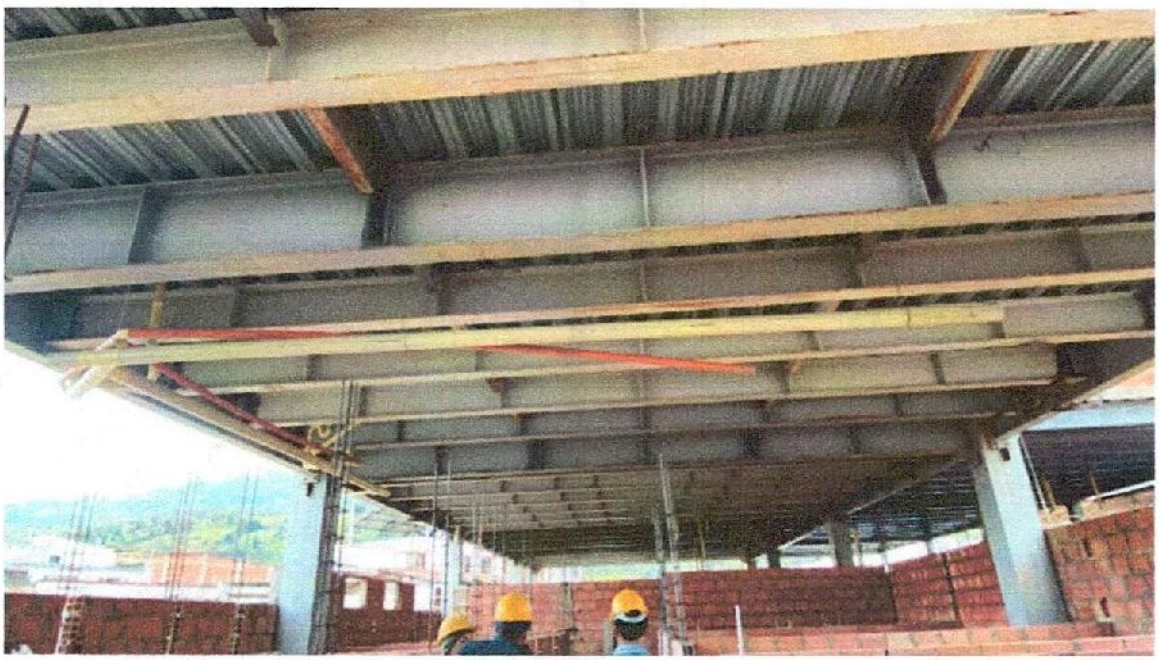


Ilustración 11 Instalación de red sanitaria modulo D

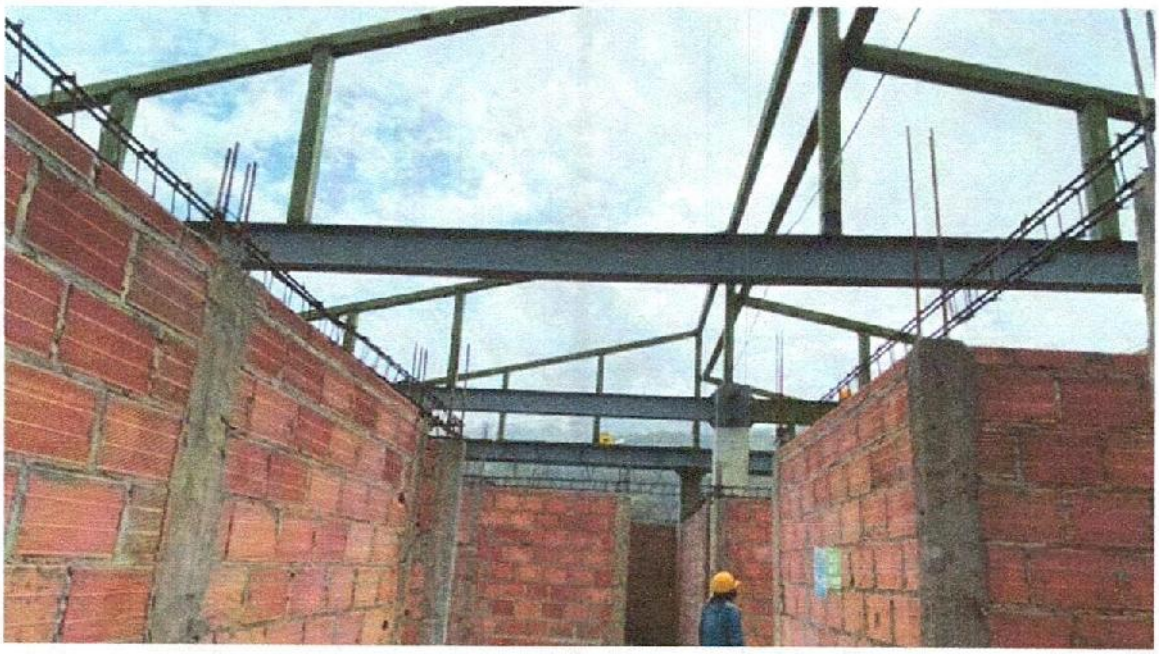


Ilustración 12 Instalación de cubierta módulo D

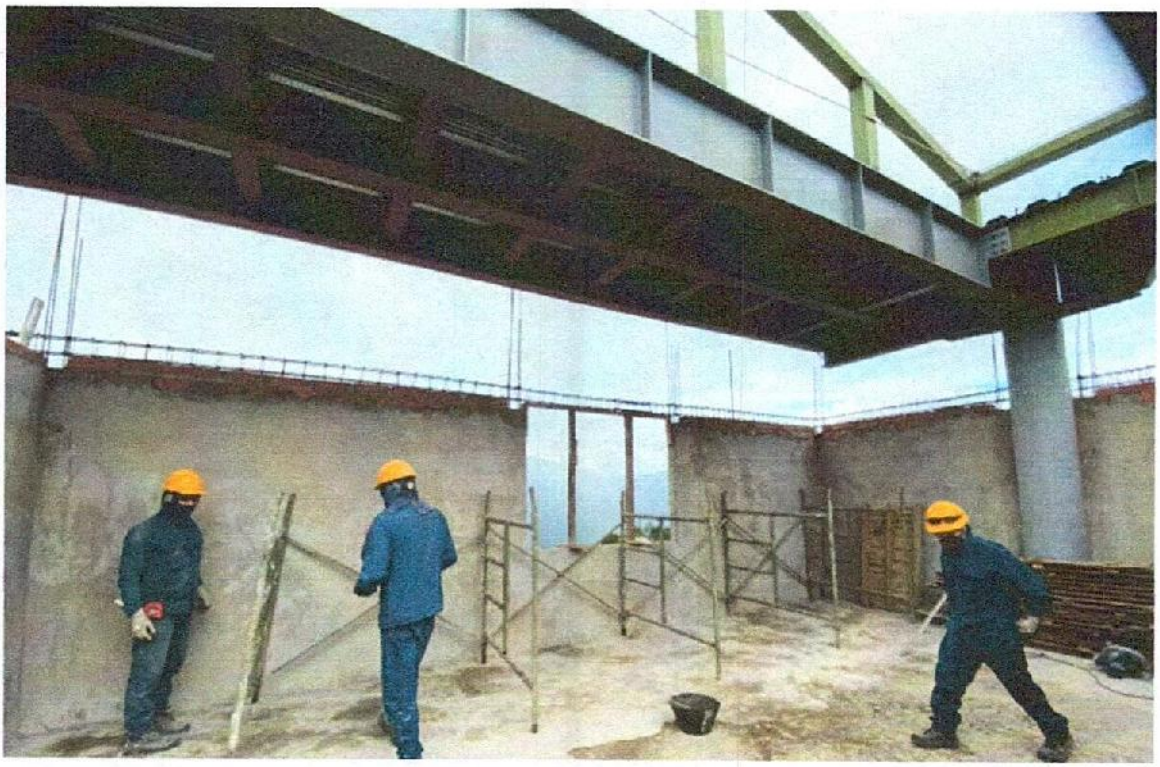


Ilustración 13 Instalación de placa metaldeck módulo D y pañete en muros de mampostería

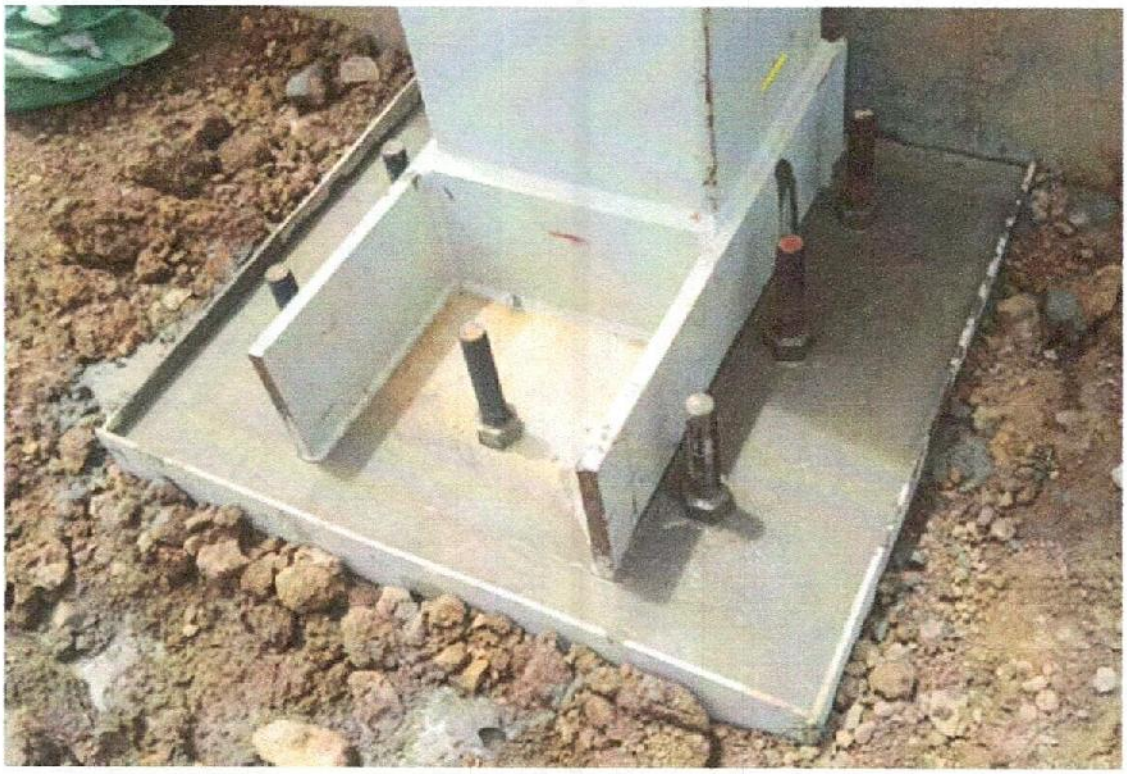


Ilustración 14 Autonivelante tipo grouting placa base modulo A



Ilustración 15 Aplicación de autonivelante en las placas bases modulo A



Ilustración 16 Montaje elementos metálicos modulo A

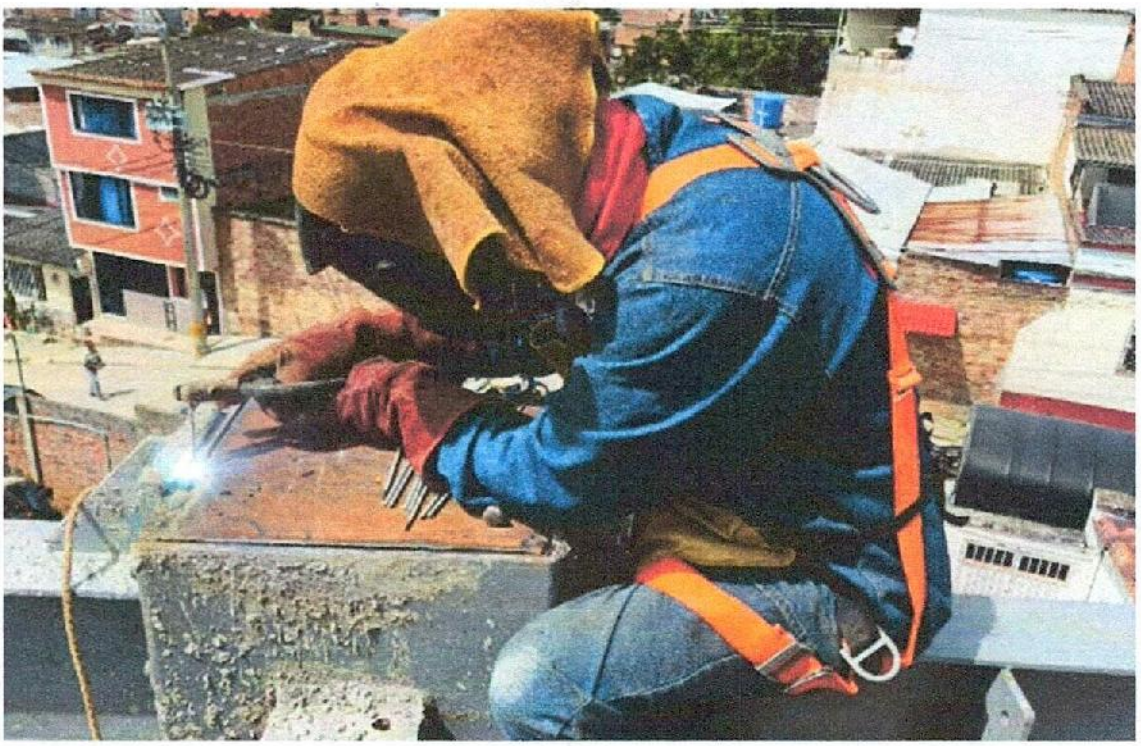


Ilustración 17 Platina de cierre columna módulo D



Ilustración 18 Instalación elementos estructurales modulo A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.

1.4 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales e intensas. Debido a esto se han presentado dificultades significativas para el desarrollo normal de las actividades programadas en el proyecto. Las condiciones climáticas adversas han generado retrasos, complicaciones logísticas y limitaciones en el acceso y operación en las áreas de intervención.

A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de junio.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MAYO - JUNIO)																														
Clase de tiempo	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Seco	24	20	24	17	19	24	24	24	24	24	24	24		24						24	12	24	24	20	16	22	18	18	15	24	24
Lluvia moderada		4		7	5			-					17		19	17	24	19	17		12			4	8	2	2		9		
Lluvia intensa													7		5	7		5	7								4	6			
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24



Ilustración 19 Lluvia constante sobre el mes de junio



Ilustración 20 Lluvias durante el mes de junio

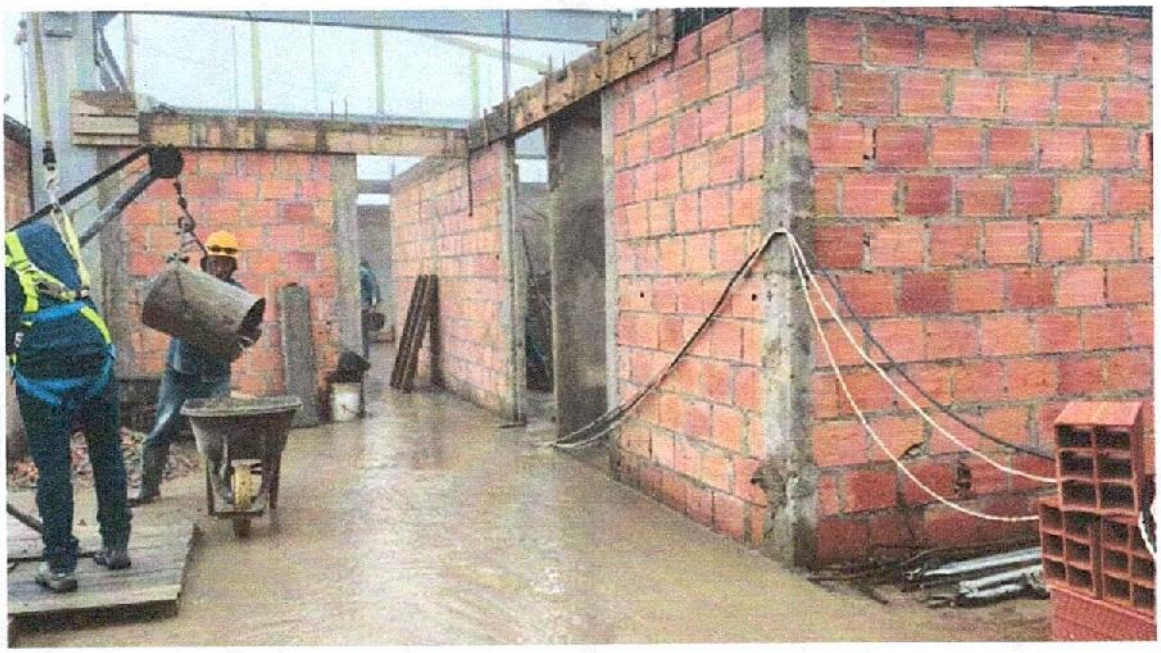


Ilustración 21 Lluvias durante el mes de junio

PRESUPUESTO DE OBRA

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE JUNIO DE 2025


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
PRESUPUESTO DE OBRA					JUNIO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**			**$ 792,132,503.09**		**$ 2,433,518.06**
1.08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABIQUE TOLETE COMÚN 10 - 15 CM, INCLUYE RETIRO	M2	$ 25,500.00	$ 75,735,000.00	27.75	$ 707,625.00
1.09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO	M2	$ 19,500.00	$ 23,400,000.00	27.30	$ 532,350.00
1.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	$ 52,348.38	$ 109,931,598.00	22.80	$ 1,193,543.06
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**			**$ 2,215,201,283.92**		**$ 85,839,546.21**
3.10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO	ML	$ 146,743.21	$ 220,114,815.00	462.93	$ 67,931,834.21
3.11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA	ML	$ 133,809.40	$ 374,666,320.00	133.83	$ 17,907,712.00
6.0	**MAMPOSTERÍA**			**$ 1,129,401,350.57**		**$ 23,916,125.26**
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 89,396.05	$ 844,792,672.50	267.53	$ 23,916,125.26
13.0	**PAÑETES**			**$ 932,022,578.57**		**$ 19,475,000.00**
13.04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	ML	$ 950,000.00	$ 31,825,000.00	20.50	$ 19,475,000.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ -**		**$ 594,944,204.03**
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	$ -	23099.09	$ 496,630,435.00
NP65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	$ 88,172.05	$ -	673.65	$ 59,397,101.48

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA						JUNIO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	$ -		164.53	$ 38,916,667.55
	VALOR COSTOS DIRECTOS			$	**39,566,165,363.82**		$ **726,608,393.56**
	ADMINISTRACIÓN		29%	$	11,474,187,955.51		$ 210,716,434.13
	IMPREVISTOS		1%	$	395,661,653.64		$ 7,266,083.94
	UTILIDAD		5%	$	1,978,308,268.19		$ 36,330,419.68
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			$	13,848,157,877.34		$ 254,312,937.75
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN			$	**53,414,323,241.16**		$ **980,921,331.31**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS			$	**7,297,487,951.66**		$ -
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29	$	2,116,271,505.58		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS			$	**9,413,759,457.24**		$ -
	DIFERENCIA POR AJUSTE						
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS			$	**62,828,082,698.40**		$ **980,921,331.31**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023			$	**1,200,000,000.00**		
	ADICIONAL No 01			$	**665,389,158.15**		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087			$	**64,693,471,857.36**		$ **980,921,331.31**
	% EJECUTADO MENSUAL						**1.52%**
	% EJECUTADO ACUMULADO						**39.23%**
	% PROGRAMADO ACUMULADO						**29.00%**


Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 25 junio de 2025.

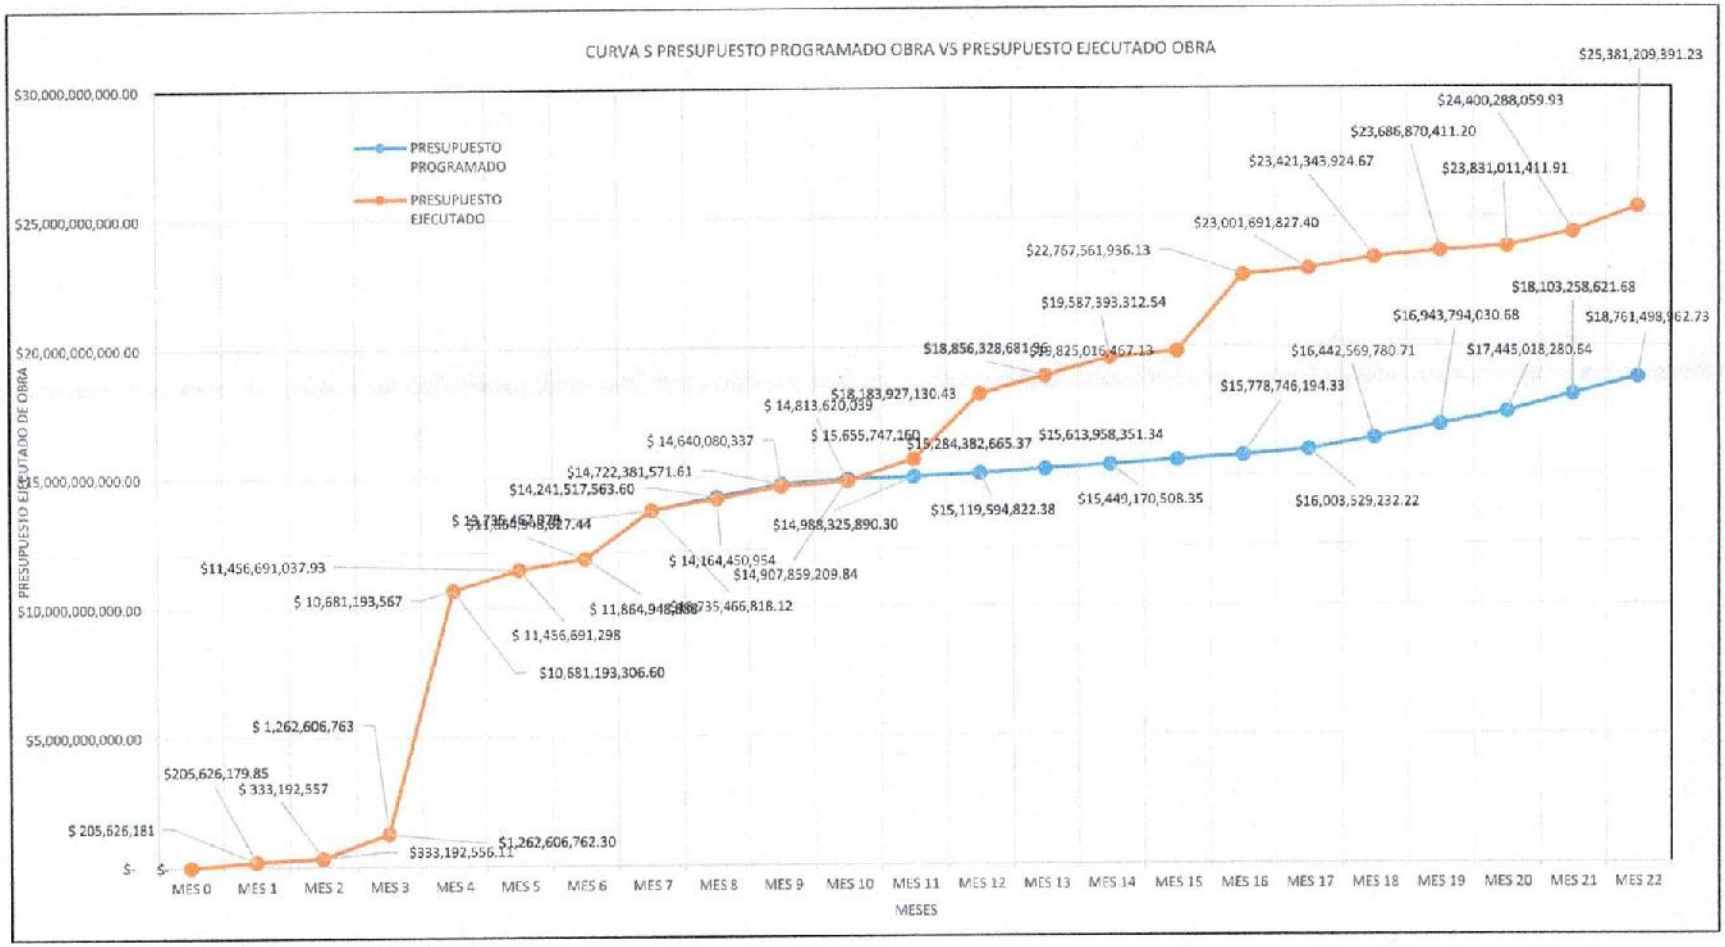

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 25 junio de 2025.

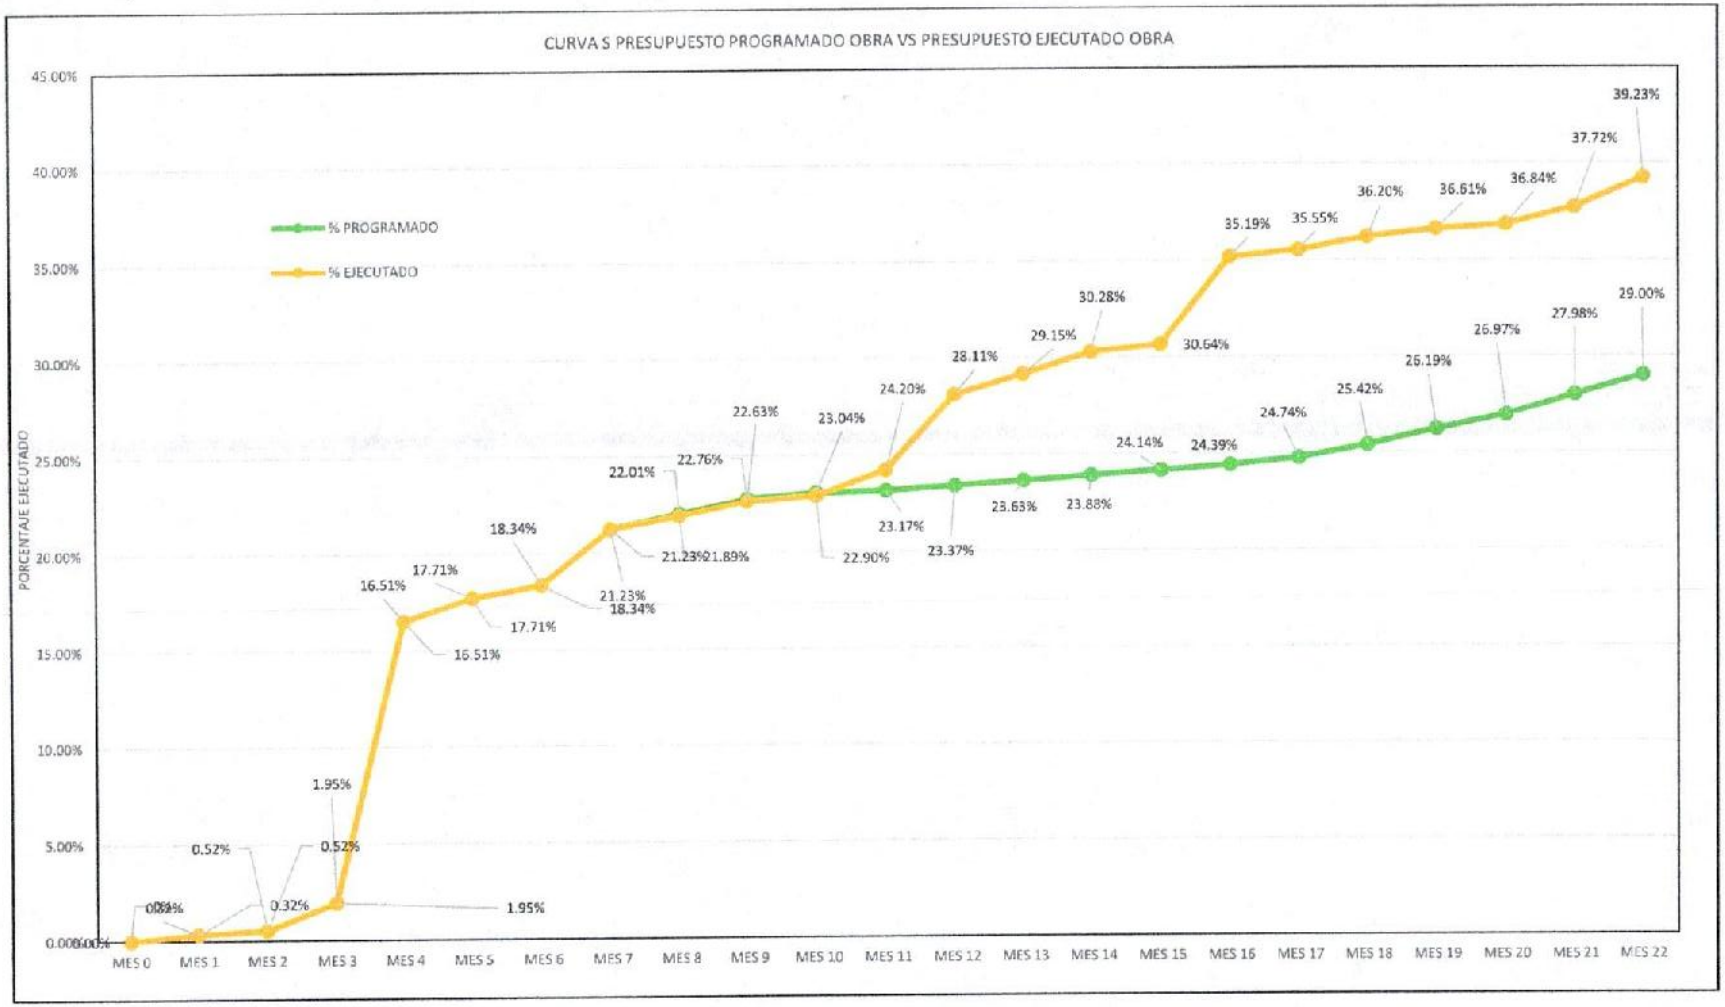

En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 29.00% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 39.23% acumulado, presentando 10.23% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está brindando capacitación continua al personal operativo que ejecuta labores de alto riesgo como el izaje y trabajo en caliente de la estructura metálica del módulo D.

- Durante el periodo evaluado, la ejecución de la obra ha avanzado de manera sostenida y conforme al cronograma establecido, avanzando los objetivos programados para el mes. Las actividades desarrolladas entre ellas la mampostería, armado de columnetas y viguetas, el montaje de elementos estructurales y montaje de cubierta se llevaron a cabo en cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto y bajos los lineamientos de sus respectivos diseños.

- Las constantes lluvias durante el mes de junio han afectado las actividades de montaje de elementos metálicos en los módulos, teniendo en cuenta se hace difícil realizar maniobras en alturas con estas condiciones.


- El proyecto se encuentra en una fase obra gris, con avances significativos en la estructura, mampostería y cubierta. A pesar de algunos contratiempos menores, como el clima y demora en la llegada de materiales por falta de la vía principal a la ciudad de Bucaramanga, el proceso de avance es positivo y se espera que las actividades planificadas se completen dentro de los tiempos establecidos.

- El porcentaje de ejecución programado en el mes de junio es de 29.00% esto equivale presupuestalmente a $ 18,761,498,962.72; en este informe el porcentaje ejecutado es de 39.23% que equivale a $ $ 25,381,209,391.23; por lo tanto, en relación a lo anterior el Consorcio de García Rovira se encuentra presentando 10.23% por encima de lo programado acumulado.

- Durante el presente mes se ha aumentado el personal operativo logrando abrir nuevas áreas de intervención y así mejorando el rendimiento de

ejecución de actividades. Esto con el fin de mejorar el porcentaje de avance mensual de obra en comparación con el porcentaje mensual programado el cual se encuentra en 1.02% y lo ejecutado durante este periodo es de 1.52%.

- Se recomienda mantener el ritmo de ejecución actual, fortalecer el control de calidad en procesos críticos como el montaje de la estructura metálica; y asegurar la disponibilidad de materiales e insumos para las próximas fases constructivas. Con base en lo anterior, se considera que la obra se encuentra en una etapa de desarrollo técnicamente satisfactoria y dentro de los parámetros previstos.



CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA					JUNIO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**			**$ 792,132,503.09**		**$ 2,433,518.06**
1.08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABIQUE TOLETE COMÚN 10 - 15 CM, INCLUYE RETIRO	M2	$ 25,500.00	$ 75,735,000.00	27.75	$ 707,625.00
1.09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO	M2	$ 19,500.00	$ 23,400,000.00	27.30	$ 532,350.00
1.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	$ 52,348.38	$ 109,931,596.00	22.80	$ 1,193,543.06
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**			**$ 2,215,201,283.92**		**$ 85,839,546.21**
3.10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO	ML	$ 146,743.21	$ 220,114,815.00	462.93	$ 67,931,834.21
3.11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA	ML	$ 133,809.40	$ 374,666,320.00	133.83	$ 17,907,712.00
6.0	**MAMPOSTERÍA**			**$ 1,129,401,350.57**		**$ 23,916,125.26**
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 89,396.05	$ 844,792,672.50	267.53	$ 23,916,125.26
13.0	**PAÑETES**			**$ 932,022,578.57**		**$ 19,475,000.00**
13.04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	ML	$ 950,000.00	$ 31,825,000.00	20.50	$ 19,475,000.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ -**		**$ 594,944,204.03**
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	$ -	23099.09	$ 496,630,435.00
NP65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	$ 88,172.05	$ -	673.65	$ 59,397,101.48
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	$ -	164.53	$ 38,916,667.55
	VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 39,566,165,363.82**		**$ 726,608,393.56**
	ADMINISTRACIÓN		29%	$ 11,474,187,955.51		$ 210,716,434.13
	IMPREVISTOS		1%	$ 395,661,653.64		$ 7,266,083.94
	UTILIDAD		5%	$ 1,978,308,268.19		$ 36,330,419.68
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			$ 13,848,157,877.34		$ 254,312,937.75
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN			**$ 53,414,323,241.16**		**$ 980,921,331.31**
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS			**$ 7,297,487,951.66**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29	$ 2,116,271,505.58		$ -
	VALOR TOTAL EQUIPOS			**$ 9,413,759,457.24**		**$ -**
	DIFERENCIA POR AJUSTE					
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS			**$ 62,828,082,698.40**		**$ 980,921,331.31**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023			**$ 1,200,000,000.00**		
	ADICIONAL No 01			**$ 665,389,158.15**		
	VALOR TOTAL CONTRATO 087			**$ 64,693,471,857.36**		**$ 980,921,331.31**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
1,08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICON TOLETE COMUN 10 - 15CM, INCLUYE RETIRO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	M2
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cant	TOTAL	195,26
CENTRAL DE GASES MEDICINALES						
FACHADA PRINCIPAL	2,80	3,05		1		8,54
FACHADA LATERAL	3,50	3,05		1		10,68
MURO DIVISORIO	2,80	3,05		1		8,54


ACUMULADO	195,26
ACTA MODIFICATORIA 4	1001,77
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	806,51
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No3	38,30
COBRADAS PARCIAL No 4	131,21
CANTIDADES PRESENTE ACTA	27,75

OBSERVACIONES:



UBICACIÓN PLANO



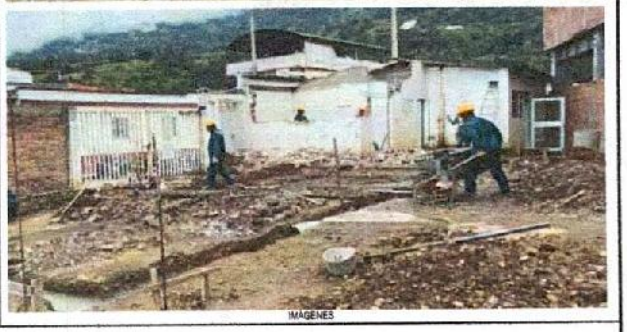

IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7762

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
1,09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO

UNIDAD	M2
TOTAL	508,39

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)		
CENTRAL DE GASES MEDICINALES						
CUBIERTA CENTRAL DE RESIDUOS EXISITENTE	6,50	4,20		27,30		27,30

ACUMULADO	508,39
ACTA MODIFICATORIA 3	1042,29
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	533,90
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	376,48
COBRADAS PARCIAL No 4	104,61
COBRADAS PARCIAL No 2	376,48
CANTIDADES PRESENTE INFORME	27,30





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
1,11	DEMOLICION DE PLACA DE PISO					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	542,40
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area		Elementos	SUBTOTAL
CENTRAL DE RESIDUOS							
PLACA DE PISO	6,00	3,80		22,80			22,80
				0,00			0,00
						ACUMULADO	542,40
						ACTA MODIFICATORIA 4	905,44
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	363,04
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	7,81
						COBRADAS PARCIAL No3	340,21
						COBRADAS PARCIAL No 4	72,21
						COBRADAS PARCIAL No 5	99,37
						CANTIDADES PRESENTE ACTA	22,80
OBSERVACIONES:							



ALEXIS ROMERO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
3,10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO				UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	611,20
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
PISO 1						
COL1		2,52				2,52
COL2		2,52				2,52
COL3		2,52				2,52
COL4		2,52				2,52
COL5		2,52				2,52
COL6		2,52				2,52
COL7		2,52				2,52
COL8		2,52				2,52
COL9		2,52				2,52
COL10		1,35				1,35
COL12		1,35				1,35
COL13		1,35				1,35
COL14		1,35				1,35
COL15		2,52				2,52
COL16		2,52				2,52
COL17		2,52				2,52
COL18		1,35				1,35
COL20		2,52				2,52
COL21		2,52				2,52
COL22		1,35				1,35
COL23		1,35				1,35
COL24		1,35				1,35
COL25		1,35				1,35
COL26		1,35				1,35
COL27		2,52				2,52
COL28		1,35				1,35
COL29		2,52				2,52
COL30		1,35				1,35
COL31		1,35				1,35
COL32		2,52				2,52
COL33		2,52				2,52
COL34		2,52				2,52
COL35		1,35				1,35
COL36		1,35				1,35
COL37		2,52				2,52
COL38		1,35				1,35
COL39		1,35				1,35
COL40		2,52				2,52
COL41		2,55				2,55
COL42		2,52				2,52
COL43		1,35				1,35
COL44		1,35				1,35
COL45		1,35				1,35
COL46		1,35				1,35
COL47		1,35				1,35
COL48		2,52				2,52
COL49		2,52				2,52
COL50		1,35				1,35
COL51		1,35				1,35
COL52		1,35				1,35
COL53		1,35				1,35
COL54		1,35				1,35
COL55		1,35				1,35
COL56		2,52				2,52
COL57		1,35				1,35
COL58		1,35				1,35
COL59		1,35				1,35
COL60		1,35				1,35
COL61		1,35				1,35


COL62		1,35				1,35
COL63		1,35				1,35
COL64		1,35				1,35
COL65		1,35				1,35
COL66		1,35				1,35
COL67		2,52				2,52
COL68		2,52				2,52
COL69		2,05				2,05
COL70		2,52				2,52
COL71		1,35				1,35
COL72		1,35				1,35
COL73		2,52				2,52
COL74		1,35				1,35
COL75		1,35				1,35
COL76		1,35				1,35
COL77		1,35				1,35
COL78		1,35				1,35
COL79		1,35				1,35
COL80		0,00				0,00
COL81		0,00				0,00
COL82		0,00				0,00
COL83		1,35				1,35
COL84		1,35				1,35
COL85		0,00				0,00
COL86		2,52				2,52
COL88		1,35				1,35
COL89		2,52				2,52
COL90		2,52				2,52
COL91		2,52				2,52
COL92		2,52				2,52
COL93		2,52				2,52
COL94		2,52				2,52
COL95		2,52				2,52
COL96		2,52				2,52
COL97		2,52				2,52
COL98		1,35				1,35
COL99		0,00				0,00
COL100		0,00				0,00
COL101		2,52				2,52
COL102		2,52				2,52
PISO 2						0,00
COL1		2,55				2,55
COL2		2,55				2,55
COL3		2,55				2,55
COL4		2,55				2,55
COL5		1,05				1,05
COL6		2,55				2,55
COL7		2,55				2,55
COL8		2,55				2,55
COL9		2,55				2,55
COL10		2,55				2,55
COL11		2,55				2,55
COL12		1,33				1,33
COL13		2,55				2,55
COL14		2,55				2,55
COL15		2,55				2,55
COL16		2,55				2,55
COL17		2,55				2,55
COL18		1,05				1,05
COL19		2,55				2,55
COL20		2,55				2,55
COL21		2,55				2,55
COL22		2,55				2,55
COL23		2,55				2,55
COL24		0,00				0,00
COL25		0,00				0,00
COL26		0,00				0,00
COL27		2,55				2,55
COL28		2,55				2,55
COL29		2,55				2,55
COL30		2,55				2,55
COL31		2,55				2,55
COL32		2,55				2,55
COL33		2,55				2,55
COL34		2,55				2,55
COL35		2,55				2,55
COL36		2,55				2,55
COL37		2,55				2,55


COL38		2,55				2,55
COL39		2,55				2,55
COL40		2,55				2,55
COL41		2,55				2,55
COL42		2,55				2,55
COL43		1,05				1,05
COL44		2,55				2,55
COL45		2,55				2,55
COL46		2,55				2,55
COL47		2,55				2,55
COL48		2,55				2,55
COL49		2,55				2,55
COL50		2,55				2,55
COL51		2,55				2,55
COL52		2,55				2,55
COL53		2,55				2,55
COL54		2,55				2,55
COL55		2,55				2,55
COL56		2,55				2,55
COL57		2,55				2,55
COL58		2,55				2,55
COL59		2,55				2,55
COL60		2,55				2,55
COL61		2,55				2,55
COL62		2,55				2,55
COL63		2,55				2,55
COL64		2,55				2,55
COL65		2,55				2,55
COL66		2,55				2,55
COL67		2,55				2,55
COL68		2,55				2,55
COL69		2,55				2,55
COL70		2,55				2,55
COL71		2,55				2,55
COL72		2,55				2,55
COL73		2,55				2,55
COL74		2,55				2,55
COL75		2,55				2,55
COL76		2,55				2,55
COL77		2,55				2,55
COL78		2,55				2,55
COL79		2,55				2,55
COL80		2,55				2,55
COL81		2,55				2,55
COL82		2,55				2,55
COL83		2,55				2,55
COL84		2,55				2,55
COL85		2,55				2,55
COL86		2,55				2,55
COL87		2,55				2,55
COL88		2,55				2,55
COL89		2,55				2,55
COL90		2,55				2,55
COL91		2,55				2,55
COL92		2,55				2,55
COL93		2,55				2,55
COL94		2,55				2,55
COL95		2,55				2,55
COL96		2,55				2,55
COL97		2,55				2,55
COL98		2,55				2,55
COL99		2,55				2,55
COL100		2,53				2,53
COL101		2,55				2,55
COL102		2,55				2,55
COL103		2,55				2,55
COL104		2,55				2,55
COL105		2,55				2,55
COL106		2,55				2,55
COL107		2,55				2,55
COL108		2,55				2,55
COL109		2,55				2,55
COL110		2,55				2,55
COL111		2,55				2,55
COL112		2,55				2,55
COL113		2,55				2,55
COL114		2,55				2,55
COL116		2,55				2,55


COL117		2,55				2,55
COL118		2,55				2,55
COL119		2,55				2,55

	ACUMULADO	611,20
	ACTA MODIFICATORIA 3	700,05
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	88,85
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	1,38
	COBRADAS PARCIAL No 3	122,11
	COBRADAS PARCIAL No 4	24,78
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	462,93
OBSERVACIONES:		



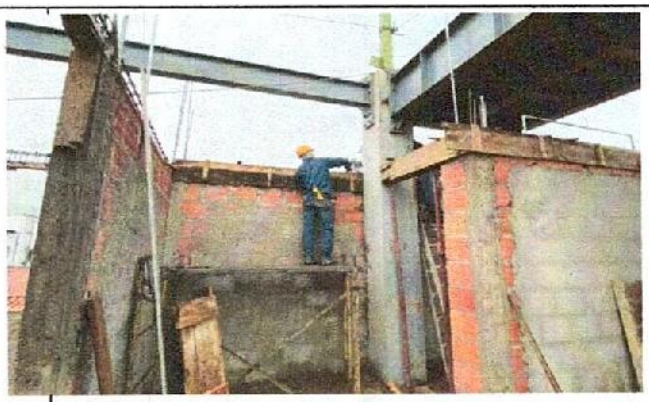

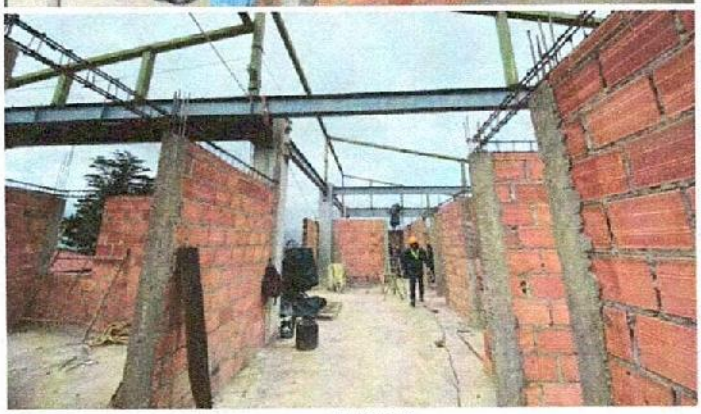

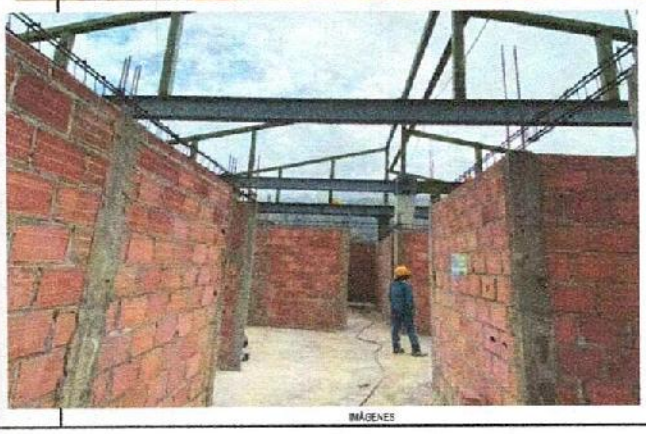

UBICACIÓN PLANO

IMÁGENES


ALEXIS ROMAN MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3,11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA					UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	428,73
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad		Elementos	SUBTOTAL
MODULO D							
VIGA DINTEL		133,83					133,83
							0,00
							0,00
	ACUMULADO						428,73
	ACTA MODIFICATORIA 3						800,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD						371,27
	COBRADAS PARCIAL No 1						
	COBRADAS PARCIAL No 2						5,87
	COBRADAS PARCIAL No 3						222,30
	COBRADAS PARCIAL No 4						66,73
	CANTIDADES PRESENTE ACTA						133,83
OBSERVACIONES:							

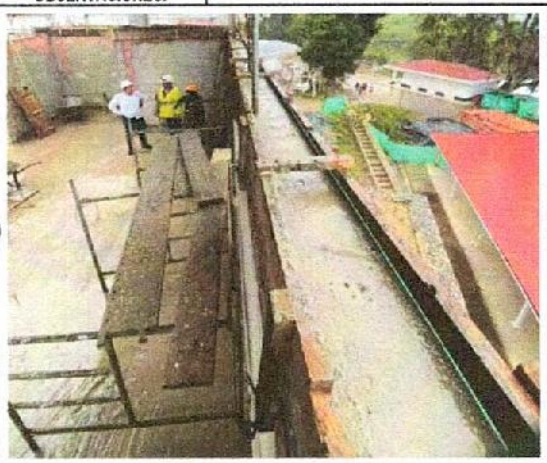



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
6,01	MURO EN BLOQUE NO 5				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	891,48
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
PISO 1						
M1		2,42	2,52	6,10		6,10
M2		2,00	2,52	5,04		5,04
M3		1,55	2,52	3,91		3,91
M4		4,62	2,52	11,64		11,64
M5		2,95	2,52	7,43		7,43
M6		3,17	2,52	7,99		7,99
M7		2,00	1,05	2,10		2,10
M8		2,78	2,52	7,01		7,01
M9		3,05	2,52	7,69		7,69
M10		3,08	2,52	7,76		7,76
M11		3,12	2,52	7,86		7,86
M12		1,55	2,52	3,91		3,91
M13		2,04	2,52	5,14		5,14
M14		0,83	2,52	2,09		2,09
M15		2,73	2,52	6,88		6,88
M16		3,92	2,52	9,88		9,88
M17		1,64	2,52	4,13		4,13
M18		1,16	2,52	2,92		2,92
M19		1,08	2,52	2,72		2,72
M20		2,78	2,52	7,01		7,01
M21		3,89	2,52	9,80		9,80
M52		2,45	2,52	6,17		6,17
M53		2,80	2,52	7,06		7,06
M54		2,50	2,52	6,30		6,30
M55		0,96	2,52	2,42		2,42
M56		0,95	2,52	2,39		2,39
M57		3,25	2,52	8,19		8,19
M58		2,75	2,52	6,93		6,93
M59		1,30	2,52	3,28		3,28
M60		4,43	2,52	11,16		11,16
M61		3,44	2,52	8,67		8,67
M62		2,00	2,52	5,04		5,04
M63		2,10	2,52	5,29		5,29
M64		1,96	2,52	4,94		4,94
M65		2,37	2,52	5,97		5,97
M66		1,83	2,52	4,61		4,61
M85		2,43	2,52	6,12		6,12
M98		1,32	2,52	3,33		3,33
M99		1,25	2,52	3,15		3,15
PISO 2						
M1		1,70	2,55	4,34		4,34
M2		2,20	2,55	5,61		5,61
M3		2,20	2,55	5,61		5,61
M4		1,00	2,55	2,55		2,55
M5		1,70	2,55	4,34		4,34
M6		4,20	2,55	10,71		10,71
M7		1,73	2,55	4,41		4,41
M8		1,59	2,55	4,05		4,05
M9		2,84	2,55	7,24		7,24
M10		1,92	2,55	4,90		4,90


M11		1,62	2,55	4,13		4,13
M12		1,72	2,55	4,39		4,39
M13		1,58	2,55	4,03		4,03
M14		2,25	2,55	5,74		5,74
M15		1,82	2,55	4,64		4,64
M16		1,96	2,55	5,00		5,00
M17		2,00	1,05	2,10		2,10
M18		2,40	2,55	6,12		6,12
M19		1,28	2,55	3,26		3,26
M20		1,80	1,05	1,89		1,89
M21		1,10	2,55	2,81		2,81
M23		2,56	2,55	6,53		6,53
M27		1,63	2,55	4,16		4,16
M28		1,28	2,55	3,26		3,26
M30		2,25	2,55	5,74		5,74
M32		1,00	2,55	2,55		2,55
M33		2,00	1,05	2,10		2,10
M34		1,76	2,55	4,49		4,49
M36		1,80	2,55	4,59		4,59
M37		2,18	2,55	5,56		5,56
M38		2,70	2,55	6,89		6,89
M39		1,80	1,05	1,89		1,89
M40		3,30	2,55	8,42		8,42
M42		1,90	2,55	4,85		4,85
M43		2,00	2,55	5,10		5,10
M44		2,75	2,55	7,01		7,01
M46		2,00	1,05	2,10		2,10
M47		1,90	2,55	4,85		4,85
M48		2,50	2,55	6,38		6,38
M49		1,40	1,05	1,47		1,47
M120		1,05	2,55	2,68		2,68
M121		1,05	2,55	2,68		2,68
M50		1,81	2,55	4,62		4,62
M51		2,05	2,55	5,23		5,23
M52		2,12	2,55	5,41		5,41
M53		1,80	2,55	4,59		4,59
M54		1,77	2,55	4,51		4,51
M55		0,75	2,55	1,91		1,91
M56		1,65	2,55	4,21		4,21
M57		1,15	2,55	2,93		2,93
M58		1,15	2,55	2,93		2,93
M59		0,80	2,55	2,04		2,04

	ACUMULADO	891,48
	ACTA MODIFICATORIA 4	3016,79
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2125,31
	COBRADAS PARCIAL No 1	
	COBRADAS PARCIAL No 2	385,90
	COBRADAS PARCIAL No 3	
	COBRADAS PARCIAL No 4	
	COBRADAS PARCIAL No 5	46,05
	EJECUTADO MES DE MAYO	192,00
	CANTIDADES PRESENTE ACTA	267,53

7771

OBSERVACIONES:	



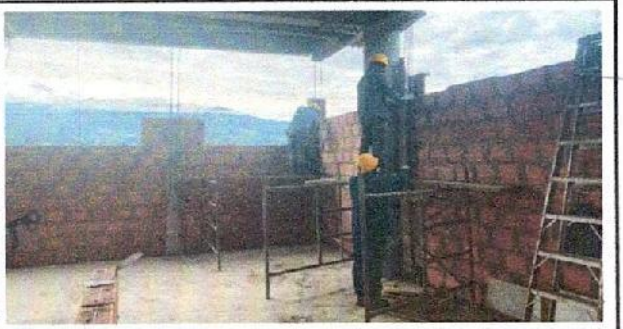



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7772

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
13,04	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE RETIRO					UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	479,88
		Ancho	Largo (M)	Alto	Elementos	Caras	SUBTOTAL
CENTAL DE GASES MEDICINALES							
VIGAS			10,90				10,90
COLUMNAS			2,40		4		9,60
						ACUMULADO	479,88
						ACTA MODIFICATORIA 4	572,75
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	92,87
						COBRADAS PARCIAL No 1	
						COBRADAS PARCIAL No 2	
						COBRADAS PARCIAL No3	89,50
						COBRADAS PARCIAL No 4	126,90
						COBRADAS PARCIAL No 5	219,95
						EJECUTADAS EN MARZO	23,03
						CANTDADES PRESENTE ACTA	20,50
OBSERVACIONES							





ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36

UNIDAD	M3
TOTAL	23099,09


LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					
		Area acero exterior	Kg/m2	Kg interno		Elementos	SUBTOTAL
	MODULO D						
O1-6'	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
P1-6"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
P1-7"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
O1-7"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
O1-4"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
P1-4"	COLUMNA CIRCULAR RADIO 0.25		1376,58	136,58			1513,16
O1-8"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
P1-8"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
O1-9"1"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
P1-9"1"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
O1-10"1"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
P1-10"1"	COLUMNA 500X500	17,18	99,70	59,40			1772,01
		Longitud	Kg/ml				
Ñ-7	HEA240	8,681	60,3				523,46
Ñ-8"	HEA240	8,681	60,3				523,46
Ñ-9"1"	HEA240	8,681	60,3				523,46
Ñ-10"1"	HEA240	8,681	60,3				523,46

ACUMULADO	23099,09
ACTA MODIFICATORIA 4	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
COBRADAS PARCIAL No 1	
COBRADAS PARCIAL No 2	
COBRADAS PARCIAL No 3	
COBRADAS PARCIAL No 4	
COBRADAS PARCIAL No 5	
EJECUTADOS ENERO	
EJECUTADA MES DE FEBRERO	
CANTDADES PRESENTE ACTA	23099,09

7774



UBICACIÓN PLANO

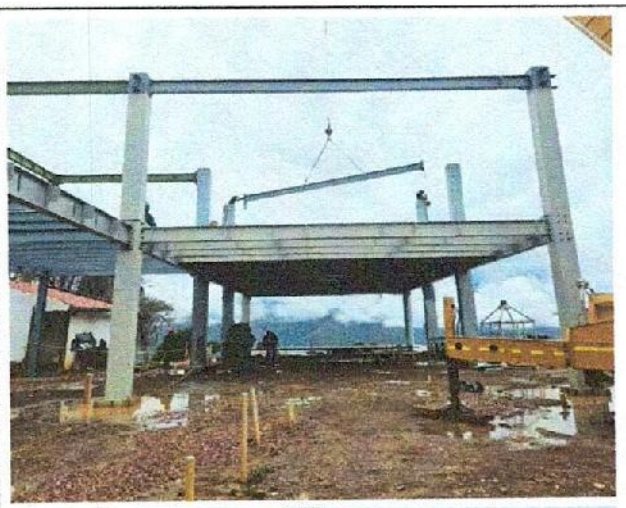



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP65	MURO EN BLOQUE No 4


					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	1031,97
	Ancho	Largo (M)	Alto	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
PISO 1						
M22		4,65	2,52			11,72
M23		1,04	2,52			2,62
M24		2,6	2,52			6,55
M25		1,4	2,52			3,53
M26		2,73	2,52			6,88
M27		1,55	2,52			3,91
M28		1,72	2,52			4,33
M29		1,6	2,52			4,03
M30		0,98	2,52			2,47
M31		1,6	2,52			4,03
M32		1,11	2,52			2,80
M33		3,1	2,52			7,81
M34		3,7	2,52			9,32
M35		0,97	2,52			2,44
M36		1,96	2,52			4,94
M37		2,05	2,52			5,17
M38		1,87	2,52			4,71
M39		1,67	2,52			4,21
M40		2	2,52			5,04
M41		0,85	2,52			2,14
M42		3,17	2,52			7,99
M43		3,17	2,52			7,99
M44		1,1	1,35			1,49
M45		1,75	1,35			2,36
M46		4,1	2,52			10,33
M47		1,75	1,35			2,36
M48		4,1	2,52			10,33
M49		1,7	1,35			2,30
M50		2,5	2,52			6,30
M51		3,56	2,52			8,97
M67		1,54	1,35			2,08
M68		2,42	1,35			3,27
M69		2,87	1,35			3,87
M70		2,78	1,35			3,75
M71		2,52	1,35			3,40
M72		1,25	1,35			1,69
M73		1,3	1,35			1,76
M74		2,28	1,35			3,08
M75		2,78	1,35			3,75
M76		4,75	2,52			11,97
M78		4,75	2,52			11,97
M79		1,9	1,35			2,57
M80		2,32	1,35			3,13
M81		2,21	1,35			2,98
M82		3,2	1,35			4,32
M83		1,91	1,35			2,58
M84		2,36	1,35			3,19

M86		1,1	1,35			1,49
M87		2,2	1,35			2,97
M88		3,2	1,35			4,32
M89		3,2	1,35			4,32
M90		3,2	1,35			4,32
M91		1,23	1,35			1,66
M92		3,2	1,35			4,32
M93		1,29	1,35			1,74
M94		3,2	1,35			4,32
M95		1,29	1,35			1,74
M96		0,98	1,35			1,32
M97		3,2	1,35			4,32
M100		1,5	2,52			3,78
M101		1,07	2,52			2,70
M102		1,65	2,52			4,16
M103		1,4	2,52			3,53
M104		0,96	2,52			2,42
M105		0,14	2,52			0,35
M106		1,53	2,52			3,86
M107		0,97	2,52			2,44
M108		1,51	2,52			3,81
M109		3,26	2,52			8,22
M110		1,25	2,52			3,15
M111		1,25	2,52			3,15
M112		0,74	2,52			1,86
M113		0,92	2,52			2,32
M114		4,75	1,35			6,41
M115		4,75	1,35			6,41
M116		3,02	1,35			4,08
M117		1,4	1,35			1,89
PISO 2						
M22		1,67	2,55			4,26
M24		3,35	2,55			8,54
M25		1,70	2,55			4,34
M26		0,40	2,55			1,02
M29		3,20	2,55			8,16
M31		1,70	2,55			4,34
M35		2,64	2,55			6,73
M41		2,50	2,55			6,38
M45		2,55	2,55			6,50
M60		1,47	2,55			3,75
M61		2,00	2,55			5,10
M62		2,85	2,55			7,27
M63		1,82	2,55			4,64
M64		1,34	2,55			3,42
M65		1,73	2,55			4,41
M66		0,30	2,55			0,77
M67		0,95	2,55			2,42
M68		3,24	2,55			8,26
M69		0,18	2,55			0,46
M70		2,52	2,55			6,43
M71		1,84	2,55			4,69
M72		2,47	2,55			6,30
M73		2,34	2,55			5,97
M74		1,37	2,55			3,49
M75		1,20	2,55			3,06
M76		3,80	2,55			9,69
M77		1,86	2,55			4,74
M78		2,93	2,55			7,47
M79		1,95	2,55			4,97
M80		0,64	2,55			1,63
M81		2,23	2,55			5,69
M82		2,45	2,55			6,25

7777

M83		2,20	2,55			5,61
M84		1,90	2,55			4,85
M85		1,75	2,55			4,46
M86		1,42	2,55			3,62
M87		3,28	2,55			8,36
M88		3,40	1,33			4,52
M89		0,55	2,55			1,40
M90		3,55	2,55			9,05
M91		1,75	2,55			4,46
M92		1,66	2,55			4,23
M93		2,10	2,55			5,36
M94		3,15	2,55			8,03
M95		3,20	2,55			8,16
M96		1,80	2,55			4,59
M97		3,10	2,55			7,91
M98		2,95	2,55			7,52
M99		2,82	2,55			7,19
M100		0,30	2,55			0,77
M101		2,55	2,55			6,50
M102		1,80	2,55			4,59
M103		2,33	2,55			5,94
M104		2,73	2,55			6,96
M105		2,75	2,55			7,01
M106		1,90	2,55			4,85
M107		0,83	2,55			2,12
M108		1,30	2,55			3,32
M109		2,30	2,55			5,87
M110		1,33	2,55			3,39
M111		1,74	2,55			4,44
M112		2,10	2,55			5,36
M113		1,93	2,55			4,92
M114		1,07	2,55			2,73
M115		2,40	2,53			6,07
M116		1,58	2,55			4,03
M117		1,58	2,55			4,03
M118		0,20	2,55			0,51
					ACUMULADO	1031,97
					ACTA MODIFICATORIA 4	649,46
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	346,76
					COBRADAS PARCIAL No 5	11,56
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	673,65

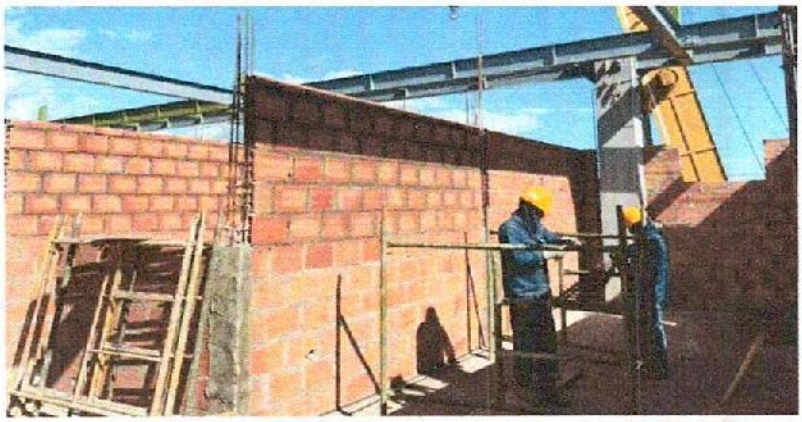


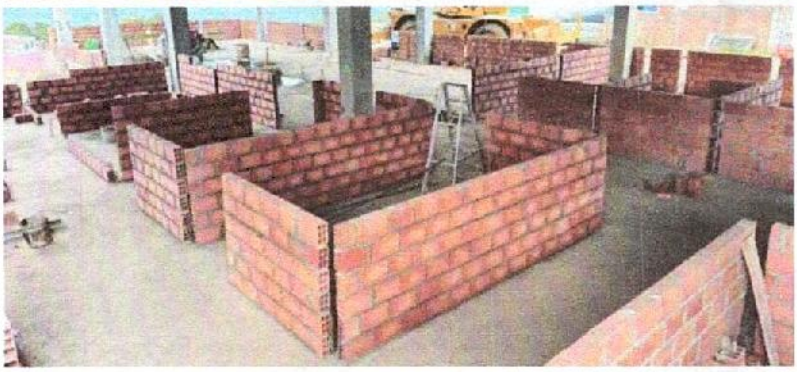



UBICACIÓN PLANO



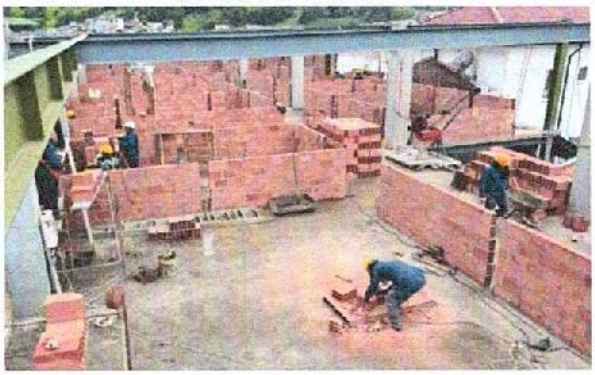

IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

7779

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO / ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	851,36
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
SEGUNDA PLANTA				570,55		570,55
TERCERA PLANTA				161,883		161,98
DESCUENTO AREA COLUMNAS 0.45X0.45	0,45	0,45			-11	-2,23
DESCUENTO AREA COLUMNA CIRCULAR					-1	-0,20
DESCUENTO AREA COLUMNA HEB	0,24	0,23			-4	-0,22
					ACUMULADO	851,36
					ACTA MODIFICATORIA 4	3169,96
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	2892,21
					COBRADAS PARCIAL No 1	
					COBRADAS PARCIAL No 2	
					COBRADAS PARCIAL No 3	
					COBRADAS PARCIAL No 4	
					COBRADAS PARCIAL No 5	121,58
					EJECUTADO MES DE ABRIL	156,17
					EJECUTADO MES DE MAYO	409,08
					CANTIDADES PRESENTE ACTA	164,53

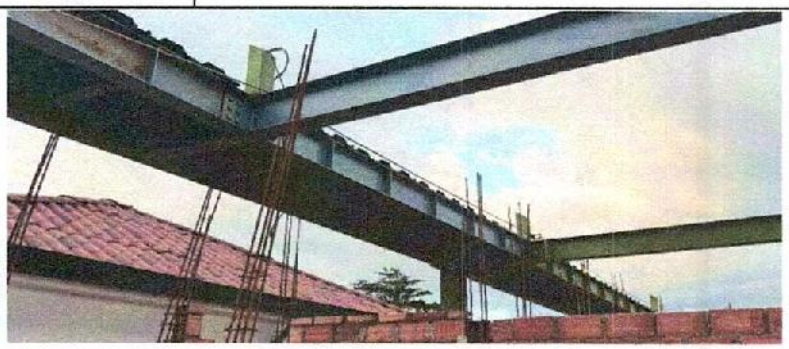





UBICACIÓN PLANO

ALEXIS RONCON MUNOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1601538723	9488310392	E	2025/07/02	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$38,307,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (63 Afiliados)																							$122,740,341	$19,811,500			$124,579,941	$4,985,800			$122,776,841	$4,913,600			$124,579,941		$8,548,000			$0	$0		$38,258,900
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (63 Afiliados)																							$122,740,341	$19,811,500			$124,579,941	$4,985,800			$122,776,841	$4,913,600			$124,579,941		$8,548,000			$0	$0		$38,258,900
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (63 Afiliados)																							$122,740,341	$19,811,500			$124,579,941	$4,985,800			$122,776,841	$4,913,600			$124,579,941		$8,548,000			$0	$0		$38,258,900
1	CC	1095816853	ANAYA RODRIGUEZ ERVIN GIOVANNY																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	13929589	BARAJAS HERNANDEZ JOSE EULISES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	13929932	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	13906579	BASTO SANCHEZ CARLOS JULIO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
5	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
6	CC	1096956290	BLANCO BLANCO DIEGO ALEXANDER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																		23020 1	30	$10,520,000	$1,788,400	EPS002	30	$10,520,000	$420,800	CCF39	30	$10,520,000	$420,800	14-25	30	$10,520,000	6.960%	$732,200	30	$0	$0	SI	$3,362,200
8	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	13925004	CASTRO PARRA ROBERTO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO												X						23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$284,800
11	CC	5613736	CONDE OJEDA RAUL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	1096960660	CORREA MOGOLLON GERZON ARTURO																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
13	CC	1098680172	CORREA MOGOLLON WERNER ALDAY		X								X								23030 1	15	$1,039,774	$166,400	EPS037	15	$1,039,774	$41,600	CCF39	15	$1,039,774	$41,600	14-25	15	$1,039,774	6.960%	$72,400	15	$0	$0	SI	$322,000
14	CC	1127592492	DELGADO CASTELLANOS SERGIO ANDRES																		23030 1	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
15	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	13927880	ESPINEL IBAÑEZ CARLOS JULIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	13928984	ESPINEL IBAÑEZ JAIME																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	13930526	FAJARDO MURILLO JAVIER																		25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
19	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
20	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO																		25-14	30	$2,207,520	$353,300	EPS037	30	$2,207,520	$88,400	CCF39	30	$2,207,520	$88,400	14-25	30	$2,207,520	6.960%	$153,700	30	$0	$0	SI	$683,800
21	CC	13926575	GOMEZ CALDERON WILMER																		25-14	30	$2,945,600	$471,300	EPS037	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
22	CC	91275443	GONZALEZ GRANADOS CHRISTIAN EDUARDO																		23030 1	30	$6,476,259	$1,101,100	EPS017	30	$6,476,259	$259,100	CCF39	30	$6,476,259	$259,100	14-25	30	$6,476,259	6.960%	$450,800	30	$0	$0	SI	$2,070,100
23	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO																		25-14	30	$5,509,146	$881,500	EPS037	30	$5,509,146	$220,400	CCF39	30	$5,509,146	$220,400	14-25	30	$5,509,146	6.960%	$383,500	30	$0	$0	SI	$1,705,800
24	CC	91218910	GOYENECHE ROJAS ULICER																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$275,300

2025/07/04 07:55 AM

25	CC	1098644710	GUERRERO GARCIA JUAN NORBEY																					25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
26	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
27	PT	2356593	GUERRERO JACOME MIGUEL ALFREDO																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
28	CC	13976475	GUTIERREZ GUTIERREZ EDUAR ENRIQUE	X																				230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
29	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																					25-14	30	$2,334,789	$373,600	EPS010	30	$2,334,789	$93,400	CCF39	30	$2,334,789	$93,400	14-25	30	$2,334,789	6.960%	$162,600	30	$0	$0	SI	$723,000
30	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																					230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
31	CC	1098150989	HUERTAS TARAZONA JUAN ANTONIO																					230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
32	CC	1100504012	JAIMES ORTIZ PABLO ANTONIO																					230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
33	CC	1095302101	LIZARAZO SANABRIA EDGAR ALFONSO																					230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
34	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																					231001	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
35	CC	5609784	LOZANO DUARTE RICARDO																					25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
36	PT	6197969	MEDINA GOMEZ BEIBI ALEXANDER																					25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
37	CC	1096957709	MENDOZA CARRILLO FARID JHOAN CAMILO																					230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
38	PT	5393250	MONTOYA CHACON GARDELINO DANTES																					230201	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
39	CC	13929148	MORENO CACERES CESAR LEANDRO																					25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
40	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS																					230301	30	$3,310,914	$529,800	EPS037	30	$3,310,914	$132,500	CCF39	30	$3,310,914	$132,500	14-25	30	$3,310,914	6.960%	$230,500	30	$0	$0	SI	$1,075,300
41	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER													X								25-14	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF39	0	$0	$0	14-25	8	$379,600	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$76,000
42	CC	79787862	ORJUELA ESTEPA VICTOR DAWER																					25-14	22	$1,349,040	$215,900	EPS002	22	$1,349,040	$54,000	CCF39	22	$1,349,040	$54,000	14-25	22	$1,349,040	6.960%	$93,900	22	$0	$0	SI	$417,800
43	CC	1044605940	ORTIZ ORTIZ JULIO ENRIQUE																					230201	30	$1,839,600	$294,400	EPS002	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
44	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO																					230301	30	$2,945,600	$471,300	EPS002	30	$2,945,600	$117,900	CCF39	30	$2,945,600	$117,900	14-25	30	$2,945,600	6.960%	$205,100	30	$0	$0	SI	$912,200
45	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO	X																				230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
46	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID																					230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
47	CC	1096954148	PINZON ORTIZ LUIS EUSEBIO																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
48	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
49	CC	1127914204	RAVELO RODRIGUEZ DOMINGO																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
50	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YESID								X													25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
51	CC	1096957820	RODRIGUEZ RANGEL DANDY SHIRLEY																					230301	30	$3,324,479	$532,000	EPS002	30	$3,324,479	$133,000	CCF39	30	$3,324,479	$133,000	14-25	30	$3,324,479	6.960%	$231,400	30	$0	$0	SI	$1,079,400
52	CC	1093885835	RODRIGUEZ ALVARADO LUIS CARLOS		X																			230301	20	$949,000	$151,900	ESSC74	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-25	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
53	CC	13928428	RODRIGUEZ AVILA LUIS FRANCISCO	X																				230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
54	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
55	CC	13927795	RODRIGUEZ JAIMES PEDRO VICENTE	X																				231001	28	$1,716,960	$274,800	EPS002	28	$1,716,960	$68,700	CCF39	28	$1,716,960	$68,700	14-25	28	$1,716,960	6.960%	$119,600	28	$0	$0	SI	$531,800
56	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO																					25-14	30	$1,839,600	$294,400	EPS037	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
57	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL																					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
58	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY								X													230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS005	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700

3781

aportes en línea

Planilla Resumen

59	CC	13852880	SILVA REYES ALEXIS ANTONIO	X																	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
60	CC	13926847	SUAREZ DIAZ LUIS EDGAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
61	CC	1099894523	TARAZONA RANGEL FERMIN ALONSO	X																	230301	28	$1,716,960	$274,800	EPS005	28	$1,716,960	$68,700	CCF39	28	$1,716,960	$68,700	14-25	28	$1,716,960	6.960%	$119,600	28	$0	$0	SI	$531,800
62	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
63	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO																		230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS041	30	$1,839,600	$73,600	CCF39	30	$1,839,600	$73,600	14-25	30	$1,839,600	6.960%	$128,100	30	$0	$0	SI	$569,700
64	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(63)																						$122,740,341	$19,811,500			$124,579,941	$4,985,800			$122,776,841	$4,913,600			$124,579,941		$8,548,000		$0	$0		$38,258,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1601538723	9488310392	E	2025/07/02	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$38,307,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	$19,811,500	$25,100	$0	$19,836,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$569,200	$800	$0	$570,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$5,259,400	$6,600	$0	$5,266,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$10,335,900	$13,000	$0	$10,348,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,647,000	$4,700	$0	$3,651,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$8,548,000	$10,700	$0	$8,558,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	63	$8,548,000	$10,700	$0	$8,558,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$4,913,600	$6,200	$0	$4,919,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	63	$4,913,600	$6,200	$0	$4,919,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				63	$4,985,800	$6,700	$0	$4,992,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,000	$100	$0	$38,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$173,400	$300	$0	$173,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$259,100	$400	$0	$259,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,564,400	$2,000	$0	$1,566,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$331,000	$500	$0	$331,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,409,000	$1,800	$0	$1,410,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,153,900	$1,500	$0	$1,155,400
TOTAL				63	$38,258,900	$48,700	$0	$38,307,600

3782

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1601846518	9488318235	K	2025/07/02	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$99,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
1	CC	1102774962	DIAZ RAMOS CAMILO EDUARDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1601846518	9488318235	K	2025/07/02	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$99,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$99,100	$200	$0	$99,300
TOTAL				1	$99,100	$200	$0	$99,300

2025/07/04 08:29 AM

3783

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1601872148	9488318262	Y	2025/07/02	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$396,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TGA RIESGO V (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
1	CC	1095946093	FAJARDO UNIMO JHULY DAYANNA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Centro de Trabajo: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
2	CC	91018696	RIVERA ARIZA JOHN JAIRO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO SAN MARTIN (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$198,200
Centro de Trabajo: CONSORCIO SAN MARTIN (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$198,200
Ciudad: SAN MARTIN Depto: CESAR (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$198,200
3	CC	91232527	RAMIREZ RIVERO SERGIO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	1098741720	SALAZAR CACERES JULIAN FERNANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total Afiliados(4)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$396,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424605	4	TGA ASOCIADOS INGENIERIA,CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	TGA	CALLE 28 32 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6942133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1601872148	9488318262	Y	2025/07/02	2025/07/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$396,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$396,400	$500	$0	$396,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$396,400	$500	$0	$396,900
TOTAL				4	$396,400	$500	$0	$396,900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-16, 07:26:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1073530537

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 15/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOB INGENIERIA SAS		
Documento	NI901478369	**Dirección**	TV 112 #20 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3232196491
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	**Identificación**	CC 1098728354
Total Afiliados	23	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065300247	CARLOS FERNEY GARCIA TORRES	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 259.000	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.281.150	$ 51.300	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.960
CC 1065332202	JENIFER PAOLA GOMAJOA CABALLERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF39) CAJASAN	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1065644913	ANDRES FELIPE CORDERO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1066182752	YONATAN ZORRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1085799972	JAIRO LEONARDO GARCIA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.425.500	$ 57.000	6,960	$ 1.425.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1090801116	JOHN ALEXANDER TOLOZA DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.425.500	$ 57.000	6,960	$ 1.425.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1095640597	JONATHAN ALEXIS SAAVEDRA QUICENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.425.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.425.500	$ 57.000	6,960	$ 1.425.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098847256	FREDY ALEXANDER VELOZA CALDERON	01	00		X															0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 263.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 67.200	6,960	$ 1.650.000	$ 117.000	(CCF39) CAJASAN	$ 1.650.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200
CC 1098853662	WILMER ERLEY COBOS LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1098648572	LUIS EDUARDO QUINTERO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(231601) COLFONDOS	$ 1.425.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.425.500	$ 57.000	6,960	$ 1.425.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098725902	GERMINER ALBIO CHIQUILLO DIAZ	01	00																	7	7	7	7	7	(231601) COLFONDOS	$ 332.150	$ 53.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 332.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.500
CC 1098725902	GERMINER ALBIO CHIQUILLO DIAZ	01	00																	0	23	23	23	23	(231601) COLFONDOS	$ 1.091.350	$ 174.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.091.350	$ 43.700	6,960	$ 1.091.350	$ 76.000	(CCF39) CAJASAN	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.100
CC 1098728354	JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	6,960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CC 1100922462	ELIANA ALEXANDRA SUAREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 13027839	OMAR AUGUSTO INFANTE MORGA	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.450	$ 159.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF39) CAJASAN	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 37546748	DARLY MARTINEZ GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 5600121	LIBARDO JAIMES JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.425.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.425.500	$ 57.000	6,960	$ 1.425.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72268383	REINALDO JUNIOR MARTINEZ MENDOZA	01	00												X					0	5	5	5	5	(231601) COLFONDOS	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF39) CAJASAN	$ 177.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 72268383	REINALDO JUNIOR MARTINEZ MENDOZA	01	00																	0	25	25	25	25	(231601) COLFONDOS	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.333.334	$ 53.400	6,960	$ 1.333.334	$ 92.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

475

Pagado: 15/07/2025 | Empresa NI901478369 JOB INGENIERIA SAS | Planilla Nro: 1073530537 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73597385	ALVARO RAFAEL BOLIVAR DIAZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.400
CC 77156325	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91345311	EDUWIN CESAR CANARIO JIMENEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 91356809	JOHN FREDY DUARTE PICO	01	00												X						0	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 142.350	$ 22.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 142.350	$ 5.700	6,960	$ 142.350	$ 9.900	(CCF39) CAJASAN	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 91356809	JOHN FREDY DUARTE PICO	01	00																		0	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.281.150	$ 51.300	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.800
CC 91420569	ELVIS CARRILLO VILLEGAS	01	06																		0	0	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 91429154	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS099) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 35.389.684	$ 36.813.184	$ 36.813.184	$ 36.753.710	$ 5.663.000	$ 1.473.300	$ 2.513.500	$ 1.444.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.094.600	$ 7.500	$ 11.102.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-16, 03:25:50 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 78979887

Periodo Cotización 202506 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-14 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1096946096										
Tipo Cotizante	01	00				S	PEÑA PEÑA VICTOR MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	6	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-16, 03:24:46 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 78979887

Periodo Cotización 202506 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-14 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
Documento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098130385		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PEÑA CARVAJAL EDINSON MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES


Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

JULIO

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"

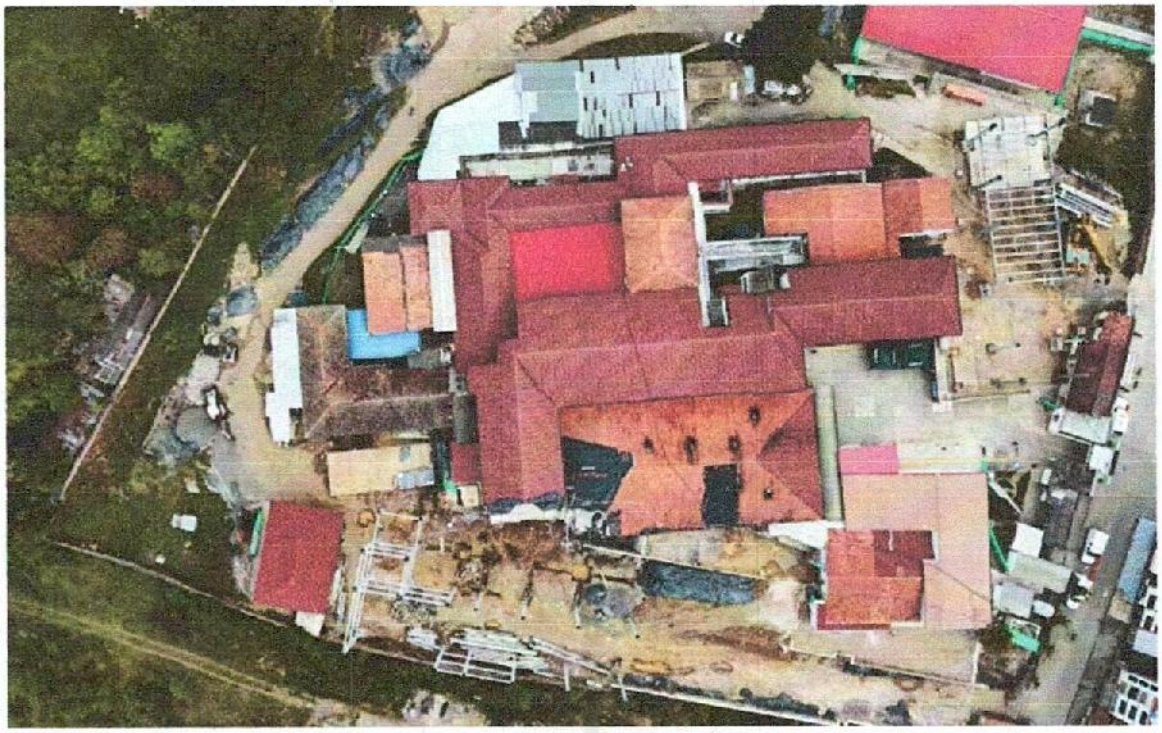

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

26 de junio de 2025 – 25 de julio de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

TIPO DE CONTRATO: 3

INTRODUCCION 4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 4

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 4

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5

Construcción módulo A: 5
Construcción módulo B: 5
Construcción módulo C: 6
Construcción módulo E: 6
Construcción módulo F 6
Adecuación área de UCI 7

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 8

1.5 CONDICIONES CLIMATICAS 14

PRESUPUESTO DE OBRA 17

1.6 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PERIODO DE JULIO DE 2025 17

Programación de obra 26

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 5
Ilustración 2 Cerramiento en mampostería de fachada norte módulo D 10
Ilustración 3 Cerramiento en mampostería de fachada módulo D 10
Ilustración 4 Cerramiento en mampostería fachada oeste modulo D 11
Ilustración 5 Friso primera planta módulo D 11
Ilustración 6 Estructura de la cubierta módulo D 12
Ilustración 7 Correas de soporte para cubierta en teja colonial modulo D 12
Ilustración 8 Armado de placa en metaldeck modulo A 13
Ilustración 9 Mampostería Nivel -0.10 mts – módulo D 13
Ilustración 13 Lluvia constante sobre el mes de junio 15
Ilustración 14 Lluvias durante el mes de julio 16
Ilustración 15 Lluvias durante el mes de julio 16

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral y detallada del desarrollo y estado actual del proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en el municipio de Málaga, Santander, llevada a cabo por el contratista CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA en el periodo comprendido de 26 de mayo de 2025 hasta la elaboración de este informe 25 de julio de 2025.

Este proyecto representa un hilo significativo en el campo de la construcción civil, no solo por s magnitud y complejidad, sino también por su contribución al desarrollo y mejora de la infraestructura hospitalaria en la provincia de García Rovira. El proyecto ha sido concebido con el propósito de satisfacer las necesidades de atención médica y hospitalaria a la hora de presentar cualquier tipo de servicio hospitalario su ejecución ha implicado una serie de desafíos técnicos, logísticos y ambientales que han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte de nuevo equipo de trabajo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y vivienda vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en varios módulos con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia
- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo B:

Este módulo se encuentra ubicado en el costado nororiental y actualmente existe una edificación en funcionamiento con los servicios de comedor, cocina, lavandería, mantenimiento, oficinas administrativas y hospitalización. Este módulo contempla las siguientes áreas:

- área de lavandería
- área de cocina
- Programa amplio de inmunizaciones PAI
- área de descargue
- área para médicos residentes
- Auditorio
- Servicio farmacéutico
- Hospitalización adultos

Construcción módulo C:

Este tercer modulo por construir se encuentra entre los módulos B y D se distingue porque actualmente se encuentra facturación, pediatría, consultorios, cuarto técnico (RACK). Este nuevo módulo C contara con las siguientes áreas:

- Servicio de terapias
- Servicios ambulatorios
- Servicios de dirección y administración

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Construcción módulo E:

El módulo E se encuentra ingresando por la plazoleta principal y cuenta con el servicio de urgencias, además colinda con el tomógrafo del hospital existente. Este nuevo módulo contendrá los siguientes servicios:

- Servicio de radiología e imágenes diagnosticas
- Servicio de laboratorio clínico
- Sala de espera
- Sala de visitas
- Recepción e información al usuario.

Construcción módulo F

El módulo F se encuentra en la zona central norte del área y donde actualmente se presta el servicio de quirófanos, trabajos de parto, recuperación de pacientes y parte de la sala de observación. Este módulo en su nueva arquitectura prestara los siguientes servicios:

- Central de esterilización

- Servicio gastroenterología
- Recuperación tardía
- Ascensores de servicios y personal
- Sala de espera para acompañante cirugía

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

1. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas durante el mes de julio. En este periodo se avanzó cumpliendo con los trabajos según el cronograma establecido, alcanzando un avance físico acumulado 40.18 % a la fecha de este informe, lo cual refleja un desarrollo importante de obra dentro del plazo previsto.

Durante el periodo del mes de julio, se realizaron actividades que están dentro del presupuesto en diferentes frentes de trabajo; entre otros se destacan actividades en mampostería, friso, estructura metálica, estructura de cubierta, instalación del entrepiso tipo metaldeck e instalación de tubería EMT para la red eléctrica y de complementarios; Adicionalmente se siguió con el montaje de la estructura metálica correspondiente al módulo A, el cual refleja un avance importante en la ejecución del proyecto.

En este informe se incluyen en detalle las actividades realizadas, los recursos utilizados, el avance por capitulo, así como las condiciones generales de ejecución y las proyecciones para el siguiente mes, con el fin de brindar una visión clara del estado actual de la obra, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos y normativos vigentes, así como las medidas de seguridad y control de calidad estipulados para esta clase de proyectos.

Todas las actividades se ejecutaron sin inconvenientes de tipo técnico, pero hubo un factor muy importante que intervino en el desarrollo de varias actividades siendo la lluvia el factor que impidió un avance mayor al ejecutado en los frisos de fachada módulo D, en el montaje de cubierta de módulo D y montaje de estructura modulo A, a continuación, se relacionan todas las actividades según los espacios donde se están interviniendo:

MODULO D

En este periodo se intervinieron diferentes actividades las cuales marcaron un avance muy importante para este módulo, entre otras se intervino en la mampostería del piso 1 y piso 2 la cual está totalmente terminada incluyendo la fundida de columnetas y viguetas y cerrando todas las fachada del módulo, adicionalmente se intervino en la ejecución del friso del piso 2 y piso 1 siendo este piso el único por terminar en un 50%, también se intervino la instalación de la tubería para la Red Eléctrica y la Red de Complementarios; paralelamente se trabajó en la fabricación de las cerchas de la estructura metálica de cubierta junto con la instalación de las correas las cuales solo falta el repaso de la soldadura para instalar la teja.

MODULO A

Para este periodo se evidencia que seguimos con la fabricación y montaje de los elementos estructurales de vigas principales y correas entre los ejes A - D y 1 – 4 de todos los niveles.

Por otro lado, y previo armado de la placa de entrepiso en metaldeck se fundió está en el nivel 0.0 entre ejes A-D presentando un repunte en el avance muy llamativo, posterior a esta actividad se inicia la actividad de la mampostería en este nivel logrando una imagen de progreso constructivo muy alentador, paralelo a ello se funden las columnetas con el objetivo de confinar los muros y así generar el cerramiento de las fachadas cerca a la subestación.

CENTRAL DE GASES

En este periodo se realiza la excavación, cimentación, fundida de columnas y mampostería de la central de gases, logrando un avance significativo ya que se pudieron concluir todas las actividades mencionadas para darle paso a la instalación de la tubería EMT red eléctrica siguiendo con el friso interno en algunos sectores.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades por módulos:

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

REGISTRO FOTOGRAFICO


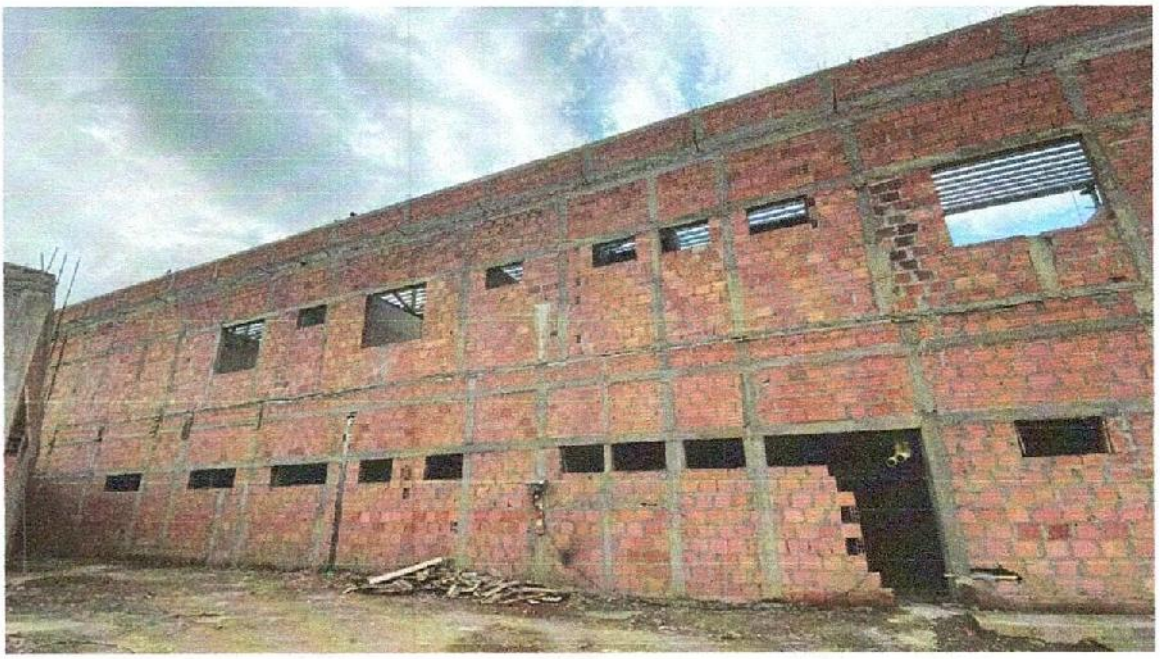


Ilustración 2 Cerramiento en mampostería de fachada norte módulo D

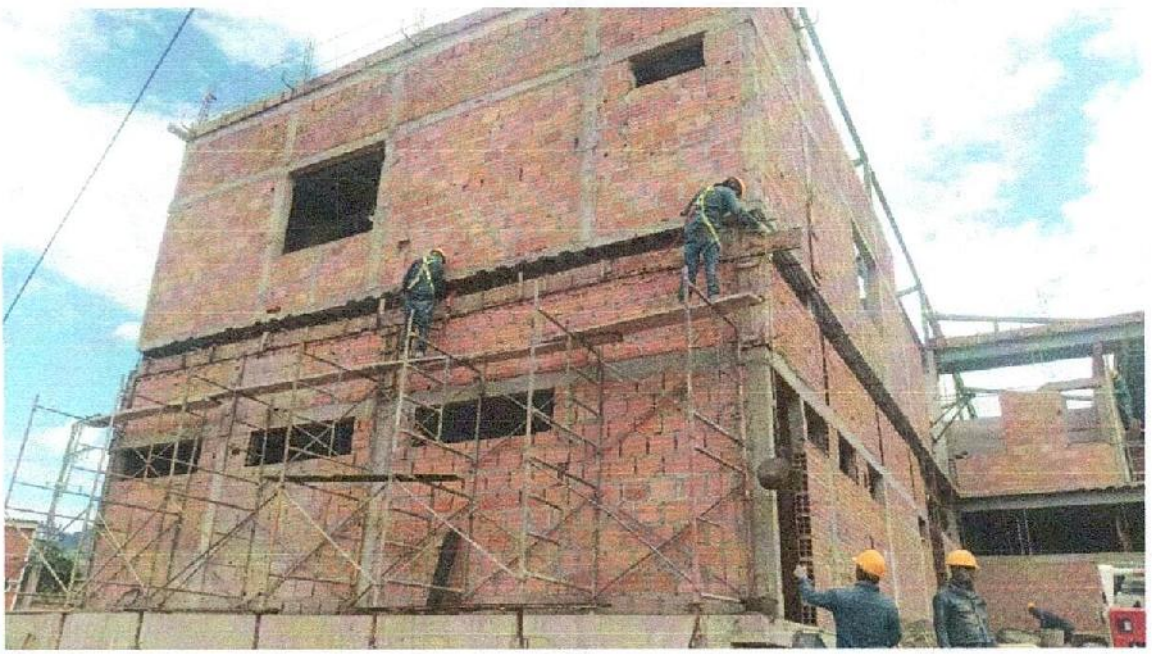

V

Ilustración 3 Cerramiento en mamposteria de fachada módulo D



Ilustración 4 Cerramiento en mampostería fachada oeste modulo D

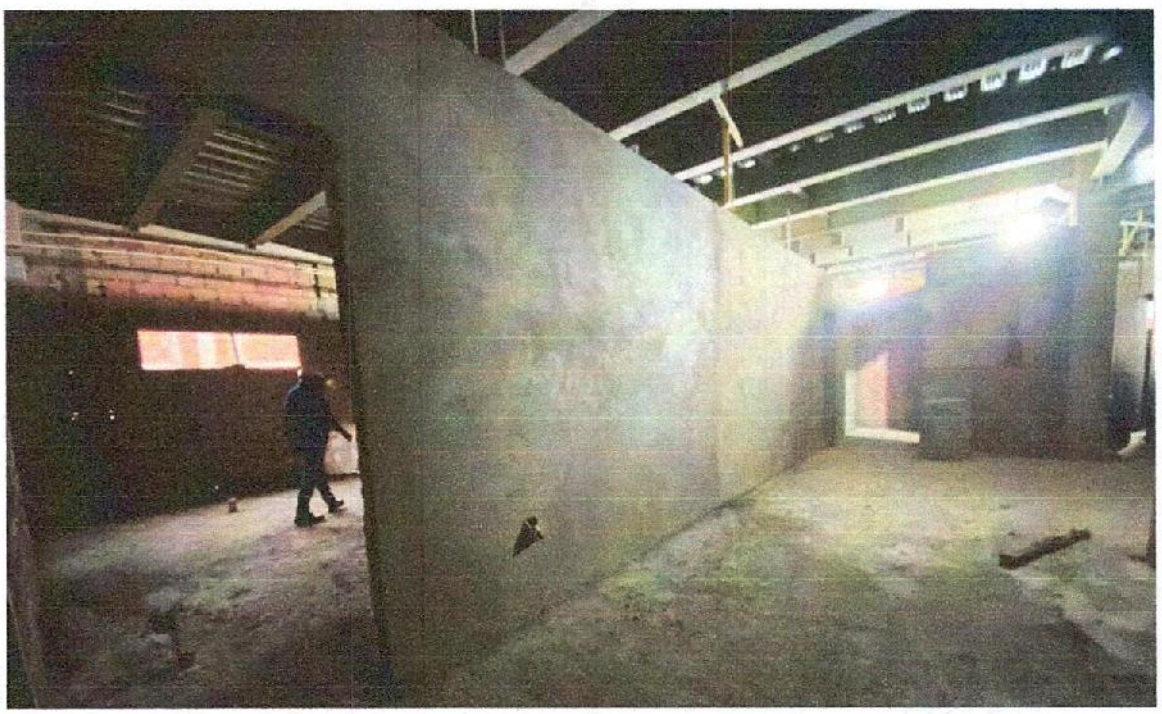


Ilustración 5 Friso primera planta módulo D

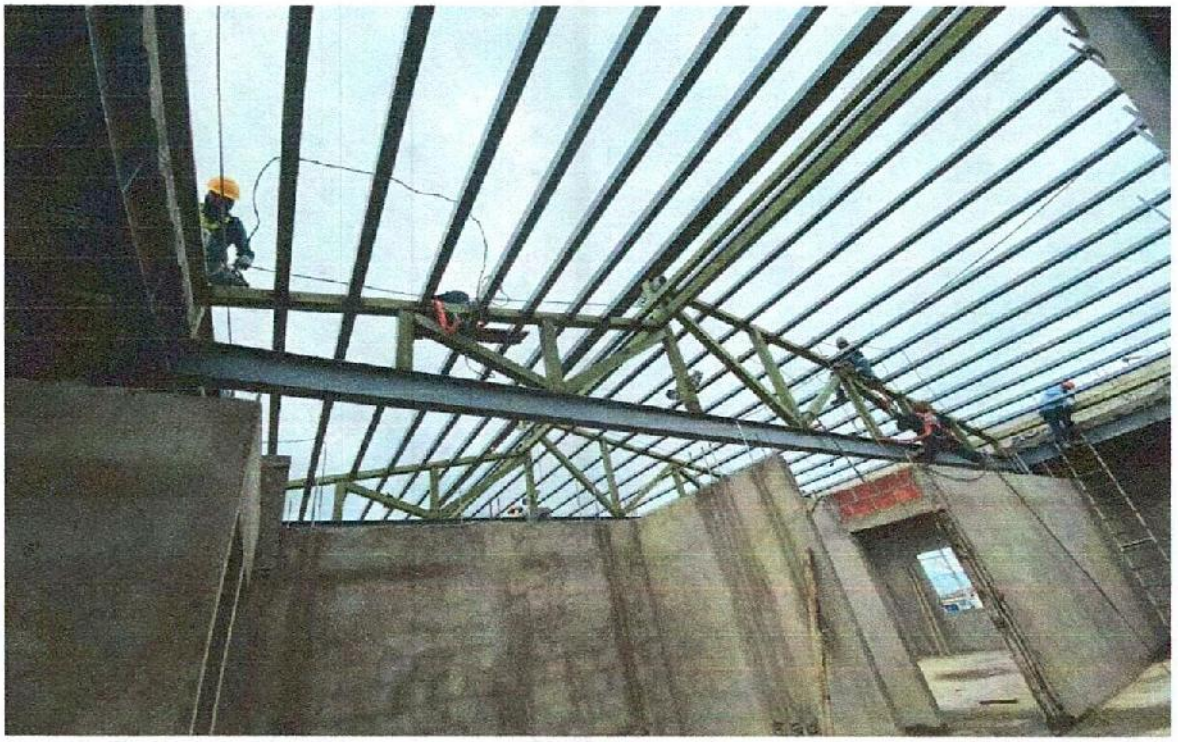


Ilustración 6 Estructura de la cubierta módulo D

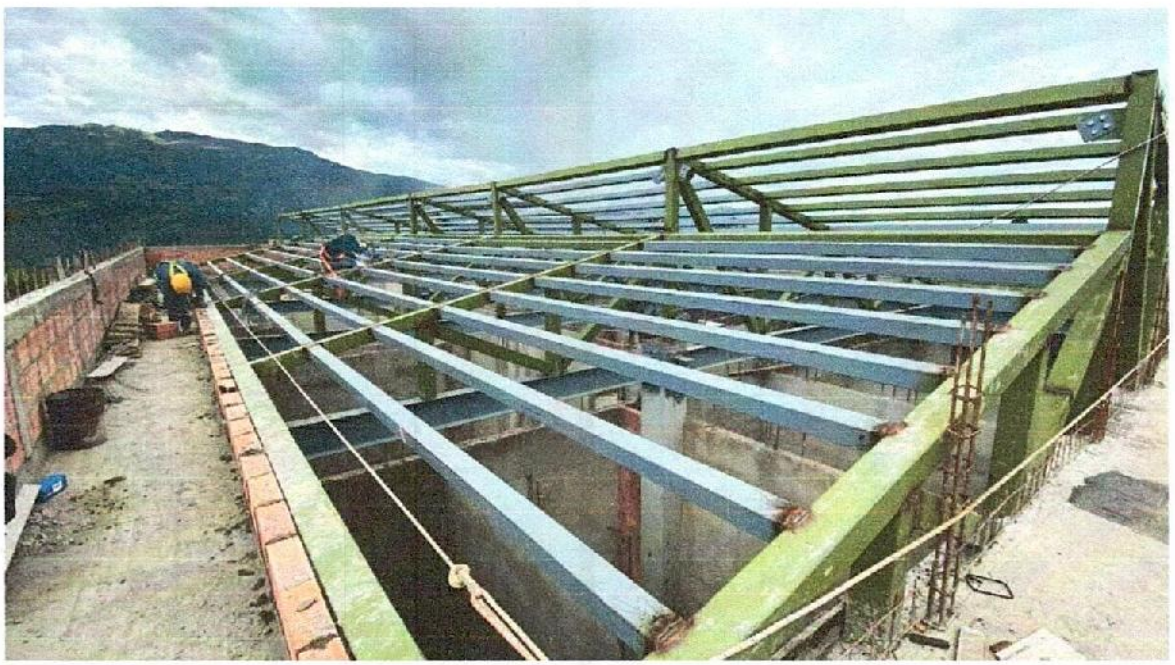


Ilustración 7 Correas de soporte para cubierta en teja colonial modulo D



Ilustración 8 Armado de placa en metaldeck modulo A

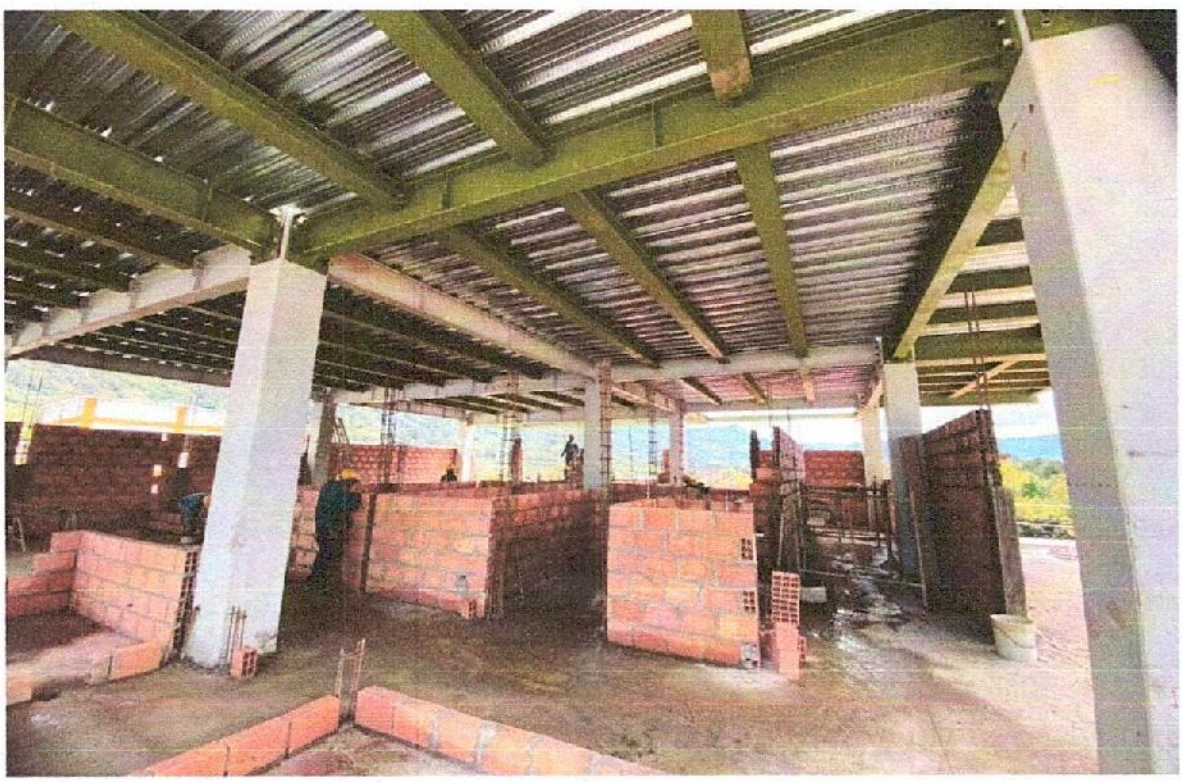


Ilustración 9 Mampostería Nivel -0.10 mts – módulo D

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Trámite ante el ente fiduciario para compra de material granular y de ferretería.
- Adquisición de materiales, herramienta, dotación de persona y equipo.
- Realización de informes de seguridad y salud en el trabajo.

1.3 CONDICIONES CLIMATICAS

En el municipio de Málaga, Santander durante el periodo del presente informe se presentaron lluvias parciales e intensas. Debido a esto se han presentado dificultades significativas para el desarrollo normal de las actividades programadas en el proyecto. Las condiciones climáticas adversas han generado retrasos, complicaciones logísticas y limitaciones en el acceso y operación en las áreas de intervención.

A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de junio - julio

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (JUNIO - JULIO)																																						
Clase de tiempo	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Seco	24	20	24	24	24	24	24	24	17	24	24		24	17	24	17	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	15	24	17	15	18	20	12	14
Lluvia moderada		4										17				7									2			9			4	6		10	8
Lluvia intensa									7			7		7																7	3		4	2	2
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24



Ilustración 10 Lluvia constante sobre el mes de junio

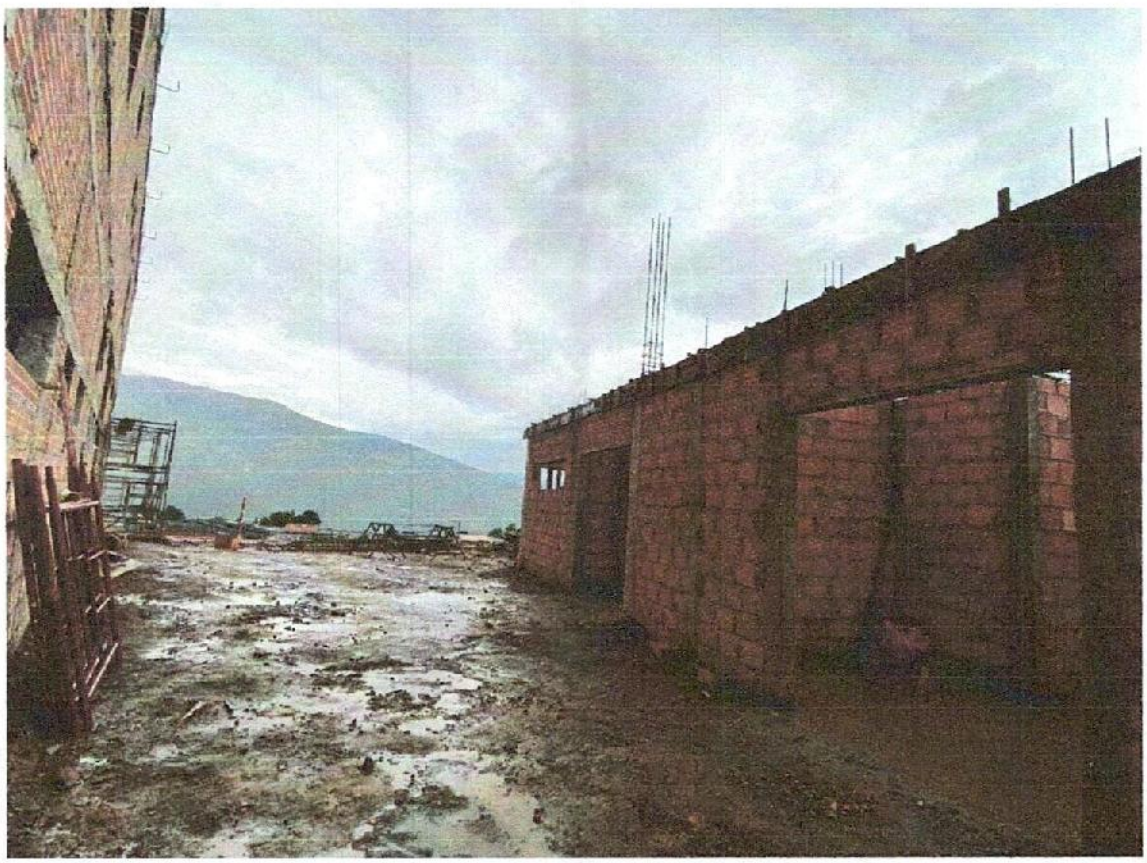


Ilustración 11 Lluvias durante el mes de julio



Ilustración 12 Lluvias durante el mes de julio

2. PRESUPUESTO DE OBRA

1.4 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO MES DE JULIO

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 728,933,688.22**		**$**	**15,435,025.14**
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	$ 14,114.65	16536.79	$ 233,411,002.97	631.75	$	8,916,930.14
1.06	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS ENTERRADOS	M3	$ 750,000.00	108.76	$ 81,570,000.00	0.22	$	162,000.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO	M2	$ 27,963.62	1656.69	$ 46,327,049.62	4.16	$	116,328.66
1.09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO	M2	$ 19,500.00	1042.29	$ 20,324,655.00	89.04	$	1,736,280.00
1.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	$ 52,348.38	905.44	$ 47,398,317.19	11.08	$	580,020.05
1.15	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	$ 45,000.00	189.00	$ 8,505,000.00	2.00	$	90,000.00
	ITEMS NO PREVISTOS							
1-NP10	MONTAJE DE PUERTAS	UND	$ 440,000.00	36.00	$ 15,840,000.00	5.00	$	2,200,000.00
1-NP11	DESMONTE E INSTALACION DE LAVAMANOS Y APARATOS SANITARIOS	UND	$ 147,000.00	9.00	$ 1,323,000.00	7.00	$	1,029,000.00
1-NP73	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	$ 20,865.25	915.36	$ 19,099,215.24	28.97	$	604,466.29
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 7,720,722,476.73**		**$**	**140,623,055.14**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,615,884.26	358.00	$	4,827,991.58
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.61	$ 106,197,118.05	574.16	$	11,198,990.80
	TANQUE							
3.10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO	ML	$ 146,743.21	700.05	$ 102,727,584.16	85.79	$	12,589,099.99

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
3.11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA	ML	$ 133,809.40	800.00	$ 107,047,520.00	360.56	$ 48,246,317.26	
	ITEMS NO PREVISTOS							
3-NP2	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 15CM	M2	$ 130,466.00	2338.93	$ 305,150,841.38	92.29	$ 12,040,707.14	
3-NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	$ 795,530.16	212.97	$ 169,424,058.18	3.38	$ 2,688,891.94	
3-NP68	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	$ 1,313,975.17	36.99	$ 48,609,854.43	3.45	$ 4,533,214.34	
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	$ 1,575,628.61	142.18	$ 224,022,875.77	25.46	$ 40,115,504.41	
3-NP86	CUNETA DE SECCION TRIANGULAR REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO SIMPLE DE FC=210 KG/CM2 (21MPA)	ML	$ 112,483.00	62.00	$ 6,973,946.00	38.96	$ 4,382,337.68	
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 11,410,924,220.28**		**$ 1,557,200,921.49**	
	ITEMS NO PREVISTOS							
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	133654.73	$ 2,873,576,674.62	22059.84	$ 474,286,588.38	
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	259201.99	$ 5,572,842,721.36	27705.32	$ 595,664,318.84	
4-NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PLANTILLAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	11875.36	$ 255,320,182.34	1946.41	$ 41,847,761.25	
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	74845.63	$ 1,609,202,608.52	11210.42	$ 241,024,110.68	

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	864.06	$ 204,378,142.34	
6.0	**MAMPOSTERÍA**				**$ 924,372,126.28**		**$ 79,979,030.94**	
6.01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	$ 89,396.05	3016.79	$ 269,689,109.68	478.26	$ 42,754,554.87	
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	$ 88,172.05	6193.93	$ 546,131,505.66	422.18	$ 37,224,476.07	
7.0	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 496,831,249.09**		**$ 27,097,740.69**	
	REDES DE PVC SANITARIA AGUAS RESIDUALES							
7.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 2"	ML	$ 25,241.58	450.67	$ 11,375,622.86	90.84	$ 2,293,020.85	
7.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 3"	ML	$ 31,825.50	175.54	$ 5,586,648.27	135.47	$ 4,311,400.49	
7.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 4"	ML	$ 66,044.00	505.12	$ 33,360,145.28	245.49	$ 16,213,141.56	
	REDES DE PVC SANITARIA AGUAS LLUVIAS							
7.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 4"	ML	$ 66,044.00	333.92	$ 22,053,412.48	22.40	$ 1,479,385.60	
	SALIDAS SANITARIAS (PARAL)							
7.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4", INCLUYE BRIDA	UN	$ 90,495.94	75.00	$ 6,787,195.50	17.00	$ 1,538,430.98	
7.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2"	UN	$ 79,494.03	154.00	$ 12,242,080.62	8.00	$ 635,952.24	
7.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2"	UN	$ 63,659.53	8.00	$ 509,276.24	6.00	$ 381,957.18	

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
7.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA DUCHA PVC 2"	UN	$ 81,483.93	31.00	$ 2,526,001.83	3.00	$ 244,451.79	
7.59	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE	UN	$ 532,796.40	28.00	$ 14,918,299.20		$ -	
8.0	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 477,515,553.22**		**$ 12,145,967.36**	
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE							
8.50	RED DE SUMINISTRO PVC 1"	ML	$ 18,087.48	112.69	$ 2,038,278.12	37.94	$ 686,238.99	
8.51	RED DE SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$ 18,315.98	213.08	$ 3,902,769.02	64.71	$ 1,185,227.07	
8.52	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$ 17,218.97	1024.69	$ 17,644,106.37	270.28	$ 4,653,943.21	
8.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1/2"	UN	$ 41,885.42	152.00	$ 6,366,583.84	20.00	$ 837,708.40	
8.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 3/4"	UN	$ 65,445.22	152.00	$ 9,947,673.44	2.00	$ 130,890.44	
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE							
8.66	RED DE SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	$ 27,723.97	221.52	$ 6,141,413.83	23.56	$ 653,176.73	
8.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1/2"	UN	$ 41,885.42	86.00	$ 3,602,146.12	11.00	$ 460,739.62	
	PUNTOS HIDRÁULICOS							
8.91	PUNTO DE AGUA FRÍA DUCHA	UN	$ 90,736.83	31.00	$ 2,812,841.73	4.00	$ 362,947.32	
8.92	PUNTO DE AGUA CALIENTE DUCHA	UN	$ 133,348.08	32.00	$ 4,267,138.56	9.00	$ 1,200,132.72	
8.93	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS	UN	$ 43,897.62	154.00	$ 6,760,233.48	25.00	$ 1,097,440.50	
8.97	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	$ 43,897.62	75.00	$ 3,292,321.50	18.00	$ 790,157.16	
8.101	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO	UN	$ 43,582.60	2.00	$ 87,365.20	2.00	$ 87,365.20	
9.0	**RED CONTRA INCENDIO**				**$ 637,135,268.40**		**$ 4,959,916.28**	
	RED GENERAL CONTRA INCENDIO Y GABINETES							
9.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UN	$ 2,292,461.50	19.00	$ 43,556,768.50	1.00	$ 2,292,461.50	
	RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)							
9.33	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	UN	$ 66,569.88	446.00	$ 29,690,166.48	35.00	$ 2,329,945.80	

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
	PINTURA PARA TUBERIAS							
9.47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	$ 22,160.80	439.21	$ 9,733,244.97	15.23	$	337,508.98
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				**$ 5,493,210,590.57**		**$**	**56,759,418.66**
10.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 PUESTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 1,272,410.12	9.00	$ 11,451,691.08	1.00	$	1,272,410.12
10.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36 PUESTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 2,213,638.34	9.00	$ 19,922,745.06	1.00	$	2,213,638.34
	ILUMINACIÓN							
10.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	UND	$ 107,121.00	276.00	$ 29,565,396.00	22.00	$	2,356,662.00
10.77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LETRERO DE SALIDA	UND	$ 183,411.90	39.00	$ 7,153,064.10	2.00	$	366,823.80
10.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 40W.	UND	$ 300,397.32	388.00	$ 116,554,160.16	3.00	$	901,191.96
10.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UND	$ 134,203.02	698.00	$ 93,673,707.96	32.00	$	4,294,496.64
	TOMACORRIENTE							

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
10.83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	$ 361,363.90	583.00	$ 210,675,153.70	68.00	$ 24,572,745.20	
10.85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GCFI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	$ 447,381.52	110.00	$ 49,211,967.20	4.00	$ 1,789,526.08	
	COMUNICACIÓN							
10.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDA DE DATOS EN MURO. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE PLATE DE 1 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 546,443.92	45.00	$ 24,589,976.40	31.00	$ 16,939,761.52	
10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE PLATE DE 2 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 738,928.10	203.00	$ 150,002,404.30	1.00	$ 738,928.10	
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP64	DESMONTE DE TUBERIA, BANDEJAS, CABLEADO Y APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES	M2	$ 12,485.00	649.46	$ 8,108,508.10	47.34	$ 591,039.90	
NP94	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA 110 VOLTIOS	UND	$ 144,439.00	28.00	$ 4,044,292.00	5.00	$ 722,195.00	
11.0	**PISOS-BASES**				**$ 888,818,320.09**		**$ 1,639,466.29**	
11.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISO 4CM	M2	$ 63,576.53	243.38	$ 15,473,255.87		$ -	
11.02	ALISTADO PISO 4CM	M2	$ 36,085.76	4047.24	$ 146,047,731.30	45.43	$ 1,639,466.29	
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**				**$ 1,788,665,703.27**		**$ 364,483.29**	


PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP146	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO SISTEMA VC5020 CON BATIENTE	M2	$ 364,483.29	16.00	$ 5,831,732.64	1.00	$ 364,483.29	
13.0	**PAÑETES**				**$ 1,252,087,083.59**		**$ 67,782,092.00**	
13.01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	$ 39,980.00	12784.38	$ 511,119,512.40	1695.40	$ 67,782,092.00	
13.04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	ML	$ 950,000.00	572.75	$ 544,112,500.00		$ -	
14.0	**ACABADOS MUROS**				**$ 822,161,706.23**		**$ 18,247,007.34**	
14.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PARED BLANCO RECTIFICADA TIPO HOSPITALARIO JUNTA PERDIDA 30X60CM, TIPO - CORONA O SIMILAR	M2	$ 130,171.61	1640.04	$ 213,486,647.26	68.58	$ 8,927,169.01	
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP89	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 8MM (2 CARAS). INCLUYE PERFILERIA DE SOPORTE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS	M2	$ 113,201.00	3246.86	$ 367,548,308.60	82.33	$ 9,319,838.33	
15.0	**ACABADOS PISOS**				**$ 1,160,657,133.42**		**$ 1,149,540.00**	
15.03	SUMINISTRO ,TRANSPORTE Y COLOCACION DE BALDOSA EN CERAMICA PARA BAÑO	M2	$ 98,000.00	190.65	$ 18,683,700.00	11.73	$ 1,149,540.00	
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**$ 529,125,789.15**		**$ 1,443,852.90**	
16.07	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA INDIVIDUAL TIPO INSTITUCIONAL RESISTENTE A LA CORROSION, PELADO Y DECOLORACION POR AGUA, METALICA ACABADO CROMO.	UN	$ 146,000.00	89.00	$ 12,994,000.00	4.00	$ 584,000.00	
16.09	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS TIPO GANZO	UN	$ 93,457.00	3.00	$ 280,371.00	2.00	$ 186,914.00	

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
16.15	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES CERÁMICOS 4 PIEZAS	UN	$ 134,587.78	6.00	$ 807,526.68	5.00	$	672,938.90
17	**PINTURA**				**$ 865,874,459.00**		**$**	**20,632,440.00**
17.01	ESTUCO PREPARADO	M2	$ 19,000.00	12784.38	$ 242,903,220.00	268.14	$	5,094,660.00
17.03	FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 12,800.00	4170.00	$ 53,376,000.00		$	-
17.04	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	$ 22,000.00	12366.97	$ 272,073,340.00	611.67	$	13,456,740.00
17.06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA	M2	$ 29,000.00	2866.10	$ 83,116,900.00	71.76	$	2,081,040.00
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP67	ESTUCO PREPARADO PARA EXTERIOR	M2	$ 59,294.08	2677.54	$ 158,762,270.96		$	-
18.0	**CIELOS RASOS**				**$ 453,057,836.57**		**$**	**15,764,366.10**
18.01	CIELO RASO SUSPENDIDO EN DRY WALL (LAMINA DE YESO), INCLUYE PINTURA	M2	$ 95,000.00	4099.83	$ 389,483,850.00	134.12	$	12,741,400.00
18.05	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE INSPECCION INCLUYE PERFORACIÓN ESTRUCTURA Y REMATE	UN	$ 31,043.02	105.00	$ 3,259,517.10	55.00	$	1,707,366.10
18.06	PEROFORACIONES DE 60X60 PARA ILUMINACION LED Y REJILLAS DE VENTILACION	UN	$ 12,500.00	290.00	$ 3,625,000.00	92.00	$	1,150,000.00

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		JULIO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
18.07	PERORACIONES PARA ROCIADORES Y BALAS DE ILUMINACION DIAMETRO MAX. 15 CM	UN	$ 9,200.00	1520.00	$ 13,984,000.00	18.00	$ 165,600.00	
18.08	MEDIA CAÑA EN YESO CON MALLA, ENTRE MUROS Y ENTRE CIELO RAZO Y MUROS	ML	$ 44,500.00	577.00	$ 25,676,500.00		$ -	
20	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 110,424,084.75**		**$ 2,898,182.35**	
20.01	ASEO GENERAL	M2	$ 6,661.11	16577.43	$ 110,424,084.75	435.09	$ 2,898,182.35	
23.0	**RED DE GAS NATURAL**				**$ 20,228,545.00**		**$ -**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.12**		**$ 2,024,122,505.97**	
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 586,995,526.73	
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 20,241,225.06	
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 101,206,125.30	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 708,442,877.09	
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 2,732,565,383.06**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ -	
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ -**	
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**			
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 2,732,565,383.06**	
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**			
	ADICIONAL No 01							
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**			

Programación de obra.

En las siguientes graficas se presentan el avance físico presupuesta de obra con fecha de corte del 25 julio de 2025.

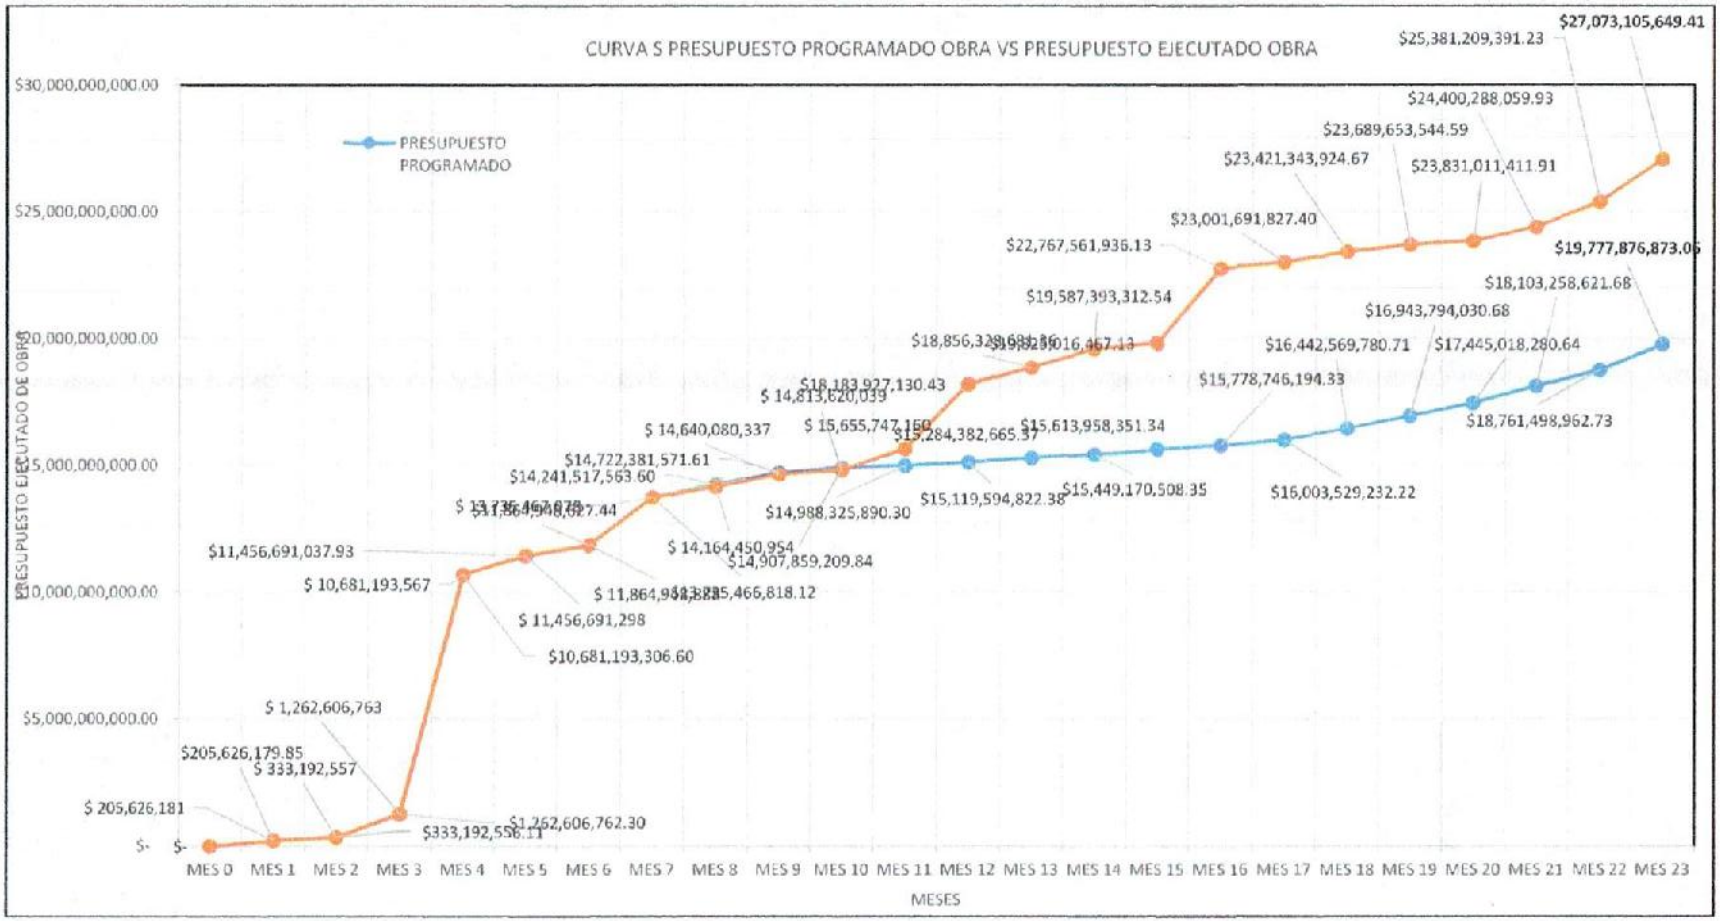

En las siguientes graficas se presentan el avance físico porcentual de obra con fecha de corte del 25 julio de 2025.



En las anteriores graficas se muestra el presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado durante el periodo de este informe, se observa que el avance de obra está por encima del avance programado. Este mes el avance programado se encuentra en el 30.57% acumulado y lo ejecutado esta sobre el 41.85% acumulado, presentando 11.28% puntos porcentuales de avance de obra por encima de lo esperado.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está brindando capacitación continua al personal operativo que ejecuta labores de alto riesgo como el izaje y trabajo en caliente de la estructura metálica del módulo D y del módulo A.

- Durante el periodo evaluado, la ejecución de la obra ha avanzado de manera sostenida y conforme al cronograma establecido, avanzando los objetivos programados para el mes. Las actividades desarrolladas entre ellas la mampostería, el friso, armado de columnetas y viguetas, el montaje de elementos estructurales y montaje de cubierta, fundida de placas se llevaron a cabo en cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto y bajos los lineamientos de sus respectivos diseños.

- Las lluvias permanentes durante el mes de julio han afectado las actividades de montaje de elementos metálicos en los módulos, teniendo en cuenta se hace difícil realizar maniobras en alturas con estas condiciones.

- El proyecto se encuentra en una fase obra gris, con avances significativos en la estructura metálica, friso, mampostería, fundida de placa y cubierta. A pesar de algunos contratiempos menores, como el clima, el proceso de avance es positivo y se espera que las actividades planificadas se completen dentro de los tiempos establecidos.

- El porcentaje de ejecución programado en el mes de julio es de 30.57% esto equivale presupuestalmente a $ 19.777.876.873,06; en este informe el porcentaje ejecutado es de 41.85% que equivale a $ 27.073.105.649.41; por lo tanto, en relación con lo anterior el Consorcio de García Rovira se encuentra presentando 11.28% por encima de lo programado acumulado.

- Se recomienda mantener el ritmo de ejecución actual, fortalecer el control de calidad en procesos críticos como el montaje de la estructura metálica; y asegurar la disponibilidad de materiales e insumos para las próximas fases constructivas. Con base en lo anterior, se considera que la obra se encuentra

en una etapa de desarrollo técnicamente satisfactoria y dentro de los parámetros previstos.

CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO
Representante legal
Consorcio de García Rovira.
C.C. 91.273.201 de Bucaramanga

7820 011

Consorcio De Garcia Rovira
NIT: 901740580 - 3

Factura Electrónica de Venta
CGR 9

Bucaramanga Calle 17 # 30-22 san Alonso
Teléfono 3148794700
Correo Electrónico consorciodegarciarovira@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083699321 que habilita desde CGR 5 hasta CGR 500. Vence 19/11/2025.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA | NIT: 900067169 - 9
Dirección: CARRERA 7 15 80B
Ciudad: Málaga | Teléfono: 6076607475
Fecha: 06/08/2025 | Vencimiento: 08/08/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: Consorcio De Garcia Rovira
Por Concepto de:
ACTA PARCIAL # 6 DEL CONTRATO DE OBRA 067-09-08-23

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	41309501	Servicio de obra	und	1,00	3.189.291.596,63	0,00	0	0,00	3.189.291.596,63
2	41309502	Administración	und	1,00	924.894.563,02	0,00	0	0,00	924.894.563,02
3	41309503	Imprevistos	und	1,00	31.892.915,97	0,00	0	0,00	31.892.915,97
4	41309504	Utilidad	und	1,00	159.464.579,83	0,00	0	0,00	159.464.579,83

Valor en Letras

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 4.305.543.655,45
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 4.305.543.655,45
RETEFUENTE	$ 86.110.873,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 4.219.432.782,45

→ 5%
2%

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-07-31 12:21:20

CUFE: 112af79c07e020c340a0a7849317017809329e064dbba5e7a56e35d67263c36f2ce95779c3c8422206 9cdbab207ee42e4 -Expedición: 06/08/2025 09:46 PM

7821

Consorcio De Garcia Rovira

NIT: 901740580 - 3

Factura Electrónica de Venta

CGR 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083699321 que habilita desde CGR 5 hasta CGR 500. Vence 19/11/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bucaramanga Calle 17 # 30-22 san Alonso

Teléfono 3148794700

Correo Electrónico consorciodegarciarovira@gmail.com

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA | **NIT:** 900067169 - 9

Dirección: CARRERA 7 15 80B

Ciudad: Málaga | **Teléfono:** 6076607475

Fecha: 31/07/2025 | **Vencimiento:** 31/07/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Consorcio De Garcia Rovira

Por Concepto de:

ACTA PARCIAL #6 DEL CONTRATO DE OBRA 087-09-08-23

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	41309501	Servicio de obra	und	1,00	3.189.291.596,63	0,00	0	0,00	3.189.291.596,63
2	41309502	Administración	und	1,00	924.894.563,02	0,00	0	0,00	924.894.563,02
3	41309503	Imprevistos	und	1,00	31.892.915,97	0,00	0	0,00	31.892.915,97
4	41309504	Utilidad	und	1,00	159.464.579,83	0,00	0	0,00	159.464.579,83

Valor en Letras

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 4.305.543.655,45**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 4.305.543.655,45
RETEFUENTE	$ 86.110.873,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 4.219.432.782,45**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-07-31 12:21:20

7822

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL No 6

CONTRATO DE OBRA	087-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($64.028.082.699,20)
ANTICIPO 40%	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA ($25.611.233.079,68)
VALOR ADICIONAL	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15)
CONTRATANTE:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA** N.I.T 900.067.169-9 **R.L. CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA** C.C. 7.169.545
CONTRATISTA	**CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201
INTERVENTORÍA	**UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** como contratista y avalada por **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** como interventoría, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1,0	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	631,75
1,06	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS ENTERRADOS	M3	0,22
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO	M2	4,16
1,08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABIQUE TOLETE COMÚN 10 - 15 CM, INCLUYE RETIRO	M2	27,75
1,09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO	M2	116,34
1,11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	33,88
1,15	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	2,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
1-NP10	MONTAJE DE PUERTAS	UND	7,00
1-NP11	DESMONTE E INSTALACION DE LAVAMANOS Y APARATOS SANITARIOS	UND	7,00
1-NP73	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	28,97
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES		
2,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	961,66
	ITEMS NO PREVISTOS		
2-NP80	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE HASTA EL 95%	M3	40,50
3,0	ELEMENTOS EN CONCRETO		
3,01	BASE CONCRETO POBRE 5CM	M2	36,64
3,02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	10972,26
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	2300,75
3,07	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA Y MURO DE CONTENCION INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	122,80
	TANQUE		
3,10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U CON ANCLAJE EPÓXICO	ML	548,72
3,11	VIGA DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 10CM C/U EMBEBIDA EN MURO ESTRUCTURAL A LA VISTA Y PLACA	ML	494,39
	ITEMS NO PREVISTOS		
3-NP1	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PIEDRA PROPORCIO 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	36,86
3-NP2	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 15CM	M2	92,29
3-NP3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATAS	M3	16,54

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
3-NP4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	67,62
3-NP68	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	3,45
3-NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	9,34
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	25,46
3-NP86	CUNETA DE SECCION TRIANGULAR REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO SIMPLE DE FC=210 KG/CM2 (21MPA)	ML	38,96
4,0	ESTRUCTURA METALICA		
	ITEMS NO PREVISTOS		
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	22059,84
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	27705,32
4-NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PLANTILLAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	1946,41
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	11210,42
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	1593,84
5,0	CUBIERTA		
5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	119,80
6,0	MAMPOSTERÍA		
6,01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	937,79
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	1095,83
7,0	INSTALACIONES SANITARIAS		
	REDES DE PVC SANITARIA AGUAS RESIDUALES		
7,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 2"	ML	90,84
7,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 3"	ML	135,47
7,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 4"	ML	245,49
	REDES DE PVC SANITARIA AGUAS LLUVIAS		
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 4"	ML	22,40
	SALIDAS SANITARIAS (PARAL)		
7,38	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4", INCLUYE BRIDA	UN	17,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
7,39	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2"	UN	8,00
7,40	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2"	UN	6,00
7,41	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA DUCHA PVC 2"	UN	3,00
7,59	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE	UN	2,00
8,0	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
8,50	RED DE SUMINISTRO PVC 1"	ML	37,94
8,51	RED DE SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	64,71
8,52	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	270,28
8,54	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1/2"	UN	20,00
8,55	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 3/4"	UN	2,00
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE		
8,66	RED DE SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	23,56
8,72	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1/2"	UN	11,00
	PUNTOS HIDRÁULICOS		
8,91	PUNTO DE AGUA FRÍA DUCHA	UN	4,00
8,92	PUNTO DE AGUA CALIENTE DUCHA	UN	9,00
8,93	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS	UN	29,00
8,97	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	18,00
8,101	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO	UN	2,00
9,0	RED CONTRA INCENDIO		
	RED GENERAL CONTRA INCENDIO Y GABINETES		
9,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UN	1,00
	RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)		
9,33	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	UN	35,00
	PINTURA PARA TUBERIAS		
9,47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	15,23
10,0	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
10,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 PUESTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00
10,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 36 PUESTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00
	ILUMINACIÓN		
10,71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	UND	22,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
10,77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LETRERO DE SALIDA	UND	2,00
10,78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 40W.	UND	3,00
10,80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UND	42,00
	TOMACORRIENTE		
10,83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	68,00
10,85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GCFI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	4,00
	COMUNICACIÓN		
10,99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDA DE DATOS EN MURO. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE PLATE DE 1 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	31,00
10,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE PLATE DE 2 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP64	DESMONTE DE TUBERIA, BANDEJAS, CABLEADO Y APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES	M2	47,34
NP94	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA 110 VOLTIOS	UND	5,00
NP156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS 4X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	4,00
11,0	**PISOS-BASES**		
11,01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISO 4CM	M2	0,00
11,02	ALISTADO PISO 4CM	M2	63,82
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP146	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO SISTEMA VC5020 CON BATIENTE	M2	1,00
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	42,64
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	0,00
NP149	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACABADO LAMINADO O TABLERO BLANCO DE 6MM (RH) TIPO VAIVEN, INCLUYE (MIRILLA SI SE REQUIERE, MARCO, Y BISAGRAS PLATEADA PUERTA VAIVEN)	M2	13,02
13,0	**PAÑETES**		


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
13,01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	1695,40
13,04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	ML	43,53
14,0	ACABADOS MUROS		
14,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PARED BLANCO RECTIFICADA TIPO HOSPITALARIO JUNTA PERDIDA 30X60CM, TIPO - CORONA O SIMILAR	M2	224,15
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP89	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 8MM (2 CARAS). INCLUYE PERFILERIA DE SOPORTE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS	M2	82,33
15,0	ACABADOS PISOS		
15,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BALDOSA EN CERAMICA PARA BAÑO	M2	11,73
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP93	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA	M2	62,94
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
16,07	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA INDIVIDUAL TIPO INSTITUCIONAL RESISTENTE A LA CORROSION, PELADO Y DECOLORACION POR AGUA, METALICA ACABADO CROMO.	UN	4,00
16,09	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS TIPO GANZO	UN	2,00
16,15	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES CERÁMICOS 4 PIEZAS	UN	5,00
17	PINTURA		
17,01	ESTUCO PREPARADO	M2	268,14
17,03	FILOS Y DILATACIONES	ML	159,88
17,04	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	611,67
17,06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA	M2	133,81
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP67	ESTUCO PREPARADO PARA EXTERIOR	M2	62,05
18,0	CIELOS RASOS		
18,01	CIELO RASO SUSPENDIDO EN DRY WALL (LAMINA DE YESO), INCLUYE PINTURA	M2	134,12
18,05	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE INSPECCION INCLUYE PERFORACIÓN ESTRUCTURA Y REMATE	UN	55,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
18,06	PEROFORACIONES DE 60X60 PARA ILUMINACION LED Y REJILLAS DE VENTILACION	UN	92,00
18,07	PERORACIONES PARA ROCIADORES Y BALAS DE ILUMINACION DIAMETRO MAX. 15 CM	UN	28,00
18,08	MEDIA CAÑA EN YESO CON MALLA, ENTRE MUROS Y ENTRE CIELO RAZO Y MUROS	ML	105,79
20	LIMPIEZA GENERAL		
20,01	ASEO GENERAL	M2	435,09
21,0	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO 1 ETAPA DIGITAL No PROGRAMABLE VERTICAL (PRO 1000) HONEYWELL TH1110DV1009	UND	1,00
22,0	GASES MEDICINALES		
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP139	DESMONTE E INSTALACION DE ALARMAS DIGITALES FABRICACION NACIONAL DE TRES GASES (O2, AIRE Y VACIO)	UND	2,00
NP140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE TRIPLEVÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS (O2-1"; AIR-1"; VAC-1-1/2") INCLUYE (1 VALVULA DE BOLA DE 1" Y 2 VALVULA DE BOLA DE 1-1/2" DE 4 TORNILLOS ACERO INOXIDABLE)	UND	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES



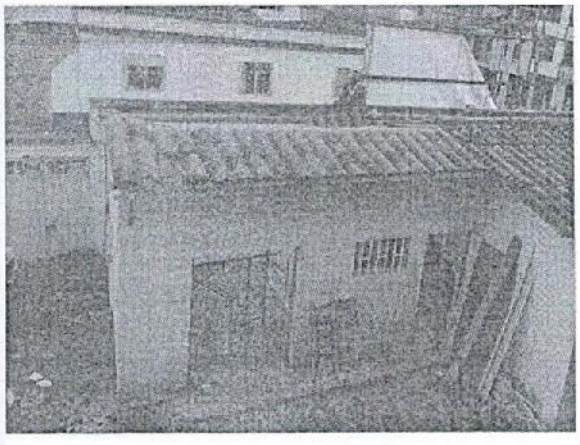



EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES






ELEMENTOS EN CONCRETO

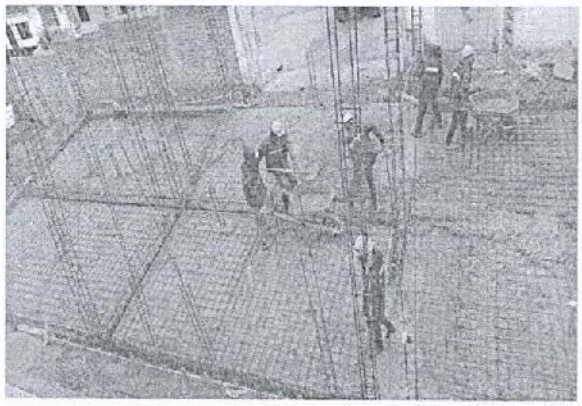

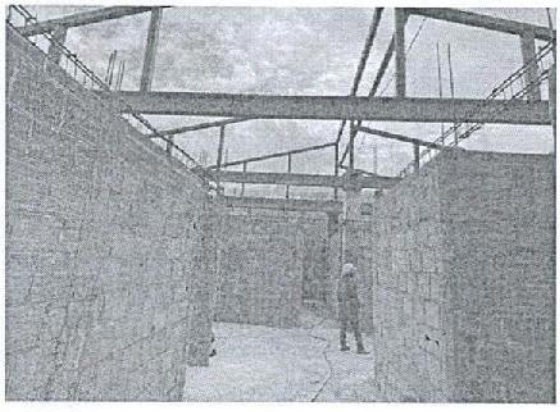

ESTRUCTURA METÁLICA



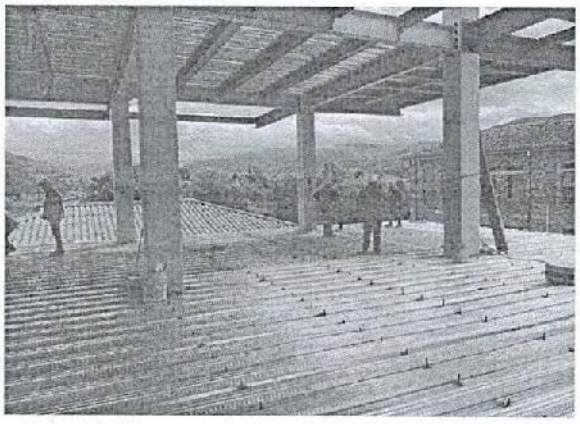



CUBIERTA







MAMPOSTERÍA

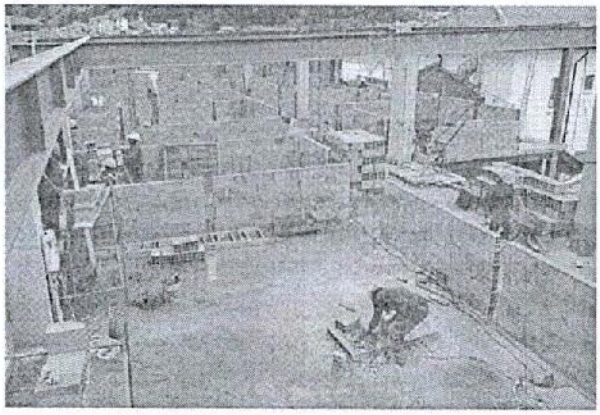

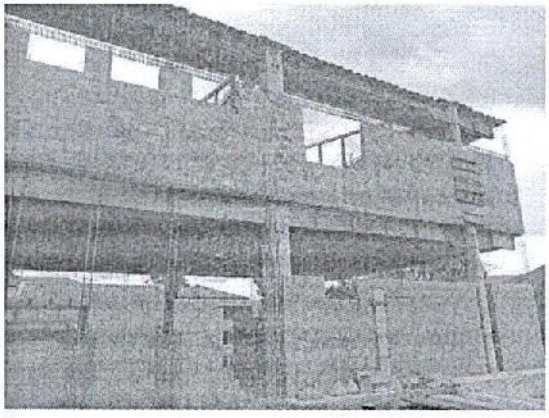



INSTALACIONES SANITARIAS

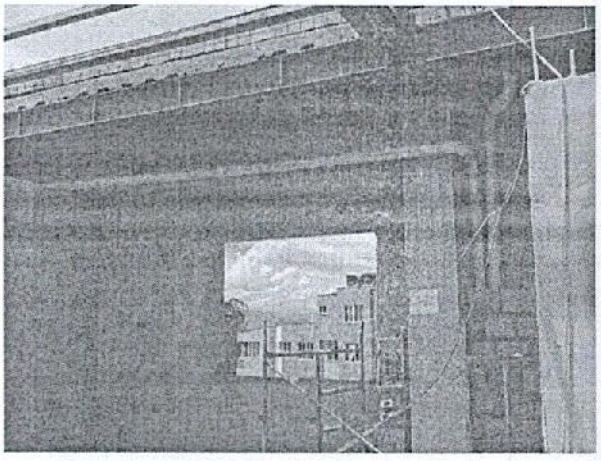

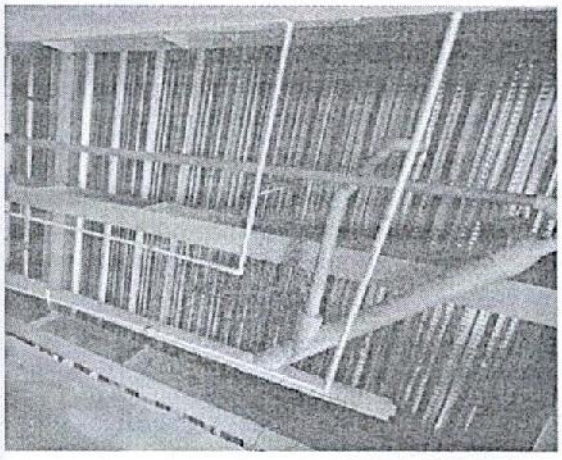



INSTALACIONES HIDRÁULICAS

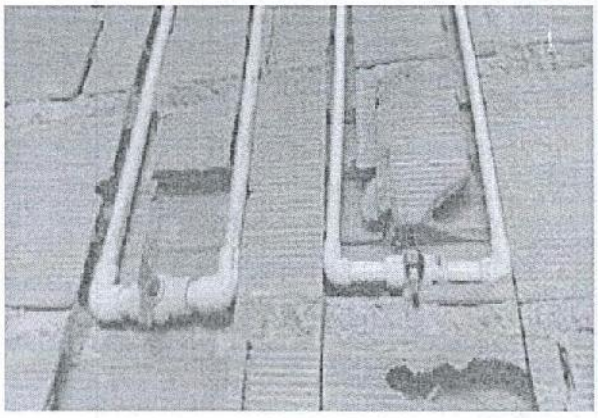

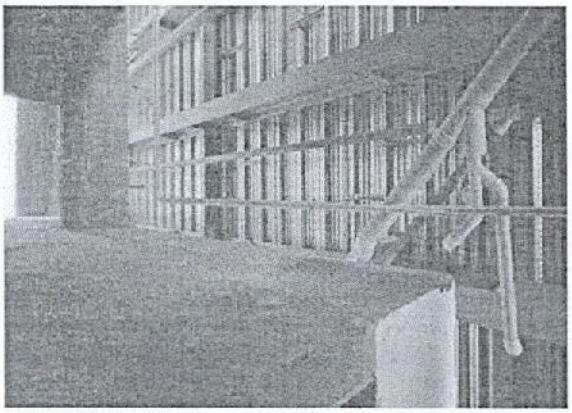



RED CONTRA INCENDIO

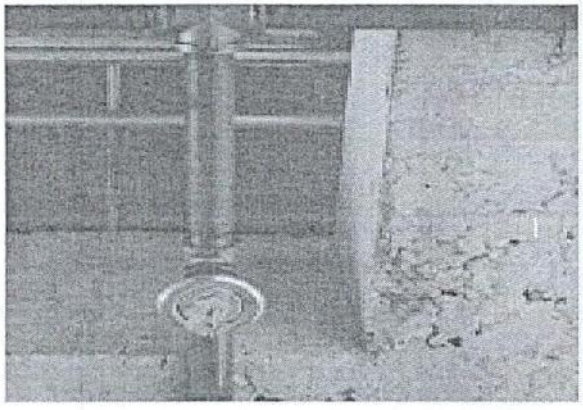

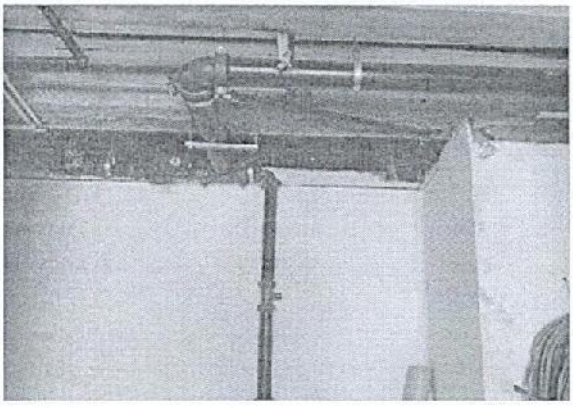


INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

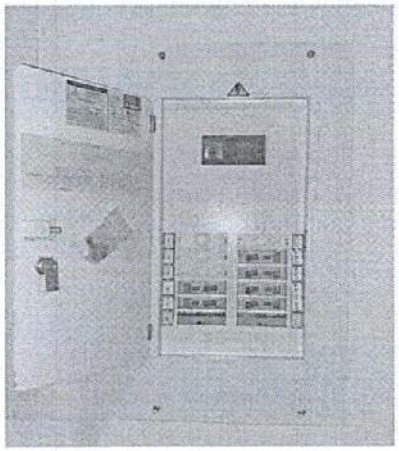

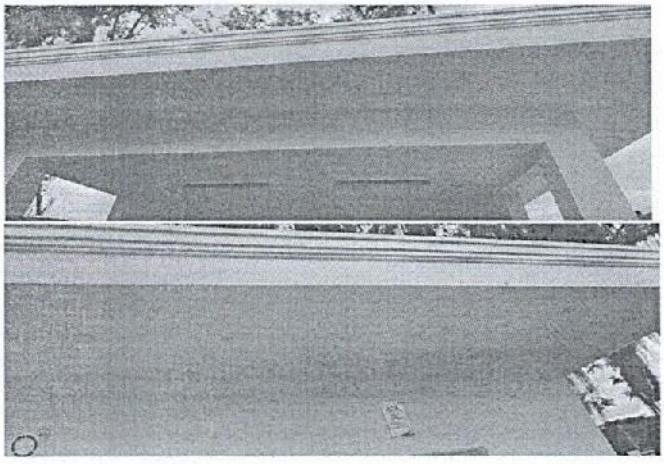



PISOS BASES



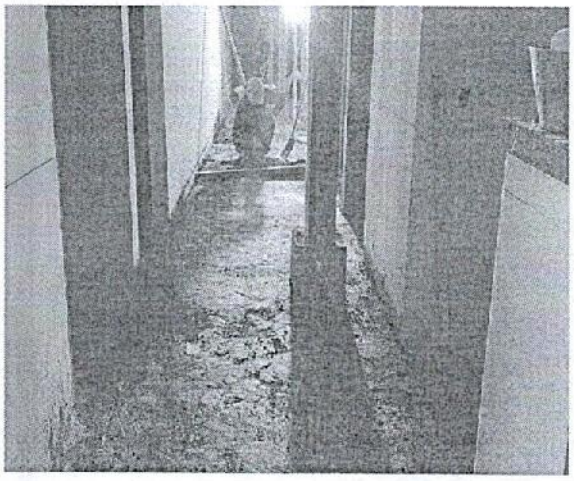



CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)

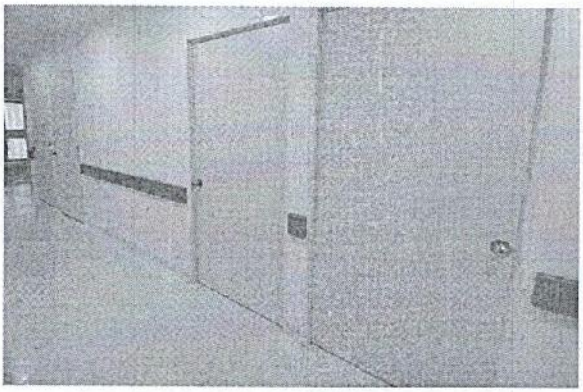

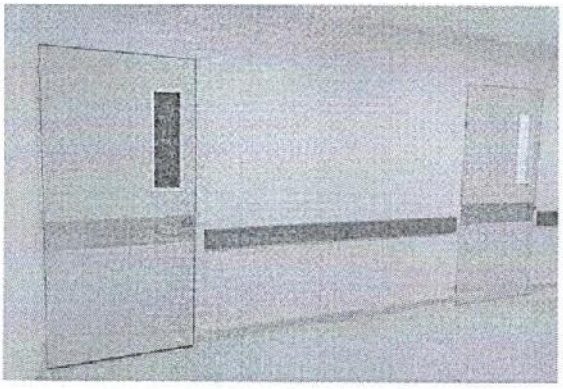



PAÑETES

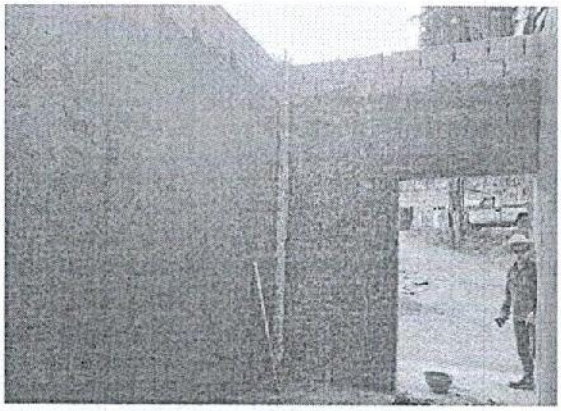

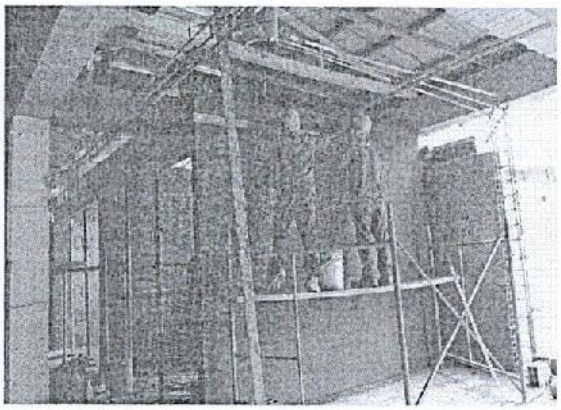



ACABADOS DE MUROS

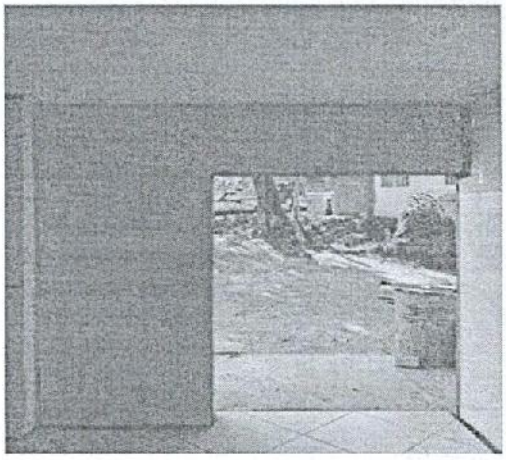

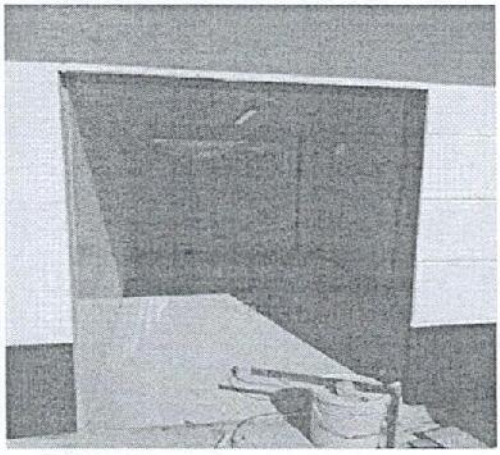



ACABADOS PISOS

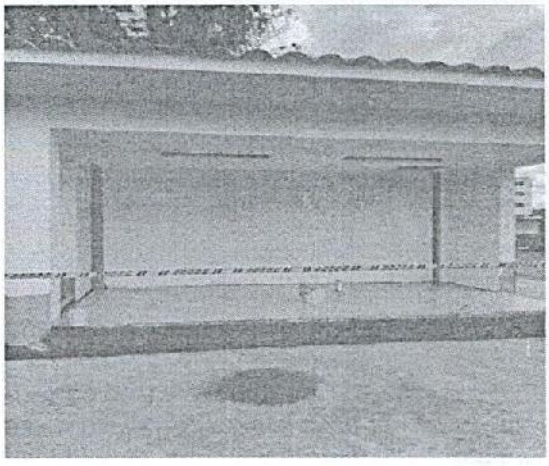

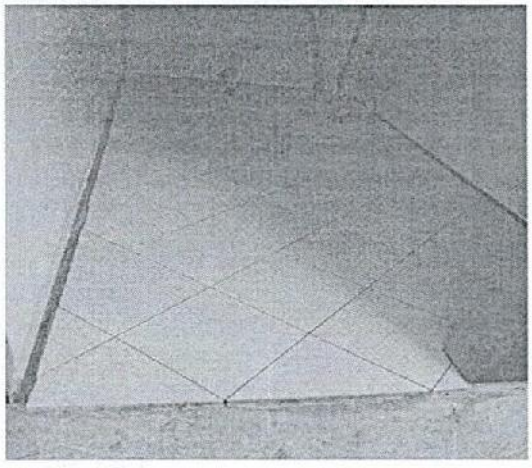


APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

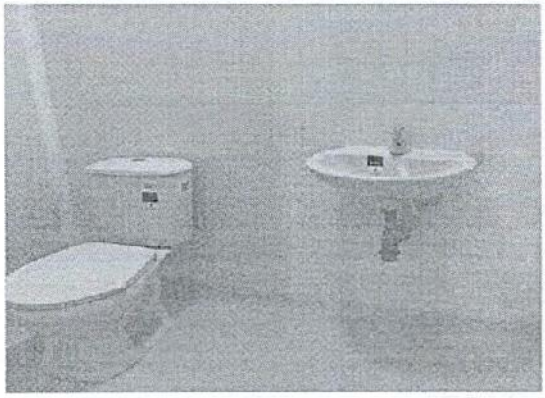

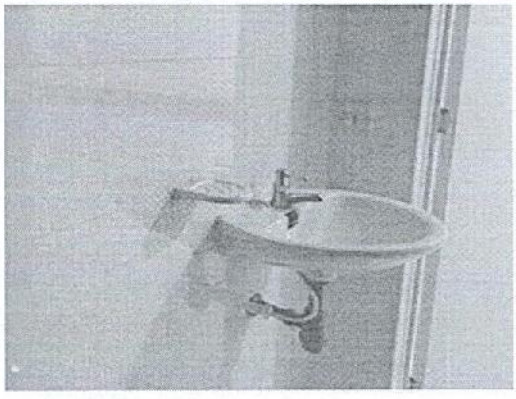


PINTURA

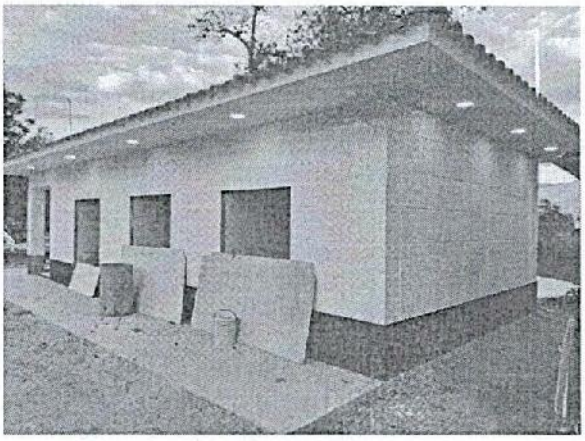





CIELO RASOS



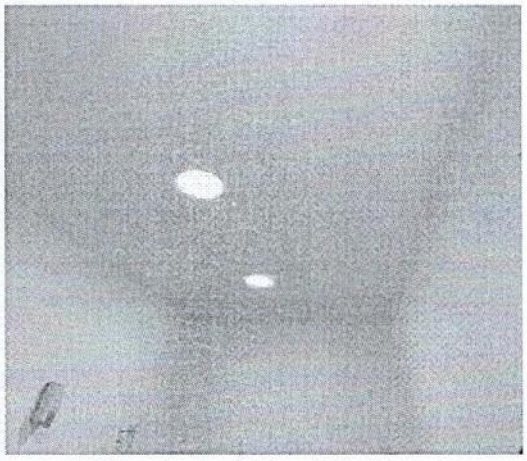

GASES MEDICINALES

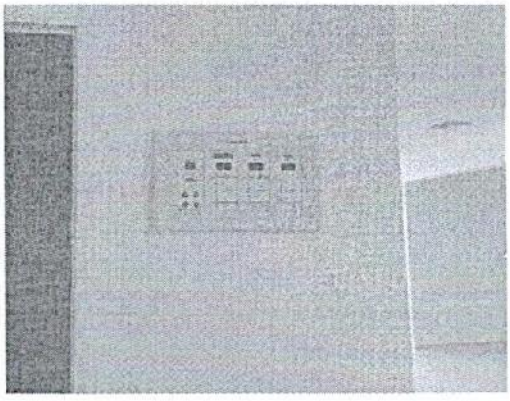

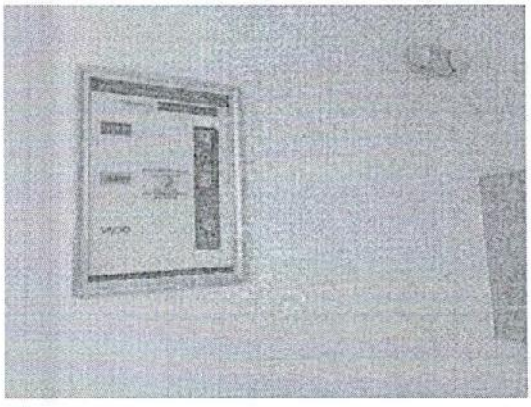

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO	
Anticipo 40%:	$ 25.611.233.080,00
Acta parcial 1:	$ 10.681.193.566,88
Acta parcial 2:	$ 3.054.273.511,53
Acta parcial 3:	$ 4.448.460.052,02
Acta parcial 4:	$ 1.403.466.358,77
Acta parcial 5:	$ 3.180.168.623,59
Acta parcial 6:	$ 4.305.543.655,45
Total amortizado	$ 10.829.242.307,30
Total pagado:	$ 27.073.105.768,24
Valor Total del Contrato	$ 64.693.471.857,35
Saldo restante:	**$ 37.620.366.089,11**

Avance financiero		41,85%
Avance Físico		41,85%

Una vez revisadas las cantidades de obra ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato No 087-23 cuyo objeto es "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER". en conjunto con el contratista **CONSORCIO DE GARCÍA ROVIRA** y la interventoría al contrato **UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL** se considera conveniente realizar el pago correspondiente al acta parcial No 6 de la siguiente forma:

Periodo de ejecución: del 18/12/2024 al 31/07/2025
Valor acta parcial No 6: $ 4.305.543.655,45
Amortización anticipo 40%: $ 1.722.217.462,18
Valor a pagar en la presenta acta: $ 2.583.326.193,27
Se expide en Málaga, al día cuatro (04) del mes de agosto del 2025.

Ing. JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	1 de 15

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA No. 087-2023

1.INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	Agosto 06 de 2025
Informe de Supervisión:	006
Periodo de Seguimiento:	Del 18 de Diciembre de 2024 al 31 de Julio de 2025
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT	901.740.580 - 3
Representante legal:	Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto
C.C:	Cc # 91.273.201
Fecha de inicio:	04 de Septiembre de 2023
Fecha de finalización:	03 de Septiembre de 2026
Valor del Contrato:	$ 64.028.082.699,20
Valor de adición:	$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	$ 64.693.471.857,35
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 // 28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas:	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del Anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial

Pago de seguridad social:

Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes parafiscales, de fecha 31 de julio de 2025; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondiente al período del 18 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025, así:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9481335964	Pensión, ARL y CC - enero de 2025 Salud – febrero de 2025 	04/02/2025
9482712207	Pensión, ARL y CC - febrero de 2025 Salud – Marzo de 2025 	04/03/2025
9484149855	Pensión, ARL y CC - Marzo de 2025 Salud – Abril de 2025 	04/04/2025

9485512424	Pensión, ARL y CC - Abril de 2025 Salud – Mayo de 2025 	02/05/2025
9487210272	Pensión, ARL y CC - Mayo de 2025 Salud – Junio de 2025 	09/06/2025
9488310392	Pensión, ARL y CC - Junio de 2025 Salud – Julio de 2025 	04/07/2025

3. REVISION TECNICA:

Descripción del alcance del contrato:	
Obligación: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU`S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud) e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado	Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Periodo de esta supervisión están: **Central de Residuos:** **Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.** Finalización de cubierta en Teja Castellana Instalación de Tubería EMT Montaje de Estructura Cielo raso y Cierre con lámina. Enchape de muros exteriores e interiores y pisos Instalación de Tablero y distribución eléctrica. **Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025.** Instalación de celosías y puertas de ingreso a los cuartos. **Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025.** Instalación de puertas principales de ingreso. Montaje de celosías traseras y canaletas para aguas lluvias. Aplicación de acabados en pintura sobre carpintería metálica y muros. **Modulo A:** **Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.** Excavación sobre eje 1 para fundición de muro contención. Instalación de Acero para zapatas, pedestales y vigas de conexión entre ejes. Limpieza y verificación topográfica de pernos de anclaje. **Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025.** Excavaciones mecánicas hasta alcanzar suelo competente Mejoramiento del terreno mediante concreto ciclópeo (33 m lineales) y armado de acero figurado. Construcción integrada de zapatas, pedestales y zarpas de muro de contención.

	Metaldeck: Se inició la instalación del sistema de entrepiso metálico. Aplicación de autonivelante en las placas base. **Del 26 de junio al 31 de julio de 2025** Montaje de estructura metálica, incluyendo columnas y vigas. Instalación de lámina metaldeck y fundida de entrepiso con concreto 4000 psi. Aplicación de pintura anticorrosiva a elementos metálicos. Instalación de canaleta pluvial sobre la estructura. **Módulo D** **Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025.** Montaje estructural nocturno del pórtico entre ejes 01-P1 y 101-91. Aplicación de fondo anticorrosivo a elementos metálicos Fabricación de elementos como conectores, rigidizadores y accesorios estructurales, conforme planos. **Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025** Fabricación de elementos metálicos en taller anexo Aplicación de pintura anticorrosiva. Transporte y descargue de columnas y vigas al sitio. Izaje e instalación de columnas en eje Ñ1 y conexión con eje O1. **Del 01 de Abril al 30 de abril de 2025** Fabricación e instalación de elementos estructurales (vigas. conexiones) para los niveles 4.30 m y 8.60 m. Instalación de 156 m² de lámina metaldeck con conectores de cortante en la placa del segundo piso. **Del 01 de mayo al 25 de mayo de 2025.** Izaje y montaje de vigas metálicas en el nivel 8.60 m

	Fundida del muro de contención de 5.90 m de altura (cierre costado norte del Módulo F). Fabricación y traslado de estructura metálica a lote auxiliar. Aplicación de protección (cromato de zinc) a elementos estructurales. Izaje e instalación de estructura metálica, iniciando por columna 8-4, seguido por vigas en pórtico. **Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025** Izaje de columnas metálicas en los ejes C1-C2-D2 Mejoramiento del terreno con concreto ciolópeo en el muro perimetral Colocación de acero de refuerzo para zarpas y muros de contención Fundida de concreto en zapatas, vigas y muros (concreto 4000 PSI) Instalación de formaleta metálica y aplicación de impermeabilizante **Del 01 de Abirl al 30 de abril de 2025** Relleno con material seleccionado tipo recebo compactado al 95% en el costado posterior del muro de contención perimetral. **Del 01 de mayo al 25 de mayo de 2025.** Izaje de estructura metálica (entre los ejes C2-C4 y 2F-2G). Instalación de conexiones metálicas, rigidizadores, columnas y vigas. Verificación y ajuste de elementos estructurales Aplicación de pintura anticorrosiva sobre componente metálicos. Excavación e instalación de red de recolección de agua lluvia sobre eje 4. **Del 26 de mayo al 25 de junio de 2025.** Estructura metálica: Continuación en el montaje de elementos estructurales. Bases de columnas: Instalación completa de placas base.

	Instalación de cubierta metálica sobre estructura ya montada. Instalación de lámina metaldeck y conectores para placa colaborante. Fundición de columnas combinas en concreto de 4000 psi. Fundida de placa de colaborante en concreto de 4000 psi Colocación de doble malla electrosoldada en placa de contrapiso. **Del 26 de mayo al 25 de junio de 2025.** Mampostería: Se avanzó en la construcción de muros interiores y exteriores en ambos niveles. Elementos de confinamiento: Instalación de columnetas y viguetas de confinamiento, incluyendo fundida de 12 columnas en concreto 4000 psi Cubierta: Montaje parcial de la estructura metálica de cubierta sobre las columnas recién fundidas. Redes sanitarias: Instalación de tubería sanitaria y conexiones interiores. Aplicación de autonivelante en las placas base. **Del 26 de junio al 31 de julio de 2025.** Fundida de placa de contrapiso y entrepiso con concreto 4000 psi, incluyendo curado con antisol. Instalación de malla electrosoldada y conectores de cortante. Fundida de columnas metálicas compuestas. Construcción de muros de mampostería interior y exterior (primer y segundo piso). Fundida de viguetas de amarre en ambos niveles. Instalación de sistema sanitario y estructuras metálicas para cubierta.

Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:


Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 18 de diciembre de 2024 a 31 de julio de 2025; soportadas por el Apoyo de la Supervisión Ingeniero José Alejandro Sandoval Medina con Informe Técnico de fecha 04 de Agosto de 2025.


De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 41.85%, siendo este avance físico del proyecto, y en igual porcentaje, el avance financiero, a 31 de julio de 2025 respectivamente.


Observaciones Adicionales:

Durante el periodo de está supervisión se realizaron Comités de Seguimiento y ejecución de obra donde intervinieron el delegado del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaria de Salud Departamental, Supervisión del Contrato, Apoyo a la Supervisión, Contratista de Obra e Interventoría.



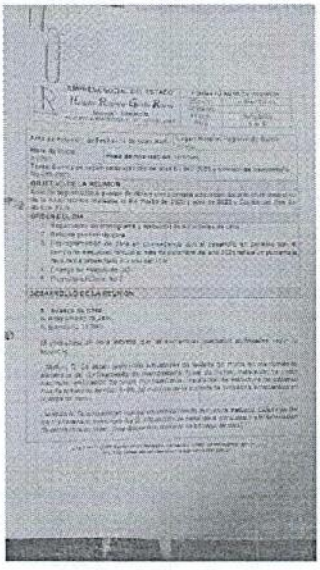









Registro Fotográfico:






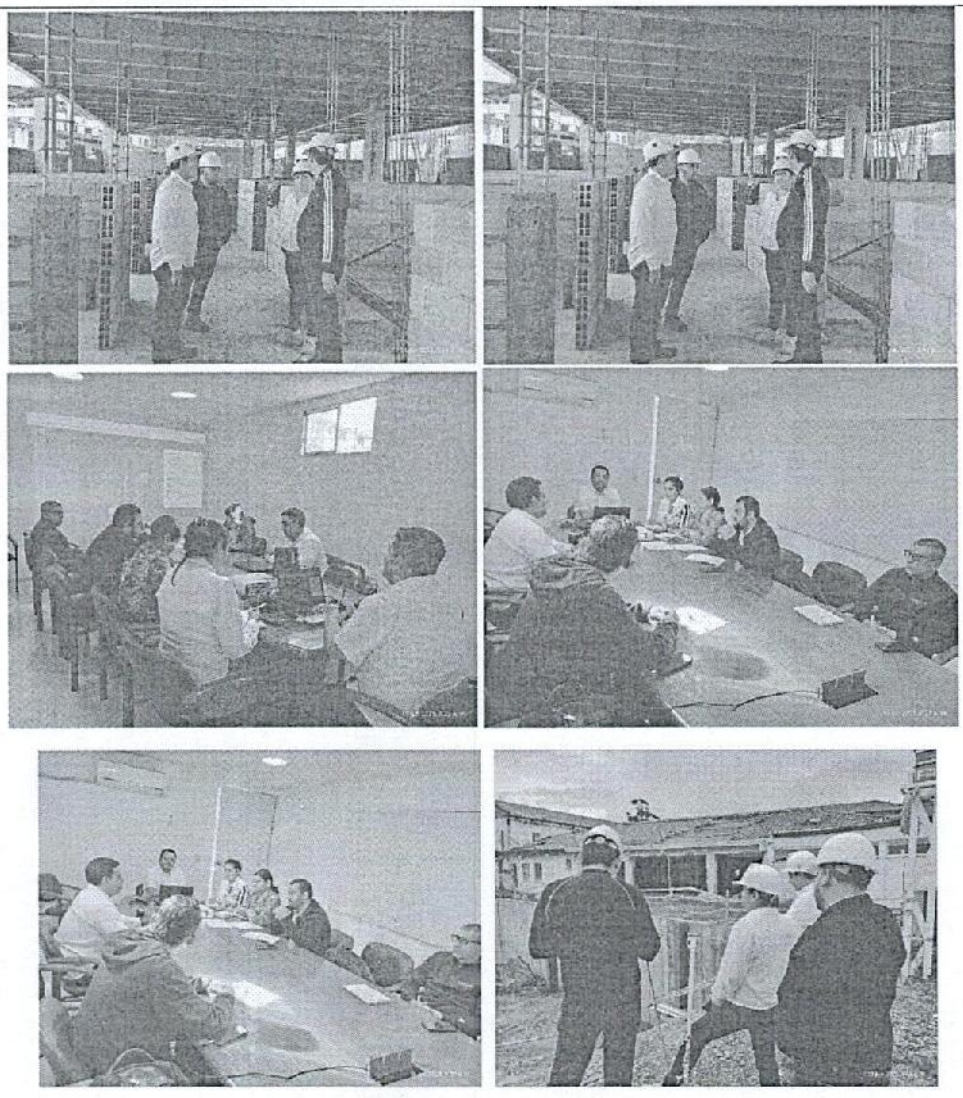

7834

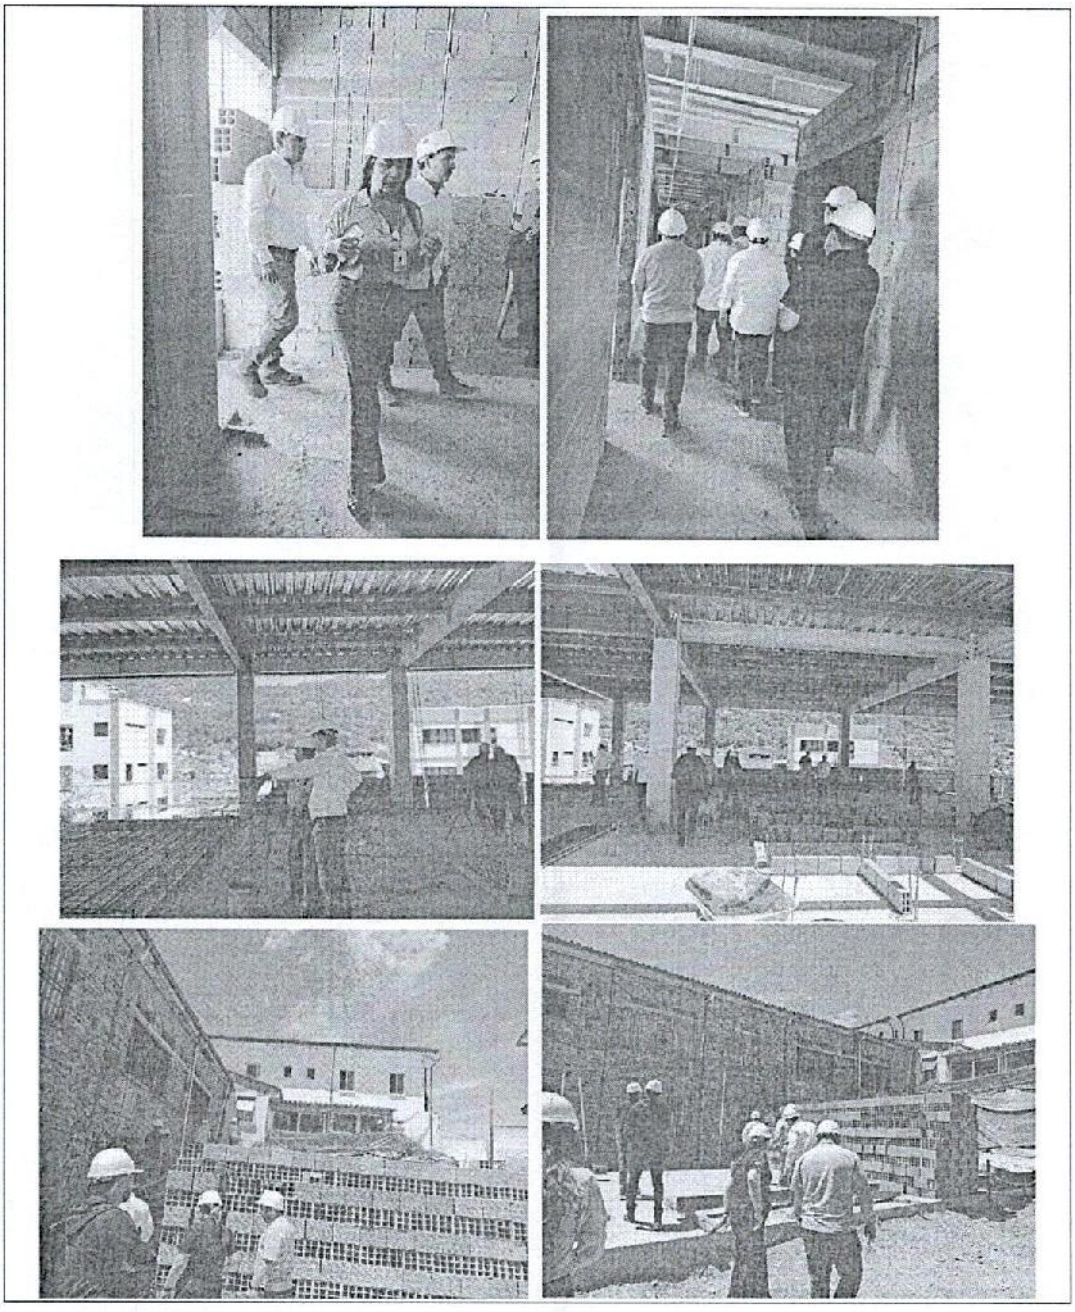



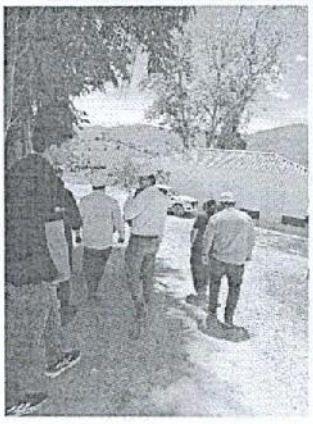



Documentos verificados para el pago:

- Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos:
  - Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.
  - Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025.
  - Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025.
  - Del 01 de abril al 30 de abril de 2025.
  - Del 01 de mayo al 25 de mayo de 2025.
  - Del 26 de mayo al 25 de junio de 2025.
  - Del 26 de junio al 31 de julio de 2025.
- Factura Electrónica No. CGR 9 expedida el 06 de agosto de 2025.
- Planillas de pago de Seguridad Social No 9481335964, 9482712207, 9484149855, 9485512424, 9487210272, 9488310392, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 18 de diciembre de 2024 a 31 de julio de 2025 con fechas de pago registradas en

el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 y 3 del presente informe.

- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 31 de julio de 2025.
- Informe escrito y un CD con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.
- Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la actual Factura No. CGR 9, por valor $ 1.722.217.462,18

Nota: Esta información reposa en la Oficina de contratación de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira

4. REVISION FINANCIERA:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
Anticipo inicial:	$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	$ 4.272.477.426.75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	$ 1.221.709.404,61
Amortización anticipo en Pago No. 003:	$ 1.779.384.020,81
Amortización anticipo en Pago No. 004:	$ 561.386.543,51
Amortización anticipo en Pago No. 005:	$ 1.272.067.449,44
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 9 (40%):	$ 1.722.217.462,18
Total Amortizado a 31 de Julio de 2025:	$ 10.829.242.307,30

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	$ 4.305.543.655,45
TOTAL GENERAL	$ 4.305.543.655,45

Valor del contrato:	$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores Acta No. 001, Acta No. 002, Acta No. 003, Acta No.4 y Acta 005	$ 9.107.024.845,12

Valor anticipo amortizado en la presente factura Acta No. 006	$ 1.722.217.462,18
Saldo anticipo después de amortizaciones	$ 14.781.990.772,38
Valor Pagado Acta No. 001	$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	$ 4.448.460.052,02
Valor Pagado Acta No. 004	$ 1.403.466.358,77
Valor Pagado Acta No. 005	$ 3.180.168.623,59
Valor pagado a la fecha:	$ 22.767.562.112,79
Valor de la presente factura Acta No. 006	$ 4.305.543.655,45
Descuentos a realizar Amortización anticipo (40%) presente factura Acta No. 006:	$ 1.722.217.462,18
Valor a Pagar después de descuentos	$ 2.583.326.193,27
Saldo por ejecutar después del pago del presente periodo:	$ 22.838.375.317,11

5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
06 de Agosto de 2025	• Informe de supervisión • Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos: - Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. - Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025. - Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025. - Del 01 de abril al 30 de abril de 2025. - Del 01 de mayo al 25 de mayo de 2025. - Del 26 de mayo al 25 de junio de 2025. - Del 26 de junio al 31 de julio de 2025. • Factura Electrónica No. CGR 9 expedida el 06 de agosto de 2025. • Planillas de pago de Seguridad Social No 9481335964, 9482712207, 9484149855, 9485512424, 9487210272, 9488310392, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta

	supervisión del 18 de diciembre de 2024 a 31 de julio de 2025 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 y 3 del presente informe. • Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 31 de julio de 2025. • Informe escrito y un CD con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión. • Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la actual Factura No. CGR 9, por valor $ 1.722.217.462,18

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	Martha Liliana Duarte Rueda
Cargo:	Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez – Profesional Administrativo	Fecha: 06-08-2025	Firma:
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 06-08-2025	Firma:

7837

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

GARCIA ROVIRA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 385

FECHA: 06/08/2025

EL ORDENADOR DEL GASTO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO HACEN CONSTAR:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EXISTE SALDO DE DISPONIBILIDAD PARA RESPALDAR EL SIQUIENTE COMPROMISO:

PAGO SEGUN ACTA PARCIAL # 6 DEL CONTRATO DE OBRA 087-09-08-23

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	4,305,543,655.45
		4,305,543,655.45

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL

CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR

7838

GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

REGISTRO PRESUPUESTAL No 405

FECHA: 06/08/2025

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO SEGUN ACTA PARCIAL # 6 DEL CONTRATO DE OBRA 087-09-08-23

DISPONIBILIDAD : 385 DEL 06/08/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	4,305,543,655.45
		4,305,543,655.45

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO PESOS

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL

CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR

7839

GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

N.I.T.: 900067169

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

TA DE CONTABILIDAD OBRA : NC02-1

FECHA DOCUMENTO : 06/08/2025

RECIBIDO DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727

LA SUMA DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO COP M/L

CONCEPTO: TRASLADO DE CUENTA POR PAGO REALIZADO A CONTRATO DE OBRA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
299003.01	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	BI 1	4,305,543,655	
443005.01	Nacional			4,305,543,655
		TOTALES IGUALES	$ 4,305,543,655	$ 4,305,543,655

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN		C. C. o NIT NÂº

7340

GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T.: 900067169
DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

BANTE DE EGRESO GENERAL : CE-199
FECHA DOCUMENTO : 06/08/2025

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580
LA SUMA DE: CUATRO MIL CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE COP M/L
CONCEPTO: PAGO FACTURA OBRA, SEGUN ACTA PARCIAL # 6 DEL CONTRATO DE OBRA 087-09-08-23

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FACTURA	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	ANTICI/DCTO
240101.01	Bienes y Servicios	CGR 9	FCS 129	2,281,938,137	
138490.01	Otras cuentas por cobrar			1,722,217,462	
113210.01	Cta ahorros 312-00001408 adecuacion y				4,004,155,600
				4,004,155,600	4,004,155,600

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
angelafuentes		
FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA		C. C. o NIT

7841

GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

DEFINITIVA DE PAGO No 514

FECHA: 06/08/2025

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO SEGUN ACTA PARCIAL # 6 DEL CONTRATO DE OBRA 087-09-08-23

REGISTRO PRESUPUESTAL : 405 DEL 06/08/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.099	Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	4,305,543,655.45
	TOTAL A PAGAR :	4,305,543,655.45

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN

[redacted]ALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR

7842

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T.: 900067169
DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

URA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-129
FECHA DOCUMENTO : 06/08/2025

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580 **SOPORTE:** CGR 9
LA SUMA DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO COP M/L
CONCEPTO: SERVICIO DE OBRA SEGUN ACTA PARCIAL # 6 DEL CONTRATO DE OBRA 087-09-08-23

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
161590.01	otras construcciones en curso		4,305,543,655.45	
243626.01	contratos de obra			86,110,873.11
244023.01	Contribucion contratos de obra publica 5%			215,277,182.77
240101.01	Bienes y Servicios			2,281,938,137.39
190690.01	Otros avances y anticipos	BI 1		1,722,217,462.18
	TOTALES IGUALES		$ 4,305,543,655.45	$ 4,305,543,655.45

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN	Mabel Calderón Aceros	Cesar Augusto Becerra Correa

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD
NIT: 900067169
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONSORCIOGR9
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 12-08-2025 **Hora:** 09:58:52
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: FUENTES25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,004,155,599.57	**Valor Registros Procesados:** $4,004,155,599.57	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046669997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	4,004,155,599.57	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025

2843
