Puerto tejada cauca Diciembre de 2025

Señores:
Secretaria de Planeación

Cordial saludo

INFORME AVANCE DE OBRA

El día 13 del mes de octubre se da inicio a las obras acordadas en el contrato # 170 del 2025 adecuación y mejoramiento de la plaza del campesino del Municipio de Puerto Tejada Departamento del Cauca.

Se inicia con el desmonte de malla y tubo en mal estado, la demolición de muros en ladrillo soga como la de las columnetas en concreto reforzado, se realiza el retiro en volqueta del material sobrante de la demolición.

Se solicita a los comerciantes que se hallan paralelos al desmonte y construcción del muro para que se aparte un poco del mismo y manifiestan que lo no harán en virtud que sus kioscos están anclados y el moverlos se destruirían por lo tanto no se retiraran.

3 días más tarde se inicia con la demolición de la viga cimentación y la excavación y corte de pedimento para la nueva estructura.

Se hacen excavaciones .40 x .40 x .35 para construcción de zapatas 20 en total.

Se funde a su vez viga en concreto reforzado de 40 x 20 x 39 mts de longitud.

El 13 de octubre se continúa con la pegada de ladrillo limpio.

Se solicita algunos propietarios de vehículos que se encuentran en el área de trabajo para que aparten los mismos ya que se iniciara con la fundición de los pisos y manifiestan el no tener información de la realización de esta obra y que a su vez no tienen donde trasladar sus vehículos.

El día 14 se inician los cortes de pavimento y posterior a ello se da la función de los mismos con el reforzamiento en malla electro soldada actividad que se dificulta debido al continuo uso y mantenimiento dentro del área de trabajo

Para el día 17 se instalan los postes del cerramiento y se funden las columnetas.

El día 20 de Octubre se hace la instalación de la malla electro soldada y su correspondiente pintura.

Se hace el retiro de sobrantes de excavación y demolición en volqueta con destino a la disposición final de escombro en la Vereda los bancos.

El día 8 de Noviembre se inicia con la demarcación y excavación de los huecos para el cerramiento en lámina posterior a ello se instalan láminas de zinc de altura 2.44 en una longitud de 31 ml los cuales permitirán la delimitación de la basura contiguo al shu de recolección

Anexos fotográficos

De antemano agradezco la atención y la confianza brindada.

Muy comedidamente

JOSE AGUSTIN ZUÑIGA AGUILAR

Contratista de obras

DEMOLICIÓN DE MUROS LADRILLO SOGA







DEMOLICIÓN DE VIGAS







PEGA DE LADRILLO

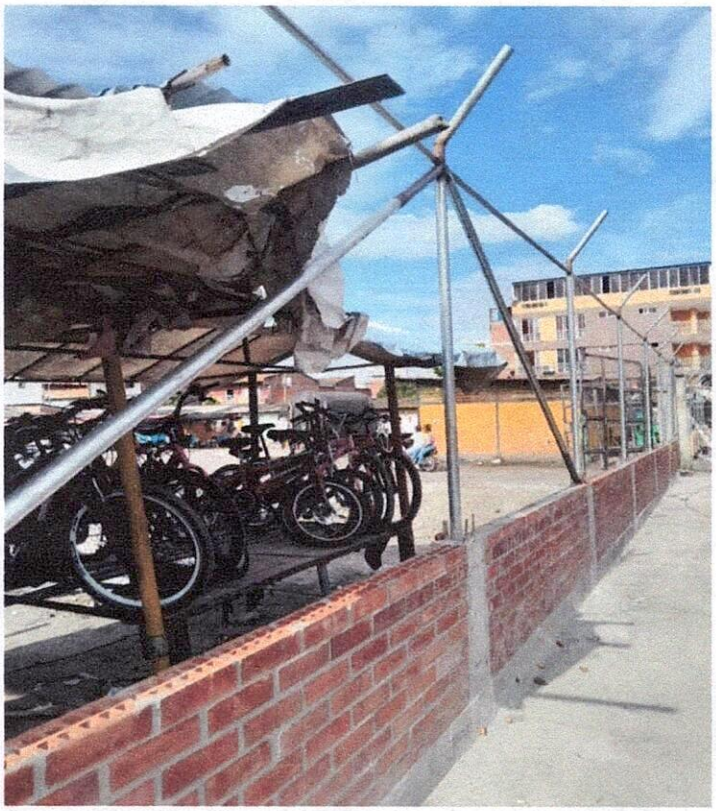

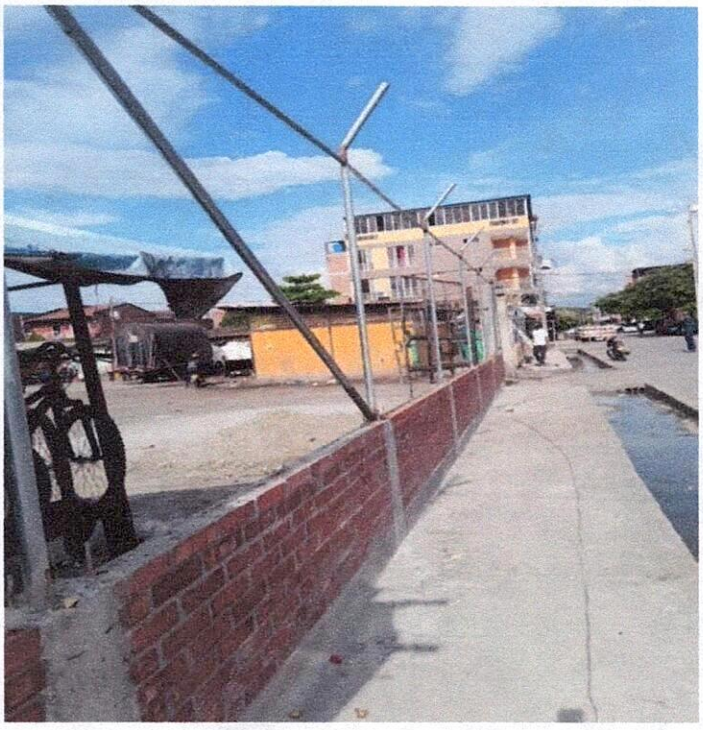


FUNDICIÓN DE COLUMNETAS Y POSTE GALVANIZADO

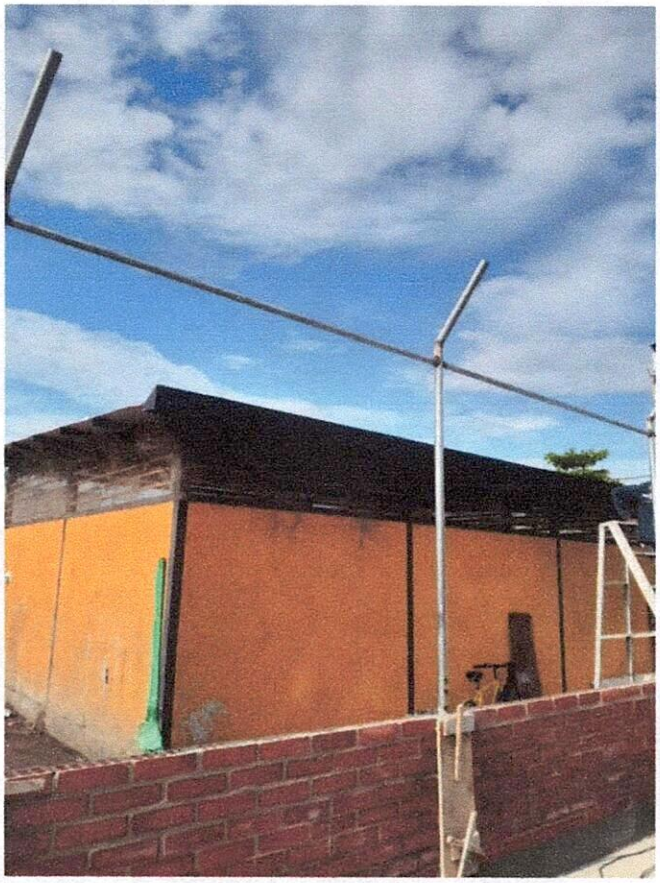

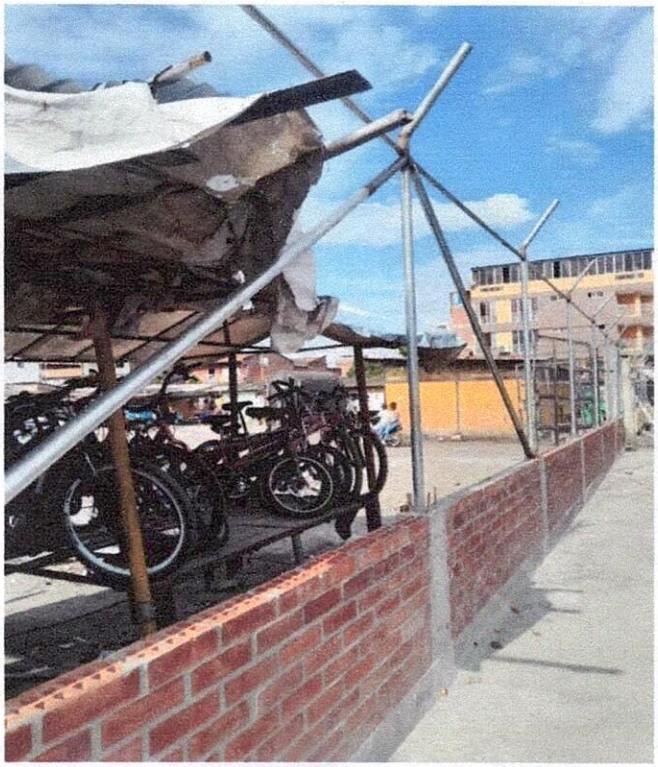


VIGA DE SEDIMENTACIÓN

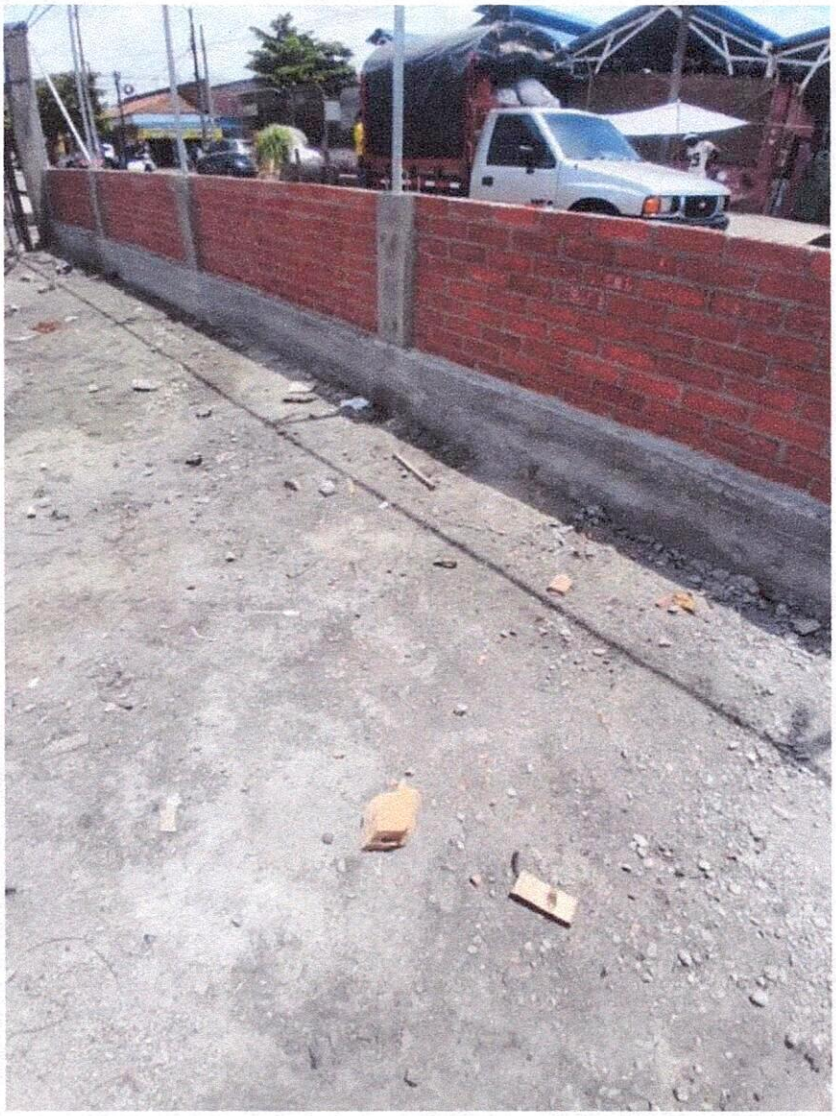


INSTALACION DE MALLA A 2 MTS DE ALTO



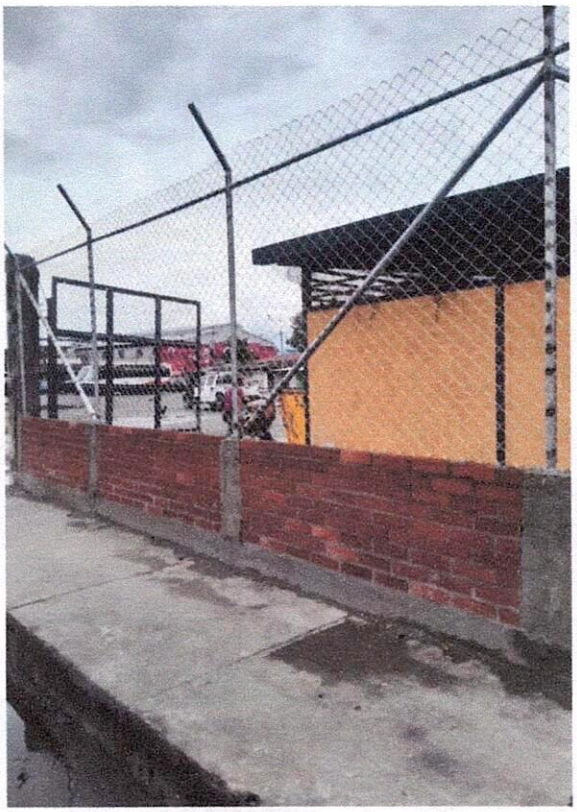

CORTE DE PAVIMENTO

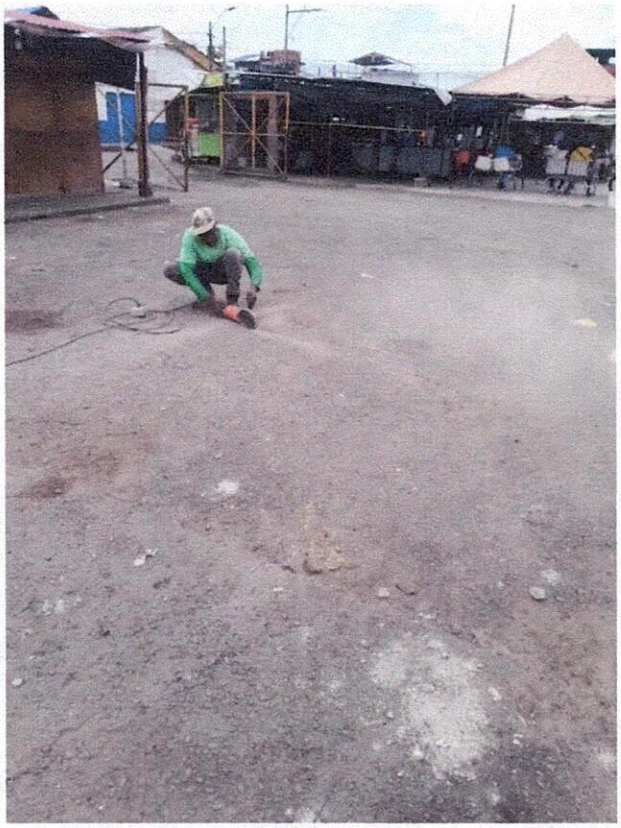





FUNDICION DE PISO EN CONCRETO





Cerramiento en laminas

