PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - SEDE OFICINA AVENIDA CARACAS (Bogotá)

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC**	SEDE	**OFICINA AVENIDA CARACAS Av Caracas No 36 -41**	SUPERVISOR	**ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	25,00%		85,00%
Valor básico de la Obra	$ 31.728.432,00	$	$ 107.876.668,00
			0

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	45,25%	92,64%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 57.424.286,65	$ 117.572.522,65

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

IMAGEN OFICINA





IMAGEN OFICINA




AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:


1. Adecuacion de redes electricas tuberia y cableado.
2. Instalacion de caja de tacos para control de fluido electrico.
3. Adecuacion de baños, instalacion de enchapes, pintura y combos sanitarios.

IMAGENES AVANCE

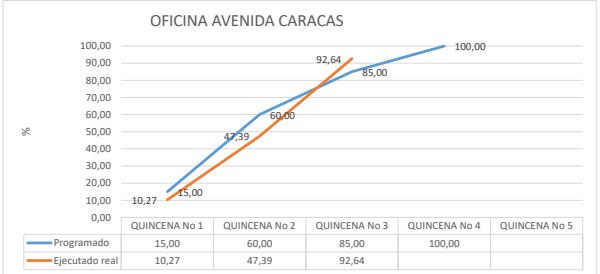

	QUINCENA No 1	QUINCENA No 2	QUINCENA No 3	QUINCENA No 4	QUINCENA No 5
Programado	15,00	60,00	85,00	100,00	
Ejecutado real	10,27	47,39	92,64		





Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Adecuacion de redes electricas.





Comentario: Adecuacion de redes electricas.





Comentario: Adecuacion de redes electricas.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - SEDE OFICINA AVENIDA CARACAS (Bogotá)

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC**	SEDE	**DIRECCIÓN GENERAL Calle 26 No 27-48**	SUPERVISOR	**ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma.	 Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND
