INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - CENTRO DE BIENESTAR Y ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS. (Fusagasuga)

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE: **CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS (Fusagasuga).** SUPERVISOR: **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	14,29%		28,57%
Valor básico de la Obra	$ 41.848.467,14	$	$ 83.696.934,29

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,69%	3,69%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 10.823.211,67	$ 10.823.211,67

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	2,5 MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2026-02-15

AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.

IMAGENES VISITA.

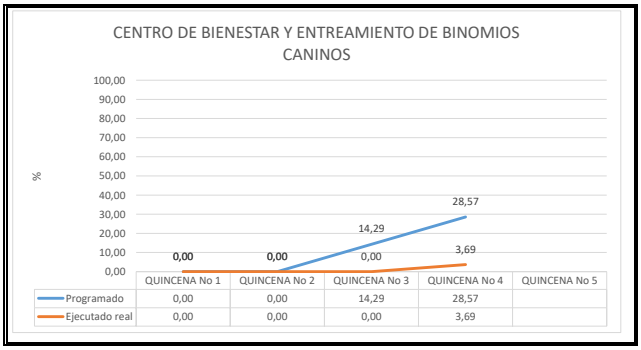





Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.





Comentario: Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.

Comentario: Se dio inicio a las actividades de nivelacion y replanteo para proceer con el inicio de las actividades de construccion.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - CENTRO DE BIENESTAR Y ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS. (Fusagasuga)

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC**	SEDE	**CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS (Fusagasuga).**	SUPERVISOR	**ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma, teniendo en cuenta que se realizo un prorroga que permitira dar continuidad a los trabajos de obra hasta su terminacion.	Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND
