OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta Recibo)

LINO RODRÍGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2026

FECHA: 13 DE ENERO DE 2026

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

CONTRATO No.	563 del 16 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
R/LEGAL	No aplica
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Lino Rodríguez Ochoa
APOYO SUPERVISIÓN	No aplica
VALOR CONTRATO	$ 35,891,025.00
FECHA INICIACIÓN	23 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA TERMINACIÓN	2 DE ENERO DEL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	Plazo de ejecución
% AVANCE FINANCIERO	100.00%
% AVANCE FISICO	100.00%
FECHA PRESENTE INFORME	13 de enero de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 049 de 2013 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista ; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Rehabilitación punto 1 (K8)	Tránsito normal
Rehabilitación punto 2 (K8+200)	Tránsito normal

VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	5

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			23/dic/2025
Buen manejo y Correcta inversión del Anticipo	x			23/dic/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	x			23/dic/2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			23/dic/2025
Otras				

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	35,891,025			
Valor Anticipo o Pago Anticipado				0
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta No.1			29,228,944.00	29,228,944.00
Valor Acta Recibo			6,662,081.00	6,662,081.00
Saldo por ejecutar			0	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**35,891,025**		**35,891,025**	**35,891,025.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Es este caso No hubo acaecimiento del riesgo.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta incio	23/dic/2025
Acta parcial No. 1	29/dic/2025
Acta de Recibo final	13/enero/2026

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe final con sus respectivos soportes como: seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros, los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7	PUNTAJE:	100	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe final del Contratista
2. Anexo 2. Informe de Supervisión

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 1
INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Lino Rodríguez Ochoa

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 ***Excavacion manual en conglomerado (nivelación)***

Se realizó la preparación del perfil para la instalación del relleno y para la construcción de la cuneta.

2 ***Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada.***

Se recuperó la banca vial en los puntos 1 y 2 proyectados inicialmente.

3 ***Gavion en piedra común (incluye geotextil NT-1600).***

Por recomendación (concepto del especialista en Geotecnia) no se ejecutó este item. Se modificó la solución técnica.

4 ***Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)***

Se construyeron dos tramos de cuneta en concreto hidráulico (K8) y un tramo de cuneta en terreno natural (K8+200)

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Lino Rodríguez Ochoa

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 1
k8+000 (sector Cantera el Moco)

ANTES...



DESPUÉS...






FOTOGRAFÍA No. 2
K8+200 (sector cruce Río Surimena)





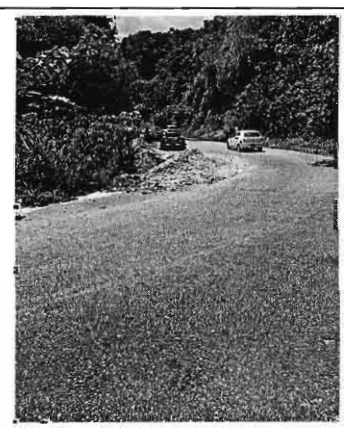



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Lino Rodríguez Ochoa

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 3
Cunetas construidas

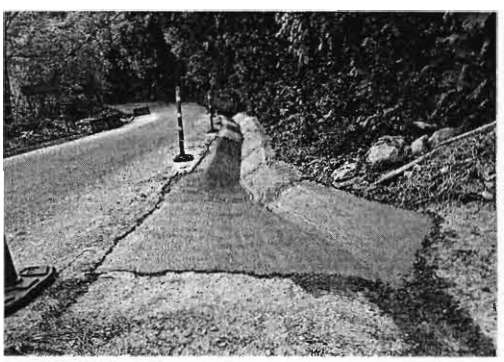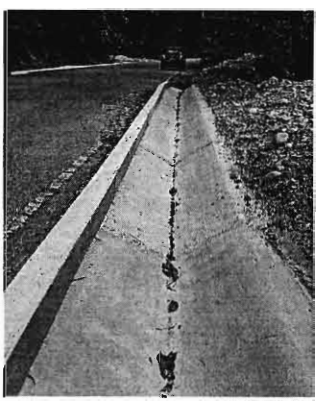LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 3

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Lino Rodriguez Ochoa

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	Excavacion manual en conglomerado (nivelación)	m3	28.12	22.56	100%	80.2	-5.6	$101,419.00	$ 2,851,902	$ 2,288,013
2	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada.	m3	100.40	301.32	100%	300.1	200.9	$97,003.00	$ 9,739,101	$ 29,228,944
3	Gavion en piedra común (incluye geotextil NT-1600).	m3	54.00	0.00	100%	0.0	-54.0	$406,613.00	$ 21,957,102	$ -
4	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)	m	12.00	39.00	100%	325.0	27.0	$111,910.000	$ 1,342,920	$ 4,364,490
								COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 35,891,025**	**$ 35,881,447**
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -9,578


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 4

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Lino Rodríguez Ochoa

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

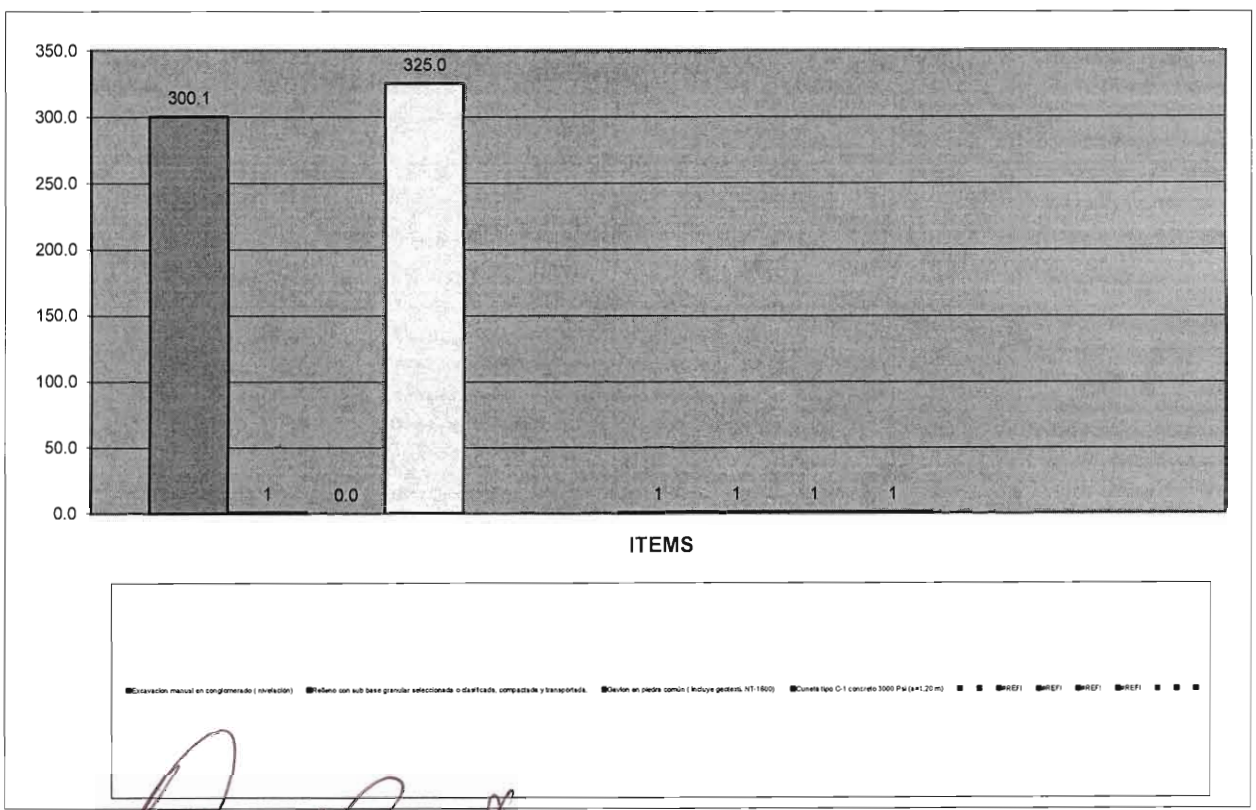

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 5

INFORME FINAL DE SUPERVISION (Acta de Recibo)

OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C. o NIT: 6773569-7
INTERVENTOR	Lino Rodríguez Ochoa

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
NOVIEMBRE	1					
	2					
	3					
	4					
DICIEMBRE	1					
	2					
	3	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Seguimiento	
	4			Acta parcial 1	Seguimiento	Informe supervisión
ENERO	1				Seguimiento	
	2			Acta de recibo final de ejecucion	Seguimiento	Informe final supervisión
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
FEBRERO	1			Acta de liquidacion	Seguimiento	
	2					
	3					
	4					
MARZO	1					
	2					
	3					
	4					

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR
