


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
0	**MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR**	**$ 997,436,114.74**	**143.75 días**	**lun 22/09/25**	**dom 01/03/26**		
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**$ 5,711,914.36**	**58.13 días**	**lun 22/09/25**	**mar 25/11/25**		
2	ACTA DE INICIO	$ 0.00	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25		5
3	**PRELIMINARES**	**$ 5,711,914.36**	**58.13 días**	**lun 22/09/25**	**mar 25/11/25**		
4		$ 1,099,811.00	3 días	lun 22/09/25	jue 25/09/25	5CC+1 día	6CC+2 días
5	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	$ 1,973,786.00	3 días	lun 22/09/25	mar 25/11/25	2	4CC+1 día,10,8
6	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	$ 615,729.00	3 días	mié 24/09/25	sáb 27/09/25	4CC+2 días	7CC
7	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	$ 2,022,588.36	3 días	mié 24/09/25	sáb 27/09/25	6CC	
8	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	5	
9	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**$ 28,900,166.30**	**75.75 días**	**lun 22/09/25**	**mar 16/12/25**		
10	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye s	$ 5,133,751.00	5 días	lun 22/09/25	jue 27/11/25	5	11CC+2 días,14,16CC,20CC+3 días
11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	$ 2,071,282.00	5 días	mié 24/09/25	mar 25/11/25	10CC+2 días	14
12	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	$ 5,390,787.00	2 días	mié 10/12/25	jue 11/12/25		14
13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	$ 16,304,346.30	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	19FC+2 días	23FC+1 día,14
14	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	mié 29/10/25	mié 29/10/25	10,11,12,13	
15	**CIMENTACIÓN**	**$ 51,364,728.42**	**68.75 días**	**lun 22/09/25**	**lun 08/12/25**		
16	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	$ 1,949,940.00	5 días	lun 22/09/25	jue 27/11/25	10CC	17CC+1 día,20
17	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la	$ 18,531,357.00	5 días	mar 23/09/25	mié 26/11/25	16CC+1 día	22CC+4 días,20
18	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios par	$ 15,856,054.00	5 días	sáb 04/10/25	jue 27/11/25	22CC+3 días	19CC+3 días,20

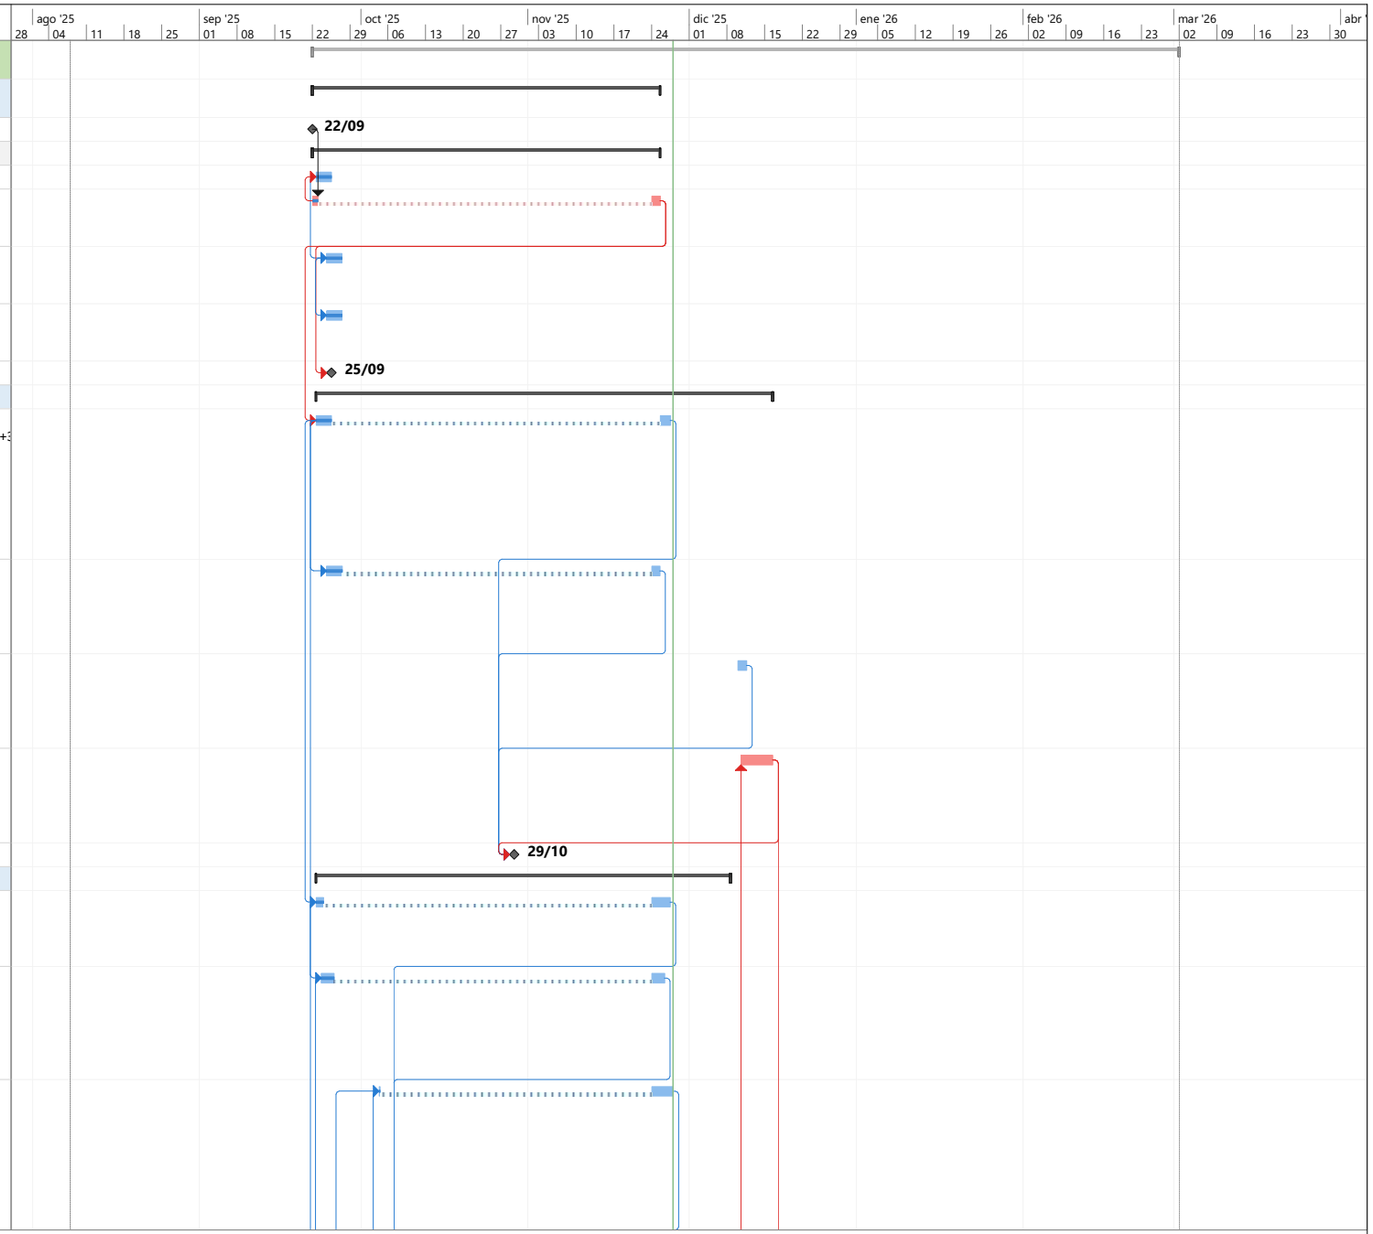

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
19	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesari	$ 15,027,377.42	5 días	mié 03/12/25	lun 08/12/25	22CC+3 días,18CC+3 días	13FC+2 días,20
20	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	jue 09/10/25	jue 09/10/25	CC+3 días,16,17,18,	
21	**REFUERZO**	**$ 139,411,768.36**	**74.75 días**	**sáb 27/09/25**	**sáb 20/12/25**		
22	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	$ 116,715,218.00	20 días	sáb 27/09/25	lun 15/12/25	17CC+4 días	18CC+3 días,19CC+3 días
23	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del	$ 17,237,975.00	3 días	mié 17/12/25	sáb 20/12/25	13FC+1 día	27FC+15 días
24	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO	$ 5,458,575.36	3 días	mar 02/12/25	jue 04/12/25		25
25	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	jue 04/12/25	jue 04/12/25	24	
26	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ 141,540,768.55**	**16 días**	**mar 06/01/26**	**vie 23/01/26**		
27	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra,	$ 57,462,696.00	6 días	mar 06/01/26	mar 13/01/26	23FC+15 días	28CC,36CC+10 días,157CC
28	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem	$ 363,914.00	1 día	mar 06/01/26	mié 07/01/26	27CC	29
29	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sika Flex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye	$ 1,100,450.00	2 días	mié 07/01/26	vie 09/01/26	28	30
30	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	$ 16,267,731.00	4 días	vie 09/01/26	mié 14/01/26	29	31
31	VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la	$ 40,710,849.00	3 días	mié 14/01/26	sáb 17/01/26	30	32
32	LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la activid	$ 2,615,801.00	3 días	sáb 17/01/26	mié 21/01/26	31	33

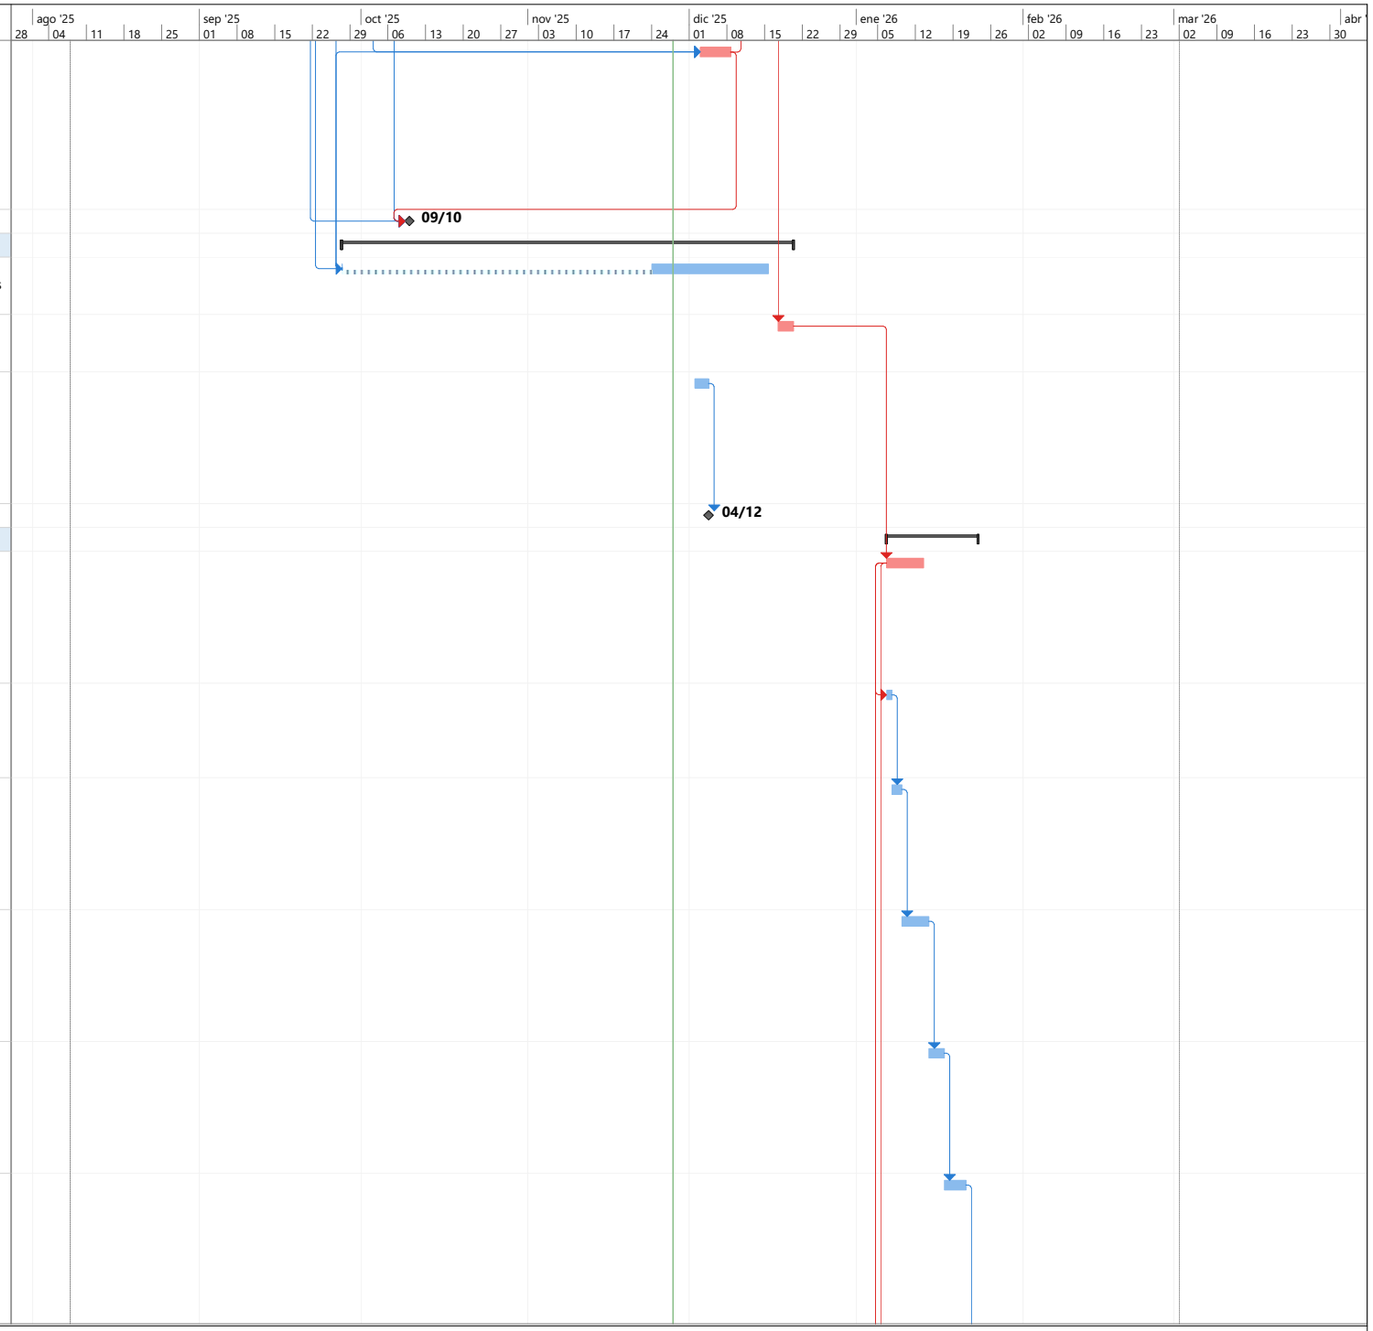


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
33	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado pendiente al 1% longitudinal, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 capas en todo	$ 23,019,327.55	3 días	mié 21/01/26	vie 23/01/26	32	34
34	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	33	
35	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**	**$ 153,981,495.00**	**20 días**	**sáb 17/01/26**	**lun 09/02/26**		
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. ASTM A653 SS-GR 50, incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la	$ 65,986,122.00	10 días	sáb 17/01/26	mié 28/01/26	27CC+10 días	37CC,144CC
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo	$ 87,995,373.00	20 días	sáb 17/01/26	lun 09/02/26	36CC	38,41CC
38	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	lun 09/02/26	lun 09/02/26	37	
39	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI**	**$ 70,058,864.74**	**19 días**	**sáb 17/01/26**	**sáb 07/02/26**		
40	**CAJAS, POZOS, CARCAMOS**	**$ 16,627,493.00**	**8 días**	**sáb 17/01/26**	**mar 27/01/26**		
41	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañe	$ 5,448,213.00	3 días	sáb 17/01/26	mié 21/01/26	37CC	42,46
42	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañet	$ 1,423,754.00	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	41	43CC
43	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	$ 2,493,751.00	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	42CC	44
44	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta	$ 7,261,775.00	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	43	
45	**REDES SANITARIAS**	**$ 9,239,821.00**	**5 días**	**mié 21/01/26**	**mar 27/01/26**		
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	$ 3,948,203.00	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	41	7CC,48CC,49CC,55C

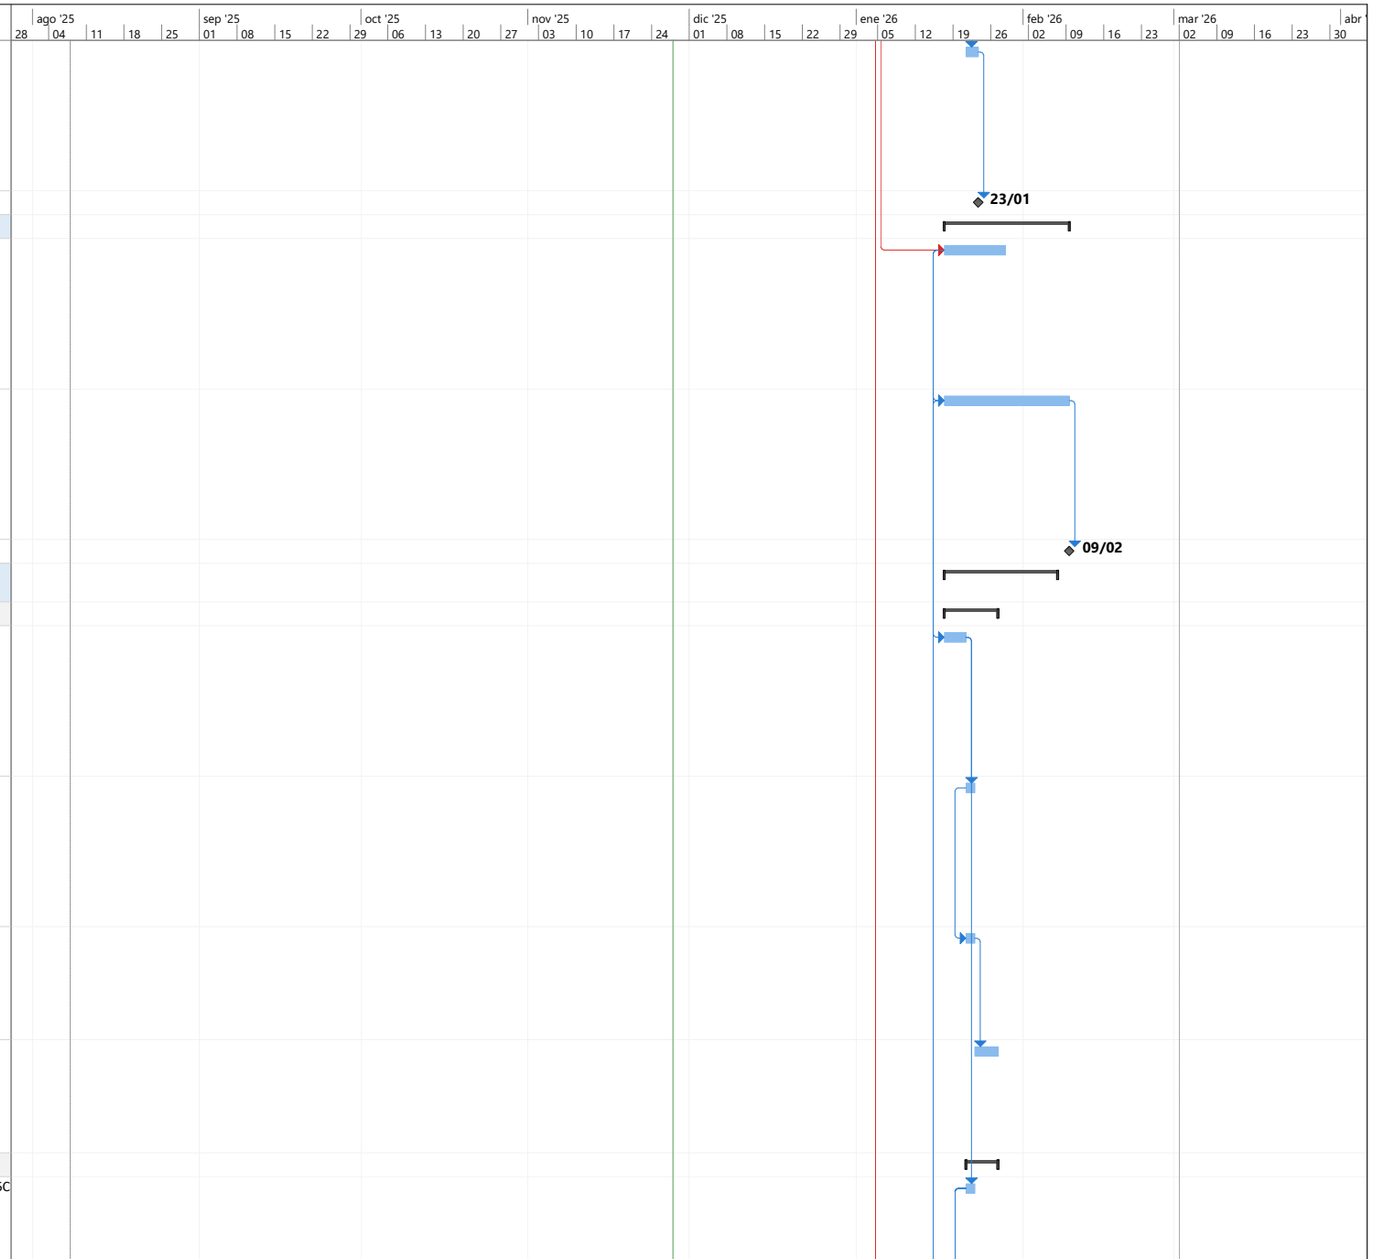


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	$ 399,411.00	3 días	mié 21/01/26	vie 23/01/26	46CC	
48	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su	$ 195,133.00	1 día	mié 21/01/26	jue 22/01/26	46CC	
49	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su	$ 209,287.00	1 día	mié 21/01/26	jue 22/01/26	46CC	50
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta	$ 1,399,425.00	1 día	jue 22/01/26	jue 22/01/26	49	51CC
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta	$ 162,241.00	1 día	jue 22/01/26	jue 22/01/26	50CC	52
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen	$ 2,165,961.00	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	51	53CC
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen	$ 760,160.00	2 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26	52CC	
54	**REDES HIDRÁULICAS**	**$ 8,913,264.00**	**16 días**	**mié 21/01/26**	**sáb 07/02/26**		
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materi	$ 1,045,015.00	4 días	mié 21/01/26	lun 26/01/26	46CC	56CC,67CC
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su	$ 1,462,923.00	4 días	mié 21/01/26	lun 26/01/26	55CC	57
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su	$ 1,320,132.00	3 días	lun 26/01/26	mié 28/01/26	56	58CC
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	$ 399,974.00	3 días	lun 26/01/26	mié 28/01/26	57CC	59
59	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios,	$ 265,314.00	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	58	60CC
60	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios,	$ 259,638.00	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	59CC	61CC




Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
61	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios,	$ 651,741.00	3 días	mié 28/01/26	sáb 31/01/26	60CC	62
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	$ 949,025.00	2 días	lun 02/02/26	mar 03/02/26	61	63CC,64CC
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	$ 684,540.00	3 días	lun 02/02/26	mié 04/02/26	62CC	
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	$ 1,263,674.00	3 días	lun 02/02/26	mié 04/02/26	62CC	65
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	$ 611,288.00	3 días	mié 04/02/26	sáb 07/02/26	64	74
66	**REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS**	**$ 24,795,049.00**	**12 días**	**mié 21/01/26**	**mar 03/02/26**		
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	$ 285,113.00	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	55CC	68CC,69CC
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	$ 348,568.00	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	67CC	
69	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	$ 319,689.00	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	67CC	70,72
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS (0,60 a X 0,90 h), tubería 110 mm (Incluye excavación, retiro de residuos, tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro NT 1600, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario	$ 23,841,679.00	10 días	vie 23/01/26	mar 03/02/26	69	
71	**TANQUES Y EQUIPOS**	**$ 10,483,237.74**	**9 días**	**vie 23/01/26**	**lun 02/02/26**		
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas	$ 5,682,570.00	5 días	vie 23/01/26	mié 28/01/26	69	73
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye prueb	$ 4,800,667.74	4 días	mié 28/01/26	lun 02/02/26	72	77

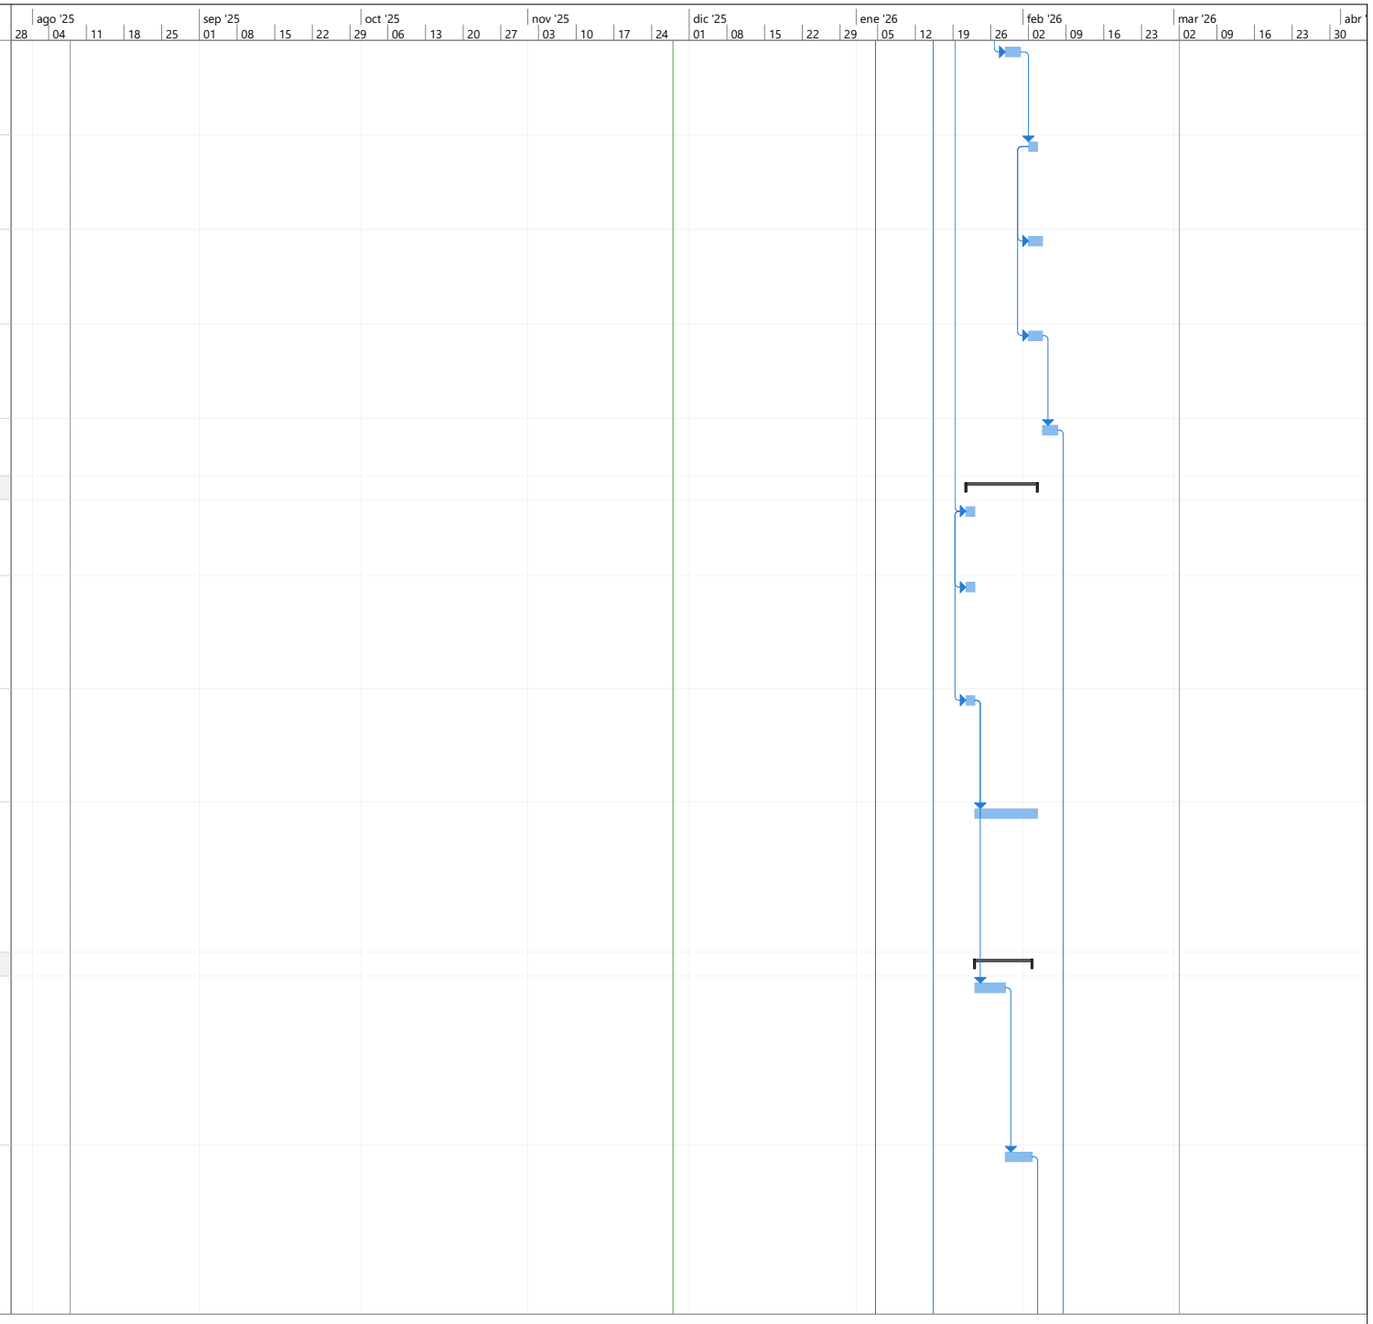


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
74	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	sáb 07/02/26	sáb 07/02/26	65	
75	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**	**$ 130,550,489.89**	**23 días**	**lun 02/02/26**	**vie 27/02/26**		
76	**EQUIPO DE MEDIDA**	**$ 607,881.00**	**2 días**	**lun 02/02/26**	**mié 04/02/26**		
77	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	$ 607,881.00	2 días	lun 02/02/26	mié 04/02/26	73	79CC+2 días
78	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**	**$ 12,742,356.00**	**8 días**	**mié 04/02/26**	**vie 13/02/26**		
79	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta	$ 5,197,895.00	4 días	mié 04/02/26	lun 09/02/26	77CC+2 días	80,83CC
80	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador	$ 3,019,146.00	3 días	lun 09/02/26	jue 12/02/26	79	81
81	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesori	$ 4,525,315.00	1 día	jue 12/02/26	vie 13/02/26	80	
82	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**	**$ 10,982,203.00**	**3 días**	**mié 04/02/26**	**sáb 07/02/26**		
83	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección:	$ 9,297,717.00	3 días	mié 04/02/26	sáb 07/02/26	79CC	84CC,113CC
84	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12)	$ 1,177,704.00	2 días	mié 04/02/26	vie 06/02/26	83CC	85
85	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA;	$ 506,782.00	1 día	vie 06/02/26	sáb 07/02/26	84	87
86	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓ**	**$ 12,466,216.00**	**8 días**	**sáb 07/02/26**	**mar 17/02/26**		
87	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos	$ 10,166,025.00	4 días	sáb 07/02/26	jue 12/02/26	85	88

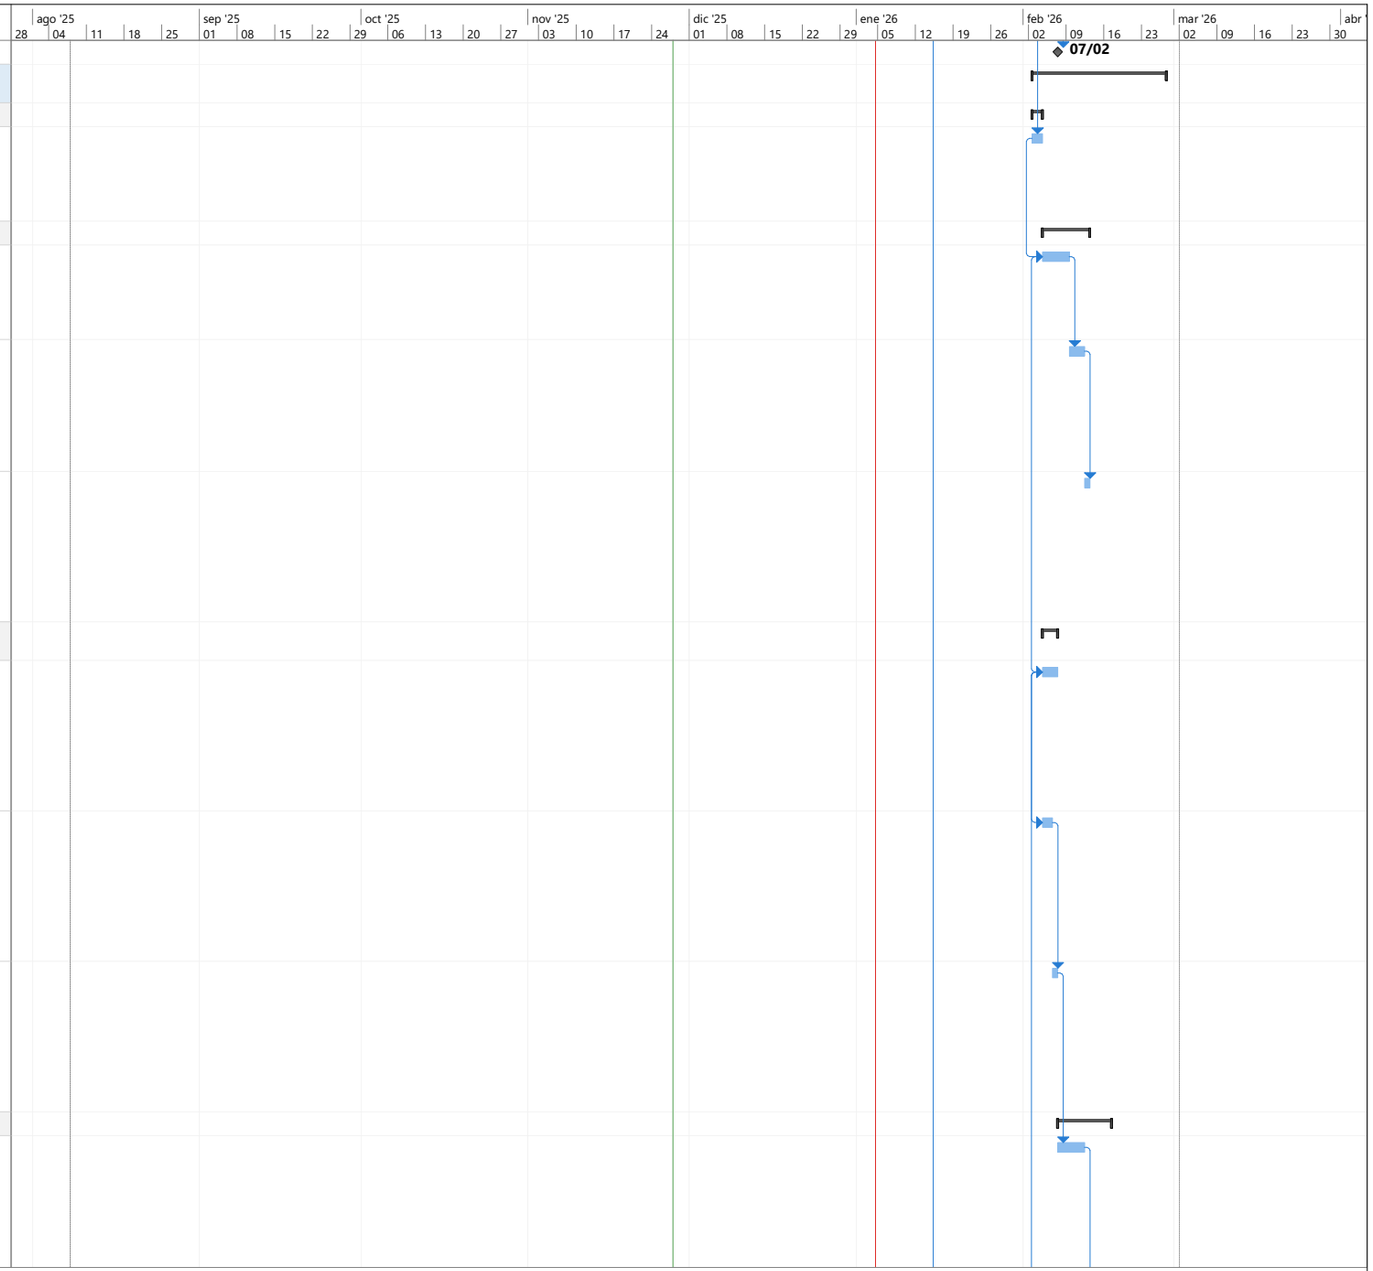


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
88	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos	$ 1,221,278.00	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26	87	89
89	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos	$ 686,530.00	2 días	sáb 14/02/26	mar 17/02/26	88	90CC,100CC
90	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada	$ 392,383.00	1 día	sáb 14/02/26	lun 16/02/26	89CC	92
91	**RED NORMAL Y REGULADA**	**$ 6,637,995.00**	**9 días**	**lun 16/02/26**	**mié 25/02/26**		
92	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halog	$ 2,509,361.00	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	90	93CC
93	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AW	$ 830,955.00	2 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	92CC	94
94	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T	$ 1,365,467.00	3 días	mié 18/02/26	vie 20/02/26	93	95
95	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzad	$ 462,098.00	2 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	94	96
96	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C	$ 1,470,114.00	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	95	98CC
97	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**	**$ 2,700,951.00**	**4 días**	**mar 24/02/26**	**vie 27/02/26**		

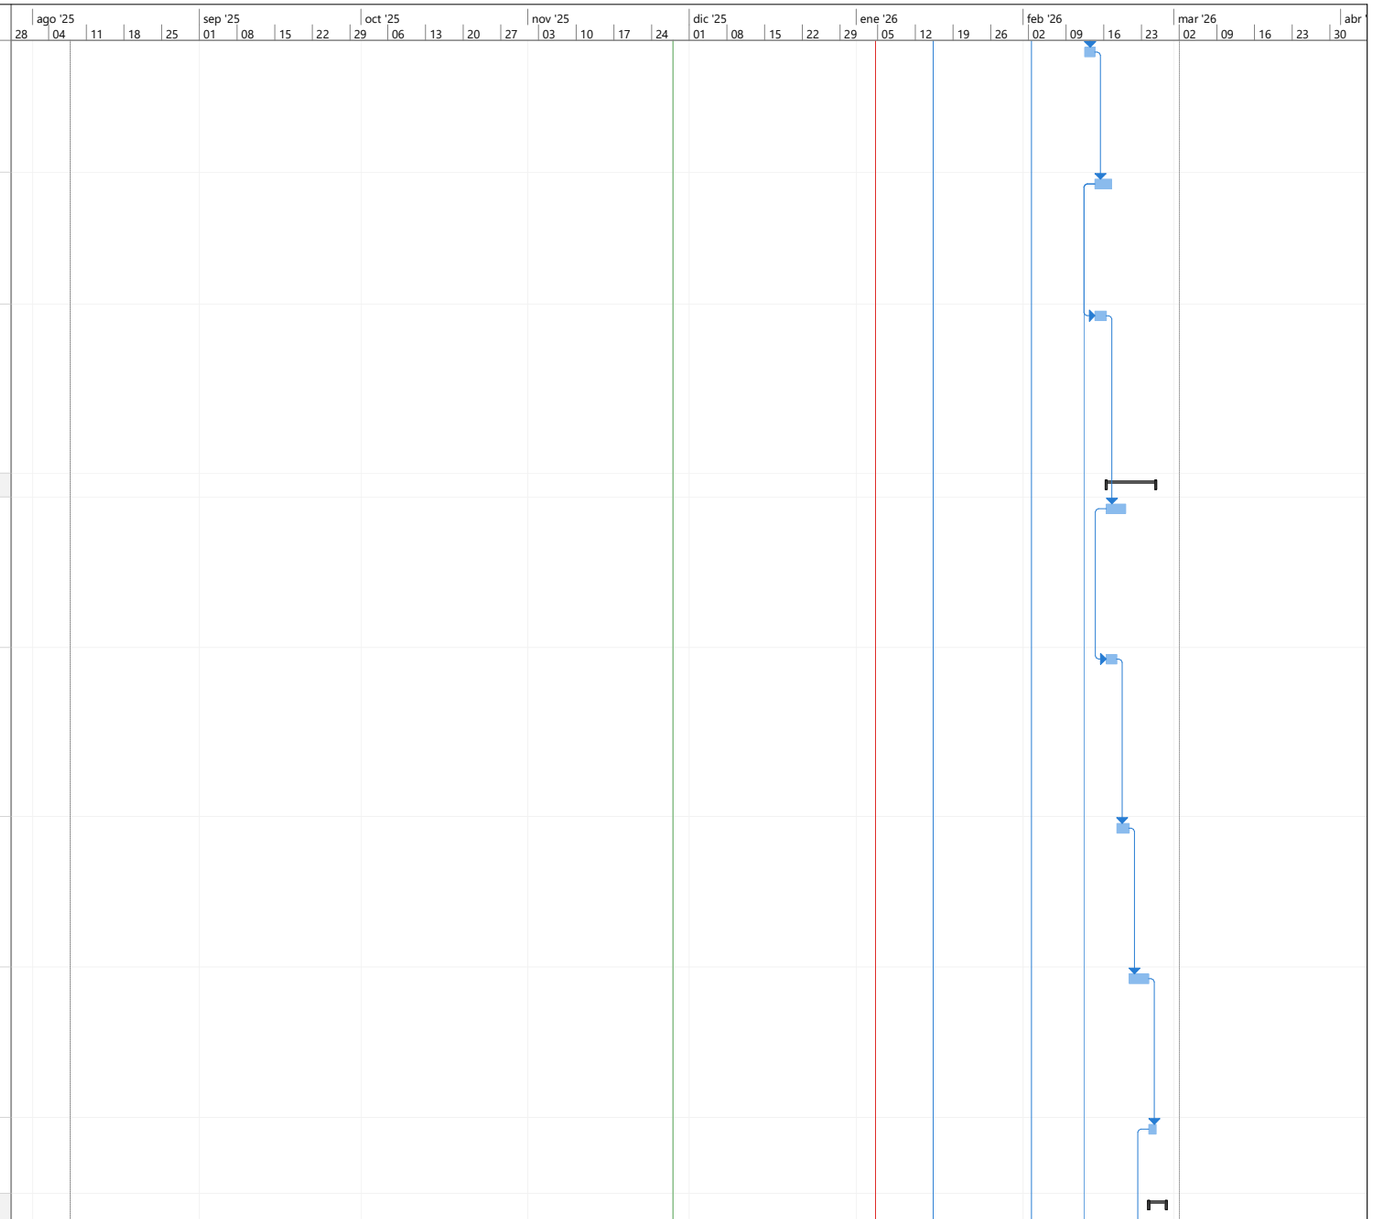


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
98	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su corr	$ 2,700,951.00	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	96CC	141
99	**ILUMINACIÓN**	**$ 35,831,525.00**	**9 días**	**sáb 14/02/26**	**mar 24/02/26**		
100	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" e	$ 1,821,756.00	3 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	89CC	101CC,102CC,103CC
101	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resa	$ 1,108,058.00	3 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	100CC	
102	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería EMT; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 1	$ 10,170,637.00	3 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	100CC	
103	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de pas	$ 2,786,843.00	5 días	sáb 14/02/26	jue 19/02/26	100CC	104
104	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios	$ 534,647.00	4 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	103	CC,106CC,107CC,10
105	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para	$ 13,166,587.00	4 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	104CC	
106	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18W Flujo Luminoso mínimo 1260 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	$ 640,695.00	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	104CC	

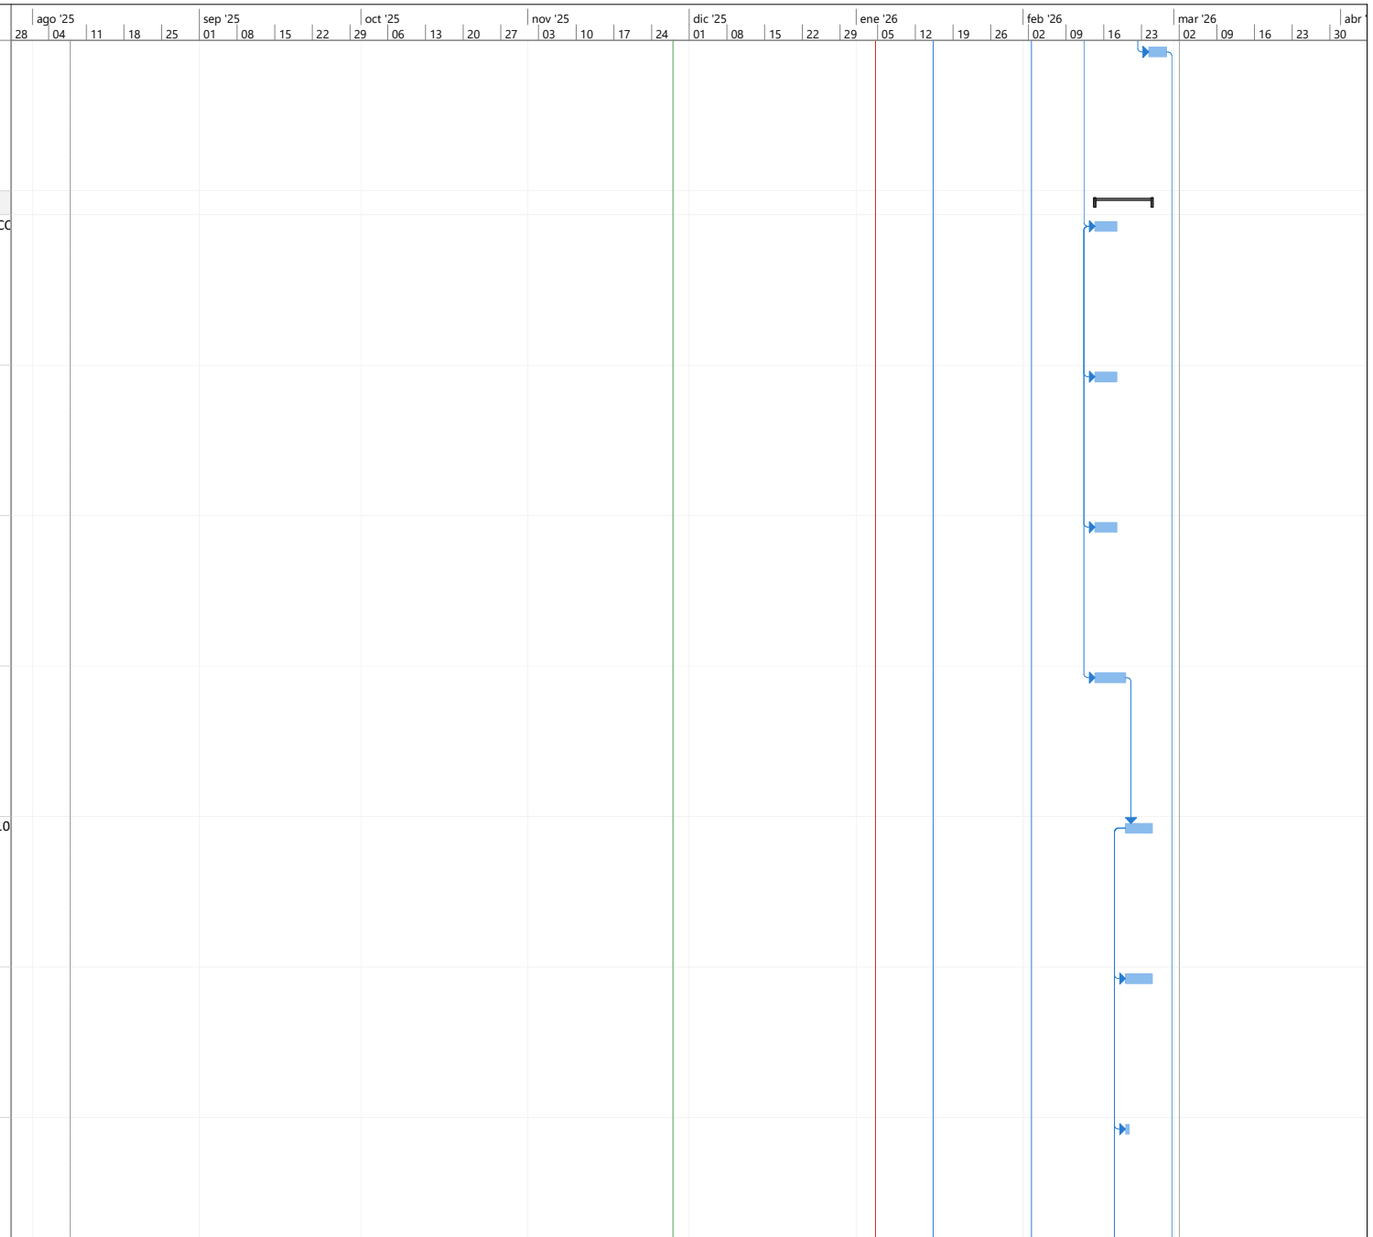


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
107	Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	$ 846,890.00	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	104CC	
108	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400,	$ 606,961.00	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	104CC	109
109	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía	$ 2,707,099.00	3 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	108	110CC,111CC
110	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	$ 538,836.00	1 día	vie 20/02/26	lun 23/02/26	109CC	
111	Suministro e instalación de luminaria tipo proyector LED 10W, 1000 lúmenes, 3000K, mínimo 30000 horas de vida útil	$ 902,516.00	1 día	vie 20/02/26	lun 23/02/26	109CC	
112	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**	**$ 18,149,616.00**	**7 días**	**mié 04/02/26**	**jue 12/02/26**		
113	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-	$ 3,179,675.00	3 días	mié 04/02/26	sáb 07/02/26	83CC	CC,115CC,116CC,11
114	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica CODENSA AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje,	$ 2,565,227.00	4 días	mié 04/02/26	lun 09/02/26	113CC	
115	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para	$ 2,650,945.00	3 días	mié 04/02/26	sáb 07/02/26	113CC	
116	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	$ 1,200,423.00	3 días	mié 04/02/26	sáb 07/02/26	113CC	
117	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de	$ 2,167,663.00	3 días	mié 04/02/26	sáb 07/02/26	113CC	118

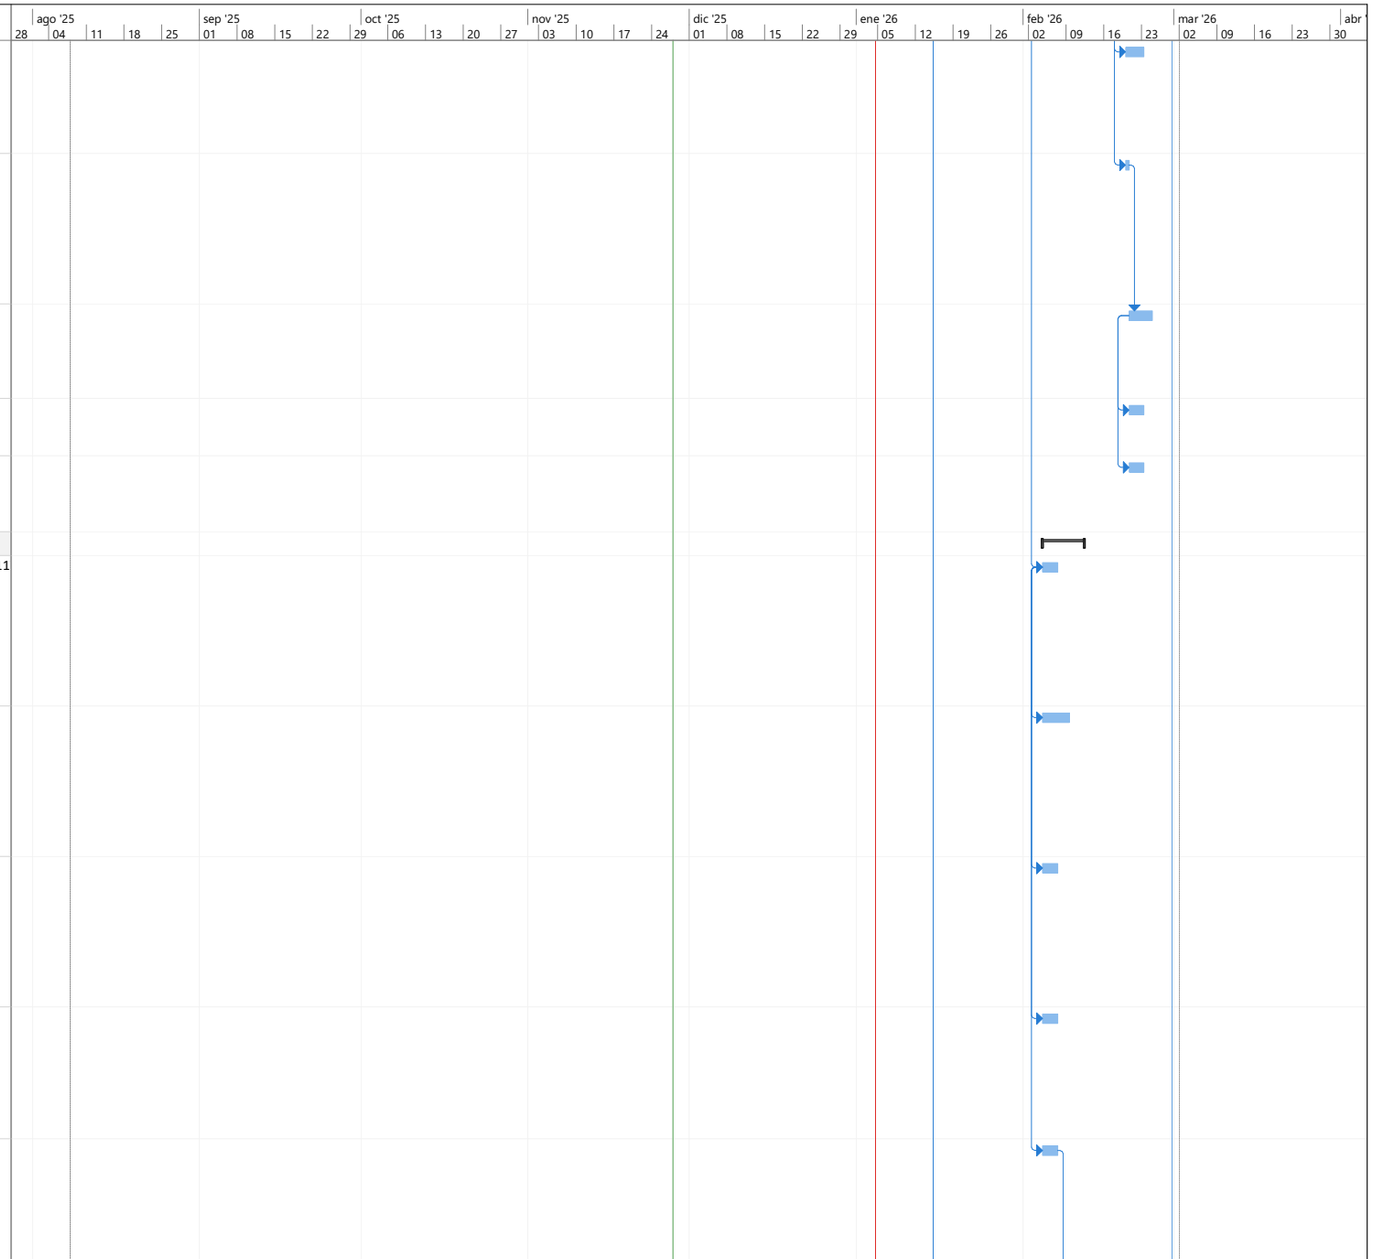


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
118	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla.,	$ 3,759,428.00	2 días	sáb 07/02/26	mar 10/02/26	117	119CC,120CC
119	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	$ 1,460,782.00	4 días	sáb 07/02/26	jue 12/02/26	118CC	
120	Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plástica, tubería PV 3/4" y accesorios, 5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2	$ 1,165,473.00	2 días	sáb 07/02/26	mar 10/02/26	118CC	122
121	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**	**$ 5,110,174.00**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**lun 16/02/26**		
122	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo	$ 2,591,252.00	5 días	mar 10/02/26	lun 16/02/26	120	123CC,124CC
123	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	$ 434,053.00	1 día	mar 10/02/26	mié 11/02/26	122CC	
124	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	$ 1,341,601.00	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26	122CC	125
125	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	$ 185,365.00	1 día	jue 12/02/26	vie 13/02/26	124	126
126	Suministro e instalación de tratamiento artificial	$ 557,903.00	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	125	128
127	**APANTALLAMIENTO**	**$ 9,954,856.00**	**7 días**	**lun 16/02/26**	**mar 24/02/26**		
128	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo	$ 3,335,110.00	3 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	126	129CC,130CC,131CC
129	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	$ 670,800.00	1 día	lun 16/02/26	mar 17/02/26	128CC	
130	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	$ 91,639.00	2 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	128CC	
131	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	$ 375,229.00	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	128CC	132,137CC
132	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	$ 5,167,915.00	3 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	131	133CC
133	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	$ 314,163.00	3 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	132CC	135

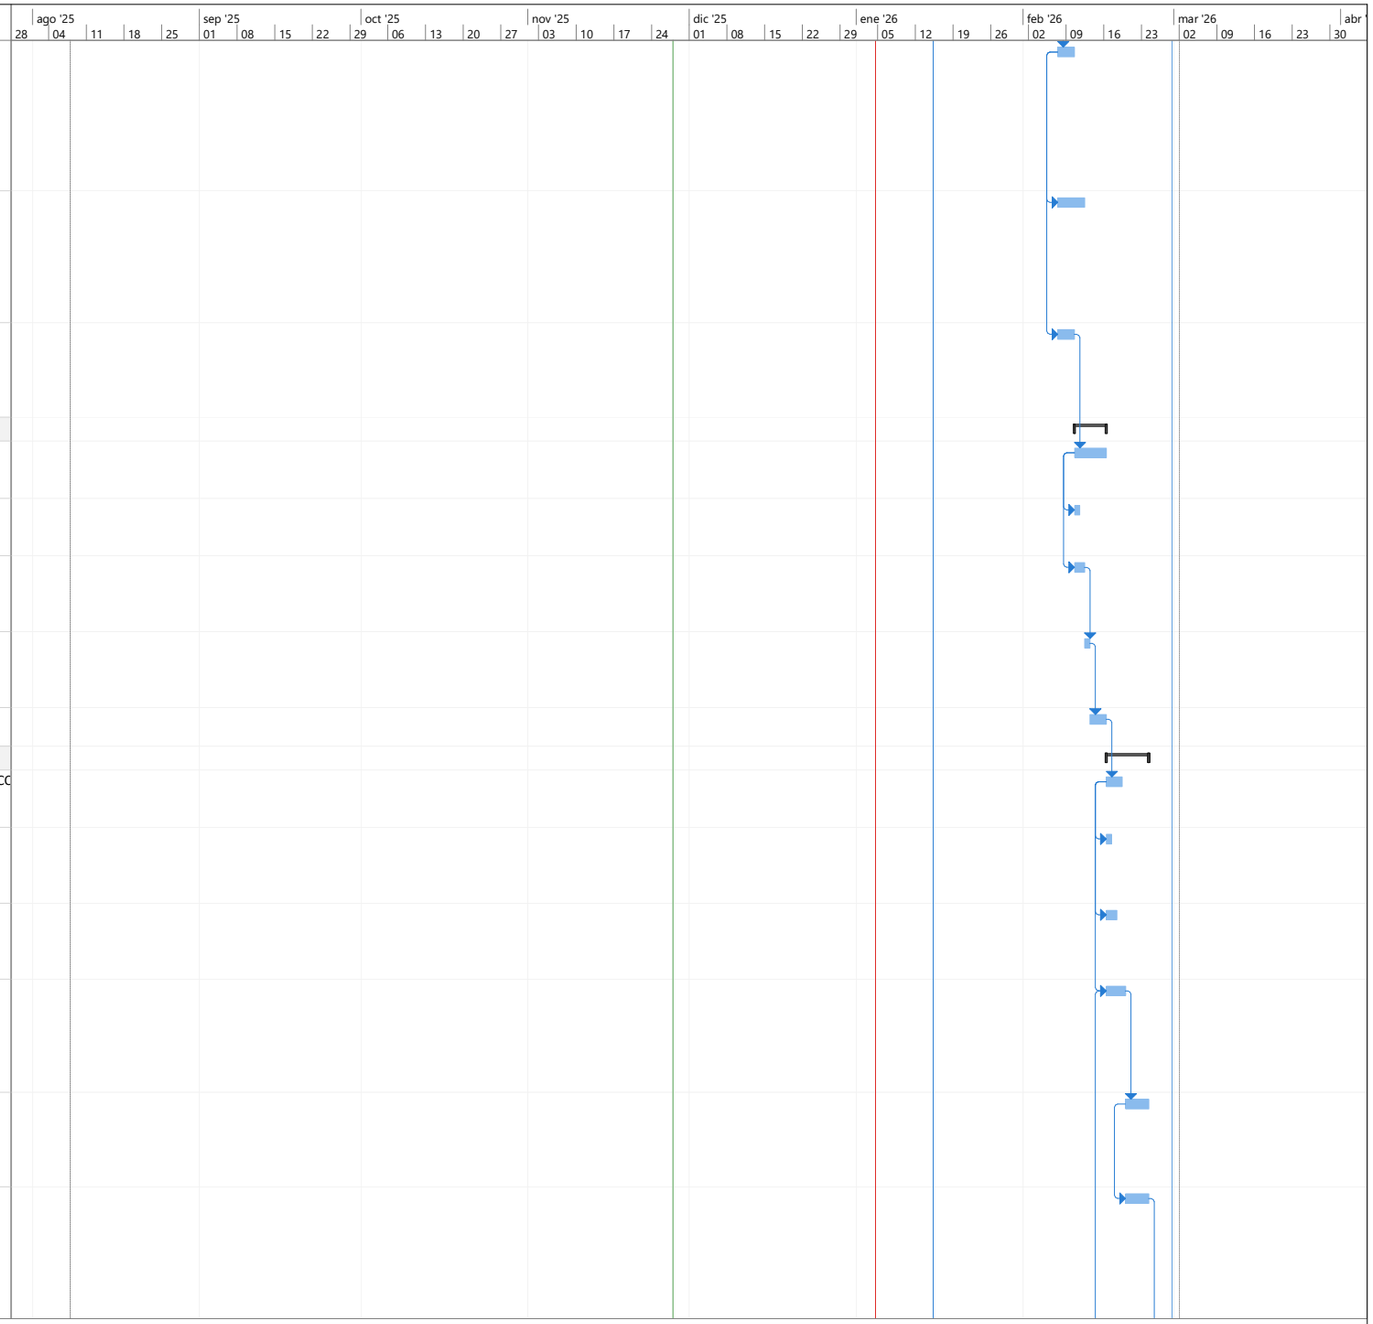


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
134	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**	**$ 773,389.00**	**2 días**	**mar 24/02/26**	**mié 25/02/26**		
135	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos,	$ 773,389.00	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	133	
136	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**	**$ 14,593,327.89**	**6 días**	**lun 16/02/26**	**lun 23/02/26**		
137	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	$ 4,807,430.00	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26	131CC	138CC,139CC,140CC
138	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la	$ 6,009,288.00	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26	137CC	
139	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos	$ 2,728,676.00	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	137CC	
140	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	$ 1,047,933.89	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26	137CC	
141	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	98	
142	**REDES ESPECIALES**	**$ 16,952,133.93**	**11 días**	**sáb 17/01/26**	**jue 29/01/26**		
143	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS**	**$ 16,952,133.93**	**11 días**	**sáb 17/01/26**	**jue 29/01/26**		
144	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	$ 1,211,137.00	4 días	sáb 17/01/26	jue 22/01/26	36CC	145CC,146CC
145	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	$ 4,652,714.00	4 días	sáb 17/01/26	jue 22/01/26	144CC	
146	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	$ 1,212,980.00	1 día	sáb 17/01/26	lun 19/01/26	144CC	147
147	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	$ 502,569.00	1 día	lun 19/01/26	mar 20/01/26	146	149CC,150CC,151CC
148	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	$ 488,402.00	1 día	lun 19/01/26	mar 20/01/26	147CC	
149	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5	$ 1,205,685.00	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26	147CC	
150	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para	$ 3,854,107.00	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26	147CC	
151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog,	$ 111,629.00	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26	147CC	

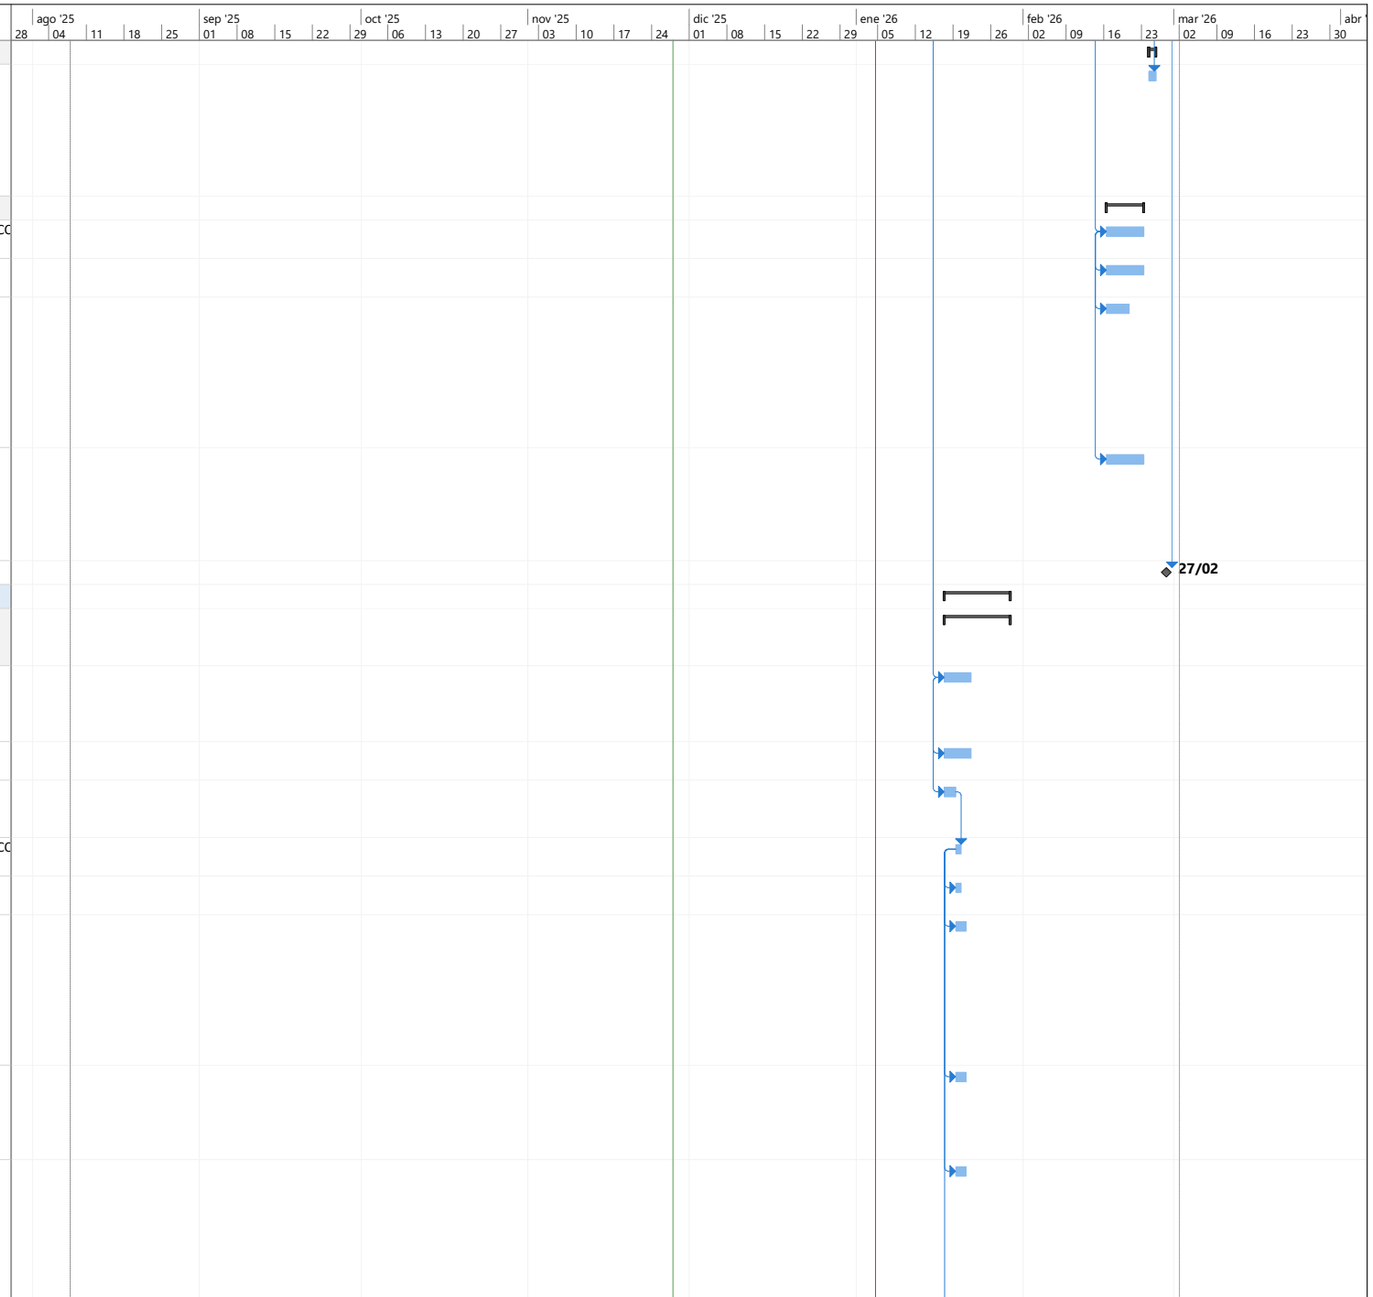


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
152	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	$ 845,346.00	5 días	lun 19/01/26	vie 23/01/26	147CC	153
153	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas,	$ 1,457,068.00	5 días	vie 23/01/26	jue 29/01/26	152	154CC,155
154	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su corr	$ 1,410,496.93	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	153CC	
155	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	153	
156	**MAMPOSTERÍA**	**$ 36,135,648.39**	**12 días**	**mar 06/01/26**	**mar 20/01/26**		
157	Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. Según	$ 6,564,344.00	6 días	mar 06/01/26	mar 13/01/26	27CC	158CC+1 día,159CC,173
158	DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXISTENTE Y FACHADA FLOTANTE	$ 516,170.00	2 días	mié 07/01/26	vie 09/01/26	157CC+1 día	
159	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	$ 8,094,133.00	3 días	mar 06/01/26	vie 09/01/26	157CC	160
160	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	$ 4,268,209.00	3 días	vie 09/01/26	mar 13/01/26	159	161
161	MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE f´c=20,7 Mpa (3000 PSI), incluye formaleta, desencofrante, todos los elementos para su correcta ejecución (No incluye refuerzo)	$ 3,491,778.00	5 días	mar 13/01/26	lun 19/01/26	160	162CC,163CC
162	MURO EN LADRILLO A LA VISTA DOS POR DOS CARAS DE 33x11,5x11cm (L x a x h) (o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafi	$ 8,323,722.00	5 días	mar 13/01/26	lun 19/01/26	161CC	
163	MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h) (producto de la partida de un ladrillo de 33X11,5X11 de media traba o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de	$ 4,877,292.39	6 días	mar 13/01/26	mar 20/01/26	161CC	164
164	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	163	167
165	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	**$ 98,072,410.00**	**18 días**	**mar 20/01/26**	**lun 09/02/26**		
166	**CUBIERTAS**	**$ 94,379,031.00**	**12 días**	**mar 20/01/26**	**lun 02/02/26**		
167	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en	$ 92,255,181.00	6 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26	164	168

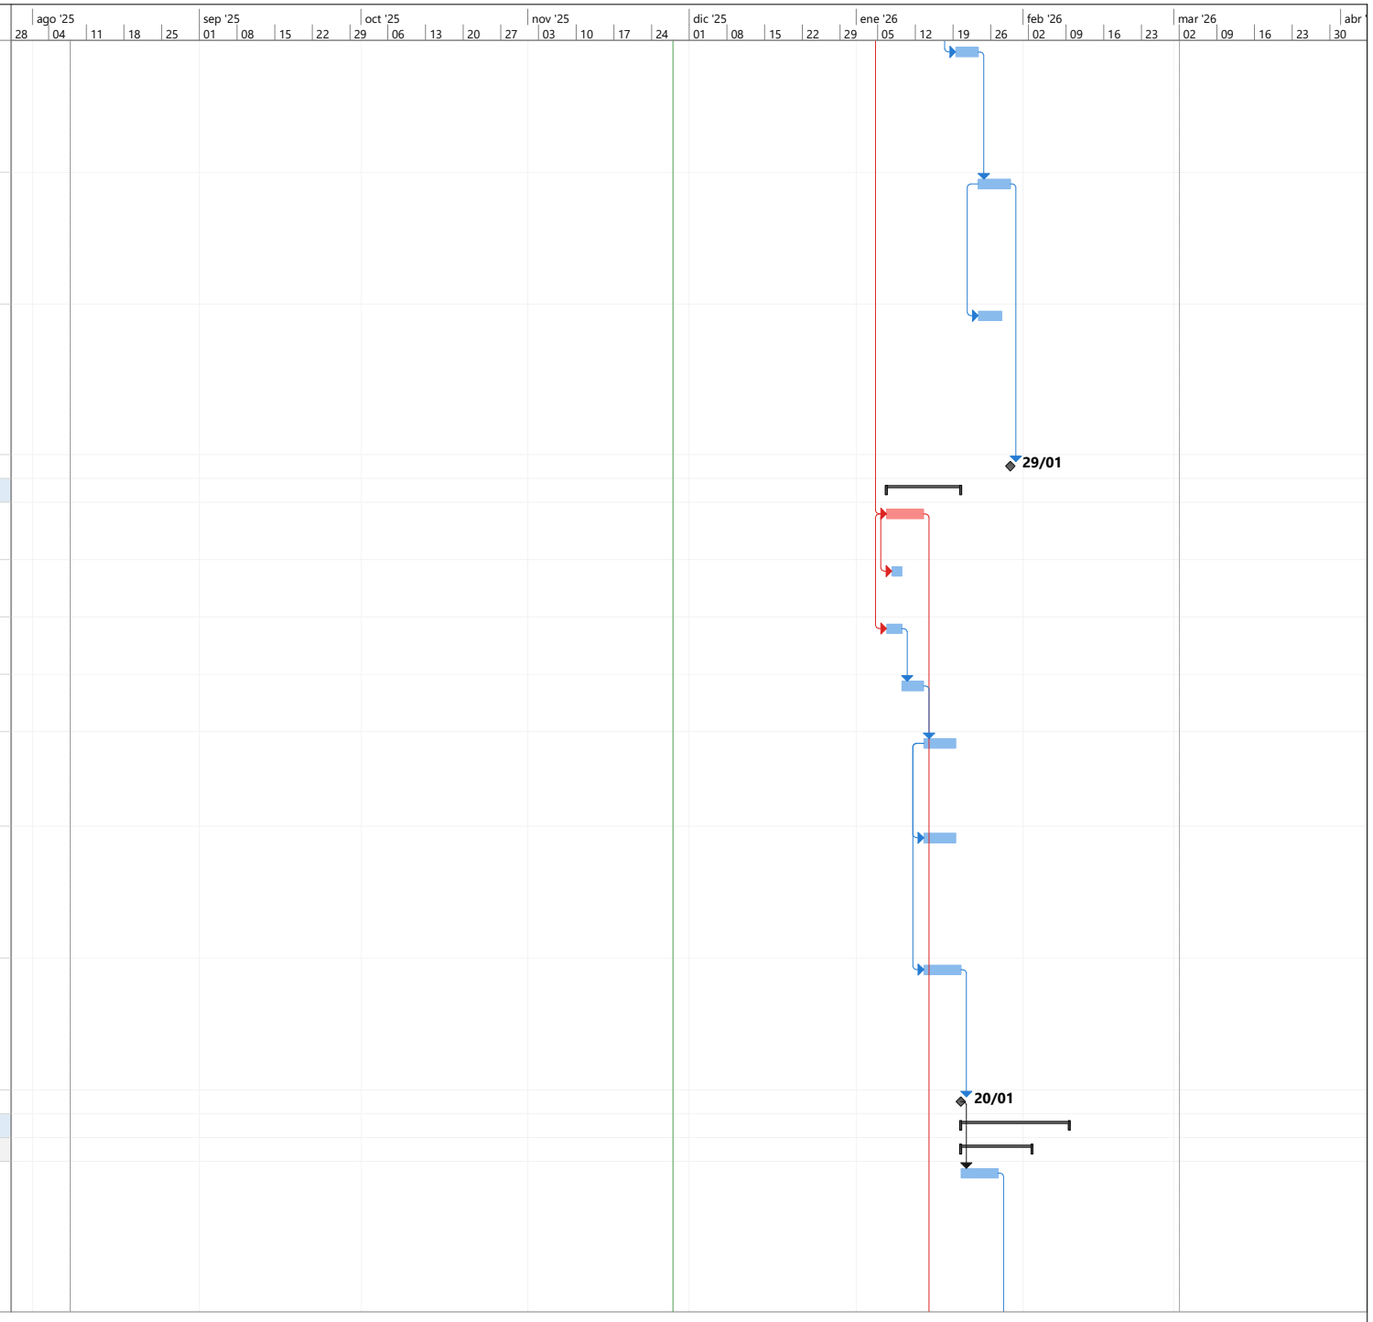


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
168	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instal	$ 2,123,850.00	6 días	mar 27/01/26	lun 02/02/26	167	170
169	**CIELO RASOS**	**$ 3,693,379.00**	**6 días**	**lun 02/02/26**	**lun 09/02/26**		
170	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PANEL YESO DE 1/2", Incluye estructura metálica para armado y soporte, con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	$ 3,693,379.00	6 días	lun 02/02/26	lun 09/02/26	168	171
171	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	lun 09/02/26	lun 09/02/26	170	
172	**PAÑETES**	**$ 6,356,382.06**	**6 días**	**mar 13/01/26**	**mar 20/01/26**		
173	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios	$ 6,356,382.06	6 días	mar 13/01/26	mar 20/01/26	157	174,219CC+5 días
174	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	173	177
175	**PISOS Y ENCHAPES**	**$ 12,073,995.80**	**8 días**	**mar 20/01/26**	**mié 28/01/26**		
176	**ENCHAPES, PISOS Y PAREDES**	**$ 9,287,443.00**	**4 días**	**mar 20/01/26**	**vie 23/01/26**		
177	ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca.	$ 1,256,381.00	2 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26	174	178
178	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, Modulado	$ 8,031,062.00	2 días	jue 22/01/26	vie 23/01/26	177	180
179	**GUARDA ESCOBAS Y BOCA PUERTAS**	**$ 1,046,104.00**	**1 día**	**vie 23/01/26**	**lun 26/01/26**		
180	ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye dilataciones en t longitudinales.	$ 1,046,104.00	1 día	vie 23/01/26	lun 26/01/26	178	182
181	**VARIOS**	**$ 1,740,448.80**	**3 días**	**lun 26/01/26**	**mié 28/01/26**		
182	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto at	$ 1,397,880.00	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26	180	183
183	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de	$ 342,568.80	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	182	184
184	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	mié 28/01/26	mié 28/01/26	183	186,204
185	**CARPINTERIA EN MADERA**	**$ 28,693,913.29**	**6 días**	**mié 28/01/26**	**mié 04/02/26**		

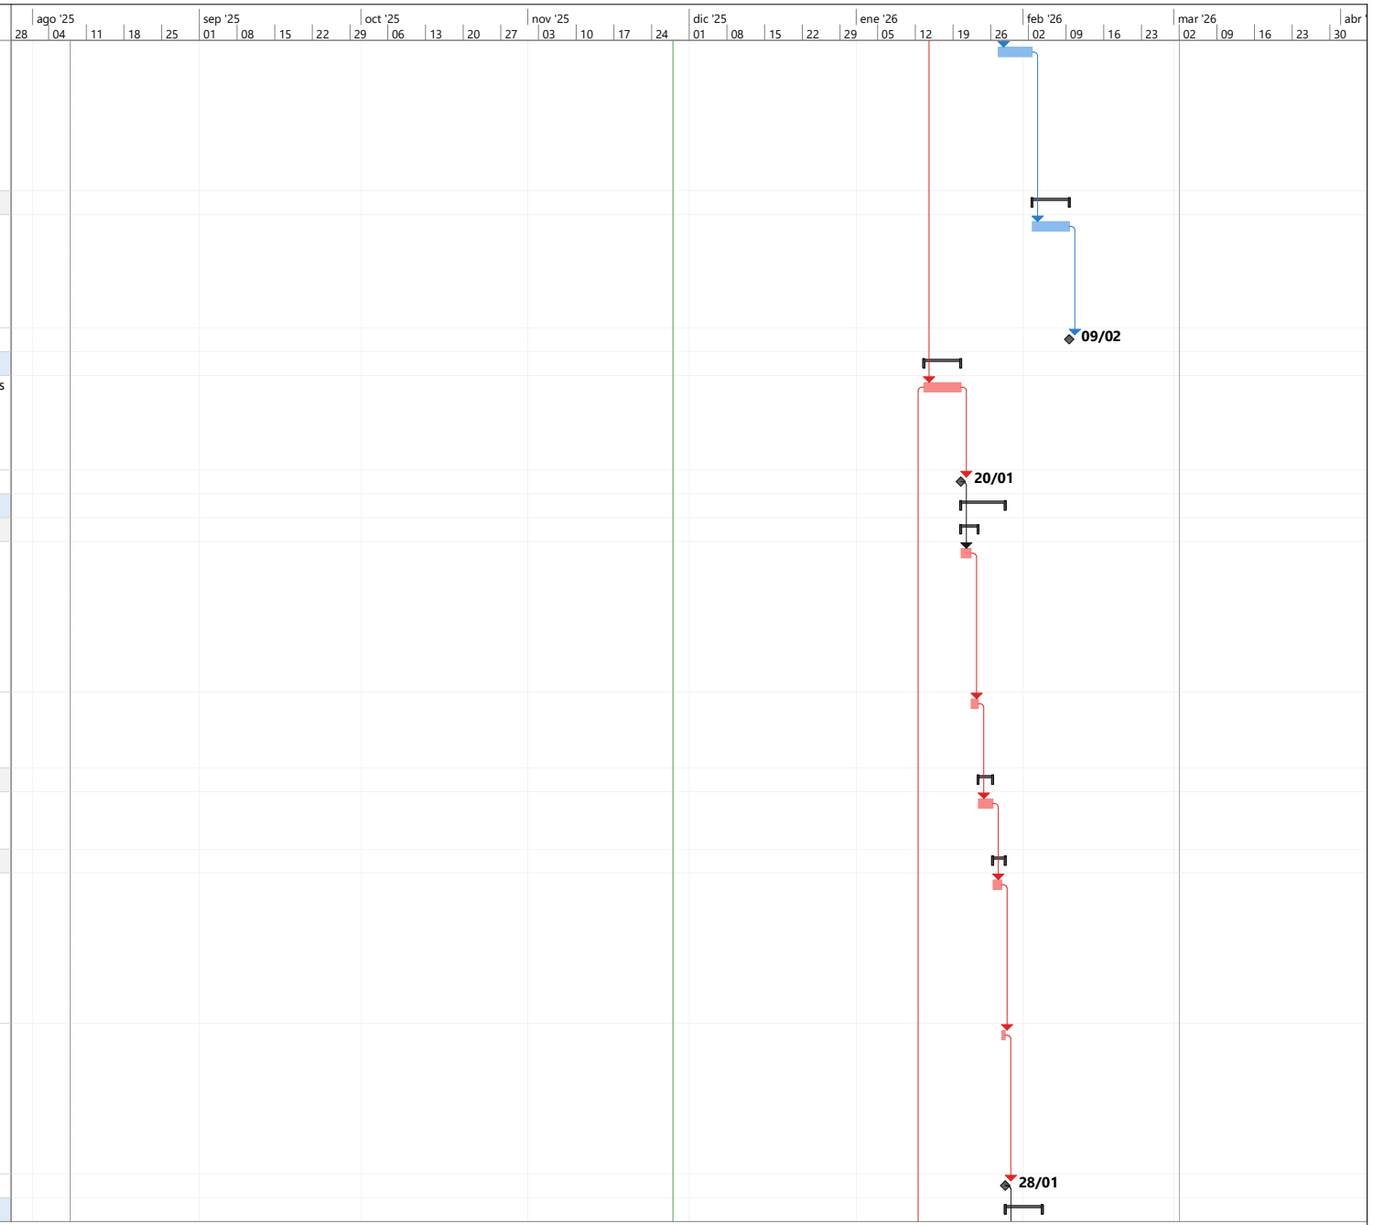


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO AMARILLO O SIMILAR INMUNIZADA perfiles principales en 2" x 4", persianas en tabla de 18 x 900 mm, incluye inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, angeo, pisavidrio 1 x 1	$ 28,693,913.29	6 días	mié 28/01/26	mié 04/02/26	184	187,190CC
187	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	mié 04/02/26	mié 04/02/26	186	
188	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**$ 41,859,661.56**	**15 días**	**mié 28/01/26**	**sáb 14/02/26**		
189	**REJAS Y VENTANAS**	**$ 3,981,565.00**	**6 días**	**mié 28/01/26**	**mié 04/02/26**		
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 x 1 1/2" (76x38x1,5 mm) Y PLATINAS DE 2"X1/8" SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, malla tipo angeo, y	$ 3,981,565.00	6 días	mié 28/01/26	mié 04/02/26	186CC	192
191	**PUERTAS**	**$ 37,523,516.00**	**6 días**	**mié 04/02/26**	**mié 11/02/26**		
192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PIVOTANTES O BASCULANTES EN PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON ANGEO INTERNO Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta fabricación e	$ 20,094,593.00	6 días	mié 04/02/26	mié 11/02/26	190	193CC,194CC
193	PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y superior en estructura tubular de 3" x 1 1/2" , pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, p	$ 1,466,499.00	6 días	mié 04/02/26	mié 11/02/26	192CC	
194	PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y riel superior, pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, pivote 600kg, b	$ 15,962,424.00	6 días	mié 04/02/26	mié 11/02/26	192CC	196
195	**VARIOS**	**$ 354,580.56**	**3 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 14/02/26**		
196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo	$ 354,580.56	3 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	194	197
197	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	sáb 14/02/26	sáb 14/02/26	196	199
198	**CERRADURAS**	**$ 3,676,772.20**	**4 días**	**sáb 14/02/26**	**jue 19/02/26**		
199	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos	$ 2,679,862.00	3 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	197	200

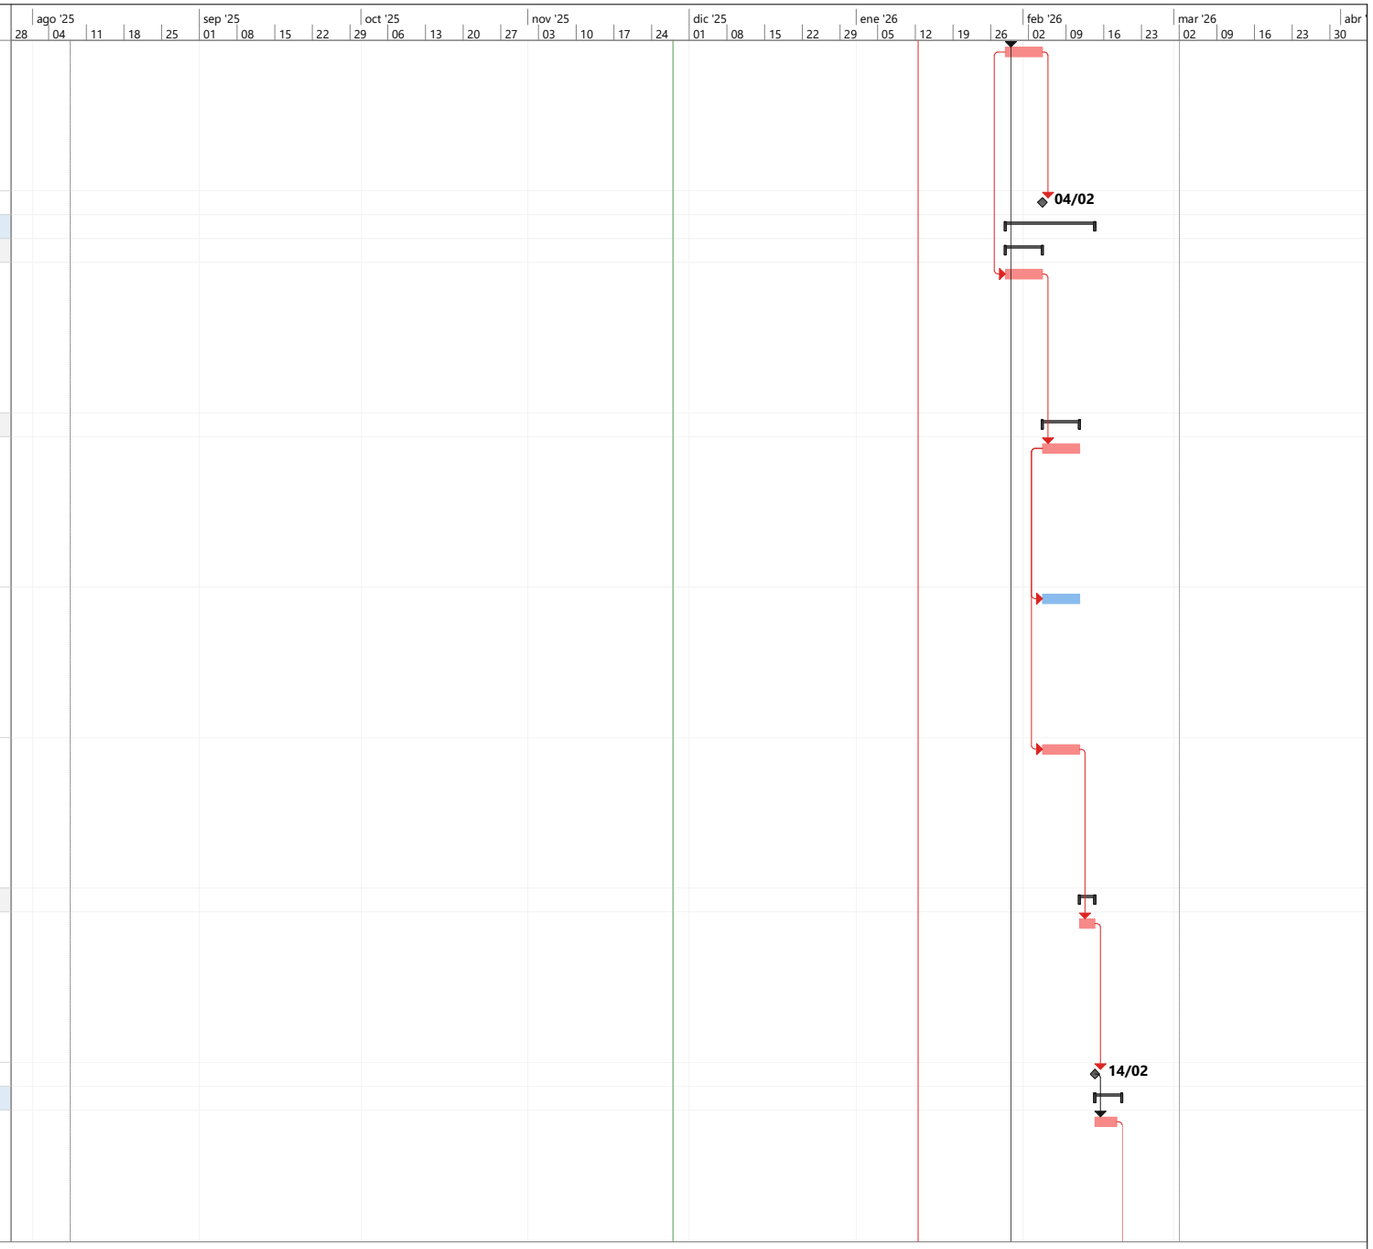

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
200	CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	$ 996,910.20	1 día	mié 18/02/26	jue 19/02/26	199	201
201	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26	200	222
202	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**	**$ 6,912,345.10**	**12 días**	**mié 28/01/26**	**mié 11/02/26**		
203	**APARATOS SANITARIOS**	**$ 3,474,605.00**	**5 días**	**mié 28/01/26**	**mar 03/02/26**		
204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y	$ 998,945.00	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	184	205
205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y	$ 1,095,123.00	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	204	206
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	$ 551,796.00	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	205	207
207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta	$ 507,223.00	1 día	lun 02/02/26	lun 02/02/26	206	208
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y	$ 321,518.00	1 día	lun 02/02/26	mar 03/02/26	207	210
209	**GRIFERÍAS**	**$ 2,515,637.00**	**4 días**	**mar 03/02/26**	**sáb 07/02/26**		
210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y	$ 809,707.00	1 día	mar 03/02/26	mié 04/02/26	208	211
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	$ 1,489,533.00	2 días	mié 04/02/26	vie 06/02/26	210	212

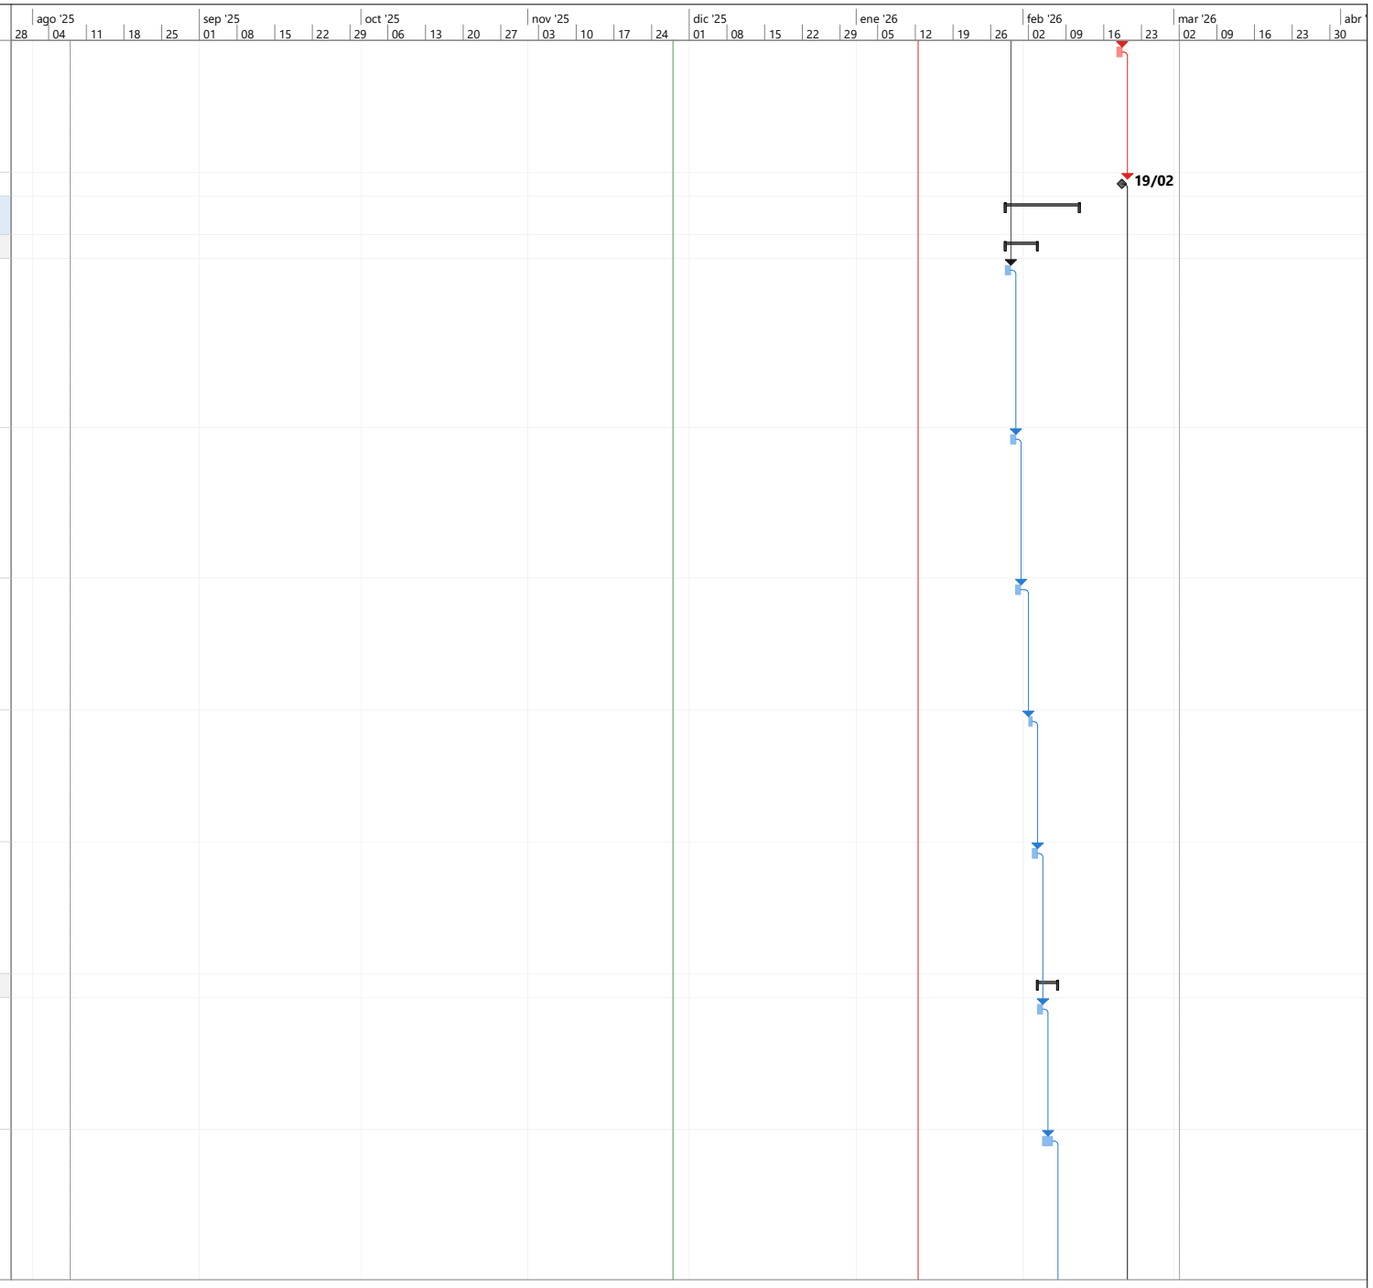

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta	$ 216,397.00	1 día	vie 06/02/26	sáb 07/02/26	211	214
213	**ACCESORIOS**	**$ 922,103.10**	**3 días**	**sáb 07/02/26**	**mié 11/02/26**		
214	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	$ 558,854.00	1 día	sáb 07/02/26	lun 09/02/26	212	215
215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado o mate, incluye anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y	$ 189,202.00	1 día	lun 09/02/26	mar 10/02/26	214	216
216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	$ 174,047.10	1 día	mar 10/02/26	mié 11/02/26	215	217
217	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26	216	
218	**PINTURAS**	**$ 8,615,980.23**	**3 días**	**lun 19/01/26**	**jue 22/01/26**		
219	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de	$ 8,615,980.23	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	173CC+5 días	220
220	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	219	
221	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**$ 1,027,969.17**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**vie 20/02/26**		
222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abaj	$ 579,066.00	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	201	223
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra,	$ 448,903.17	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	222	224
224	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	223	226
225	**EQUIPOS Y OTROS**	**$ 10,767,240.84**	**6 días**	**vie 20/02/26**	**vie 27/02/26**		
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	$ 155,738.00	1 día	vie 20/02/26	lun 23/02/26	224	227
227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte)	$ 475,028.00	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	226	228,231

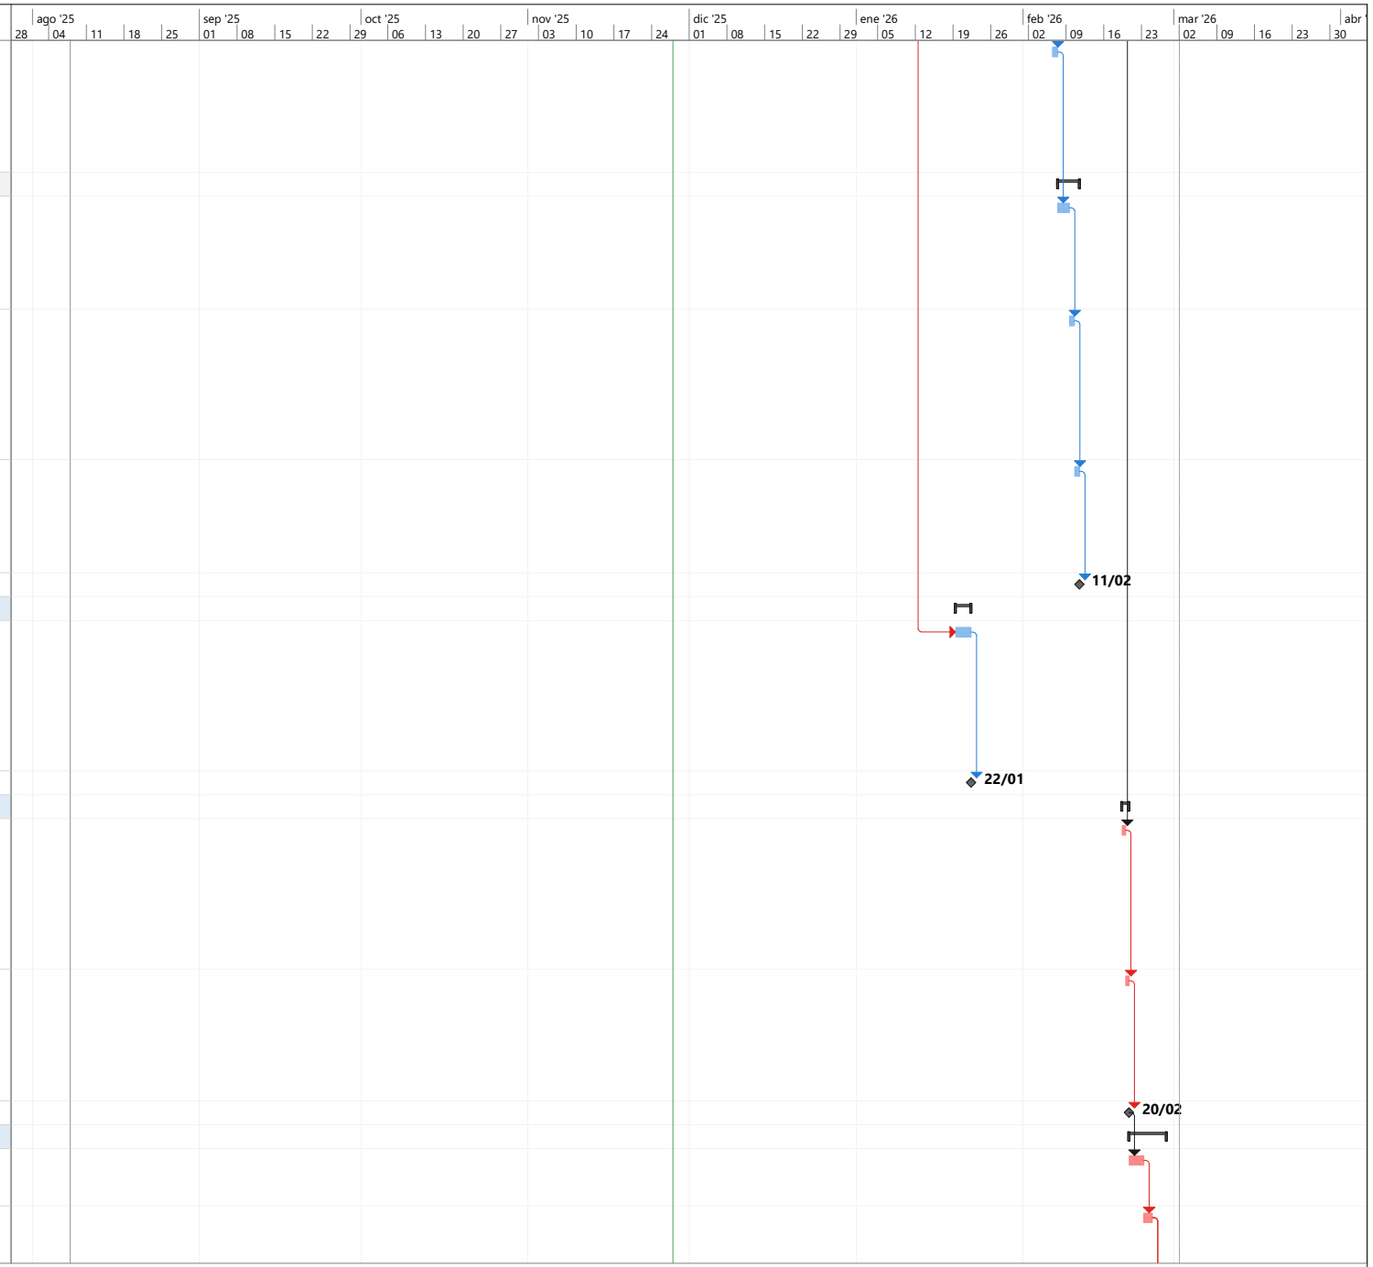

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
228	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, arrancador montado, válvula de pie, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque	$ 10,136,474.84	3 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	227	229
229	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	228	
230	**SEÑALIZACIÓN**	**$ 2,724,196.18**	**4 días**	**mié 25/02/26**	**sáb 28/02/26**		
231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5 según planos) Letras tipo ARIAL de 0.20 m de	$ 1,915,542.00	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	227	232
232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así: (1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal	$ 808,654.18	2 días	jue 26/02/26	sáb 28/02/26	231	233,235CC
233	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	232	
234	**ASEO**	**$ 2,047,270.37**	**2 días**	**jue 26/02/26**	**dom 01/03/26**		
235	ASEO GENERAL DE OBRA	$ 2,047,270.37	2 días	jue 26/02/26	dom 01/03/26	232CC	236
236	FIN CAPÍTULO O GRUPO	$ 0.00	0 días	dom 01/03/26	dom 01/03/26	235	237
237	FIN CONTRATO	$ 0.00	0 días	dom 01/03/26	dom 01/03/26	236	



CONSORCIO ORIMEG
JUAN CARLOS SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA

JVM INGENIERIA SAS BIC
FABIAN RADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
