AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6

INFORME PARCIAL 002 PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 014 DE 2024

OBJETO: "REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA."

EMPRESA CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO

MUNICIPIO DE YONDÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

26 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La **necesidad** de realizar las actividades del proyecto "**Servicio de Restauración y Recuperación de Ecosistemas en el Municipio de Yondó, Antioquia**" surge debido a varios factores críticos relacionados con la salud de los ecosistemas acuáticos y el bienestar de la comunidad local.

Yondó, **rodeado de importantes ríos y fuentes hídricas**, depende de estos recursos para la sostenibilidad ambiental y el bienestar de sus habitantes. Sin embargo, estos cuerpos de agua se han visto **afectados por la acción humana**, haciendo necesaria su protección y restablecimiento. El municipio no cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, lo cual genera **impactos negativos** en los cuerpos hídricos, afectando la pesca artesanal y el hábitat de la fauna silvestre.

Las acciones erosivas, de sedimentación y de contaminación están afectando los cuerpos de agua, limitando la entrada de luz y oxígeno, degradando la calidad del agua y causando su pérdida progresiva por sedimentación y eutrofización.

Los **impactos positivos** que este proyecto tendría en la localidad de impacto son múltiples:

- **Mejoramiento de la calidad de vida:** El proyecto contribuirá a mejorar las condiciones medioambientales, lo cual se traducirá en una mejor calidad de vida para la población local.

- **Fortalecimiento de la fauna y flora local:** Al reactivar los procesos biológicos, se fortalecerá la fauna y flora local, permitiendo que estos ecosistemas permanezcan como entidades funcionales en el paisaje.

- **Control de inundaciones y regulación de caudales:** Las ciénagas, como la Ciénaga el Totumo y la Ciénaga Sardinata, controlan inundaciones y regulan los caudales de los ríos, reteniendo sedimentos y purificando el agua.

- **Mejora de la conectividad hídrica:** Se busca mejorar la conectividad hídrica de los diferentes complejos cenagosos, cuerpos de agua y caños colectores, permitiendo el intercambio de aguas y nutrientes necesarios para su recuperación, brindando condiciones óptimas para la vida acuática.

- **Mitigación de la degradación:** La limpieza de ciénagas y canales revertirá los efectos negativos y recuperará su equilibrio ecológico.


- **Beneficios para la población local:** El desarrollo de estas obras traerá consigo múltiples beneficios para la población local, que se verán representados en el mejoramiento paulatino de su calidad de vida mediante las mejores condiciones medio ambientales.

- **Conocimiento y participación comunitaria:** Es fundamental la relación con las comunidades residentes conocedoras de los procesos históricos de ocupación del territorio, de las transformaciones ambientales que este ha sufrido

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6


1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área a intervenir está localizada en el departamento de Antioquia en la región Del Magdalena medio ubicado al nororiente en el municipio de Yondó, sobre la margen occidental del rio magdalena.

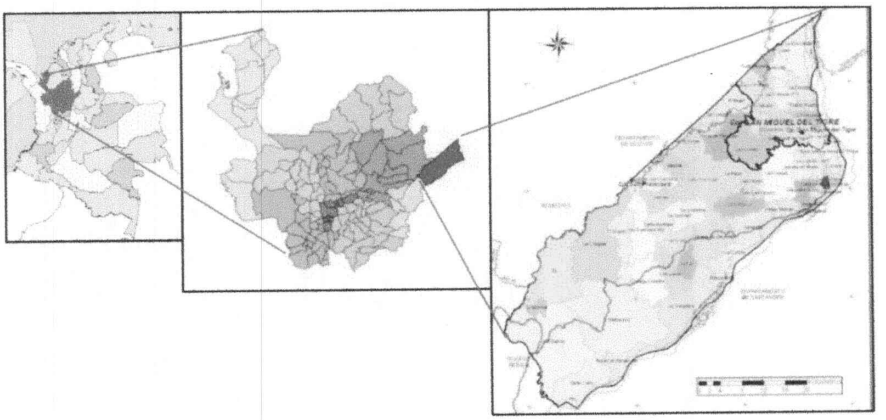

Los
sectores a intervenir con la presente propuesta comprenden:

- Se encuentra ubicado en el Municipio de Yondó en el departamento de Antioquia, este municipio tiene una extensión aproximada de 1.881 kilómetros cuadrados. Para el presente contrato se realizará la vigilancia y control en el corregimiento san miguel del tigre caño agrio, es de alta importancia mencionar que el caño agrio y el caño carmelitas hacen parte del adicional realizado mediante el otro si no 003.

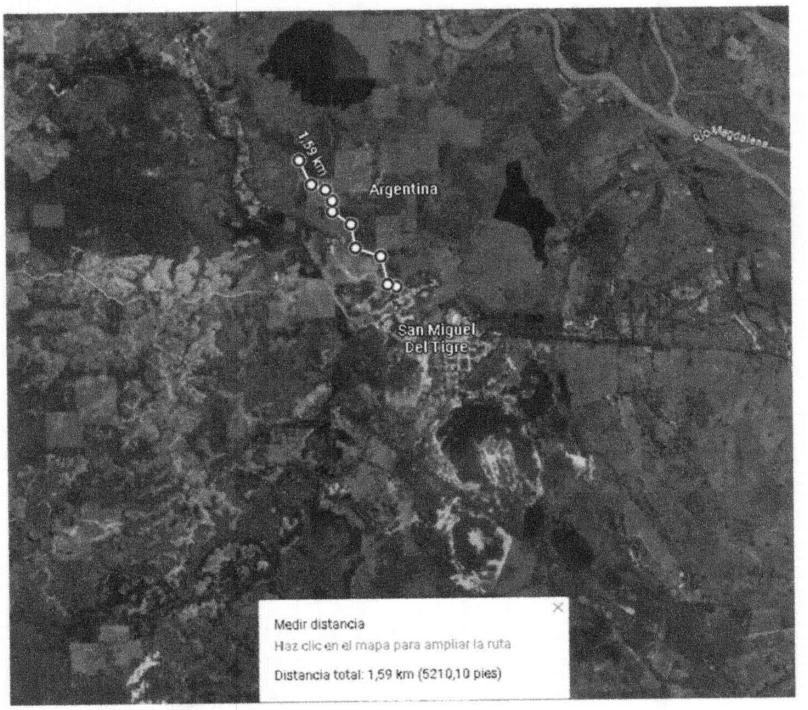

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
E. S. P. 811.021.151-6

2. *RESUMEN EJECUTIVO*

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
NUMERO DEL CONTRATO	014--2024
CONTRATISTA	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S. P
REP. LEGAL EMPRESA DE AGUAS	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT O CC)	811.021.151-6
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.447.398 EXPEDIDA BARRANCABERMEJA
SUPERVISOR	***MARTHA RUTH SEGURA URIBE.***
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 014 DE 2024 ***"REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA."***.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.085.210.726,25
VALOR PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPADO	$2.042.605.363,12
PORCENTAJE DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPADO	50%
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA 003	$1.099.715.001,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD 014-2024	$ 5.184.925.727,25
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHENTA (80) DÍAS
ADICIÓN EN PLAZO	N/A
FECHA FINAL SEGÚN ADICIÓN EN PLAZO SOBRE LA EJECUCIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN DE CONTRATO	N/A
REINICIO DEL CONTRATO	N/A
VALOR EJECUTADO A LA PRESENTE FECHA	$ 4.591.129.002,52
PORCENTAJE VALOR EJECUTADO	88,55%

3. *RESUMEN EJECUTIVO*

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LAS OBRAS

1. ***Realizar limpieza manual de material vegetal que se encuentre al interior de los cuerpos hídricos:***

Consiste en la limpieza y extracción de material vegetal y residuos sólidos inorgánicos presentes en caños, cuerpos de agua y/o canales artificiales por los cuales se distribuyen las aguas, producto de los malos manejos por parte de la población localizada en lugares aledaños a estos, por los cuales se distribuyen las aguas en el municipio de Yondó.

2. ***Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir):***

Consiste en la actividad del levantamiento topográfico mediante la Planimetría inicial (Fotogrametría) de las condiciones de los puntos a intervenir, el seguimiento a la ejecución de actividades mediante tomas aéreas con equipo de Dron y un levantamiento planimétrico (Fotogrametría) final de cada una de las áreas intervenidas para los puntos.

3. ***Retiro de material extraído en los cuerpos hídricos y canales naturales y/o artificiales para disposición final de residuos:***

Consiste en el retiro de todo material proveniente de la limpieza en cada uno de los cuerpos hídricos artificiales y/o naturales, llámese árboles, secos trozados, material de pasto y enraizado, residuos sólidos inorgánicos, entre otros elementos.

La Gerencia de la empresa estará obligada a invertir los recursos obtenidos de acuerdo con los parámetros del proyecto y a reportar en los informes que se entreguen solo las actividades contratadas.

La Empresa Aguas & Aseo de Yondó S.A E.S.P, se encargará de realizar los procesos de contratación de acuerdo a los estatutos vigentes para estos efectos.

Contratación de la interventoría:

El proyecto contempla la contratación de la interventoría, con el fin que ese pueda realizar un seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico del contrato de obra; el presente contrato no será concurrente con la supervisión y tiene como objeto disponer de insumos de información suficientes que permitan que en el marco de la ejecución del contrato de obra se atienda la observancia de la moralidad administrativa, y de esta forma procurar la prevención de actos de corrupción y la transparencia de la gestión contractual, de acuerdo a los establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Seguimiento técnico: *Por medio de este seguimiento, el interventor deberá verificar que el contrato de obra se esté ejecutando en el marco de las especificaciones técnicas establecidas.*

Seguimiento administrativo: *En el marco de este seguimiento, el interventor requerirá al contratista de la obra la información correspondiente a contratos, documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social, seguros requeridos para la ejecución del contrato, información de pagos de nómina, prestaciones sociales y demás conceptos a los que tengan derecho los trabajadores requeridos para la ejecución de la obra; este seguimiento se realizará durante la ejecución del contrato de obra y hasta antes de la liquidación.*

Seguimiento financiero: *La etapa de planeación del contrato de obra, implica la consolidación de presupuesto oficial que se confirma con la suscripción y perfeccionamiento de este; de tal forma que corresponde al interventor realizar un acucioso seguimiento de las inversiones realizadas por el contratista de obra, de acuerdo con el presupuesto oficial, la necesidad de esta, y que estas atiendan a los principios de economía, eficiencia y efectividad; procurando que todas las gestiones presupuestales se atiendan en salvaguarda de los recursos públicos.*

Seguimiento contable: *El interventor deberá realizar un seguimiento de los registros contables derivados de la ejecución del contrato de obra; debiendo verificar los soportes contables y que estén debidamente documentados, que los informes contables reflejen la realidad de las actividades desarrolladas, que se cumplan con las normas y procedimientos contables establecidos, además del cumplimiento de las obligaciones fiscales a que haya lugar.*

Seguimiento jurídico: *El interventor deberá realizar la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales durante toda la ejecución del contrato. Esto implica asegurar que el contrato esté debidamente perfeccionado, es decir, que se hayan cumplido todos los requisitos legales para su validez, como la suscripción de las pólizas necesarias y su correspondiente aprobación. El interventor también debe verificar que cualquier modificación contractual esté legalmente justificada, y asegurar que los procedimientos y plazos establecidos por la ley se cumplan a cabalidad, minimizando así posibles riesgos legales.*

Seguimiento ambiental: *Dada la naturaleza del contrato de obra pretendido, es menester que el interventor realice un seguimiento ambiental, en el que se coordinen las actividades y mecanismos de control, tendientes a procurar que las obras y actividades planteadas, sean implementadas de tal forma que se minimicen los impactos ambientales negativos y se maximicen los positivos, en virtud de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia hayan impartidos las autoridades ambientales competentes.*

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRADA

Se contrato el ítem 1 Realizar limpieza manual de material vegetal emergente medial y superficial que se encuentre al interior de las aguas de los ecosistemas - ciénaga la represa, actividad *administrada directamente por la empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S. P, se realizó exámenes al personal de campo, se firmó contrato individual con vinculación en nómina, a continuación, se describe información del personal obrera en campo:*

Adicionalmente, en el marco de la ejecución del **Otrosí No. 003**, se llevaron a cabo las actividades correspondientes a la **vinculación laboral del personal operativo** que participó de manera integral en el desarrollo del objeto contractual. Estas actividades incluyeron la **realización de exámenes médicos ocupacionales**, la **entrega completa de dotación de elementos de protección personal**, así como la **afiliación y actualización de los registros ante los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales**, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo y asegurando condiciones adecuadas para la ejecución de las labores en campo.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6

E. S. P.

3.3. RESUMEN AVANCE FÍSICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			ADICION N°01		CONDICIONES SEGÚN ADICION N°01 DEL CONTRATO		CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos											-	-				
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00	9.100,00	$ 776.275.500,00	40.835,00	$ 3.483.429.675,00	28.561,50	8.190,00	36.751,50	2.436.438.757,50	$ 698.647.950,00	$ 3.135.086.707,50	4.083,50	$ 348.342.968,00
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00	9.100,00	$ 42.551.600,00	40.835,00	$ 190.944.460,00	28.561,50	8.190,00	36.751,50	133.553.574,00	$ 38.296.440,00	$ 171.850.014,00	4.083,50	$ 19.094.446,00
1.1.3	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00	260,00	$ 20.650.000,00	1.680,00	$ 123.900.000,00	1.260,00	252,00	1.512,00	92.925.000,00	$ 16.585.000,00	$ 111.510.000,00	168,00	$ 12.390.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 2.958.797.035,00		$ 839.477.100,00		$ 3.798.274.135,00				$ 2.662.917.331,50	$ 755.529.390,00	$ 3.418.446.721,50		$ 379.827.413,50
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 858.051.140,15		$ 243.448.359,00		$ 1.101.499.499,15				$ 772.246.026,13	$ 219.103.523,10	$ 991.349.549,23		$ 110.149.949,92
	ADMINISTRACIÓN	24,00%			$ 710.111.268,40		$ 201.474.504,00		$ 911.585.792,40				$ 639.100.159,56	$ 181.327.053,60	$ 820.427.213,16		$ 91.158.579,24
	IMPREVISTOS				$ -		$ -		$ -				$ -	$ -	$ -		$ -
	UTILIDAD	5%			$ 147.939.851,75		$ 41.973.855,00		$ 189.913.706,75				$ 133.145.866,57	$ 37.776.469,50	$ 170.922.336,07		$ 18.991.370,68
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				$ 3.816.848.175,15		$ 1.082.925.459,00		$ 4.899.773.634,15				$ 3.435.163.357,63	$ 974.632.913,10	$ 4.409.796.270,73		$ 489.977.363,42
	INTERVENTORIA				$ 188.260.360,00		$ -		$ 188.260.380,00				$ 94.130.190,00	$ -	$ 94.130.190,00		$ 94.130.190,00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 4.005.108.555,15		$ 1.082.925.459,00		$ 5.088.034.014,15				$ 3.529.293.547,63	$ 974.632.913,10	$ 4.503.926.460,73		$ 584.107.553,42
	AGUAS Y ASEO DE YONDO E.S.P. 2% DEL PROYECTO	2%			$ 80.102.171,10	1,550387596899225%	$ 16.789.542,00		$ 96.891.713,10				$ 72.091.953,99	$ 15.110.587,80	$ 87.202.541,79		$ 9.689.171,31
	VALOR TOTAL DE LA OBRA, INTERVENTORIA Y AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P.				$ 4.085.210.726,25		$ 1.099.715.001,00		$ 5.184.925.727,25				$ 3.601.385.501,62	$ 989.743.500,90	$ 4.591.129.002,52		$ 593.796.724,73

1080

De acuerdo a la información anterior se presenta el avance porcentual a la fecha de 21 de DICIEMBRE de 2024, se ha ejecutado el 88,55%, cumpliendo la programación del proyecto.

RESUMEN DE INVERSIÓN

Con corte al 21 de diciembre de 2024 se tiene una inversión programada de $4.399.345.636,22 – 95,45%, de lo anterior decimos que a este mismo corte se tiene ejecutado $ 4.591.129.002,52 – 88,55%, los anteriores datos corresponden al corte parcial del contrato delegación administrativa.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Trabajo comprendido entre el 01 de diciembre al 21 de diciembre de 2024 se describen las actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS		
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL
1	Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos				
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos	M2	28.561,50	8.190,00	36.751,50
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	28.561,50	8.190,00	36.751,50
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.260,00	252,00	1.512,00

5. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

Plazo total	Ochenta (80) dias
Tiempo total transcurrido	Setenta y dos (72) dias
Avance porcentual en tiempo.	90,00%

7.2. GASTOS HONORARIOS

Para el presente periodo se informa el avance del 90,00% en el rubro de honorarios según el valor total contratado, para el cual se presenta anexa a este informe la respectiva factura de cobro.

8. CONTROL DE CALIDAD

En cumplimiento de los lineamientos trazados por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE YONDÓ, la empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. en cumplimiento a los documentos de los estudios previos, se cumple con las actividades pactadas y se controla la calidad garantizando un buen resultado de los trabajos realizados.

- Se realizo la supervisión y un estricto control a la limpieza y mantenimiento que el personal y subcontratista realizaron en este periodo, según especificaciones técnicas vigentes.
- Se realizo inspección y control de los equipos para el buen desarrollo de las actividades y el trabajo seguro en campo.

9. MODIFICACIONES EN DISEÑOS

El **Contrato Interadministrativo de Administración Delegada No. CD 014-2024**, suscrito el 4 de octubre de 2024, permitió la ejecución de actividades de limpieza manual en cuerpos hídricos clave del municipio de Yondó, específicamente en Caño Agrio, Caño Colector y Caño Colector Canalizado. Estas acciones incluyeron la remoción de material vegetal y residuos sólidos, facilitando el flujo del agua, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la disponibilidad hídrica para el consumo y la biodiversidad. Además, se realizaron levantamientos topográficos con fotogrametría para delimitar las áreas intervenidas y evaluar el impacto de los trabajos, complementados con el retiro de material sedimentado para su disposición final. Estas labores resultan fundamentales ante la vulnerabilidad del municipio frente al fenómeno de La Niña y el aumento de lluvias proyectado por el IDEAM, fortaleciendo la capacidad de regulación hídrica y mitigación de inundaciones. Para completar las intervenciones programadas y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, se requiere ampliar los frentes de trabajo y disponer de mayor maquinaria, asegurando el cumplimiento del contrato y el bienestar ambiental y social de la comunidad.

10. MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO RURAL

La empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. evaluó el impacto ambiental y reconoce que las actividades desempeñadas en las zonas residenciales y veredales no afectan los ecosistemas, si no que prologan el buen flujo del recurso hídrico.

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6

- ***Programación general de obra administrativa***

General + adicional

CARRERA 53 # 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitán
Yondó -Antioquia

NUMERO DE CONTRATO	CD 014-2024
OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA
EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P CD 014-2024
EMPRESA CONTRATISTA	SALIPAISMA S.A.S. CT.OB.058-2024
EMPRESA INTERVENTOR	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CT.IV.059-2024

ITEM	ACTIVIDAD	Unidad	Meta	V. Unitario	V. Parcial		MES 1				MES 2			
							31 DE OCTUBRE - 30 DE NOVIEMBRE				01 DE DICIEMBRE - 31 DE DICIEMBRE			
							SM 1 (31/10/2024 AL 07/11/2024)	SM 2 (08/11/2024 AL 15/11/2024)	SM 3 (16/11/2024 AL 22/11/2024)	SM 4 (23/11/2024 AL 30/11/2024)	SM 5 (01/12/2024 AL 07/12/2024)	SM 6 (08/12/2024 AL 15/12/2024)	SM 7 (16/12/2024 AL 21/12/2024)	SM 8 (24/12/2024 AL 31/12/2024)
	ACTIVIDADES DIRECTAS													
						PROGRAMADO	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%
1,1,1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	VALOR PROGRAMADO	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 532.463.146,88	$ 532.463.146,88	$ 532.463.146,88	$ 532.463.146,88
						EJECUTADO	-	14,0%	24%	31%	7%	7%	7%	0%
						VALOR EECUTADO	$ -	$ 487.287.751,50	$ 852.753.565,13	$ 1.096.397.440,88	$ 232.882.650,00	$ 232.882.650,00	$ 232.882.650,00	
						PROGRAMADO	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%
1,1,2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00	VALOR PROGRAMADO	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 29.187.007,50	$ 29.187.007,50	$ 29.187.007,50	$ 29.187.007,50
						EJECUTADO	0	14,0%	24%	31%	7%	7%	7%	0%
						VALOR EECUTADO	0	$ 26.710.714,80	$ 46.743.750,90	$ 60.099.108,30	12.765.480	12.765.480	12.765.480	
						PROGRAMADO	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%
	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	VALOR PROGRAMADO	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 18.068.750,00	$ 18.068.750,00	$ 18.068.750,00	$ 18.068.750,00
						EJECUTADO	-	18,0%	32%	41%	5%	5%	5%	0%
						VALOR EECUTADO	-	$ 18.585.000,00	$ 32.523.750,00	$ 41.816.250,00	6.195.000	6.195.000	6.195.000	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 3.798.274.135,00		$ 369.849.629,38	$ 369.849.629,38	$ 369.849.629,38	$ 369.849.629,38	$ 579.718.904,38	$ 579.718.904,38	$ 579.718.904,38	$ 579.718.904,39
	ADMINISTRACION	24%			$ 911.585.792,40		$ 88.763.911,05	$ 88.763.911,05	$ 88.763.911,05	$ 88.763.911,05	$ 139.132.537,05	$ 139.132.537,05	$ 139.132.537,05	$ 139.132.537,05
	IMPREVISTO	0%			$ -									
	UTILIDAD	5%			$ 189.913.706,75		$ 18.492.481,47	$ 18.492.481,47	$ 18.492.481,47	$ 18.492.481,47	$ 28.985.945,22	$ 28.985.945,22	$ 28.985.945,22	$ 28.985.945,22
	TOTAL PROGRAMADO DIRECTO+INDIRECTOS				$ 4.899.773.634,15		477.106.021,89	477.106.021,89	477.106.021,89	477.106.021,89	747.837.386,64	747.837.386,64	747.837.386,64	747.837.386,66
	TOTAL INTERVENTORIA				$ 188.260.380,00		$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50
	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	2%			$ 96.891.713,10		$ 10.012.771,39	$ 10.012.771,39	$ 10.012.771,39	$ 10.012.771,39	$ 14.210.156,89	$ 14.210.156,89	$ 14.210.156,89	$ 14.210.156,89
	TOTAL OBRA				$ 5.184.925.727,25	TOTAL OBRA ACUMULADA	$ 510.651.340,78	$ 510.651.340,78	$ 510.651.340,78	$ 510.651.340,78	$ 785.580.091,03	$ 785.580.091,03	$ 785.580.091,03	$ 785.580.091,05

TOTAL INTERVENTORIA		$ 188.260.380,00	% EJECUTADO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
			V EJECUTADO	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50				
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	2%	$ 107.463.722,15	% EJECUTADO	16,77%	16,77%	16,77%	16,77%	4,69%	4,69%	4,69%	
			V EJECUTADO	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 5.036.862,60	$ 5.036.862,60	$ 5.036.862,60	

	PROGRAMADO	VR AVANCE SEMANAL					510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	785.580.091,03	785.580.091,03	785.580.091,03	785.580.091,05
		VR AVANCE ACUMULADO					510.651.340,78	1.021.302.681,56	1.531.954.022,34	2.042.605.363,13	2.828.185.454,16	3.613.765.545,19	4.399.345.636,22	5.184.925.727,27
		% AVANCE SEMANAL					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		% AVANCE ACUMULADO					12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	60,00%	70,00%	85,00%	100,00%
	EJECUTADO	VR AVANCE SEMANAL					$ -	$ 532.583.466,30	$ 932.021.066,03	$ 1.198.312.799,18	$ 251.843.130,00	$ 251.843.130,00	$ 251.843.130,00	$ -
		AIU	0,29				$ -	$ 154.449.205,23	$ 270.286.109,15	$ 347.510.711,76	$ 73.034.507,70	$ 73.034.507,70	$ 73.034.507,70	$ -
		TOTAL EJECUTADO					$ -	$ 687.032.671,53	$ 1.202.307.175,17	$ 1.545.823.510,94	$ 324.877.637,70	$ 324.877.637,70	$ 324.877.637,70	$ -
		VR AVANCE ACUMULADO					41.555.536,00	770.143.743,52	2.014.006.454,69	3.601.385.501,62	3.931.300.001,92	4.261.214.502,22	4.591.129.002,52	4.591.129.002,52
		% AVANCE SEMANAL					0,80%	14,05%	23,99%	30,62%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00%
		% AVANCE ACUMULADO					0,80%	14,85%	38,84%	69,46%	75,82%	82,18%	88,55%	88,55%

NOTA: la interventoria no relaciona ejecucion del PDT dentro del periodo informado,puesto que no realizo cobro sobre el avance que realizo.

1040


- ***Memorias de cálculo.***


MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA RUTH SEGURA URIBE SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
PERIODO:	DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,01 Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

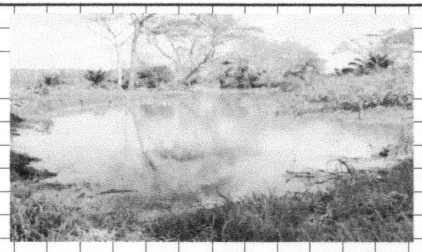

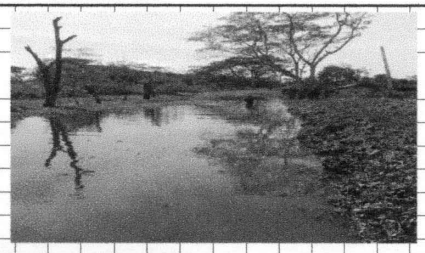



SUPERVISOR

ADMINISTRADOR

DIMENSIONES (Si aplica)

ABSCISA	ANCHO DE CAÑO M.	PROMEDIO ANCHO M.	DISTANCIA M.	AREA M2.
K0+000	20			
		19	100	1900
K0+100	18			
		19,5	100	1950
K0+200	21			
		20,5	100	2050
K0+300	20			
		25,5	89,81	2290
K0+389,81	31			
			TOTAL	8190 M2

TOTAL	8190,00	M2

1092


MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA RUTH SEGURA URIBE SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
PERIODO:	DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,02 Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO



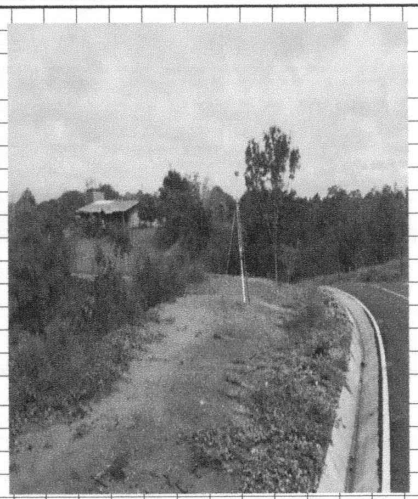

SUPERVISOR

ADMINISTRADOR

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA LIMPIADA CAÑO AGRIO M2

ABSCISA	ANCHO DE CAÑO M.	PROMEDIO ANCHO M.	DISTANCIA M.	AREA M2.
K0+000	20			
		19	100	1900
K0+100	18			
		19,5	100	1950
K0+200	21			
		20,5	100	2050
K0+300	20			
		25,5	89,81	2290
K0+389,81	31			
			TOTAL	**8190 M2**

TOTAL	**8190,00**	**M2**

1093

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA RUTH SEGURA URIBE SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
PERIODO:	DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,03 Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo
UNIDAD:	M3

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES (Si aplica)

ABSCISA	ANCHO PROME	LONGUITUD	ESPESOR	TOTAL M3
K0+00 - K0+100	19,00	100,00	0,020	38,00
K0+100 - K0+200	19,50	100,00	0,025	48,26
K0+200 - K0+300	20,50	100,00	0,025	51,25
K0+300 - K0+389,81	25,50	89,80	0,050	114,50
				252,0

TOTAL	**252,00**	**M3**

SUPERVISOR

ADMINISTRADOR

1094

- ***Informes semanales.***

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29	
Fecha de Aprobación: 01/12/2014		
Versión: 1	Página: 1 de 1	

FECHA		PERIODO No.	5	DEL	1-dic-24	AL	8-dic-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	37	EQUIV,	62%	PLAZO TRANSCURRIDO:	37	EQUIV.	62%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		3.816.848.175,15
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$		1.908.424.087,58
VALOR POR PAGAR:	$		188.260.380,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.908.424.087,58
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	50,00%	90,00%	40,00%
Durante el periodo	12,50%	8,00%	-4,50%
Acumulado Actual	62,50%	98,00%	35,50%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	38	22	21,30

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,0%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,5%
4	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.358,28	90,0%
5	$ 2.385.530.109,45	$ 3.740.511.211,65	98,0%
TOTAL	$ 2.385.530.109,45	$ 3.740.511.211,65	156,8%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

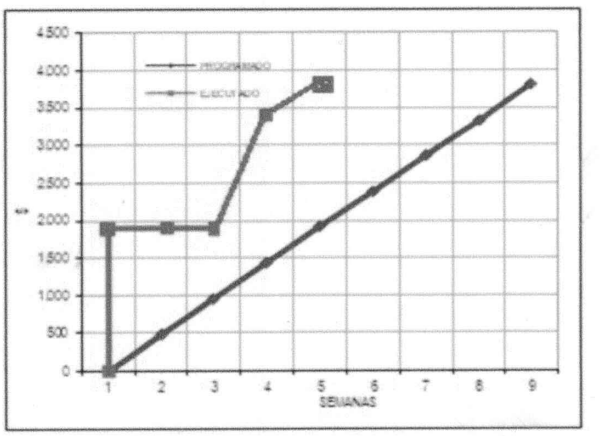

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	5	DEL	1-dic-24	AL	8-dic-24

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se continuan las actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio logrando un avance significativo en respecto con lo programado programado

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con un pago anticipado del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se viene trabajando a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja el alto porcentaje de ejecucion del 98% Vs el 62,50% programado

1

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y

N/A


6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte a del proyec







SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29
Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	6	DEL	9-dic-24	AL	15-dic-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	45	EQUIV,	75%	PLAZO TRANSCURRIDO:	45	EQUIV.	75%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$		94.130.190,00	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$		2.449.886.817,08
VALOR POR PAGAR:	$		94.130.190,00	VALOR POR PAGAR:	$		2.449.886.817,08
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	62,50%	76,34%	13,84%
Durante el periodo	13,09%	5,00%	-8,09%
Acumulado Actual	75,59%	81,34%	5,75%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	45	15	3,45

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,0%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,5%
4	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.358,28	70,1%
5	$ 2.385.530.109,45	$ 3.740.511.211,65	76,3%
6	$ 3.703.611.284,34	$ 3.985.511.211,65	81,3%
TOTAL	$ 3.703.611.284,34	$ 3.985.511.211,65	107,6%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

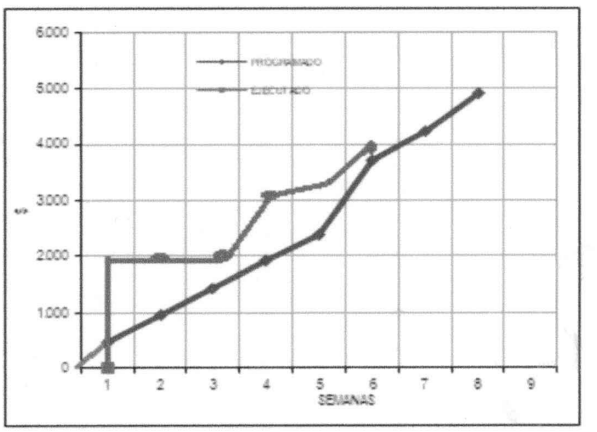

1099

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	6	DEL	9-dic-24	AL	15-dic-24

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se continuan las actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio logrando un avance significativo en respecto con lo programado programado

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con un pago anticipado del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se viene trabajando a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja el alto porcentaje de ejecucion del 81,34% Vs el 75,59% con la reprogramacion debido al adicional en valor

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldia. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29	
Fecha de Aprobación:	01/12/2014	
Versión: 1	Página: 1 de 1	

FECHA		PERIODO No.	7	DEL	16-dic-24	AL	21-dic-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	52	EQUIV,	87%	PLAZO TRANSCURRIDO:	52	EQUIV.	87%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$		94.130.190,00	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$		2.449.886.817,08
VALOR POR PAGAR:	$		94.130.190,00	VALOR POR PAGAR:	$		2.449.886.817,08
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	75,59%	81,35%	5,76%
Durante el periodo	10,55%	8,65%	-1,90%
Acumulado Actual	86,14%	90,00%	3,86%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	51	9	2,32

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,0%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,5%
4	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.358,28	70,1%
5	$ 2.385.530.109,45	$ 3.740.511.211,65	76,3%
6	$ 3.703.611.284,34	$ 3.985.511.211,65	81,3%
7	$ 4.220.665.008,46	$ 4.409.796.270,74	90,0%
TOTAL	$ 4.220.665.008,46	$ 4.409.796.270,74	104,5%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

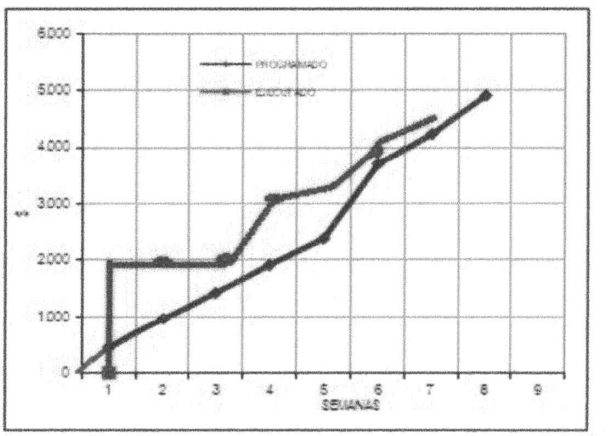

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29 Fecha de Aprobación: 01/12/2014 Versión: 1 | Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	7	DEL	16-dic-24	AL	21-dic-24

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se continuan las actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio logrando un avance significativo en respecto con lo programado

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con un pago anticipado del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se viene trabajando a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja un pequeño adelanto en el porcentaje de ejecucion del 86,14% Vs el 90,00%

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldia. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A


6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte ac al del







SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

- ***Bitácora de obra.***

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 1 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realoizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 2 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA


Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	410			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	410			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

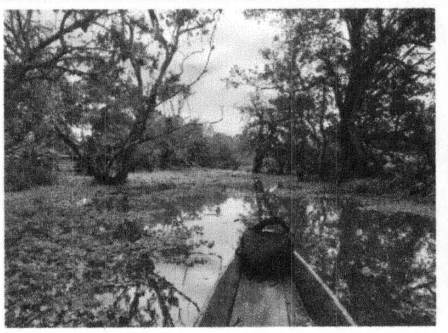

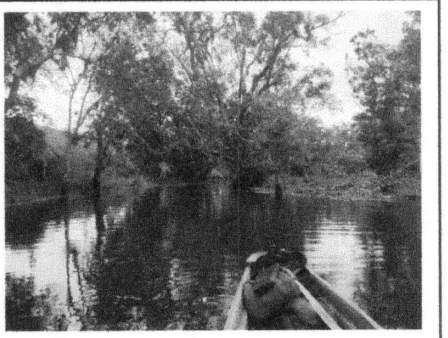

OBSERVACIONES

se realiza inicio de actividades en el correguimiento san miguel del tigre, en la zona de caño agrio

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 3 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	400			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	400			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de topografia sector caño agrio corregimiento el tigre.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 4 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	516			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	516			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

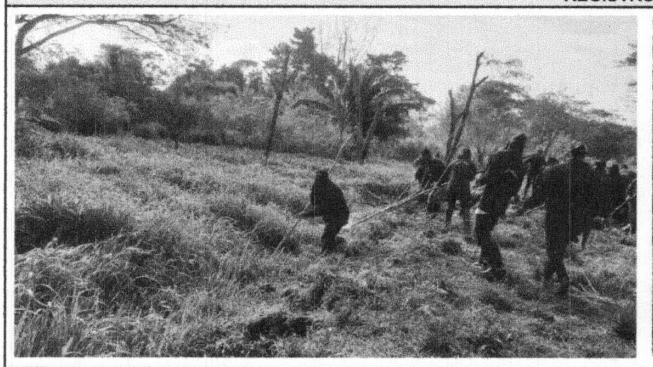

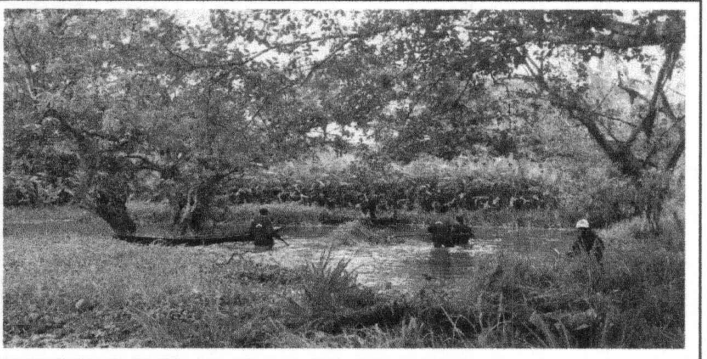

OBSERVACIONES

se continuan con las acrividades de limpieza en el area perimetral del caño agrio del corregimiento san miguel del tigre

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 5 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA


Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	421			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	421			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

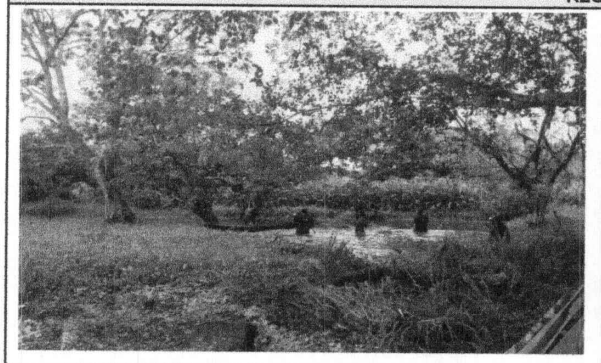

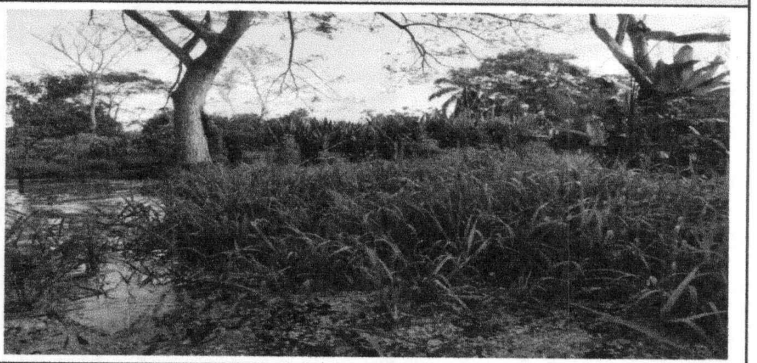

OBSERVACIONES

joranda de limpieza en el area del caño agrio transcurrida con normalidad

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 6 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	566			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	566			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO



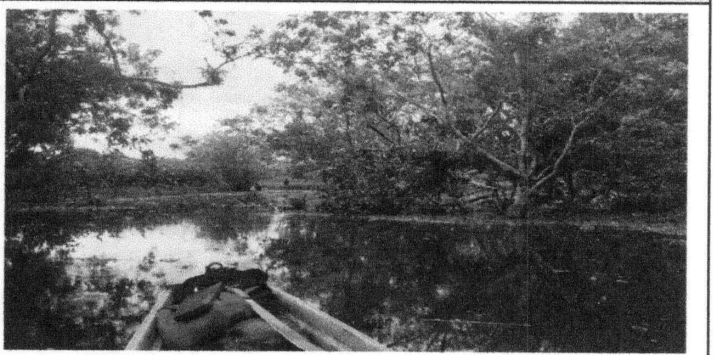

OBSERVACIONES

Se realiza jornada de limpieza sector caño agrio del corregimiento san miguel del tigre. Se presenta accidente laboral a las 12:15 pm,por deslizamiento.

Elaborado por:

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 7 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	580			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	580			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se realiza jornada de capacitación por parte de la ARL AXA COLPATRIA. Oficina Salupaisma. Sin novedades.

Elaborado por:

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 8 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 9 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA


Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	413			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	413			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO



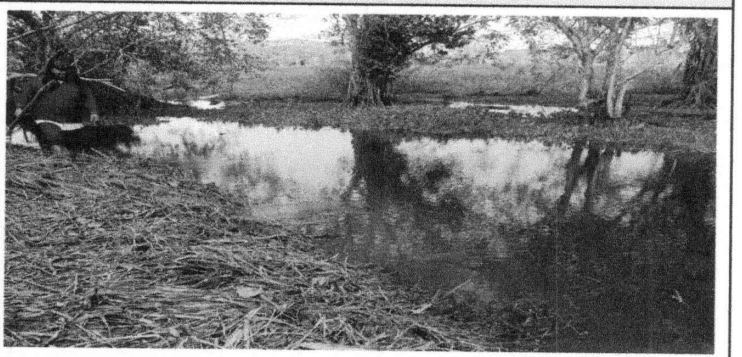

OBSERVACIONES

Se ejecutan labores de limpieza en caño agrio del corregimiento san miguel del tigre. Se presenta accidente laboral a las 11 am.

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

SUPERVISOR
