SERVICIOS DE INGENIERÍA

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 059 DE 2024.



ESTADO TECNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA No. 058– 2024 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.

DICIEMBRE DE 2024

Periodo	Elaboro	Reviso	Aprobó
22/12/2024 30/12/2024	Dayanna medina muñoz Residente Interventoría	Luis Manuel Bustamante Romero Director de Interventoría	Luis Manuel Bustamante Romero Representante Legal

01

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION

2 ALCANCE

3 OBJETIVOS

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
4.2 CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
4.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
4.5 INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO.

5 ANEXOS

5.1 FORMATO F-GPI-SIN-34 INFORME EJECUTIVO MENSUAL.
5.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE INTERVENTORÍA (F-GPI-SIN-29).
5.3 LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

6 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
6.2 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL (F-GPI-SIN-16).
6.3 MEMORIAS DE CÁLCULO (F-GPI-SIN-38)

7 CONTROL DE CALIDAD.

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
7.2 CONTROL DE EQUIPOS (F-GPI-SIN-13).
7.3 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (F-GPI-SIN-14).
7.4 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (F-GPI-SIN-10).

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS.

8.1 PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO
8.2 PERSONAL DE OBRA.
8.3 HOJAS DE VIDA.
8.4 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.
8.5 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
8.6 ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

9 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
9.2 ACTAS DE VECINDAD

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
10.2 ACTAS SUSCRITAS.
10.3 RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES

10.4 CONTROL DE GARANTÍAS.
10.5 CONTROL DE PAGOS PARAFISCALES.
10.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO (F-GPI-SIN-21).
10.7 REGÍSTRO DIARIO DE OBRA (BITÁCORA).

11 CONTRATO DE INTERVENTORIA

11.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.
11.2 ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE TRABAJO.
11.3 PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
11.4 HOJA DE VIDA
11.5 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
11.6 ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN.
11.7 ACTAS SUSCRITAS.
11.8 RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES.
11.9 CONTROL DE GARANTÍAS.
11.10 CONTROL DE PAGOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.
11.11 ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

11.11.1 PRINCIPIOS DE LA INTERVENTORÍA
11.11.2 FINALIDAD DE LA INTERVENTORÍA
11.11.3 CALIDAD
11.11.4 FUNCIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA
11.11.5 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA
11.11.6 FUNCIONES FINANCIERA DE LA INTERVENTORÍA
11.11.7 FUNCIONES FINANCIERA DE LA INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES EJECUCCION DEL PROYECTO

1 INTRODUCCION

La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, desde hace tiempo inicio un proceso de transformación social y económica, con lo cual busca consolidar un Municipio con equilibrio social y desarrollo sostenible, donde prime la inclusión y las oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos sus habitantes.

Entendiendo que el bienestar de tener fuentes hídricas limpias y sin focos de contaminación es un derecho porque el agua ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana y en el entorno de todo ser humano, adulto o niño se resalta la importancia de crear y/o emprender proyectos, programas y políticas públicas encaminadas a brindar dicho servicio especial, de establecer acciones eficientes que mitiguen la dificultades y necesidades que aquejan a la población más vulnerables, y de generar proyectos de gran magnitud e inversión que propendan por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Yondó.

Para ello, el Municipio de Yondó, trazó en su plan de desarrollo una serie de actividades que buscan dar los primeros pasos para emprender dicho proceso y establecer una ruta que logre mitigar dicha falencia y mejorar esta situación a la población del Municipio de Yondó volviendo a sus habitantes productivos e inculcando el cuidado de sus fuentes hídricas.

Con base en lo mencionado y como solución propuesta a mejorar la condición o ambiente de salubridad que padecen los habitantes, se da inició la ejecución del contrato de obra 058 del 2024, celebrado entre la empresa **SALUPAISMA S.A.S** y el la empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.,** cuyo objeto es la **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024**, por un valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE** con un plazo de 02 meses partir de la suscripción del acta de inicio, donde se busca dar cobertura a las principales fuentes hídricas del municipio.

De la misma forma La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, a través de un PROCESO DE INVITACION A COTIZAR adjudico a **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** el Contrato de **"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024."** para realizar las actividades de Interventoría por un valor de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($188.260.380,00) M/CTE** con un plazo de 02 meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

Al ejecutarse el 90% del valor contractual en el primer mes de ejecución se observó la necesidad de adicionar recursos para ampliar el alcance del contrato de obra por lo cual surgió el Otro Si No 3 el cual adiciono $1.082.925.459,00.

En este sentido el siguiente informe describe las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales realizadas por partes intervinientes en el proyecto para el periodo del 22 al 30 de diciembre de 2024.

Dentro de las principales actividades de este periodo tenemos:

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos.
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo.

2 ALCANCE


El presente informe tiene como alcance establecer el estado físico y financiero de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024 del contrato de Obra **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024".**

3 OBJETIVOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento claro y efectivo de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecución.
- ✓ Cuantificar el costo de las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo de corte.

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

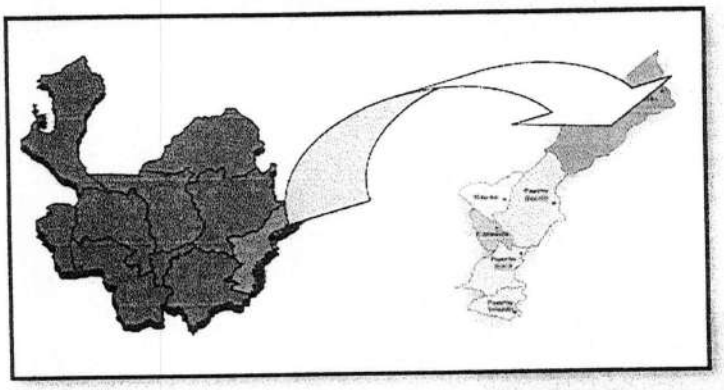

Localización General, Municipio Yondó, Antioquia

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

Año de constitución	1978
Inauguración como municipio	1 enero de 1979
Ordenanza departamental	N° 38 del 23 de noviembre de 1978
Primer Alcalde	Rubén Darío Arango Vélez
Primera empresa	Shell filial de la Royal Duech de Holanda
Primeros pobladores	Indígenas de la etnia Yariguies.

El municipio de Yondó se encuentra localizado en la zona Nororiente del departamento de Antioquia, dentro de la región denominada del Magdalena Medio Antioqueño en la República de Colombia a los 7° 06´ 24" latitud Norte y a los 74° 52´ 46" Longitud Occidental, a una altura promedio de 80 M.S.N.M, con una temperatura promedio de 28°C (fuente Atlas regional Andino IGAC).

El casco urbano está situado sobre una llanura aluvial del Río Magdalena entre las cordilleras Central y Oriental, en terrenos muy bajos e inundables formando depresiones pantanosas o anegadas, las cuales han sufrido procesos de relleno con tierra, material conglomerado, arena y material de sedimentación.

El Municipio de Yondó, presenta en las zonas altas unos suelos ácidos y levemente erosionados, con baja fertilidad clasificados por el ICA como Eutropets de pobre evolución y en las zonas bajas unos suelos de fertilidad moderada clasificados por el ICA como Fluvaquents; pero con problemas de drenaje debido a las bajas pendientes, lo cual permite que el agua se estanque fácilmente en épocas de lluvia por el desbordamiento de los ríos.

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo segundo establece los fines esenciales del estado, entre los cuales se encuentran servir a la comunidad y promover la prosperidad en general. De él se deriva la gestión administrativa que debe cumplirse en los términos del Art. 209 de la Carta Magna; de igual forma en el Artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; atendiendo a esta aseveración, se hace necesario el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos educativos con los que cuenta el municipio garantizando de este modo ambientes propicios que reúnan las condiciones necesarias para atender y garantizar la permanencia de los estudiantes.


El Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo vigente fueron diseñados para atender las expectativas y demandas más sentidas por los habitantes del Municipio de Yondó.

Uno de los principales sectores a fortalecer es el saneamiento básico, la administración municipal, a través de La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P** tiene como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así como el mantenimiento y cuidado de los sistemas hídricos del municipio.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024".** Se encuentra ubicado en el Municipio de Yondo en el departamento de Antioquia, este municipio tiene una extensión aproximada de 1.881 kilómetros cuadrados. Para el presente contrato se realizará la vigilancia y control en la vereda la represa, caño carmelitas.

Municipio de YONDO
Departamento de ANTIOQUIA

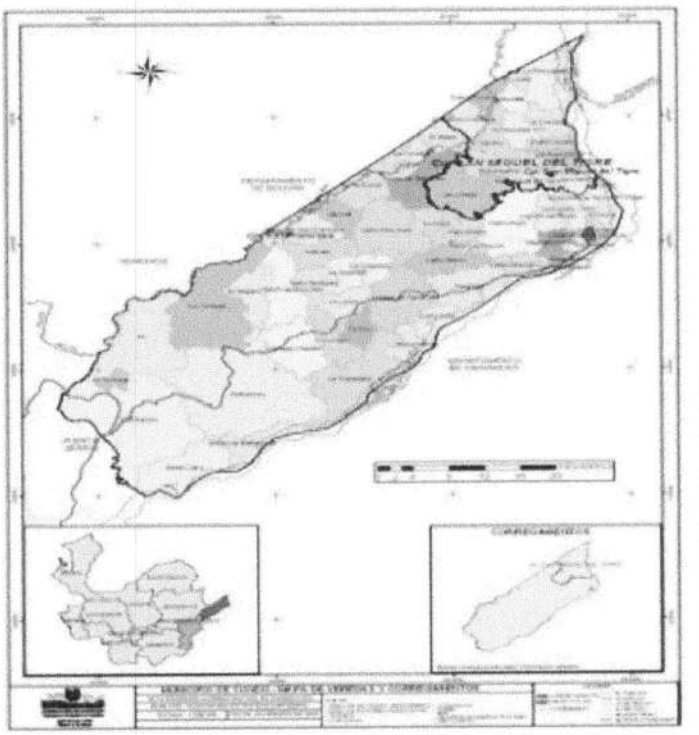

4.2 CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el mantenimiento y cuidado de los cuerpos hídricos en el municipio de Yondó, Antioquia

A continuación, se muestran las actividades inicialmente contratadas del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00
2	Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00
3	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00
				TOTAL PRODUCTO 1:	$ 2.958.797.035,00
				TOTAL EJECUCION	$ 2.958.797.035,00
				ADMINISTRACIÓN 24,0%	$ 710.111.288,40
				UTILIDAD 5,0%	$ 147.939.851,75
				TOTAL VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 3.816.848.175,15

Se realizo el otro Si No 3 adicionando un valor de $1.082.925.459,00 dando como nuevo valor del contrato $ 4.899.773.634,15 y actualizando cantidades de la siguiente forma:

1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00
				TOTAL PRODUCTO 1:	$ 3.798.274.135,00
				TOTAL EJECUCION	$ 3.798.274.135,00
				ADMINISTRACIÓN 24,0%	$ 911.585.792,40
				UTILIDAD 5,0%	$ 189.913.706,75
				TOTAL COSTO OBRA FISICA:	$ 4.899.773.634,15

4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto se mantuvo de Dos (02) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Aprobación de Garantía Única, expedición del Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio).

4.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El municipio de Yondó se encuentra sobre la margen izquierda del rio Magdalena en su región media, a su vez cuenta con una amplia variedad de recursos hídricos que hacen parte de la cuenca de este importante cauce, estos cuerpos de agua se han visto afectados en gran medida por la acción antrópica de comunidades que se han asentado en sus periferias y la expansión de las fronteras agrícolas de estas áreas.

Toda la región Este del municipio de Yondó presenta un área superficial considerable de espejos de agua que son alimentados por la presencia del río Magdalena, estos complejos Cenagosos son a su vez hábitats de diferentes tipos de especies de animales y plantas la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de obras ilegales no autorizadas de canalización, taponamientos y desvíos de caños y/ o afluentes y la alta presencia de vegetación flotantes y otro tipo de residuos orgánico e inorgánicos sobre sus aguas.

El contexto territorial del Municipio de la referencia presenta un área superficial considerable de espejos de agua alrededor de 263 humedales que en su mayoría bifurcan sus aguas a la cuenca del río Grande de la Magdalena, estos complejos Cenagosos son a su vez hábitats de diferentes tipos de especies de animales acuáticos como el manati (Trichecus Manatus), bocachico Prochilodus magdalenae, bagre rayado Pseudoplatystoma fasciatum, doncella Pseudoplatystoma fasciatum, blanquillo Sorubim cuspicaudus , mojarra crilla Caquetaia kraussii (=Petenia kraussii) , pacora Plagioscion magdalenae (=P. surinamensis) dorada Brycon sinuensis, barbudo Polynemidae, y plantas comoroble Quercus robur, Orejero Enterolobium cyclocarpum, campano Albizia saman, árbol del pan Artocarpus altilis , a, abarco Cariniana pyriformis, caoba Swietenia, solera Cordia gerascanthus, Zapan entre otros la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de obras ilegales no autorizadas de canalización, taponamientos y desvíos de caños y/ o afluentes y la alta presencia de vegetación flotantes y otro tipo de residuos orgánico e inorgánicos sobre sus aguas

Las subcuencas del colector Shell y Caño La Rompida pertenecen a estas áreas que tienen contacto directo con el río Magdalena, estas cuentan con una serie de cuerpos hídricos que van desde ciénagas hasta caños o brazos del río que tienden a funcionar como aliviaderos en periodos de invierno y crecientes de este, situación que beneficia en gran medida a los pobladores de estas zonas.

La subvaloración y la falta de gestión ambiental frente a los recursos naturales en el territorio de Yondó a través del tiempo, ha venido generando el deterioro paulatino del ecosistema hídrico y sus componentes asociados como el suelo, el aire, la fauna y la flora silvestre, debido a los vertimientos de aguas residuales domésticas y a la inadecuada disposición de residuos sólidos. Lo anterior contribuye al crecimiento de plantas invasoras causante de la perdida de espejos de agua y reducen la demanda de oxígeno disuelto DBO5, PH, OD, como factores preponderantes para el desarrollo de la vida ictiológica.

La importancia de los humedales no solo radica en la función reguladora de flujos hídricos son también un soporte esencial para desarrollo de la vida de múltiples especies lo cual representa un servicio ambiental directo para la sociedad en términos de Alimentación, control de inundaciones, retienen sedimentos, controla la erosión, contribuyen a la recarga y descarga de acuíferos y pueden contribuir a la estabilización micro climática, por el aumento en las cuencas hidrográficas, y como espacios para la conservación de la biodiversidad, siendo además importantes para el desarrollo de una identidad cultural regional y un sentido de pertenencia.

El Estado Colombiano ha asignado funciones a los municipios, en torno a la protección de los recursos naturales y la gestión de los ecosistemas, a través de estrategias de conservación de la biodiversidad y de la creación de áreas protegidas de carácter regional.

Así mismo la política nacional para Humedales interiores, que fue aprobada por el comité Nacional Rasmar del 5 de diciembre de 2001, contempla dentro de sus metas la formulación de planes de manejo ambiental para estos ecosistemas con el fin de garantizar el mantenimiento de sus características ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales.

La alta presencia de vegetación flotante y otro tipo de materiales orgánicos e inorgánicos sobre los cuerpos de aguas y canales (naturales - artificiales) da paso a la eutrofi.zación, proceso que permite la proliferación de todo tipo de algas acuáticas que a su vez impide el ingreso de la luz a las zonas bajas de los cuerpos de agua mayormente, disminuyendo de esta manera la cantidad de oxígeno necesario para la eliminación de los desechos orgánicos, esto sumado al bajo intercambio de sus aguas por manipulación de los flujos hídricos están permitiendo la acumulación excesiva de materia orgánica en diferentes zonas. Por lo anterior, se hace necesario realizar las obras para el retiro, limpieza y disposición de este material de cada uno de los canales y superficie de cuerpos hídricos de agua para su recuperación y permitir que se surtan los diferentes procesos biológicos en su interior que brinden unas condiciones óptimas para el desarrollo de la vida acuática y mejore la calidad del agua.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

Debido al estado actual de las Ciénagas y su importancia como hábitat natural de diversas especies de animales e incluso fuente de recursos para pobladores de esta región del Municipio de Yondó, se hace necesario realizar acciones para su protección y restablecimiento de este mediante el mejoramiento de su conectividad hídrica que permita el intercambio de aguas y nutrientes necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos biológicos al interior de esta. De tal forma que se plantea realizar actividades por medio del retiro de material vegetal de retiro de material y su disposición final para su posterior manejo.

La limpieza de los complejos cenagosos, canales y caños colectores del municipio de Yondó es esencial para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales de las zonas. así como para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad de la región.

La proliferación de microorganismos y algas en la ciénaga puede causar un desequilibrio ecológico y afectar la calidad del agua de varias maneras.

En primer lugar, la abundancia de microorganismos y algas puede consumir gran parte del oxigeno disuelto en el agua, lo que puede llevar a la muerte de organismos acuáticos que dependen de él para respirar. Esto puede generar una disminución significativa en la biodiversidad de las zonas y afectar el equilibrio ecológico.

Además, algunos tipos de algas pueden producir toxinas que son perjudiciales para la salud de los seres humanos y animales que utilizan el agua de las ciénagas y los canales para sus actividades diarias. Estas toxinas pueden acumularse en los tejidos de los organismos acuáticos y representar un riesgo para la salud de las personas que los consumen.

La proliferación de microorganismos y algas también puede disminuir la transparencia del agua, lo que afecta la penetración de la luz solar y reduce la capacidad de las plantas acuáticas para realizar la fotosíntesis. Esto puede afectar el equilibrio ecológico de la zona, ya que muchas especies de animales dependen de las plantas acuáticas para su alimentación y refugio.

En resumen, la proliferación de microorganismos y algas puede tener efectos negativos en el equilibrio ecológico y la calidad del agua de las ciénagas y los diferentes cuerpos de agua, y es importante tomar medidas para prevenir su crecimiento excesivo y controlar su presencia en las zonas.

La necesidad de limpieza de estas ciénagas y canales surge como una medida para revertir los efectos negativos y recuperar su equilibrio ecológico.

La realización de mantenimiento de cuencas hidrográficas y de caños colectores con sus vertientes es esencial para garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, debido a varios factores clave:

- Conservación de la calidad del agua: La vegetación de las cuencas actúa como un filtro natural, reteniendo sedimentos y contaminantes que pueden afectar la pureza del agua. Esto reduce los costos de tratamiento para el consumo humano.
- Regulación del ciclo hidrológico: Un manejo adecuado permite la regulación del flujo de agua, evitando la escasez en épocas secas y las inundaciones en temporadas lluviosas. Esto facilita un suministro constante y confiable de agua potable.
- Los caños colectores y sus vertientes cumplen un papel importante en la recolección y conducción de aguas pluviales y residuales. Su mantenimiento, como la limpieza regular y la gestión de desechos, previene la acumulación de basura y sustancias tóxicas, que podrían contaminar tanto las fuentes de agua potable como los cuerpos de agua circundantes.

En resumen, el mantenimiento adecuado de cuencas hidrográficas y caños colectores no solo es vital para garantizar la disponibilidad de agua potable de calidad, sino que también facilita la gestión de residuos y la infraestructura de alcantarillado, protegiendo el medio ambiente y la salud pública.

Por lo tanto, es fundamental realizar una limpieza y mantenimiento exhaustivos para eliminar no solo los obstáculos y residuos acumulados al interior de los mismos sino también para reducir los riesgos de eutrofización, asegurando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema hidráulico y minimizando el impacto ambiental negativo en la región.

El mantenimiento y limpieza de los canales colectores, como el canal Shell, sus vertientes y otros que conducen residuos líquidos industriales o domiciliarios, así como aguas pluviales en redes públicas es crucial para:

- Prevenir obstrucciones y garantizar las dinámicas de los flujos de agua al interior de los caños.
- Reducir el riesgo de inundaciones y daños a la infraestructura.
- Minimizar la contaminación ambiental y proteger la salud pública.
- Alargar la vida útil de la infraestructura hidráulica.
- Reducir la carga en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
- Mejorar la eficiencia en la gestión de aguas pluviales y residuales.
- Prevenir la sedimentación y acumulación de lodos y residuos.
- Disminuir los costos por tratamiento del agua para consumo humano
- Reducir riesgo de eutrofización del agua.

Realizar el mantenimiento y limpieza periódicos de estos canales:

- Evita la acumulación de residuos y reduce el riesgo de vertidos no controlados.
- Ayuda a mantener la calidad del agua en ríos, lagos y acuíferos.
- Contribuye a la protección de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos.
- Reduce los costos asociados con reparaciones y rehabilitación de la infraestructura.
- Mejora la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

4.5 INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO.

Este proyecto cuenta con los siguientes soportes técnicos:

- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.).
- ✓ Estudios Previos.
- ✓ Especificaciones Técnicas de construcción.
- ✓ Presupuesto detallado.
- ✓ Análisis de Precios Unitarios.
- ✓ Pliegos de Condiciones.
- ✓ Propuesta económica del proponente.
- ✓ Acta de adjudicación del contrato.
- ✓ Minuta de Contrato de obra.
- ✓ Aprobación de Pólizas de Garantías.
- ✓ Certificado Registro presupuestal (C.R.P.)
- ✓ Acta de inicio.

5 ANEXOS

5.1 FORMATO F-GPI-SIN-34 INFORME EJECUTIVO A LA FECHA DE CORTE.

Las actas de Informe Ejecutivo Mensual (F-GPI-SIN-34), se anexan en este informe donde se refleja en un balance presupuestal el avance de la ejecución del contrato.

5.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE INTERVENTORÍA (F-GPI-SIN-29).

Las Actas de seguimiento semanales se envían a la supervisión donde se evidencia el control de la programación que se realiza de las actividades de Obras ejecutadas durante el periodo a cobrar, para determinar el avance o atraso del proyecto; el seguimiento Semanal se realiza con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios para evitar atrasos en el proyecto.

5.3 LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

Para el presente proyecto, no requiere ningún tipo de licencias o permisos de construcción ya que los trabajos a realizar son del tipo de mantenimiento de las estructuras y no de construcción.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

INFORME EJECUTIVO MENSUAL

Calle 63 No 19-17 Barrio Parnaso - Móvil: 311 214 8798 - contacto@mbservingenieria.com - Barrancabermeja / Santander / Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22 DE DICIEMBRE	Y EL	30 de diciembre de 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024				
LOCALIZACIÓN	Yondó Antioquia				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	059 de 2024		CONTRATO No.:	058 de 2024	
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S	
PLAZO INICIAL:	60		PLAZO INICIAL:	60	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024	
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	60 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	60 DIAS	
VALOR INICIAL :	$	188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$	3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):			VALOR ADICION(ES):	$	1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$	169.434.342,00	VALOR PAGADO:	$	4.409.796.270,74
VALOR POR PAGAR:	$	18.826.038,00	VALOR POR PAGAR:	$	489.977.363,41

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento	31/10/2024	1/07/2025	$ 18.826.038,00	Predios labores y operaciones	29/10/2024	10/01/2025	$ 520.000.000,00
Salarios y prestaciones sociales	31/10/2024	31/12/2027	$ 9.413.019,00	Cumplimiento	29/10/2024	10/07/2025	$ 489.977.363,42
Calidad del servicio	31/10/2024	1/07/2025	$ 18.826.038,00	Pago anticipado	29/10/2024	10/07/2025	$ 2.449.886.817,71
				Salario y prestaciones sociales	29/10/2024	10/01/2028	$ 244.988.681,71
				Calidad del servicio	29/10/2024	10/07/2025	$ 489.977.363,42

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA DE AVANCE No 1	5/12/2024	$ 94.130.190,00	PAGO ANTICIPADO	4/11/2024	$ 1.908.424.087,58
ACTA DE AVANCE No 2	21/12/2024	$ 75.304.152,00	ACTA PARCIAL No 1	19/12/2024	$ 1.526.739.270,06
			PAGO ANTICIPADO DEL ADICONAL No 1	19/11/2024	$ 541.462.729,50
			ACTA PARCIAL No 2	21/12/2024	$ 433.170.183,60

4. CURVA "S"

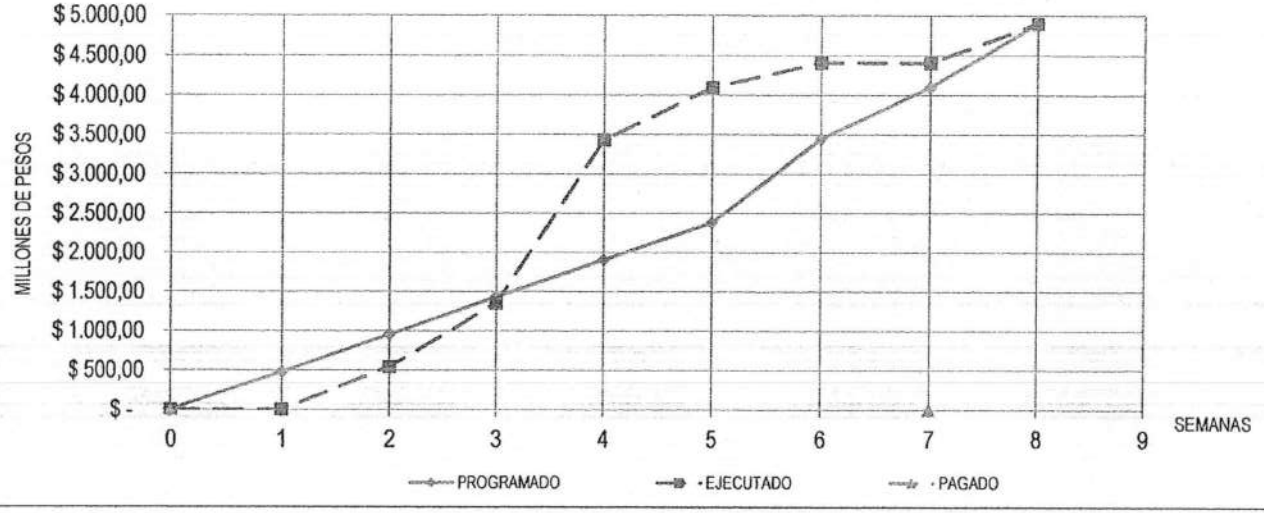

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el proyecto se adelantaron las actividades a un excelente ritmo de trabajo, se recominenda realizar revision de los sitios de acopia de residuos para verificar que no quede nada por retirar.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

19
1695

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

INFORMES SEMANALES

1677

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	8	DEL	22-dic-24	AL	30-dic-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIV,	100%	PLAZO TRANSCURRIDO:	60	EQUIV.	100%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$		169.434.342,00	VALOR PAGADO:	$		4.409.796.270,74
VALOR POR PAGAR:	$		18.826.038,00	VALOR POR PAGAR:	$		489.977.363,41
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	86,14%	90,00%	3,86%
Durante el periodo	13,86%	10,00%	-3,86%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,00%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

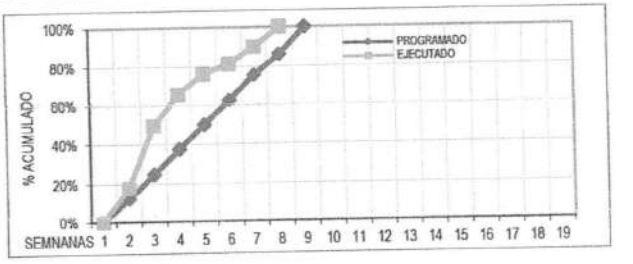

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	60	0	0,00

2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,0%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,5%
4	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.358,28	70,1%
5	$ 2.385.530.109,45	$ 3.740.511.211,65	76,3%
6	$ 3.703.611.284,34	$ 3.985.511.211,65	81,3%
7	$ 4.899.773.634,15	$ 4.409.796.270,74	90,0%
8	$ 4.899.773.634,15	$ 4.899.773.634,15	100,0%
TOTAL	$ 4.899.773.634,15	$ 4.899.773.634,15	100,0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

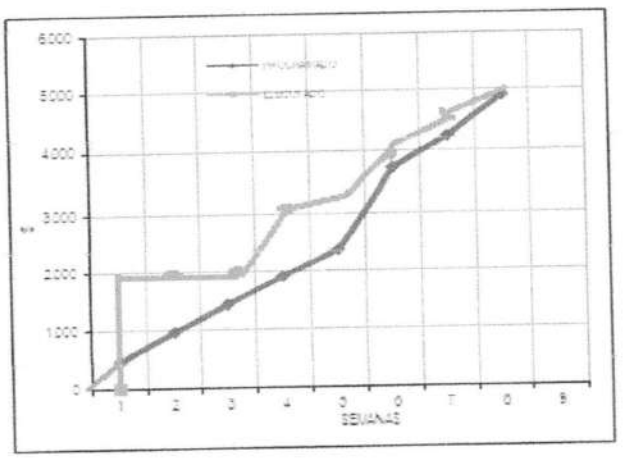

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	8	DEL	22-dic-24	AL	30-dic-24

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se continuan las actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio logrando un avance significativo en respecto con lo programado

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con un pago anticipado del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se trabajo a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja en el porcentaje de ejecucion del 100% Vs el 100,00%

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldía. Nota: En caso de no haber identificado ninguno de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Anexe registro fotográfico que muestren el avance general de la obra





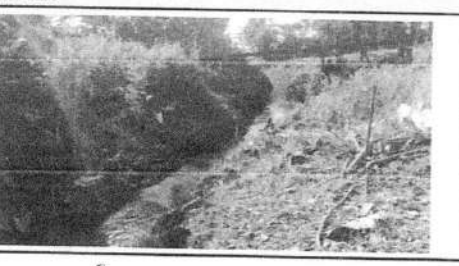

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO

DIRECTORA DE OBRA
Nombre: VICKY PATIÑO OSPITIA

6 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se presenta evidencias mediante un cuadro de actividades desarrolladas durante el periodo y acumuladas.

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL
1.01	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	3.135.086.707,50	$ 348.342.967,50	$ 3.483.429.675,00
1.02	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	171.850.014,00	$ 19.094.446,00	$ 190.944.460,00
1.03	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	1.512,00	168,00	1.680,00	111.510.000,00	$ 12.390.000,00	$ 123.900.000,00
									-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 3.798.274.135,00				3.418.446.721,50	$ 379.827.413,50	$ 3.798.274.135,00
	ADMINISTRACIÓN				$ 911.585.792,40				820.427.213,16	$ 91.158.579,24	$ 911.585.792,40
	IMPREVISTOS				$ -				-	$ -	$ -
	UTILIDAD				$ 189.913.706,75				170.922.336,08	$ 18.991.370,68	$ 189.913.706,75
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				1.082.925.459,00	$ 4.899.773.634,15				4.409.796.270,74	$ 489.977.363,42	$ 4.899.773.634,15
AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO 50%					$ 2.449.886.817,08				2.449.886.817,08		$ 2.449.886.817,08
VALOR A PAGAR									1.959.909.453,66	**$ 489.977.363,42**	$ 2.449.886.817,08

CORTE FINAL – (22/12/2024 hasta 30/12/2024).

El día 31 de octubre del año 2024, se firma el Acta de Inicio entre las partes que intervienen en el proceso (Contratista, Interventoría y Supervisión)

Una vez firmada la Acta de Inicio, la interventoría solicito la información del proyecto, como son estudios, propuesta técnica del contratista, manual de interventoría y demás documentos soporte del contrato, esto con el fin de entrar a revisar el alcance de los trabajos e iniciar con la revisión de los diseños. Posteriormente, se inicia con el replanteo e inspección con equipos de precisión de todos los lineamientos, cotas niveles del proyecto y áreas de intervención.

Se iniciaron actividades inicialmente se realizó el levantamiento topográfico de la zona a intervenir, donde se pudieron apreciar las áreas de los caños y sus áreas de influencia.

El contratista de obra durante este tercer corte final de labores realizo actividades de

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo

6.2 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL (F-GPI-SIN-16).

En el presente informe se anexa copia del acta de corte realizada conjuntamente con el contratista y con la cual realizara cobro de las actividades ejecutadas.

6.3 MEMORIAS DE CÁLCULO (F-GPI-SIN-38)

Se diligencia en este formato las medidas y localizaciones correspondientes a cada una de las actividades con el fin de realizar un control sobre las cantidades de cada actividad ejecutada del contrato a la fecha correspondiente al periodo de cobro.

7 CONTROL DE CALIDAD.

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El contratista durante el periodo correspondiente al presente corte ha cumplido ejecutado las actividades de ejecución de obra donde la interventoría realiza un seguimiento riguroso de estas actividades como lo son:

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos.
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo.

Todo esto se realiza bajo los lineamientos de las especificaciones técnicas y observaciones que realiza la interventoría.

7.2 CONTROL DE EQUIPOS (F-GPI-SIN-13).

En el formato F-GPI-SIN-13 se evidencia el control de equipos durante los periodos comprendidos entre el 22/12/2024 AL 30/12/2024 del presente informe de corte.

7.3 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (F-GPI-SIN-14).

En el formato F-GPI-SIN-14 se evidencia el control y seguimiento de seguridad industrial durante los periodos comprendidos entre el 22/12/2024 AL 30/12/2024 del presente informe.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com


MEMORIAS DE CALCULO

Calle 63 No 19-17 Barrio Parnaso - Móvil: 311 214 8798 - contacto@mbservingenieria.com - Barrancabermeja / Santander / Colombia

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 3 final	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,01 Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

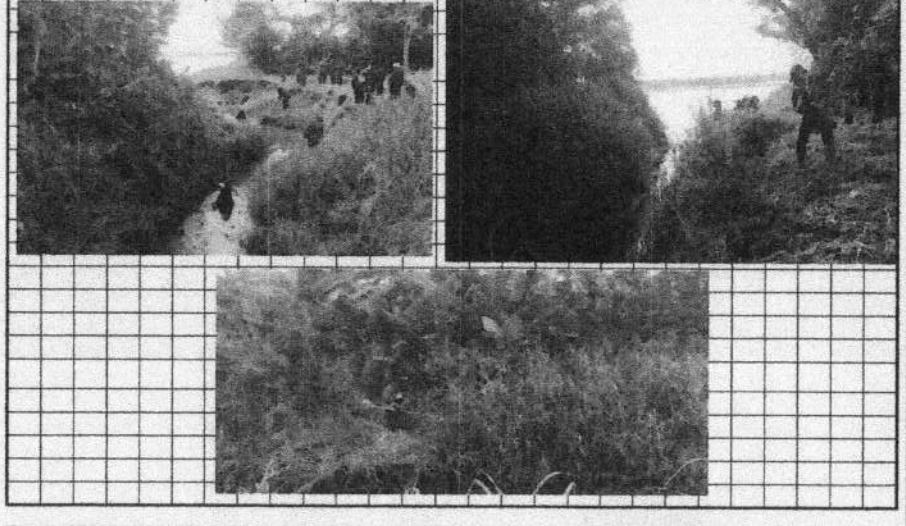

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2,80			
		2,65	100,00	265,00
K0+100	2,50			
		2,80	100,00	280,00
K0+200	3,10			
		3,00	100,00	300,00
K0+300	2,90			
		3,55	100,00	355,00
K0+400	4,20			
		4,00	100,00	400,00
K0+500	3,80			
		3,75	100,00	375,00
K0+600	3,70			
		3,60	100,00	360,00
K0+700	3,50			
		3,45	100,00	345,00
K0+800	3,40			
		3,30	100,00	330,00
K0+900	3,20			
		3,10	35,00	108,50
K0+935	3,00			
LATERALES		2,00	482,50	965,00

TOTAL	4083,50	M2

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 3 final	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,02 Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO





DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2,80			
		2,65	100,00	265,00
K0+100	2,50			
		2,80	100,00	280,00
K0+200	3,10			
		3,00	100,00	300,00
K0+300	2,90			
		3,55	100,00	355,00
K0+400	4,20			
		4,00	100,00	400,00
K0+500	3,80			
		3,75	100,00	375,00
K0+600	3,70			
		3,60	100,00	360,00
K0+700	3,50			
		3,45	100,00	345,00
K0+800	3,40			
		3,30	100,00	330,00
K0+900	3,20			
		3,10	35,00	108,50
K0+935	3,00			
LATERALES		2,00	482,50	965,00
TOTAL				4083,50 M2

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 3 final	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,03 Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo
UNIDAD:	M3

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (SI aplica)

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS

ABSCISA	AREA M2	ESPESOR	VOL
K 0+00			
	265,00	0,08	21,20
K0+100			
	280,00	0,05	14,00
K0+200			
	300,00	0,05	15,00
K0+300			
	355,000	0,05	17,75
K0+400			
	400,00	0,05	20,00
K0+500			
	375,00	0,05	18,75
K0+600			
	360,00	0,05	18,00
K0+700			
	345,00	0,06	19,18
K0+800			
LATERALES	965,00	0,025	24,13

TOTAL	168,0	M3

1684

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

CONTROL DE EQIPOS

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

CONTROL DE EQUIPOS

Código:	F-GPI-SIN-13
Fecha de Aprobación:	01/12/2014
Versión: 1	Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE 2024 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No. 058 DE 2024

CONTRATISTA: SALUPAISMA S.A.S

CONTRATO No. 058 DE 2024

INTERVENTOR: MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

EQUIPO	FECHAS DE USO		PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	INICIO	FIN					
VOLQUETA	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO
CAMION DE ESTACA	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO
CAMION TIPO FURGON	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	DISTRIBUCION HIELO Y AGUA	EN BUEN ESTADO
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	22/11/2024	30/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

32

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Calle 63 No 19-17 Barrio Parnaso - Móvil: 311 214 8798 - contacto@mbservingenieria.com - Barrancabermeja / Santander / Colombia

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-14	
		Fecha de Aprobación:01/12/2014	
	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA			
NÚMERO DE CONTRATO:	059 DEL 2024	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	22/12/20224	**Y EL** 30/12/2024
CONTRATISTA:	SALUPAISMA SAS			
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA SAS			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	N/A		
- Diurna	N/A		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL PROYECTO

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

4

32

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS.

8.1 PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO

El proyecto cuenta con un Plan de Trabajo Detallado (PDT) actualizado con el adicional en valor realizado, mediante el cual se evalúa periódicamente la ejecución de las actividades del proyecto que permite determinar los avances y atrasos respectivamente.

Se anexa en este informe.

8.2 PERSONAL DE OBRA.

Dentro del presente informe, se relaciona el personal que labora para el proyecto.

Personal inicial

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
1	LINA MARIA SANCHEZ MURCIA	1001814858	OBRERO
2	JAIDER ANDRES MORALES CASTRO	1042215028	OBRERO
3	DIANA MARIA MEDINA INFANTE	1042211429	OBRERO
4	ELBIA HERRERA GOMEZ	63462346	OBRERO
5	CARLOS JOSUE DIAZ MORALES	1001815806	CADENERO
6	JANETH ZAPATA CANO	43652967	OBRERO
7	JEISON VARGAS PEREZ	1005177155	OBRERO
8	EVANGELINA MARROQUIN CAICEDO	28154628	OBRERO
9	LILLETH ALEXANDRA LEON	1001815791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10	BRANDON SMITH GUZMAN FUENTES	1043124944	AYUDANTE DE VOLQUETA
11	DANY MILENA SANCHEZ	1042212671	OBRERO
12	LEANDRO ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ	1001815732	OBRERO
13	MARTHA CECILIA VANEGAS	21950152	OBRERO
14	KALED OCTAVIO OROZCO	1096191351	OBRERO
15	AMALIA RODRIGUEZ TREJOS	1042212903	OBRERO
16	MAIDIS SEIJA PIMIENTA	1002446712	OBRERO
17	NEDER YENEVIS ARIAS CASTANEDA	1096228829	OBRERO
18	YESSICA TATIANA GUERRERO BLANCO	1001815926	OBRERO
19	JHON JAIRO LOPEZ HERRERA	1126126332	OBRERO
20	JACKELINE JIMENEZ CARPIO	37581459	OBRERO
21	EDILMA MILENA RIANO LEON	28070089	OBRERO
22	EMELYS CASTRO SEIJA	1042212312	OBRERO
23	LINEY DAYANA TELLEZ AGUIRRE	1097184507	OBRERO
24	ROBER ANTONIO QUIROGA MORENO	1050544332	OBRERO
25	LUIS FERNANDO AGUILAR CARRILLO	15452500	OBRERO
26	SAMUEL PALENCIA CASTRO	15452001	OBRERO
27	EVA SANDRID OROZCO MARTINEZ	1005189008	OBRERO
28	YULIE FERNANDEZ ALMENDRALES	1001815392	OBRERO
29	VIVIANA ESTHER GUERRERO	37576322	OBRERO
30	MARISOL CASTRO JARAMILLO	1042211977	OBRERO

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
31	LILIA SUSANA VILLAR HERNANDEZ	1148944064	OBRERO
32	GLORIA INES ENCISO CASTRO	1096221078	ALMACENISTA
33	GLORIA AMPARO RODAS	28336158	OBRERO
34	JORGE LUIS FLOREZ MORATOS	1042212258	OBRERO
35	KEVIN MANUEL RODRIGUEZ	1007567729	OBRERO
36	EDWIN ANDRES JIMENEZ	1042210290	OBRERO
37	ANGIE PAOLA VERGARA ESCOBAR	1042215122	OBRERO
38	OSCAR DE JESUS CARDONA TABARES	13892791	OBRERO
39	LUCELY SAAVEDRA GIRALDO	1042212425	OBRERO
40	TANIA ELVIRA THOMAS MARTINEZ	28484170	OBRERO
41	LIBIA GIRALDO HOYOS	21949968	OBRERO
42	PAOLA ANDREA MUNOZ BLANDON	1001814730	OBRERO
43	JHAN CARLOS RUA RESTREPO	1001815607	OBRERO
44	BETSABE RODRIGUEZ CASTRO	37575140	OBRERO
45	SEBASTIAN BERNAL VARGAS	1001815512	OBRERO
46	LUZ AIDE COTERIO MONTOYA	1042213893	OBRERO
47	YARILUZ BERMUDEZ BOHORQUEZ	1042211341	OBRERO
48	YEIMI KATHERINE CASTELLANOS LUNA	1005289808	OBRERO
49	MIGUEL ANDRES SALCEDO	1096226906	OBRERO
50	CARLOS GUALDRON AGUDELO	1005155013	OBRERO
51	ANGELES DISNEY OSORIO CASTANEDA	1056768193	OBRERO
52	ELIAS MORALES FLOREZ	3557595	OBRERO
53	GLORIA ESTER GARCIA VANEGAS	1148944038	OBRERO
54	ROSA ELVIRA MOSQUERA	43656476	OBRERO
55	MERCEDES MARIA PALOMINO	1126121871	OBRERO
56	MIGUEL ANGEL MORA	15451673	OBRERO
57	YISELA YULIETH MARTINEZ A	1001814628	OBRERO
58	NATALIA BERRIO	1042211595	OBRERO
59	JAROLD MARIA PENA	52905774	OBRERO
60	ANTONIO MURILLO MURILLO	13881219	OBRERO
61	ALDAIR VEGA BELENO	1001814934	OBRERO
62	KARINA MARTINEZ LOPEZ	21950897	OBRERO
63	MARIA ISABEL SALGADO	63459623	OBRERO
64	MARIA ALEJANDRA AGREDO	1096253602	OBRERO
65	ANDREA JULIETH HERNANDEZ	1039679021	OBRERO
66	JAVIER SOLIS RIANO SALAZ	1042210651	OBRERO
67	ELIANA RODRIGUEZ MORENO	1042210855	OBRERO
68	LUIS FERNANDO RUIZ LEAL	1104094396	OBRERO
69	YESENIA DIAZ CARDENAS	21950783	OBRERO
70	JOHANNA HERRERA MADRID	33223337	OBRERO
71	VICENTE HERNANDO SANTA	13889845	OBRERO
72	YURIAN ALEXANDRA MONTOYA	1096184135	OBRERO
73	EDILMA LEON	37925342	OBRERO
74	AIDE DEL CAMELO COTERIO	42937786	OBRERO
75	BLANCA MARIA FUNEZ	37575102	OBRERO

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
76	JUAN DAVID RICARDO	1042210521	OBRERO
77	YURLADIS AGUDELO	1096211787	OBRERO
78	MAIRA PAEZ ZAPATA	1001815812	OBRERO
79	ALEYDA GONZALEZ	1096190651	OBRERO
80	ROSA MARIA SANCHEZ	63462513	OBRERO
81	DUBAN ALFREDO GIRALDO	1001815643	OBRERO
82	LUIS OBED SOSA PEDROZO	1005180011	OBRERO
83	CARLOS HELI DIAZ MELGAREJO	1042212040	OBRERO
84	EMILCE GALVAN MANTILLA	21950123	OBRERO
85	SORANI ALEJANDRA FONCE POVEDA	1005190659	OBRERO
86	KELLY SOLANY AGUIRRE POVEDA	1096248472	OBRERO
87	DOMINGO MANUEL QUIROZ	3806527	OBRERO
88	INGRID LISBET RAMIREZ CASTELLANOS	1096261512	OBRERO
89	ASTRID KATHERINE LOPEZ MURCIA	1001204559	OBRERO
90	MARIA YULEINE MEZQUIDA PENATE	1096234313	OBRERO
91	SANDRA PATRICIA CONTRERAS SERRANO	37578512	OBRERO
92	SONILDA ROBLES RENDON	1042212666	OBRERO
93	ERICA MARCELA DURAN RUEDA	1032379188	OBRERO
94	KAROL ANDREA RINCON AMARIS	1097182252	OBRERO
95	ONIX DANIELA JIMENEZ PENA	1005182654	OBRERO
96	YURLEIDIS CARDENAS CASTANEDA	1001815666	OBRERO
97	MARIA CAMILA PENA CASTANEDA	1001815658	OBRERO
98	RUBEN MACIAS RAMIREZ	15452205	OBRERO
99	MARTA LUZ MONTIEL ROJAS	21950224	OBRERO
100	CARLOS JULIO MIRANDA BETANCUR	1096230911	OBRERO
101	CARLOS ALBERTO MONTESINO GUZMAN	12503344	OBRERO
102	MARIA CAROLINA RICARDO ARRIETA	1042214981	PALETERA
103	KOREIMA OLAYA AGUDELO	1001815196	OBRERO
104	ADRIAN MENDEZ CARPIO	1001815785	OBRERO
105	LUIS FERNANDO ACONCHA NIETO	1096229965	OBRERO
106	KAROL JISELA RODRIGUEZ JIMENEZ	1042210904	OBRERO
107	KELLY VIVIANA GUERRERO FERNANDEZ	1096226438	OBRERO
108	YOHANA MARCELA DUARTE VANEGAS	1001443147	OBRERO
109	MARTHA CECILIA CARPIO RODRIGUEZ	21950297	OBRERO
110	IVAN ENRIQUE PALLARES PALENCIA	1003267413	OBRERO
111	LUDI ORQUIDIA MONSALVE SIERRA	1005181787	OBRERO
112	ALEJANDRO FRAGOSO AGAMES	1042213583	OBRERO
113	WILMAR URRUTIA CHACON	13569412	OBRERO
114	NORIDA MILEDYS ARCE CERVERA	1042212453	OBRERO
115	EDGAR YESID CIFUENTES MENDOZA	1005184816	OBRERO

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
116	MARITZA ALEJANDRA RAMOS CARDENAS	1005182488	OBRERO
117	JHON ALEX GALVIS CARPIO	1042214721	OBRERO
118	VALENTINA JARAMILLO MARIN	1027802576	OBRERO
119	DIANA PAOLA LONDONO RINCON	21950793	OBRERO
120	OMAIRA DEL CARMEN MARTINEZ BALDOVINO	1102580165	OBRERO
121	EFRAIN BENAVIDES	10157106	OBRERO
122	GLORIA ESTHER DURAN LORA	21931870	OBRERO
123	MARIA GABRIELA MORALES VASQUEZ	21665251	OBRERO
124	GERSON DANIEL ROJAS ROMERO	1005190548	OBRERO
125	SOLMARINA ROJAS SIERRA	23151104	OBRERO
126	JOSE MIGUEL BETANCOURT VANEGAS	5594391	OBRERO
127	SOLANGEL NAYHOSCA GUARIA RODRIGUEZ	1258295	OBRERO
128	OMAIRA LOZANO MACHUCA	21950417	OBRERO
129	YULIER PAOLA MESTRA TORO	1005180303	OBRERO
130	MARIA FABIOLA MACIAS PINEDA	21950238	OBRERO
131	NORELIA ENSUENO VILLA SUAREZ	21950114	OBRERO
132	IVETH KATHERINE LOPEZ HERNANDEZ	1005190010	OBRERO
133	EVA LONEY YAIMA GARATEJO	52455196	OBRERO
134	MARELVIS PEDROZO CADAVID	37577419	OBRERO
135	BRENDA LITH ORTIZ CASTANO	1096183607	OBRERO
136	JULIANA ANDREA AGUDELO GARCIA	1193413272	OBRERO
137	AURA DAHYANA APONTE HERNANDEZ	1096248599	OBRERO
138	ROMER CARDENAS AGUDELO	13568430	OBRERO
139	MARIO DE JESUS FRAGOSO LOPEZ	13892370	OBRERO
140	YULIETH TATIANA TEJADA ESPINOSA	1005182963	OBRERO
141	SANDRA MILENA ORTEGA CELIS	40051319	OBRERO
142	DUBERNEY CARDONA	91444019	CAPATAZ
143	MARIA MARGARITA DELGADO SIERRA	21950263	OBRERO
144	LEIDY SULGEY PAEZ BERNAL	1042212708	OBRERO
145	LUCY MARIN PULGARIN	52222368	OBRERO
146	WENDY DAYANA SUAREZ GIRALDO	1005182624	OBRERO
147	KEVIN DANIEL RUIZ GENI	1005184375	OBRERO
148	NULIALBA ZAPATA GRANADA	63466253	OBRERO
149	ADELA GONZALEZ SERNA	63468205	OBRERO
150	YAJAIRA PAOLA VARGAS MARTINEZ	1065592685	OBRERO
151	DUVAN BRAVO JEREZ	1001814876	OBRERO
152	GREIS PATRICIA RODRIGUEZ MORALES	1042212524	OBRERO
153	SANDRA MILENA CIFUENTES PEDRAHITA	1096203894	OBRERO
154	JUAN DIEGO MOREIRA AVILA	1042214422	OBRERO
155	MAURICIO ALFONSO MANCIPE ARROLLAVE	13568357	OBRERO

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
156	ROSA MERY SERRANO CARDENA	60383628	OBRERO
157	TEOBALDO MARTINEZ GUZMAN	91422853	CAPATAZ
158	YINETH ISABEL MARTINEZ DURAN	1042214848	PALETERA
159	AMBAR YARITZA MARTINEZ GUTIERREZ	1042214346	OBRERO
160	MARIA JOVITA MORALES AGUIIRE	21950365	OBRERO
161	MAICOL STUART CORREDOR JIMENEZ	1039679222	OBRERO
162	JUAN LISANDRO VILLA JIMENEZ	15452335	OBRERO
163	OMAIRA CHACON RAMIREZ	21950408	OBRERO
164	YULDER RINCON AGUDELO	1001814968	OBRERO
165	KENIA ALEJANDRA MUNETON GARCIA	1039686203	OBRERO
166	LUISA FERNANDA NAVARRO GUERRA	1148685200	OBRERO
167	STEFANY CARDONA AMAYA	1036220470	PALETERA
168	HECTOR ARMANDO POSADA	71181354	OBRERO
169	FANY ORTIZ LOZANO	32729136	OBRERO
170	YURLADIS CABRALES MARROQUIN	1001814758	OBRERO
171	LUDILVIA MEDINA CALERO	21950216	OBRERO
172	MANUEL ANDRES GIL ARIAS	1094832086	OBRERO
173	IGNACIO SILVARA MEDINA	13854825	OBRERO
174	LEON JULIO ANAYA	91440800	CONDUCTOR
175	YIMI ROY BENAVIDEZ JARAMILO	91445624	OBRERO
176	VICKI YURANY PATINO ESPITIA	1054543056	DIRECTORA DE OBRA
177	KELLY JOHANA FARFAN BALLESTEROS	1096214774	OBRERO
178	DULCINA RODRIGUEZ ROJAS	21950195	OBRERO
179	ANGELICA RODRIGUEZ ROJAS	1042212057	OBRERO
180	JUAN DAVID LOPEZ SANTOS	1082351523	OBRERO
181	SOL FANETH MENDOZA	1042211511	OBRERO
182	ROCIO DE LA OSSA MORALES	63465590	OBRERO
183	ELIZABETH CASTRO OVIEDO	37575353	OBRERO
184	ERIKA TATIANA ANTOLINEZ BENAVIDES	1042214005	OBRERO
185	ANA LUCIA RICO CRUZATE	1096234778	OBRERO
186	DAMARIX ROSA RODRIGUEZ TREJOS	21950088	OBRERO
187	YAILETH HERNANDEZ JARAMILLO	1005180731	OBRERO
188	DEIVIS LOPEZ MARTINEZ	80022053	OBRERO
189	ZHARICK XIBELLE CUERVO APARICIO	1005240015	OBRERO
190	ELIZABETH ROMERO BALMACEDA	1096219716	OBRERO
191	JOSE YIMMI MORENO BENITEZ	4854222	OBRERO
192	LIBORIO ORTEGA CANTILLO	3557880	OBRERO
193	LUIS FELIPE BELTRAN LOPEZ	1063959626	OBRERO
194	YESICA PAOLA CARRILLO ARROYAVE	1042214087	OBRERO
195	DIANA CAROLINA CHACON ECHAVARRIA	1096228002	OBRERO

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
196	PAULA ANDREA ARRIETA RIVAS	1042214382	OBRERO
197	ILVA MARIA NIETO RODRIGUEZ	21949422	OBRERO
198	ANDREA JOHANA DIAZ CASTELLANO	1096204724	OBRERO
199	YUMNARA JAZBLEIDY GIL GONZALEZ	1096190744	OBRERO
200	RUBIELA IZABEL GUERRERO ZULETA	28488406	OBRERO
201	NORIS JEREZ LOPEZ	21950434	OBRERO
202	JOSE LEONARDO FRANCO CAMPOS	1096207153	VIGILANTE
203	ALLISON VALENTINA VEGA RAMOS	1005221813	OBRERO
204	VICENTE ESCOLASTICO BENAVIDES ORTEGA	17370023	VIGILANTE
205	MAROLIZ ANDREA GUERRA RODRIGUEZ	1042210074	OBRERO
206	ANDRES FELIPE GAMARRA HIGUINIO	1005188000	OBRERO
207	LUZ ANDREA LOPEZ OROZCO	1193473817	OBRERO
208	JUBY SMIT LONDONO GARZON	1042214880	OBRERO
209	MARISOL RUIZ GIL	30572723	HSE
210	ZENEIDA MORENO ALVARADO	1085171327	VIGILANTE
211	ROSELIA VILORIA LOPEZ	1042213467	OBRERO
212	MARIA ALEJANDRA MORALES	1001815165	OBRERO
213	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS	19247420	OBRERO
214	ROY CASTILLO ARDILA	91424510	TOPOGRAFO
215	KATERINE GUTIERREZ	1001815273	RESIDENTE DE OBRA
216	DIEGO BELENO RODRIGUEZ	1042210357	AYUDANTE DE VOLQUETA
217	DARCY CARDONA AMAYA	1036220471	OBRERO
218	FERNANDO PINERES LERMA	91426792	OBRERO
219	JACKLYN KATERINE CARDENAS CAMPO	37440917	OBRERO
PERSONAL ADICIONAL (93)			
220	SAMUEL CAMARGO RODRIGUEZ	15451761	OBRERO
221	NILSON DANIEL CRESPO*	1148944080	OBRERO
222	NANCY BERNAL ROMERO*	21950792	OBRERO
223	MARTHA LILIANA PEREZ AGUDELO*	1104130380	OBRERO
224	ROSA MARITZA ALFONSO TORRES*	1118546237	OBRERO
225	LILI ARANGO VASQUEZ	1039702224	OBRERO
226	DOMINGO ROJAS CUADROS*	13889736	OBRERO
227	MANUEL SANTOS ESPITIA MADERA	13565932	OBRERO
228	MARYORIS MEJIA MONTOYA	1096802785	OBRERO
229	YOLIMA CASTELLAR OTALVAREZ	28489460	OBRERO
230	JHON FREDY RAVELO ROMERO	15452260	OBRERO

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
231	LILIANA ANDREA BEDOYA PEREZ	1042210587	OBRERO
232	JORGE ELIECER JIMENEZ CIFUENTES	15452324	OBRERO
233	YORLENY FERNANDEZ ALMENDRALES	1042210903	OBRERO
234	HERMES MOYANO MAHECHA	15452498	OBRERO
235	MYRIAM ROJAS SIERRA	30783131	OBRERO
236	NELCIDA JIMENEZ SANDOVAL	36585211	OBRERO
237	MARIA CRISTINA HERREÑO LOPEZ	21949761	OBRERO
238	NEREYDA AMAYA MARIN	21950243	OBRERO
239	ROSELIA HERNANDEZ SUAREZ	30003974	OBRERO
240	NICOL DANIELA PEREZ HUESO	1096185384	OBRERO
241	LUZ MERY CARDONA TABARES	37928561	OBRERO
242	LAUDIS ASTRID BERNAL DIAZ	1050918515	OBRERO
243	MAICOL YESID LEON MELGAREJO	1042210223	OBRERO
244	NATALY PATRICIA FRAGOSO CASTELLAR	1096190906	OBRERO
245	LUZ MARY GARAY MALDONADO	1042212704	OBRERO
246	ELIANA MILENA PIEDRAHITA GUARNICA	28069774	OBRERO
247	YENNY MARIN ZABALA	1017190974	OBRERO
248	RONALDO ALBERTO MARIN RICO	1042210636	OBRERO
249	LUZ ARGENES MARTINEZ UILES	21950690	OBRERO
250	OTILIA YASOS BERNAL	63459696	OBRERO
251	REYES MANUEL NISPERUZA CORRALES	92512059	OBRERO
252	LEIDY YANETH MARTINEZ UILES	1042212218	OBRERO
253	ANA ISABEL GUTIERREZ	23151498	OBRERO
254	JOSE FERNANDO LEON BOHORQUEZ	15451850	OBRERO
255	ROSA MARIA RICO	37579039	OBRERO
256	LIDIS EMILIA ZABALA SANCHEZ	21949581	OBRERO
257	WENDY YARIZA FLORIDO OROZCO	1001815541	OBRERO
258	MAYERLI SIERRA AGUILAR	1096210154	OBRERO
259	LUZ DARY TOVAR CAMPO	63462209	OBRERO
260	CARLOTA HERNANDEZ PALACIOS	28489173	OBRERO
261	MARIA LILLANA PIÑERES PRIETO	21950728	OBRERO
262	SANTIAGO RAMIREZ CARDENAS	91320362	OBRERO
263	MARIA VICTORIA MARQUEZ RUIZ	1002643412	OBRERO
264	BASILICA PEDROZO CAMPO	37934718	OBRERO
265	YESICA PEÑA OSPINO	1048556070	OBRERO
266	MARELIS LERMA DIAZ	63463423	OBRERO
267	ZULEIMA PAOLA MENCO PIÑERES	1052987217	OBRERO
268	YAZMIN YULIET CORDOBA MORALES	21950798	OBRERO
269	MARITZA CARRASCAL VELASQUEZ	32007741	OBRERO
270	JHOAN SEBASTIAN PAEZ FONCE	1128464014	OBRERO

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
271	MARIA MONICA PUENTES GUAPACHA	1096194594	OBRERO
272	WILLIAM GAVIRIA RAMIREZ	1096210618	OBRERO
273	DORIS MORENO ORTIZ	26270688	OBRERO
274	GISELLA ANDREA IBARRA BRAN	1001815978	OBRERO
275	MANUEL FERNANDO ESPITIA MOLINA	1042211085	OBRERO
276	YAI DANER CASTAÑEDA ZAPATA	15452396	OBRERO
277	NORAIMA CARPIO	1042214051	OBRERO
278	JESUS ANTONIO LOPEZ	1022400762	OBRERO
279	ISABELLA SANCHEZ HERNANDEZ	1005182416	OBRERO
280	XIOMARA SANCHEZ BENAVIDES	24717371	OBRERO
281	SANDRA MILENA APARICIO RINCON	28020339	OBRERO
282	ESTEFANIA CHACON JARABA	1001814708	OBRERO
283	DIANA LUCIA PAREDES DIAZ	1078247260	OBRERO
284	YENNY MORALES	43657665	OBRERO
285	JONNIER ALEXIS CABEZAS MEJIA	1001271537	OBRERO
286	BERTHA JULIANA QUEJADA PALACIO	1042213523	OBRERO
287	LUIS ROBERTO DE LA ROSA GOMEZ	18911151	OBRERO
288	OLGA BALLESTROS MORALES	21950613	OBRERO
289	DANIELA LOPEZ SIERRA	1042210662	OBRERO
290	NEUDIS LERMA FRANCO	26766703	OBRERO
291	CARMEN ANA MEJIA	21949449	OBRERO
292	LEONEL HERNANDEZ SANCHEZ	1042215286	OBRERO
293	JAMES SOTO RANGEL	1096239201	OBRERO
294	FRANCISCO JAVIER PEDROZO RANGEL	5172800	OBRERO
295	IDALIDES NAVARRO FLOREZ	30874459	OBRERO
296	CRISTIAN CAMILO MESA GUERRA	1096241220	OBRERO
297	ORTENCIA YULIETH ORTIZ LLORENTE	1001815023	OBRERO
298	GISELL NATALIA MOYANO CASALLAS	1042210988	OBRERO
299	NANCY ELVIRA GUTIERREZ ARROLLO	37927798	OBRERO
300	MAROIDYS CARDONA TORRES	1096189303	OBRERO
301	YESSICA TATIANA CASTRO MORENO	1054564044	OBRERO
302	YOREIDYS BOHORQUEZ RODRIGUEZ	1042212730	OBRERO
303	LUZ MERY VIDES MORA	22820196	OBRERO
304	JOSE DE JESUS AVENDAÑO	71185259	OBRERO
305	LUIS ARMANDO ROBLES RONDON	1096199954	OBRERO
306	NATALIA CAICEDO ORTIZ	1096801732	OBRERO
307	YERLINTH JAIDITH SANCHEZ HERNANDEZ	1148944059	OBRERO
308	YULI ESTEFANIA ROJAS MEDINA	1001814830	OBRERO
309	LILIAN YORLADIS TAPIAS ESTRADA	1065243718	OBRERO
310	ATILANO FLOREZ CARBALLIDO	1001814819	OBRERO
311	YESSICA MILDRED RINCON	1005186073	OBRERO
312	LINA MARCELA SANABRIA MACIAS	1001815224	OBRERO

PROGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
FECHA:	DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCION	VR. ACTIVIDAD		MES 1				MES 2			
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Etapa Precontractual											
1. Objetivo Especifico 1: SERVCIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA											
1.1. Producto 1: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos											
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos	$ 4.493.624.280,75	CAÑO COLECTOR Y RAMALES								
			CAÑO AGRIO EL TIGRE								
			CANAL BRISAS DE ORIENTE								
			BARRIOS 3 DE OCTUBRE, PROGRESO, POP CASABE								
			BOCATOMA LAGUNA Y ACUEDUCTO RURAL								
			CAÑO CARMELITAS								
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir).	$ 246.318.353,40									
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	$ 159.831,00									
				$ 1.908.424.088				$ 2.991.349.547			
TOTALES		***$ 4.740.102.465,15***		***$ 1.908.424.087,58***				***$ 2.991.349.546,58***			

1.03 INTERVENTORIA

42


1694

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

ORGANIGRAMA DE OBRA

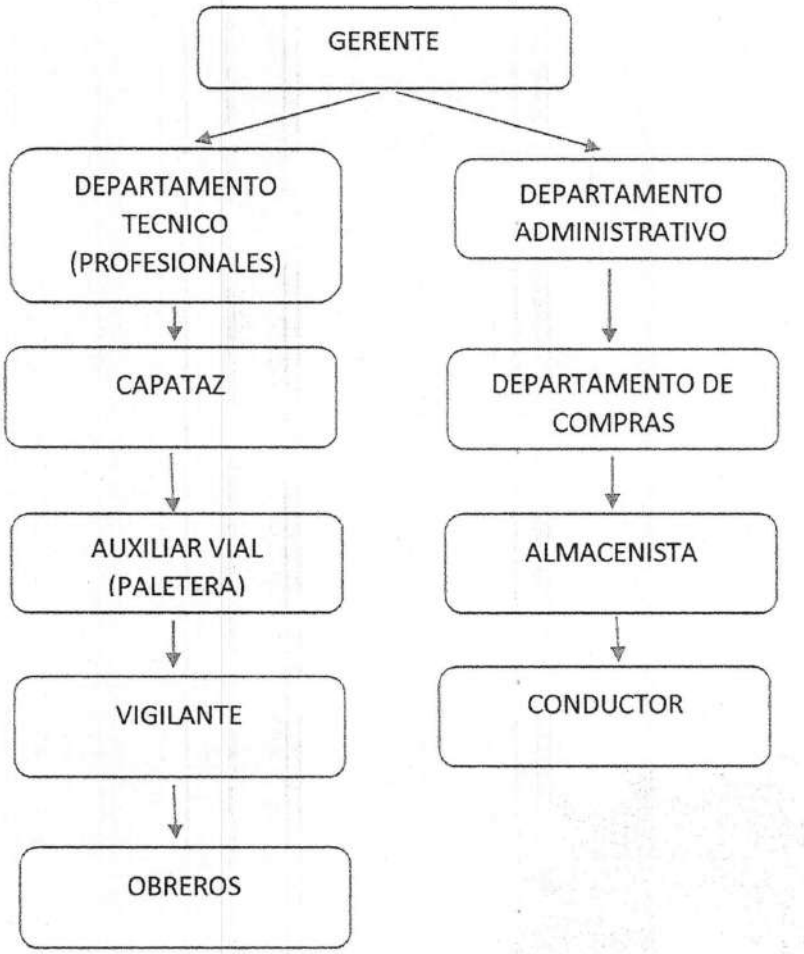

8.3 HOJAS DE VIDA.

En este Capítulo se anexan las hojas de vida del personal No profesional vinculado para la ejecución del contrato, las hojas de vida de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

8.4 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.

En este Capítulo se anexan los contratos individuales de trabajo del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

8.5 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.


En este Capítulo se anexan las afiliaciones y certificaciones al régimen de seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

8.6 ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

Con el fin de brindar seguridad y protección a los trabajadores al momento de ejecutar las actividades del contrato, el contratista hace entrega de los implementos y vestuarios, es por eso que se le solicita al contratista la elaboración de un acta de entrega de dotación del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato, durante este periodo no ingreso nuevo personal.

A continuación, presentamos un desglose de los grupos poblacionales que se encuentran dentro del personal que desarrolla el proyecto.

POBLACIÓN							
TOTAL BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	ADULTO MAYOR + 58 AÑOS	ADULTOS ENTRE 29 Y 57 AÑOS	JOVENES ENTRE 18 - 27 AÑOS	COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE	PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	COMUNIDAD LGTBIQ+	VICTIMAS DEL CONFLICTO
312	32	68	125	28	9	5	45

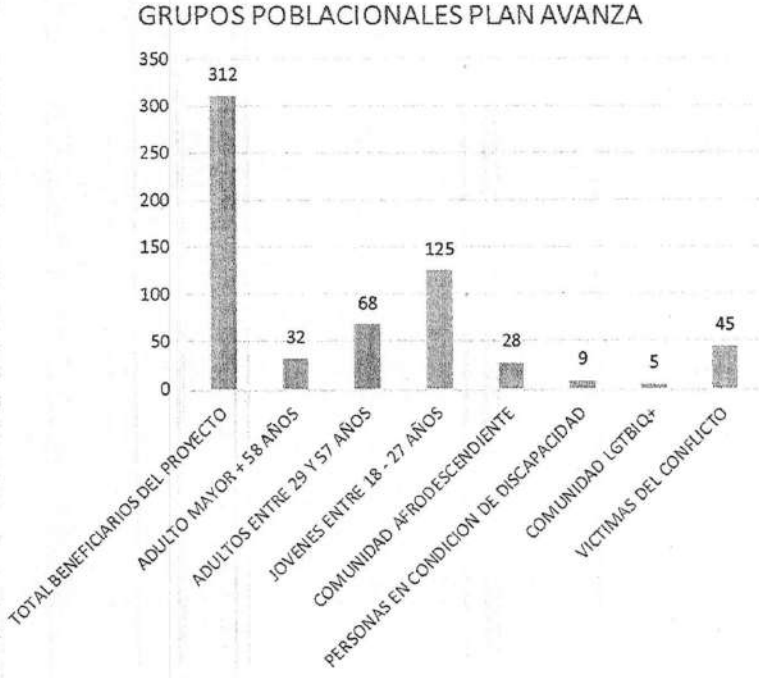

9 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad en general del Municipio de Yondó donde asistieron diferentes personas de diferentes sectores, la Interventoría, personal de la empresa de servicios públicos, el contratista y su equipo de trabajo.

En esta socialización la comunidad planteo sus inquietudes respecto a la parte laboral: en cuanto a salarios, tipo de contrato, prestaciones y cantidad de personal requerido para la obra, en este punto el tema se centró en la necesidad de utilización de la mano de obra local.

Este documento se anexo en el informe anterior.

9.2 ACTAS DE VECINDAD

No se realizaron estas actas de vecindad debido a que los trabajos se realizaron durante este periodo no afectaron viviendas cercanas.

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
CONTRATO DE OBRA:	No 058 - 2024
CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
OBJETO	OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE
VALOR ADICIONADO:	MIL OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1.082.925.459,00) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($4.899.773.634,15) M/CTE.
PLAZO:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

OFICINA RESPONSABLE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
FECHA ACTA DE INICIO:	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

10.2 ACTAS SUSCRITAS.

NOMBRE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
Otro Si No 01	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
Otro Si No 02	PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 1	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
Otro si No 03	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 2	VEINTI UNO (21) DE DICIEMBRE DE 2024

10.3 RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES

A la fecha se ha efectuado un pago parcial, pero con el presente informe se realizará el segundo corte.

ACTA PARCIAL No	VALOR DEL ACTA	DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO 50%	VALOR NETO A PAGAR	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO
1	$ 3.435.163.357,64	$ 1.908.424.087,58	$ 1.526.739.270,06	$ 3.435.163.357,64	$ 381.684.817,52
2	$ 974.632.913,10	$ 541.462.729,50	$ 433.170.183,60	$ 4.409.796.270,74	$ 489.977.363,42
3	$ 489.977.363,41		$ 489.977.363,41	$ 4.899.773.634,15	$ -

10.4 CONTROL DE GARANTÍAS.

El contratista presento a la Administración Municipal de póliza de Cumplimiento No 11-45-10101153670 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. Para amparar los riesgos de Cumplimiento de Contrato, Estabilidad de Obra, Pago de Salarios prestación Sociales y Responsabilidad Civil Extracontractual No 11-40-101069764, para la Legalización del contrato de Obra No. 058 DE 2024. Una vez revisadas las pólizas, AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P mediante acta de aprobación de garantías da aceptación.

Actualización de pólizas del contrato

SEGÚN OTRO SI No 3 EN VALOR					
POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO	%
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$489.977.363,42	10%
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$2.449.886.817,08	50%
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/01/2028	$244.988.681,71	5%
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$489.977.363,42	10%
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/01/2025	$520.000.000,00	

10.5 CONTROL DE PAGOS PARAFISCALES.

En el presente informe, se adjunta el pago de aportes parafiscales del personal de obra, correspondientes al periodo del presente cobro.

10.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO (F-GPI-SIN-21).

En el presente informe se anexa el formato F-GPI-SIN-21 donde se verifican las actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato en el periodo de cobro.

10.7 REGÍSTRO DIARIO DE OBRA (BITÁCORA).

En el presente informe, se anexa la bitácora de Obra en donde se registran las actividades realizadas día a día en Obra en la cual se evidencia el avance en la ejecución del proyecto.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

E. S. P.	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	Página 74 de 79

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.

VALOR: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)

CONTRATISTA: SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7

INTERVENTOR: MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: EVARISTO ANTONIO FLORES OLIVERA


FECHA DEL REGISTRO: 23 DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 1



DESCRIPCIÓN: Se realiza jornada de recolección de residuos para su debida disposición final.

FOTOGRAFÍA No. 2

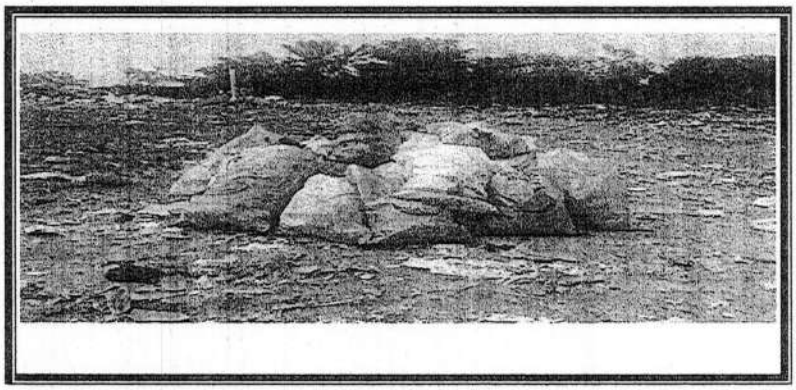

DESCRIPCIÓN: Disposición final de residuos.

E. S. P.	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	Página 75 de 79

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.

VALOR: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)

CONTRATISTA: SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7

INTERVENTOR: MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: EVARISTO ANTONIO FLORES OLIVERA

FECHA DEL REGISTRO: 26 DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 3



DESCRIPCIÓN: Limpieza y des taponamiento caño carmelitas.

FOTOGRAFÍA No. 4




DESCRIPCIÓN: Jornada de des taponamiento caño carmelitas

E. S. P.	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	Página 76 de 79

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
VALOR:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)
CONTRATISTA:	SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLORES OLIVERA
FECHA DEL REGISTRO:	27 DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 5

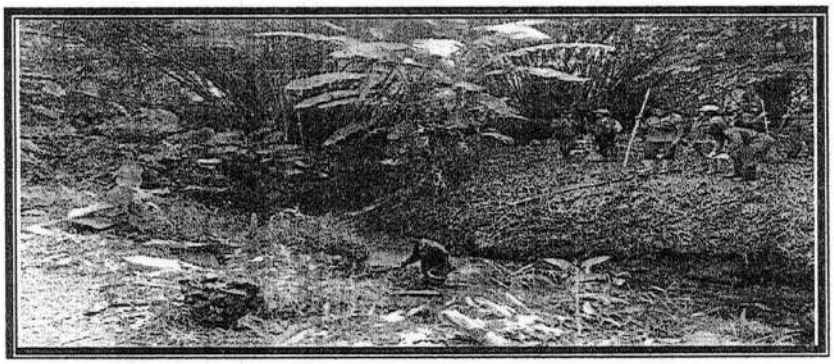

DESCRIPCIÓN: Se ejecuta jornada de limpieza caño carmelitas.

FOTOGRAFÍA No. 6




DESCRIPCIÓN: Avance limpieza caño carmelitas.

E. S. P.	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	Página 77 de 79


OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
VALOR:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)
CONTRATISTA:	SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLORES OLIVERA
FECHA DEL REGISTRO:	28 DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 7

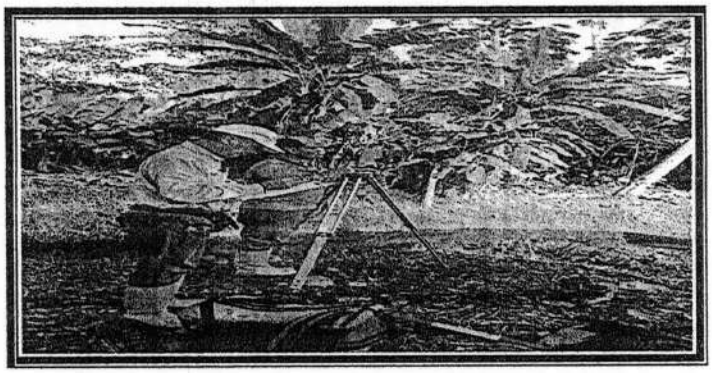

DESCRIPCIÓN: Jornada de topografía sector caño carmelitas.

FOTOGRAFÍA No. 8

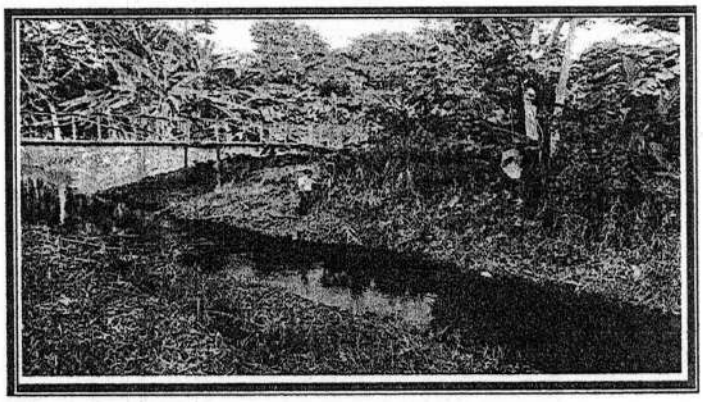

DESCRIPCIÓN: Topografía caño carmelitas.

E. S. P.	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	Página 78 de 79


OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
VALOR:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)
CONTRATISTA:	SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLORES OLIVERA
FECHA DEL REGISTRO:	30 DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 9



DESCRIPCIÓN: Limpieza y des taponamiento sector caño carmelitas.

FOTOGRAFÍA No. 10

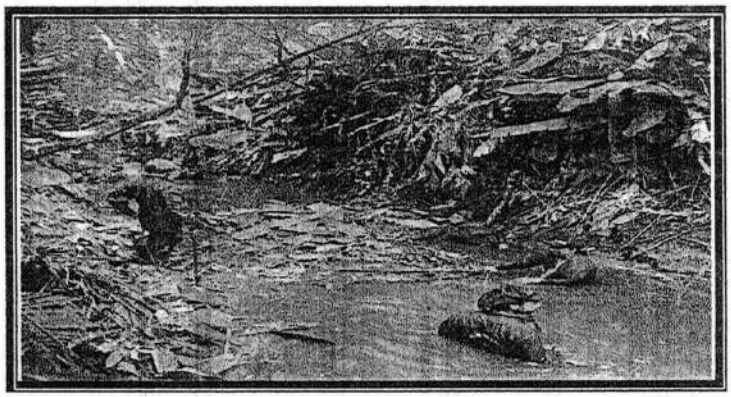

DESCRIPCIÓN: Avance limpieza sector caño carmelitas

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

BITACORA DE OBRA

Calle 63 No 19-17 Barrio Parnaso - Móvil: 311 214 8798 - contacto@mbservingenieria.com - Barrancabermeja / Santander / Colombia

1712

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 — Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 22 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por: Katerine Gutierrez	Aprobado por: Dayana Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 23 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	910			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	910			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	45			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

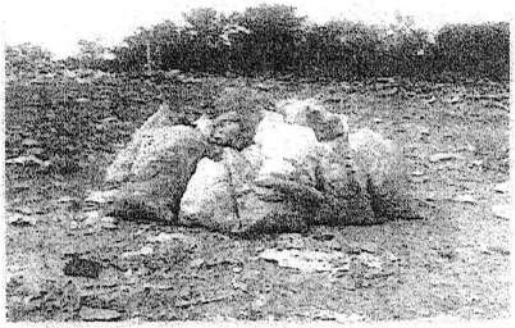

OBSERVACIONES

Se realizan labores de recolección de residuos.

Elaborado por: Katarine Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 24 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por festejo navideño.

Elaborado por: Katerin Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

1975

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 25 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia festivo.

Elaborado por: Rodrigo Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

60

1716

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

E. S. P.

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 26 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	722			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	722			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	38			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de limpieza caño carmelitas. Sin novedad.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

61

1717

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

E. S. P.

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 27 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	756			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	756			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	25			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

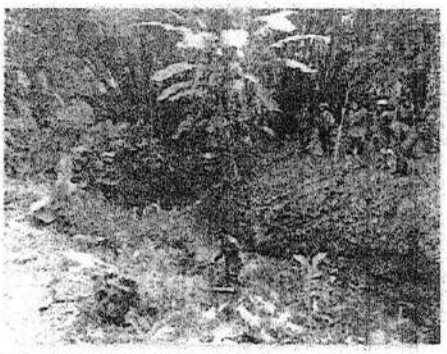

DESPUES

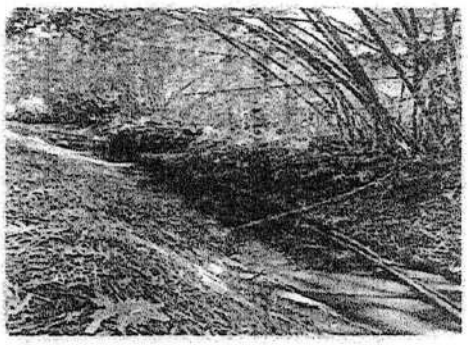

OBSERVACIONES

Jornada de limpieza caño carmelitas. Sin novedad.

Elaborado por: Karen de Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

62

1718

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 28 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	725,50			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	725,50			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	29.			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

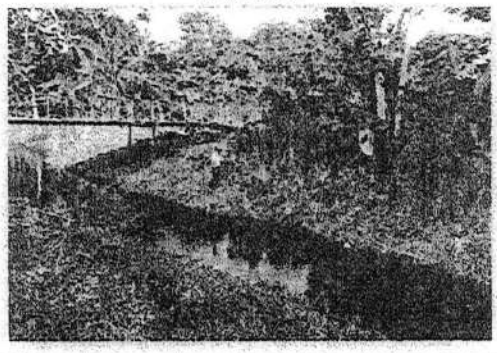

OBSERVACIONES

Jornada de topografia sector caño carmelitas.

Elaborado por:	Aprobado por:
Fabian Gutierrez	Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

63

1719

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6		
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
		Fecha de Aprobación:	
		Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 29 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por: Katerine Gutierrez CONTRATISTA	Aprobado por: Dayanna Ufadiva INTERVENTORIA

64

1720

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 30 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	970			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	970			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	31			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

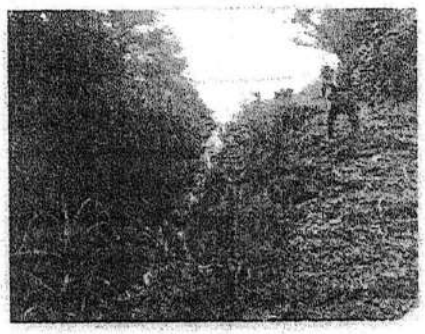

OBSERVACIONES

Jornada de limpieza y des taponamiento caño carmelitas.

Elaborado por: Katerine Gutierrez	Aprobado por: Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA


65

11 CONTRATO DE INTERVENTORIA

11.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATANTE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	059 DE 2024
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
OBJETO	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($188.260.380,00) M/CTE
PLAZO:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
OFICINA RESPONSABLE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
FECHA ACTA DE INICIO:	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

11.2 ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE TRABAJO.

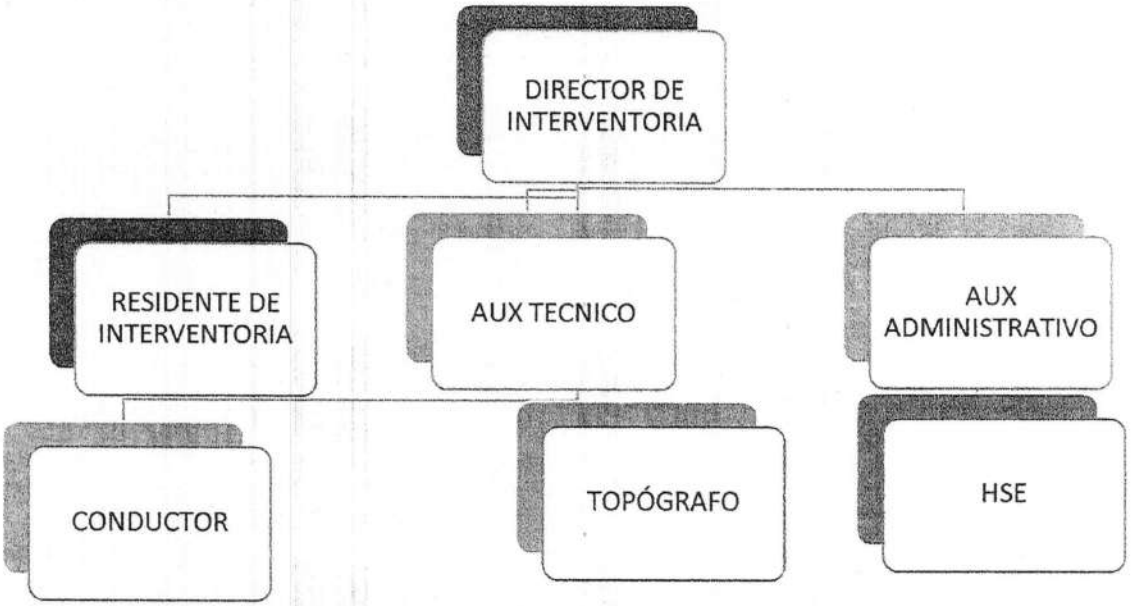

11.3 PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Estos documentos se entregaron para efectos del Acta de Inicio.

Este es el listado del personal de la interventoría.

ITEM	NOMBRE	No DE CEDULA	CARGO
1	LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO	5,594,307	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	DAYANNA MEDINA MUÑOZ	1,042,213,706	INGENIERA RESIDENTE
3	CINDI RODRIGUEZ PACHECO	1,042,211,909	AUX DE INTERVENTORIA
4	KAREN MARGARITA ALMENDRALES BARRAGAN	1,096,215,798	HSE
5	MIRIAM RODRIGUEZ PACHECO	1,042,212,722	AUX ADMINISTRATIVO
6	JHOAN ARNALDO RODRIGUEZ ATENCIA	1,042,212,332	CONDUCTOR
7	JOAQUIN ORTIZ CAMACHO	91,229,547	TOPOGRAFO

11.4 HOJA DE VIDA

Estos documentos se entregaron para efectos del Acta de Inicio.

11.5 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Estos documentos se entregaron para efectos del Acta de Inicio.

11.6 ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

Estos documentos se entregaron para efectos del Acta de Inicio.

11.7 ACTAS SUSCRITAS.

La siguiente es la relación de actas suscritas a la fecha de cobro:

NOMBRE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 1	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 2	VEINTI UNO (21) DE DICIEMBRE DE 2024

11.8 RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES.

A la fecha se ha efectuado un pago parcial.

BALANCE DEL CONTRATO				
ACTA PARCIAL No.	VALOR ACTA	VALOR PAGADO DEL ACTA	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO
1	$ 94.130.190,00	$ 94.130.190,00	$ 94.130.190,00	$ 94.130.190,00
2	$ 75.304.152,00	$ 75.304.152,00	$ 169.434.342,00	$ 18.826.038,00
3	$ 18.826.038,00	$ 0,00	$ 188.260.380,00	$ 0,00

11.9 CONTROL DE GARANTÍAS.

El contratista presento a la empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P la póliza No 56-45-101003492 de SEGUROS DEL ESTADO S.A para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Calidad del Servicio y pago de Salarios prestaciones Sociales, para la Legalización del

contrato de Interventoría No. 059 de 2024. Una vez revisadas las pólizas, la empresa contratante mediante acta de aprobación de Garantía donde se da aceptación a estas.

Mediante acta de aprobación de Garantías se da aceptación a la actualización de la póliza según acta de inicio.

SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO					
POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO	%
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2024	01/07/2025	$18.826.038,00	10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2024	31/12/2027	$ 9.413.019,00	5
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2024	01/07/2025	$18.826.038,00	10

11.10 CONTROL DE PAGOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.

En el presente informe, se adjunta el pago de seguridad social inicial del personal de Interventoría.

11.11 ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

El alcance de la interventoría comprende realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero al proyecto de Obra para dar cumplimiento a lo establecido anteriormente de acuerdo a las leyes, decretos y normas que sean necesarias aplicar en la ejecución de las actividades, dicha información es entregada a la EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P a través de informe de interventorías que demuestran el avance o atraso de la ejecución de la Obra.

11.11.1 Principios de la Interventoría

- ✓ Velar para que los contratos se ejecuten cumpliendo con la programación y el flujo de inversión establecidos.
- ✓ Colaborar con la la EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P y el contratista, a lograr los objetivos contractuales pactados, conformando un grupo interdisciplinario que en forma conjunta puedan resolver las dificultades de orden técnico, administrativo y financiero.

- ✓ Velar que los recursos sean ejecutados en forma adecuada y de acuerdo a las asignaciones presupuestales de los contratos.

11.11.2 Finalidad de la Interventoría

- ✓ Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas en los contratos.
- ✓ Mantener permanente comunicación con el contratista y la entidad contratante.
- ✓ Propender porque no se generen conflictos entre las partes y tomar medidas para solucionar eventuales controversias generadas en la ejecución del contrato.
- ✓ Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso, ante sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista, o cuando la alcaldía, lo requiera.
- ✓ Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.
- ✓ Velar porque el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y post contractuales.
- ✓ Garantizar que el contratista presente todos los documentos exigidos por la EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P para proceder a la liquidación del contrato.

11.11.3 Calidad

- ✓ Revisar y aprobar los materiales utilizados para el proyecto.
- ✓ Realizar los ensayos necesarios para la verificación de la calidad de los trabajos efectuados.

11.11.4 Funciones Técnicas de la Interventoría

- ✓ Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato.
- ✓ Verifica que el personal vinculado se encuentre afiliado al Régimen de seguridad social y riesgos.
- ✓ Llevar un libro diario de obra donde se indicará la maquinaria y el personal que labora día a día.
- ✓ Verificar la calidad de los materiales.
- ✓ Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las licencias y /o permisos, normas y leyes que le apliquen para la ejecución del contrato.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios suministrados por la EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P.
- ✓ Controlar y verificar el estado de la maquinaria y equipos utilizado por el contratista.
- ✓ Velar para que se cumpla con el objeto contractual.

11.11.5 Funciones Administrativas de la Interventoría

- ✓ Elaborar las actas que se requieran durante la ejecución del contrato.
- ✓ Verificar el cumplimiento de los cronogramas, establecidos en el contrato.

- ✓ Elaborar, revisar, suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, terminación, entrega y recibo final, liquidación y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato.
- ✓ Cumplir y hacer cumplir que todo el personal este afiliado al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgo profesional) y el pago de las obligaciones parafiscales.
- ✓ Hacer control a las garantías exigidas, con el fin de que permanezcan vigentes y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo.
- ✓ Atender las inquietudes presentada por la comunidad, y este a su vez se transmitirá a la Alcaldía Municipal.
- ✓ Control de la documentación relacionada con el desarrollo del contrato.
- ✓ Llevar un control diario de obra.

11.11.6 Funciones Financiera de la Interventoría

✓ Revisar y aprobar el flujo de caja, balance del contrato y programa de inversión.
Elaborar, revisar y aprobar las actas de pago parcial y final.

11.11.7 Funciones Financiera de la Interventoría.

- ✓ Revisar y aprobar el flujo de caja, balance del contrato y programa de inversión.
- ✓ Elaborar, revisar y aprobar las actas de pago parcial y final.

OBSERVACIONES EJECUCCION DEL PROYECTO

Durante la ejecución de las actividades en general de este contrato, se observó el esfuerzo realizado por el personal para sacar adelante el proyecto, cumpliendo las metas propuestas y sobrepasando las expectativas generadas por el contrato de obra.

Se recomienda continuar interactuando con las comunidades aledañas a los caños y cuerpos cenagosos intervenidos para concientizarlos de la importancia de cuidar y mantener limpias estas fuentes hídricas.

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
Director de Interventoría

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

INFORME TOPOGRAFICO No 3
DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Contrato de Interventoría de Obra Pública Nro. 059-2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014 - 2024

CONSULTOR

MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

NIT# 900.488.751-2

SUPERVISION

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P

MUNICIPIO DE YONDO, ANTIOQUIA, DICIEMBRE DE 2024

SERVICIOS DE INGENIERÍA


Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes
www.mbservingenieria.com

INTRODUCCION

El presente informe contiene los resultados de los diferentes levantamientos y Replanteos Topográficos realizados en obra para la ejecución del proyecto " MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024."; Por parte de la firma interventora MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

El proyecto en ejecución se encuentra ubicado en el sector urbano y rural del municipio de Yondo, departamento de Antioquia.

Localización General, Municipio Yondó, Antioquia

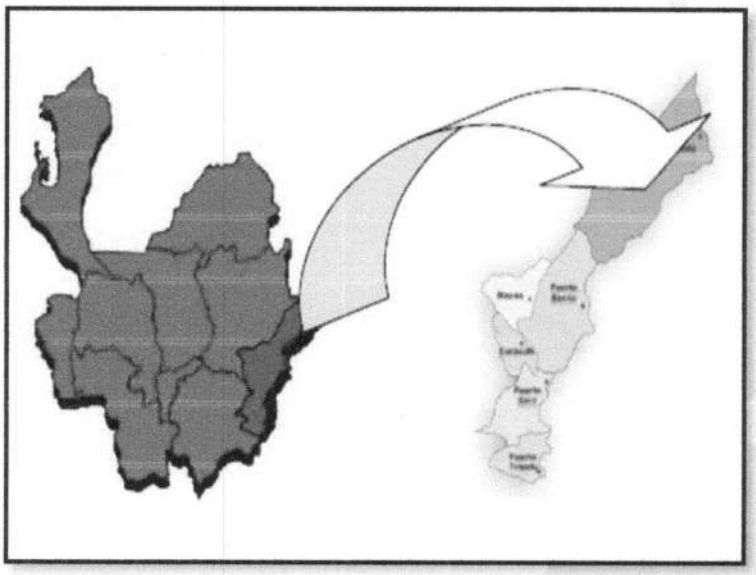

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes
www.mbservingenieria.com

ALCANCE

Los levantamientos y replanteos topográficos realizados, se han ejecutado con un equipo de precisión Estación Total Geodésica, con la cual se tomaron todos los detalles relevantes para la realización del trabajo Levantamiento Topográfico Geo-referenciado a los puntos designados, para el proyecto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.".

Entre estos detalles geo-referenciados podemos enunciar, calzada, carreteables, ejes de vía, árboles, cunetas, accidentes topográficos y demás detalles que pudieran ser útiles para el proceso de ejecución en obra.


La información topográfica se procesó con software que permitió el dibujo de los detalles en ambiente Auto-cad y la elaboración de curvas de nivel del área de estudio. Ya con esta información se procedió a montar las área intervenidas y de esta manera poder realizar los replanteos topográficos en terreno y cuantificar las cantidades de obra ejecutadas.

OBJETIVO

- Realizar el Levantamiento Topográfico, correspondiente a toda el área donde se desarrollará " **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024".**

LOCALIZACION DEL PROYECTO – UBICACIÓN

Municipio de YONDO
Departamento de ANTIOQUIA

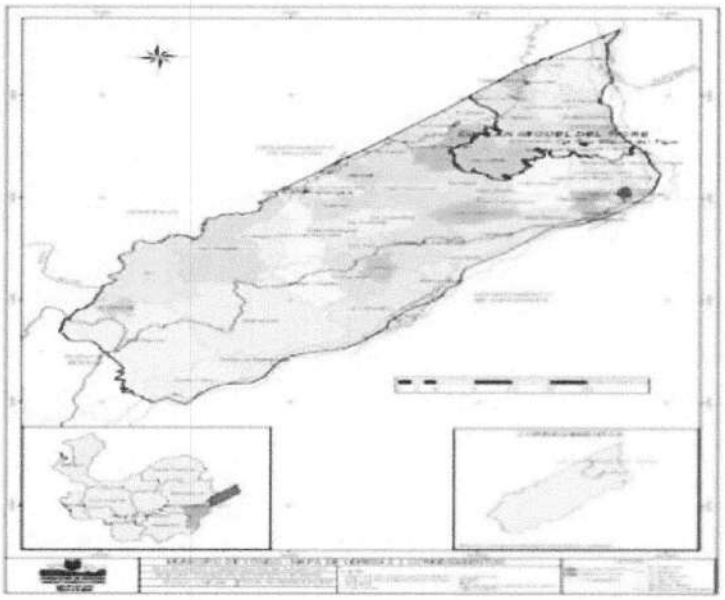

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TERCER PERIODO DE TRABAJOS:

Se realizó el levantamiento Topográfico y replanteo en la zona donde se va a ejecutar el proyecto y los equipos que se utilizaron fueron:

- ESTACION TOTAL MARCA TOPCON
- TRIPODE
- PRISMA
- PORTA PRISMA
- NIVEL DE PRESICION MARCA LEICA
- MIRA
- CINTA METRICA
- HERRAMIENTA MENOR

Los trabajos de levantamientos topográficos y replanteos realizados contemplan la captura de toda la información existente en terreno y con toda esta información digitalizada se procede al cálculo de perfiles y pendientes.

DESARROLLO

Este tercer informe contiene la información del tercer corte de actividades, las cuales se desarrollaron en el denominado caño carmelitas del municipio de yóndo, Antioquia, se realizó el levantamiento inicial del área a intervenir dando como resultado los siguiente:

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2,80			
		2,65	100,00	265,00
K0+100	2,50			
		2,80	100,00	280,00
K0+200	3,10			
		3,00	100,00	300,00
K0+300	2,90			
		3,55	100,00	355,00
K0+400	4,20			
		4,00	100,00	400,00
K0+500	3,80			
		3,75	100,00	375,00
K0+600	3,70			
		3,60	100,00	360,00
K0+700	3,50			
		3,45	100,00	345,00
K0+800	3,40			
		3,30	100,00	330,00
K0+900	3,20			
		3,10	100,00	310,00
K1+000	3,00			
		3,50	70,00	245,00
K1+070	4,00			
				3565,00
LATERALES		2,00	2144,00	4288,00
			TOTAL AREAS	**7853,00**

Lo cual nos arrojaba un área total de 7853 m2 lo cual era un área mayor y se pasaba de las cantidades de obra pendientes por ejecutar del contrato, por lo cual se definió iniciar desde la parte de la salida de la ciénaga hacia la desembocadura en el rio magdalena.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes
www.mbservingenieria.com

A continuación, presentamos los puntos de las áreas de topografía ejecutada y verificada conjuntamente con el contratista de obra.

ABSCISA	ANCHO CAÑO	PROMEDIO ANCHO	DISTANCIA ML	AREA M2
K 0+00	2.80			
		2.65	100.00	265.00
K0+100	2.50			
		2.80	100.00	280.00
K0+200	3.10			
		3.00	100.00	300.00
K0+300	2.90			
		3.55	100.00	355.00
K0+400	4.20			
		4.00	100.00	400.00
K0+500	3.80			
		3.75	100.00	375.00
K0+600	3.70			
		3.60	100.00	360.00
K0+700	3.50			
		3.45	100.00	345.00
K0+800	3.40			
		3.30	100.00	330.00
K0+900	3.20			
		3.10	35.00	108.50
K0+935	3.00			
LATERALES		2.00	482.50	965.00
TOTAL				4083.50 M2

En general se intervinieron 4083,50 ml de este caño, debido a su variable ancho de cauce.

Después de definida el área a intervenir, verificamos los volúmenes de material extraído sacando un promedio de espesores entre los tramos definidos.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

AREA INTERVENIDA CAÑO CARMELITAS				
ABSCISA	**AREA M2**	**ESPESOR**	**VOL**	
K 0+00				
	265,00	0,08	21,20	
K0+100				
	280,00	0,05	14,00	
K0+200				
	300,00	0,05	15,00	
K0+300				
	355,000	0,05	17,75	
K0+400				
	400,00	0,05	20,00	
K0+500				
	375,00	0,05	18,75	
K0+600				
	360,00	0,05	18,00	
K0+700				
	345,00	0,06	19,18	
K0+800				
LATERALES	965,00	0,025	24,13	

TOTAL	168,0

Después de este ejercicio podemos corroborar que se extrajeron 168 m3 de material vegetal del caño carmelitas.

ANEXAMOS

- **PLANO DE LEVANTAMIENTO INICIAL CAÑO CARMELITAS**
- **PLANO DE LEVANTAMIENTO DE AREAS INTERVENIDAS CAÑO CARMELITAS.**
-

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

Atentamente,

Joaquín Ortiz Camacho
C.C. 91.229.547 de B/manga.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

REGISTRO FOTOGRAMETRICO DEL AREA INTERVENIDA





SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com






SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com




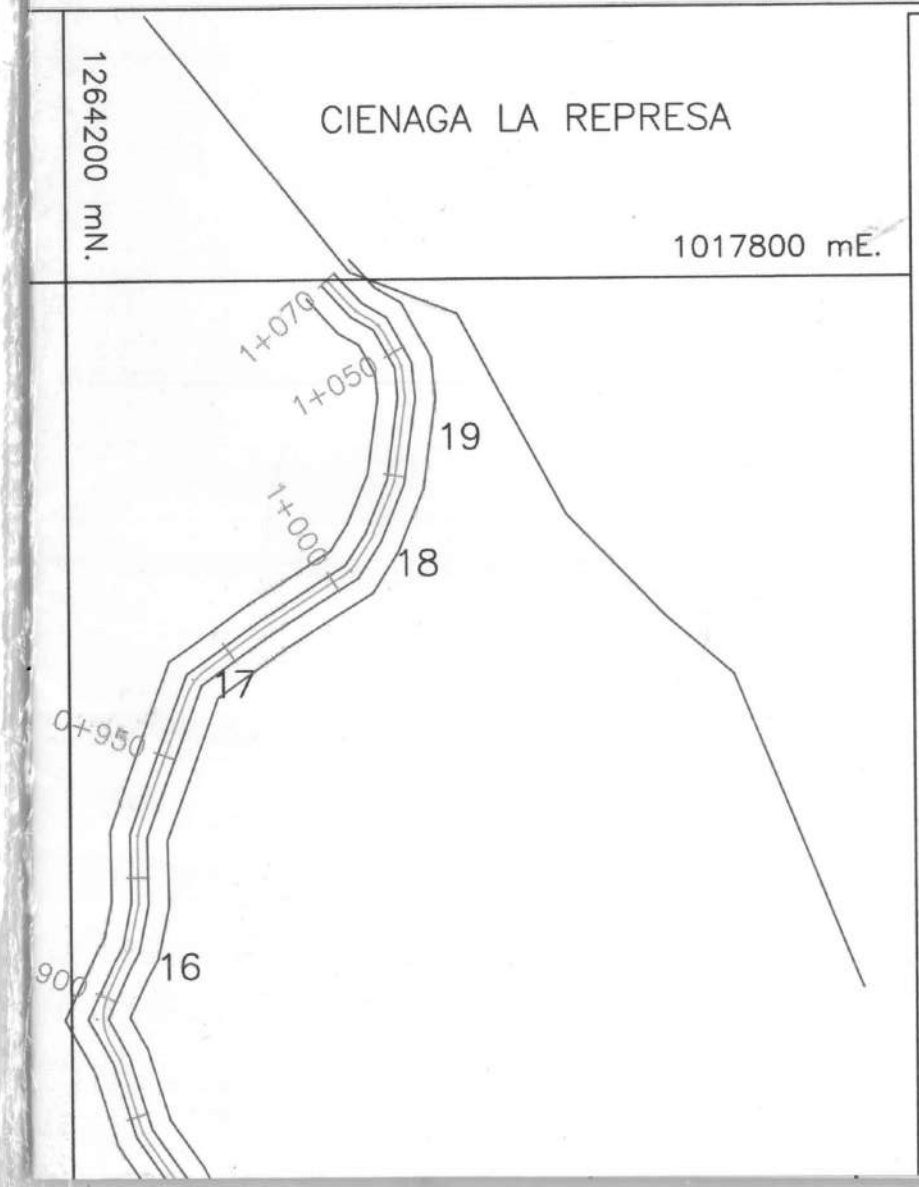

MUNICIPIO DE YONDO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOCALIZACIÓN GENERAL

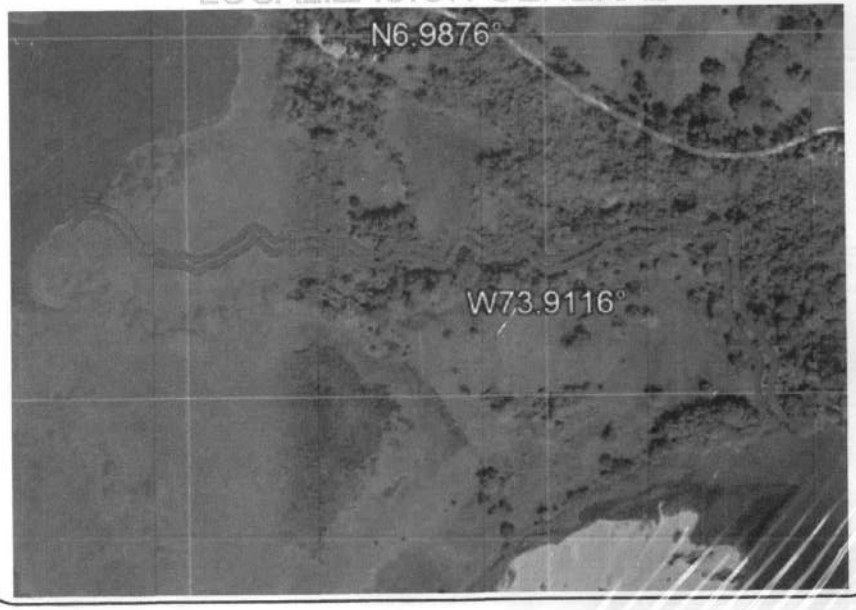

Proyecto:

SERVICIO DE RESTAURACIÒN

1264000 mN.

1017800 mE.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900488751	2	MB SERVICIOS INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MB SERVICIOS	CALLE 63 NO 19 17	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3112148798	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9483879743	9483879743	E	2025/01/15	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	78	$11,456,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MB SERVICIOS (7 Afiliados)						$34,600,000	$5,735,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$2,408,400		$0	$0
Centro de Trabajo: MB SERVICIOS (7 Afiliados)						$34,600,000	$5,735,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$2,408,400		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)						$34,600,000	$5,735,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$2,408,400		$0	$0
1	CC	1096215798	ALMENDRALES KAREN	230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF38	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	$271,500	30	$0	$0
2	CC	5594307	BUSTAMANTE LUIS	230301	30	$7,800,000	$1,326,000	EPS037	30	$7,800,000	$312,000	CCF38	30	$7,800,000	$312,000	14-11	30	$7,800,000	$542,900	30	$0	$0
3	CC	1042213706	MEDINA DAYANNA	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS005	30	$6,600,000	$264,000	CCF38	30	$6,600,000	$264,000	14-11	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
4	CC	91229547	ORTIZ JOAQUIN	25-14	30	$5,500,000	$935,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF38	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	$382,500	30	$0	$0
5	CC	1042211909	RODRIGUEZ CINDI	230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS040	30	$3,900,000	$156,000	CCF38	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	$271,500	30	$0	$0
6	CC	1042212332	RODRIGUEZ JHOAN	230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF38	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
7	CC	1042212722	RODRIGUEZ MIRIAM	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS040	30	$3,300,000	$132,000	CCF38	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$34,600,000	$5,735,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$1,384,000			$34,600,000	$2,408,400		$0	$0

2025/04/03 08:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900488751	2	MB SERVICIOS INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MB SERVICIOS	CALLE 63 NO 19 17	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3112148798	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9483879743	9483879743	E	2025/01/15	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	78	$11,456,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$5,735,000	$286,600	$0	$6,021,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$935,000	$46,800	$0	$981,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$4,800,000	$239,800	$0	$5,039,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,408,400	$120,300	$0	$2,528,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$2,408,400	$120,300	$0	$2,528,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,384,000	$69,200	$0	$1,453,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	7	$1,384,000	$69,200	$0	$1,453,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,384,000	$69,200	$0	$1,453,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$312,000	$15,600	$0	$327,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$784,000	$39,200	$0	$823,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$288,000	$14,400	$0	$302,400
TOTAL				7	$10,911,400	$545,300	$0	$11,456,700

2025/04/03 08:53 AM

142

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo **NORALBA OREJARENA PLATA** identificada con cedula de ciudadanía No 63.471.634 de Barrancabermeja, en mi condición de contador público de la sociedad **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** identificada con NIT 900.488.751 bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** representada Legalmente por **LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.594.307 expedida en Barrancabermeja, Santander, quienes ejecutan el CONTRATO No 059 - 2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.
Durante el mes de DICIEMBRE de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2024

Sin otro particular.

NORALBA OREJARENA PLATA
CONTADORAPUBLICA
MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 4 B F 9 3 D D 9 2 4 F F 5 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORALBA OREJARENA PLATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63471634 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 111006-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1795

Quita marcas de agua Wondershare PDFelement





Quita marcas de agua Wondershare PDFelement

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

111006-T



NORALBA
OREJARENA PLATA
C.C. 63471634
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

PRESIDENTE **LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ** 120744

31072

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

SOPORTES ADMINISTRATIVOS

RELACION DE GASTOS CORTE 2 DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	COSTOS ($)
A	**COSTO DE PERSONAL**		
	PERSONAL PROFESIONAL		
1	Director de Interventoria	UNIDAD	$ 1.560.000,00
1	Residente de Interventoria	UNIDAD	$ 1.320.000,00
1	Topografo	UNIDAD	$ 1.100.000,00
1	Auxiliar de interventoria (Tecnico o Tecnologo)	UNIDAD	$ 780.000,00
1	Profesional, Tecnico o Tecnologo HSE	UNIDAD	$ 780.000,00
	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO		
1	Auxiliar administrativo	UNIDAD	$ 660.000,00
1	Conductor	UNIDAD	$ 720.000,00
		SUBTOTAL	$ 6.920.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR 2		**$ 13.840.000,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTOS ($)
1	Edicion de informes Incluye fotograias, papeleria, CDS, Fotocopias, presentaciones.	MES	$ 200.000,00
1	Alquiler Camioneta 4 x 4	MES	$ 1.100.000,00
1	Gastos de Combustible	MES	$ 200.000,00
1	Alquiler Oficina	MES	$ 200.000,00
1	Equipos y planes de comunicación (voz y datos)	MES	$ 80.200,00
1	Equipo y moviliario de oficina (computadores, escritorios, archivadores, etc)	MES	$ 200.000,00
		SUB TOTAL	**$ 1.980.200,00**

TOTAL GASTOS CORTE 2		**$ 15.820.200,00**
	IVA 19%	$ 3.005.838,00
	TOTAL	**$ 18.826.038,00**

1749

Yondó, Antioquia, 30 de Diciembre del 2024

MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

NIT. 900.488.751-2

DEBE A:

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
C.C: 5.594.307 DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: *ALQUILER DE OFICINA*

DESDE: *DEL 22 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.*

CON OCASIÓN: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 059 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
C.C: 5.594.307 DE BARRANCABERMEJA

Recibí
30-12-24

77

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5594307

BUSTAMANTE ROMERO
APELLIDOS

LUIS MANUEL
NOMBRES

Luis M. Bustamante
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-FEB-1979
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-MAR-1997 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2701900-59094264-M-0005594307-20020129 03548 02029A 01 118705274

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Consecutivo: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14157272511

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 5 9 4 3 0 7 — 2

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

13. [illegible]: 2 9

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 5 5 9 4 3 0 7

27. Fecha expedición: 1 9 9 7 0 3 1 3

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Santander — 6 8

30. Ciudad/Municipio: Barrancabermeja — 0 8 1

31. Primer apellido: BUSTAMANTE

32. Segundo apellido: ROMERO

33. Primer nombre: LUIS

34. Otros nombres: MANUEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Santander — 6 8

40. Ciudad/Municipio: Barrancabermeja — 0 8 1

41. Dirección: CL 63 19 17 BRR PARNASO

42. Correo electrónico: rgimbr2006@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 6 1 1 2 9 4 9

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 4 5 3 0

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 4 0 9 1 6

Actividad secundaria

48. Código: 7 4 [illegible]

49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 6 0 2

Otras actividades

50. Código — 1: — 2:

Ocupación

51. Código: 2 1 4 2

52. Número establecimientos:

Responsabilidades

53. Código: 1 2, 2 2

12-Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. Núm. de Folios: 3 — 61. Fecha: 2 0 1 1 0 8 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante:

Luis M. Bustamante
C.C. 5594307

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre: VALBUENA TORRES MARTHA LUCIA

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO SIN COSTO

1752

Yondó, Antioquia, 30 de Diciembre del 2024

MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

NIT. 900.488.751-2

DEBE A:

EDELBERTO MARTINEZ LARROTA
C.C: 91.477.925 DE BARRANCABERMEJA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: *ALQUILER DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA (COMPUTADORES, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES ETC)*

DESDE: *DEL 22 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.*


CON OCASIÓN: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 059 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

EDELBERTO MARTINEZ LARROTA
C.C: 91.477.925 DE BARRANCABERMEJA

Recibí
30-12-24

8

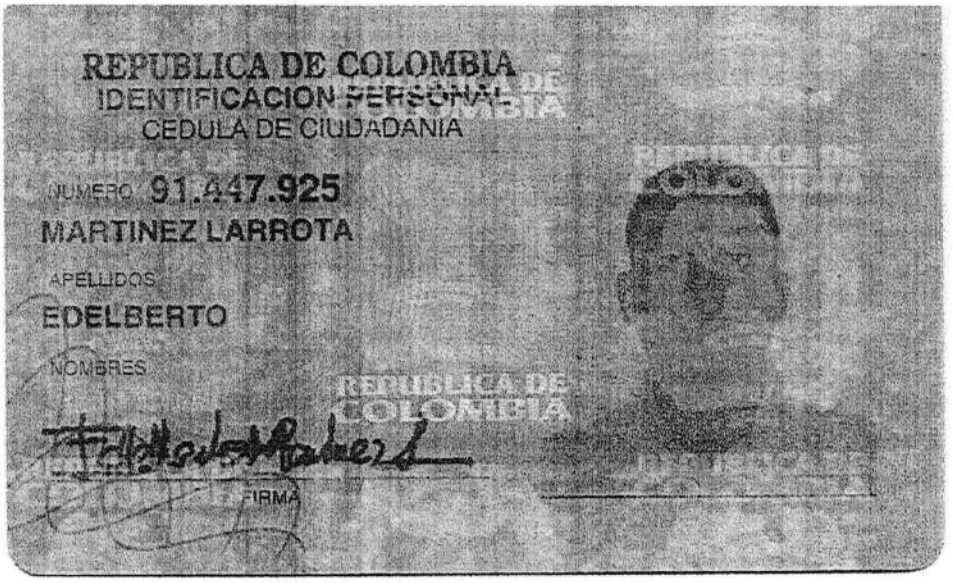

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.447.925
MARTINEZ LARROTA
APELLIDOS
EDELBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1977
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
AB+ G.S. RH
M SEXO

19-DIC-1995 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2701900-00130469-M-0091447925-20081122 0006610686A 2 7150014282

1754

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806658691

(415)7707212489984(8020) 000001480665869 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 4 4 7 9 2 5	8	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	91447925	1995 12 19

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	LARROTA	EDELBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGECADEL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CR 56 A 39 BIS 18 TO 1 AP 501 TO DEL CAMPESTRE BRR LOS FUNDADORES

42. Correo electrónico edelberto.martinez4@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 2 1 4 6 1	3 0 0 3 7 7 7 0 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1	2 0 0 6 0 1 0 2	1 8 1 1	2 0 0 6 0 1 0 2	7 7 1 0	3 1 1 8	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
.d - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 18 / 16 : 09: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ LARROTA EDELBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1755

Yondó, Antioquia, 30 de Diciembre del 2024

MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

NIT. 900.488.751-2

DEBE A:

LUIS MANUEL BUSTAMANTE VALENCIA
C.C: 1.097.182.516 DE BARRANCABERMEJA

LA SUMA DE: OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($80.200,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: *ALQUILER DE EQUIPOS Y PLANES DE COMUNICACIÓN (VOZ Y DATOS)*

DESDE: *DEL 22 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.*

CON OCASIÓN: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 059 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

Luis M. Bustamante V.
LUIS MANUEL BUSTAMANTE VALENCIA
C.C: 1.097.182.516 DE BARRANCABERMEJA

Recibí
30-12-83

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.097.182.516



Apellidos
BUSTAMANTE VALENCIA

Nombres
LUIS MANUEL

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.75	M
Fecha de nacimiento	G.S.	
04 SEPT 2004	B+	

Lugar de nacimiento
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
06 SEPT 2022, BARRANCABERMEJA

Fecha de expiración
08 SEPT 2032

Firma

.CO

003463031

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL003463031227019<<<<<<<<<<<
0409049M3209088COL1097182516<3
BUSTAMANTE<VALENCIA<<LUIS<MANU

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14923590578

(415)7707212489984(8020) 000001492359057 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1097182516 | 6. DV: 2 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | 13: 29 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1097182516	20220906

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Santander 68	Barrancabermeja 081

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUSTAMANTE	VALENCIA	LUIS	MANUEL

Razón social

35. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Barrancabermeja 081

41. Dirección principal: CL 63 19 17 BRR EL PARNASO

42. Correo electrónico: luisbustamantevalen@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3138401153 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4390	20230630						9312	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2023-06-30 13:00:17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

1097182516

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

98. Nombre: CASTILLO RODRIGUEZ YESENIA SHIRLEY
99. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF 30-06-2023

95

1758

Yondó, Antioquia, 30 de Diciembre del 2024

MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

NIT. 900.488.751-2

DEBE A:

MARTHA ISABEL ROMERO MANRIQUE
C.C: 37.916.430 DE BARRANCABERMEJA

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL PESOS ($1.100.000,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: *ALQUILER DE CAMIONETA*

DESDE: *DEL 22 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.*

CON OCASIÓN: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 059 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

MARTHA ISABEL ROMERO MANRIQUE
C.C: 37.916.430 DE BARRANCABERMEJA

Recibí
30-12-24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 37.916.430
ROMERO MANRIQUE

APELLIDOS
MARTA ISABEL

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1956
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1976 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

NO. SERIAL

1760

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915512153

(415)7707212489984(8020) 000001491551215 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 7 9 1 6 4 3 0	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	37916430	1 9 7 6 1 1 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROMERO	MANRIQUE	MARTA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CL 63 19 17 BRR PARNASO

42. Correo electrónico martairomero@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 1 2 9 4 9	3 5 0 5 9 6 0 6 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 4 0 6 1 6	4 2 9 0	2 0 0 4 0 9 1 6	7 7 1 0	4 9 2 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2	4 9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 19 / 14 : 40: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz: en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO MANRIQUE MARTA ISABEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-05-2023 02:40:23PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

1761

Yondó, Antioquia, 30 de Diciembre del 2024

MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

NIT. 900.488.751-2

DEBE A:

FABIAN OSWALDO PEREZ REY
C.C: 13.873.157 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: *EDICION DE INFORMES INCLUYE FOTOGRAFIAS, PAPELERIA, CDS, FOTOCOPIAS, PRESENTACIONES.*

DESDE: *DEL 22 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.*

CON OCASIÓN: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 059 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

Fabian O Perez

FABIAN OSWALDO PEREZ REY
C.C: 13.873.157 DE BUCARAMANGA

Recibí
30-12-24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13873157

PEREZ REY
APELLIDOS

FABIAN OSWALDO
NOMBRES

Fabian Perez R
FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1981
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.87 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-NOV-1999 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS ESCOBAR

INDICE DERECHO



F-2700100-70078038-M-0013873157-20000330 03067 00268A 01 087006945

1763

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14449330228

(415)7707212489984(8020) 000001444933022 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 8 7 3 1 5 7	0	Impuestos de Medellín 11	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1 3 8 7 3 1 5 7	1 9 9 9 1 1 1 1

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Santander 68	Bucaramanga 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	REY	FABIAN	OSWALDO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Yondó 893

41. Dirección principal: CR 55 A 46 B 06 BRR COLONIA SUR

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ingfabianperezrey@gmail.com		6426577	3183955669

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	20050519	4210	20050519	4220	7110	2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	9	5	11	22																						

09- Retención en la fuente en el impuesto
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2018 02 07

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PEREZ REY FABIAN OSWALDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-02-2018 03:14:53PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

91

1764

Factura Electrónica de Venta No

FEFE133617

Fecha Validación DIAN: 2024-12-28 16:40:12
Fecha Emisión: 2024-12-28 16:40:11

VICTOR RAUL CASTRO MEJIA

ESTACION DE SERVICIO EL FERROCARRIL

NIT: 13716890-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074111496 de 2024-07-02
De FEFE-1 A FEFE-5000000 - Desde: 2024-07-02 Hasta: 2026-07-02
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
Carrera 23 No 50-38
Barrancabermeja - Santander - Colombia
Telefono: 3138299107
E-mail: admoncastroserrano@hotmail.com

CC o NIT: 900488751 - 2
Cliente: MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Dirección:
Ciudad:
Telefono:
E-mail: MBSERVICIOSDEINGENIERIASAS@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	C1	CORRIENTE	5,16	galón	15,490	0	0	80,000	80,000			80,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	80,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	80,000
Impuestos:	
Total Factura:	80,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:
ORDEN DE VENTA: 19017-EQUIPO 2

SON: OCHENTA MIL COP

Firma Digital:

ol9hCzjuUU1oAQ1p+3qj5DOfmHiroo8zVp74xCDKklyq5zBTAgLWX3G0bM1ESsCMygxx0CXTif3AXlmKv0lW1RFrsp2qeoSeuA1xHx7nrUpO2AVEzTlGZaWLcteHJ1nIBSlAFuCpD9H2ARck
ULkimgwtiygIVsFeAhzTLUTWBXXal0ok5qAhHUKjF6lU9vsokEV8/3O3IwDKlQXlgO/BMwA+AV1Ttq5zwHmsyxdpQ693qMk4zcLPBfhQR6GdOPssPbES2qNVMB5ZkMKAXdD01T1JMreKye
+ofbrpH0S1WCp4k7TN9zBs3yKMpPDQYBcpMMjUyiCptyE3MnMggMRleg==

92

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

PAZ Y SALVOS DEL PERSONAL

PAZ Y SALVO

YO, **LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO** Cédula de ciudadanía número No. 5.594.307 de Barrancabermeja hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
C.C. No. 5594307 Barb

PAZ Y SALVO

YO, **DAYANNA MEDINA MUÑOZ** Cédula de ciudadanía número No. 1,042,213,706 de Yondo, Antioquia hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

DAYANNA MEDINA MUÑOZ
C.C. No. 1042213706

PAZ Y SALVO

YO, **JOAQUIN ORTIZ CAMACHO** Cédula de ciudadanía número No. 91,229,547 de Bucaramanga hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

JOAQUIN ORTIZ CAMACHO
C.C. No. 91 229 547

1769

PAZ Y SALVO

YO, **JHOAN ARNALDO RODRIGUEZ ATENCIA** Cédula de ciudadanía número No. 1,042,212,332 de Yondo Antioquia hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

JHOAN ARNALDO RODRIGUEZ ATENCIA
C.C. No. 1042212332

97

PAZ Y SALVO

YO, **CINDI RODRIGUEZ PACHECO** Cédula de ciudadanía número No. 1,042,211.909 de Yondo Antioquia hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

Cindi Rodriguez P

CINDI RODRIGUEZ PACHECO
C.C. No. 1042211909

PAZ Y SALVO

YO, **MIRIAM RODRIGUEZ PACHECO** Cédula de ciudadanía número No. 1,042,212,722 de Yondo Antioquia hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

MIRIAM RODRIGUEZ PACHECO
C.C. No. 1042212722

1772

PAZ Y SALVO

YO, **KAREN MARGARITA ALMENDRALES BARRAGAN** Cédula de ciudadanía número No. 1,096,215,798 de Barrancabermeja hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como empleador del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, prima legal, auxilio de transporte, y en general, todo concepto legal o extralegal relacionado con salarios, prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. Que no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador relacionada con el contrato de trabajo.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

Karen Almendrales

KAREN MARGARITA ALMENDRALES BARRAGAN
C.C. No. 1092157988

100

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

PAZ Y SALVO PROVEEDORES

Calle 63 No 19-17 Barrio Pamaso - Móvil: 311 214 8798 - contacto@mbservingenieria.com - Barrancabermeja / Santander / Colombia

PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES

YO, **MARTHA ISABEL ROMERO MANRIQUE** Cédula de ciudadanía número No. *37.916.430* de Barrancabermeja hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como ejecutor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes por concepto de:

ALQUILER DE CAMIONETA desde el 31 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, por lo tanto, el contrato que ha quedado extinguido.

2. Que, no obstante, la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que se acordó y se cumplió, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato que ha quedado terminado; por consiguiente, esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación comercial que existió entre el contratante y el proveedor relacionado con el contrato comercial.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

MARTHA ISABEL ROMERO MANRIQUE
C.C. No. 37916430

PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES

YO, **EDELBERTO MARTINEZ LARROTA** Cédula de ciudadanía número No. *91.477.925* de Barrancabermeja hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como ejecutor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes por concepto de:

ALQUILER DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA (COMPUTADORES, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES ETC) desde el 31 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, por lo tanto, el contrato que ha quedado extinguido.

2. Que, no obstante, la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que se acordó y se cumplió, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato que ha quedado terminado; por consiguiente, esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación comercial que existió entre el contratante y el proveedor relacionado con el contrato comercial.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

EDELBERTO MARTINEZ LARROTA
C.C. No. 91477925

PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES

YO, **LUIS MANUEL BUSTAMANTE VALENCIA** Cédula de ciudadanía número No. *1.097.182.516* de Barrancabermeja hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como ejecutor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes por concepto de:

ALQUILER DE EQUIPOS Y PLANES DE COMUNICACIÓN (VOZ Y DATOS) desde el 31 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, por lo tanto, el contrato que ha quedado extinguido.

2. Que, no obstante, la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que se acordó y se cumplió, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato que ha quedado terminado; por consiguiente, esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación comercial que existió entre el contratante y el proveedor relacionado con el contrato comercial.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

LUIS MANUEL BUSTAMANTE VALENCIA
C.C. No. 1097182516

PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES

YO, **LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO** Cédula de ciudadanía número No. 5.594.307 de Barrancabermeja hago constar expresamente lo siguiente:

1. Que la empresa **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS con** Nit. 900.488.751-2 como ejecutor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 059-2024 " INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N°CD014-2024.",** a entregado la totalidad de los valores correspondientes por concepto de:

Alquiler de oficina desde el 31 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, por lo tanto, el contrato que ha quedado extinguido.

2. Que, no obstante la presente declaración se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que se acordó y se cumplió, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato que ha quedado terminado; por consiguiente esta transacción tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación comercial que existió entre el contratante y el proveedor relacionado con el contrato comercial.

Quedando a PAZ y SALVO por dichos conceptos.

Firmo a los Quince (15) días del mes de enero del 2025.

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
C.C. No. 5594307 Bga

ACTA DE RECIBO FINAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024

EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

$4,899,773,634,15

SALUPAISMA S.A.S

MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.AS

DEL 22/12/2024 AL 30/12/2024

FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FINAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 10,00%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 100%

Diciembre del año 2024 se reunieron: CARLOS ENLIO DIAZ TOVAR Representante legal del Contratista, LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO Representante legal de Interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

l de material que se encuentre idéicos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.151.175,00	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	3.135.086.707,50	$ 348.342.967,50	$ 3.483.429.675,00	-	$ -
el Area a Intervenir (incluye ento al avance en la ejecución final de Las Áreas a	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.850,00	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00	36.751,50	4.083,50	40.835,00	171.850.014,00	$ 19.094.446,00	$ 190.944.460,00	-	$ -
a Puntos Previamente r Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	1.512,00	168,00	1.680,00	111.510.000,00	$ 12.390.000,00	$ 123.900.000,00	-	$ -
TOS	-	-	-	$ 2.958.797.036,00	-	-	$ 3.798.274.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		14%		$ 710.111.288,40			$ 911.585.792,40				3.418.446.721,50	$ 379.827.413,50	$ 3.798.274.135,00	-	-
		%		$ -			$ -				820.427.213,16	$ 91.158.579,24	$ 911.585.792,40	$ -	-
TOS		5%		$ 147.939.651,75			$ 189.913.706,75				-	$ -	$ -	$ -	-
ADO 50%				$ 3.816.848.175,15		1.082.925.459,00	$ 4.899.773.634,15				170.922.336,08	$ 18.991.370,67	$ 189.913.706,75		-
				$ 1.908.424.087,58			$ 2.449.886.817,08				4.409.796.270,74	$ 489.977.363,41	$ 4.899.773.634,15	$ -	-
											2.449.886.817,08		$ 2.449.886.817,08	$ -	-
											1.959.909.453,66	$ 489.977.363,41	$ 2.449.886.817,07		

HENTA Y NÚEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

la de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
en la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron.

DIAZ TOVAR
DEL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
SUPERVISOR
AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

Holzarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.P. informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el contratista, realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte de la interventoría

SIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900904251	7	SALUPAISMA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 18 # 56-57 BARRIO PUEBLO NUEVO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6026075	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1226605480	9480955862	E	2025/01/15	2025/01/29	BANCO DE BOGOTA	14	$166,668,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Irg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																								$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
SUCURSAL: 01 (317 Afiliados)																								$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (317 Afiliados)																								$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (317 Afiliados)																								$510,197,400	$81,776,500			$544,917,248	$22,925,400			$544,943,010	$21,804,400			$547,517,248		$38,054,300		$13,199,097	$660,000		$165,220,600
1	CC	1096229965	ACONCHA NIETO LUIS FERNANDO		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
2	CC	1096253602	AGREDO AYALA MARIA ALEJANDRA		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
3	CC	1193413272	AGUDELO GARCIA JULIANA ANDREA		X							X										25-14	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
4	CC	1096211787	AGUDELO VALENCIA YURLADIS MILENA		X							X										23100 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS005	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
5	CC	15452500	AGUILAR CARRILLO LUIS FERNANDO		X							X										23100 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
6	CC	1096248472	AGUIRRE POVEDA KELI SOLANYI		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
7	CC	1118546237	ALFONSO TORRES ROSA MARITZA		X							X										23030 1	30	$1,769,596	$283,200	EPS005	30	$1,769,596	$70,800	CCF40	30	$1,769,596	$70,800	14-4	30	$1,769,596	6.960%	$123,200	30	$0	$0	SI	$548,000
8	CC	21950243	AMAYA MARIN NEREIDA	X	X							X										23030 1	30	$1,499,097	$239,900	EPS037	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
9	CC	91440800	ANAYA PEREZ LEON JULIO		X							X										23030 1	30	$1,779,652	$284,800	EPS041	30	$1,779,652	$71,200	CCF40	30	$1,779,652	$71,200	14-4	30	$1,779,652	6.960%	$123,900	30	$0	$0	SI	$551,100
10	CC	1042214005	ANTOLINEZ BENAVIDES ERIKA TATIANA		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS037	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
11	CC	28020339	APARICIO RINCON SANDRA MILENA	X	X							X										23030 1	30	$1,499,097	$239,900	EPS002	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
12	CC	1096248599	APONTE HERNANDEZ AURA DAHYANA		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
13	CC	1039702224	ARANGO VASQUEZ LILI		X							X										23030 1	30	$1,709,314	$273,500	EPS040	30	$1,709,314	$68,400	CCF40	30	$1,709,314	$68,400	14-4	30	$1,709,314	6.960%	$119,000	30	$0	$0	SI	$529,300
14	CC	1042212453	ARCE CERVERA NORIDA MILEDYS		X							X										23020 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
15	CC	1096228829	ARIAS CASTAÑEDA NEDER YEVENIS		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS041	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
16	CC	1042214382	ARRIETA RIVAS PAULA ANDREA		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS017	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200
17	CC	71185259	AVENDAÑO JOSE DE JESUS	X	X							X										25-14	30	$1,499,097	$239,900	EPS041	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
18	CC	21950613	BALLESTEROS MORALES OLGA	X	X							X										23030 1	30	$1,499,097	$239,900	EPS040	30	$1,499,097	$60,000	CCF40	30	$1,499,097	$60,000	14-4	30	$1,499,097	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
19	CC	1042210587	BEDOYA PEREZ LILIANA ANDREA		X							X										23030 1	30	$1,640,915	$262,600	EPS037	30	$1,640,915	$65,700	CCF40	30	$1,640,915	$65,700	14-4	30	$1,640,915	6.960%	$114,300	30	$0	$0	SI	$508,300
20	CC	1042210357	BELEÑO RODRIGUEZ DIEGO		X							X										23030 1	30	$1,779,652	$284,800	EPS040	30	$1,779,652	$71,200	CCF40	30	$1,779,652	$71,200	14-4	30	$1,779,652	6.960%	$123,900	30	$0	$0	SI	$551,100
21	CC	1063959626	BELTRAN LOPEZ LUIS FELIPE		X							X										23100 1	30	$2,327,438	$372,400	EPS040	30	$2,327,438	$93,100	CCF40	30	$2,327,438	$93,100	14-4	30	$2,327,438	6.960%	$162,000	30	$0	$0	SI	$720,600
22	CC	10157106	BENAVIDES EFRAIN																	X			0	$0	$0	EPS040	3	$130,000	$5,200	CCF40	0	$0	$0	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$5,200
23	CC	10157106	BENAVIDES EFRAIN		X							X											0	$0	$0	EPS040	27	$1,659,711	$66,400	CCF40	27	$1,659,711	$66,400	14-4	27	$1,659,711	6.960%	$115,600	27	$0	$0	SI	$248,400
24	CC	17370023	BENAVIDES ORTEGA VICENTE ESCOLASTICO		X							X											0	$0	$0	EPS017	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$267,800
25	CC	91445624	BENAVIDES JARAMILLO YIMI ROY		X							X										23030 1	30	$1,949,886	$312,000	EPS040	30	$1,949,886	$78,000	CCF40	30	$1,949,886	$78,000	14-4	30	$1,949,886	6.960%	$135,800	30	$0	$0	SI	$603,800
26	CC	1042211341	BERMUDEZ BOHORQUEZ YARILUZ		X							X										23030 1	30	$1,789,711	$286,400	EPS040	30	$1,789,711	$71,600	CCF40	30	$1,789,711	$71,600	14-4	30	$1,789,711	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,200

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900904251	7	SALUPAISMA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CARRERA 18 # 56-57 BARRIO PUEBLO NUEVO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6026075	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1226605480	9480955862	E	2025/01/15	2025/01/29	BANCO DE BOGOTA	14	$166,668,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				295	$81,776,500	$716,200	$0	$82,492,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$4,955,700	$43,400	$0	$4,999,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$7,599,800	$66,600	$0	$7,666,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	229	$63,515,900	$556,200	$0	$64,072,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$5,705,100	$50,000	$0	$5,755,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				317	$38,054,300	$333,200	$0	$38,387,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	317	$38,054,300	$333,200	$0	$38,387,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				317	$21,804,400	$191,000	$0	$21,995,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	317	$21,804,400	$191,000	$0	$21,995,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				315	$22,925,400	$201,400	$0	$23,126,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,000	$600	$0	$60,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$446,400	$4,000	$0	$450,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$600	$0	$60,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,123,700	$9,900	$0	$1,133,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$71,600	$700	$0	$72,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$112,000	$1,000	$0	$113,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	82	$5,503,900	$48,200	$0	$5,552,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,551,300	$13,600	$0	$1,564,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$699,400	$6,200	$0	$705,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$891,600	$7,900	$0	$899,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	158	$12,405,500	$108,700	$0	$12,514,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$396,000	$3,500	$0	$399,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$396,000	$3,500	$0	$399,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,000	$2,400	$0	$266,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$264,000	$2,400	$0	$266,400
TOTAL				317	$165,220,600	$1,447,700	$0	$166,668,300

1734
