SALUPAISMA S.A.S
NIT 900904251 - 7

INFORME No. 02 DE AVANCE DE OBRA

ESTADO TECNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA No. 058– 2024 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 058 DE 2024.

CONTRATISTA DE OBRA:
SALUPAISMA S.A.S

INTERVENTORIA:
MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

CONTRATANTE:
AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P

PERIODO DEL INFORME:
DEL 1 AL 21 DE DICIMEBRE DE 2024

YONDO, ANTOQUIA DICIEMBRE DE 2024

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION

2 ALCANCE

3 OBJETIVOS

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
4.2 CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
4.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
4.5 INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO.

5 ANEXOS

5.1 FORMATO F-GPI-SIN-34 INFORME EJECUTIVO MENSUAL.
5.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE INTERVENTORÍA (F-GPI-SIN-29).
5.3 LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

6 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
6.2 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL (F-GPI-SIN-16).
6.3 MEMORIAS DE CÁLCULO (F-GPI-SIN-38)

7 CONTROL DE CALIDAD.

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
7.2 CONTROL DE EQUIPOS (F-GPI-SIN-13).
7.3 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (F-GPI-SIN-14).
7.4 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (F-GPI-SIN-10).

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS.

8.1 PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO
8.2 PERSONAL DE OBRA.
8.3 HOJAS DE VIDA.
8.4 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.
8.5 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
8.6 ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

9 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
9.2 ACTAS DE VECINDAD

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
10.2 ACTAS SUSCRITAS.
10.3 RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES
10.4 CONTROL DE GARANTÍAS.
10.5 CONTROL DE PAGOS PARAFISCALES.
10.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO (F-GPI-SIN-21).
10.7 REGÍSTRO DIARIO DE OBRA (BITÁCORA).

OBSERVACIONES A LA EJECUCCION DEL PROYECTO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

1 INTRODUCCION

La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, desde hace tiempo inicio un proceso de transformación social y económica, con lo cual busca consolidar un Municipio con equilibrio social y desarrollo sostenible, donde prime la inclusión y las oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos sus habitantes.

Entendiendo que el bienestar de tener fuentes hídricas limpias y sin focos de contaminación es un derecho porque el agua ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana y en el entorno de todo ser humano, adulto o niño se resalta la importancia de crear y/o emprender proyectos, programas y políticas públicas encaminadas a brindar dicho servicio especial, de establecer acciones eficientes que mitiguen la dificultades y necesidades que aquejan a la población más vulnerables, y de generar proyectos de gran magnitud e inversión que propendan por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Yondó.

Para ello, el Municipio de Yondó, trazó en su plan de desarrollo una serie de actividades que buscan dar los primeros pasos para emprender dicho proceso y establecer una ruta que logre mitigar dicha falencia y mejorar esta situación a la población del Municipio de Yondó volviendo a sus habitantes productivos e inculcando el cuidado de sus fuentes hídricas.

Con base en lo mencionado y como solución propuesta a mejorar la condición o ambiente de salubridad que padecen los habitantes, se da inició la ejecución del contrato de obra 058 del 2024, celebrado entre la empresa **SALUPAISMA S.A.S** y el la empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.,** cuyo objeto es la **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024**, por un valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE** con un plazo de 02 meses partir de la suscripción del acta de inicio, donde se busca dar cobertura a las principales fuentes hídricas del municipio.

De la misma forma La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P**, a través de un PROCESO DE INVITACION A COTIZAR adjudico a **MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** el Contrato de

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024." para realizar las actividades de Interventoría por un valor de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($188.260.380,00) M/CTE** con un plazo de 02 meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

Al ejecutarse el 90% del valor contractual en el primer mes de ejecución se observó la necesidad de adicionar recursos para ampliar el alcance del contrato de obra por lo cual surgió el Otro Si No 3 el cual adiciono $1.082.925.459,00.

En este sentido el siguiente informe describe las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales realizadas por partes intervinientes en el proyecto para el periodo del 1 al 21 de diciembre de 2024.

Dentro de las principales actividades de este periodo tenemos:

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos.
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo.

2 ALCANCE

El presente informe tiene como alcance establecer el estado físico y financiero de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 del contrato de Obra **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024".**


Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

3 OBJETIVOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento claro y efectivo de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecución.
- ✓ Cuantificar el costo de las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo de corte.

4 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO.

4.1 Localización del Proyecto



Localización General, Municipio Yondó, Antioquia

Año de constitución	1978
Inauguración como municipio	1 enero de 1979
Ordenanza departamental	N° 38 del 23 de noviembre de 1978
Primer Alcalde	Rubén Darío Arango Vélez
Primera empresa	Shell filial de la Royal Duech de Holanda
Primeros pobladores	Indígenas de la etnia Yariguies.

El municipio de Yondó se encuentra localizado en la zona Nororiente del departamento de Antioquia, dentro de la región denominada del Magdalena Medio Antioqueño en la República de Colombia a los 7° 06´ 24" latitud Norte y a los 74° 52´ 46" Longitud Occidental, a una altura promedio de 80 M.S.N.M, con una temperatura promedio de 28°C (fuente Atlas regional Andino IGAC).

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

El casco urbano está situado sobre una llanura aluvial del Río Magdalena entre las cordilleras Central y Oriental, en terrenos muy bajos e inundables formando depresiones pantanosas o anegadas, las cuales han sufrido procesos de relleno con tierra, material conglomerado, arena y material de sedimentación.

El Municipio de Yondó, presenta en las zonas altas unos suelos ácidos y levemente erosionados, con baja fertilidad clasificados por el ICA como Eutropets de pobre evolución y en las zonas bajas unos suelos de fertilidad moderada clasificados por el ICA como Fluvaquents; pero con problemas de drenaje debido a las bajas pendientes, lo cual permite que el agua se estanque fácilmente en épocas de lluvia por el desbordamiento de los ríos.

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo segundo establece los fines esenciales del estado, entre los cuales se encuentran servir a la comunidad y promover la prosperidad en general. De él se deriva la gestión administrativa que debe cumplirse en los términos del Art. 209 de la Carta Magna; de igual forma en el Articulo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; atendiendo a esta aseveración, se hace necesario el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos educativos con los que cuenta el municipio garantizando de este modo ambientes propicios que reúnan las condiciones necesarias para atender y garantizar la permanencia de los estudiantes.

El Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo vigente fueron diseñados para atender las expectativas y demandas más sentidas por los habitantes del Municipio de Yondó.


Uno de los principales sectores a fortalecer es el saneamiento básico, la administración municipal, a través de La Empresa **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P** tiene como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así como el mantenimiento y cuidado de los sistemas hídricos del municipio.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024**". Se encuentra ubicado en el Municipio de Yondo en el departamento de Antioquia, este municipio tiene una extensión aproximada de 1.881 kilómetros cuadrados. Para el presente contrato se realizará la vigilancia y control en el corregimiento san miguel del tigre caño agrio, caño colector en sus diferentes sectores como lo son vereda la cóndor, barrio el progreso, barrio la victoria, barrio brisas del oriente y barrio 3 de octubre, además de intervenir en sector de la bocatoma en la laguna del miedo posteriormente se adiciono caño carmelitas.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Municipio de YONDO
Departamento de ANTIOQUIA

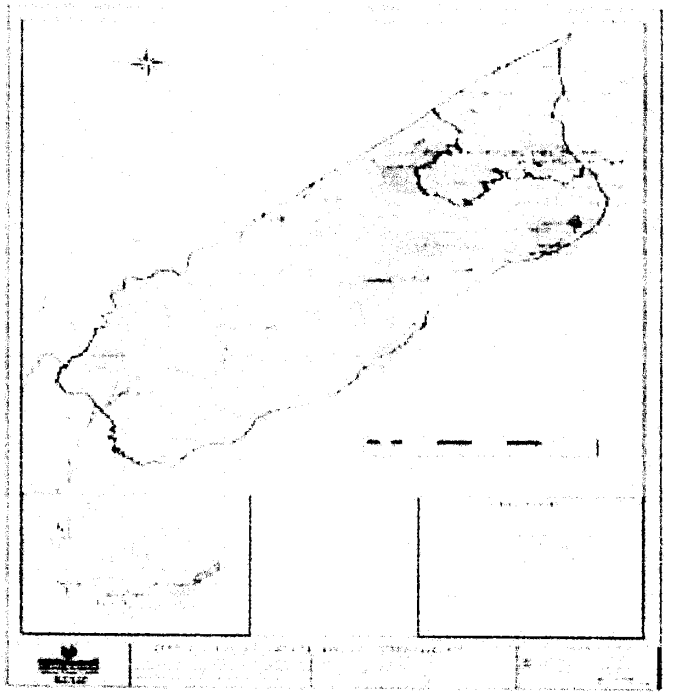

4.2 Condiciones Técnicas del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo el mantenimiento y cuidado de los cuerpos hídricos en el municipio de Yondó, Antioquia

A continuación, se muestran las actividades inicialmente contratadas del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M.L	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00
2	Localizacion y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir)	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00
3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.481,06	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00
				TOTAL PRODUCTO 1:	**$ 2.958.797.035,00**
				TOTAL EJECUCION	**$ 2.958.797.035,00**
				ADMINISTRACIÓN 24,0%	**$ 710.111.288,40**
				UTILIDAD 5,0%	**$ 147.939.851,75**
				TOTAL VALOR CONTRATO DE OBRA:	**$ 3.816.848.175,15**

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Se realizo el otro Si No 3 adicionando un valor de $1.082.925.459,00 dando como nuevo valor del contrato $ 4.899.773.634,15 y actualizando cantidades de la siguiente forma:

1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos	M2	40.835,00	$	85.305,00	$ 3.483.429.675,00
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$	4.676,00	$ 190.944.460,00
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$	73.750,00	$ 123.900.000,00
					TOTAL PRODUCTO 1:	$ *3.798.274.135,00*
					TOTAL EJECUCION	$ *3.798.274.135,00*
					ADMINISTRACIÓN 24,0%	$ *911.585.792,40*
					UTILIDAD 5,0%	$ *189.913.706,75*
					TOTAL COSTO OBRA FISICA:	$ *4.899.773.634,15*

4.3 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del proyecto se mantuvo de Dos (02) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Aprobación de Garantía Única, expedición del Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio).

4.4 Antecedentes del Proyecto.

El municipio de Yondó se encuentra sobre la margen izquierda del rio Magdalena en su región media, a su vez cuenta con una amplia variedad de recursos hídricos que hacen parte de la cuenca de este importante cauce, estos cuerpos de agua se han visto afectados en gran medida por la acción antrópica de comunidades que se han asentado en sus periferias y la expansión de las fronteras agrícolas de estas áreas.

Toda la región Este del municipio de Yondó presenta un área superficial considerable de espejos de agua que son alimentados por la presencia del río Magdalena, estos complejos Cenagosos son a su vez hábitats de diferentes tipos de especies de animales y plantas la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de obras ilegales no autorizadas de canalización, taponamientos y desvíos de caños y/ o afluentes y la alta presencia de vegetación flotantes y otro tipo de residuos orgánico e inorgánicos sobre sus aguas.

El contexto territorial del Municipio de la referencia presenta un área superficial considerable de espejos de agua alrededor de 263 humedales que en su mayoría bifurcan sus aguas a la cuenca del río Grande de la Magdalena, estos complejos Cenagosos son a su vez hábitats de diferentes

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

tipos de especies de animales acuáticos como el manati (Trichecus Manatus), bocachico Prochilodus magdalenae, bagre rayado Pseudoplatystoma fasciatum, doncella Pseudoplatystoma fasciatum, blanquillo Sorubim cuspicaudus , mojarra crilla Caquetaia kraussii (=Petenia kraussii) , pacora Plagioscion magdalenae (=P. surinamensis) dorada Brycon sinuensis, barbudo Polynemidae, y plantas comoroble Quercus robur, Orejero Enterolobium cyclocarpum, campano Albizia saman, árbol del pan Artocarpus altilis , a, abarco Cariniana pyriformis, caoba Swietenia, solera Cordia gerascanthus, Zapan entre otros la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de obras ilegales no autorizadas de canalización, taponamientos y desvíos de caños y/ o afluentes y la alta presencia de vegetación flotantes y otro tipo de residuos orgánico e inorgánicos sobre sus aguas

Las subcuencas del colector Shell y Caño La Rompida pertenecen a estas áreas que tienen contacto directo con el río Magdalena, estas cuentan con una serie de cuerpos hídricos que van desde ciénagas hasta caños o brazos del río que tienden a funcionar como aliviaderos en periodos de invierno y crecientes de este, situación que beneficia en gran medida a los pobladores de estas zonas.

La subvaloración y la falta de gestión ambiental frente a los recursos naturales en el territorio de Yondó a través del tiempo, ha venido generando el deterioro paulatino del ecosistema hídrico y sus componentes asociados como el suelo, el aire, la fauna y la flora silvestre, debido a los vertimientos de aguas residuales domésticas y a la inadecuada disposición de residuos sólidos. Lo anterior contribuye al crecimiento de plantas invasoras causante de la perdida de espejos de agua y reducen la demanda de oxígeno disuelto DBO5, PH, OD, como factores preponderantes para el desarrollo de la vida ictiológica.

La importancia de los humedales no solo radica en la función reguladora de flujos hídricos son también un soporte esencial para desarrollo de la vida de múltiples especies lo cual representa un servicio ambiental directo para la sociedad en términos de Alimentación, control de inundaciones, retienen sedimentos, controla la erosión, contribuyen a la recarga y descarga de acuíferos y pueden contribuir a la estabilización micro climática, por el aumento en las cuencas hidrográficas, y como espacios para la conservación de la biodiversidad, siendo además importantes para el desarrollo de una identidad cultural regional y un sentido de pertenencia.

El Estado Colombiano ha asignado funciones a los municipios, en torno a la protección de los recursos naturales y la gestión de los ecosistemas, a través de estrategias de conservación de la biodiversidad y de la creación de áreas protegidas de carácter regional.

Así mismo la política nacional para Humedales interiores, que fue aprobada por el comité Nacional Rasmar del 5 de diciembre de 2001, contempla dentro de sus metas la formulación de planes de manejo ambiental para estos ecosistemas con el fin de garantizar el mantenimiento de sus características ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales.

La alta presencia de vegetación flotante y otro tipo de materiales orgánicos e inorgánicos sobre los cuerpos de aguas y canales (naturales - artificiales) da paso a la eutrofi.zación, proceso que permite la proliferación de todo tipo de algas acuáticas que a su vez impide el ingreso de la luz a las zonas bajas de los cuerpos de agua mayormente, disminuyendo de esta manera la cantidad de oxígeno necesario para la eliminación de los desechos orgánicos, esto sumado al bajo intercambio de sus aguas por manipulación de los flujos hídricos están permitiendo la acumulación excesiva de materia orgánica en diferentes zonas. Por lo anterior, se hace necesario realizar las obras para el retiro, limpieza y disposición de este material de cada uno de los canales y superficie de cuerpos hídricos de agua para su recuperación y permitir que se surtan los diferentes procesos biológicos en su interior que brinden unas condiciones óptimas para el desarrollo de la vida acuática y mejore la calidad del agua.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

Debido al estado actual de las Ciénagas y su importancia como hábitat natural de diversas especies de animales e incluso fuente de recursos para pobladores de esta región del Municipio de Yondó, se hace necesario realizar acciones para su protección y restablecimiento de este mediante el mejoramiento de su conectividad hídrica que permita el intercambio de aguas y nutrientes necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos biológicos al interior de esta. De tal forma que se plantea realizar actividades por medio del retiro de material vegetal de retiro de material y su disposición final para su posterior manejo.

La limpieza de los complejos cenagosos, canales y caños colectores del municipio de Yondó es esencial para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales de las zonas. así como para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad de la región.

La proliferación de microorganismos y algas en la ciénaga puede causar un desequilibrio ecológico y afectar la calidad del agua de varias maneras.

En primer lugar, la abundancia de microorganismos y algas puede consumir gran parte del oxigeno disuelto en el agua, lo que puede llevar a la muerte de organismos acuáticos que dependen de él para respirar. Esto puede generar una disminución significativa en la biodiversidad de las zonas y afectar el equilibrio ecológico.

Además, algunos tipos de algas pueden producir toxinas que son perjudiciales para la salud de los seres humanos y animales que utilizan el agua de las ciénagas y los canales para sus actividades diarias. Estas toxinas pueden acumularse en los tejidos de los organismos acuáticos y representar un riesgo para la salud de las personas que los consumen.

La proliferación de microorganismos y algas también puede disminuir la transparencia del agua, lo que afecta la penetración de la luz solar y reduce la capacidad de las plantas acuáticas para realizar la fotosíntesis. Esto puede afectar el equilibrio ecológico de la zona, ya que muchas especies de animales dependen de las plantas acuáticas para su alimentación y refugio.

En resumen, la proliferación de microorganismos y algas puede tener efectos negativos en el equilibrio ecológico y la calidad del agua de las ciénagas y los diferentes cuerpos de agua, y es importante tomar medidas para prevenir su crecimiento excesivo y controlar su presencia en las zonas.

La necesidad de limpieza de estas ciénagas y canales surge como una medida para revertir los efectos negativos y recuperar su equilibrio ecológico.

La realización de mantenimiento de cuencas hidrográficas y de caños colectores con sus vertientes es esencial para garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, debido a varios factores clave:

- Conservación de la calidad del agua: La vegetación de las cuencas actúa como un filtro natural, reteniendo sedimentos y contaminantes que pueden afectar la pureza del agua. Esto reduce los costos de tratamiento para el consumo humano.
- Regulación del ciclo hidrológico: Un manejo adecuado permite la regulación del flujo de agua, evitando la escasez en épocas secas y las inundaciones en temporadas lluviosas. Esto facilita un suministro constante y confiable de agua potable.
- Los caños colectores y sus vertientes cumplen un papel importante en la recolección y conducción de aguas pluviales y residuales. Su mantenimiento, como la limpieza regular y la gestión de desechos, previene la acumulación de basura y sustancias tóxicas, que podrían contaminar tanto las fuentes de agua potable como los cuerpos de agua circundantes.

En resumen, el mantenimiento adecuado de cuencas hidrográficas y caños colectores no solo es vital para garantizar la disponibilidad de agua potable de calidad, sino que también facilita la gestión de residuos y la infraestructura de alcantarillado, protegiendo el medio ambiente y la salud pública.

Por lo tanto, es fundamental realizar una limpieza y mantenimiento exhaustivos para eliminar no solo los obstáculos y residuos acumulados al interior de los mismos sino también para reducir los

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

riesgos de eutrofización, asegurando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema hidráulico y minimizando el impacto ambiental negativo en la región.

El mantenimiento y limpieza de los canales colectores, como el canal Shell, sus vertientes y otros que conducen residuos líquidos industriales o domiciliarios, así como aguas pluviales en redes públicas es crucial para:

- Prevenir obstrucciones y garantizar las dinámicas de los flujos de agua al interior de los caños.
- Reducir el riesgo de inundaciones y daños a la infraestructura.
- Minimizar la contaminación ambiental y proteger la salud pública.
- Alargar la vida útil de la infraestructura hidráulica.
- Reducir la carga en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
- Mejorar la eficiencia en la gestión de aguas pluviales y residuales.
- Prevenir la sedimentación y acumulación de lodos y residuos.
- Disminuir los costos por tratamiento del agua para consumo humano
- Reducir riesgo de eutrofización del agua.

Realizar el mantenimiento y limpieza periódicos de estos canales:

- Evita la acumulación de residuos y reduce el riesgo de vertidos no controlados.
- Ayuda a mantener la calidad del agua en ríos, lagos y acuíferos.
- Contribuye a la protección de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos.
- Reduce los costos asociados con reparaciones y rehabilitación de la infraestructura.
- Mejora la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

4.5 Información soporte del Proyecto.

Este proyecto cuenta con los siguientes soportes técnicos:

- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.).
- ✓ Estudios Previos.
- ✓ Especificaciones Técnicas de construcción.
- ✓ Presupuesto detallado.
- ✓ Análisis de Precios Unitarios.
- ✓ Pliegos de Condiciones.
- ✓ Propuesta económica del proponente.
- ✓ Acta de adjudicación del contrato.
- ✓ Minuta de Contrato de obra.
- ✓ Aprobación de Pólizas de Garantías.
- ✓ Certificado Registro presupuestal (C.R.P.)
- ✓ Acta de inicio.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

5 Anexos

5.1 FORMATO F-GPI-SIN-34 INFORME EJECUTIVO A LA FECHA DE CORTE.

Las actas de Informe Ejecutivo Mensual (F-GPI-SIN-34), se anexan en este informe donde se refleja en un balance presupuestal el avance de la ejecución del contrato.

5.2 SEGUIMIENTO SEMANAL DE INTERVENTORÍA (F-GPI-SIN-29)

Las Actas de seguimiento semanales se envían a la supervisión donde se evidencia el control de la programación que se realiza de las actividades de Obras ejecutadas durante el periodo a cobrar, para determinar el avance o atraso del proyecto; el seguimiento Semanal se realiza con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios para evitar atrasos en el proyecto.

5.3 LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

Para el presente proyecto, no requiere ningún tipo de licencias o permisos de construcción ya que los trabajos a realizar son del tipo de mantenimiento de las estructuras y no de construcción.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	Código: F-GPI-SIN-34
	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA	Fecha de Aprobación:01/12/2014
		Versión: 1 | Página: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 DE DICIEMBRE	Y EL	21 de diciembre de 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024				
LOCALIZACIÓN	Yondo Antioquia				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	059 de 2024		CONTRATO No.:	058 de 2024	
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S	
PLAZO INICIAL:	60		PLAZO INICIAL:	60	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024	
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	60 DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	60 DIAS	
VALOR INICIAL :	$	188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$	3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):			VALOR ADICION(ES):	$	1.082.925.459,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	4.899.773.634,15
VALOR PAGADO:	$	94.130.190,00	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$	2.449.886.817,08
VALOR POR PAGAR:	$	94.130.190,00	VALOR POR PAGAR:	$	2.449.886.817,08

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA		VALOR
Cumplimiento	31/10/2024	1/07/2025	$	18.826.038,00
Salarios y prestaciones sociales	31/10/2024	31/12/2027	$	9.413.019,00
Calidad del servicio	31/10/2024	1/07/2025	$	18.826.038,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA		VALOR
Predios labores y operaciones	29/10/2024	10/01/2025	$	390.000.000,00
Cumplimiento	29/10/2024	10/07/2025	$	381.684.817,52
Pago anticipado	29/10/2024	10/07/2025	$	1.908.424.087,58
Salario y prestaciones sociales	29/10/2024	10/01/2028	$	190.842.408,76
Calidad del servicio	29/10/2024	10/07/2025	$	381.684.817,52

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR
ACTA DE AVANCE No 1	17/12/2024	$	94.130.190,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR
PAGO ANTICIPADO	4/11/2024	$	1.908.424.087,58
ACTA PARCIAL No 1	19/12/2024	$	1.526.739.270,06
PAGO ANTICIPADO DEL ADICONAL No 1	19/11/2024	$	541.462.729,50

2266

4. CURVA "S"

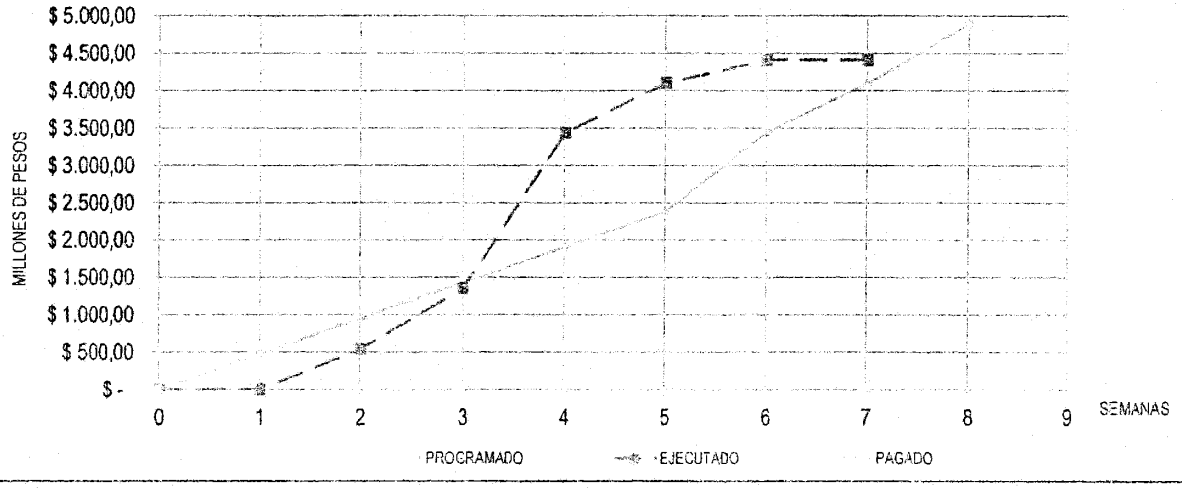

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda al contratista estar al pendiente de los elementos de protección personal y realizar una inspección previa antes de labores en los diferentes sectores de trabajo para evitar accidentes con animales de la fauna silvestre, se evidencia un pequeño adelanto en lo ejecutado del 90% del valor del contrato incluido el valor adicional recibido de $1.08.925.459,00 vs lo programado del 85%, lo que equivale a $ 4.409.796.270,74

DIRECTOR DE OBRA

6 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se presenta evidencias mediante un cuadro de actividades desarrolladas durante el periodo y acumuladas.

1.01	Realizar la limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	28.561,50	8.190,00	36.751,50	2.436.438.758,00	$ 698.647.950,00	$ 3.135.086.708,00
1.02	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$ 4.678,00	$ 190.944.460,00	28.561,50	8.190,00	36.751,50	133.553.574,00	$ 38.296.440,00	$ 171.850.014,00
1.03	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	1.269,00	252,00	1.512,00	92.925.000,00	$ 18.585.000,00	$ 111.510.000,00
									-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 3.798.274.135,00				2.662.917.331,50	$ 755.529.390,00	$ 3.418.446.722,00
	ADMINISTRACIÓN				$ 911.585.792,40				639.100.159,56	$ 181.327.053,60	$ 820.427.213,28
	IMPREVISTOS				$ -				-	$ -	$ -
	UTILIDAD				$ 189.913.706,75				133.145.866,58	$ 37.776.469,50	$ 170.922.336,10
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 4.899.773.634,15				3.435.163.357,64	$ 974.632.913,10	$ 4.409.796.271,38
AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO		50%			$ 2.449.886.817,08				1.908.424.087,58	$ 541.462.729,50	$ 541.462.729,50
VALOR A PAGAR									1.526.739.270,06	$ 433.170.183,60	$ 433.170.183,60

SEGUNDO CORTE – (01/12/2024 hasta 21/12/2024).

El día 31 de octubre del año 2024, se firma el Acta de Inicio entre las partes que intervienen en el proceso (Contratista, Interventoría y Supervisión)

Una vez firmada la Acta de Inicio, la interventoría solicito la información del proyecto, como son estudios, propuesta técnica del contratista, manual de interventoría y demás documentos soporte del contrato, esto con el fin de entrar a revisar el alcance de los trabajos e iniciar con la revisión de los diseños. Posteriormente, se inicia con el replanteo e inspección con equipos de precisión de todos los lineamientos, cotas niveles del proyecto y áreas de intervención.

Se iniciaron actividades inicialmente se realizó el levantamiento topográfico de la zona a intervenir, donde se pudieron apreciar las áreas de los caños y sus áreas de influencia.

El contratista de obra durante este segundo corte de labores realizo actividades de

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

6.2 Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal (F-GPI-SIN-16).

En el presente informe se anexa copia del acta de corte realizada conjuntamente con el contratista y con la cual realizara cobro de las actividades ejecutadas.

6.3 MEMORIAS DE CÁLCULO (F-GPI-SIN-38)

Se diligencia en este formato las medidas y localizaciones correspondientes a cada una de las actividades con el fin de realizar un control sobre las cantidades de cada actividad ejecutada del contrato a la fecha correspondiente al periodo de cobro.

7 CONTROL DE CALIDAD.

7.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

El contratista durante el periodo correspondiente al presente corte ha cumplido ejecutado las actividades de ejecución de obra donde la interventoría realiza un seguimiento riguroso de estas actividades como lo son:

- Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos.
- Localización y Replanteo del Área a Intervenir (incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
- Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo.

Todo esto se realiza bajo los lineamientos de las especificaciones técnicas y observaciones que realiza la interventoría.

7.2 Control de equipos (F-GPI-SIN-13).

En el formato F-GPI-SIN-13 se evidencia el control de equipos durante los periodos comprendidos entre el 01/12/2024 AL 21/12/2024 del presente informe de corte.

7.3 Control de Seguridad Industrial (F-GPI-SIN-14).


En el formato F-GPI-SIN-14 se evidencia el control y seguimiento de seguridad industrial durante los periodos comprendidos entre el 01/12/2024 AL 21/12/2024 del presente informe.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 2	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR: SUPERVISOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.: PERIODO:	058 DE 2024 DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,01 Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO







DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA LIMPIADA CAÑO AGRIO M2

ABSCISA	ANCHO DE CAÑO M.	PROMEDIO ANCHO M.	DISTANCIA M.	AREA M2.
K0+000	20			
		19	100	1900
K0+100	18			
		19,5	100	1950
K0+200	21			
		20,5	100	2050
K0+300	20			
		25,5	89,81	2290
K0+389,81	31			
			TOTAL	**8190 M2**


TOTAL	**9190,00**	**M2**

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO INFORME 2	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	058 DE 2024
PERIODO:	DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,02 Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO



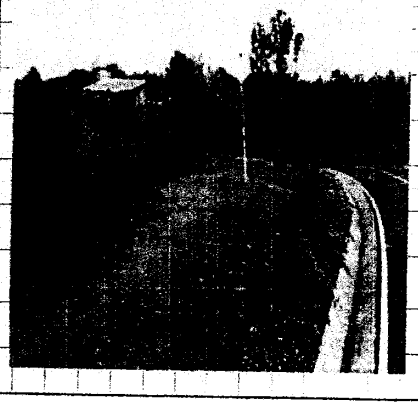

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA LIMPIADA CAÑO AGRIO M2				
ABSCISA	ANCHO DE CAÑO M.	PROMEDIO ANCHO M.	DISTANCIA M.	AREA M2.
K0+000	20			
		19	100	1900
K0+100	18			
		19,5	100	1950
K0+200	21			
		20,5	100	2050
K0+300	20			
		25,5	89,81	2290
K0+389,81	31			
			TOTAL	8190 M2


TOTAL	8190,00	M2

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR: SUPERVISOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA S.A.S JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.: PERIODO:	058 DE 2024 DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM: UNIDAD:	1,03 Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo M3

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO



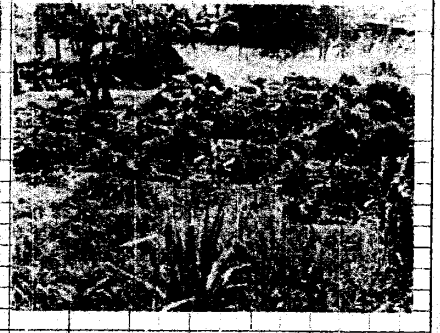

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

DIMENSIONES (Si aplica)

ABSCISA	ANCHO PROME	LONGUITUD	ESPESOR	TOTAL M3
K0+00 - K0+100	19,00	100,00	0,020	38,00
K0+100 - K0+200	19,50	100,00	0,025	48,26
K0+200 - K0+300	20,50	100,00	0,025	51,25
K0+300 - K0+389,81	25,50	89,80	0,050	114,50
				252,0

TOTAL	252,00	M3

MUNICIPIO DE YONDO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOCALIZACIÓN GENERAL

SAN MIGUEL EN LA LOMA

ABARRANCABERMEJA


Proyecto:

1277000 m.N

1013800 m.E

N

2274

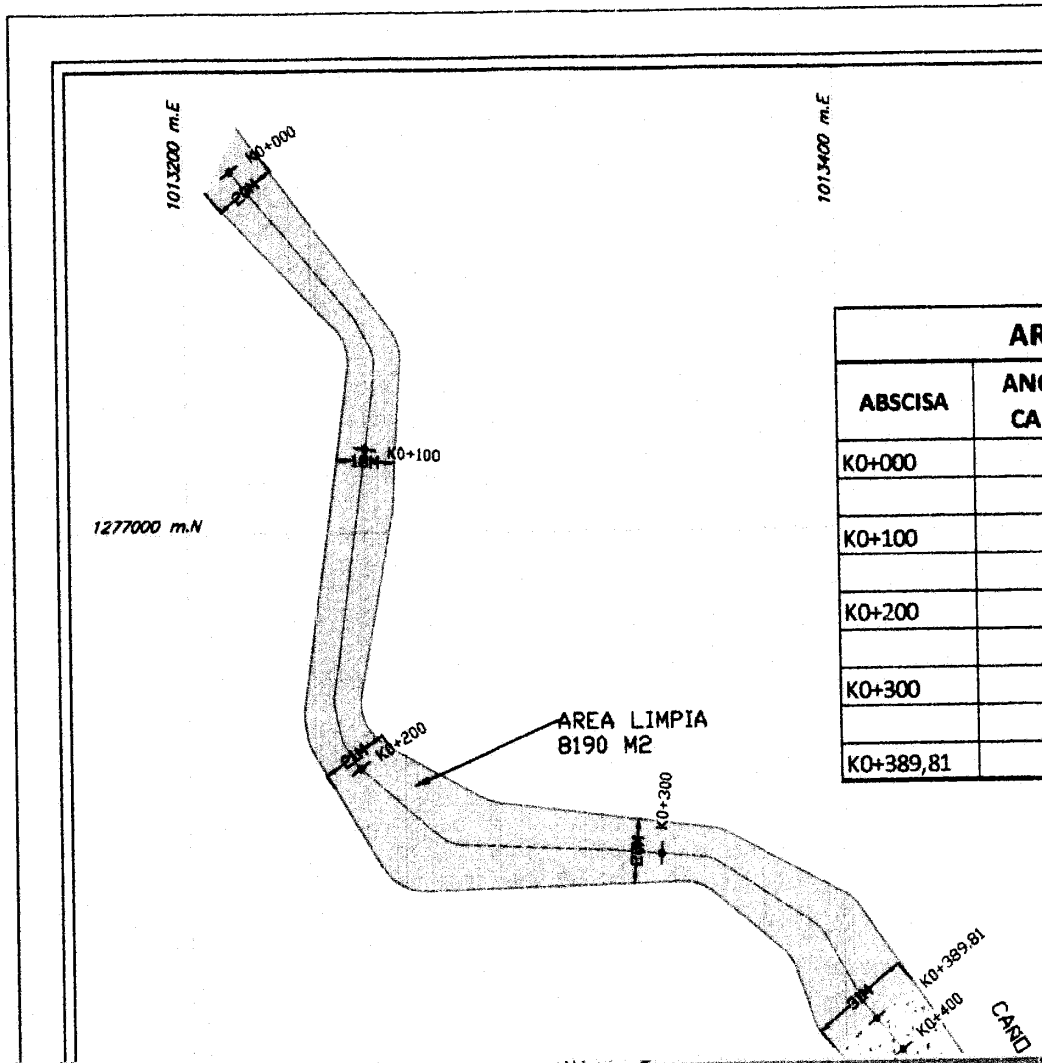

AREA LIMPIADA CAÑO AGRIO M2				
ABSCISA	ANCHO DE CAÑO M.	PROMEDIO ANCHO M.	DISTANCIA M.	AREA
K0+000	20			
		19	100	190
K0+100	18			
		19,5	100	195
K0+200	21			
		20,5	100	205
K0+300	20			
		25,5	89,81	229
K0+389,81	31			
			TOTAL	8190

E. S. P.	**AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P** **811.021.151-6**		
	CONTROL DE EQUIPOS	Código: F-GPI-SIN-13	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE 2024 **Y EL** 21 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: SALUPAISMA S.A.S **CONTRATO No.** 058 DE 2024

INTERVENTOR: MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S **CONTRATO No.** 058 DE 2024

EQUIPO	FECHAS DE USO		PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	INICIO	FIN					
VOLQUETA	12/11/2024	21/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO
CAMION DE ESTACA	12/11/2024	21/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO
CAMION TIPO FURGON	12/11/2024	21/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	DISTRIBUCION HIELO Y AGUA	EN BUEN ESTADO
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	12/11/2024	21/12/2024		X	SITIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO	RECOLECCION DE SOBRANTES	EN BUEN ESTADO

Firma: Víctor Portilla

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-14	
		Fecha de Aprobación:01/12/2014	
	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA			
NÚMERO DE CONTRATO:	059 DEL 2024	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/12/20224	**Y EL** 21/12/2024
CONTRATISTA:	SALUPAISMA SAS			
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS D EINGENIERIA SAS			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	N/A		
- Diurna	N/A		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL PROYECTO

Firma:

Nombre: VICKY PATIÑO OSPITIA
DIRECTOR DE OBRA

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS.

8.1 PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO

El proyecto cuenta con un Plan de Trabajo Detallado (PDT) actualizado con el adicional en valor realizado, mediante el cual se evalúa periódicamente la ejecución de las actividades del proyecto que permite determinar los avances y atrasos respectivamente.

Se anexa en este informe.

8.2 PERSONAL DE OBRA.

Dentro del presente informe, se relaciona el personal que labora para el proyecto.

Personal inicial

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
1	LINA MARIA SANCHEZ MURCIA	1001814858	OBRERO
2	JAIDER ANDRES MORALES CASTRO	1042215028	OBRERO
3	DIANA MARIA MEDINA INFANTE	1042211429	OBRERO
4	ELBIA HERRERA GOMEZ	63462346	OBRERO
5	CARLOS JOSUE DIAZ MORALES	1001815806	CADENERO
6	JANETH ZAPATA CANO	43652967	OBRERO
7	JEISON VARGAS PEREZ	1005177155	OBRERO
8	EVANGELINA MARROQUIN CAICEDO	28154628	OBRERO
9	LILLETH ALEXANDRA LEON	1001815791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10	BRANDON SMITH GUZMAN FUENTES	1043124944	AYUDANTE DE VOLQUETA
11	DANY MILENA SANCHEZ	1042212671	OBRERO
12	LEANDRO ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ	1001815732	OBRERO
13	MARTHA CECILIA VANEGAS	21950152	OBRERO
14	KALED OCTAVIO OROZCO	1096191351	OBRERO
15	AMALIA RODRIGUEZ TREJOS	1042212903	OBRERO
16	MAIDIS SEIJA PIMIENTA	1002446712	OBRERO
17	NEDER YENEVIS ARIAS CASTANEDA	1096228829	OBRERO
18	YESSICA TATIANA GUERRERO BLANCO	1001815926	OBRERO
19	JHON JAIRO LOPEZ HERRERA	1126126332	OBRERO
20	JACKELINE JIMENEZ CARPIO	37581459	OBRERO
21	EDILMA MILENA RIANO LEON	28070089	OBRERO
22	EMELYS CASTRO SEIJA	1042212312	OBRERO
23	LINEY DAYANA TELLEZ AGUIRRE	1097184507	OBRERO
24	ROBER ANTONIO QUIROGA MORENO	1050544332	OBRERO
25	LUIS FERNANDO AGUILAR CARRILLO	15452500	OBRERO
26	SAMUEL PALENCIA CASTRO	15452001	OBRERO
27	EVA SANDRID OROZCO MARTINEZ	1005189008	OBRERO
28	YULIE FERNANDEZ ALMENDRALES	1001815392	OBRERO
29	VIVIANA ESTHER GUERRERO	37576322	OBRERO
30	MARISOL CASTRO JARAMILLO	1042211977	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
31	LILIA SUSANA VILLAR HERNANDEZ	1148944064	OBRERO
32	GLORIA INES ENCISO CASTRO	1096221078	ALMACENISTA
33	GLORIA AMPARO RODAS	28336158	OBRERO
34	JORGE LUIS FLOREZ MORATOS	1042212258	OBRERO
35	KEVIN MANUEL RODRIGUEZ	1007567729	OBRERO
36	EDWIN ANDRES JIMENEZ	1042210290	OBRERO
37	ANGIE PAOLA VERGARA ESCOBAR	1042215122	OBRERO
38	OSCAR DE JESUS CARDONA TABARES	13892791	OBRERO
39	LUCELY SAAVEDRA GIRALDO	1042212425	OBRERO
40	TANIA ELVIRA THOMAS MARTINEZ	28484170	OBRERO
41	LIBIA GIRALDO HOYOS	21949968	OBRERO
42	PAOLA ANDREA MUNOZ BLANDON	1001814730	OBRERO
43	JHAN CARLOS RUA RESTREPO	1001815607	OBRERO
44	BETSABE RODRIGUEZ CASTRO	37575140	OBRERO
45	SEBASTIAN BERNAL VARGAS	1001815512	OBRERO
46	LUZ AIDE COTERIO MONTOYA	1042213893	OBRERO
47	YARILUZ BERMUDEZ BOHORQUEZ	1042211341	OBRERO
48	YEIMI KATHERINE CASTELLANOS LUNA	1005289808	OBRERO
49	MIGUEL ANDRES SALCEDO	1096226906	OBRERO
50	CARLOS GUALDRON AGUDELO	1005155013	OBRERO
51	ANGELES DISNEY OSORIO CASTANEDA	1056768193	OBRERO
52	ELIAS MORALES FLOREZ	3557595	OBRERO
53	GLORIA ESTER GARCIA VANEGAS	1148944038	OBRERO
54	ROSA ELVIRA MOSQUERA	43656476	OBRERO
55	MERCEDES MARIA PALOMINO	1126121871	OBRERO
56	MIGUEL ANGEL MORA	15451673	OBRERO
57	YISELA YULIETH MARTINEZ A	1001814628	OBRERO
58	NATALIA BERRIO	1042211595	OBRERO
59	JAROLD MARIA PENA	52905774	OBRERO
60	ANTONIO MURILLO MURILLO	13881219	OBRERO
61	ALDAIR VEGA BELENO	1001814934	OBRERO
62	KARINA MARTINEZ LOPEZ	21950897	OBRERO
63	MARIA ISABEL SALGADO	63459623	OBRERO
64	MARIA ALEJANDRA AGREDO	1096253602	OBRERO
65	ANDREA JULIETH HERNANDEZ	1039679021	OBRERO
66	JAVIER SOLIS RIANO SALAZ	1042210651	OBRERO
67	ELIANA RODRIGUEZ MORENO	1042210855	OBRERO
68	LUIS FERNANDO RUIZ LEAL	1104094396	OBRERO
69	YESENIA DIAZ CARDENAS	21950783	OBRERO
70	JOHANNA HERRERA MADRID	33223337	OBRERO
71	VICENTE HERNANDO SANTA	13889845	OBRERO
72	YURIAN ALEXANDRA MONTOYA	1096184135	OBRERO
73	EDILMA LEON	37925342	OBRERO
74	AIDE DEL CAMELO COTERIO	42937786	OBRERO
75	BLANCA MARIA FUNEZ	37575102	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
76	JUAN DAVID RICARDO	1042210521	OBRERO
77	YURLADIS AGUDELO	1096211787	OBRERO
78	MAIRA PAEZ ZAPATA	1001815812	OBRERO
79	ALEYDA GONZALEZ	1096190651	OBRERO
80	ROSA MARIA SANCHEZ	63462513	OBRERO
81	DUBAN ALFREDO GIRALDO	1001815643	OBRERO
82	LUIS OBED SOSA PEDROZO	1005180011	OBRERO
83	CARLOS HELI DIAZ MELGAREJO	1042212040	OBRERO
84	EMILCE GALVAN MANTILLA	21950123	OBRERO
85	SORANI ALEJANDRA FONCE POVEDA	1005190659	OBRERO
86	KELLY SOLANY AGUIRRE POVEDA	1096248472	OBRERO
87	DOMINGO MANUEL QUIROZ	3806527	OBRERO
88	INGRID LISBET RAMIREZ CASTELLANOS	1096261512	OBRERO
89	ASTRID KATHERINE LOPEZ MURCIA	1001204559	OBRERO
90	MARIA YULEINE MEZQUIDA PENATE	1096234313	OBRERO
91	SANDRA PATRICIA CONTRERAS SERRANO	37578512	OBRERO
92	SONILDA ROBLES RENDON	1042212666	OBRERO
93	ERICA MARCELA DURAN RUEDA	1032379188	OBRERO
94	KAROL ANDREA RINCON AMARIS	1097182252	OBRERO
95	ONIX DANIELA JIMENEZ PENA	1005182654	OBRERO
96	YURLEIDIS CARDENAS CASTANEDA	1001815666	OBRERO
97	MARIA CAMILA PENA CASTANEDA	1001815658	OBRERO
98	RUBEN MACIAS RAMIREZ	15452205	OBRERO
99	MARTA LUZ MONTIEL ROJAS	21950224	OBRERO
100	CARLOS JULIO MIRANDA BETANCUR	1096230911	OBRERO
101	CARLOS ALBERTO MONTESINO GUZMAN	12503344	OBRERO
102	MARIA CAROLINA RICARDO ARRIETA	1042214981	PALETERA
103	KOREIMA OLAYA AGUDELO	1001815196	OBRERO
104	ADRIAN MENDEZ CARPIO	1001815785	OBRERO
105	LUIS FERNANDO ACONCHA NIETO	1096229965	OBRERO
106	KAROL JISELA RODRIGUEZ JIMENEZ	1042210904	OBRERO
107	KELLY VIVIANA GUERRERO FERNANDEZ	1096226438	OBRERO
108	YOHANA MARCELA DUARTE VANEGAS	1001443147	OBRERO
109	MARTHA CECILIA CARPIO RODRIGUEZ	21950297	OBRERO
110	IVAN ENRIQUE PALLARES PALENCIA	1003267413	OBRERO
111	LUDI ORQUIDIA MONSALVE SIERRA	1005181787	OBRERO
112	ALEJANDRO FRAGOSO AGAMES	1042213583	OBRERO
113	WILMAR URRUTIA CHACON	13569412	OBRERO
114	NORIDA MILEDYS ARCE CERVERA	1042212453	OBRERO
115	EDGAR YESID CIFUENTES MENDOZA	1005184816	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
116	MARITZA ALEJANDRA RAMOS CARDENAS	1005182488	OBRERO
117	JHON ALEX GALVIS CARPIO	1042214721	OBRERO
118	VALENTINA JARAMILLO MARIN	1027802576	OBRERO
119	DIANA PAOLA LONDONO RINCON	21950793	OBRERO
120	OMAIRA DEL CARMEN MARTINEZ BALDOVINO	1102580165	OBRERO
121	EFRAIN BENAVIDES	10157106	OBRERO
122	GLORIA ESTHER DURAN LORA	21931870	OBRERO
123	MARIA GABRIELA MORALES VASQUEZ	21665251	OBRERO
124	GERSON DANIEL ROJAS ROMERO	1005190548	OBRERO
125	SOLMARINA ROJAS SIERRA	23151104	OBRERO
126	JOSE MIGUEL BETANCOURT VANEGAS	5594391	OBRERO
127	SOLANGEL NAYHOSCA GUARIA RODRIGUEZ	1258295	OBRERO
128	OMAIRA LOZANO MACHUCA	21950417	OBRERO
129	YULIER PAOLA MESTRA TORO	1005180303	OBRERO
130	MARIA FABIOLA MACIAS PINEDA	21950238	OBRERO
131	NORELIA ENSUENO VILLA SUAREZ	21950114	OBRERO
132	IVETH KATHERINE LOPEZ HERNANDEZ	1005190010	OBRERO
133	EVA LONEY YAIMA GARATEJO	52455196	OBRERO
134	MARELVIS PEDROZO CADAVID	37577419	OBRERO
135	BRENDA LITH ORTIZ CASTANO	1096183607	OBRERO
136	JULIANA ANDREA AGUDELO GARCIA	1193413272	OBRERO
137	AURA DAHYANA APONTE HERNANDEZ	1096248599	OBRERO
138	ROMER CARDENAS AGUDELO	13568430	OBRERO
139	MARIO DE JESUS FRAGOSO LOPEZ	13892370	OBRERO
140	YULIETH TATIANA TEJADA ESPINOSA	1005182963	OBRERO
141	SANDRA MILENA ORTEGA CELIS	40051319	OBRERO
142	DUBERNEY CARDONA	91444019	CAPATAZ
143	MARIA MARGARITA DELGADO SIERRA	21950263	OBRERO
144	LEIDY SULGEY PAEZ BERNAL	1042212708	OBRERO
145	LUCY MARIN PULGARIN	52222368	OBRERO
146	WENDY DAYANA SUAREZ GIRALDO	1005182624	OBRERO
147	KEVIN DANIEL RUIZ GENI	1005184375	OBRERO
148	NULIALBA ZAPATA GRANADA	63466253	OBRERO
149	ADELA GONZALEZ SERNA	63468205	OBRERO
150	YAJAIRA PAOLA VARGAS MARTINEZ	1065592685	OBRERO
151	DUVAN BRAVO JEREZ	1001814876	OBRERO
152	GREIS PATRICIA RODRIGUEZ MORALES	1042212524	OBRERO
153	SANDRA MILENA CIFUENTES PEDRAHITA	1096203894	OBRERO
154	JUAN DIEGO MOREIRA AVILA	1042214422	OBRERO
155	MAURICIO ALFONSO MANCIPE ARROLLAVE	13568357	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
156	ROSA MERY SERRANO CARDENA	60383628	OBRERO
157	TEOBALDO MARTINEZ GUZMAN	91422853	CAPATAZ
158	YINETH ISABEL MARTINEZ DURAN	1042214848	PALETERA
159	AMBAR YARITZA MARTINEZ GUTIERREZ	1042214346	OBRERO
160	MARIA JOVITA MORALES AGUIIRE	21950365	OBRERO
161	MAICOL STUART CORREDOR JIMENEZ	1039679222	OBRERO
162	JUAN LISANDRO VILLA JIMENEZ	15452335	OBRERO
163	OMAIRA CHACON RAMIREZ	21950408	OBRERO
164	YULDER RINCON AGUDELO	1001814968	OBRERO
165	KENIA ALEJANDRA MUNETON GARCIA	1039686203	OBRERO
166	LUISA FERNANDA NAVARRO GUERRA	1148685200	OBRERO
167	STEFANY CARDONA AMAYA	1036220470	PALETERA
168	HECTOR ARMANDO POSADA	71181354	OBRERO
169	FANY ORTIZ LOZANO	32729136	OBRERO
170	YURLADIS CABRALES MARROQUIN	1001814758	OBRERO
171	LUDILVIA MEDINA CALERO	21950216	OBRERO
172	MANUEL ANDRES GIL ARIAS	1094832086	OBRERO
173	IGNACIO SILVARA MEDINA	13854825	OBRERO
174	LEON JULIO ANAYA	91440800	CONDUCTOR
175	YIMI ROY BENAVIDEZ JARAMILO	91445624	OBRERO
176	VICKI YURANY PATINO ESPITIA	1054543056	DIRECTORA DE OBRA
177	KELLY JOHANA FARFAN BALLESTEROS	1096214774	OBRERO
178	DULCINA RODRIGUEZ ROJAS	21950195	OBRERO
179	ANGELICA RODRIGUEZ ROJAS	1042212057	OBRERO
180	JUAN DAVID LOPEZ SANTOS	1082351523	OBRERO
181	SOL FANETH MENDOZA	1042211511	OBRERO
182	ROCIO DE LA OSSA MORALES	63465590	OBRERO
183	ELIZABETH CASTRO OVIEDO	37575353	OBRERO
184	ERIKA TATIANA ANTOLINEZ BENAVIDES	1042214005	OBRERO
185	ANA LUCIA RICO CRUZATE	1096234778	OBRERO
186	DAMARIX ROSA RODRIGUEZ TREJOS	21950088	OBRERO
187	YAILETH HERNANDEZ JARAMILLO	1005180731	OBRERO
188	DEIVIS LOPEZ MARTINEZ	80022053	OBRERO
189	ZHARICK XIBELLE CUERVO APARICIO	1005240015	OBRERO
190	ELIZABETH ROMERO BALMACEDA	1096219716	OBRERO
191	JOSE YIMMI MORENO BENITEZ	4854222	OBRERO
192	LIBORIO ORTEGA CANTILLO	3557880	OBRERO
193	LUIS FELIPE BELTRAN LOPEZ	1063959626	OBRERO
194	YESICA PAOLA CARRILLO ARROYAVE	1042214087	OBRERO
195	DIANA CAROLINA CHACON ECHAVARRIA	1096228002	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
196	PAULA ANDREA ARRIETA RIVAS	1042214382	OBRERO
197	ILVA MARIA NIETO RODRIGUEZ	21949422	OBRERO
198	ANDREA JOHANA DIAZ CASTELLANO	1096204724	OBRERO
199	YUMNARA JAZBLEIDY GIL GONZALEZ	1096190744	OBRERO
200	RUBIELA IZABEL GUERRERO ZULETA	28488406	OBRERO
201	NORIS JEREZ LOPEZ	21950434	OBRERO
202	JOSE LEONARDO FRANCO CAMPOS	1096207153	VIGILANTE
203	ALLISON VALENTINA VEGA RAMOS	1005221813	OBRERO
204	VICENTE ESCOLASTICO BENAVIDES ORTEGA	17370023	VIGILANTE
205	MAROLIZ ANDREA GUERRA RODRIGUEZ	1042210074	OBRERO
206	ANDRES FELIPE GAMARRA HIGUINIO	1005188000	OBRERO
207	LUZ ANDREA LOPEZ OROZCO	1193473817	OBRERO
208	JUBY SMIT LONDONO GARZON	1042214880	OBRERO
209	MARISOL RUIZ GIL	30572723	HSE
210	ZENEIDA MORENO ALVARADO	1085171327	VIGILANTE
211	ROSELIA VILORIA LOPEZ	1042213467	OBRERO
212	MARIA ALEJANDRA MORALES	1001815165	OBRERO
213	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS	19247420	OBRERO
214	ROY CASTILLO ARDILA	91424510	TOPOGRAFO
215	KATERINE GUTIERREZ	1001815273	RESIDENTE DE OBRA
216	DIEGO BELENO RODRIGUEZ	1042210357	AYUDANTE DE VOLQUETA
217	DARCY CARDONA AMAYA	1036220471	OBRERO
218	FERNANDO PINERES LERMA	91426792	OBRERO
219	JACKLYN KATERINE CARDENAS CAMPO	37440917	OBRERO
PERSONAL ADICIONAL (93)			
220	SAMUEL CAMARGO RODRIGUEZ	15451761	OBRERO
221	NILSON DANIEL CRESPO*	1148944080	OBRERO
222	NANCY BERNAL ROMERO*	21950792	OBRERO
223	MARTHA LILIANA PEREZ AGUDELO*	1104130380	OBRERO
224	ROSA MARITZA ALFONSO TORRES*	1118546237	OBRERO
225	LILI ARANGO VASQUEZ	1039702224	OBRERO
226	DOMINGO ROJAS CUADROS*	13889736	OBRERO
227	MANUEL SANTOS ESPITIA MADERA	13565932	OBRERO
228	MARYORIS MEJIA MONTOYA	1096802785	OBRERO
229	YOLIMA CASTELLAR OTALVAREZ	28489460	OBRERO
230	JHON FREDY RAVELO ROMERO	15452260	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
231	LILIANA ANDREA BEDOYA PEREZ	1042210587	OBRERO
232	JORGE ELIECER JIMENEZ CIFUENTES	15452324	OBRERO
233	YORLENY FERNANDEZ ALMENDRALES	1042210903	OBRERO
234	HERMES MOYANO MAHECHA	15452498	OBRERO
235	MYRIAM ROJAS SIERRA	30783131	OBRERO
236	NELCIDA JIMENEZ SANDOVAL	36585211	OBRERO
237	MARIA CRISTINA HERREÑO LOPEZ	21949761	OBRERO
238	NEREYDA AMAYA MARIN	21950243	OBRERO
239	ROSELIA HERNANDEZ SUAREZ	30003974	OBRERO
240	NICOL DANIELA PEREZ HUESO	1096185384	OBRERO
241	LUZ MERY CARDONA TABARES	37928561	OBRERO
242	LAUDIS ASTRID BERNAL DIAZ	1050918515	OBRERO
243	MAICOL YESID LEON MELGAREJO	1042210223	OBRERO
244	NATALY PATRICIA FRAGOSO CASTELLAR	1096190906	OBRERO
245	LUZ MARY GARAY MALDONADO	1042212704	OBRERO
246	ELIANA MILENA PIEDRAHITA GUARNICA	28069774	OBRERO
247	YENNY MARIN ZABALA	1017190974	OBRERO
248	RONALDO ALBERTO MARIN RICO	1042210636	OBRERO
249	LUZ ARGENES MARTINEZ UILES	21950690	OBRERO
250	OTILIA YASOS BERNAL	63459696	OBRERO
251	REYES MANUEL NISPERUZA CORRALES	92512059	OBRERO
252	LEIDY YANETH MARTINEZ UILES	1042212218	OBRERO
253	ANA ISABEL GUTIERREZ	23151498	OBRERO
254	JOSE FERNANDO LEON BOHORQUEZ	15451850	OBRERO
255	ROSA MARIA RICO	37579039	OBRERO
256	LIDIS EMILIA ZABALA SANCHEZ	21949581	OBRERO
257	WENDY YARIZA FLORIDO OROZCO	1001815541	OBRERO
258	MAYERLI SIERRA AGUILAR	1096210154	OBRERO
259	LUZ DARY TOVAR CAMPO	63462209	OBRERO
260	CARLOTA HERNANDEZ PALACIOS	28489173	OBRERO
261	MARIA LILLANA PIÑERES PRIETO	21950728	OBRERO
262	SANTIAGO RAMIREZ CARDENAS	91320362	OBRERO
263	MARIA VICTORIA MARQUEZ RUIZ	1002643412	OBRERO
264	BASILICA PEDROZO CAMPO	37934718	OBRERO
265	YESICA PEÑA OSPINO	1048556070	OBRERO
266	MARELIS LERMA DIAZ	63463423	OBRERO
267	ZULEIMA PAOLA MENCO PIÑERES	1052987217	OBRERO
268	YAZMIN YULIET CORDOBA MORALES	21950798	OBRERO
269	MARITZA CARRASCAL VELASQUEZ	32007741	OBRERO
270	JHOAN SEBASTIAN PAEZ FONCE	1128464014	OBRERO

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUPAISMA S.A.S

NIT 900904251 - 7

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
271	MARIA MONICA PUENTES GUAPACHA	1096194594	OBRERO
272	WILLIAM GAVIRIA RAMIREZ	1096210618	OBRERO
273	DORIS MORENO ORTIZ	26270688	OBRERO
274	GISELLA ANDREA IBARRA BRAN	1001815978	OBRERO
275	MANUEL FERNANDO ESPITIA MOLINA	1042211085	OBRERO
276	YAIDANER CASTAÑEDA ZAPATA	15452396	OBRERO
277	NORAIMA CARPIO	1042214051	OBRERO
278	JESUS ANTONIO LOPEZ	1022400762	OBRERO
279	ISABELLA SANCHEZ HERNANDEZ	1005182416	OBRERO
280	XIOMARA SANCHEZ BENAVIDES	24717371	OBRERO
281	SANDRA MILENA APARICIO RINCON	28020339	OBRERO
282	ESTEFANIA CHACON JARABA	1001814708	OBRERO
283	DIANA LUCIA PAREDES DIAZ	1078247260	OBRERO
284	YENNY MORALES	43657665	OBRERO
285	JONNIER ALEXIS CABEZAS MEJIA	1001271537	OBRERO
286	BERTHA JULIANA QUEJADA PALACIO	1042213523	OBRERO
287	LUIS ROBERTO DE LA ROSA GOMEZ	18911151	OBRERO
288	OLGA BALLESTROS MORALES	21950613	OBRERO
289	DANIELA LOPEZ SIERRA	1042210662	OBRERO
290	NEUDIS LERMA FRANCO	26766703	OBRERO
291	CARMEN ANA MEJIA	21949449	OBRERO
292	LEONEL HERNANDEZ SANCHEZ	1042215286	OBRERO
293	JAMES SOTO RANGEL	1096239201	OBRERO
294	FRANCISCO JAVIER PEDROZO RANGEL	5172800	OBRERO
295	IDALIDES NAVARRO FLOREZ	30874459	OBRERO
296	CRISTIAN CAMILO MESA GUERRA	1096241220	OBRERO
297	ORTENCIA YULIETH ORTIZ LLORENTE	1001815023	OBRERO
298	GISELL NATALIA MOYANO CASALLAS	1042210988	OBRERO
299	NANCY ELVIRA GUTIERREZ ARROLLO	37927798	OBRERO
300	MAROIDYS CARDONA TORRES	1096189303	OBRERO
301	YESSICA TATIANA CASTRO MORENO	1054564044	OBRERO
302	YOREIDYS BOHORQUEZ RODRIGUEZ	1042212730	OBRERO
303	LUZ MERY VIDES MORA	22820196	OBRERO
304	JOSE DE JESUS AVENDAÑO	71185259	OBRERO
305	LUIS ARMANDO ROBLES RONDON	1096199954	OBRERO
306	NATALIA CAICEDO ORTIZ	1096801732	OBRERO
307	YERLINTH JAIDITH SANCHEZ HERNANDEZ	1148944059	OBRERO
308	YULI ESTEFANIA ROJAS MEDINA	1001814830	OBRERO
309	LILIAN YORLADIS TAPIAS ESTRADA	1065243718	OBRERO
310	ATILANO FLOREZ CARBALLIDO	1001814819	OBRERO
311	YESSICA MILDRED RINCON	1005186073	OBRERO
312	LINA MARCELA SANABRIA MACIAS	1001815224	OBRERO

Cel 3227238016
recursohumanoconsor@gmail.com


PROGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
FECHA:	DICIEMBRE DE 2024

ITEM	***DESCRIPCION***	***VR. ACTIVIDAD***		***MES 1***				***MES 2***			
				SEM 1	***SEM 2***	***SEM 3***	***SEM 4***	***SEM 1***	***SEM 2***	***SEM 3***	***SEM 4***
Etapa Precontractual											
1. Objetivo Especifico 1: SERVCIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA											
1.1. Producto 1: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos											
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	$ 4.493.624.280,75	CAÑO COLECTOR Y RAMALES								
			CAÑO AGRIO EL TIGRE								
			CANAL BRISAS DE ORIENTE								
			BARRIOS 3 DE OCTUBRE, PROGRESO, POP CASABE								
			BOCATOMA LAGUNA Y ACUEDUCTO RURAL								
			CAÑO CARMELITAS								
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	$ 246.318.353,40									
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	$ 159.831,00									
				$			1.908.424.088	$			2.991.349.547
TOTALES		***$ 4.740.102.465,15***		***$***			***1.908.424.087,58***	***$***			***2.991.349.546,58***

5912

ORGANIGRAMA DE OBRA

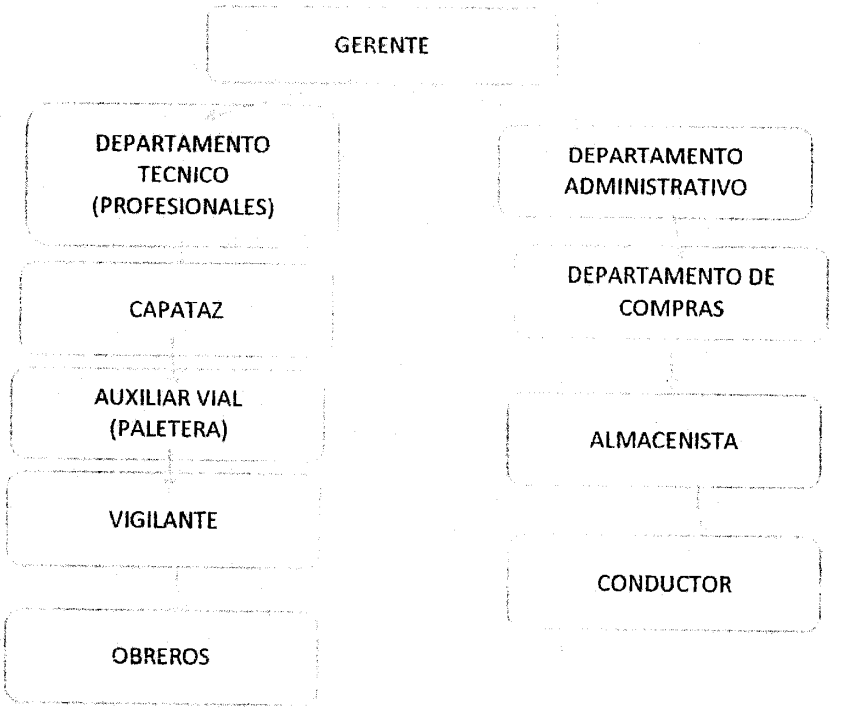

8.3 Hojas de Vida.

En este Capítulo se anexan las hojas de vida del personal No profesional vinculado para la ejecución del contrato, las hojas de vida de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato.

8.4 Contratos Individuales de trabajo.

En este Capítulo se anexan los contratos individuales de trabajo del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

8.5 Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social.


En este Capítulo se anexan las afiliaciones y certificaciones al régimen de seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato.

8.6 Actas de Entrega de Dotación.

Con el fin de brindar seguridad y protección a los trabajadores al momento de ejecutar las actividades del contrato, el contratista hace entrega de los implementos y vestuarios, es por eso que se le solicita al contratista la elaboración de un acta de entrega de dotación del personal vinculado para la ejecución del contrato, la de los profesionales se entregaron para realizar acta de inicio del contrato.

A continuación, presentamos un desglose de los grupos poblacionales que se encuentran dentro del personal que desarrolla el proyecto.

POBLACIÓN							
TOTAL BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	ADULTO MAYOR + 58 AÑOS	ADULTOS ENTRE 29 Y 57 AÑOS	JOVENES ENTRE 18 - 27 AÑOS	COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE	PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	COMUNIDAD LGTBIQ+	VICTIMAS DEL CONFLICTO
312	32	68	125	28	9	5	45

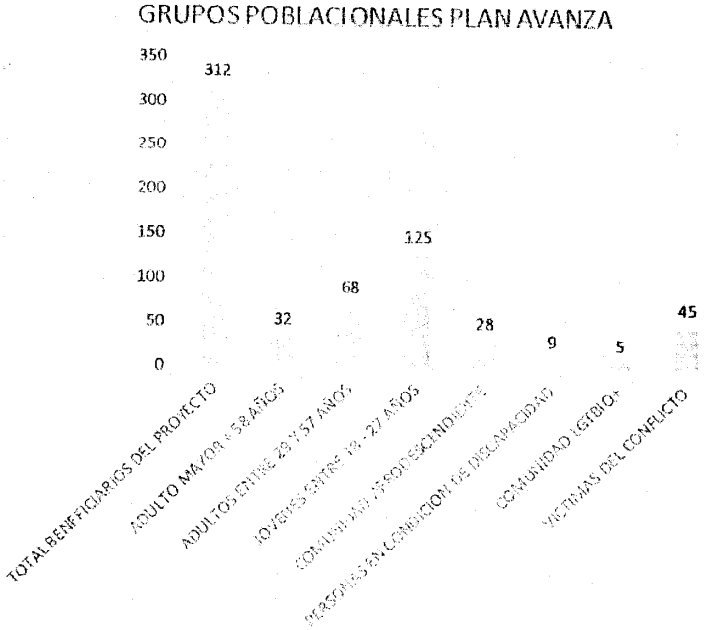

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

9 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

9.1 Socialización del proyecto.

Se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad en general del Municipio de Yondó donde asistieron diferentes personas de diferentes sectores, la Interventoría, personal de la empresa de servicios públicos, el contratista y su equipo de trabajo.

En esta socialización la comunidad planteo sus inquietudes respecto a la parte laboral: en cuanto a salarios, tipo de contrato, prestaciones y cantidad de personal requerido para la obra, en este punto el tema se centró en la necesidad de utilización de la mano de obra local.

Este documento se anexo en el informe anterior.

9.2 Actas de Vecindad

No se realizaron estas actas de vecindad debido a que los trabajos se realizaron durante este periodo no afectaron viviendas cercanas.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

10.1 Información General del Contrato

CONTRATANTE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
CONTRATO DE OBRA:	No 058 - 2024
CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
OBJETO	OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD 014-2024.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($3.816.848.175,15) M/CTE
VALOR ADICIONADO:	MIL OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1.082.925.459,00) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($4.899.773.634,15) M/CTE.
PLAZO:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

OFICINA RESPONSABLE:	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
FECHA ACTA DE INICIO:	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

10.2 Actas Suscritas.

NOMBRE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
Otro Si No 01	TREINTA Y UN (31) DE OCTUBRE DE 2024
Otro Si No 02	PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 1	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
Otro si No 03	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024

10.3 Relación de Pagos Parciales

A la fecha se ha efectuado un pago parcial, pero con el presente informe se realizará el segundo corte.

ACTA PARCIAL No	VALOR DEL ACTA	DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO 50%	VALOR NETO A PAGAR	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO
1	$ 3.435.163.357,64	$ 1.908.424.087,58	$ 1.526.739.270,06	$ 3.435.163.357,64	$ 381.684.817,52
2	$ 974.632.913,10	$ 541.462.729,50	$ 433.170.183,60	$ 4.409.796.270,74	$ 489.977.363,42

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

10.4 Control de Garantías.

El contratista presento a la Administración Municipal de póliza de Cumplimiento No 11-45-10101153670 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. Para amparar los riesgos de Cumplimiento de Contrato, Estabilidad de Obra, Pago de Salarios prestación Sociales y Responsabilidad Civil Extracontractual No 11-40-101069764, para la Legalización del contrato de Obra No. 058 DE 2024. Una vez revisadas las pólizas, AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P mediante acta de aprobación de garantías da aceptación.

Actualización de pólizas del contrato

SEGÚN OTRO SI No 3 EN VALOR					
POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO	%
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$489.977.363,42	10%
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$2.449.886.817,08	50%
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/01/2028	$244.988.681,71	5%
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/07/2025	$489.977.363,42	10%
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	29/10/2024	10/01/2025	$520.000.000,00	

10.5 Control de Pagos Parafiscales.

En el presente informe, se adjunta el pago de aportes parafiscales del personal de obra, correspondientes al periodo del presente cobro.

10.6 Registro Fotográfico (F-GPI-SIN-21).

En el presente informe se anexa el formato F-GPI-SIN-21 donde se verifican las actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato en el periodo de cobro.

10.7 Regístro Diario de Obra (Bitácora).

En el presente informe, se anexa la bitácora de Obra en donde se registran las actividades realizadas día a día en Obra en la cual se evidencia el avance en la ejecución del proyecto.

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com

SALUDPAISMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No. CD 014-2024.
VALOR:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($3.816.848.165,15)
CONTRATISTA:	SALUDPAISMA S.A.S NIT:900904251-7
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	INGENIERO JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
FECHA DEL REGISTRO:	1 Al 21 DE DICIEMBRE 2024

FOTOGRAFÍA No. 1




FOTOGRAFÍA No. 2



FOTOGRAFÍA No. 3



FOTOGRAFÍA No. 4

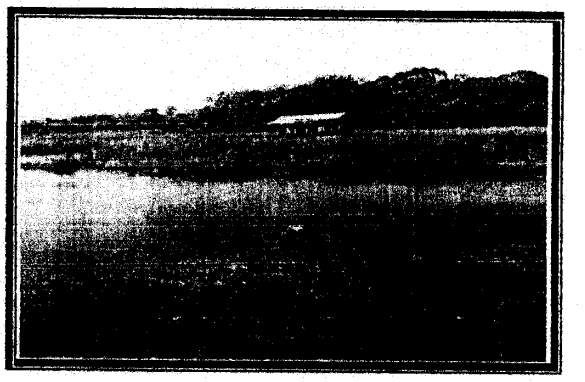

DESCRIPCIÓN: Jornada de limpieza caño colector vereda X10 y bocatoma laguna del miedo.

SALUPAESMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	

FOTOGRAFÍA No. 5



FOTOGRAFÍA No. 6



FOTOGRAFÍA No. 7



DESCRIPCIÓN: Capacitación al personal plan avanza con ARL AXA COLPATRIA.

SALUPAISMA SAS NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	


FOTOGRAFÍA No. 8



FOTOGRAFÍA No. 9



FOTOGRAFÍA No. 10

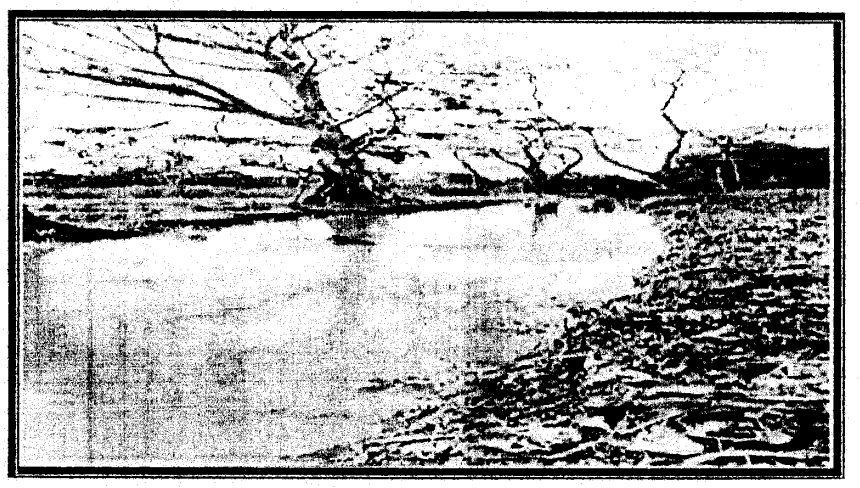

DESCRIPCIÓN: Se realizan labores de limpieza en caño agrio corregimiento san miguel del tigre

SALUPAISMA SAS NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	

FOTOGRAFÍA No. 11



FOTOGRAFÍA No. 12



FOTOGRAFÍA No. 13



DESCRIPCIÓN: Se realiza desmantelamiento de árboles caídos en caño agrio corregimiento san miguel del tigre.

SALUPAESMA S.A.S NIT 900904251 - 7	REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024	

FOTOGRAFÍA No. 14



FOTOGRAFÍA No. 15



FOTOGRAFÍA No. 16



DESCRIPCIÓN: Avance en limpieza del caño agrio corregimiento san miguel del tigre.

2297

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 1 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realoizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2298

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 2 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	410.00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	410.00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se ejecutan labores en el caño colector sector vereda X10. Sin novedades

Elaborado por: Vicky Pardo
CONTRATISTA

Aprobado por: Dayanna Medina
INTERVENTORIA

2299

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 3 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	400.00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	400.00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de topografia sector caño agrio corregimiento el tigre.

Elaborado por: Victor Patiño
CONTRATISTA

Aprobado por: Deyanna Medina
INTERVENTORIA

2300

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 4 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	516,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	516,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de limpieza en la bocatoma laguna del miedo

Elaborado por:

CONTRATISTA

Aprobado por:

INTERVENTORIA

2301

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YOPAL S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 5 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación T	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación T	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	421,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	421,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

jornada de limpieza sector bocatoma laguna del miedo

Elaborado por:

CONTRATISTA

Aprobado por:

INTERVENTORIA

2302

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	Código: 001
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Fecha de Aprobación:
		Versión: 0 / Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 6 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M^2	566,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M^2	566,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realiza jornada de limpieza sector bocatoma laguna del miedo. Se presenta accidente laboral a las 12:15 pm,por deslizamiento.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2303

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.351-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación:
		Versión: 0 / Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 7 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M^2	580,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M^2	580,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realiza jornada de capacitación por parte de la ARL AXA COLPATRIA. Sin novedades

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2309

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 8 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
Yicon Patiño	Dayana Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2305

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-5	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 / Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 9 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	413,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	413,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

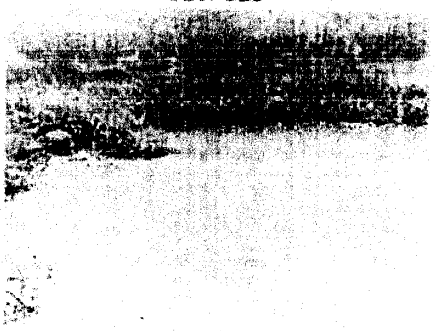

OBSERVACIONES

Se ejecutan labores de limpieza en caño colector vereda la condor. Se presenta accidente laboral a las 11 am.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2306

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 10 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripcion	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	420,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	420,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

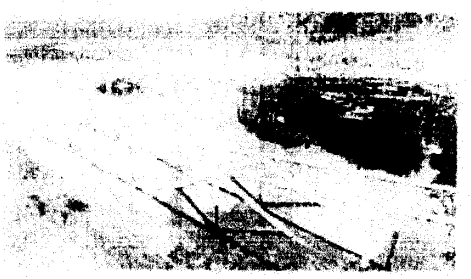

DESPUES



OBSERVACIONES

Avance de limpieza bocatoma laguna del miedo.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2307

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YOPAL S.A.E.S.P. SIG.C22.16.1-6 **REGISTRO DIARIO DE OBRA**	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 11 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	528,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	528,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

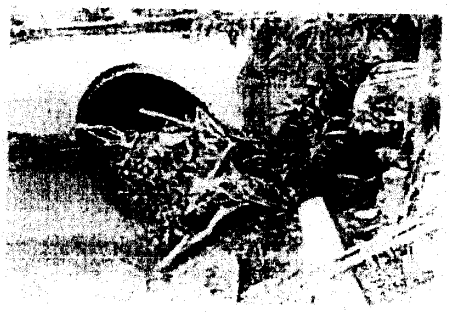

DESPUES



OBSERVACIONES

Se ejecuta jornada de limpieza caño colector sector vereda la condor. Sin novedades

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

7308

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 12 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotacion C	Dotacion I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	533,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	533,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realiza jornada de limpieza en el caño del barrio barrio paraiso. Sin novedades.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2309

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	Código: 001
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Fecha de Aprobación:
		Versión: 0 / Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 13 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	398,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	398,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	141			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Jornada de limpieza en caño agrio corregimiento san miguel del tigre. Se realiza recoleccion de residuos

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2310

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.351-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 14 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA


Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	391,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	391,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

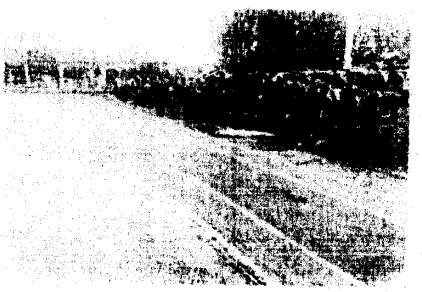

DESPUES



OBSERVACIONES

Capacitación al personal plan avanza con ARL AXA COLPATRIA. Sin novedades.

Elaborado por:	Aprobado por:
Victor Patiño	Dayanna Medina
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2511

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P

811.021.461-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 15 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M^2				
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 16 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	570,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	570,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realiza jornada de capacitaciones por parte de la ARL.

Elaborado por:	Revisado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2313

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.451-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 17 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	420,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	420,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	m^3	108			

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

se ejecutan labores de recolección de residuos.

Elaborado por: Victor Arrieta

CONTRATISTA

Aprobado por: Dayanna Medina

INTERVENTORIA

2314

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 18 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	301,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	361,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realizan labores de limpieza en caño agrio corregimiento san miguel del tigre. Se presenta accidente laboral por deslizamiento.

Elaborado por:

CONTRATISTA

Aprobado por: Dayana Medina

INTERVENTORIA

2315

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE PUERTO GAITÁN S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 19 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	423,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	423,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se realiza desmantelamiento de arboles caidos en caño agrio corregimiento san miguel del tigre.

Elaborado por: VICTOR PINZON

CONTRATISTA

Aprobado por: Dayanna Medina

INTERVENTORIA

2316

E. S. P.	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P 811.021.151-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 20 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	414,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	414,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Avance en limpieza del caño agrio corregimiento san miguel del tigre.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.151-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 21 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	m^2	421,00			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	m^2	421,00			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Limpieza caño agrio corregimiento san miguel del tigre.

Elaborado por:

CONTRATISTA

Aprobado por:

INTERVENTORIA

2318

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A.E.S.P
811.021.352-5

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 22 de diciembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		312	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EJECUCCION DEL PROYECTO

- Revisión de proyecto: Durante la revisión del proyecto, se observó que el equipo de desarrollo está trabajando mucho más del ritmo previsto, lo que puede afectar el plazo de entrega.

- Situación actual: En la reunión realizada con el grupo de trabajo, se observó que los miembros del equipo están trabajando de manera coordinada, lo que ha llevado a mejorar el rendimiento y la comunicación.

- Desempeño: Se observó que el desempeño de los grupos ha mejorado significativamente, el rendimiento en las últimas semanas, lo que ha llevado a una mayor eficiencia en el proceso de trabajo.

VICKY PATIÑO OSPITIA
DIRECTORA DE OBRA

Cel 3227288016
recursohumanoconsor@gmail.com
