ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Bogotá, D.C., 03 de diciembre de 2025

Señores:
ZION CONSTRUCCIONES S.A.S.
JULIÁN OCTAVIO RIAÑO MORA
Representante Legal
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO No. 435-2025 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O DE TENENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: DEVOLUCIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDAD CORRESPONDIENTES AL CORTE No.2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 419-2025.

Respetado Ing. **RIAÑO:**

En atención al asunto, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, por parte de esta interventoría, se REQUIERE al contratista de obra ZION CONSTRUCCIONES S.A.S. que con el fin de dar viabilidad a las cantidades de obra enviadas por medio del documento denominado "MEMORIAS CORTE 2", por parte de esta Interventoría se REQUIERE, se realice los siguientes requerimientos de justificación y corrección técnicas sobre cada uno de los ítems, de la siguiente forma:

- **El ítem 2.2. DESMONTE CIELO RASO incluye el cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados.**

Se requiere que en la memoria de cálculo se adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención, dado que la foto no corresponde con la zona, por otro lado, en el plano debe incluir medidas de donde es el sitio o la numeración a que hace referencia del lugar.

- **El ítem 2.5 DESMONTE DIVISIONES BAÑOS, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados.**

Se requiere retirar este ítem o la cantidad reportada en la memoria de cálculo, ya que la actividad no se ha ejecutado para el ACTA PARCIAL No 2.


- **El ítem 2.7. DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos), incluye tapón y retiro a sitios autorizados.**

Se requiere adjuntar plano anexo de cada una de las zonas en donde se ejecutó la actividad.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

- **El ítem 2.13. DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados**.

Se requiere memoria de cálculo con la justificación cuantitativa detallada (CANTIDAD, LARGO, ANCHO) y el soporte fotográfico de la demolición de la cantidad reportada, por otro lado, en el plano anexo referenciar debe incluir medidas de donde es el sitio o la numeración a que hace referencia del lugar.

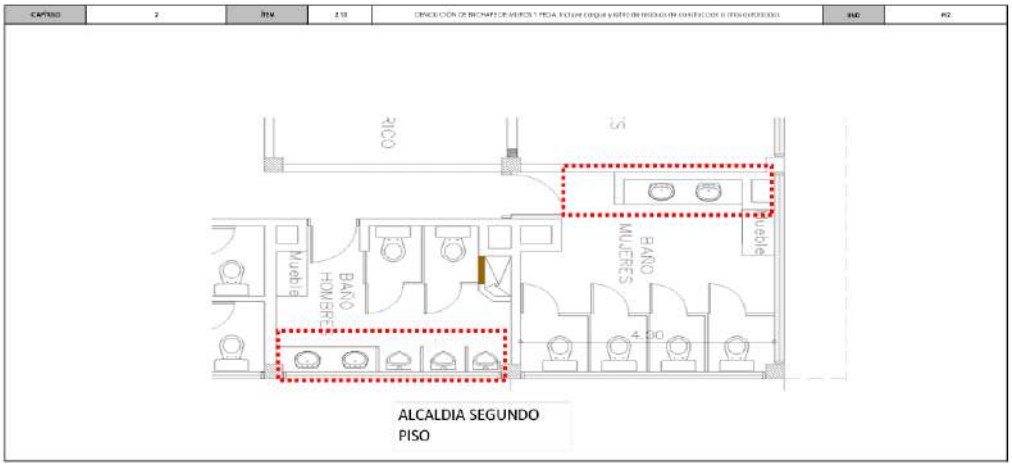

- **El ítem 5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2".**

Esta actividad no se puede cobrar por el ítem en mención toda vez, que la actividad ejecutada fue reparación del punto sanitario de 2" de los orinales.

- **El ítem 5.6, SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, ya que se cobra desmonte y montaje en los ítems 27 y 17.1; solo se realiza el sondeo, por lo cual se aprobó un NP-35 para pasar este ítem.

- **El ítem 8.6. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN**.


La actividad ejecutada no corresponde al ítem anteriormente mencionado toda vez que no se utilizó tubería EMT, la tubería utilizada fue conduit PVC como se evidencia en el registro fotográfico adjunto, por lo tanto, se requiere cambiar el ítem al que corresponde.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.



- **El ítem 9.4, PISO PORCELANATO 60x60, incluye pegante y emboquillado**.

Se requiere memoria de cálculo que aclare la discrepancia de alcance con la actividad reportada en el corte, y justifique la ejecución real. El plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

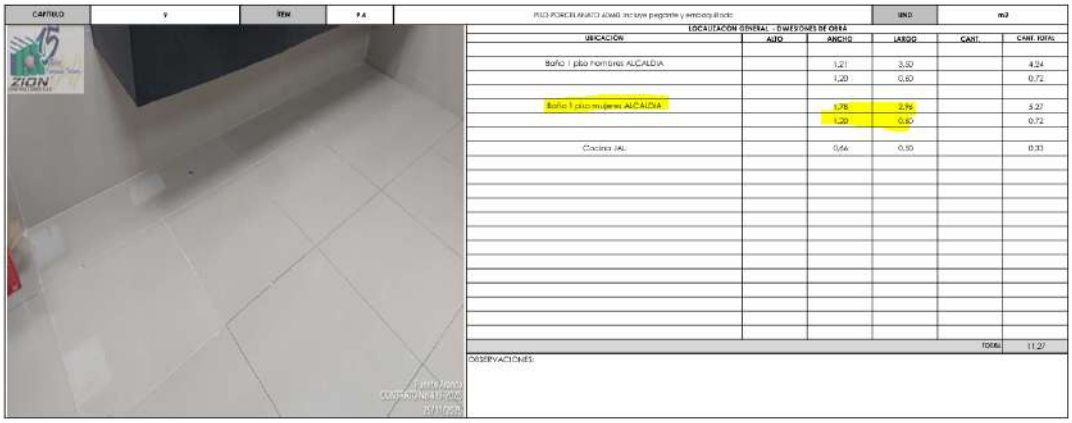

CAPITULO	9	ITEM	9.4	PISO PORCELANATO 60x60. Incluye pegante y emboquillado	UNID	m2
LOCALIZACION GENERAL - DIMENSIONES DE OBRA						
UBICACION		ALTO	ANCHO	LARGO	CANT.	CANT. TOTAL
Baño 1 piso hombres ALCALDIA			1,21	3,50		4,24
			1,20	0,60		0,72
Baño 1 piso mujeres ALCALDIA			1,78	2,96		5,27
			1,20	0,60		0,72
Cocina AA.			0,66	0,50		0,33
					TOTAL	11,27
OBSERVACIONES:						


- **El ítem 11.1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO 30CM X 45CM, incluye boquilla color.**

Se requiere que la memoria de cálculo debe de ser retirado, y debe incluirse un nuevo ítem que corresponda al formato de baldosa usado correspondiente a la medida de 30 cm * 20 cm, por lo tanto, se requiere cambiar el ítem al que corresponda.

- **El ítem 11.4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN DE ALUMINIO.**

Se requiere que el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar, asimismo se deben ratificar las medidas reportadas en la presente memoria de cálculo.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

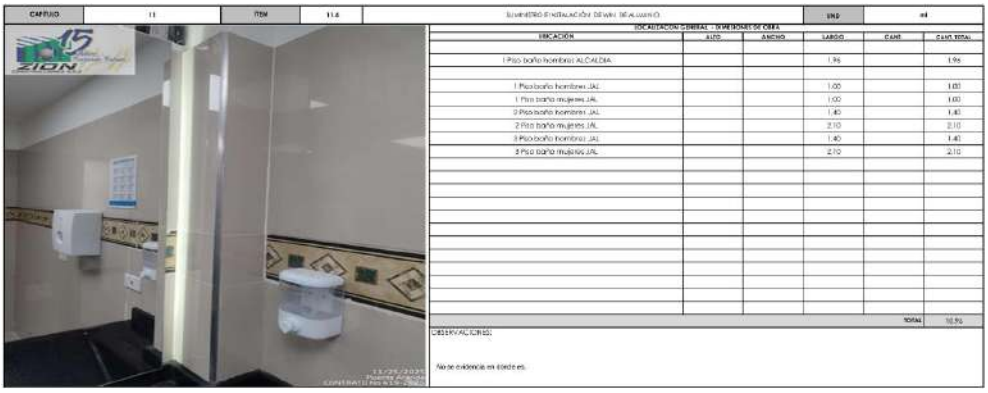

CAPÍTULO	13	ÍTEM	13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 LAVABLE	UND	ml

UBICACIÓN GENERAL - DIMENSIONES DE OBRA

UBICACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	CANT.	CANT. TOTAL
1 Piso baño hombres ALCALDIA			1.96		1.96
1 Piso baño hombres JAL			1.00		1.00
1 Piso baño mujeres JAL			1.00		1.00
2 Piso baño hombres JAL			1.40		1.40
2 Piso baño mujeres JAL			2.10		2.10
3 Piso baño hombres JAL			1.40		1.40
3 Piso baño mujeres JAL			2.10		2.10
				TOTAL	10.96

OBSERVACIONES:

No se evidencia en sitio de es

- **El ítem 13.1. VINILO MUROS INTERIORES TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS, incluye resanes, filos, dilataciones y andamios.**

Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar. Ya que se encuentra una diferencia en cuanto a cantidades, por otro lado, durante el periodo correspondiente al ACTA PARCIAL No. 2 esta actividad no fue ejecutado en el piso 1 del Edificio de JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).


- **El ítem 13.2, PINTURA VINILO TECHOS (2 manos).**

Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar. Ya que se encuentra una diferencia en cuanto a cantidades, por otro lado, durante el periodo correspondiente al ACTA PARCIAL 2 esta actividad no fue ejecutado en el piso 1 del Edificio de JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL) y baños de 2 piso del Edificio de JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).

- **El ítem 14.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA EN SUPERBOARD 6MM, incluye tornillería, masilla, andamios. No incluye perfilería, ni pintura.**


Se requiere memoria de cálculo que aclare la discrepancia de alcance con la actividad ya que, en esta no se hace uso de andamio. Adicional, rectificar el cálculo de cantidades, se adjuntan cantidades de para **ítem NP-24**.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

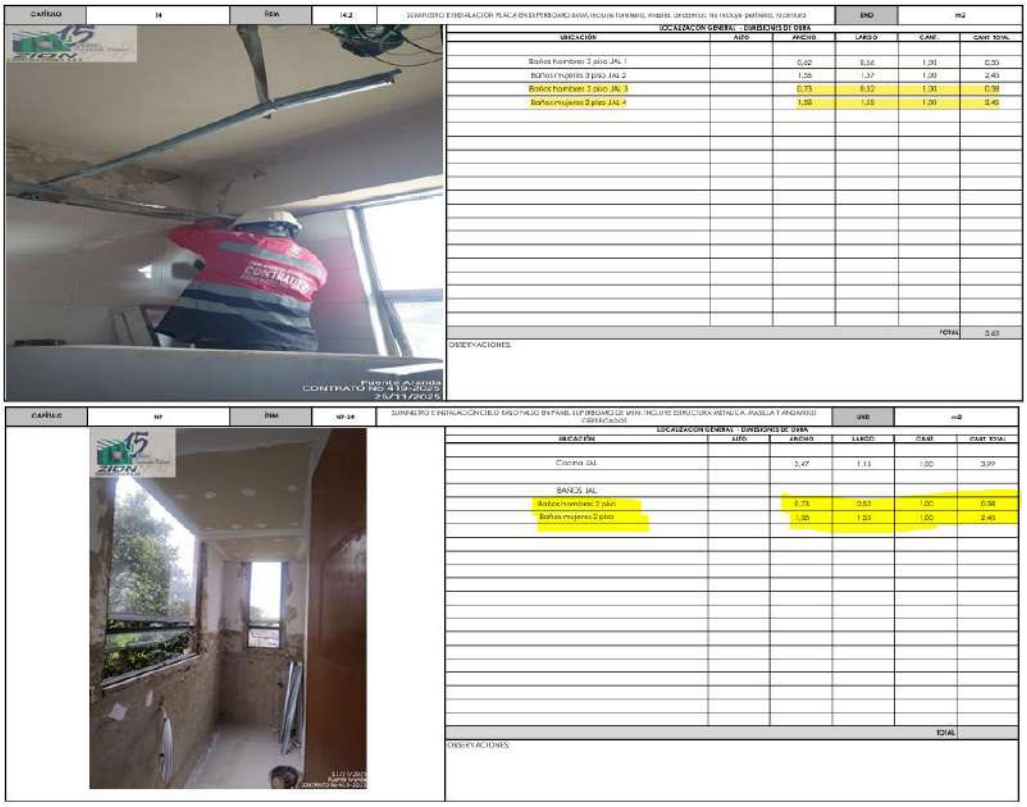

- **El ítem 16.2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE Perfilería Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO - VIDRIO Ttemplado 5 mm.**


Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que la actividad no se ha ejecutado la instalación, y la puerta del registro fotográfico no corresponde a una puerta batiente.

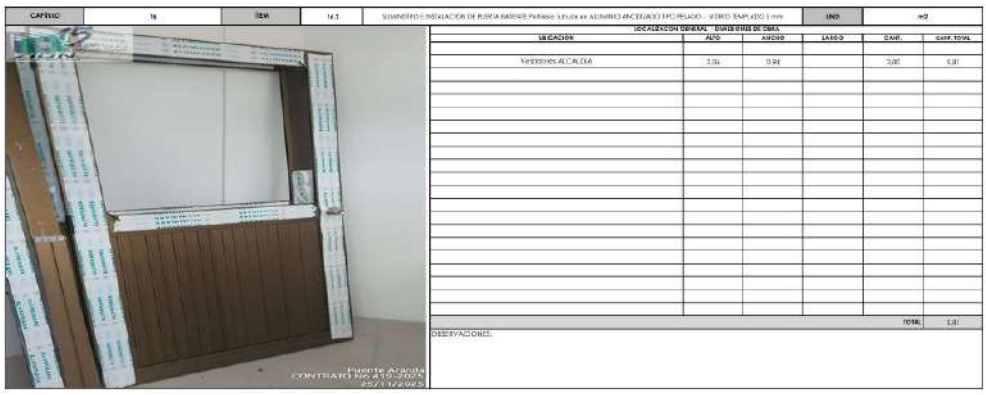

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

- **El ítem 16.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS. Incluye puertas y accesorios para su correcto funcionamiento.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que la actividad no se ha ejecutado para el corte.

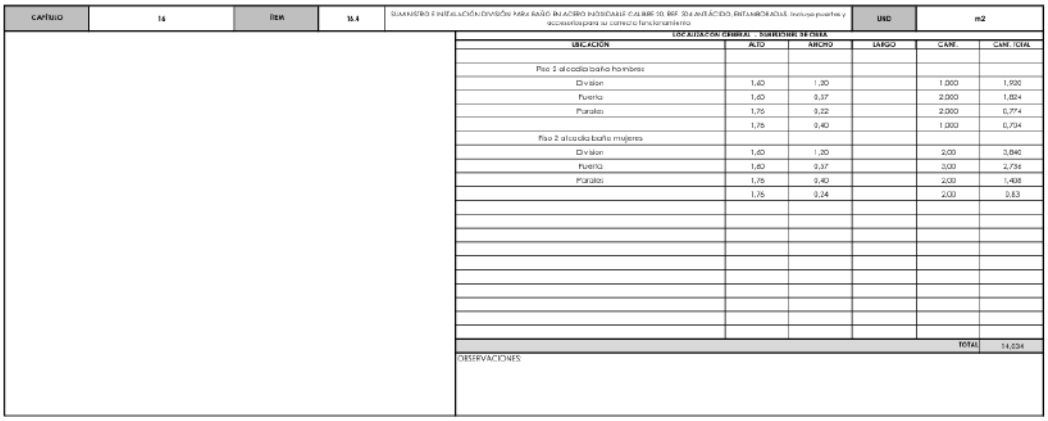

CAPÍTULO	16	ÍTEM	16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS. Incluye puertas y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	m2

LOCALIZACIÓN ORIGINAL - SUMINISTRO DE OBRA

UBICACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	CANT.	CANT. TOTAL
Piso 2 alcaldía baño hombres					
División	1,60	1,20		1.000	1,920
Puerta	1,60	0,37		2.000	1,024
Puntales	1,75	0,22		2.000	0,774
	1,75	0,40		1.000	0,704
Piso 2 alcaldía baño mujeres					
División	1,60	1,20		2,00	3,840
Puerta	1,60	0,37		3,00	2,734
Puntales	1,75	0,40		2,00	1,408
	1,75	0,24		2,00	0,83
				TOTAL	14,034

OBSERVACIONES


- **El ítem 16.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS, DIMENSIONES 0.45 x 1.2M.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que la actividad no se ha ejecutado para el corte.

- **El ítem 17.2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL Gotta Corona o equivalente, entrada superior, incluye accesorios de conexión.**

Se requiere memoria de cálculo que aclare la discrepancia de alcance ya que, en esta actividad aún no se ha realizado la instalación de dos elementos (los del piso 2 del edificio de ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA). Hacer el ajuste porque se usa memoria del **ítem 17.1**. Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

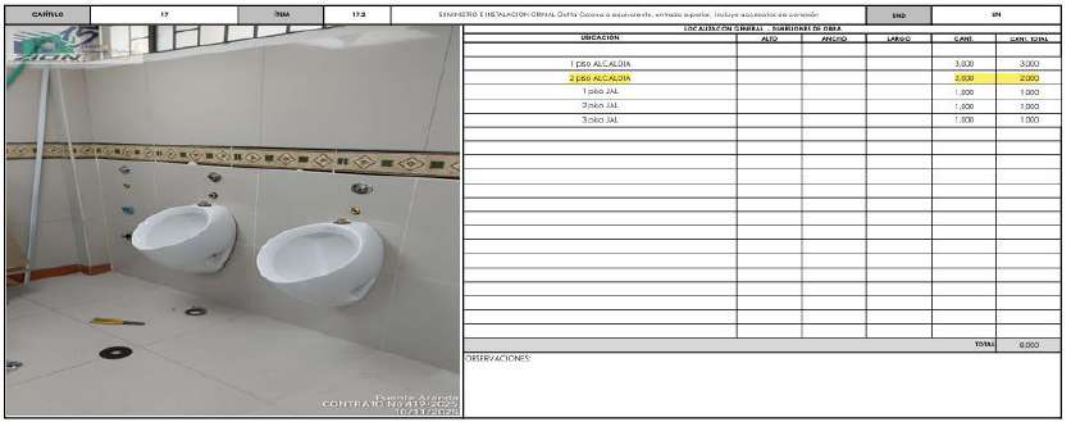

CAPÍTULO	17	ÍTEM	17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL Delta Corona o equivalente, entrada superior, incluye accesorios de conexión	UND	UN

UBICACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	CANT.	CANT. TOTAL
1 piso ALCALDIA				3.000	3.000
2 piso ALCALDIA				2.000	2.000
1 piso JAL				1.000	1.000
2 piso JAL				1.000	1.000
3 piso JAL				1.000	1.000
				TOTAL	0.000

OBSERVACIONES

- **El ítem 17.3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PARA ORINAL PUSH, entrada Superior empotrada antimicrobiano**.

Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

- **El ítem 17.6, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS CON SENSOR. Tipo Sfera Corona o similar.**

Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar ubicación de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar. Hacer el ajuste porque se usa memoria del ítem 17.1 como anexo.

- **El ítem 17.7, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE CON VÁLVULA REGULADORA PARA LAVAMANOS 1/2".**

Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar ubicación de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar. Hacer el ajuste porque se usa memoria del ítem 17.1 como anexo.

- **El ítem 17.8, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea ajustada, debido a que la actividad no se ha ejecutado en su totalidad de instalación a las cantidades en la memoria. Hacer el ajuste porque se usa memoria del ítem 17.1 como anexo. Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar ubicación de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

- **El ítem 17.9, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLI CUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 5CM Y SEPARACIÓN DE GRIFOS MÍNIMA DE 60CM, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM, incluye ángulos, platinas y elementos de fijación, faldón de 20 30cm con salpicaderos**

Se requiere que la memoria de cálculo contenga en el plano anexo, referenciar ubicación de donde es el sitio y la numeración

a que hace referencia del lugar, modificando la longitud de los mesones de lavamanos a los que hace referencia.

- **El ítem 19.2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO CALIDAD PELDAR O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.**

Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención. El plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar. Hacer el ajuste porque se usa memoria del ítem 17.1 como anexo.

- **El ítem 19.5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA MANIJA SATÍN, tipo Austin Yale o equivalente. USAN LA MISMA MEMORIA EL 16.2.**


Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que la actividad no se ha ejecutado para el presente corte del ACTA PARCIAL No.2, y no es una actividad que no incluya la puerta.

- **El ítem NP-1, DESMONTE DE LÁMPARAS.**

Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención. El plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

- **El ítem NP-2, DESMONTE DE REJAS TIPO BANCARIO.**

Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención. El plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

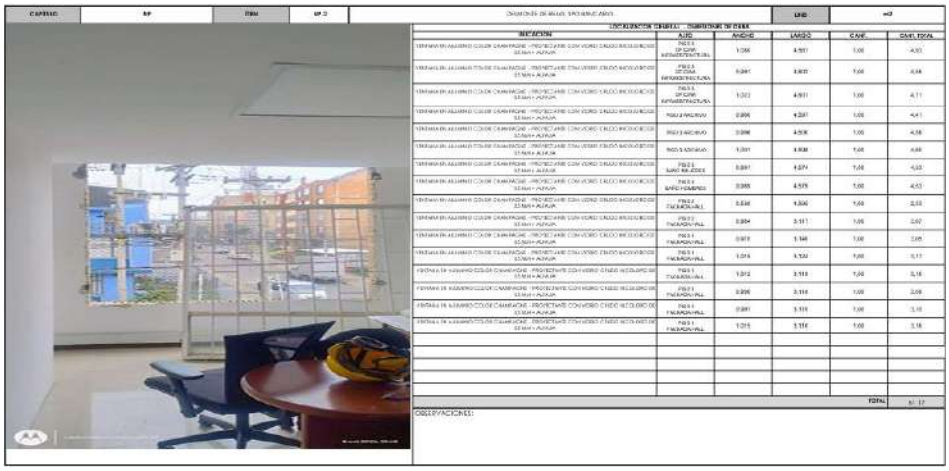

- **El ítem NP-6, SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que no se hace uso de tubería PVC y se correlaciona con el ítem NP-32.

- **El ítem NP-13, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SOBRE CUBIERTA EDIFICIO JAL - INCLUYE POSTES EN TUBERÍA METÁLICA 100X100X3.0MM ANCLADAS A VIGAS AÉREAS EN CONCRETO, CABLE EN ACERO INOXIDABLE PARA TRÁNSITO CONTINUO SOBRE LA CUBIERTA, 10 ANCLAJES QUÍMICOS SOBRE CONCRETO DISCRIMINADOS EN 9 ANCLAJES SOBRE PLACA DE CONCRETO EN CUBIERTA Y 1 PUNTO DE ANCLAJE PARA ACCESO A LA CUBIERTA EL CUAL CONTEMPLARÁ 1 LÍNEA DE VIDA AUTO RETRÁCTIL PARA ACCESO SEGURO, PRUEBA DE SEGURIDAD, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN E INFORME FINAL.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que la actividad no se ha ejecutado para el presente corte del ACTA PARCIAL No.2.

- **El ítem NP-14, PAÑETE MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0,6 M) INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS.**

Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada, debido a que la actividad no se ha ejecutado con andamio para el presente corte del ACTA PARCIAL No.2, por lo tanto, se requiere cambiar el ítem al que corresponda, y adjunte el registro fotográfico unitario de cada tomacorriente.


- **El ítem NP-17, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR.**

Se requiere que el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar.

- **El ítem NP-18, REFUERZO EN MADERA PINO 4X8 CMS.**

Se requiere que el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar que se encuentran los refuerzos dentro de los muros.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

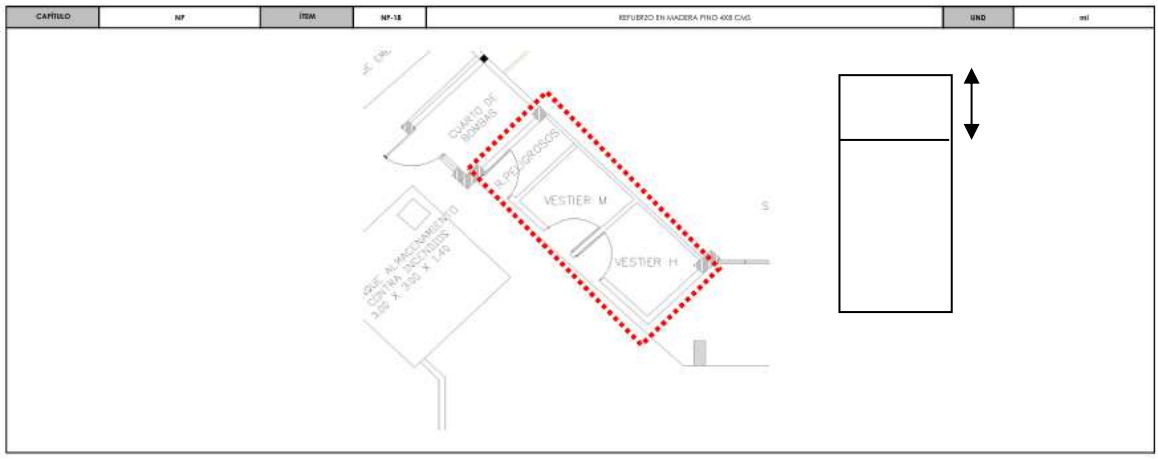

- **El ítem NP-21, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**

Se requiere que el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar donde están ubicados los interruptores.

- **El ítem NP-23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**

Se requiere que en la memoria de cálculo se adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención, el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar donde están ubicados las salidas.

- **El ítem NP-24, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6MM. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**

Se requiere memoria de cálculo que aclare la discrepancia de alcance con la actividad ya que, en esta no se hace uso de andamio. Se requiere que la memoria de cálculo sea retirada.

- **El ítem NP-25, CINTA LED ESPEJOS FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO.**

Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención, el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar donde están ubicadas las cinta led.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

- **El ítem NP-27, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE EDIFICIO ALCALDÍA. INCLUYE ANCLAJE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 316 L, TORNILLO DE ANCLAJE VARILLA MÉTRICA ROSCADA EN ACERO, EPOXICO ALTA RESISTENCIA, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRECINTO DE IDENTIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN E INFORME FINAL.**

Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención, ya que fueron **43 puntos** los ejecutados. el plano debe incluir medidas de donde es el sitio y la numeración a que hace referencia del lugar donde están ubicados.

- **El ítem NP-32, APARATO ELÉCTRICO PARA TOMA CORRIENTE TIPO GFCI.**

Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención. El plano debe incluir medidas de donde están ubicados los tomacorrientes. Adicional, rectificar el cálculo de cantidades, se adjuntan cantidades correspondientes al **ítem 8.6** con respecto a los baños, hacer especificación a que tomas hacen referencia cuando modifiquen el ítem 8.6.


- **El ítem NP-35, SONDEO DE PUNTO SANITARIO DE 2" A 4".**

Se requiere memoria de cálculo que aclare la discrepancia de alcance con la actividad ya que se debe rectificar el cálculo de cantidades, se adjuntan cantidades del **ítem 5.6**. Se requiere memoria de cálculo que adjunte el registro fotográfico que correlacione la cantidad reportada con la zona de intervención. El plano debe incluir medidas de donde están ubicados Requerir que se modifique la cantidad del ítem 5.6 la cual fue cobrada en el ACTA PARCIAL No. 1 y pasar la cantidad a él NP aprobado

Por lo anterior, se **REQUIERE Y EMPLAZA**, de manera **INMEDIATA** al contratista de obra se allegue las memorias de cálculo con las correcciones arriba descritas en un plazo no mayor a UN (1) día contado a partir del recibo del presente comunicado.

Sin otro particular y para fines pertinentes

Cordialmente;



ARQ. FERNANDO BELTRÁN SARMIENTO
Residente de interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Nit: 830.098.495-4

Elaboró: ARQ. FERNANDO BELTRÁN SARMIENTO – Residente de interventoría
Revisó y Verificó: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Representante Legal
Vo. Bo.: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Representante Legal

Copia: ARQ. FREDY ARMANDO MARTIN GUANTIVAR – Profesional de apoyo a la supervisión de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.

CALLE 38 No. 8-12 – OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.
