CONTRATO DE OBRA No. **CLPIH 397 DE 2023**

INFORME DE OBRA No. 3

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA.





MUNICIPIO: **AGRADO.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**


CONTRATO DE (OBRA) No. CLPIH 397 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WIN

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO DE OBRA No.: CLPIH397 DE 2023				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LA ONDINA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA		**PERIODO DEL INFORME**	Entre 17 de julio al 31 de julio de 2024.
CONTRATISTA	CONSORCIO WIN	**NIT:**	901.756.252-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	NORMA PATRICIA LUNA HERNÁNDEZ	**C.C:**	40.441.590	
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	30 DE OCTUBRE DE 2023			
FECHA DE INICIO (D/M/A):	14 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
FECHA DE REINCIO:	17 DE JULIO DE 2024			
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.			
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A			
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.			
VALOR INICIAL:	$ 494.305.625			
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A			

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Cubierta Auto portante con Iluminación se encuentra localizado en la Vereda La Ondina de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila.

El proyecto "Cubierta Autoportante con Iluminación" está situado en la Vereda La Ondina, en la zona rural del Municipio del Agrado, Departamento del Huila. Esta ubicación estratégica se caracteriza por su entorno natural y su accesibilidad, lo que la convierte en un lugar ideal para la implementación de soluciones arquitectónicas innovadoras.

La Vereda La Ondina se distingue por su paisaje montañoso y su rica biodiversidad, proporcionando un contexto inspirador que favorece la integración de la construcción con el medio ambiente. La elección de este sitio no solo busca optimizar la funcionalidad de la cubierta autoportante, sino también aprovechar al máximo la luz natural, garantizando un ambiente iluminado y acogedor.

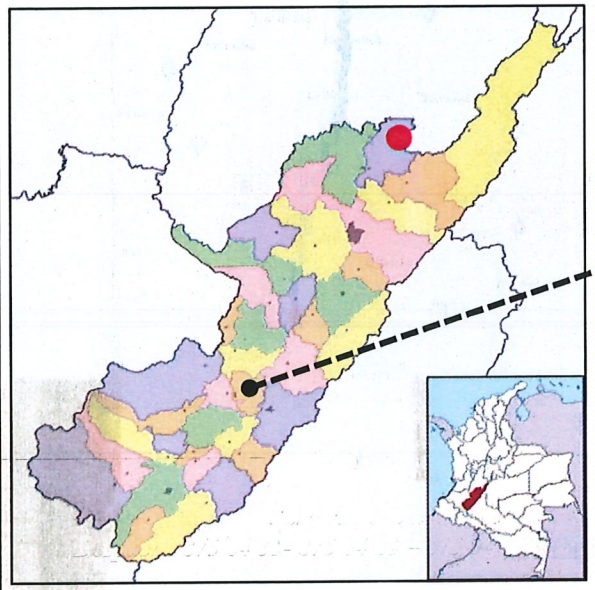







3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Auto portante con Iluminación para la Vereda La Ondina la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema auto portante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, plaza contra piso en concreto reforzado de 3000 PSI.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y actividades logísticas, Tal como se describen en este informe realizado por el contratista.

Junto con el contratista de obra se revisó los ajustes de los diseños emitidos por la entidad contratante (INDERHUILA) el 11 de junio del 2024 y se procede a efectuar el balance de obra teniendo en cuenta los ítems no previstos y mayores y menores cantidades.

Se da inicio al retiro de los 4 postes, corte y figurado del acero de refuerzo Fy= 60.000 P.S.I. de las zapatas de cimentación

Continuamos con el corte y figurado del acero de refuerzo de las zapatas de cimentación.

El 30 de julio la entidad contratante devolvió el balance de obra por lo que es necesario realizar los ajustes para volver a radicar dicha información.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	14/11/2023	44		
Suspensión No. 1	28/12/2023		202	
Reiniciación No. 1	17/07/2023	15		
TERMINACIÓN Cto.				3/09/2024
TOTAL DIAS		59		

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha

	CLPIH397 DE 2023	
ACTA DE INICIO	1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACION	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSÍ NO.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - REINICIO	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO	1	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	3	17 DE JULIO DE 2024
OTROSÍ	2	17 DE JULIO DE 2024

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Actividades Administrativas.

1. Se presentó a la interventoría el cambio del Inspector SISO.
2. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó.
3. Se verifico los ajustes estructurales de diseños entregados por INDERHUILA.
1. Se suscribió con la interventoría el acta de justificación de reinicio N°2 y acta de reinicio N°1 el día 17 de julio del 2024 y así mismo el acta de justificación N°3 del otrosí N°2.
4. Se entrega póliza del acta de reinicio N°1 a la interventoría para su revisión y tramitar a la entidad para su aprobación.
5. Se presentó nuevamente el plan de inversión del anticipo y se retomó nuevamente el trámite para el pago del anticipo los cuales fueron radicado ante la interventoría el día 5 de diciembre del 2023.
6. Se ejecuta el plan de SST.

b). Actividades Operativas.

1. Se verifico los ajustes a los planos estructurales enviados por la entidad contratante INDERHUILA el 11 de junio del 2024.

2. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba le inicio de las actividades:

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de	4 Und.	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.		
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	1912,44 KG	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN; INCL. RETIRO DE LUMINARIAS, CABLEADO Y DEMOLICIÓN DE MACHÓN EN CONCRETO.

Se realizó el retiro de los postes existentes dos en el eje B y dos en el eje A.

Unidad de medida	Cantidad Ejecutada
Und	4

CIMENTACIÓN

ACERO DE REFUERZO FY=60.000 P.S.I. ZAPATAS

Se realizo con el corte y figurado del acero de refuerzo ¾" de las 6 zapatas del eje A

Unidad de medida	Cantidad Ejecutada
KG	1912,44

3.. Se registra el avance diario en la bitácora de obra.


8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el mes de julio, la Vereda La Ondina, ubicada en la zona rural del Municipio del Agrado, Huila, generalmente experimenta un clima característico de la región andina, que se encuentra en plena temporada de lluvias.

En julio, es común que se presenten lluvias frecuentes, con cielos nublados y temperaturas moderadas. Las temperaturas suelen oscilar entre los 15°C y 25°C, creando un ambiente fresco y húmedo. Las precipitaciones son beneficiosas para la agricultura local, ya que favorecen el crecimiento de cultivos y mantienen la vegetación en un estado vibrante.

Los días pueden comenzar con neblina o nubes bajas, y las lluvias suelen ser más intensas en las tardes y noches. Este patrón climático es típico de la región, donde la humedad y las lluvias son esenciales para el ecosistema local.

Durante este el mes de julio la temperatura promedio es de 28°C, en horas de la mañana es una temperatura de 22°C y en a las 3:15 pm se presenta la temperatura más alta de 28°C, como se muestra en la imagen a continuación. El día 24 de julio no se pudo trabajar por fuertes lluvias. El día 25 de Julio no se pudo trabajar por fuertes lluvias.

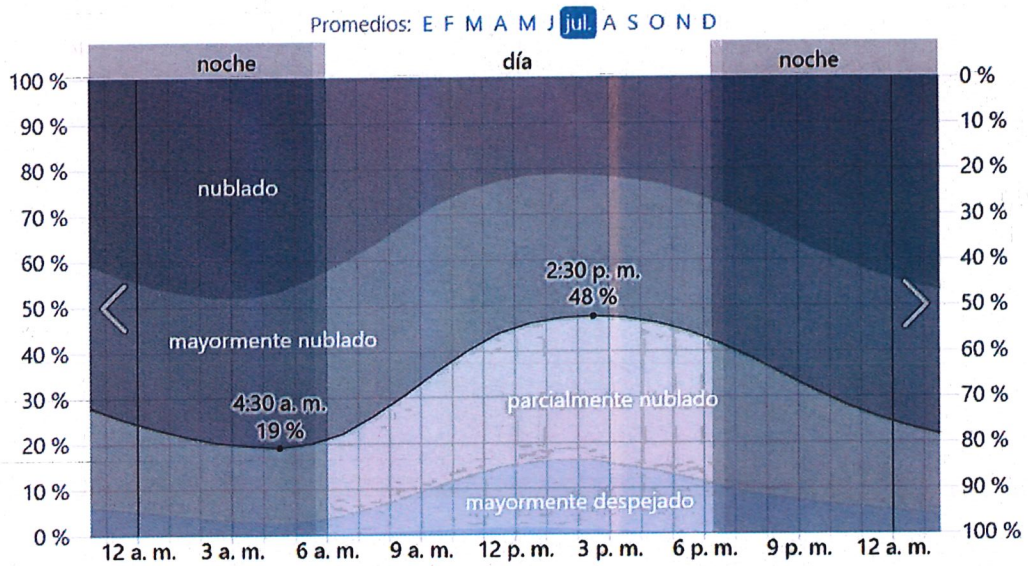

https://es.weatherspark.com/d/22372/7/7/Tiempo-promedio-el-7-de-julio-en-Agrado-Colombia#Figures-CloudCover

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

10. CONTROL DE ANTICIPO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	En tramite	$123.576.406.25		$123.576.406.25
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$494.305.625	$	$494.305.625	$	$ 494.305.625

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
26/07/2024	Ondina	• Comité de obra - 00

12. RELACION DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (17/07/2024) al (31/07/2024)	28/08/2024		Físico
Informe HSEQ (periodo del (17/07/2024) al (31/07/2024)	28/08/2024		Físico
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (17/07/2024) al (31/07/2024)	28/08/2024		Físico
Documentos soportes cambio de profesional SISO periodo del (17/07/2024) al (31/07/2024)	28/08/2024		Físico

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional Contratista)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	40.441.590	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ISMAEL ENRIQUE GUTIRREZ HERRERA	19.379.912	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
MARCO TULIO YAÑEZ	13.450.383	DIRECTOR DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	80.082.099	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	1.077.872.832	INSPECTOR SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIO

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO		EN TRAMITE

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$	7945159752
ISMAEL ENRIQUE GUTIRREZ HERRERA	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800			1064809584
MARCO TULIO YAÑEZ	$ 208.000	$ 52.000	$90.500	$52.000	$	7945159752
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	$ 208.000	$ 162.500	$6.800		$	8632049963
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	$ 40.000	$ 10.000	$17.400	$	$	7970963760

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	30/10/2023	30/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2023	30/012024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2023	30/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	0	03/11/2023	30/10/2023	30/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	1 anulada 2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	14/02/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	14/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	1 anulada 2	06/12/2023	14/11/2023	14/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	3	24/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	3	24/07/2024	14/11/2023	03/09/2024

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	4	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	


Póliza actualizada ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	5	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

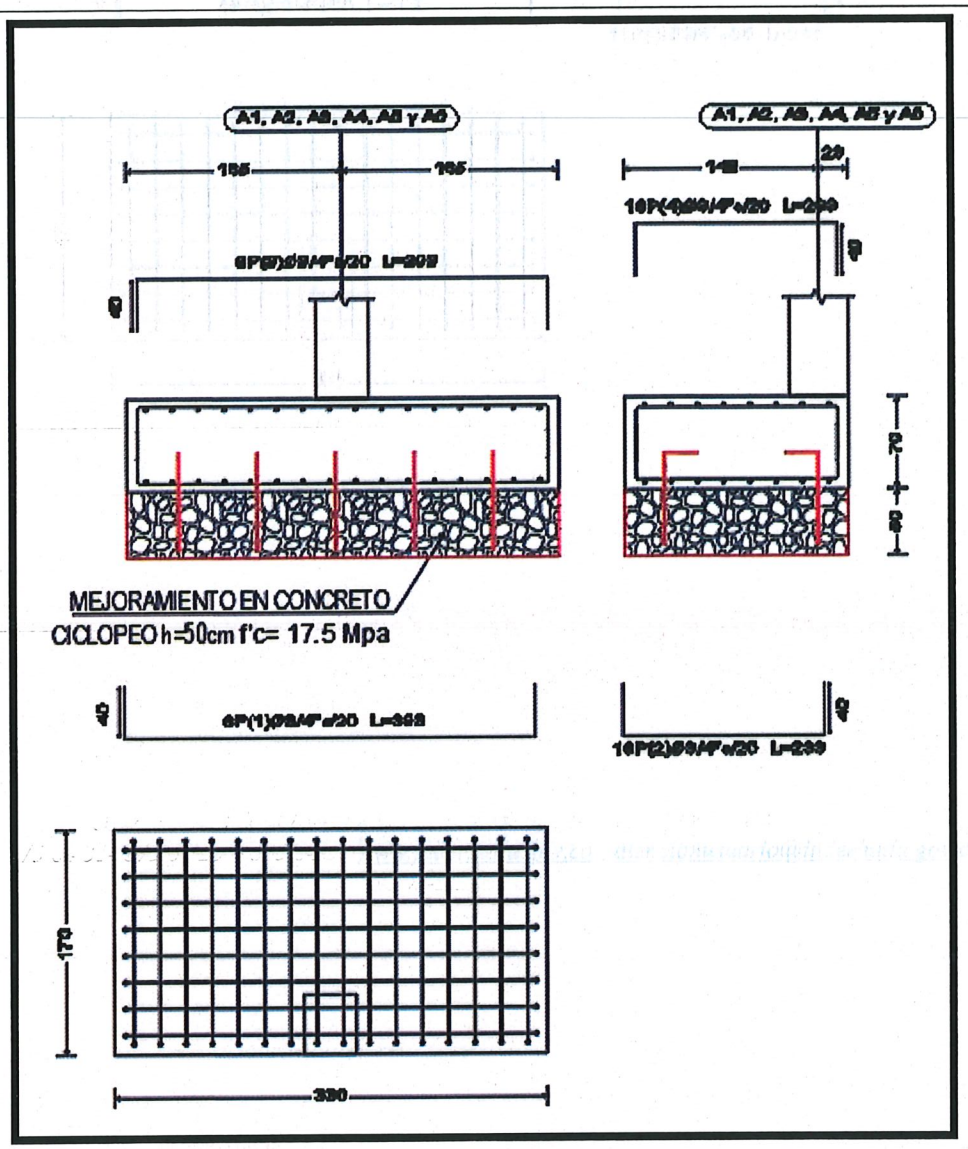
A1, A2, A3, A4, A5 y A6
A1, A2, A3, A4, A5 y A6
MEJORAMIENTO EN CONCRETO
CICLOPEO h=50cm f'c= 17.5 Mpa

18. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

DIAGRAMA DE AVANCE

CONDICIONES CONTRACTUALES								EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL DE JULIO			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM			DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	% EJECUCIÓN
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.01			Localización y replanteo.	M2	515.48	$ 3,571.00	$ 1,840,779.00		$ -	0,00000%	515.48	0.465%
1.02			Demolición cuneta existente.	ML	34.37	$ 7,591.00	$ 260,903.00	0	$ -		0	0.002%
1.03			Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	51.11	$ 26,372.00	$ 1,347,873.00	0	$ -		0	0.066%
1.04			Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	8.86	$ 20,933.00	$ 185,466.00		$ -	0,00000%	6	0.032%

1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1.91	$ 21,837.00	$ 41,709.00	0	$ -		0	0,0000%
1.06	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	$ 117,136.00	$ 234,272.00		$ -	0,00000%	2	0.059%
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	65.73	$ 10,804.00	$ 710,147.00	0	$ -		0	0,0000%
1.08	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	671.85	$ 46,165.00	$ 31,015,955.00		$ -	0,00000%	20,9	0.164%
1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	113.17	$ 84,145.00	$ 9,522,690.00	0	$ -		0	0,0000%
2	CIMENTACIÓN									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	13.45	$ 34,133.00	$ 459,089.00	0	$ -		0	
2.2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	41.27	$ 361,274.00	$ 14,909,778.00	0	$ -		0	
2.3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	62.45	$ 621,249.00	$ 38,797,000.00	0	$ -		0	

2.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	4,127.00	$ 7,142.00	$ 29,475,034.00	1912,44	$ 13,658,646.00	3.35%	1.855,44	3.454%
2.5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	5.38	$ 744,661.00	$ 4,006,276.00	0	$ -		0	
2.6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,109.00	$ 7,142.00	$ 7,920,478.00	0	$ -		0	
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.00	$ 924,080.00	$ 15,709,360.00	0	$ -		0	
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,537.00	$ 7,142.00	$ 32,403,254.00	0	$ -		0	
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	17.00	$ 1,008,424.00	$ 17,143,208.00	0	$ -		0	
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,096.00	$ 7,142.00	$ 14,969,632.00	0	$ -		0	
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60.80	$ 40,490.00	$ 2,461,792.00	0	$ -		0	
4	CUBIERTA									

4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469.68	$ 212,305.00	$ 99,715,412.00	0	$ -		0	
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO									
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317.78	$ 14,850.00	$ 4,719,033.00	0	$ -		0	
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2.00	$ 3,723,874.00	$ 7,447,748.00	0	$ -		0	
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	65.73	$ 85,034.00	$ 5,589,285.00	0	$ -		0	

5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2.90	$ 74,204.00	$ 215,192.00	0	$ -		0	
5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60.80	$ 84,148.00	$ 5,116,198.00	0	$ -		0	
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	60.00	$ 80,428.00	$ 4,825,680.00	0	$ -		0	
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14.30	$ 107,469.00	$ 1,536,807.00	0	$ -		0	
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	2.00	$ 219,826.00	$ 439,652.00	0	$ -		0	
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 351,225.00	$ 702,450.00	0	$ -		0	
7	PLACA POLIDEPORTIVO									

7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4.00	$ 294,388.00	$ 1,177,552.00	4	$ 1.177.552	0.298%	4,00	0.298%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 641,158.00	$ 1,923,474.00	0	$ -		0	
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3.52	$ 46,165.00	$ 162,501.00	0	$ -		0	
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22.00	$ 49,516.00	$ 1,089,352.00	0	$ -		0	
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 305,578.00	$ 611,156.00	0	$ -		0	
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 283,273.00	$ 566,546.00	0	$ -		0	
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,020,417.00	$ 1,020,417.00	0	$ -		0	

7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,717,814.00	$ 4,717,814.00	0	$ -		0	
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14.00	$ 88,848.00	$ 1,243,872.00	0	$ -		0	
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 370,272.00	$ 4,443,264.00	0	$ -		0	
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	$ 58,358.00	$ 3,501,480.00	0	$ -		0	
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,022,387.00	$ 12,268,644.00	0	$ -		0	
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 978,457.00	$ 978,457.00	0	$ -		0	
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,039,024.00	$ 1,039,024.00	0	$ -		0	

7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1.00	$ 2,260,862.00	$ 2,260,862.00	0	$ -		0	
8	TRANSPORTE									
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4.273,49	$ 1.104,00	**$ 4.717.933,00**	0	$ -		0	
Total Costo Directo					**$ 395,444,500.00**		$ 14.429.104,00			
ADMINISTRACION 20%					**$ 79,088,900.00**		$ 2,967,240.00			
IMPREVISTOS 1%					**$ 3,954,445.00**		$ 148,362.00			
UTILIDAD 4%					**$ 15,817,780.00**		$ 593,448.00			
TOTAL COSTO					**$ 395,444,500.00**		$ 18,545,248.00			
% DE AVANCE DE OBRA								**3.649%**		**4.540%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ARQ. MARCO TULIO YAÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO





IMAGEN N°1. CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO DE ZAPATAS

Corte de Acero de Refuerzo: Se llevo a cabo el corte de varillas de acero de refuerzo según las especificaciones técnicas del diseño estructural. Utilizando herramientas adecuadas, se garantizarán cortes precisos que cumplan con las dimensiones requeridas para cada zapata, asegurando así la correcta distribución de las cargas.

Figurado de Acero de Refuerzo: Una vez cortadas, las varillas de acero fueron sometidas a un proceso de figurado, donde se les dará forma de acuerdo con los planos estructurales. Este proceso incluyo doblado y conformado de las varillas para adaptarse a la geometría de las zapatas, asegurando que el acero de refuerzo se integre adecuadamente en la cimentación.



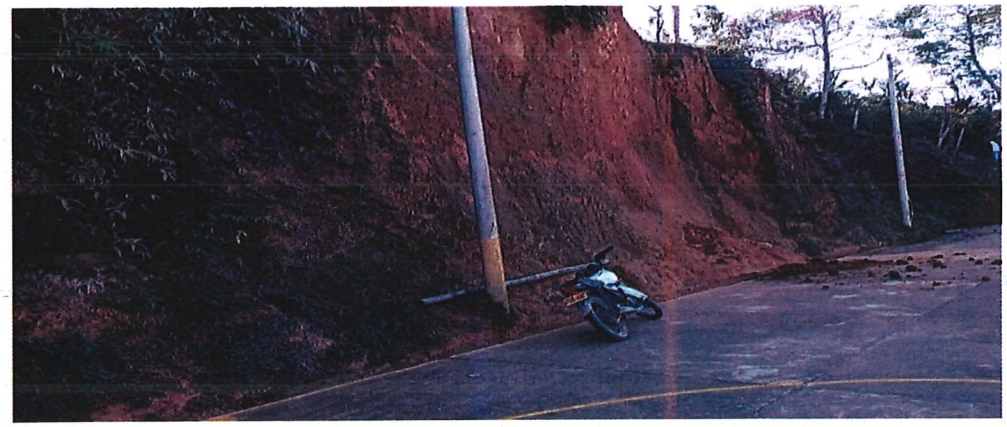


IMAGEN N°2. DEMONTE DE POSTES EXISTENTES

Desmonte de Postes: Utilizando herramientas adecuadas, se procedió a la remoción de los postes. Esto puede incluyo el uso de maquinaria, palancas y otros equipos para asegurar que el desmonte, se realizó de manera eficiente y segura. Se presto especial atención para evitar daños a las estructuras circundantes y al entorno.

Retiro de Materiales: Una vez desmontados, los postes serán retirados del sitio de trabajo. Se gestiono la disposición adecuada de los materiales, ya sea para reciclaje, reutilización o eliminación, de acuerdo con las normativas ambientales vigentes.

20. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA.
- MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DEL PERIODO
- COMITES DE OBRA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
- CERTIFICADO CALIDAD DE MATERIALES (ACERO)
- CARTA CAMBIO INSPECTOR SISO
- HOJA DE VIDA DE INSPECTOR SISO

ARQ.MARCO TULIO YAÑEZ	(28/08/2024)	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F95
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 17/07/2024	3
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/07/2024	
CAPÍTULO:	2 CIMENTACIÓN	UNIDAD:	KG
ITEM:	2.4 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Ø VARILLA	No DE BARRAS	LONG	PESO KG	CANT DE ELLEMENTOS	PESO TOTAL KG
ZAPATAS A1, A2, A3,A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6	3/4	16	3,93	2,25	6	848,88
ZAPATAS A1, A2, A3,A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6	3/4	32	2,33	2,25	6	1.006,56
GANCHOS ANCLAJE CICLOPEO A ZAPATAS	1/2	10	0,95	1	6	57,00
TOTAL						1.912,44

ESQUEMAS:

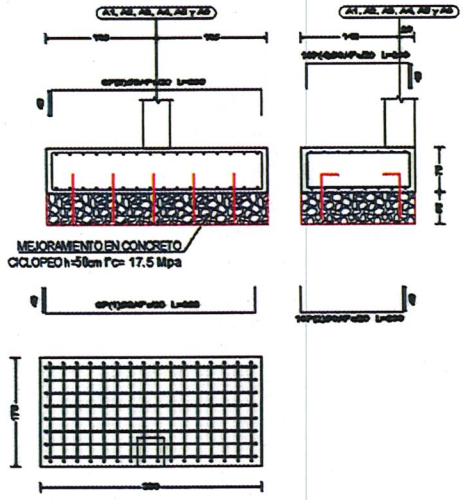

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 17/07/2024	**3**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/07/2024	

CAPÍTULO:	7	**PLACA POLIDEPORTIVO**	**UNIDAD:**	**UND**
ITEM:	7.01	**Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y**		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.					4,00	4,00
TOTAL						**4,00**

ESQUEMAS:

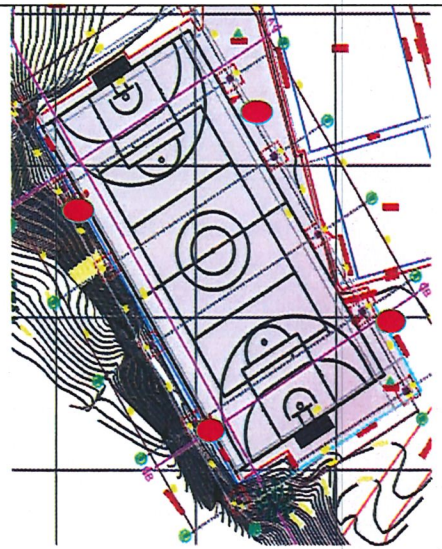

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania** DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901352057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 159A # 13A-46	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SUCURSAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7945159752	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024				
DÍAS DE MORA:	123						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1127894924				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 0	$ 208.000	$ 18.300	$ 226.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 0	$ 208.000	$ 18.300	$ 226.300
SUBTOTALES:										$ 416.000	$ 36.600	$ 452.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 13.800	$ 0	$ 156.000	$ 13.800	$ 0	$ 169.800
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 13.800	$ 0	$ 169.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.100	$ 104.100	$ 9.200	$ 0	$ 113.300
SUBTOTALES:									$ 104.100	$ 9.200	$ 0	$ 113.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 156.000	$ 13.800	$ 169.800
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 13.800	$ 169.800

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13450383	YANEZ VILLAMIZAR MARCO TULIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 27718971	YANEZ VILLAMIZAR GLADYS STELLA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.300.000	FIJO		SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 40441590	LUNA HERNANDEZ NORMA PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 905.500

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-19, 07:19:18 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1064809584 **Referencia pago(PIN)** 8810605065

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202407

Cliente:

PAGADA 2024-08-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA				
Documento	CC 19379912	**Dirección**	CR 50 #64 A - 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114598014		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19379912		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.300.000	230201		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.300.000	$ 6.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-80082099
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-26
FECHA DE PAGO:	2024-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8632049963
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605079864
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/09/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901352057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 159A # 13A-46	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	008 - ONDINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7970963760	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			267				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1468502717

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 0	$ 40.000	$ 7.300	$ 47.300
SUBTOTALES:										$ 40.000	$ 7.300	$ 47.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 10.000	$ 1.900	$ 0	$ 11.900
SUBTOTALES:													$ 10.000	$ 1.900	$ 0	$ 11.900

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.400	$ 17.400	$ 3.200	$ 0	$ 20.600	
SUBTOTALES:									$ 17.400	$ 3.200	$ 0	$ 20.600	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900
SUBTOTALES:			$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1077672832	OSPINA HERMES PEDRO NEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	28	30															230301-PORVENIR	5	$ 250.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 250.000		$ 17.400	5	$ 250.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 91.700

EL INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor, certifica que el informe presentado por el ejecutar del ***Contrato No. CLPIH397 DE 2023*** *", cuyo objeto es la* **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, *cumple con los requisito establecidos en las obligaciones contractuales del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido del 17 de Julio de 2024 hasta el 31 de Julio de 2024.*

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de 2024.

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Interventoría Contrato CIHCM410 de 2023
