
CONTRATO DE OBRA No. **CLPIH 397 DE 2023**

INFORME DE OBRA No. 4

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA.

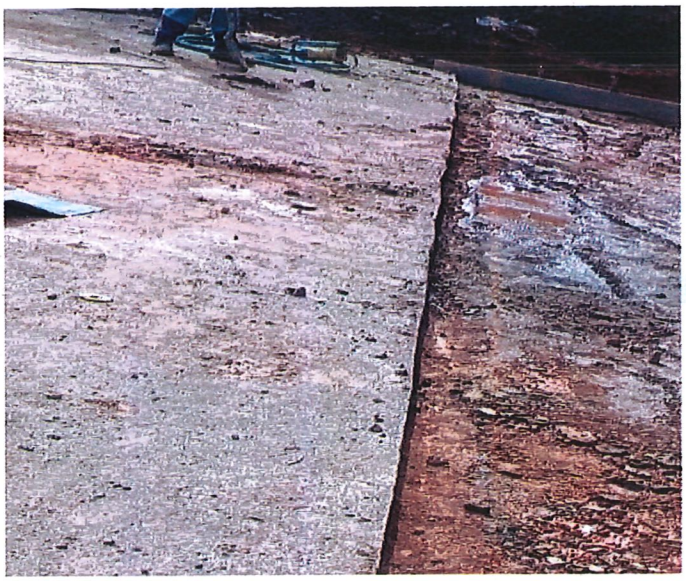

MUNICIPIO: **AGRADO.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE (OBRA) No. CLPIH 397 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WIN

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH397 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LA ONDINA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de agosto al 31 de agosto de 2024.
CONTRATISTA	CONSORCIO WIN	**NIT:**	901.756.252-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NORMA PATRICIA LUNA HERNÁNDEZ	**C.C:**	40.441.590


FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTROSI 1 – FUENTE DE FINANCIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (D/M/A):	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO (D/M/A):	17 DE JULIO 2024
OTROSI 2 – VIGENCIA FISCAL	17 DE JULIO 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTROSI 3 PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/08/2024)	UN (1) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	$ 494.305.625
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A
VALOR FINAL	$ 494.305.625

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Auto portante con Iluminación se encuentra localizado en la Vereda La Ondina de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila.

El proyecto "Cubierta Autoportante con Iluminación" está situado en la Vereda La Ondina, en la zona rural del Municipio del Agrado, Departamento del Huila. Esta ubicación estratégica se caracteriza por su entorno natural y su accesibilidad, lo que la convierte en un lugar ideal para la implementación de soluciones arquitectónicas innovadoras.

La Vereda La Ondina se distingue por su paisaje montañoso y su rica biodiversidad, proporcionando un contexto inspirador que favorece la integración de la construcción con el medio ambiente. La elección de este sitio no solo busca optimizar la funcionalidad de la cubierta autoportante, sino también aprovechar al máximo la luz natural, garantizando un ambiente iluminado y acogedor.

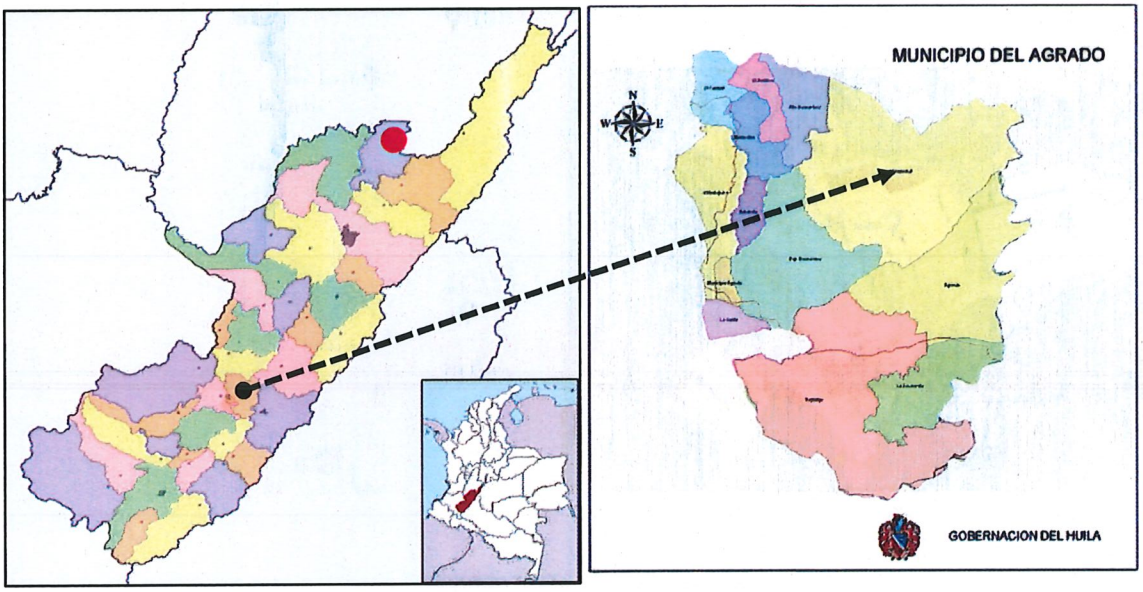





3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Auto portante con Iluminación para la Vereda La Ondina la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema auto portante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, plaza contra piso en concreto reforzado de 3000 PSI.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el mes de agosto, se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

1.04 Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta H=3 m

El desmontaje y retiro completo de estructuras de cerramiento (muros, mallas) hasta una altura de 3 metros, utilizando herramientas manuales según sea necesario. Incluye la carga y disposición.

1.05 Demolición de andén existente (e=0,10 m)

Se realizó con equipo mecánico especializado, fragmentando la capa superficial del andén en secciones para facilitar su extracción. Los residuos se cargaron y transportaron el mismo día para evitar acumulación en el área de trabajo.

1.07 Corte de placa de concreto (e=0,10 m)

Los cortes se efectuaron con sierra diamantada, siguiendo las líneas de trazado previamente establecidas. La operación se desarrolló en jornadas continuas para garantizar precisión en las dimensiones requeridas.

Esta semana se continua en mesas de trabajo con la interventoría para definir el balance de la obra.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
INICIACIÓN	14/11/2023	44		
SUSPENSIÓN NO. 1	28/12/2023		202	
REINICIACIÓN NO. 1	17/07/2023	15		
Otrosi No. 3	27/08/2024	30		

TERMINACIÓN Cto.				03/10/2024
TOTAL DIAS		**89**	**202**	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
CONTRATO	CLPIH397	30 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION No.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTRO SI No. 01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 - SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	2	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03	3	17 DE JULIO DE 2024
OTROSÍ No.02	3	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04	4	27 DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ No.03	3	27 DE AGOSTO DE 2024

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Actividades Administrativas.**	1. Se modifica el plan de inversión de anticipo Pago del anticipo $123.576.406,25., debido a que la entidad descontó el 5% del impuesto a guerra. Por un valor de $6.178.820.00. 2. Se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación N°4 y otrosí N°3 el día 27 de agosto del 2024. 3. Se entregan las pólizas del acta de reinicio N°1 a la interventoría para su revisión y tramitar a la entidad para su aprobación. 4. Se hace tramite de solicitud de pólizas a la aseguradora según otrosí No. 3

b). Actividades Operativas.

1. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba le inicio de las actividades:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**

1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	8.86
1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1.91
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	58


2. Se registra el avance diario en la bitácora de obra. Se cumplió con:
   - Demolición de cerramiento perimetral y anden existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.
   - Corte de placa de concreto e= 0.10 mts
3. Se entrega informe de seguridad y salud en el trabajo.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante este el mes de agosto la temperatura promedio es de 28°C, en horas de la mañana y en horas de la tarde una temperatura de 22°C. Durante el mes de agosto de 2024, la Vereda La Ondina, ubicada en la zona rural del Municipio del Agrado, Departamento del Huila, experimentó un clima característico de la región andina. En general, agosto es un mes que se encuentra dentro de la temporada de lluvias, lo que significa que se pueden esperar precipitaciones frecuentes y temperaturas moderadas.

El día 8 de agosto se presentaron lluvias. El día 12 de agosto se presentaron lluvias. El día 13 de agosto se presentaron lluvias. El día 28 de agosto no se trabajó por lluvias. El día 29 de agosto no se trabajo por lluvias. El día 30 de agosto se presentaron

El clima en Agrado

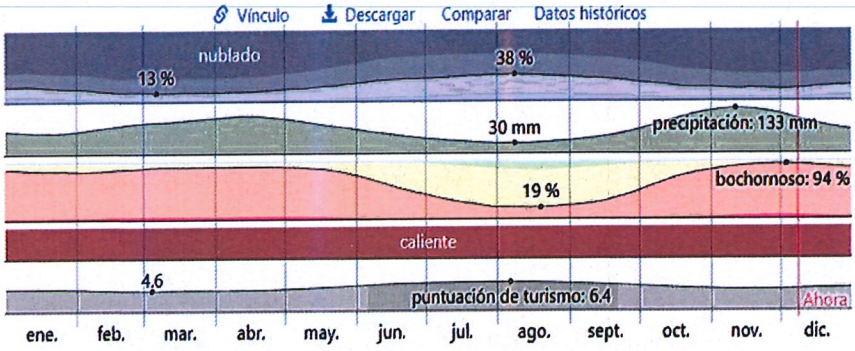

El tiempo por mes en Agrado. Haga clic en cada gráfico para ver más información

lluvias.

https://es.weatherspark.com/y/22372/Clima-promedio-en-Agrado-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Figures-Summary

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica

10. CONTROL DE ANTICIPO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	8 de agosto 2024	$123.576.406.25		$123.576.406.25
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$494.305.625	$	$494.305.625	$	$494.305.625

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
2/08/2024	Ondina	• Comité de obra - 1
16/08/2024	Ondina	• Comité de obra - 2

26/08/2024	Virtual	• Reunión de obra

12. RELACION DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA INTERVENTORIA (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/08/2024) al (30/08/2024)	16/12/2024		Digital
Informe sst (periodo del (01/08/2024) al (30/08/2024))	16/12/2024		Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (01/08/2024) al (30/08/2024)	16/12/2024		Digital

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional Contratista)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	40.441.590	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	19.379.912	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
MARCO TULIO YAÑEZ	13.450.383	DIRECTOR DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	80.082.099	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	1.077.872.832	INSPECTOR SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	12.202.652	MAESTRO DE OBRA	PRESTACION DE SERVICIOS
ULTENGO FIOLE LUIS ALFREDO	12.276.865	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	17.645.756	OFICIAL DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
LOPEZ VALLEJO JOSE HERIBERTO	83.252.051	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
LOPEZ VALLEJO DEIMER ALEXIS	1.004.074.367	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
TEJADA AULLON OSCAR FERNEY	1.004.417.886	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	1.077.858.347	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

TRUJILLO JHON JAIRO	1.079.388.136	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
VEGA VICTORIA JHON FREDY	1.079.388.301	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	S.N.	8/08/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$	7945159825
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$	$	1066282031
MARCO TULIO YAÑEZ VILLAMIZAR	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$	7945159825
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	$ 19.200	$ 4.800	$ 8.400	$ 4.800	$	7946290208
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	$ 72.000	$ 18.000	$ 31.400	$ 18.000	$	7946290208
ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	$ 69.400	$ 17.400	$ 30.200	$ 17.400	$0	7946290208
ULTENGO FIOLE LUIS ALFREDO	$ 34.700	$ 8.700	$ 15.100	$ 8.700	$0	31939769
ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	$ 104.000	$ 26.000	$ 45.300	$ 26.000	$0	31939769
LOPEZ VALLEJO JOSE HERIBERTO	$ 104.000	$ 26.000	$ 45.300	$ 26.000	$0	31939769
LOPEZ VALLEJO DEIMER ALEXIS	$ 34.700	$ 8.700	$ 15.100	$ 8.700	$0	31939769

TEJADA AULLON OSCAR FERNEY	$ 34.700	$ 8.700	$ 15.100	$ 8.700	$0	31939769
ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	$ 104.000	$ 26.000	$ 45.300	$ 26.000	$0	31939769
TRUJILLO JHON JAIRO	$ 34.700	$ 8.700	$ 15.100	$ 8.700	$0	31939769
VEGA VICTORIA JHON FREDY	$ 104.000	$ 26.000	$ 45.300	$ 26.000	$0	31939769

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	30/10/2023	30/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2023	30/012024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2023	30/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	0	03/11/2023	30/10/2023	30/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	1 anulada 2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	14/02/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	14/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	1 anulada 2	06/12/2023	14/11/2023	14/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	3	24/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	3	24/07/2024	14/11/2023	03/09/2024

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	4	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	5	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)


Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.



Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.



Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts

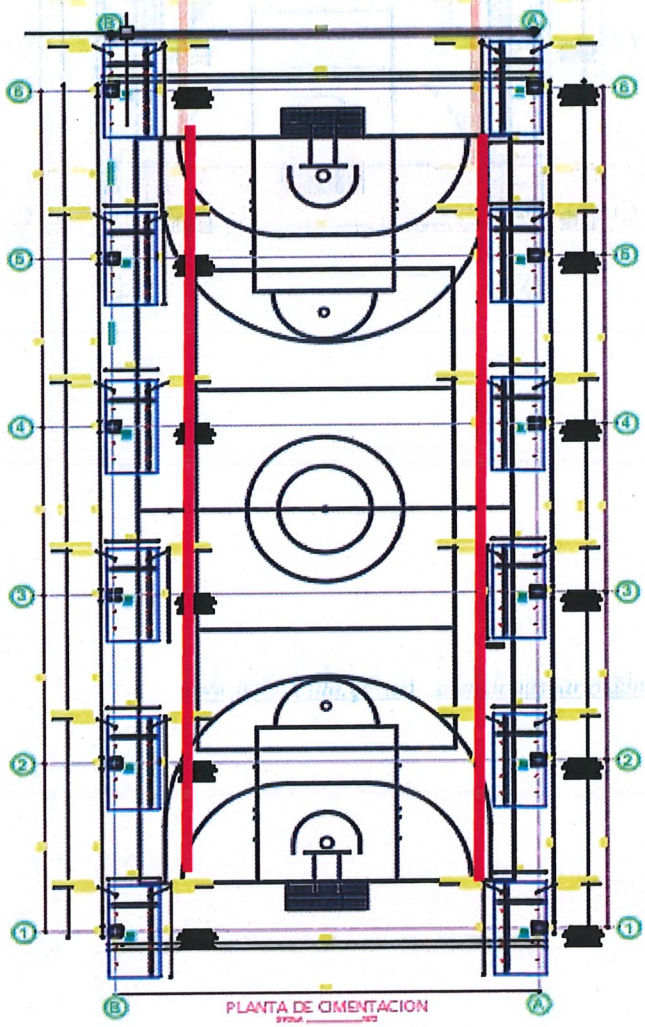

18. INFORME PORCENTAJE AVANCE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	Agosto			
						1/08/2024 - 30/08/2024			
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					cant	vl	%	Acumulado
1.01	Localización y replanteo.	M2	515.48	$ 3,571.00	$ 1,840,779.00		$ -	0.000 %	0.465%
1.02	Demolición cuneta existente.	ML	34.37	$ 7,591.00	$ 260,903.00		$ -	0.000 %	0.002%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	51.11	$ 26,372.00	$ 1,347,873.00		$ -	0.000 %	0.066%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	8.86	$ 20,933.00	$ 185,466.00	6.00	$ 125,598.00	0.031 %	0.062%
1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1.91	$ 21,837.00	$ 41,709.00	1.91	$ 41,709.00	0.010 %	0.010%
1.06	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	$ 117,136.00	$ 234,272.00		$ -	0.000 %	0.059%
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	65.73	$ 10,804.00	$ 710,147.00	58.00	$ 626,632.00	0.153 %	0.153%
1.08	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	671.85	$ 46,165.00	$ 31,015,955.00		$ -	0.000 %	0.164%
1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	113.17	$ 84,145.00	$ 9,522,690.00		$ -	0.000 %	0.000%
2	CIMENTACIÓN						$ -	0.000 %	0.000%
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	13.45	$ 34,133.00	$ 459,089.00		$ -	0.000 %	0.000%
2.2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	41.27	$ 361,274.00	$ 14,909,778.00		$ -	0.000 %	0.000%
2.3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	62.45	$ 621,249.00	$ 38,797,000.00		$ -	0.000 %	0.000%
2.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	4,127.00	$ 7,142.00	$ 29,475,034.00		$ -	0.000 %	3.454%
2.5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	5.38	$ 744,661.00	$ 4,006,276.00		$ -	0.000 %	0.000%
2.6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,109.00	$ 7,142.00	$ 7,920,478.00		$ -	0.000 %	0.000%
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO						$ -	0.000 %	0.000%

3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.00	$ 924,080.00	$ 15,709,360.00		$ -	0.000 %	0.000%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,537.00	$ 7,142.00	$ 32,403,254.00		$ -	0.000 %	0.000%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	17.00	$ 1,008,424.00	$ 17,143,208.00		$ -	0.000 %	0.000%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,096.00	$ 7,142.00	$ 14,969,632.00		$ -	0.000 %	0.000%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60.80	$ 40,490.00	$ 2,461,792.00		$ -	0.000 %	0.000%
4	**CUBIERTA**						$ -	0.000 %	0.000%
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469.68	$ 212,305.00	$ 99,715,412.00		$ -	0.000 %	0.000%
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**						$ -	0.000 %	0.000%
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317.78	$ 14,850.00	$ 4,719,033.00		$ -	0.000 %	0.000%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2.00	$ 3,723,874.00	$ 7,447,748.00		$ -	0.000 %	0.000%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	65.73	$ 85,034.00	$ 5,589,285.00		$ -	0.000 %	0.000%
5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2.90	$ 74,204.00	$ 215,192.00		$ -	0.000 %	0.000%
5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60.80	$ 84,148.00	$ 5,116,198.00		$ -	0.000 %	0.000%
NP 5.6	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UND		$ 2,853,692.00	$ -		$ -	0.000 %	0.000%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**0.00**		$ -	0.000 %	0.000%
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	60.00	$ 80,428.00	$ 4,825,680.00		$ -	0.000 %	0.000%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14.30	$ 107,469.00	$ 1,536,807.00		$ -	0.000 %	0.000%

6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	2.00	$ 219,826.00	$ 439,652.00		$ -	0.000 %	0.000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 351,225.00	$ 702,450.00		$ -	0.000 %	0.000%
NP 6.5	Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento	ml	0.00	$ 60,909.00	$ -		$ -	0.000 %	0.000%
7	**PLACA POLIDEPORTIVO**						$ -	0.000 %	0.000%
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4.00	$ 294,388.00	$ 1,177,552.00		$ -	0.000 %	0.298%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 641,158.00	$ 1,923,474.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3.52	$ 46,165.00	$ 162,501.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22.00	$ 49,516.00	$ 1,089,352.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 305,578.00	$ 611,156.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 283,273.00	$ 566,546.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,020,417.00	$ 1,020,417.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,717,814.00	$ 4,717,814.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14.00	$ 88,848.00	$ 1,243,872.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 370,272.00	$ 4,443,264.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	$ 58,358.00	$ 3,501,480.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,022,387.00	$ 12,268,644.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 978,457.00	$ 978,457.00		$ -	0.000 %	0.000%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,039,024.00	$ 1,039,024.00		$ -	0.000 %	0.000%

7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1.00	$ 2,260,862.00	$ 2,260,862.00		$ -	0.000 %	0.000%
8	**TRANSPORTE**				**0.00**		$ -	0.000 %	0.000%
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4,273.49	$ 1,104.00	$ 4,717,933.00		$ -	0.000 %	0.000%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 395,444,500.00**		$ 793,939.00	0.194 %	4.734%
	ADMINISTRACION			**20%**	**$ 79,088,900.00**		$ 158,788.00		
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 3,954,445.00**		$ 7,939.00		
	UTILIDAD			**4%**	**$ 15,817,780.00**		$ 31,758.00		
	TOTAL COSTO				**$ 494,305,625.00**		$ 992,424.00	% Avance Obra	4.734%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ARQ. MARCO TULIO YAÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO





IMAGEN N°1 Y 2. DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE (MURO, MALLA, CIMENTACIÓN) HASTA, H= 3 MT. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

Se llevo a cabo la demolición de cualquier cerramiento sobrante en el área de trabajo. Una cantidad de 12 ML, la cual contenía malla eslabonada, mampostería a 1 m de altura y columnetas.





IMAGEN N°3 Y 4. CORTE DE PLACA DE CONCRETO E= 0.10mts y demolición de anden.

Se procederá al corte de la placa correspondiente al Eje A, y demolición de anden utilizando herramientas adecuadas para asegurar cortes precisos y limpios. Esta actividad es esencial para la correcta instalación de los elementos estructurales.

20. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA.
- MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DEL PERIODO
- COMITES DE OBRA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
- INFORME SST CONSORCIO WIN
- PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
- SUBCONTRATO MANO DE OBRA
- SOPORTES DESEMBOLSO DE ANTICIPO

ARQ.MARCO TULIO YAÑEZ	(16/12/2024)	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1


OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 1/08/2024	**4**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/08/2024	

CAPÍTULO:	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**UNIDAD:**	**ML**
ITEM:	**1.04**	**Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.**		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante. EJE A FRENTE ACCESO A PLODEPORTIVO		6,00			1,00	6,00
TOTAL						**6,00**

ESQUEMAS:

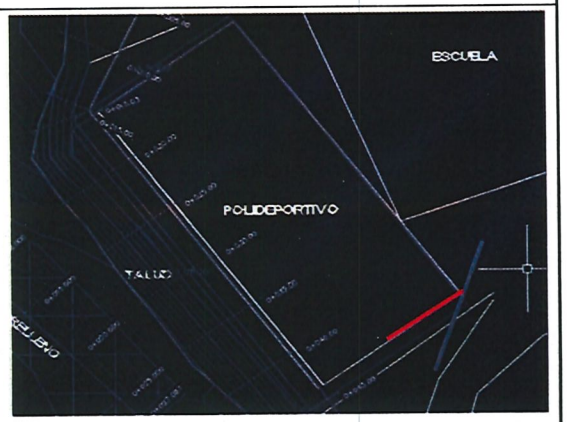

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania** DIRECTOR DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 1/08/2024	**4**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/08/2024	
CAPÍTULO:	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**UNIDAD:** **M2**
ITEM:	**1.05**	**Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.**	1.05

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante ENTRE EJES 1 Y2 EJE A.		1,91	1,00			1,91
TOTAL						**1,91**

ESQUEMAS:

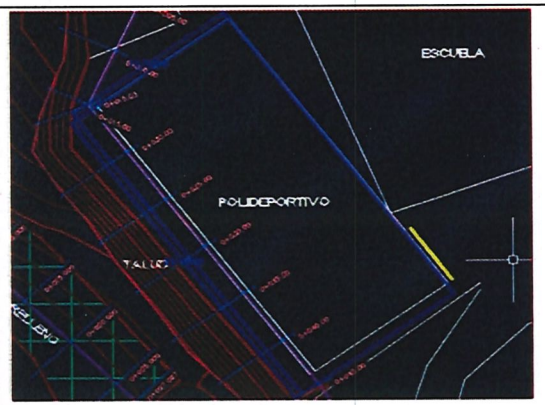

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania** DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/08/2024	4
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/08/2024	

CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	ML
ITEM:	1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Corte Placa concreto e= 0.10 mts. ZAPATAS SOBRE EL EJE A		29,00			2,00	58,00
TOTAL						58,00

ESQUEMAS:

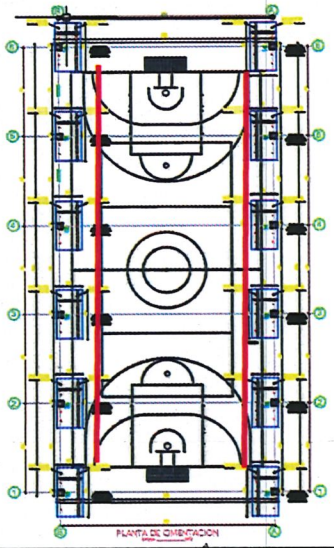

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ing. Falver Eduardo Perdomo Polania DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901352057
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 159A # 13A-46	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SUCURSAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7945159825	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		94			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1127513828

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 208.000	$ 13.900	$ 221.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 208.000	$ 13.900	$ 221.900
SUBTOTALES:										$ 416.000	$ 27.800	$ 443.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 156.000	$ 10.400	$ 0	$ 166.400
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 10.400	$ 0	$ 166.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.100	$ 104.100	$ 7.000	$ 0	$ 111.100
SUBTOTALES:									$ 104.100	$ 7.000	$ 0	$ 111.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 156.000	$ 10.400	$ 166.400
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 10.400	$ 166.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13450383	YANEZ VILLAMIZAR MARCO TULIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 27718971	YANEZ VILLAMIZAR GLADYS ESTELLA	DEPEND	PENSIONADO	$ 1.300.000	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 40441590	LUNA HERNANDEZ NOHORA PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 887.700

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-19, 08:37:59 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066282031 **Referencia pago(PIN)** 8810807983

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202408

Cliente:

PAGADA 2024-09-03

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA				
Documento	CC 19379912	**Dirección**	CR 50 #64 A - 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114598014		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19379912		Residente			Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00						GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.300.000	230201		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.300.000	$ 6.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901756252
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO WIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAJICA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 12A-26	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - SUCURSAL EL AGRAGO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7946290208	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	95		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1127304360

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 91.200	$ 6.200	$ 97.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 69.400	$ 4.700	$ 74.100
SUBTOTALES:										$ 160.600	$ 10.900	$ 171.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 4.800	$ 400	$ 0	$ 5.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.400	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 35.400	$ 2.400	$ 0	$ 37.800
SUBTOTALES:													$ 40.200	$ 2.800	$ 0	$ 43.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.000	$ 70.000	$ 4.800	$ 0	$ 74.800
SUBTOTALES:									$ 70.000	$ 4.800	$ 0	$ 74.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 40.200	$ 2.800	$ 43.000
SUBTOTALES:			$ 40.200	$ 2.800	$ 43.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						ARP				PARAFISCALES									
																												PENSIÓN							SALUD																																		
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1077872832	DSPINA BERMEO PEDRO NEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	52																	230301-PORVENIR	9	$ 450.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.000	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 18.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 450.000		$ 31.400	9	$ 450.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 12202852	VELA TRUJILLO ARQUIMEDES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	21																	231001-COLFONDOS	10	$ 433.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 17.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 433.334		$ 30.200	10	$ 433.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 80082099	RAMIREZ FRANCO JAIME ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI	29																	230301-PORVENIR	2	$ 120.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 19.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 4.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 120.000		$ 8.400	2	$ 120.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 332.300

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12202652	0	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA CAGUANCITO		3132491183		ARQUIVELA1994@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
ERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31939769	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.146.500	72.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
8 de 8	31939769	2024-09-12	Pagada						

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12202652	0	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA CAGUANCITO		3132491163		ARQUIVELA1994@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31939769	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.146.500	72.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8 de 8	31939769		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.466.666	3.466.666	3.466.666	3.466.666	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EP(Administradoras: 3)				8	554.800	0	37.400	0	592.200
PORVENIR	230301	800224808	8	4	416.000	0	28.000	0	444.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	69.400	0	4.700	0	74.100
PROTECCION	230201	800229739	0	2	69.400	0	4.700	0	74.100
PS(Administradoras: 3)				8	138.800	0	9.400	0	148.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	52.000	0	3.500	0	55.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	60.800	0	4.100	0	64.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	26.000	0	1.800	0	27.800
RP(Administradoras: 1)				8	241.600	0	16.300	0	257.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	241.600	0	16.300	0	257.900
CF(Administradoras: 1)				8	138.800	0	9.400	0	148.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	138.800	0	9.400	0	148.200
an Total					1.074.000	0	72.500	0	1.146.500

1038

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12202652
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	EMPLEADOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-16
FECHA DE PAGO:	2024-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31939769
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31939769
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 26.000	$ 27.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 52.000	$ 55.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 60.800	$ 64.900
Subtotal Salud		3	8	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 138.800	$ 148.200
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 69.400	$ 74.100
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 28.000	$ 416.000	$ 444.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 69.400	$ 74.100
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 554.800	$ 592.200
14-11	890903790	ARL SURA	8	$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 241.600	$ 257.900
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 241.600	$ 257.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 138.800	$ 148.200
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 138.800	$ 148.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 72.500	$ 1.074.000	$ 1.146.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2024

Fecha 01 Agosto 2024
Clima. Nublado
Actividades desarrolladas.
- Se continua con la demolición de cerramiento Perimetral.

Residente obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha. 02 Agosto 2024
Clima: Soleado.
- Se continua con la demolicion de cerramiento Perimetral

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha: 08 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividades desarrolladas
- Se continua con la demolición de cerramiento Perimetral el muro, cimentación incluye retiro del material

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria Cristian Junco.

Fecha. 04 Agosto 2024
Clima: Soleado.
Actividades desarrolladas.
- Se continua con la demolición de cerramiento Perimetral muros, cimentación, malla. Altura = 3 mts.
- Se libera actividad de corte para placa.

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 05 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividades desarrolladas.
- Se termina actividad de demolición de cerramiento Perimetral / Altura: 3 mts. y una longitud de: 8:86 ml, incluye retiro

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha: 07 Agosto 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrolladas.
- No se trabajo por dia Festivo

Fecha. 08 Agosto 2024
Clima: lluvioso
Actividad desarrollada.
- Se inicia demolición de anden existente, no se logra avanzar mucho por lluvias.

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 09 Agosto 2024
Clima: Lluvioso Nublado
Actividad desarrollada.
- Se continua a paso muy lento con la demolición de anden existente,

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha: 10 Agosto 2024
Clima: lluvioso
Actividad desarrollada
Se termina la demolición de anden existente con un area de 1.91 m^2

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha: 11 Agosto 2024
Clima: lluvia
Actividades desarrolladas
- No se trabajo por lluvias fuertes en la zona

Residente Obra	Director Obra	Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha: 12 Agosto 2024
Clima: lluvia
Actividades desarrolladas
- No se trabajo por fuertes lluvias.

Residente Obra	Director Obra	Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 14 Agosto 2024
Clima. Nublado.
Actividad desarrollada
- Se inicia la actividad de Corte de placa de concreto con sierra diamantada, siguiendo las lineas trazadas previamente establecidas.

Residente Obra
Jaime Alejandro Ramirez

Director Obra
Marco Tulio Yañez

Director Interventoria
Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 15 Agosto 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con la actividad de corte de placa con sierra diamantada, avanza lento por clima en la zona

Residente Obra
Jaime Alejandro Ramirez

Director Obra
Marco Tulio Yañez

Director Interventoria
Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 16 Agosto 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Se continua con la actividad de corte de placa con sierra diamantada, avanza lento por clima en la zona.

Residente Obra
Jaime Alejandro Ramirez

Director Obra
Marco Tulio Yañez

Director Interventoria
Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 17 Agosto 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada:
- se continua con la actividad de corte de placa avanza lento por clima en la zona

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 18 Agosto 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada:
Nose pudo trabajar por fuertes lluvias en la zona

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco:

Fecha: 19 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada:
- Se continua con corte de placa con sierra diamantada

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo.

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 20 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
Se reinsa corte de placa con Sierra diamantada si sigue el trazado, la operación se desarrollo en Jornadas continuas, sobre eje A

Residente Obra — Jaime Alejandro Ramirez
Director Obra — Marco Tulio Yañez
Director Interventoria — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 21 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
No se trabajo dia Festivo

Residente Obra — Jaime Alejandro Ramirez
Director Obra — Marco Tulio Yañez
Director Interventoria — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 22 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
Se continua con el corte de placa sobre Eje

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 23 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
Se continua con corte placa con sierra diamantada.

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 24 Agosto 2024
Clima: lluvioso
Actividad desarrollada
Se continua con el corte de placa con sierra diamantada, no se avanza mucho por lluvias en la zona.

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 25 Agosto 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
Se continua con corte de placa, no se avanza mucho por lluvias en la zona

Residente Obra — Jaime Alejandro Ramirez
Director Obra — Marco Tulio Yañez
Director Interventoria — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco.

Fecha: 26 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
Se continua con corte de placa,

Residente Obra — Jaime Alejandro Ramirez
Director Obra — Marco Tulio Yañez
Director Interventoria — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 28 Agosto 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
No se labora por lluvias Fuertes

Residente Obra — Jaime Ramirez
Director Obra — Marco Tulio Yañez
Director Interventoria — Faiver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 29 Agosto 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
- No se laboro, por fuertes lluvias.

Residente Obra — Director Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Farver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 30 Agosto 2024
Clima: Lluvioso - Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con el corte de placa, no se avanza mucho por clima en la zona.

Residente Obra — Director de Obra — Director Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez — Marco Tulio Yañez — Farver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Junco

Fecha: 31 Agosto 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Terminación de corte de placa, con sierra diamantada, siguiendo las lineas trazadas con una longitud de 65.73 m.l.

Residente de obra
Jaime Alejandra Ramirez

Director Obra
Marco Tulio Yañez

Director Interventoria
Farver Eduardo Perdomo

Residente Interventoria
Cristian Sanco.
