CONTRATO DE OBRA No. **CLPIH 397 DE 2023**

INFORME DE OBRA No. 8

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: **AGRADO.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE (OBRA) No. CLPIH 397 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WIN

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH397 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LA ONDINA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.
CONTRATISTA	CONSORCIO WIN	**NIT:**	901.756.252-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NORMA PATRICIA LUNA HERNÁNDEZ	**C.C:**	40.441.590
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	30 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		
OTROSI 1 – FUENTE DE FINANCIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN (D/M/A):	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO (D/M/A):	17 DE JULIO 2024		
OTROSI 2 – VIGENCIA FISCAL	17 DE JULIO 2024		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
OTROSI 3 PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/08/2024)	UN (1) MES		
OTROSI 4 MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS	**Adición:** DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 18.061.646,00) M/CTE.		
OTROSI 4 PLAZO ADICIONAL (No.1) (30/09/2024)	UN (1) MES.		
OTROSI 5 PLAZO ADICIONAL (No.3) (30/10/2024)	1 MES		
OTROSI 6 PLAZO ADICIONAL (No.4) (27/11/2024)	22 DIAS		
OTROSI 7 PLAZO ADICIONAL (No.4) (20/12/2024)	1 MES		
PLAZO TOTAL:	7 MESES Y 22 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	$ 494.305.625.00		


VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$ 18.061.646.00
VALOR FINAL	$ 512.367.271.00

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Auto portante con Iluminación se encuentra localizado en la Vereda La Ondina de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila.

El proyecto "Cubierta Autoportante con Iluminación" está situado en la Vereda La Ondina, en la zona rural del Municipio del Agrado, Departamento del Huila. Esta ubicación estratégica se caracteriza por su entorno natural y su accesibilidad, lo que la convierte en un lugar ideal para la implementación de soluciones arquitectónicas innovadoras.

La Vereda La Ondina se distingue por su paisaje montañoso y su rica biodiversidad, proporcionando un contexto inspirador que favorece la integración de la construcción con el medio ambiente. La elección de este sitio no solo busca optimizar la funcionalidad de la cubierta autoportante, sino también aprovechar al máximo la luz natural, garantizando un ambiente iluminado y acogedor.

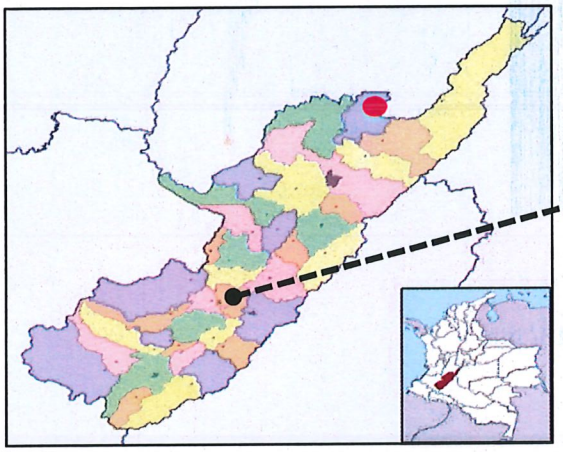







3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Auto portante con Iluminación para la Vereda La Ondina la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema auto portante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, plaza contra piso en concreto reforzado de 3000 PSI.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el periodo de Diciembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades:

1.03 – Demolición de placa de concreto (e=0,10 m)

Se ejecutó la demolición de la placa de concreto existente de 10 cm de espesor, identificando su deterioro, presencia de grietas y ausencia de malla electrosoldada. Para garantizar un adecuado empalme con la nueva placa, se demolió hasta la junta de dilatación conforme a las especificaciones técnicas. También se demolió placa en el eje del colegio para permitir la construcción de cunetas.

3.01 – Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2 – 3000 PSI

Se llevó a cabo la instalación de formaletas y el vaciado de concreto de 3000 PSI para la conformación de columnas sobre el eje colindante al talud. Las actividades se ejecutaron conforme a planos estructurales y normativas técnicas aplicables.

1.09 – Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente

Se realizó el relleno con recebo seleccionado en las áreas previamente excavadas en los dos ejes. El material fue colocado en capas y compactado mecánicamente para alcanzar la densidad requerida, tras la pérdida de suelo por lluvias constantes.

5.03 – Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 m

Se efectuó la instalación de la malla electrosoldada y la construcción de la placa de piso de 10 cm de espesor, utilizando concreto de 3000 PSI, en los ejes A y B, siguiendo las especificaciones del diseño.

1.08 – Excavación manual sin clasificar

Se ejecutaron excavaciones manuales en el área de cunetas, entre los ejes A y B, para instalación de tuberías de 6" y 8", y construcción de cajillas. También se realizó la excavación y retiro de material en el talud entre los ejes 1-3, con un volumen aproximado de 22.11 m³, con el objetivo de continuar con las labores en esa zona.

3.04 – Acero de refuerzo (Fy=60,000 PSI) para Viga Canal

Se procedió con el armado del acero de refuerzo para la viga canal en los dos ejes, organizando las barras y estribos de acuerdo con los diseños estructurales. Se instalaron los traslapos según norma y se preparó la formaleta correspondiente para su posterior vaciado.

NP 6.5 – Canal para conducción de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo-cemento

Se continuó con la ejecución del canal a cielo abierto utilizando sacos trinchera rellenos con mezcla de suelo-cemento, respetando las pendientes establecidas. Se dejó previsto que el propietario de la vivienda en la parte alta del talud deberá encargarse de canalizar sus aguas lluvias, ya que no se autorizó intervención fuera del perímetro del colegio.

8.01 – Transporte de materiales pétreos

Se gestionó el transporte y acopio de materiales pétreos en la zona de intervención, asegurando su disponibilidad para las labores de mezcla y vaciado de concreto en distintas estructuras.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	14/11/2023	44		
Suspensión No. 1	28/12/2023		202	
Reiniciación No. 1	17/07/2023	15		
Otrosi No. 3	27/08/2024	30		
Otrosi No. 4	30/09/2024	30		
Otrosi No. 5	30/10/2024	30		
Otrosi No. 6	27/11/2024	27		
Otrosi No. 7	20/12/2024	23		
TERMINACIÓN Cto.		10		23/01/2025
TOTAL DIAS		209	202	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION No.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTRO SI No. 01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 - SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03	3	17 DE JULIO DE 2024
OTROSÍ No.02	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04	4	27 DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ No.03	3	27 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.05 - ACTA DE MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS No.01	5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.04	4	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA	6	30 DE OCTUBRE DE 2024
OTROSI	5	30 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA	7	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI	6	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.08	8	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.07	7	20 DE DICIEMBRE DE 2024

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Actividades Administrativas.**	1. Se está trabajando en la proyección del balance de Mayores y Menores cantidades. 2. De acuerdo a los retrasos en obras presentados por las fuertes lluvias se solicitó prorroga de tiempo al contrato de obra e interventoría para su seguimiento y se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación N°8 y otrosí N°7 el día 20 de diciembre del 2024. 3. Se cargaron al secop 2 las pólizas actualizadas para su revisión y aprobación. 4. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución y se aprueban las cantidades descritas para proyectar parcial 1 5. Se tramita parcia 1 para revisión por parte de la interventoría.
b). **Actividades Operativas.**	1. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba le inicio de las actividades:

PRELIMINARES

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	23.20 m2	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	52.21 m3	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	101.59 m3	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

ESTRUCTURA EN CONCRETO

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	6.965 M3	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	2.078,20 KG	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	162,14 M2	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Canal para conducción de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento	31.00 ML	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

TRANSPORTE


Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Transporte de materiales pétreos	1.074,7246 UND	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

2. Se registra el avance diario en la bitácora de obra.
3. Se entrega sistema de seguridad y salud en el trabajo

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante este el mes de diciembre predomino la lluvia en las horas de la mañana y en horas de la tarde imposibilitando el trabajo en algunas jornadas debido a las lluvias con descargas eléctricas. Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 28 °C, rara vez bajan a menos de *26 °C* o exceden *30 °C*.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 20 °C, rara vez bajan a menos de *19 °C* o exceden *21 °C*. La temperatura mínima promedio diaria más baja es *20 °C* el *21 de diciembre*.

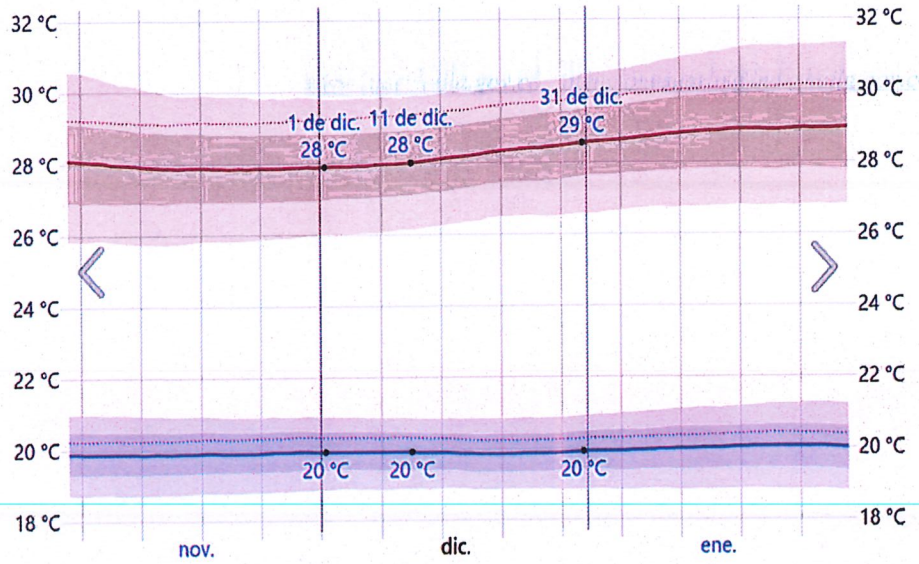

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con las bandas de los percentiles 25° a 75°, y 10° a 90°. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio

https://es.weatherspark.com/y/22372/Clima-promedio-en-Agrado-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Figures-Summary

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

SEND Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO — VEL-005 — V.01

PROYECTO:	LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
SOLICITADO POR:	CONSORCIO WIN
LOCALIZACION:	Columnas Eje B 4, 5, 6. Concreto 3000 PSI
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673 — FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 24/11/2024
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

Cilindro Nº	Nº Intorno	Localización	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
19352		Columnas Eje B 4, 5, 6. Concreto 3000 PSI	3,80	20,00	10,20	81,71	2326,44	21/11/24	28/11/24	7	222,00 kN	3939,44 PSI	27,17 MPa	3	3882,34 PSI	26,77 MPa
19353			3,93	19,70	10,40	84,95	2346,00	21/11/24	28/11/24	7	224,10 kN	3825,23 PSI	26,38 MPa	3		
19354								21/11/24	19/12/24	28						
19355								21/11/24	19/12/24	28						

PROBETAS ELABORADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.3.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de 2 o más probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Bien Formado En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Con Ahusa Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Través De Los Extremos, Se Dan Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

10. CONTROL DE ANTICIPO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	8 de agosto 2024	$123.576.406.25		$123.576.406.25
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$494.305.625	$	$494.305.625	$	$

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
3/12/2024	Ondina	• Verificación de obras – Acta Inder-Huila
13/12/2024	Ondina	• Comité de obra - 10

12. RELACION DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/11/2024) al (30/11/2024)	10/02/2024		Digital
Informe SG-SST (periodo del (1/12/2024) al (31/12/2024)	10/02/2025		Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (1/12/2024) al (31/12/2024)	10/02/2024		Digital
Correspondencia (periodo del (periodo del (01/12/2024) al (31/12/2024)	10/02/2024		Digital

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional Contratista)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	40.441.590	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	19.379.912	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
MARCO TULIO YAÑEZ	13.450.383	DIRECTOR DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	80.082.099	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	1.077.872.832	INSPECTOR SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	12.202.652	MAESTRO DE OBRA	PRESTACION DE SERVICIOS
ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	17.645.756	OFICIAL DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
MENDEZ ANGULO JAIRO	12.200.188	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	1.077.858.347	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
HERNAN JARAMILLO MORERA	12.194.810	SUBCONTRATISTA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
HERNAN DARIO CEDIEL	1.077.871.260	AYUDANTE	CONTRATO POR OBRA O LABOR
TAMERLAN GUTIERREZ PUENTES	1.004.303.415	AYUDANTE	CONTRATO POR OBRA O LABOR
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ	1.077.866.104	INSPECTOR	CONTRATO POR OBRA O LABOR

14. RELACION DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	S.N.	8/08/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	208.000	52.000	6.800	52.000	$	7957949473
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	208.000	162.500	6.800			1068522870
MARCO TULIO YAÑEZ	$ 208.000	$ 52.000	$90.500	52.000	$	7957949473
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	$ 288.000	$ 225.000	$125.300	72.000	$ 54.000	7953602509
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	$ 240.000	$ 187.500	$104.400	60.000	$ 45.000	7953602509
ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	$ 208.000	$ 162.500	$90.500	52.000	$ 39.000	7953602509
ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	$ 227.800	$ 57.000	$99.100	57.000	$0	32901479
MENDEZ ANGULO JAIRO	$ 55.500	$ 13.900	$24.200	13.900	$0	32901479
ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	$ 227.800	$ 57.000	$99.100	57.000	$0	32901479
HERNAN JARAMILLO MORERA	$ 208.000	$ 162.500	$64.200	0	$0	7954087446 7954247257

HERNAN DARIO CEDIEL	$ 208.000	$ 52.000	$31.700	52.000		9479123856
TAMERLAN GUTIERREZ PUENTES	$ 208.000	$ 52.000	$31.700	52.000		9479123856
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ	$ 208.000	$ 52.000	$31.700	52.000		9479123856

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	30/10/2023	30/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2023	30/012024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2023	30/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	0	03/11/2023	30/10/2023	30/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	1 anulada 2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	14/02/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	14/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	1 anulada 2	06/12/2023	14/11/2023	14/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	3	24/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	3	24/07/2024	14/11/2023	03/09/2024

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	4	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	5	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	6	02/09/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	4	02/09/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	7	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	5	10/10/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x ACLARACION OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	8	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	6	10/10/2024	14/11/2023	03/11/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 5

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	9	01/11/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	7	01/11/2024	14/11/2023	03/01//2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	10	04/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/12/2027

				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	8	04/12/2024	14/11/2023	03/01//2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 7


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	11	26/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	


PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	9	26/12/2024	14/11/2023	25/01//2025


17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)

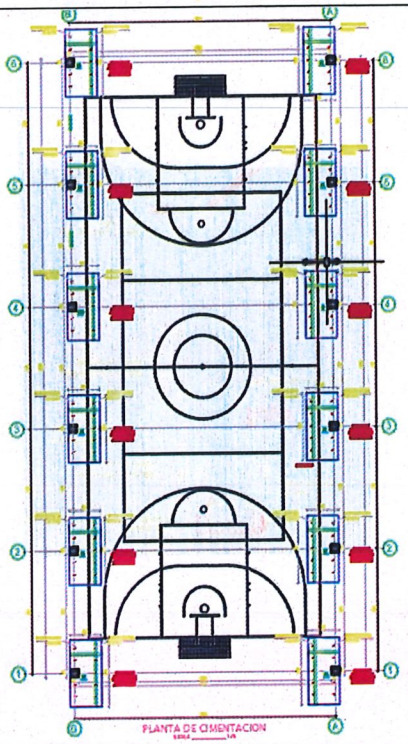


Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante, Excavación manual sin clasificar y Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

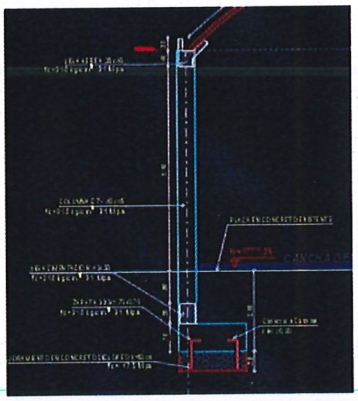


Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.

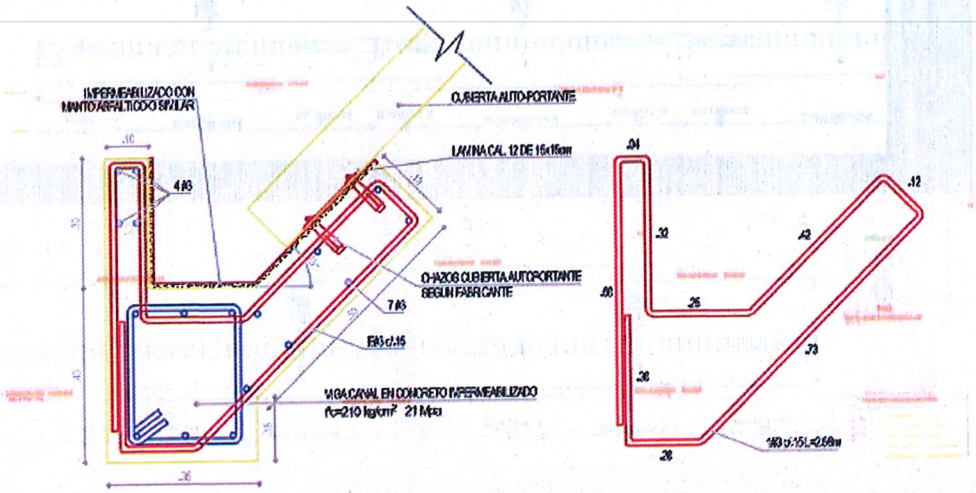


DETALLE VIGA CANAL
ESCALA _____ 1:10

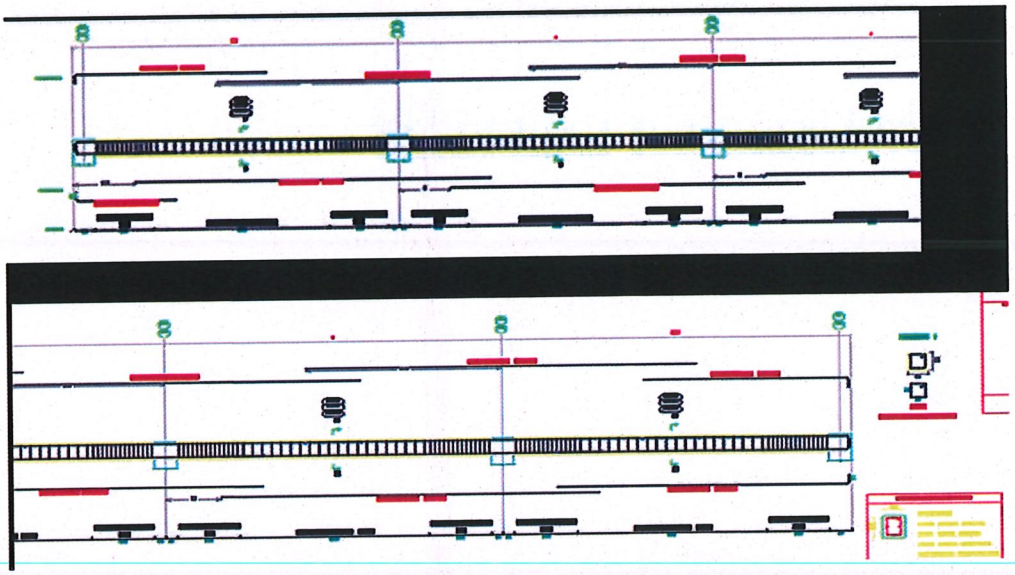

Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal

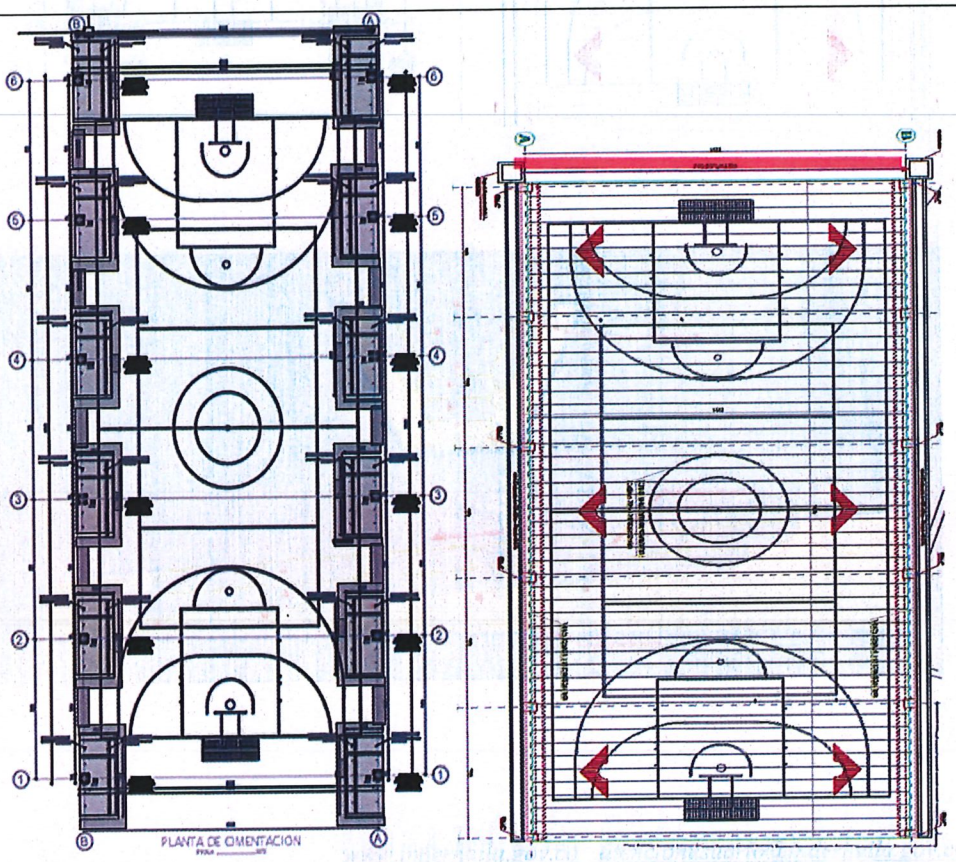

Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.

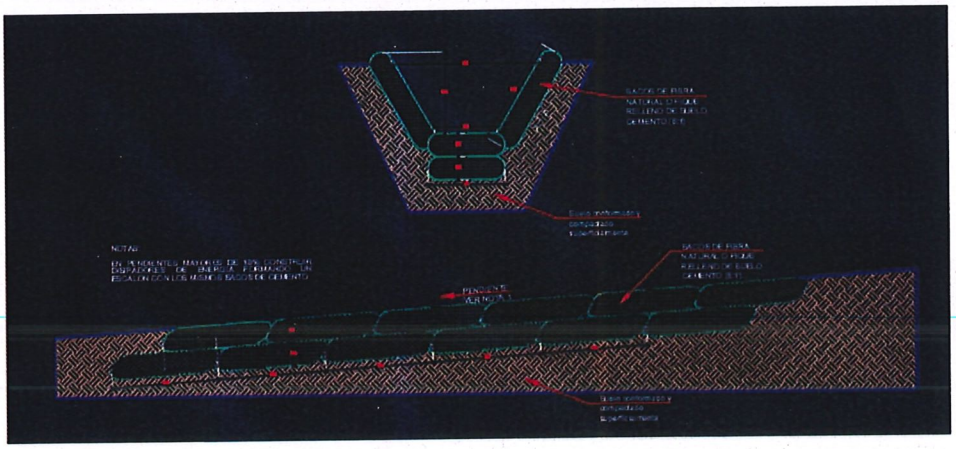

Canal para conducción de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento

18. INFORME PORCENTAJE AVANCE DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICION ACTUALIZADA ACTA DE MODIFICACION No.1		Diciembre			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/TOTAL	cant	vl	%	Acumulado
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.01	Localización y replanteo.	M2	738,43	$ 2.636.934,00		$ -	0,000%	0,643%
1.02	Demolición cuneta existente.	ML	15,20	$ 115.383,00		$ -	0,000%	0,002%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	84,10	$ 2.217.885,00	23,20	$611.830,00	0,149%	0,606%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	8,86	$ 185.466,00		$ -	0,000%	0,061%
1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1,91	$ 41.709,00		$ -	0,000%	0,010%
1.06	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 234.272,00		$ -	0,000%	0,057%
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	58,00	$ 626.632,00		$ -	0,000%	0,153%
1.08	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	311,51	$ 14.380.859,00	52,21	$2.410.275,00	0,588%	2,812%
1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	134,18	$ 11.290.576,00	101,59	$8.548.291,00	2,085%	2,085%
N.P 1,10	Excavación mecanica incluye retiro	M3	964,87	$ 28.142.363,00		$ -	0,000%	6,866%
2	CIMENTACIÓN					$ -	0,000%	0,000%
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	10,80	$ 368.637,00		$ -	0,000%	0,090%
2.2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	33,66	$ 12.160.483,00		$ -	0,000%	2,967%
2.3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	47,12	$ 29.273.253,00		$ -	0,000%	7,142%
2.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3.824,88	$ 27.317.293,00		$ -	0,000%	6,664%

2.5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	11,20	$	8.340.203,00		$ -	0,000%	2,035%
2.6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.267,18	$	9.050.200,00		$ -	0,000%	2,208%
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**						$ -	0,000%	0,000%
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	13,93	$	12.872.434,00	6,965	$ 6.436.217,00	1,570%	3,140%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.303,10	$	30.732.740,00		$ -	0,000%	7,498%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	16,68	$	16.820.512,00		$ -	0,000%	0,000%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2.078,20	$	14.842.504,00	2.078,20	$ 14.842.504,00	3,621%	3,621%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60,80	$	2.461.792,00		$ -	0,000%	0,000%
4	**CUBIERTA**						$ -	0,000%	0,000%
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469,68	$	99.715.412,00		$ -	0,000%	0,000%
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**						$ -	0,000%	0,000%
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	315,13	$	4.679.681,00		$ -	0,000%	0,000%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0,00	$	-		$ -	0,000%	0,000%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	145,88	$	12.404.760,00	162,14	$ 13.787.413,00	3,364%	3,364%
5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2,90	$	215.192,00		$ -	0,000%	0,000%
5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60,80	$	5.116.198,00		$ -	0,000%	0,000%
NP 5.6	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$	5.707.384,00		$ -	0,000%	0,000%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						$ -	0,000%	0,000%

6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	46,40	$	3.731.859,00		$ -	0,000%	0,000%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14,30	$	1.536.807,00		$ -	0,000%	0,000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20,00	$	4.396.520,00		$ -	0,000%	0,000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$	702.450,00		$ -	0,000%	0,000%
NP 6.5	Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento	ml	100,00	$	6.090.900,00	31,00	$ 1.888.179,00	0,461%	0,921%
7	**PLACA POLIDEPORTIVO**						$ -	0,000%	0,000%
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$	1.177.552,00		$ -	0,000%	0,287%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$	1.923.474,00		$ -	0,000%	0,000%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3,52	$	162.501,00		$ -	0,000%	0,000%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22,00	$	1.089.352,00		$ -	0,000%	0,000%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$	611.156,00		$ -	0,000%	0,000%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$	566.546,00		$ -	0,000%	0,000%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$	1.020.417,00		$ -	0,000%	0,000%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$	4.717.814,00		$ -	0,000%	0,000%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14,00	$	1.243.872,00		$ -	0,000%	0,000%


7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 4.443.264,00		$ -	0,000%	0,000%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 3.501.480,00		$ -	0,000%	0,000%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 12.268.644,00		$ -	0,000%	0,000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 978.457,00		$ -	0,000%	0,000%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.039.024,00		$ -	0,000%	0,000%
7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1,00	$ 2.260.862,00		$ -	0,000%	0,000%
8	**TRANSPORTE**					$ -	0,000%	0,000%
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4.058,07	$ 4.480.109,00	1.074,7246	$1.186.496,00	0,289%	1,126%
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 409.893.817,00**		**$ 49.711.205,00**	**12,128 %**	**54,360%**

ARQ.CRISTIAN JUNCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. MARCO TULIO YAÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO



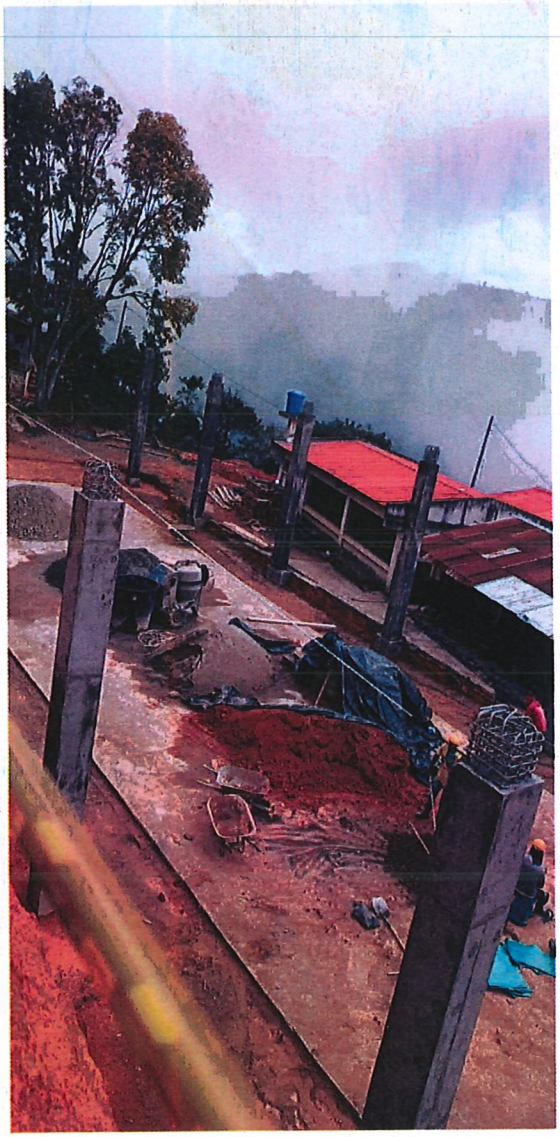

ENCOFRADO Y CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE 3000 PSI EJE TALUD

Se realizó el encofrado y la construcción de columnas utilizando concreto de 3000 PSI en el eje del talud. La estructura fue diseñada y ejecutada con precisión para garantizar la resistencia y estabilidad necesarias en zonas con pendiente. La colocación del concreto se llevó a cabo siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando un acabado uniforme y una correcta compactación para maximizar la durabilidad y la seguridad de la estructura.



DEMOLICIÓN DE PLACA EXISTENTE E = 10CM

Se procederá al corte de la placa correspondiente al Eje A, utilizando herramientas adecuadas para asegurar cortes precisos y limpios. Esta actividad es esencial para la correcta instalación de los elementos estructurales.



RELLENO EN RECEBO Y COMPACTADO MECANICAMENTE

Se realizó el relleno en recebo, asegurando que el material utilizado cumpla con las especificaciones del proyecto. Posteriormente, se llevó a cabo el compactado mecánico del recebo para garantizar la estabilidad, resistencia y reducción de asentamientos futuros. Este proceso es fundamental para preparar la base y asegurar la durabilidad de la estructura, evitando movimientos no deseados y asegurando una superficie uniforme.



INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO DE 10 CM

Se llevo a cabo una inspección del armado, asegurando que las varillas de acero de refuerzo estén correctamente dispuestas y unidas según las especificaciones estructurales.

Se preparará la mezcla de concreto, asegurando que cumpla con las especificaciones de resistencia de 3000 PSI. Se utilizarán materiales de buena calidad, como cemento, agregados y agua, para garantizar la durabilidad de la placa.



CONTINUACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS A CIELO ABIERTO EN SACOS DE SUELO-CEMENTO

Se realizó la continuación del canal de conducción de aguas lluvias a cielo abierto, utilizando sacos de suelo-cemento para formar las paredes y la estructura del canal. La obra fue diseñada para mejorar el drenaje pluvial, asegurando un flujo eficiente y controlado del agua. La utilización de sacos de suelo-cemento proporciona resistencia y durabilidad, permitiendo una solución efectiva y de bajo costo para el manejo de aguas pluviales en la zona.




EXCAVACION MANUAL DE CUNETA Y CAJILLAS

Se realizó la excavación manual de cunetas y cajillas para el sistema de drenaje, siguiendo las dimensiones y especificaciones del proyecto. Este trabajo se llevó a cabo con herramientas manuales, asegurando precisión en la profundidad y ancho, y facilitando la correcta instalación de las tuberías o sistemas de drenaje. La excavación fue realizada cuidadosamente para evitar daños en las estructuras circundantes y garantizar un flujo eficiente del agua pluvial.



EXCAVACION MANUAL DE TUBERIA DE 6" Y DE 8"

Se realizó la excavación manual para la instalación de tuberías de 6" y 8", siguiendo las dimensiones y pendientes requeridas en el proyecto. La excavación se llevó a cabo con herramientas manuales, asegurando la precisión en la profundidad y el ancho, y facilitando la correcta colocación de las tuberías. Este proceso garantiza un sistema de drenaje eficiente y duradero, evitando daños y asegurando un flujo adecuado del agua.

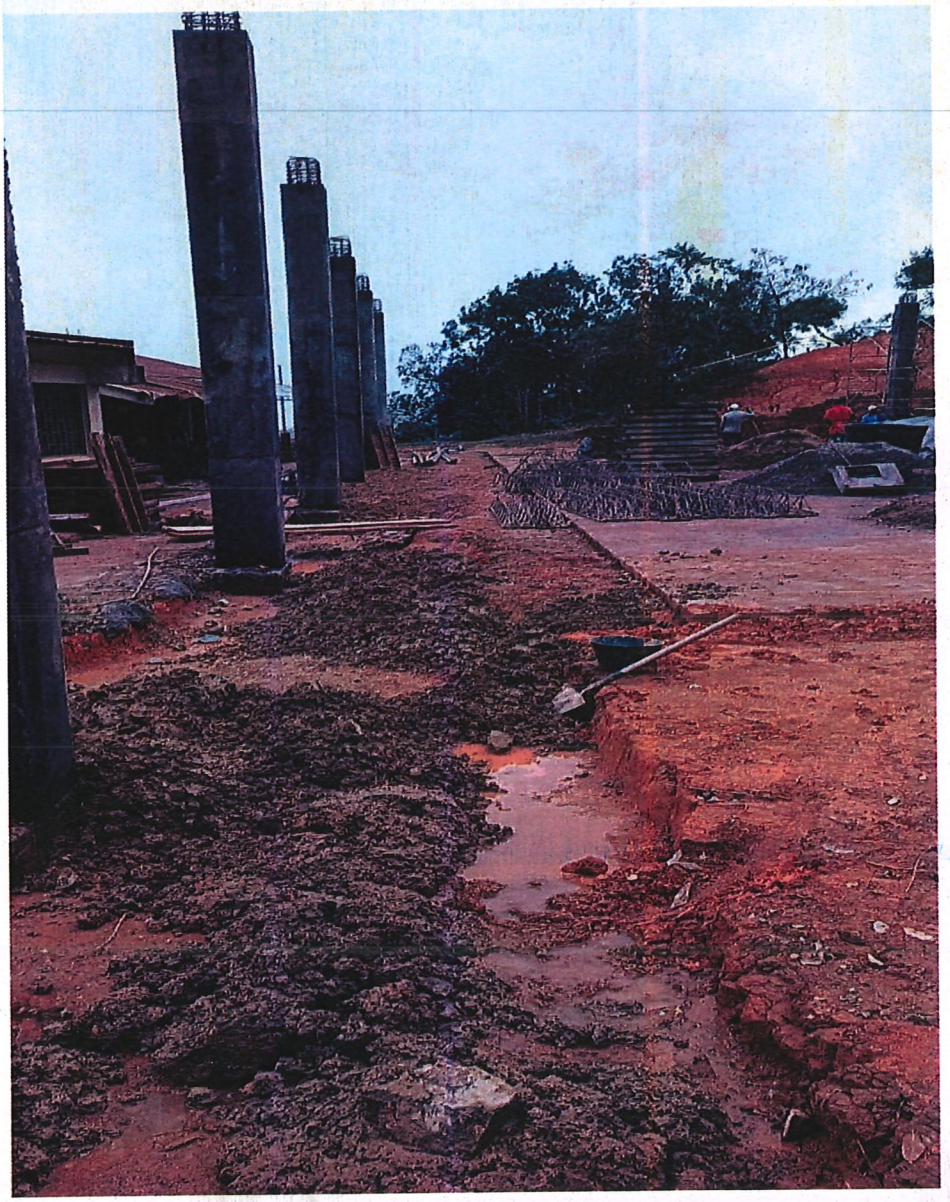

EXCAVACION MANUAL DE PLACA ENTRE EJE A-B

Se realizó la excavación manual para la colocación de la placa en el tramo entre los ejes A y B, siguiendo las dimensiones y especificaciones del proyecto. La excavación se llevó a cabo con herramientas manuales, asegurando la precisión en la profundidad y el ancho necesarios para la correcta instalación de la placa estructural. Este trabajo es fundamental para garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura en esa sección.



FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CANAL

Se realizó el armado (figuración) y la instalación del acero de refuerzo en la viga canal, siguiendo las especificaciones estructurales del proyecto. El proceso incluyó la colocación precisa de las varillas de acero, asegurando la correcta distribución y amarre para garantizar la resistencia y durabilidad de la viga. La instalación fue realizada con cuidado para mantener la integridad del refuerzo y facilitar el vertido del concreto.

Nota: Debido a las fuertes lluvias se presentó un deslizamiento en masa, afectando el eje colindante al talud por lo cual se requirió realizar excavaciones manuales para dejar el área libre y continuar con la ejecución de obra, para ello se constata que se realizaron excavaciones de 22.11 m3.





20. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA.
- MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DEL PERIODO
- COMITES DE OBRA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- INFORME SST CONSORCIO WIN
- PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS
- CONTRATO SUBCONTRATISTA

ARQ.MARCO TULIO YAÑEZ	(10/02/2025)	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo R.L. INTERVENTORIA**


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/12/2024	8
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/12/2024	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Demolicion eje B		29,00	0,80		1,00	23,20
TOTAL						23,20

ESQUEMAS:

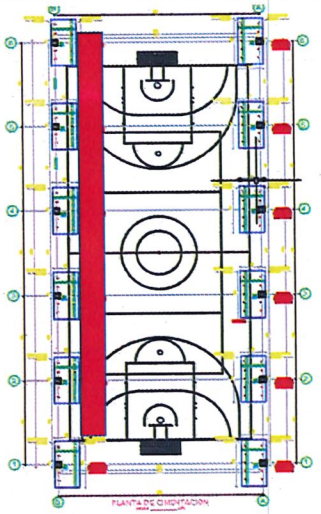

Observaciones:	Durante el proceso de ejecución en el eje colindante del colegio en la placa existente, presento fisuramiento y desprendimiento toda vez que es una placa vieja, por tal razón se requirió demoler hasta el quiebre de dilatación con el fin de hacer una función de placa y empalmarla con la antigua, por tanto se requiere realizar un balance de mayores y menores cantidades.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 2 de 1


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/12/2024	8
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/12/2024	

CAPÍTULO:	1			ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M3
ITEM:	1.08			Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN				LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
EXCAVACION CUNETA				60,80	0,50	0,400	1,00	12,1600
EXCAVACION TUBERIA 6"				14,30	0,50	0,800	1,00	5,7200
EXCAVACION DE 8"				20,00	0,50	0,800	1,00	8,0000
TALUD				2,70	1,40	1,950	3,00	22,1130
PLACA ENTRE EJE A- B				11,10	3,00	0,100	1,00	3,3300
Placa de cancha				-3,00	0,45	0,100	1,00	-0,1350
Cajillas				0,80	0,80	0,800	2,00	1,0240
TOTAL								52,21

ESQUEMAS:

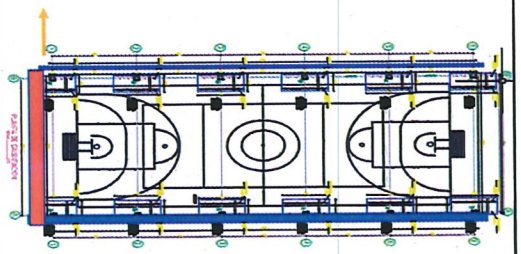

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/12/2024	8
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/12/2024	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M3
ITEM:	1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
RELLENO RECEBO ZAPATA A1		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA A2		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA A3		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA A4		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA A5		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA A6		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA B1		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA B2		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA B3		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA B4		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA B5		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
RELLENO RECEBO ZAPATA B6		3,30	1,70	1,300	1,00	7,29
menos la viga de cimentaciòn		5,60	0,40	0,500	-10,00	-11,20
menos columna de cimentaciòn		1,30	0,40	0,45	-12,00	-2,81
RELLENO RECEBO VIGA DE CIMENTACION EJE A		2,70	0,80	1,30	5,00	14,04
RELLENO RECEBO VIGA DE CIMENTACION EJE B		2,70	0,80	1,30	5,00	14,04
TOTAL						101,59

ESQUEMAS:

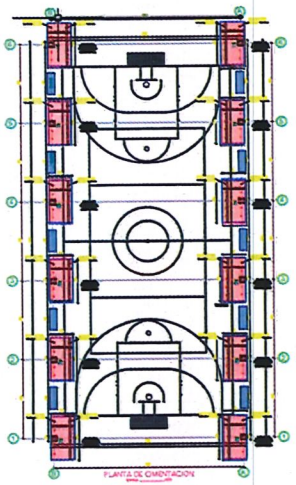

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/12/2024	8
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/12/2024	
CAPÍTULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M3
ITEM:	3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
COLUMNA A1		6,80	0,40	0,450	1,00	1,224
COLUMNA A2		6,80	0,40	0,450	1,00	1,224
COLUMNA A3		6,80	0,40	0,450	1,00	1,224
COLUMNA A4		6,80	0,40	0,450	1,00	1,224
COLUMNA A5		6,80	0,40	0,450	1,00	1,224
COLUMNA A6		6,80	0,40	0,450	1,00	1,224
menos viga aerea		0,45	0,35	0,400	-6,00	-0,378
TOTAL:						6,965

ESQUEMAS:

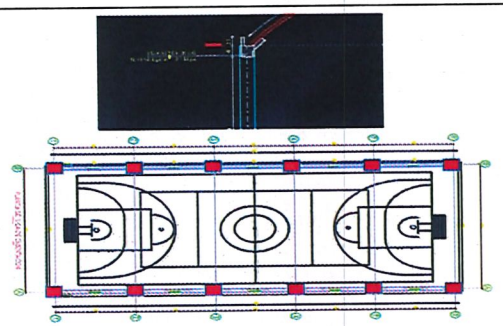

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en los planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1


OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 1/12/2024	**8**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/12/2024	

CAPÍTULO:	**3**	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**UNIDAD:**	**KG**
ITEM:	**3.04**	**Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal**		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Ø VARILLA	No DE BARRAS	LONG	PESO (KG)	CANT DE ELELMENTOS	PESO TOTAL (KG)
Viga canal Eje A1 - A6 y eje B1 - B6	1/2"	8,00	3,85	1,000	2,00	61,60
	1/2"	16,00	6,95	1,000	2,00	222,40
	1/2"	4,00	5,40	1,000	2,00	43,20
	1/2"	16,00	6,75	1,000	2,00	216,00
	1/2"	4,00	2,10	1,000	2,00	16,80
	3/8"	240,00	1,34	0,560	2,00	360,19
Aletas	3/8"	11,00	39,00	0,560	2,00	480,48
Gancho (Fleje)	3/8"	203,00	2,98	0,560	2,00	677,53
TOTAL						**2.078,20**

ESQUEMAS:

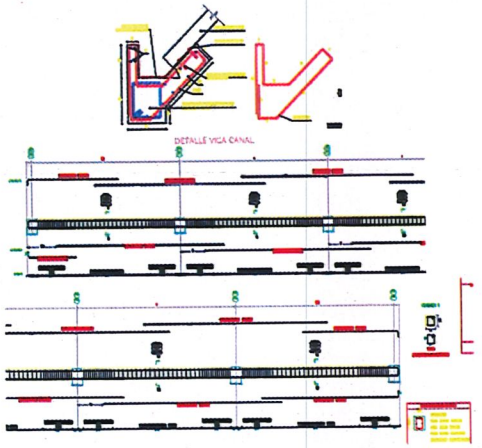

Observaciones:

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 1/12/2024	**8**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/12/2024	

CAPÍTULO:	**5**	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**	**UNIDAD:**	**M2**
ITEM:	**5.03**	**Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.**		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm, EJE A		31,00	2,20		1,00	68,200
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm, EJE B		31,00	3,10		1,00	96,100
Columnas Eje A Y B		0,18	-12,00		1,00	-2,160
TOTAL						**162,14**

ESQUEMAS:

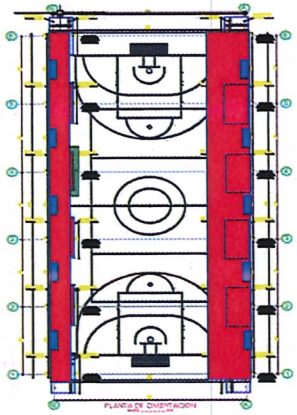

Observaciones:


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
			Versión:	2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023		
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/12/2024	8	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/12/2024		
CAPÍTULO:	NP	0	UNIDAD:	ml	
ITEM:	NP 6.5	Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento			

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

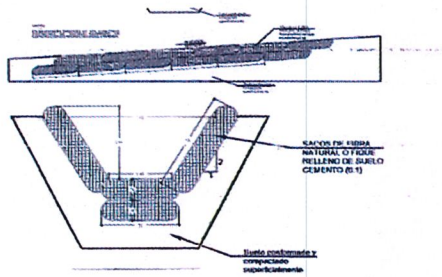DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento		31,00			1,00	31,00	
TOTAL						31,00	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F95
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 1/12/2024	**8**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/12/2024	

CAPÍTULO:	**8**	**TRANSPORTE**	**UNIDAD:**	**M3-Km**
ITEM:	**8.01**	**Transporte de materiales petreos**		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	KILOMETRO	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA CANAL (0,57m3 arena - 0,84m3 grava)	1,41	17,1804	20,00			484,4873	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA DE PISO (0,57m3 arena - 0,84m3 grava)	1,41	20,739400	20,00			584,8511	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA ANDEN (0,57m3 arena - 0,84m3 grava)	1,41	0,191000	20,00			5,3862	
TOTAL						**1.074,7246**	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 30 noviembre 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
- Transporte materiales petreos, Total 392.83 m^3
- Armado Andamios para formaleta Viga canal.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 02 Diciembre 2024
Clima: Lluvias
Actividad desarrollada.
- Se Inicia Excavaciones para tuberias
- Se inicia armado de acero para Viga canal en Concreto. - Eje B.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha. 03 diciembre
Clima: Lluvias
Antividad desarrollado
- No se pudo trabajar por fuertes lluvias

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 04 diciembre 2024
Clima: lluvias
Actividad desarrollada
- Se continua excavación manual segun niveles indicados en planos
- Se continua con armado de acero para Viga Canal en concreto Eje B.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 05 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se termina excavación manual total 24,70 m^3
- Se continua con armado de acero para vigacanal en concreto Eje B
-

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 06 diciembre.
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Se continua con armado de acero para vigacanal en concreto Eje B.
- Se inicia Armado de Andamios para Formaleta interior vigacanal en concreto Eje A.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 07 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con el armado de acero de vigacanal en concreto Eje B
- Se continua con el armado de andamios para formaleta Viga canal eje A

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Julio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 09 diciembre 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se inicia armado de acero de viga canal en concreto Eje A
- Se continua con armado de acero de vigacanal en concreto Eje B.
- Se inicia encofre formaleta viga canal en concreto Eje B

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Julio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 10 diciembre 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se continua armado de acero vigacanal en concreto Eje A
- Se termina con el armado de acero viganal en concreto Eje B.
- Se continua con encofre formaleta vigacanal en concreto Eje B.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 11 diciembre 2024
Clima: Soleado.
Actividad desarrollada
- Se continua Armado de acero para vigacanal en concreto Eje A
- Se Inicia Instalación de tuberias PVC-S de 6"
- Se Inicia Instalación de tuberias PVC-S de 8"

Residente Interventoria

Fecha: 12 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua armado de acero para vigacanal en concreto Eje A
- Se continua con Instalación de Tuberias PVC-S de 6"
- Se continua con Instalación de tuberias PVC-S de 8"

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha 13 diciembre 2024.
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua armado de acero para vigacanal en concreto Eje A
- Se culmina con instalación de Tuberias PVC-S 6" total 14.30 ml incluye relleno
- Se culmina con Instalación de Tuberias PVC-S 8" total 20 ml

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 14 diciembre
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
- Se continua con armado viga canal en concreto Eje A
- Se inicia encofrado formaleta Viga canal Eje A

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 16 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con armado viga canal en concreto Eje A
- Se continua con encofrado formaleta Viga canal Eje A

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 17 diciembre 2024
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
- Se termina armado de acero vigacanal en concreto Eje A, total acero 2.078,20 Kg.
- Se continua con encofre formaleta Viga canal Eje A

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 18 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Se continua con encofre formaleta Viga canal en concreto Eje A

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 19 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollado
- Se inicia fundición vaciado de concreto Viga canal Eje B
- Se instala caja de inspeccion de alumbrado Cant. 1.019,25 Und.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 20 diciembre 2024.
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se continua fundición vaciado de concreto Viga canal Eje B
-

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 21 diciembre
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se termina fundición vaciado de concreto Viga canal Eje B.
- Se inicia fundicion vaciado de concreto Viga canal Eje A

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventorico
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 23 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con fundición en concreto Viga canal Eje A
- Se inicia fundición placa piso 3000 PSI

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 24 diciembre
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se termina con fundición Viga canal en concreto Viga Canal Eje A, total fundición 16,68 m^3
- Se continua fundición placa piso 3000 PSI.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 25 diciembre 2024
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
- No se trabaja dia festivo

Residente Obra	Director Interventoria	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 26 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua fundición placa piso en concreto 3000 PSI
- Se inicia cuneta en concreto de 3000 PSI
- Se inicia con canal de conducción de aguas lluvias con sacos de trinchera.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 27 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se culmina fundicion placa piso en concreto 3000PSI
- Se continua con formaleta y fundicion de cuneta de 3000PSI.
- Se continua con canal de conducción aguas lluvias con saco trinchera.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 28 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Se culmina con formaleta y fundicion de cuneta de 3000PSI cantidad 60,80 ml
- Se continua con canal de conducción de aguas lluvias con sacos de trinchera.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 30 diciembre 2024
Clima: Nublado
Actividad:
- Se termina el canal de conducción de aguas lluvias con sacos de trinchera

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 31 diciembre
Clima: lluvioso
Actividad desarrollada
No se trabaja día festivo

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoría
Jaime Alejandro Ramírez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901352057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 159A # 13A-46	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SUCURSAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7957949473			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1222901673

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 208.000	$ 1.500	$ 209.500
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 208.000	$ 1.500	$ 209.500
SUBTOTALES:										$ 416.000	$ 3.000	$ 419.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 156.000	$ 1.100	$ 0	$ 157.100
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 1.100	$ 0	$ 157.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.100	$ 104.100	$ 800	$ 0	$ 104.900
SUBTOTALES:									$ 104.100	$ 800	$ 0	$ 104.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 156.000	$ 1.100	$ 157.100
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 1.100	$ 157.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																															PENSIÓN							SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13450303	YANEZ VILLAMIZAR MARCO TULIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 27718971	YANEZ VILLAMIZAR GLADYS ESTELLA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.300.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 40441580	LUNA HERNANDEZ NORMA PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 838.100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 03:01:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068522870

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810807983

PAGADO 04/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA		
Documento	CC19379912	**Dirección**	CR 50 #64 A - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114598014
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19379912	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901756252
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO WIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAJICA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 12A-26	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - SUCURSAL EL AGRAGO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7953602509	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			57		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1334342879

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 0	$ 208.000	$ 7.700	$ 215.700
230301	230301-PORVENIR	2	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 528.000	$ 19.400	$ 547.400
SUBTOTALES:										$ 736.000	$ 27.100	$ 763.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 12.900	$ 0	$ 350.000	$ 12.900	$ 0	$ 362.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 8.300	$ 0	$ 225.000	$ 8.300	$ 0	$ 233.300
SUBTOTALES:													$ 575.000	$ 21.200	$ 0	$ 596.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 320.200	$ 320.200	$ 11.800	$ 0	$ 332.000
SUBTOTALES:									$ 320.200	$ 11.800	$ 0	$ 332.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 184.000	$ 6.800	$ 190.800
SUBTOTALES:			$ 184.000	$ 6.800	$ 190.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 138.000	$ 5.100	$ 143.100
SUBTOTALES:			$ 138.000	$ 5.100	$ 143.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1077872832	DISPINA BERMEO PEDRO NEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO
2	CC 12202852	VELA TRUJILLO ANQUIMEDES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO
3	CC 80082099	RAMIREZ FRANCO JAIME ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			NO

NOVEDADES Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	
2																	
3																	

SEGURIDAD SOCIAL Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400
2	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 125.300

PARAFISCALES DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.500.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 60.000	$ 0	$ 45.000	$ 0	$ 0
30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
30	$ 1.800.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 72.000	$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.025.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12202652	0	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA CAGUANCITO		3132491163			ARQUIVELA1984@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32901479	E	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.061.400	72.100	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32901479	2025-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 12200188	MENDEZ ANGULO JAIRO	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	5411101
2	CC 1077858347	ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
3	CC 17645756	ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12202652	0	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA CAGUANCITO		3132491163			ARQUIVELA1984@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32901479	E	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.061.400	72.100	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32901479	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.193.667	3.193.667	3.193.667	3.193.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	511.100	0	37.200	0	548.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	33.100	0	488.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	55.500	0	4.100	0	59.600
EPS(Administradoras: 2)				3	127.900	0	9.400	0	137.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	4.200	0	61.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	70.900	0	5.200	0	76.100
ARP(Administradoras: 1)				3	222.400	0	16.200	0	238.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	222.400	0	16.200	0	238.600
CCF(Administradoras: 1)				3	127.900	0	9.300	0	137.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	127.900	0	9.300	0	137.200
Gran Total					989.300	0	72.100	0	1.061.400

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12194810
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HERNAN JARAMILLO MORERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4-25	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79540874 46	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1153688575

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 12194810	JARAMILLO MORERA HERNAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 12194810	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12194810
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERNAN JARAMILLO MORERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4-25	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7954247257	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1178142806
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7954067448	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/12/26

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 774.600	$ 0	$ 0	$ 30.800	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 836.200	$ 0	$ 836.200
SUBTOTALES:										$ 836.200	$ 0	$ 836.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 605.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.200	$ 0	$ 0	$ 605.200
SUBTOTALES:													$ 605.200	$ 0	$ 0	$ 605.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 25.300	$ 25.300	$ 0	$ 0	$ 25.300
SUBTOTALES:									$ 25.300	$ 0	$ 0	$ 25.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 12194810	JARAMILLO MORERA HERNAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	12194810	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 12194810	JARAMILLO MORERA HERNAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 6.141.000				NO							C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.141.000	$ 982.600	$ 30.800	$ 30.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.044.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.141.000	$ 767.700	$ 0	$ 767.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.141.000	12194810	$ 32.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 12194810	JARAMILLO MORERA HERNAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 6.141.000				NO							R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 4.841.000	$ 774.800	$ 30.800	$ 30.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 836.200	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 4.841.000	$ 605.200	$ 0	$ 605.200	14-11 - ARL SURA	0	$ 4.841.000	12194810	$ 25.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.466.700

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12194810	0	JARAMILLO MORERA HERNAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS	CALLE 5 4-28	GARZON-HUILA	8330206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1153756842	9479123856	E	2025/01/07	2024/12/26	BANCOLOMBIA	0	$1,291,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATOS (3 Afiliados)						$3,900,000	$884,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,100		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (3 Afiliados)						$3,900,000	$884,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,100		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (3 Afiliados)						$3,900,000	$884,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,100		$0	$0
1	CC	1077871260	CEDIEL DIAZ HERNAN DARIO	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1004303415	GUTIERREZ PUENTES TAMERLAN	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
3	CC	1077866104	RAMIREZ CASTRILLON MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,900,000	$884,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,100		$0	$0

2024/12/27 03:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12194810	0	JARAMILLO MORERA HERNAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS	CALLE 5 4-28	GARZON-HUILA	8330206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1153756842	9479123856	E	2025/01/07	2024/12/26	BANCOLOMBIA	0	$1,291,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$884,000	$0	$0	$884,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$884,000	$0	$0	$884,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$95,100	$0	$0	$95,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$95,100	$0	$0	$95,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				3	$1,291,100	$0	$0	$1,291,100

2024/12/27 03:56 PM


Suelos y Concretos S.A.S	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	VEL-005
		V.01

PROYECTO:	LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO WIN		
LOCALIZACION:	Vigas de Cimentacion Eje A concreto 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	8/11/2024
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
19388		Vigas de Cimentacion Eje A concreto 3000 PSI	3,57	20,00	10,00	78,54	2270,82	05/11/24	12/11/24	7	129,60 kN	2392,69 PSI	16,50 MPa	3	2257,92 PSI	15,57 MPa
19389			3,87	20,00	10,00	78,54	2463,72	05/11/24	12/11/24	7	115,00 kN	2123,15 PSI	14,64 MPa	4		
19390			3,76	20,00	10,00	78,54	2393,69	05/11/24	03/12/24	28	167,80 kN	3097,95 PSI	21,36 MPa	2	3139,49 PSI	21,65 MPa
19391			3,87	20,00	10,00	78,54	2463,72	05/11/24	03/12/24	28	172,30 kN	3181,03 PSI	21,94 MPa	4		

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
901.680.866-0
Servicio de Ensayos
Nit 901.680.866-0
Cra 42 Barrio Los Samanes, e mail sendsuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 614 36 84 - 310 827 62 24 / Garzón - Huila

SEND
Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005


V.01

PROYECTO:	LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO WIN		
LOCALIZACIÓN:	Columnas Eje B 1, 2, 3 Concreto 4000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	28/11/2024
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
19380		Columnas Eje B 1, 2, 3 Concreto 4000 PSI	3,89	19,50	10,50	86,59	2304,99	25/11/24	02/12/24	7	149,30 kN	2500,13 PSI	17,24 MPa	3	2519,67 PSI	17,38 MPa
19381			3,79	19,70	10,10	80,12	2401,27	25/11/24	02/12/24	7	140,30 kN	2539,20 PSI	17,51 MPa	3		
19382								25/11/24	23/12/24	28						
19383								25/11/24	23/12/24	28						

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro, Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

SEND SUELOS Y CONCRETOS NIT 901.680.866-1 Servicio de Ensayos
Cra. 1 No. 42 Barrio Los Samanes . e mail send.suelosyconcretos@gmail.com Tel: 311 414 36 54 - 310 822 64 24 Garzón - Huila
