CONTRATO DE OBRA No. **CLPIH 397 DE 2023**

INFORME DE OBRA No. 9

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: **AGRADO.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE (OBRA) No. CLPIH 397 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WIN

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH397 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LA ONDINA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de enero al 31 de enero de 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO WIN	**NIT:**	901.756.252-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NORMA PATRICIA LUNA HERNÁNDEZ	**C.C:**	40.441.590
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	30 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		
OTROSI 1 – FUENTE DE FINANCIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN (D/M/A):	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO (D/M/A):	17 DE JULIO 2024		
OTROSI 2 – VIGENCIA FISCAL	17 DE JULIO 2024		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
OTROSI 3 PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/08/2024)	UN (1) MES		
OTROSI 4 MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS	**Adición:** DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 18.061.646,00) M/CTE.		
OTROSI 4 PLAZO ADICIONAL (No.1) (30/09/2024)	UN (1) MES.		
OTROSI 5 PLAZO ADICIONAL (No.3) (30/10/2024)	1 MES		
OTROSI 6 PLAZO ADICIONAL (No.4) (27/11/2024)	22 DIAS		
OTROSI 7 PLAZO ADICIONAL (No.4) (20/12/2024)	1 MES		
OTROSÍ N°8: 21/01/2025	15 DÍAS		
PLAZO TOTAL:	**OCHO (8) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025.		


VALOR INICIAL:	$ 494.305.625.00
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$ 18.061.646.00
VALOR FINAL	$ 512.367.271.00


2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Auto portante con Iluminación se encuentra localizado en la Vereda La Ondina de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila.

El proyecto "Cubierta Autoportante con Iluminación" está situado en la Vereda La Ondina, en la zona rural del Municipio del Agrado, Departamento del Huila. Esta ubicación estratégica se caracteriza por su entorno natural y su accesibilidad, lo que la convierte en un lugar ideal para la implementación de soluciones arquitectónicas innovadoras.

La Vereda La Ondina se distingue por su paisaje montañoso y su rica biodiversidad, proporcionando un contexto inspirador que favorece la integración de la construcción con el medio ambiente. La elección de este sitio no solo busca optimizar la funcionalidad de la cubierta autoportante, sino también aprovechar al máximo la luz natural, garantizando un ambiente iluminado y acogedor.

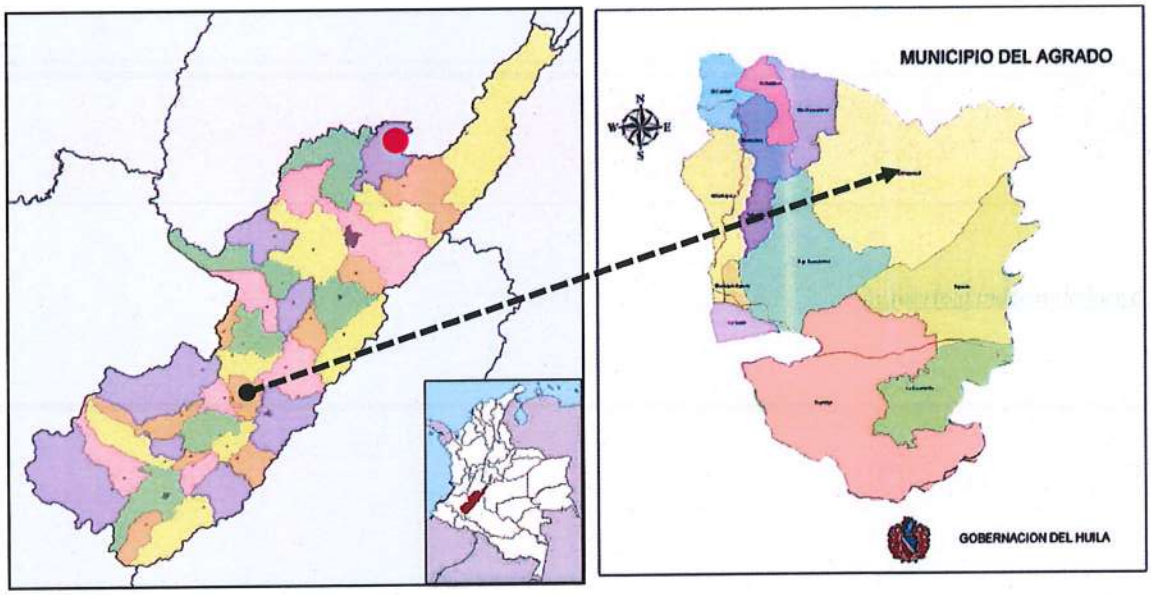

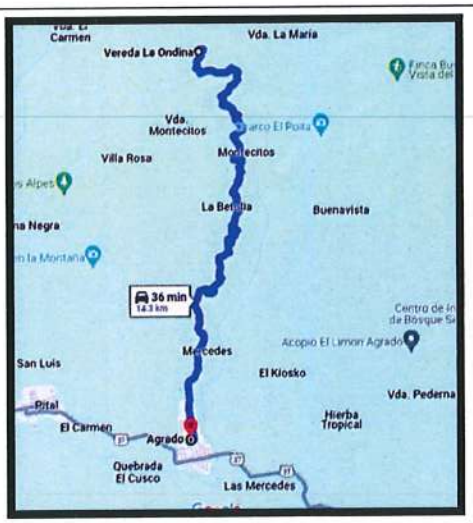



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Auto portante con Iluminación para la Vereda La Ondina la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema auto portante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, plaza contra piso en concreto reforzado de 3000 PSI.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el periodo de Enero de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades:

3.03 – Construcción de Viga Canal en Concreto

Se ejecutó la instalación de formaletas y la fundición de la viga canal en concreto de 3000 PSI en el eje A. Una vez finalizada esta etapa, se procedió con las mismas actividades en el eje B, garantizando continuidad estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

6.1 – Bajantes en PVC-S de 4"

Se realizó la instalación de bajantes de aguas lluvias utilizando tubería PVC-S de 4" con sus respectivos accesorios en los ejes A1, A3, A4 y A6, siguiendo el diseño hidráulico establecido.

3.05 – Manto Zetal en Viga Canal

Se efectuó la aplicación del manto asfáltico Zetal sobre la viga canal en ambos ejes, brindando protección adicional contra filtraciones y agentes ambientales.

5.03 – Placa de Piso en Concreto

Se ejecutó la instalación de malla electrosoldada y la fundición de la placa de piso de 10 cm de espesor con concreto de 3000 PSI, completando el tramo faltante entre los ejes A y B.

5.05 – Cuneta en Concreto

Se realizaron las excavaciones, instalación de formaletas y construcción de cunetas en concreto de 3000 PSI, conforme al diseño establecido y considerando las afectaciones por lluvias previas.

6.4 – Caja de Inspección en Concreto

Se construyó la caja de inspección en el eje del talud, instalando su formaleta y tapa de acuerdo con el diseño hidráulico del sistema de desagüe.

6.2 – Tubería PVC-S de 6" para Desagües

Se instaló la tubería PVC-S de 6" con todos sus accesorios para conectar la caja de inspección 1 con la caja de inspección 2, cumpliendo con la ruta del sistema de desagüe.

6.3 – Tubería PVC-S de 8" para Salida

Se colocó la tubería PVC-S de 8" desde la caja de inspección 2 (por construir) hacia el punto de descarga final, considerando el diseño hidráulico y caudal proyectado.

7.03 – Excavación Manual

Se ejecutaron excavaciones manuales para el tendido de redes eléctricas subterráneas y para las transiciones aéreo-subterráneas, en los puntos indicados del proyecto.

7.02 – Caja de Inspección para Alumbrado Público

Se realizó la construcción e instalación de la caja de inspección para el sistema de alumbrado público en el eje A, con base en el diseño eléctrico.

7.04 – Canalización en Ductos Conduit PVC

Se colocaron los ductos de PVC pesado de 1½" para baja tensión, garantizando la correcta canalización y protección del cableado eléctrico.

7.05 y 7.06 – Transición Aérea-Subterránea

Se instalaron tramos de tubería IMC de 1½" y 1" para realizar las conexiones entre las redes aéreas y subterráneas, asegurando continuidad y protección del sistema eléctrico.

7.15 – Hincado de Postes de Concreto

Se ejecutó la excavación, hincado, plomada y nivelación de un poste de concreto centrifugado de 8 m y 510 kg, según especificaciones de diseño eléctrico.

7.07 – Cableado Medida Directa en Poste

Se instalaron tubos metálicos galvanizados de 1" MT, caja de polipropileno para el medidor, cableado y un interruptor bifásico, configurando el sistema de medida directa en poste conforme a normativa eléctrica vigente.

7.09 – Cableado para Red de Distribución

Se realizó el tendido subterráneo del cableado de la red de distribución utilizando conductores 2x6 AWG SER 8000 + 6 AWG SER 8000 + 1x8 AWG CU, respetando los planos eléctricos.

7.10 – Brazo Sencillo para Reflector

Se llevó a cabo la instalación de brazos galvanizados con pintura en polvo poliéster para soportar reflectores, conforme al diseño de iluminación.

8.01 – Transporte de Materiales Pétreos

Se gestionó la llegada y acopio de materiales pétreos en el sitio de obra, necesarios para la continuación de las fundiciones de concreto pendientes.

4.1 – Cubierta Autoportante

Se instalaron las láminas de acero engargoladas en paneles de una sola pieza para conformar la cubierta autoportante, asegurando su fijación y acabado conforme al diseño arquitectónico.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	14/11/2023	44		
Suspensión No. 1	28/12/2023		202	
Reiniciación No. 1	17/07/2023	15		
Otrosi No. 3	27/08/2024	30		
Otrosi No. 4	30/09/2024	30		
Otrosi No. 5	30/10/2024	30		

Otrosi No. 6	27/11/2024	22		
Otrosi No. 7	20/12/2024	30		
Otrosi No. 8	21/01/2025	15		
TERMINACIÓN Cto.		24		07/02/2025
TOTAL DIAS		240	202	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION No.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTRO SI No. 01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 - SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	2	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03	3	17 DE JULIO DE 2024
OTROSÍ No.02	3	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04	3	27 DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ No.03	3	27 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.05	4	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS No.01	5	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.04	4	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA	6	30 DE OCTUBRE DE 2024
OTROSI	5	30 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA	7	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI	6	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.08	8	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.07	7	20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.09	9	21 DE ENERO DE 2025
OTROSÍ No.08	8	21 DE ENERO DE 2025

ACTA DE MODIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.02	10	27 DE ENERO DE 2025

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Actividades Administrativas.

1. Se radica la proyección del balance de Mayores y Menores cantidades.
2. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó.
3. De acuerdo a la demora del fabricante de la cubierta y problemas con la maquina roladora, se solicitó más tiempo de ejecución con el fin de finalizar las actividades y seguimiento de obra, por lo cual se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación N°9 y otrosí N°8 el día 21 de enero del 2025.
4. Se realizó entrega de pólizas de acuerdo al otrosí N°7 del contratista de obra, el cual se tramitó a la entidad para su aprobación.
5. Se presenta balance de Mayores y Menores cantidades.

c). Actividades Operativas.

1. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba le inicio de las actividades:

ESTRUCTURA EN CONCRETO

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	16.68 M3	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	60.80 M2	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

CUBIERTA

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una	469,68 M2	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.		

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	26.40 M2	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	60.80 ML	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	23,20 ML	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	14.30 ML	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	20.00 ML	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	1.00 UND	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

PLACA POLIDEPORTIVO

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en	1.00 und	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

		concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.		
		Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	3.52 m3	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	22.00 ml	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	2.00 und	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	2.00 und	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	1.00 und	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	14.00 ml	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	12.00 und	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)
		Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	1.00 und	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)


TRANSPORTE

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Transporte de materiales petreos	145.3947 M3-Km	Agrado-Huila (Vereda La Ondina)

2. Se registra el avance diario en la bitácora de obra.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el mes de enero se pronosticaron lluvias en horas de la mañana y noche esporádicamente

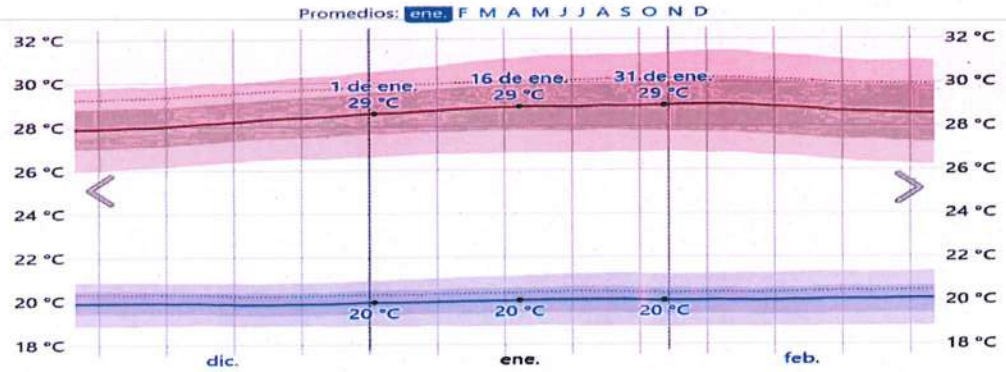

https://es.weatherspark.com/y/22372/Clima-promedio-en-Agrado-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Figures-Summary

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

10. CONTROL DE ANTICIPO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	8 de agosto 2024	$123.576.406.25		$123.576.406.25
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$494.305.625	$ 18.061.646,00	$512.367.271,00	$	$ $512.367.271,00

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
07/1/2025	Ondina	• **Comité de obra - 11**
20/1/2025	Ondina	• **Comité de obra - 12**

12. RELACION DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital
Informe SG-SST (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital
Correspondencia (periodo del (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional Contratista)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	40.441.590	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	19.379.912	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
MARCO TULIO YAÑEZ	13.450.383	DIRECTOR DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	80.082.099	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	1.077.872.832	INSPECTOR SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	12.202.652	MAESTRO DE OBRA	PRESTACION DE SERVICIOS
ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	17.645.756	OFICIAL DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	1.077.858.347	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
HERNAN JARAMILLO MORERA	12.194.810	SUBCONTRATISTA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
HERNAN DARIO CEDIEL	1.077.871.260	AYUDANTE	CONTRATO POR OBRA O LABOR

14. RELACION DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	S.N.	8/08/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ	277.800	57.000	7.500	57.000	$	7960320160
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	277.800	178.000	7.500			1070761389
MARCO TULIO YAÑEZ	277.800	57.000	99.100	57.000	$	7960320160
JAIME ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO	$ 288.000	$ 225.000	$125.300	72.000	$ 54.000	7963553182
PEDRO NEL OSPINA BERMEO	$ 240.000	$ 187.500	$104.400	60.000	$ 45.000	7963553182
ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	$ 277.800	$ 178.000	$99.100	57.000	$ 42.800	7963553182
ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	$ 227.800	$ 57.000	$99.100	57.000	$0	32901489
ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	$ 227.800	$ 57.000	$99.100	57.000	$0	32901489
HERNAN JARAMILLO MORERA	$ 277.800	$ 178.000	$7.500	0		7958510671
HERNAN DARIO CEDIEL	$ 172.800	$ 26.600	$16.200	26.600		9481137811

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	30/10/2023	30/07/2024

				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2023	30/012024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2023	30/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	0	03/11/2023	30/10/2023	30/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	1 anulada 2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	14/02/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	14/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	1 anulada 2	06/12/2023	14/11/2023	14/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	3	24/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	3	24/07/2024	14/11/2023	03/09/2024

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	4	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027

				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días

Póliza actualizada ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	5	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	6	02/09/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	4	02/09/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	7	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	5	10/10/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x ACLARACION OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	8	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/05/2025

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	6	10/10/2024	14/11/2023	03/11/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 5

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	9	01/11/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	7	01/11/2024	14/11/2023	03/01//2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	10	04/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	8	04/12/2024	14/11/2023	03/01//2025


Póliza actualizada x OTROSÍ No. 7

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	11	26/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	9	26/12/2024	14/11/2023	25/01//2025


17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)

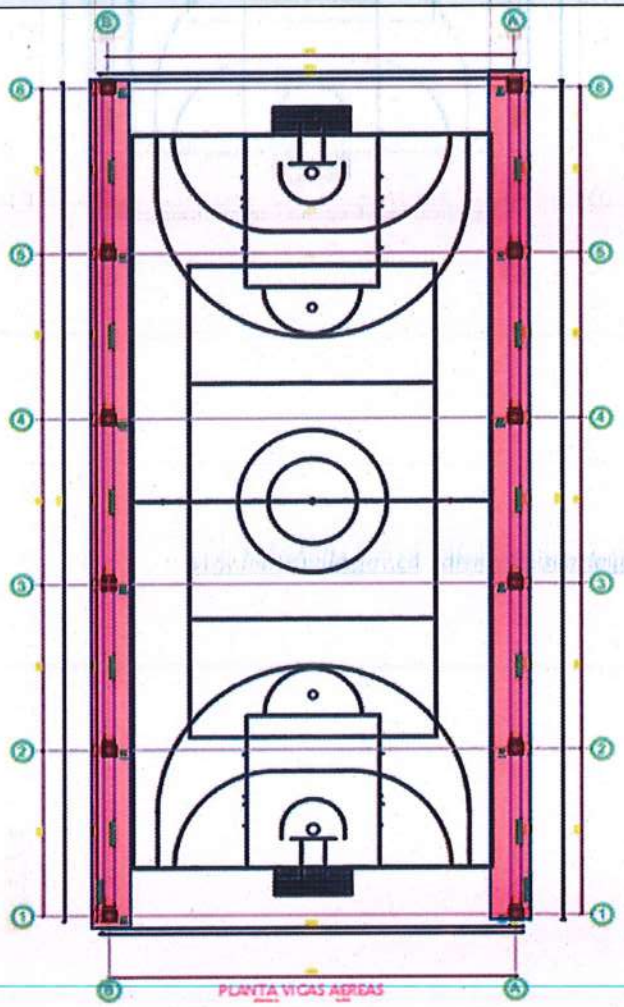


VIGA CANAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ZETAL PARA VIGA CANAL

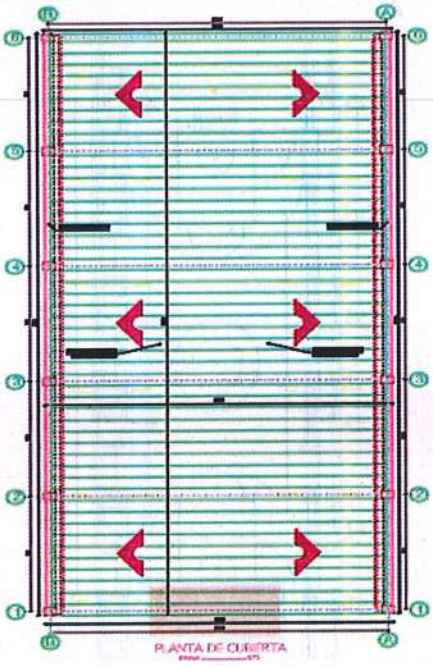


INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE

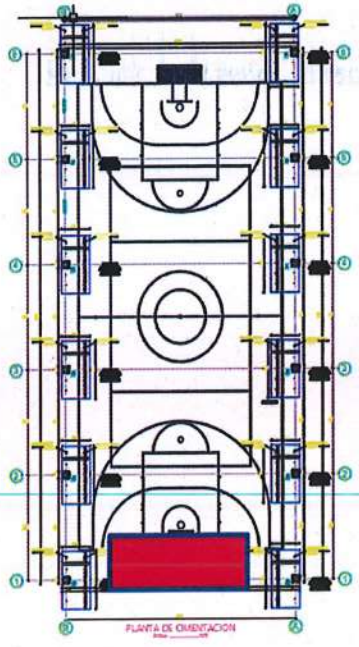


CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON E=10 CM

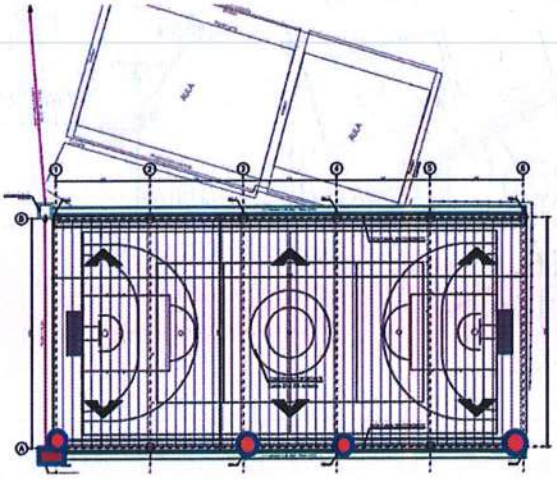


CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y BAJANTES DE TUBERÍA DE 4" EN PVC-S Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DE 6" PARA DESAGÜE, CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI Y TUBERÍA DE DE 8" PARA SALIDA

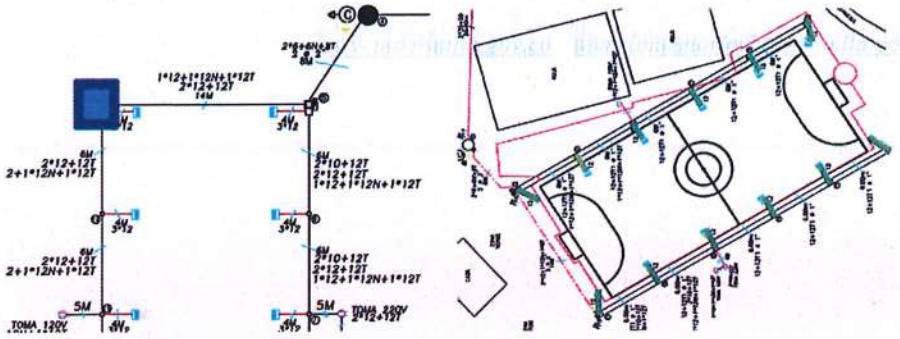

CAJA DE INSPECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONCRETO Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR E INSTALACIONES DE BRAZO SENCILLO PARA REFLECTORES

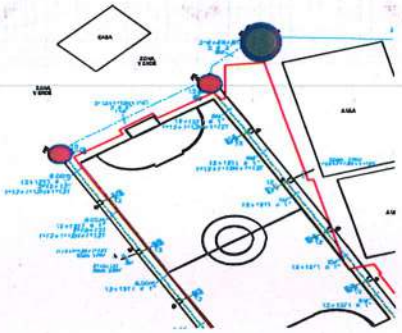

INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA- SUBTERRÁNEA TUBERÍA IMC 1 1/2" Y TUBERÍA DE 1" Y EXCAVACIÓN, HINCADA Y PLOMADA DE POSTES DE CONCRETO Y SUMINISTRO - INSTALACIÓN Y CABLEADO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE

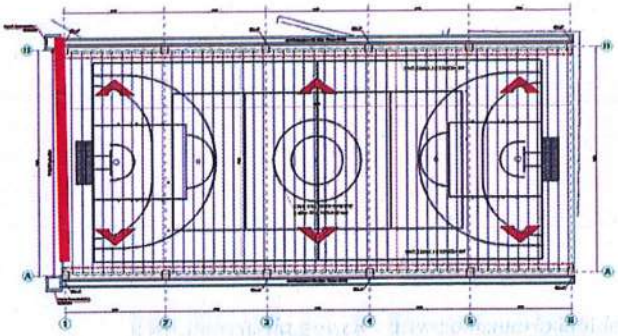

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EN DUCTO SUBTERRÁNEO

18. INFORME PORCENTAJE AVANCE DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICION ACTUALIZADA ACTA DE MODIFICACION No.2		Enero			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/TOTAL	cant	vl	%	Acumulado
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.01	Localización y replanteo.	M2	738,43	$ 2.636.934,00		$ -	0,000%	0,649%
1.02	Demolición cuneta existente.	ML	1,20	$ 9.109,00		$ -	0,000%	0,002%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	94,25	$ 2.485.561,00		$ -	0,000%	0,612%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	12,00	$ 251.196,00		$ -	0,000%	0,062%
1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1,91	$ 41.709,00		$ -	0,000%	0,010%
1.06	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 234.272,00		$ -	0,000%	0,058%
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	58,00	$ 626.632,00		$ -	0,000%	0,154%
1.08	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	249,67	$ 11.526.016,00		$ -	0,000%	2,838%
1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	101,59	$ 8.548.291,00		$ -	0,000%	2,105%
N.P 1,10	Excavación mecanica incluye retiro	M3	964,87	$ 28.142.363,00		$ -	0,000%	6,929%
2	CIMENTACIÓN					$ -	0,000%	0,000%
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	10,80	$ 368.636,00		$ -	0,000%	0,091%
2.2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	33,66	$ 12.160.483,00		$ -	0,000%	2,994%

2.3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	47,12	$ 29.273.253,00		$ -	0,000%	7,208%
2.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3.824,88	$ 27.317.293,00		$ -	0,000%	6,726%
2.5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	11,20	$ 8.340.203,00		$ -	0,000%	2,054%
2.6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.267,18	$ 9.050.200,00		$ -	0,000%	2,228%
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					$ -	0,000%	0,000%
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	13,93	$ 12.872.434,00		$ -	0,000%	3,170%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.303,10	$ 30.732.740,00		$ -	0,000%	7,567%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	16,68	$ 16.820.512,00	16,68	$ 16.820.512,00	4,104%	4,142%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2.078,20	$ 14.842.504,00		$ -	0,000%	3,655%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60,80	$ 2.461.792,00	60,80	$ 2.461.792,00	0,601%	0,606%
4	**CUBIERTA**					$ -	0,000%	0,000%
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469,68	$ 99.715.412,00	469,68	$ 99.715.412,00	24,327%	24,552%
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**					$ -	0,000%	0,000%
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	315,13	$ 4.679.681,00		$ -	0,000%	0,000%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0,00	$ -		$ -	0,000%	0,000%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	188,54	$ 16.032.310,00	26,40	$ 2.244.898,00	0,548%	3,948%


5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2,90	$ 215.192,00		$ -	0,000%	0,000%
5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60,80	$ 5.116.198,00	60,80	$ 5.116.198,00	1,248%	1,260%
NP 5.6	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 5.707.384,00		$ -	0,000%	0,000%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					$ -	0,000%	0,000%
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	46,40	$ 3.731.859,00	23,20	$ 1.865.930,00	0,455%	0,459%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14,30	$ 1.536.807,00	14,30	$ 1.536.807,00	0,375%	0,378%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20,00	$ 4.396.520,00	20,00	$ 4.396.520,00	1,073%	1,083%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 702.450,00	1,00	$ 351.225,00	0,086%	0,086%
NP 6.5	Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento	ml	62,00	$ 3.776.358,00		$ -	0,000%	0,930%
7	**PLACA POLIDEPORTIVO**					$ -	0,000%	0,000%
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$ 1.177.552,00		$ -	0,000%	0,290%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 1.923.474,00	1,00	$ 641.158,00	0,156%	0,158%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3,52	$ 162.501,00	3,52	$ 162.501,00	0,040%	0,040%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22,00	$ 1.089.352,00	22,00	$ 1.089.352,00	0,266%	0,268%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 611.156,00	2,00	$ 611.156,00	0,149%	0,150%


7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 566.546,00	2,00	$	566.546,00	0,138%	0,139%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.020.417,00	1,00	$	1.020.417,00	0,249%	0,251%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.717.814,00		$	-	0,000%	0,000%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14,00	$ 1.243.872,00	14,00	$	1.243.872,00	0,303%	0,306%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 4.443.264,00	12,00	$	4.443.264,00	1,084%	1,094%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 3.501.480,00		$	-	0,000%	0,000%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 12.268.644,00		$	-	0,000%	0,000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 978.457,00		$	-	0,000%	0,000%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.039.024,00		$	-	0,000%	0,000%
7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1,00	$ 2.260.862,00	1,00	$	2.260.862,00	0,552%	0,557%
8	**TRANSPORTE**					$	-	0,000%	0,000%
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4.326,914	$ 4.776.913,00	145,39	$	160.516,00	0,039%	1,176%
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$406.133.632**		**$**	**146.708.938,00**	**35,792%**	**90,986%**

ARQ.CRISTIAN JUNCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. MARCO TULIO YAÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA


18. REGISTRO FOTOGRAFICO

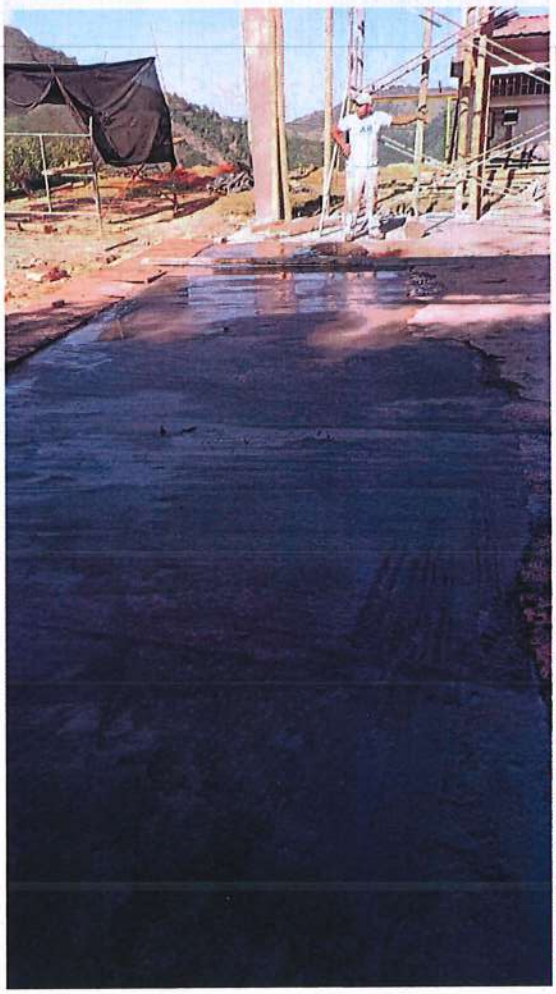

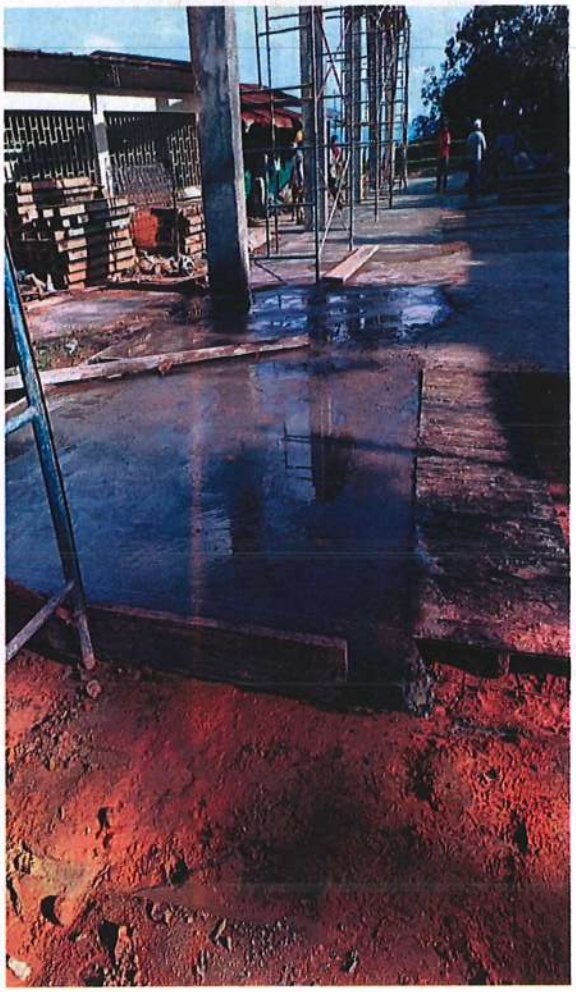

CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E=10 CM

Se llevó a cabo la construcción de una placa de concreto armado, utilizando concreto de 3000 PSI con un espesor de 10 cm. El proceso incluyó la preparación de la base, colocación de encofrado, armado de la malla de acero de refuerzo, y el vertido del concreto, asegurando una correcta compactación y nivelación. La estructura fue diseñada para garantizar resistencia, durabilidad y cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto.

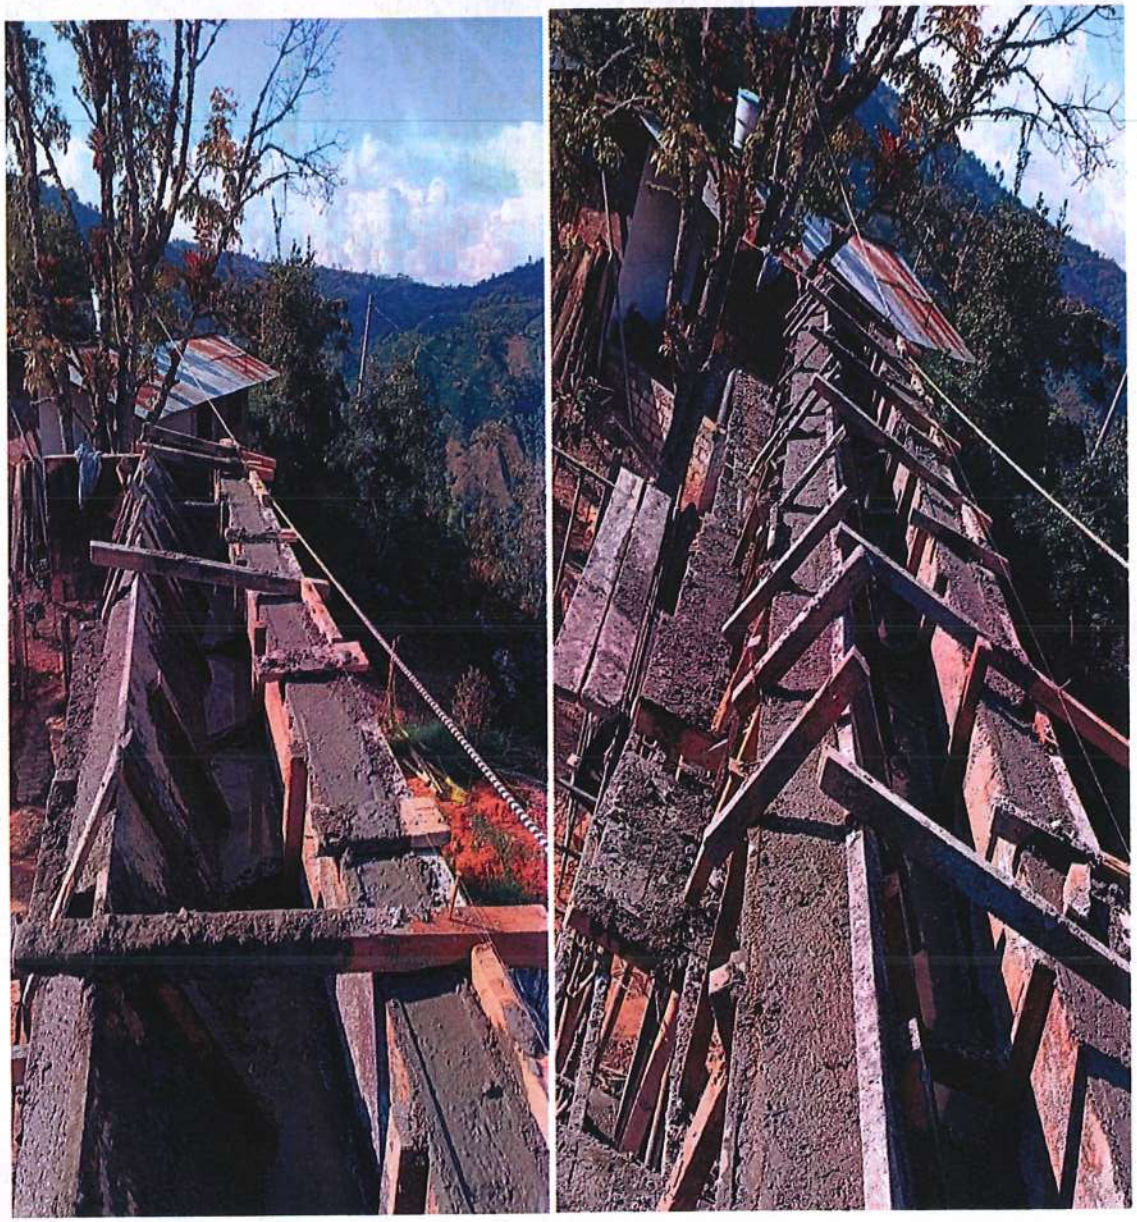

CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI

Se realizó la construcción de una viga canal utilizando concreto de 3000 PSI, siguiendo las especificaciones estructurales del proyecto. El proceso incluyó la preparación de la forma, colocación del acero de refuerzo, armado y montaje de la estructura, y el vertido del concreto, asegurando una correcta compactación y nivelación. La viga canal fue diseñada para proporcionar soporte y resistencia en la estructura, garantizando durabilidad y seguridad.



IMAGEN N°1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ZETAL VIGA CANAL.

Se realizó una inspección de la instalación para verificar que el manto Zetal esté correctamente colocado y que no haya burbujas de aire o áreas despegadas.


Se aseguraron las uniones y se revisaron posibles obstrucciones que puedan afectar el rendimiento del manto.



CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI


Se realizó la construcción de una cuneta en concreto de 3000 PSI, siguiendo las dimensiones y pendientes especificadas en el diseño del proyecto. El proceso incluyó la preparación de la base, colocación de encofrado, vertido y compactación del concreto para garantizar resistencia y durabilidad. La cuneta fue diseñada para facilitar el drenaje eficiente de aguas pluviales, protegiendo las estructuras circundantes y mejorando la gestión del agua en la zona.



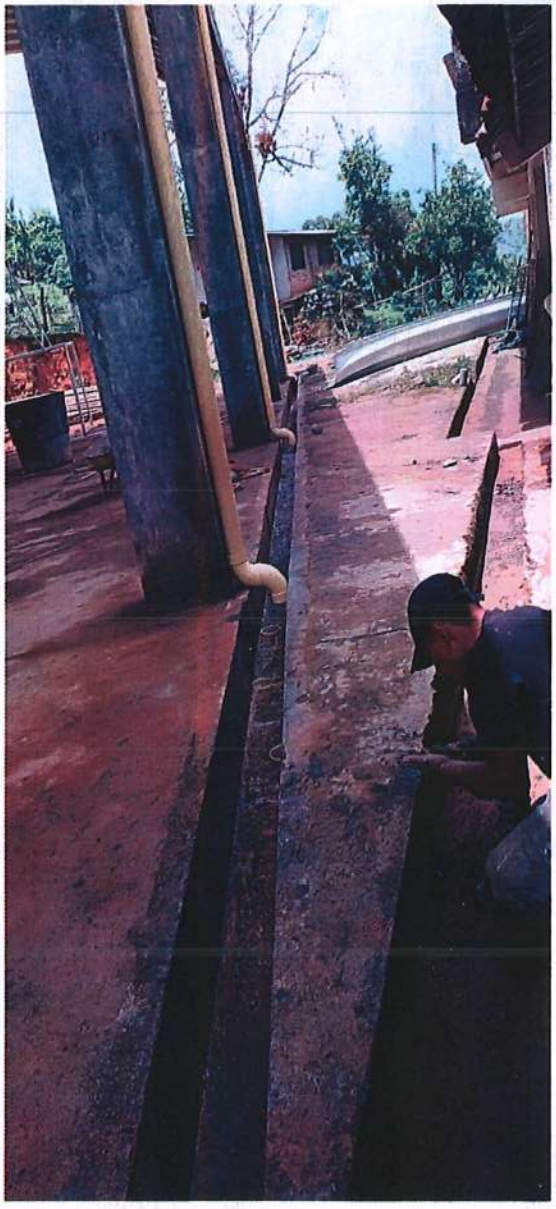


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-S DE 4"

Se realizó el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 4 pulgadas, siguiendo las especificaciones del proyecto. La instalación incluyó la colocación de las tuberías en las pendientes y alineaciones requeridas, asegurando conexiones herméticas y resistencia a las condiciones de operación. Este sistema de tuberías se destinó al transporte de líquidos o aguas pluviales, garantizando un funcionamiento eficiente y duradero.

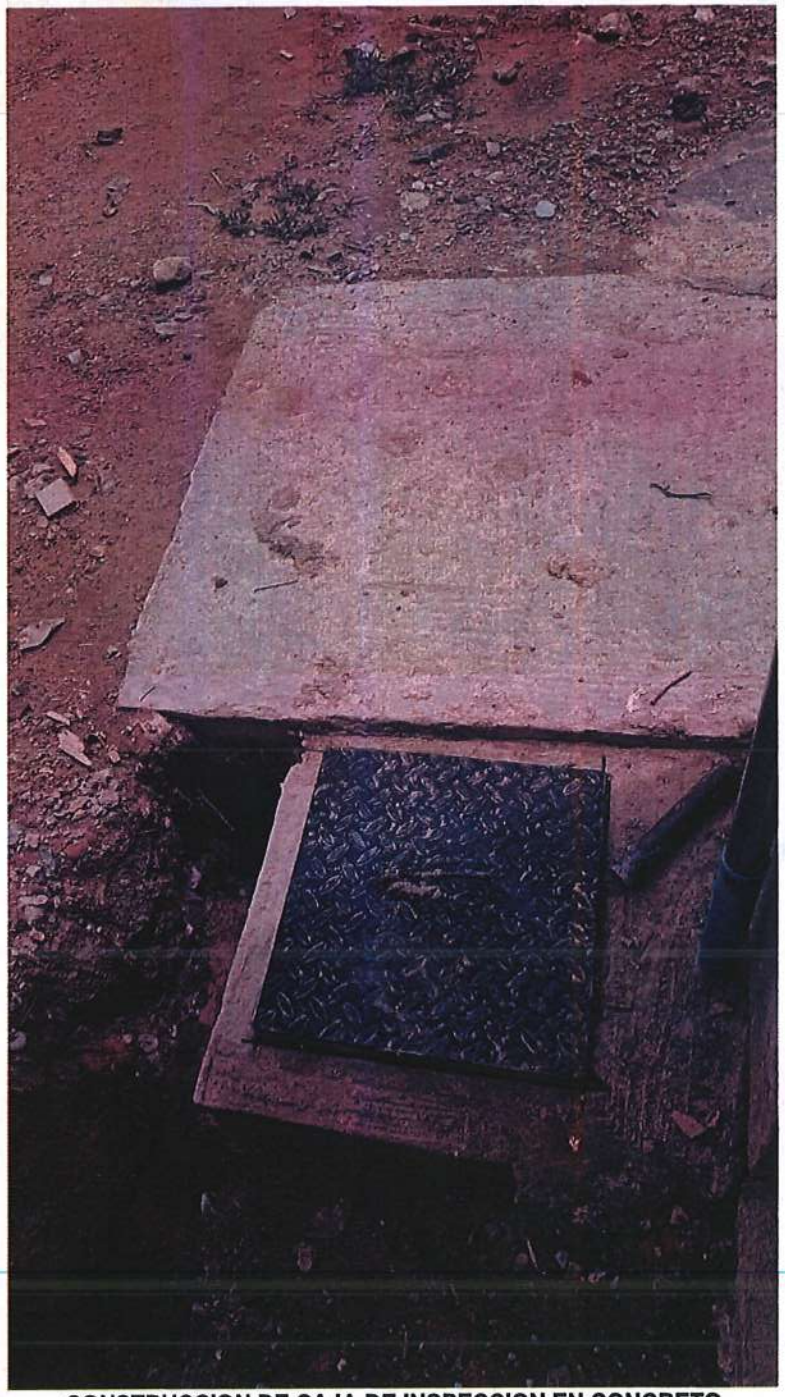


CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO

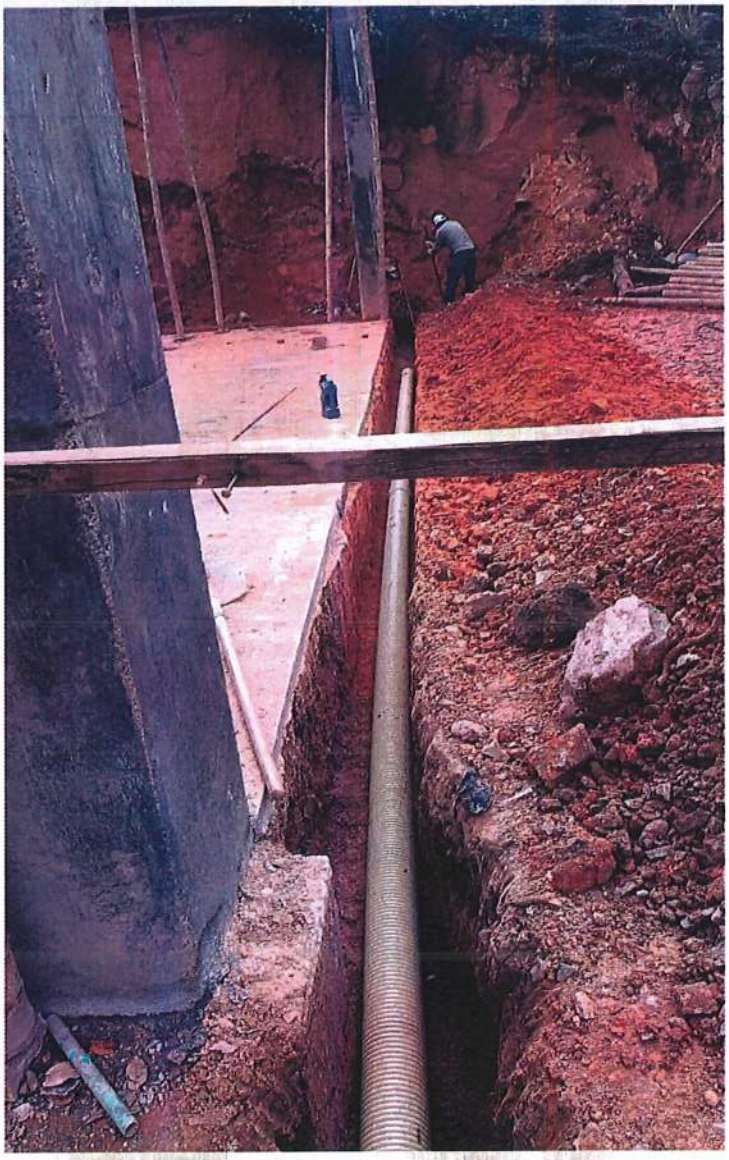


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-S DE 6" PARA DESAGUE

Se realizó el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 6 pulgadas, destinada al sistema de desagüe. La instalación incluyó la colocación de las tuberías en las pendientes y alineaciones especificadas, asegurando conexiones herméticas y resistencia a las condiciones de operación. Este sistema de desagüe fue diseñado para facilitar la evacuación eficiente de aguas residuales o pluviales, garantizando durabilidad y funcionamiento óptimo.

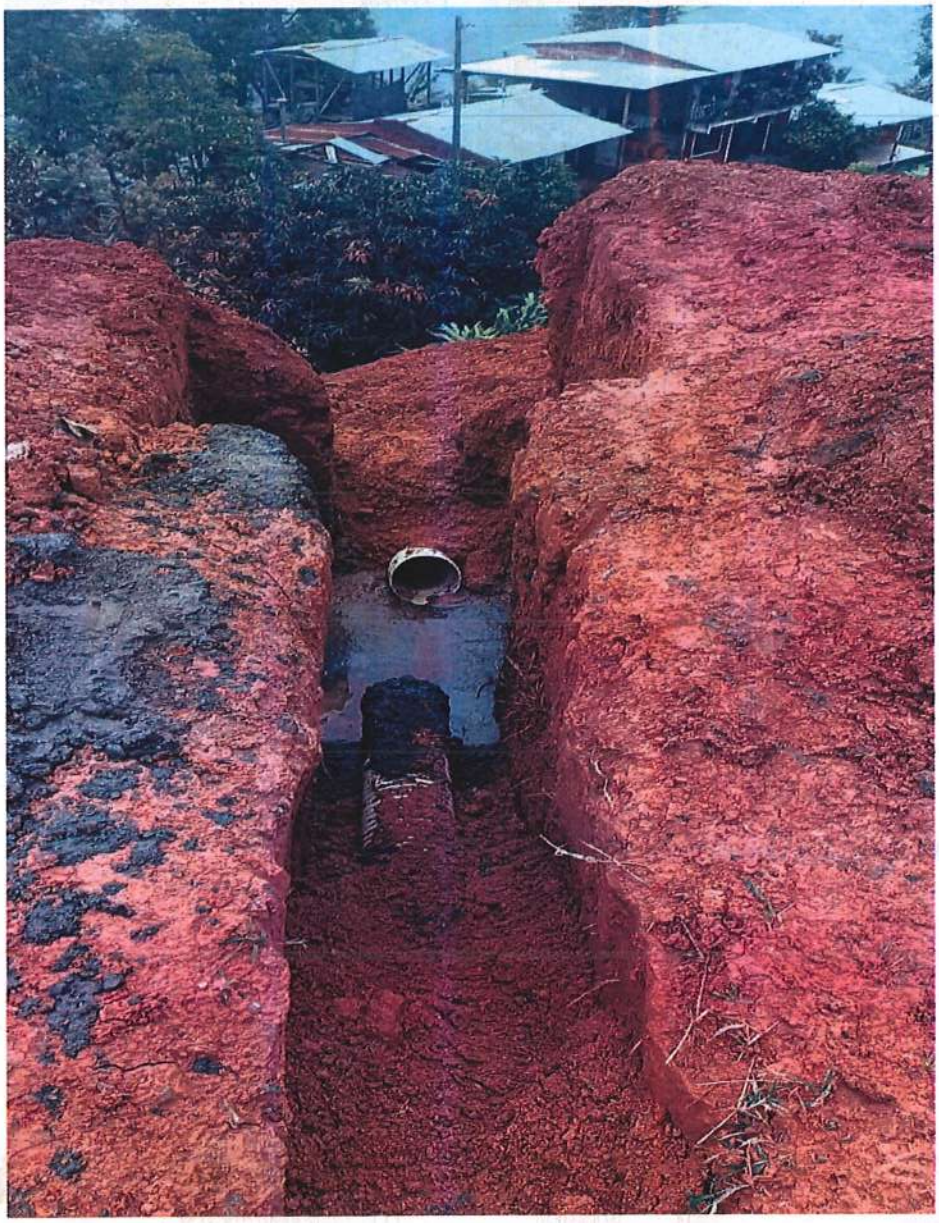


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-S DE 8" PARA SALIDA

Se realizó el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 8 pulgadas, destinada a la salida del sistema de drenaje o alcantarillado. La instalación incluyó la colocación en las pendientes y alineaciones requeridas, asegurando conexiones herméticas y resistencia a las condiciones de operación. Este sistema de salida garantiza una evacuación eficiente y segura de líquidos, contribuyendo a la durabilidad y correcto funcionamiento de la infraestructura.

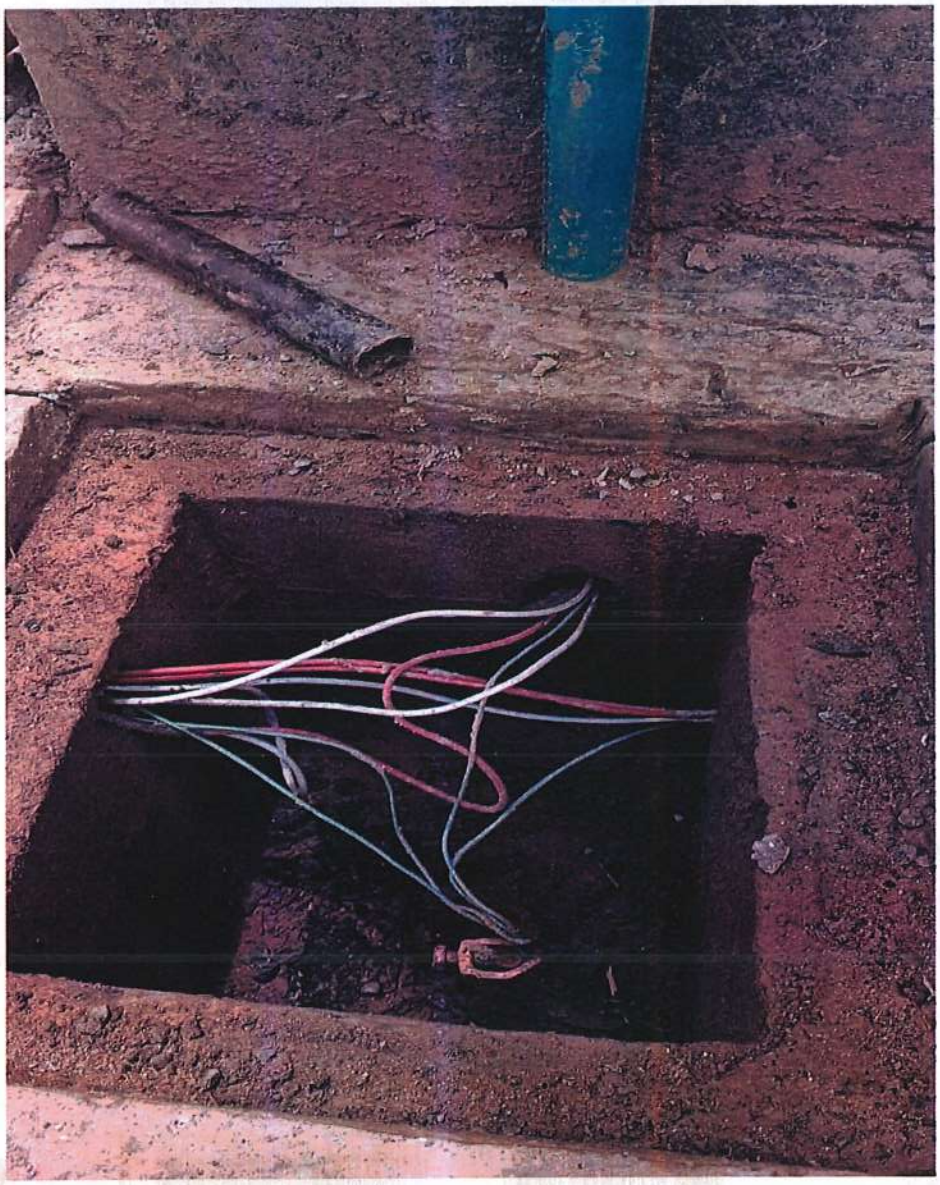


CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PUBLICO

Se realizó la construcción de una caja de inspección para el sistema de alumbrado público, siguiendo las especificaciones del proyecto. La estructura incluyó la excavación, colocación de la base, armado de la caja con materiales resistentes y la instalación de las tapas de acceso. Esta caja permite el mantenimiento, revisión y conexión de las instalaciones eléctricas del alumbrado, asegurando accesibilidad y protección contra las condiciones ambientales.

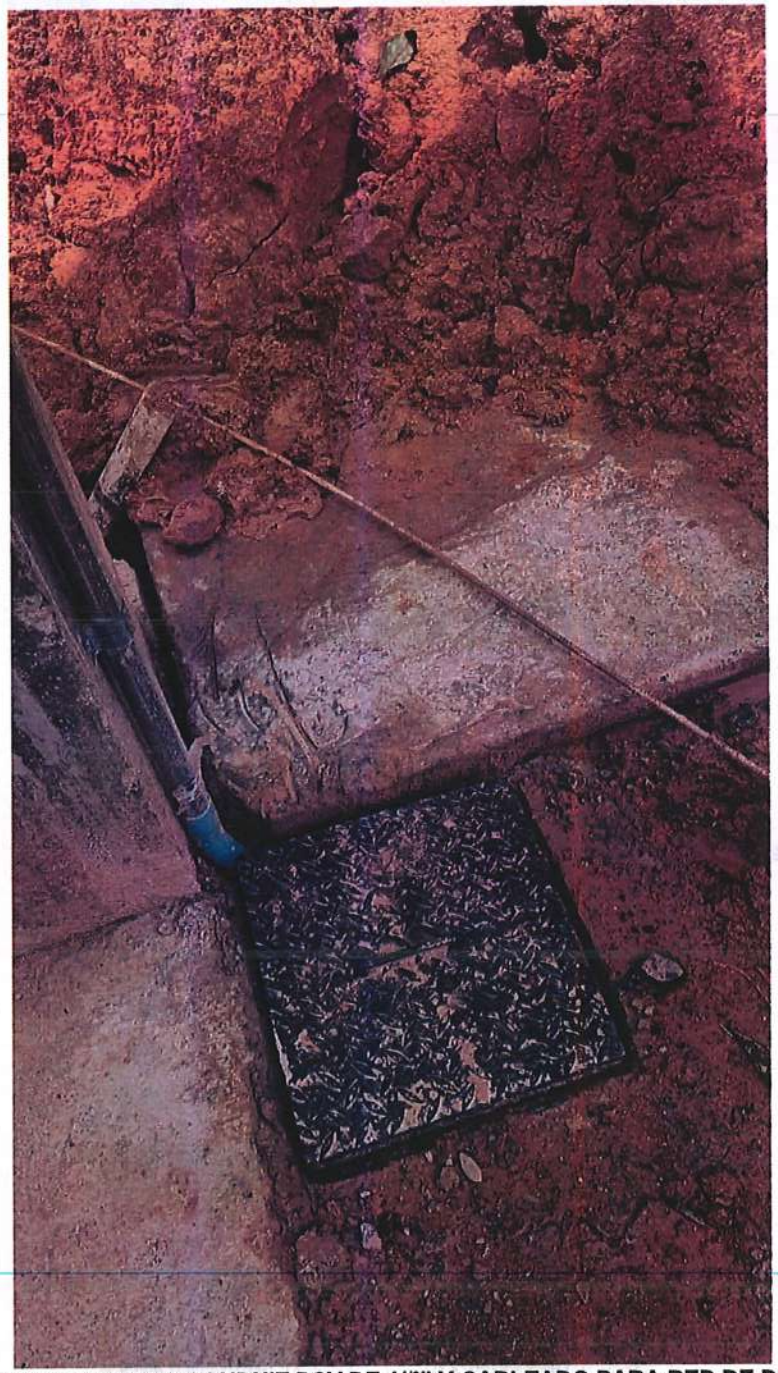


CANALIZACION DE DUCTOS CONDUIT PCV DE 1 1/2" Y CABLEADO PARA RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL

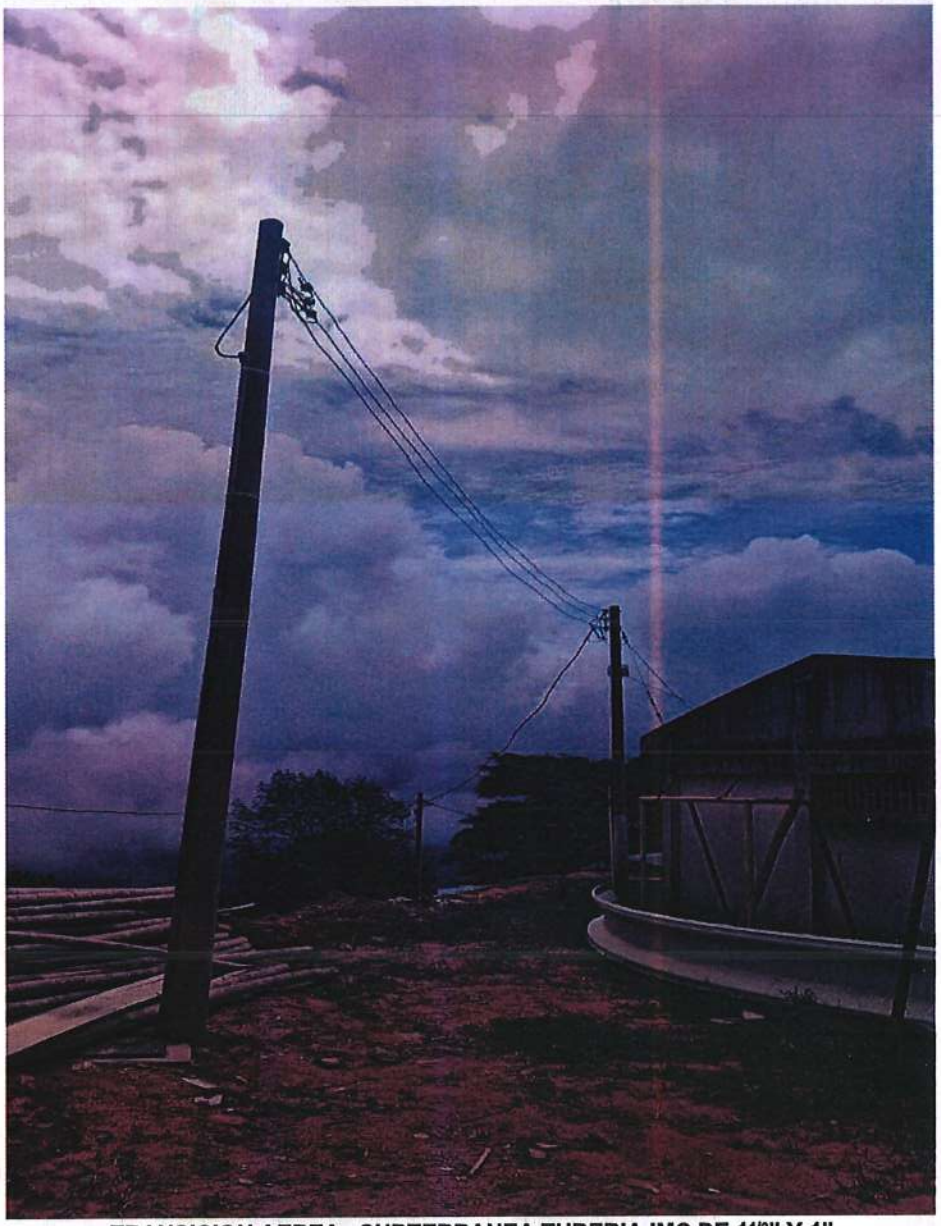

TRANSICION AEREA –SUBTERRANEA TUBERIA IMC DE 1$^{1/2}$" Y 1"

Se realizó la instalación de la transición aérea y subterránea de tubería IMC (Iron Male Threaded) de 1 ½" y 1", asegurando la correcta conexión entre las secciones aéreas y subterráneas del sistema. La transición incluyó la colocación de accesorios, conexiones seguras y protección adecuada para garantizar la integridad y funcionamiento eficiente del sistema de tuberías. Este trabajo es fundamental para mantener la continuidad y seguridad en la conducción de líquidos o gases.

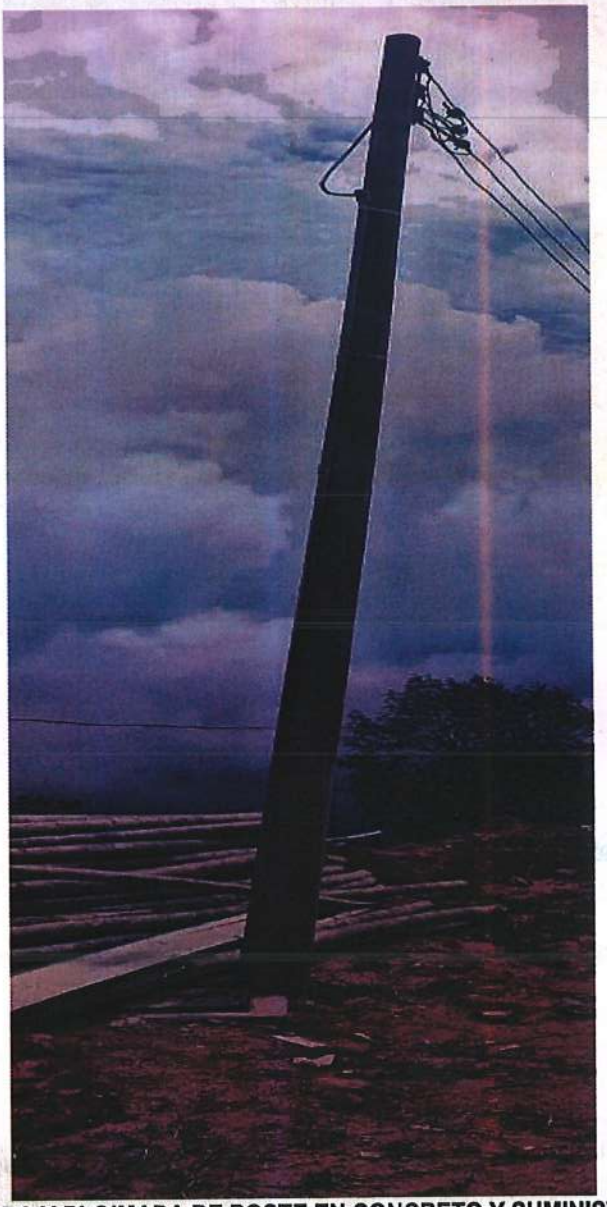

EXCAVACION, HINCADA Y PLOIMADA DE POSTE EN CONCRETO Y SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE MEDIA DIRECTA EN POSTE

Se realizó la excavación, hincada y verificación de la verticalidad (plomada) de postes en concreto, asegurando su correcta ubicación y estabilidad. Además, se llevó a cabo el suministro, instalación y cableado de media directa en los postes, garantizando la conexión eléctrica segura y eficiente para el sistema de alumbrado o señalización. Todo el proceso se realizó siguiendo las especificaciones técnicas para asegurar durabilidad, seguridad y funcionamiento óptimo del sistema.






INSTALACIÓN BRAZO SENCILLO SEGÚN DISEÑO DE 3,5 MTS. GALVANIZADO Y ACABADO EN PINTURA POLVO POLIÉSTER, PARA ANCLAR EL REFLECTOR.

Se procedió a fijar el brazo sencillo en la ubicación designada, asegurando que esté nivelado y alineado correctamente.

Se utilizaron los anclajes y tornillos adecuados para asegurar el brazo a la estructura de soporte, garantizando su estabilidad y resistencia.





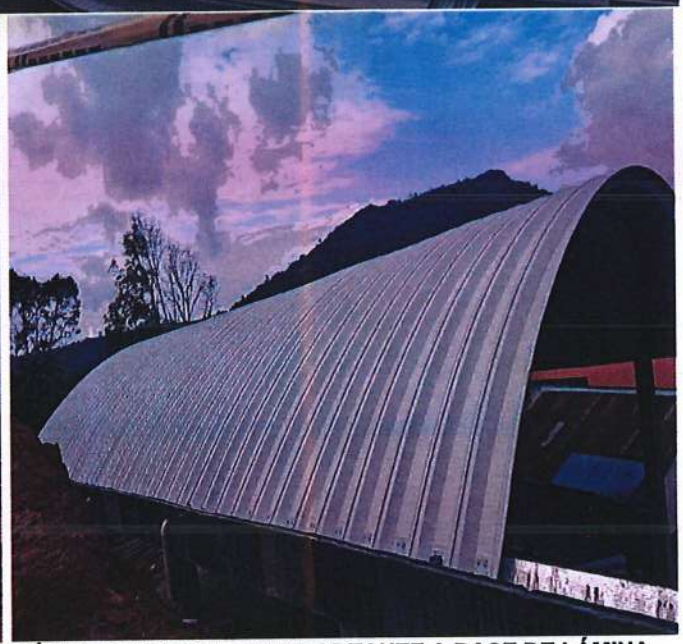

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22, EN PÁNELES ENGARGOLADOS LATERALMENTE DE UNA SOLA PIEZA EN ACABADO PINTRO POLIESTER ESTÁNDAR, FABRICADO A UN 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ

Se inició la colocación de los paneles engargolados de lámina de acero, comenzando desde un extremo de la cubierta y avanzando hacia el otro, asegurando que se mantenga la alineación y el solape adecuado entre los paneles. Se fijaron los paneles a la estructura de soporte utilizando tornillos y selladores, asegurando que estén bien sujetos y sellados para evitar filtraciones.

19. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA.
- MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DEL PERIODO
- COMITES DE OBRA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- INFORME SST CONSORCIO WIN
- PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

ARQ.MARCO TULIO YAÑEZ	(10/02/2024)	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo R.L. INTERVENTORIA**


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	3 ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M3
ITEM:	3.03 Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Viga canal Eje A1 - A6 y eje B1 - B6		30,40	0,35	0,400	2,00	8,51
Aleta Inclinada		30,40	0,18	0,580	2,00	6,35
Aleta Vertical		30,40	0,10	0,300	2,00	1,82
TOTAL						16,68

ESQUEMAS:

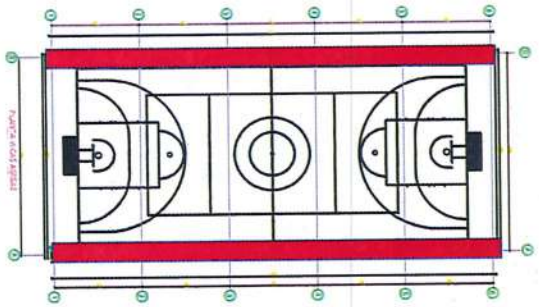

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M2
ITEM:	3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de manto zetal viga canal EJE A.		30,40			1,00	30,40
Suministro e instalación de manto zetal viga canal EJE B.		30,40			1,00	30,40
TOTAL						60,80

ESQUEMAS:

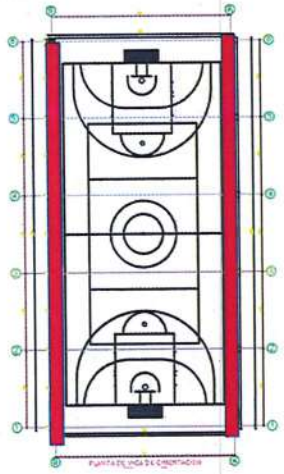

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/01/2025	
CAPÍTULO:	4	CUBIERTA	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.		15,45	30,40			469,68
TOTAL						469,68

ESQUEMAS:

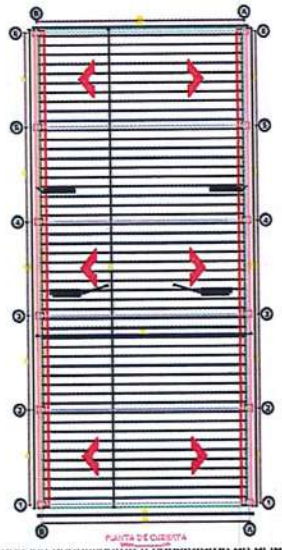

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO: 5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO	UNIDAD:	M2
ITEM: 5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm, entre EJE A-B		3,00	9,20		1,00	27,60
Plaquita		-3,00	0,40		1,00	-1,20
TOTAL						26,40

ESQUEMAS:

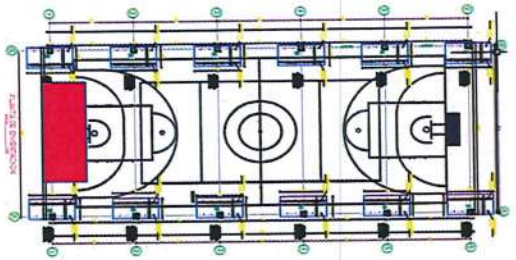

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tullo Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO	UNIDAD:	ML
ITEM:	5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
CUNETA EN CONCRETO EJE A ENTRE 1 Y 6		30,40				30,40
CUNETA EN CONCRETO EJE B ENTRE 1 Y 6		30,40				30,40
TOTAL						60,80

ESQUEMAS:

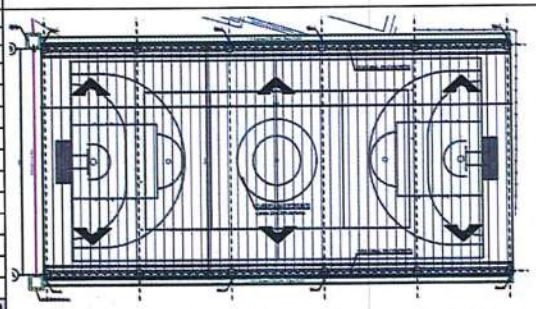

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	ML
ITEM:	6.1 Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Eje A1 - A3 - A4 - A6		5,80			4,00	23,20
TOTAL						23,20

ESQUEMAS:

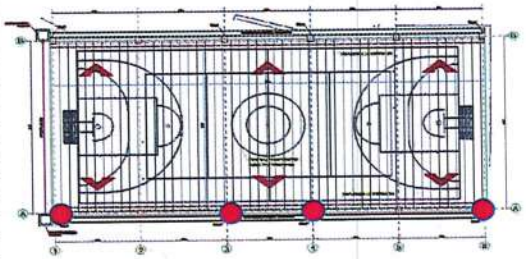

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/01/2025	
CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	ML
ITEM:	6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.		14,30				14,30
TOTAL						14,30

ESQUEMAS:

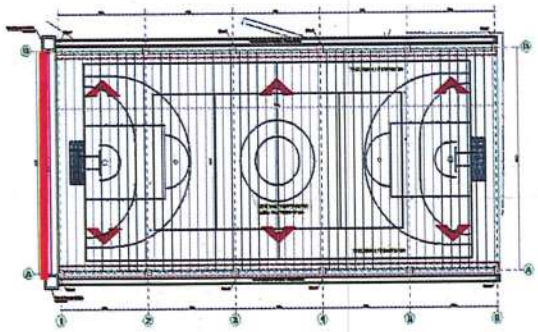


Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tullo Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/01/2025	
CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	ML
ITEM:	6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de		

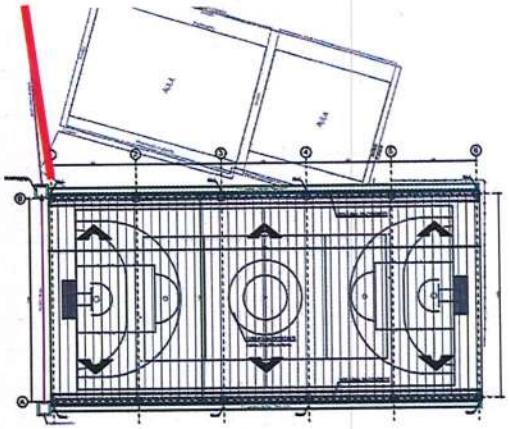DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.		20,00				20,00	
TOTAL						20,00	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	6.4 Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño. Eje A					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

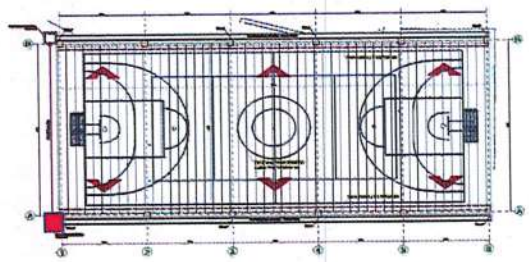

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**No. CONTRATO:**	**CLPIH397 DE 2023**
LOCALIZACION:	**VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	**INFORME**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO WIN**	**Desde:** 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF**	**Hasta:** 31/01/2025	
CAPÍTULO:	7 **PLACA POLIDEPORTIVO**	**UNIDAD:**	**UND**
ITEM:	7.02 **Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en**		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. Eje A					1,00	1,00
TOTAL						**1,00**

ESQUEMAS:

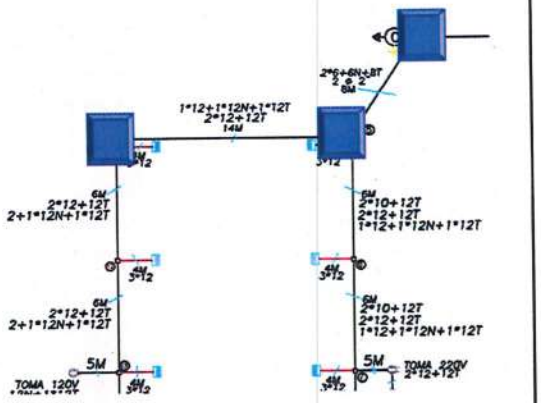

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	M3
ITEM:	7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		22,00	0,40	0,400		3,52
TOTAL						3,52

ESQUEMAS:

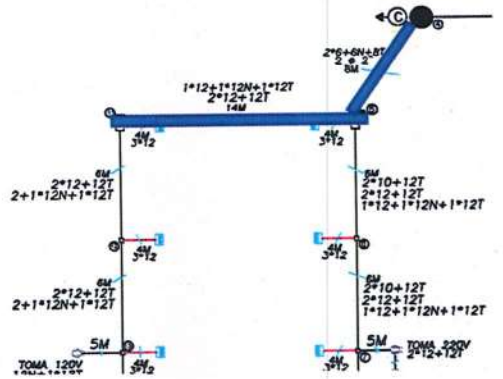

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramírez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	ML
ITEM:	7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.		22,00				22,00
TOTAL						22,00

ESQUEMAS:

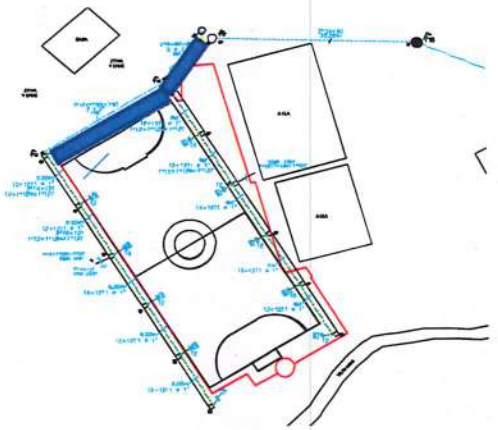

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.05 Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"					2,00	2,00
TOTAL						2,00

ESQUEMAS:

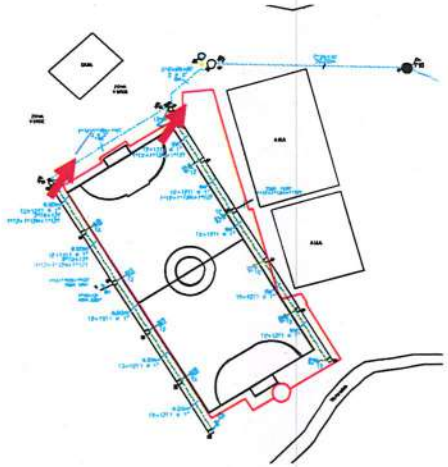

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y plano.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"				2,000	2,00
TOTAL					2,00

ESQUEMAS:

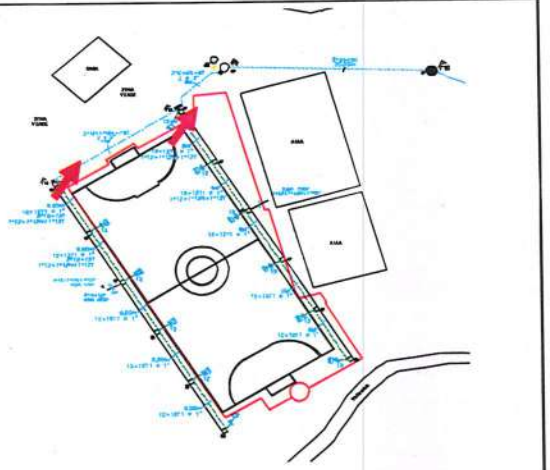

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y plano.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

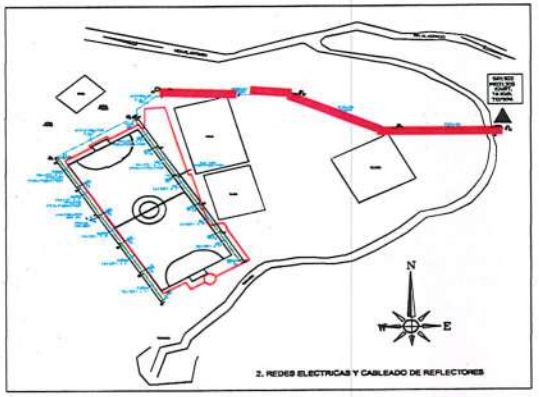

Observaciones:


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y plano.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	ML
ITEM:	7.09 Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.		14,00				14,00	
TOTAL						14,00	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.					12,00	12,00
TOTAL						12,00

ESQUEMAS:

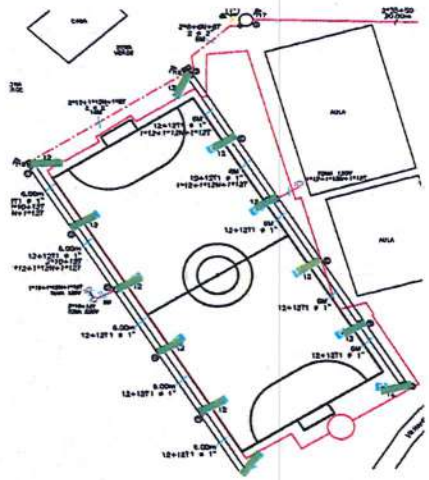

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	31/01/2025	
CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM:	7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

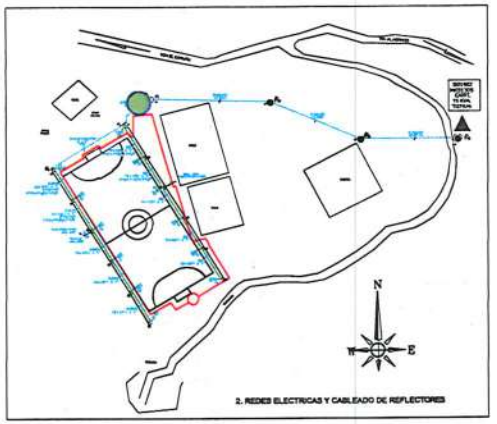

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	8	TRANSPORTE	UNIDAD:	M3-Km
ITEM:	8.01	Transporte de materiales petreos		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	KILOMETRO	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETA ANDEN (0,57m3 arena - 0,84m3 grava)	1,41	5,155840	20,00			145,3947	
TOTAL						145,3947	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

Fecha: 31 diciembre
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
No se trabaja día festivo

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoría
Jaime Alejandro Ramírez	Marco Julio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 03 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
- Se inicia con la instalación de placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 m, cantidad 25,95 m^2

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoría
Jaime Alejandro Ramírez	Marco Julio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 04 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
- Desencofre formaleta Vigacanal Eje B - Eje A solo los laterales. dejando el inferior.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoría
Jaime Alejandro Ramírez	Marco Julio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 06 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- No se trabajo día festivo

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoría
Jaime Alejandro Ramírez	Marco Julio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 07 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con el desencofre formaleta Vigacanal Eje A-B solo formaleta Lateral.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 08 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con el desencofre formaleta Vigacanal Eje A-B solo formaleta Lateral.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 09 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se termina el desencofre formaleta Vigacanal Eje A-B solo formaleta Lateral

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 10 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se inicia instalacion del manto vigacanal

Residente Obra — Director Obra — Residente Interventoria
Jaime Alejandro Pomaret — Marco Tulio Yañez — Cristian Junco

Fecha: 11 Enero 2025
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada
- No se trabaja el medio dia del sabado por fuertes lluvias

Residente Obra — Director Obra — Residente Interventoria
Jaime Alejandro Pomaret — Marco Tulio Yañez — Cristian Junco

Fecha: 13 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con instalación del manto en viga canal
- Se inicia Excavaciones manual sin clasificar, para instalaciones electricas.
- Excavación e Instalación de 1 poste de 8 mts.

Residente Obra — Director Obra — Residente Interventoria
Jaime Alejandro Pomaret — Marco Tulio Yañez — Cristian Junco

Fecha: 14 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con instalacion del manto en vigacanal
- Se culmina excavaciones manual sin clasificar, par instalaciones Electricas, total 3.52 m³

Residente Obra — Director Obra — Residente Interventoria
Jaime Alejandro Pomaret — Marco Tulio Yañez — Cristian Junco

Fecha: 15 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se termina la instación del manto en viga canal. 60.80 m^2
- Se inicia cajas de inspección de alumbrado de 40x40x70 cm

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 16 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se cylmina cajas de inspeccion alumbrado de 40x40x70cm
cantidad 3 und.
- Se inicia el transporte de materiales Petreos.
- Se inicia canalización en ductos conduit, brecha de 0.40 mts.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 17 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Se continua con el transporte de materiales Petreos
- Se termina, la canalización en ductos conduit, brecha de 0.40mts
Cantidad 22 ml.
- Se hace la transición aerea-subterranea tubena IMC 1" cant. 2und.
- Se hace la transición aerea-subterranea tubería IMC 1 ½" cantidad 2 und.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventorio
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 18 enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se continua con el transporte de material Pedreos

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 20 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se termina el transporte de materiales Petreos cantidad 145.39 m^3.
- Construcción caja de inspección 70X70 cant. 1.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 21 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Se inicia el desmonte de formaleta inferior de viga canal en concreto Eje A - B

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 22 Enero 2025
Clima: Lluvias
Actividades desarrolladas
- Se culmina el desmonte de formaleta inferior de viga canal en concreto Eje A-B
- Llegada material cubierta en lamina cal. 22

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha 23 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Se inicia la instalación de cubierta Autoportante a base de acero cal. 22

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 24 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada.
- Se continua con la instalacion de cubierta Autoportante a base de acero cal. 22 en lamina.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 25 Enero 2025
Clima: Soleado
Actividad desarrollada
- Se continua con la instacion de cubierta Autoportante a base de acero cal. 22 en lamina.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 27 Enero 2025
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada.
- Se continua con instalación de cubierta Autoportante en lamina acero cal. 22.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 28 Enero 2025
Clima: Lluvioso
Actividad desarrollada:
- Se culmina la instación de cubierta Autoportante en lamina acero Cal. 22. Cantidad 469.68 m².

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 29 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Instalación y cableado de caja de distribución. cant. 1 und.
- Instalacion y cableado media directa poste Cant. 1

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 30 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada
- Instalación cableado de red de distribucion principal en ducto subterraneo. Total 14.00 ml.
- Inicio Instalación de bajante en PVC 5 de 4"

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

Fecha: 31 Enero 2025
Clima: Nublado
Actividad desarrollada.
- Instalación de bajantes de PVC-S 4" con accesorios de conexión cantidad 23.20 ML.
- Instalacion de brazos sencillo en tubo galvanizado Cant. 12 und.

Residente Obra	Director Obra	Residente Interventoria
Jaime Alejandro Ramirez	Marco Tulio Yañez	Cristian Junco

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901352057
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 159A # 13A-46	TELÉFONO:	7508721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MiPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SUCURSAL BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7960320160	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1261217123		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:													$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 114.100	$ 114.100	$ 0	$ 0	$ 114.100
SUBTOTALES:									$ 114.100	$ 0	$ 0	$ 114.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 171.000	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:			$ 171.000	$ 0	$ 171.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13450383	YANEZ VILLAMIZAR MARCO TULIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 27718971	YANEZ VILLAMIZAR GLADYS STELLA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.423.500	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 40441590	LUNA HERNANDEZ NORMA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 911.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 03:00:23 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070161389

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822878650

PAGADO 05/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA		
Documento	CC19379912	**Dirección**	CR 50 #64 A - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114598014
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tot
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Tota
CC 19379912	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901756252
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO WIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAJICA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 12A-26	TELÉFONO:	7506721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - SUCURSAL EL AGRAGO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7963553182	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	28				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1334333242		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 0	$ 227.800	$ 4.200	$ 232.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 528.000	$ 9.600	$ 537.600
SUBTOTALES:										$ 755.800	$ 13.800	$ 769.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 225.000	$ 4.100	$ 0	$ 229.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 365.500	$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 365.500	$ 6.700	$ 0	$ 372.200
SUBTOTALES:													$ 590.500	$ 10.800	$ 0	$ 601.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 328.800	$ 328.800	$ 6.000	$ 0	$ 334.800
SUBTOTALES:									$ 328.800	$ 6.000	$ 0	$ 334.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 189.000	$ 3.500	$ 192.500
SUBTOTALES:			$ 189.000	$ 3.500	$ 192.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 141.800	$ 2.600	$ 144.400
SUBTOTALES:			$ 141.800	$ 2.600	$ 144.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1077877832	OSPINA PERMEO PEDRO NEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 60.000	$ 0	$ 45.000	$ 0	$ 0
2	CC 12202652	VELA TRUJILLO ARQUIMEDES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 80062089	RAMIREZ FRANCO JAIME ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 72.000	$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.042.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12202652	0	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA CAGUANCITO		3132491163			ARQUIVELA1984@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32901489	E	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	929.500	47.700	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32901489	2025-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1077858347	ROJAS FIGUEROA LUIS HERNANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
2	CC 17645756	ROJAS MORALES LUIS HERNANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12202652	0	ARQUIMEDES VELA TRUJILLO	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	VEREDA CAGUANCITO		3132491163			ARQUIVELA1984@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32901489	E	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	929.500	47.700	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32901489	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	455.600	0	24.600	0	480.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	24.600	0	480.200
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	6.200	0	120.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	3.100	0	60.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	3.100	0	60.100
ARP(Administradoras: 1)				2	198.200	0	10.700	0	208.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	198.200	0	10.700	0	208.900
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	6.200	0	120.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	114.000	0	6.200	0	120.200
Gran Total					881.800	0	47.700	0	929.500

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12194810
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERNAN JARAMILLO MORERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 4-25	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7958510671	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1240368569

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS SUBSISTEMAS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12194810	0	JARAMILLO MORERA HERNAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS	CALLE 5 4-28	GARZON-HUILA	8330206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240358284	9481137811	E	2025/02/05	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$242,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATOS (1 Afiliados)					$664,300	$172,800			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$16,200		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (1 Afiliados)					$664,300	$172,800			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$16,200		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$664,300	$172,800			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$16,200		$0	$0
1	CC 1077871260	CEDIEL DIAZ HERNAN DARIO	230301	14	$664,300	$172,800	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	$16,200	14	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$664,300	$172,800			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300	$16,200		$0	$0

2025/02/03 03:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12194810	0	JARAMILLO MORERA HERNAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS	CALLE 5 4-28	GARZON-HUILA	8330206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240358284	9481137811	E	2025/02/05	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$242,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$0	$0	$172,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$172,800	$0	$0	$172,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$0	$0	$16,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$16,200	$0	$0	$16,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$0	$0	$26,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$26,600	$0	$0	$26,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$0	$0	$26,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$26,600	$0	$0	$26,600
TOTAL				1	$242,200	$0	$0	$242,200

2025/02/03 03:01 PM
