TABLA DE CONTENIDO

Informe de componente de calidad final		1771
Anexo 1. Actividades ejecutadas en el proyecto		1798
1.1.	Actividades ejecutadas	1804
1.1.1.	Noviembre 2024	1805
1.1.2.	Diciembre 2024	1810
1.1.3.	Enero 2025	1816
1.1.4.	Febrero 2025	1822
1.1.5.	Marzo 2025	1828
1.1.6.	Abril 2025	1833
1.1.7.	Mayo 2025	1840
1.1.8.	Junio 2025	1846
1.1.9.	Julio 2025	1852
1.1.10.	Agosto 2025	1857
1.1.11.	Septiembre 2025	1862
1.1.12.	Octubre 2025	1867
1.2.	Control de actividades	1872
1.2.1.	Diciembre 2024	1873
1.2.2.	Enero 2025	1895
1.2.3.	Febrero 2025	1913
1.2.4.	Marzo 2025	1945
1.2.5.	Abril 2025	1979
1.2.6.	Mayo 2025	2077
1.2.7.	Junio 2025	2101
1.2.8.	Julio 2025	2134
1.2.9.	Agosto 2025	2163
1.2.10.	Septiembre 2025	2189
1.2.11.	Octubre 2025	2192
Anexo 2. Seguimiento de las comunicaciones		2198
2.1. Actas de comité		2199
2.2. Correspondencia enviada y recibida		2409
2.2.1. Enviada		2410
2.2.2. Recibida		2426
3.1. Bitácora de obra		2438
3.1.1. Diciembre 2024		2439
3.1.2. Enero 2025		2462
3.1.3. Febrero 2025		2474
3.1.4. Marzo 2025		2485
3.1.5. Abril 2025		2494
3.1.6. Mayo 2025		2501
3.1.7. Junio 2025		2506
3.1.8. Julio 2025		2516
3.1.9. Agosto 2025		2524
3.1.10. Septiembre 2025		2531
3.1.11. Octubre 2025		2537
Anexo 3. Control de documentos		2541
Anexo 4. Control de calidad de materiales		2543
4.1. Certificados de calidad		2544
4.1.1.	Accesorios eléctricos	2545
4.1.2.	Anticorrosivo	2586
4.1.3.	Caucho	2591
4.1.4.	Cinta de unión	2600
4.1.5.	Gravilla	2604
4.1.6.	Esmalte	2609
4.1.7.	Grama	2614
4.1.8.	Malla cerramiento	2618

4.1.9. Malla arcos	2621
4.1.10. Pegante	2626
4.1.11. Vinilo tipo 2	2631
4.1.12. Vidrio templado Pádel	2634
4.2. Inspección y ensayos	2636
Anexo 5. Manual de uso y mantenimiento	2683
5.1. Palermo sur	2684
5.2. Pijaos	2712
5.3. Victoria norte	2740
5.4. Valle de Refous	2768
5.5. Primavera	2796
5.6. La Esperanza	2824
5.7. Carlos Lleras	2852
5.8. Modelia	2880
5.9. Pádel PRD	2906
Anexo 6. Planos récord	2931
6.1. Palermo sur	2932
6.2. Pijaos	2934
6.3. Victoria norte	2936
6.4. Valle de Refous	2938
6.5. Primavera	2940
6.6. La Esperanza	2942
6.7. Carlos Lleras	2944
6.8. Modelia	2946
6.9. Pádel PRD	2948
Anexo 7. Control de cambios	2951
7.1. Adición y prórroga al contrato	2952
7.2. Balances	2962
7.3. Programación	2970
Anexo 8. Salidas no conformes	3015
8.1. Cierre CNC 1	3017
8.2. Cierre CNC 2	3028
8.3. Cierre CNC 3	3039
8.4. Cierre CNC 4	3045
8.5. Cierre CNC 5	3049
Anexo 9. Auditora interna	3059
9.1. Documentación auditor	3060
9.2. Plan de audtorias V1 – V2	3067
9.3. Programa de auditorias	3070
9.4. Auditoria 1	3072
9.5. Auditoria 2	3082

1. INFORME COMPONENTE DE CALIDAD FINAL NOVIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025

INFORME FINAL DE CALIDAD
V2

CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

OBRA PUBLICA 4041 DE 2024 CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD DE BOGOTA

Bogotá D.C., diciembre de 2025

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ:
Fecha: 19/12/2025	Fecha: 22/12/2025	Fecha: 22/12/2025
Nombre: Ing. John Jairo Marín López Ing. QA-QC	Nombre: Ing. Brayan Stivens Garcia Garcia Ing. Residente.	Nombre: Ing. Javier Linares Director de Obra

1772

VERSIÓN NO.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	22/11/2025	Se elabora el Documento
2	19/12/2025	Ajustes al documento de acuerdo a observaciones de la interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 6
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 7
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 9
5. Seguimiento al cumplimiento de plan de calidad 11
   5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto 11
   5.2 Otras actividades de cumplimiento del plan de calidad. 13
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 14
   6.1 Actas de Comité 14
   6.2 Correspondencia 14
   6.3 Bitácora. 15
7. Seguimiento de la información documentada 15
8. Control de calidad de materiales 16
   8.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor 16
   8.2 Control de Inspección y Ensayos. 19
9. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 22
10. Planos récord 23
11. CONTROL DE LA GESTION 23
    11.1 Control de Cambios 23
    11.2 Salidas no conformes 25
12. Auditorías internas 25
13. Listado de Anexos 26

1774

LISTADO DE TABLAS

Tabla Nro. 1 Estado del contrato 5
Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo 6
Tabla Nro. 3 Novedad 1 cambio de personal 7
Tabla Nro. 4 Novedad 2 cambio de personal 8
Tabla Nro. 5 Personal del contrato 8
Tabla Nro. 6 Actividades realizadas durante el proyecto 9
Tabla Nro. 7 Actividades cumplimiento plan de calidad. 13
Tabla Nro. 8 Materiales certificados por proveedor 16
Tabla Nro. 9 Materiales controlados por inspección y ensayos 20
Tabla Nro.10 Control de Cambios de los Balances 23
Tabla Nro.11 Control de Cambios de las programaciones. 24
Tabla Nro.12 Control de Cambios del contrato. 24
Tabla Nro. 13 Consolidado de salidas no conformes 25
Tabla Nro. 14 Consolidado de Auditorías realizadas 25

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 control instalación de Grama 11
Ilustración 2 control instalación Imprimación. 11
Ilustración 3 Ilustración control llegada de Materiales. 12
Ilustración 4 Acta de entrega para puesta en marcha. 13

1795

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

El contrato formalizado con el Instituto Distrital De Recreación y Deporte como se muestra a continuación tuvo inicio el 20 de noviembre de 2024 con un plazo inicial de 8 meses, el cual tuvo una adición de 3 meses en tiempo y presupuestal de 2.847.000.000. A continuación, se describe el proceso contractual del contrato:

Tabla Nro. 1 Estado del contrato

CONTRATO DE OBRA IDRD No.	*4041 - 2024*
CONTRATISTA	*CONSORCIO INNOVAPARQUES*
OBJETO	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".* *Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	***GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS.*** *Las obras por ejecutar se realizarán en los campos deportivos administrados por el IDRD en grama natural, sintética y de arena, los cuales se encuentran en un listado preliminar, sin perjuicio del ingreso de nuevos campos deportivos a cargo del IDRD, los cuales podrán ser sujeto de intervención conforme a las necesidades del Instituto, definidos en los comités de obra.*
FECHA DE INICIO	*Noviembre 20 de 2024*
FECHA FINAL INICIAL	*Julio 19 de 2025*
PLAZO INICIAL	*8 meses*
ADICION EN TIEMPO	*3 meses Total 11 meses*
FECHA FINAL CONTRATO	*Octubre 19 de 2025*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 5.200.000.000,00*
VALOR ADICION DEL CONTRATO	*$2.847.000.000*
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	***$8.047.000.000***
INTERVENTORÍA	*CONSORCIO SANTA TERESA 28*
SUPERVISOR	*RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO*

1776

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento al porcentaje de avance que fue presentando de acuerdo con el desarrollo y condiciones particulares detectadas, el cual se reportó a lo largo de cada informe. Dado que el 15 de mayo de 2025 el contrato tuvo una adición en dinero por un valor de **$2.847.000.000**, los indicadores tuvieron un cambio ajustándolo con el nuevo valor del contrato fijado en **$8.047.000.000 así como en tiempo por 3 meses para un total de 11 meses. Estos 2 nuevos datos de ingreso** afectaron los indicadores de avance en el tiempo, financiero y entrega de productos el cual cambiaría a un total de 62 productos por entregar. A continuación, se realiza el consolidado de los indicadores durante la ejecución del proyecto:

Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS	FRECUENCIA	META	EJECUTADO TOTAL PROYECTO
Porcentaje de avance en el tiempo	Nro. De Meses de Ejecución Acumulado x 100 / Meses de ejecución contractual.	12 x 100 = **100. %** / 12	Mensual	100% en el tiempo de ejecución del proyecto	Del 100% del plazo de ejecución con la adición del tiempo del proyecto, el contrato se ejecutó 100% del tiempo establecido.
Porcentaje de avance Financiero	Valor ejecutado en el periodo x100 / Valor total del Contrato	8.047.000.000 x 100= 100 % / 8.047.000.000	Mensual	100% del presupuesto	Del 100% del presupuesto con la adición presupuestal se ejecutó el 100% del valor total del contrato
Porcentaje de Avance Físico	Nro. De actividades ejecutadas acumulado periodo x100 / Nro. De actividades planeadas periodo.	18 x 100= 100% / 18	Mensual	100% de las actividades de la programación	Del 100 % de las actividades en el contrato, se ejecutó el 100% de las actividades.
Entrega de Productos	#Entrega de productos presentados aprobados /#Productos presentados) *100%	62 x 100= **100%** / 62	Inicio del Proyecto y [illegible]	Aprobación del 100% de los productos entregados.	De **62** productos proyectados con la adición del contrato para aprobación, se aprobaron el 100%

Nota: El indicador de entrega de productos, tiene como base 13 planes iniciales entregados y aprobados. Para cada periodo va sumando 4 informes x 12 meses que corresponden al técnico, calidad, SST y ambiental y un último informe final.

2773

Con base a los resultados de los indicadores en la ejecución del contrato podemos concluir lo siguiente:

- **Porcentaje de avance en el tiempo: 100%**. Esto indica que el proyecto se ha completado exactamente en el plazo contractual previsto (12 de 12 meses), cumpliendo el cronograma establecido.
- **Porcentaje de avance Financiero: 100%**. El valor total presupuestado para el contrato se ha ejecutado en su totalidad ($8,047,000,000), lo que sugiere una gestión financiera eficiente y alineada con el plan de inversión.

- **Porcentaje Avance Físico: 100%**. Se han completado todas las actividades planeadas durante la ejecución del contrato (18 de 18), lo que significa que el alcance físico del proyecto se ha logrado plenamente según la programación.

- **Entrega de Productos: 93% de aprobación**. Todos los 62 productos presentados fueron aprobados satisfactoriamente, alcanzando la meta de **calidad** del proyecto.

En términos generales, El proyecto es un **éxito rotundo**, habiendo cumplido todas las metas establecidas en tiempo, presupuesto, alcance y calidad de los entregables

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio INNOVAPARQUES dio cumplimiento con el personal mínimo requerido en los requisitos contractuales obteniendo las respectivas aprobaciones donde se indica el cargo, profesión, dedicación, consecutivo realizado por el Consorcio y comunicado de aprobación realizado por la interventoría.

Durante la ejecución del contrato, se presentaron 2 novedades de la siguiente manera:

a) En el informe 3 que corresponde al mes de enero de 2025 se hizo el cambio de cargo de Brayan García quien pasa de Inspector III a Residente de Obra reemplazando al Ing. Camilo Rojas y en reemplazo de Brayan Garzón ingresa al cargo de Inspector III, la ingeniera Carol Giselle López Figueroa

Tabla Nro. 3 Novedad 1 cambio de personal

No	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
1	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	**1.022.443.543**	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-093	IDRD-4080-G1-2024-132
2	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	1.024.488.768	RESIENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-061	IDRD-4080-G1-2024-081
2	CAMILO ANDRÉS ROJAS ZAPATA	1.013.636.704	RESIDENTE DE OBRA	Ing. Civil	80%	CINNOVAPARQUES-CF-001	IDRD-4080-G1-2024-030

2778

b) En el mes de julio que corresponde al informe Nro. 9 se presentó una novedad de cambio de personal relacionado con el Residente de Obra donde ingresa la Ing. Dayana Carolina Jiménez Hoyos en reemplazo del Ing. Brayan Stivens García como se muestra a continuación:

Tabla Nro. 4 Novedad 2 cambio de personal

No	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
1	DAYANA CAROLINA JIMENEZ HOYOS	1.004.088.970	RESIDENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-237	IDRD-4080-G1-2024-312
2	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	1.024.488.768	RESIDENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-041	**IDRD-4080-G1-2024-081**

Lo restante del contrato, se conservó el siguiente personal donde se como se muestra a continuación.

Tabla Nro. 5 Personal del contrato

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
1	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	DIRECTOR DE OBRA	Ing. Civil	22.4%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
2	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	79.455.166	AGRONOMO	Ing. Agrónomo	50%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
3	ANDREA MARCELA LOPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Ambiental	34%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
4	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1.013.632.556	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
5	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	1.115.913.000	INSPECTOR	Tecnólogo en obras civiles	100%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
6	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	**1.022.443.543**	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-093	**IDRD-4080-G1-2024-132**
7	ALEANDRO STEVE SARAY HERNANDEZ	80.050.329	TOPOGRAFO	Tecnólogo en topografía	12%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
8	JUAN CARLOS SANABRIA MUNZABA	79.698.876	CADENERO	NA	12%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
9	DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO	1.023.865.830	SECRETARIA	Técnico en gestión de aerolíneas y agencias de viajes	5%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
10	DAYANA CAROLINA JIMENEZ	1.004.088.970	RESIDEENTE DE OBRA	Ing. Civil	80%	CINNOVAPARQUES-CE-237	IDRD-4080-G1-2024-312

1779

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
	HOYOS						

Fuente: Elaboración Consorcio Innova parques

Las profesionales y firmas del personal que esta autorizado para la elaboración, revisión y aprobación del presente informe son los siguientes profesionales:

NOMBRE	CARGO	INFORME PARA FIRMAR	ROL
Ing. Dayana Carolina Jiménez Hoyos	Ingeniera Residente.	Informe Técnico	Elabora
Ing. Brayan Stivens García	Ingeniera Residente.	Informe Técnico	Elabora
Javier Linares	Director de Obra.	Todos los Informes	Aprueba y Revisa
Ing. John Jairo Marín López	Profesional de Calidad	Calidad	Elabora
Ing. Andrea López	Profesional SG SST y Ambiental	Seguridad, Salud en el trabajo y Plan Ambiental	Elabora

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

En la etapa inicial del contrato, el consorcio INNOVAPARQUES diseño un Plan de Calidad el cual fue avalado por la interventoria *CONSORCIO SANTA TERESA 28 mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-025 APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD V.2* cumpliendo con los parámetros establecidos por el IDRD. ***Ver anexo A***

Las actividades ejecutadas en el contrato de **MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS** fueron las siguientes:

Tabla Nro. 6 Actividades realizadas durante el proyecto

ITEM	CODIGO	ACTIVIDAD
1	12522	02 Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol
2	12484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO
3	12482	05 Cepillado de Campo Sintético
4	12492	09 Imprimacion asfáltica en Frio (Equip.de Bomba) **
5	12512	10 reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS) **
6	12483	12 CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **
7	16225	14 Corte césped canchas fútbol
8	10723	03 Relleno en arena de rio suelta**
9	12445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)
10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**

11	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).
12	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB).
13	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**
14	12468	06 Verticutter + ayudante **
15	12453	01 Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)
16	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **
17	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante
18	12454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **
19	12164	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO
20	12352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **
21	10561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**
22	12480	02 Mantenimiento de arcos (porterias) de futbol
23	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)
24	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)
25	14075	06 Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**
26	13813	07 Limpieza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)
27	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)
28	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)
29	12479	06 Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal) r=21 m
30	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo
31	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins
32	10457	05 Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **
33	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL
34	NP-001	Suministro e instalacion de cancha de Padel de 20 m de largo por 10 m de ancho, incluye transporte
35	NP-003	Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi reforz+bombeo, corte y dilatacion de juntas para estructura de campo Padel
36	NP-004	Afinado sobre placa de concreto estructural para cancha de padel
37	NP-005	Suministro e instalacion juego de arcos futbol 8 tipo cabaña moviles, incluye prueba de tintas
38	NP-006	Suministro e instalacion juego de arcos futbol 11 moviles, incluye prueba de tintas
39	NP-007	Pegue de tapete en grama sintetica existente (No incluye suministro de grama) incluye limpieza, adecuacion de zona, recorte, retiro de cinta existente, adecuacion de tapetes, cinta y pegante bicomponente, organización de rellenos existentes, cepillado manual orden y aseo de la zona
40	NP-008	Pegue de grama de demarcacion incluye suministro de grama sintetica monofilamento, de demarcacion blanca o amarilla, limpieza, adecuacion de zona, recorte, retiro de cinta existente, adecuacion de tapetes, cinta y pegante bicomponente, organización de rellenos existentes, cepillado manual, orden y aseo de la zona
41	NP-009	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ≥ 100 mts
42	NP-010	Trasiego m3 (2 Ayudantes) < 50,00 ML
43	NP-011	Suministro e instalación de grama sintetica curly morada para paisajismo cancha de padel de 700g/m2 espesor 12-14 mm
44	NP-012	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc)**
45	NP-014	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación)
46	NP-015	Cable Cu 1#8 AWG (Sum+Inst)
47	NP-016	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)
48	NP-017	Breaker Industrial40 Amp 'para 25 KA(Sum+Inst.)
49	NP-018	Control A lumbradoPublic.(S/Diagr Unif) Sum+Instal
50	NP-019	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m
51	NP-020	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades

1781

El consolidado de las actividades realizadas en todas las canchas se encuentran registradas en el ***anexo A***

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD

Dentro de las actividades de cumplimiento del plan de calidad las cuales se describen en el presente documento se encuentran entre otras la siguiente:

- Seguimiento a los indicadores del proyecto en el periodo.
- Seguimiento a las comunicaciones
- Control de ensayos de materiales
- Control y medición de equipos
- Control de los cambios existente en el proyecto.
- Auditorias internas las cuales se realizarán según la programación aprobada.
- Mejora continua.

5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto

Durante la ejecución del contrato se utilizaron los siguientes instrumentos para realizar el control de las actividades tales como:

a) **PS-F-11 Formato de verificación instalaciones v3**: Este formato tiene características de control de instalación de grama sintética, Mallas e imprimación asfáltica como actividades relevantes del contrato, como se muestra a continuación:

Ilustración 1 control instalación de Grama

1. Información General del Proyecto:			
Fecha de Verificación:	20-16-25		
Ubicación:	Valle de Ref		
Inspector que verifica	Cesar Lopez		
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo Futbol		
Nro de Lote instalado	25N 225 - E720 B		
2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuper 7	Material del Césped	Mantenimiento Polie.
Color del Césped:	Verde / Blanco	Altura de las fibras: (Medida en cm)	Gram

Ilustración 2 control instalación Imprimación.

1782

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES VARIAS	Codigo	PS-F-11 H
		Version	3
		Fecha	17/07/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	26/06/2025
Ubicación:	Tranquilera
Inspector que verifica	Carol Lopez
ubicación Portería: (Norte , Sur , Occ, Oriente)	Campo Completo

2. IMPRIMACION ASFALTICA			
2.1. Condicion de la Superficie antes de instalar			
	No aplica	Adecuada SI/No	Observaciones
La superficie no esta rodando/cia por exceso de humedad.		Si	Superficie seca
No presenta fallo o imperfecciones		Si	sin fallas
Esta libre de material suelto que impida la adherencia?		Si	sin material suelto
2.2. Aplicación de la imprimacion			
	No aplica	Adecuada SI/No	Observaciones
Esta correctamente distribuida sobre la superficie?		Si	OK
No muestra segmentos de discontinuidad?		Si	OK
El producto muestra que endureció correctamente?		Si	OK

b) **PS-F-08 Formato de control de llegada de materiales semanal:** Este formato tiene características de control de llegada de materiales a cada parque intervenido, en cantidades y proveedor como se muestra a continuación:

Ilustración 3 Ilustración control llegada de Materiales.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 05 de Julio de 2025
RESPONSABLE: Daniel Salcedo
PERIODO: del 01 al 05 de Julio de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	1/07/2025	TITO FABIAN	VIAJE TIPO 1	72	CAMION	CAMPOS NATURALES
2	4/07/2025	GREGORIO SEGUNDO	IMPRIMACION ASFALTICA	1355	MO	LA ESPERANZA
3	1/07/2025	CUPERZ SAS	GRAMA SINTETICA	12	ROLLOS	PRIMAVERA
4	1/07/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	3	ROLLOS	PRIMAVERA
5	1/07/2025	SÍLICO	PEGANTE BICOMPONENTE	660	KG	PRIMAVERA
6	1/07/2025	SUMINISTROS EPPI	ARENA SILICE	17	TON	PRIMAVERA
7	1/07/2025	CONSTRUMAS	GRAVILLA 3/4" A 1"	7	M3	ESPERANZA
8	1/07/2025	ECOTIRE GREEN	CAUCHO GRANULADO	17	TON	PRIMAVERA
9						

c) **Acta de entrega para puesta en servicio del parque en formato IDRD**: Este formato cuya propiedad intelectual es del Cliente IDRD, se anexo a lo largo de los informes como complemento al control de actividades, dado que este registro demuestra la satisfacción del cliente donde firmaban las partes interesadas como se muestra a continuación:

1783

Ilustración 4 Acta de entrega para puesta en marcha.



ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

d) **Supervisión y control de las actividades realizadas:** *La supervisión* se desarrolló a lo largo del contrato con la participación de los inspectores en cada parque intervenido, quienes permanentemente verificaban la calidad del trabajo diligenciando los formatos respectivos de control, así como del diligenciamiento de la bitácora la cual registra las actividades diarias. *Los controles* se realizaron a través de la gestión documental de los ensayos y calidad de los materiales instalados de acuerdo con las actividades de cada periodo. **Ver anexo A**

5.2 Otras actividades de cumplimiento del plan de calidad.

Además de los controles anteriormente relacionados., se realizaron los siguientes controles:

Tabla Nro. 7 Actividades cumplimiento plan de calidad.

ELEMENTO CONTROLADO EN EL PLAN DE CALIDAD	REGISTRO RELACIONADO
Indicadores de Gestión	A través de los indicadores relacionados en la tabla 2 del presente documento relacionado con el Porcentaje de avance en el tiempo, Porcentaje de avance Financiero, Porcentaje de Avance Físico y Entrega de Productos
Control y seguimiento del recurso humano	A través del cumplimiento de los perfiles de los profesionales establecidos contractualmente aprobados por la interventoría.
Actividades ejecutadas en el proyecto	A través de seguimiento de ejecución de actividades por parque y aprobados por la interventoría en el corte mensual

2184

Seguimiento al cumplimiento de plan de calidad.	Consolidando las actividades y los controles establecidos a través de formatos como el PS-F-11 Formato de verificación instalaciones v3., PS-F-08 Formato de control de llegada de materiales semanal, Acta de entrega para puesta en servicio de cada parque en formato IDRD. y supervisión y control de las actividades realizadas.
Seguimiento a las comunicaciones	Actividad realizada a través de las actas de comité, correspondencia y Bitácora.
Control de Documentos	A través de la actualización de los documentos cada vez que surtía un cambio de versión y de fecha utilizando el formato HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Infraestructura y preservación	A través del uso de los equipos necesarios para la ejecución de contrato en cada parque, uso de elementos de emergencias, equipos de cómputo, vehículos. ETC
Compras Y/O Plan de Adquisiciones	A través del control de adquisiciones relacionados por parque, así como de las remisiones respectivamente
Control de calidad de materiales Materiales certificados por proveedor **Control de Inspección y Ensayos.**	-Verificando los certificados de calidad de los materiales utilizados en cada parque y relacionado la información en el PS-F-05 Control de materiales con Certif. Conformidad v2 -Verificando los laboratorios que realizaban los ensayos y los parámetros establecidos que cumplieran con el plan de ensayos en el formato PS-F-08 Control de Inspección y ensayos.
Medición	Se verifico el nivel y equipo de topografía a través de los certificados de verificación y chequeo quincenales en el formato 20251019 PS-F-10 Control de equipos de Medición
Salidas no Conformes	Se tomaron las salidas no conformes cuyas fuentes fueron observaciones de la interventoría o de las auditoria internas registrándose en el formato HSEQ-F-06 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Auditoria	Se realizaron 2 auditorias internas en la ejecución del contrato el 27 de febrero y 29 de abril por un auditor certificado, haciendo uso de los formatos HSEQ-F-08 PROGRAMA DE AUDITORIAS, HSEQ-F-30 PLAN DE AUDITORIAS CI v2 y 20250227 HSEQ-F-39 INFORME DE AUDITORIA.
Control de cambios	Se registraron los cambios que mas impactaron al proyecto como fue la adición de contrato, las programaciones y balances.

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

6.1 Actas de Comité

Durante la ejecución del contrato se realizaron comités de seguimiento junto con la interventoría con una frecuencia aproximada de cada 8 días. Teniendo en cuenta los temas tratados se establecen compromisos de dichos temas a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos del contrato. En total fueron 44 Comités donde los compromisos y seguimiento se encuentran resumidos en el ***anexo B / actas de comité***.

6.2 Correspondencia

Durante la ejecución del contrato se realizaron comunicaciones que fueron enviadas y recibidas con su respectivo consecutivo entre el consorcio INNOVAPRQUES y la Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28. Todos los requerimientos técnicos, de calidad, ambientales y de Seguridad quedaron soportadas a través de este canal.

1785

Dada la amplitud estas comunicaciones, se adjuntan los archivos denominados *20251122 Control Correspondencia Enviado Consolidado* y *20251122 Control Correspondencia Recibido Consolidado* en el ***anexo B / Correspondencia enviada y recibida.***

6.3 Bitácora.


La bitácora se constituyó como el instrumento para el registro del control y supervisión de obra se usa para ir haciendo las anotaciones en el libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en el Consorcio Innova parques la cual contó con las siguientes características:

Fechado: Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que se efectúa el registro.

Escritura de la bitácora: Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca con tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en escribir con letra fácilmente legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo escrito.

Errores en la escritura de la bitácora: Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota debe anularse acompañada de una leyenda que diga "Esta nota se anula por tener error". De inmediato se abre la siguiente nota repitiendo lo asentado, esta vez sin errores. En lo posible se debe evitar el tener que proceder como se indica, pero llegado el caso es imprescindible hacerlo.

A Continuación, se muestra un aparte del 24 de abril sobre la información suministrada por este documento:

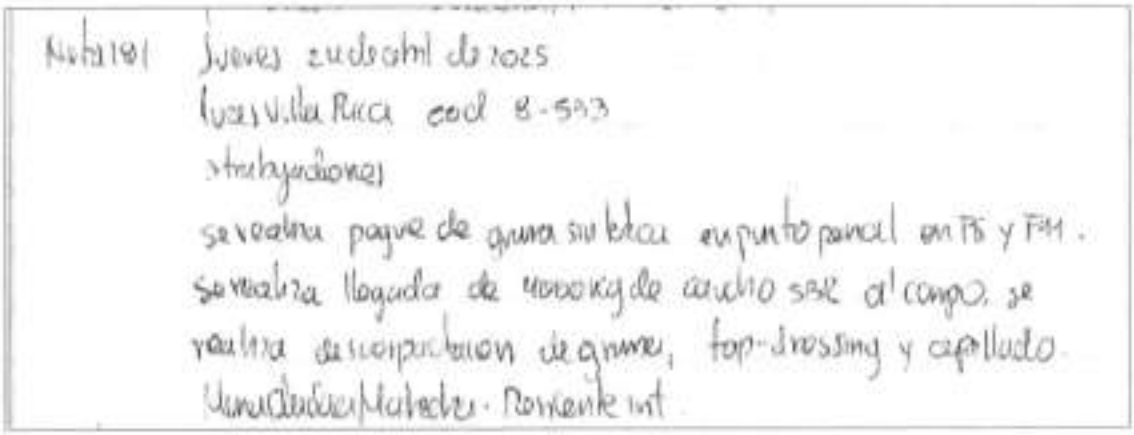
Nota 191 Jueves 24 de abril de 2025
Luis Villa Roca cod 8-593
Actividades
se realiza pique de guia suelda en punto parcial en PS y PM.
se realiza llegada de concreto de arcilla sobre el campo. se realiza descapote en zona, top-dressing y capellada.
Una Unidad Maestro. Ayudante int

El seguimiento consolidado de este registro se encuentra disponible en el ***anexo B / Bitácora***

7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada del Consorcio Innova parques incluye los planes previos al inicio del proyecto y la información entregada durante el proyecto relacionados con los siguientes documentos:

- Informe técnico
- Informe de Seguridad y Salud en el trabajo
- Informe de Calidad
- Actas de reuniones y comités de seguimiento
- Planos Récord.
- Manual de Funcionamiento.

Las firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación corresponden a los profesionales aprobados por la interventoria para la elaboración, en algunos casos la revisión y para la probación corresponde al director y /o representante legal del contratista e interventoria. Durante la ejecución del contrato se actualizaron las nuevas versiones de los balances y de las programaciones quedando consignado en el HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS disponible en el ***anexo C* Control de Documentos**

8. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Innovaparques estableció e implementó las medidas necesarias para controlar la calidad de las actividades de obra ejecutadas y los equipos de medición utilizados así como los materiales utilizados en cada una de estas, para lo cual, de conformidad con el plan de calidad aprobado por la interventoría, realizó el control a los materiales certificados por los proveedores, verificando que los mismos cumplieran con las características requeridas por el contrato .

8.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor

Los controles implementados por el Consorcio Innovaparques permitieron tener la trazabilidad de los materiales utilizados en obra, asegurando que los proveedores proporcionaran estándares de calidad , permitiendo identificar la conformidad de los productos bajo parámetros establecidos por normas del IDRD , normas nacionales o internacionales de acuerdo con las particularidades de cada material y cuyos resultados se muestran en los certificados de calidad emitidos por el mismo proveedor los cuales fueron conformes a lo largo del proyecto .Estos se encuentran disponibles en el ***anexo D / 1 Certificados de calidad***

El consolidado de certificados de materiales a conformidad se listan en la siguiente tabla:

Tabla Nro. 8 Materiales certificados por proveedor

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TECNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Caucho	NTC 5176	EN 933-1 EN 1097-3 EN 14955	N. E	CAUCHOS DINAMICOS

1787

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Vinilo Basico Tipo 2 Blanco	MNI 125,0- MAX 130,0	NTC 559	1561	TITO PABON
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr /Palermo SUR 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
ULTRACORROSIVO	N. E	N. E	95468	ULTRA PINTURAS
ESMALTE SINTETICO	N. E	N. E	95742	ULTRA PINTURAS
CINTA DE UNION DE CESPED	IDRD	N. E	CGQ-0345	MALLAS Y GRAMAS
MALLA DE CERRAMIENTO	IDRD	N.E.	1224-032	TRENZACOL
NYLON #4	IDRD	N.E.	1224-023	TRENZACOL
NYLON #8	IDRD	N.E.	1224-017	TRENZACOL
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr / Pijaos Lotes 24N530-E581B, 24N530AE581B, 24N531-E581B, 24N531AE581B, 24N532-E581B, 24N532AE581B, 24N529-E581B, 24N529AE581B, 24N528-E020B, 24N533-E581B, 24N533AE581B, 24N534-E581B, 24N534AE581B, 24N538-E581B, 24N538AE581B, 24N536-E581B, 24N536AE581B, 24N535-E581B, 24N535AE581B, 24N546-E581B, 24N546AE581B, 24N537-E581B, 24N537AE581B, 24N545-E581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
Cancha Primavera / EDEL DIAMONDBLADE 60-13,5 / 25N219-E720B	IDRD	ASTM 3776	-23027-P_NG	CUPERZ
Cancha Primavera / EDEL DIAMONDBLADE 60-13,5 / 25N219-E720B	IDRD	ASTM 3776	I-23027-P_NG	CUPERZ
Cancha VICTORIA NORTE / EDEL DIAMONDBLADE 60-13,5 / 25N222-E720B	IDRD	ASTM 3776	I-23027-P_NG	CUPERZ
ESMULSION ASFALTICA	IDRD	INV E 763-761-764-762-765-767-768	MA013-25	EMULSIONES ASFALTICAS
Cancha Carlos Lleras /EDEL DIAMONDBLADE 60-13,5 Rollo Lote 25N238-E720B	IDRD	ASTM 3776	I-23030-P_NG	CUPERZ

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Cancha Esperanza / EDEL DIAMONDBLADE 60-13.5 25N225-E720B	IDRD	ASTM 3776	I-23029-P_NG	CUPERZ
Cancha Primavera / EDEL DIAMONDBLADE 60-13,5 / 25N219-E720B	IDRD	ASTM 3776	I-23027-P_NG	CUPERZ
GRANULO ECO T4	IDRD	ASTM 1817 / ASTM D1864/ ASTM D5603	REF 104449 O.T. 35404	INTERLABCO
TABLEROS DE BAJA TENSION	IDRD	RETIE	1616 V:0	17066 CERTECNICA SAS
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	IDRD	RETIE	2550	CIDET
CONTACTOR	IDRD	RETIE	4446	CIDET
BARRAS DE COBRE RIGIDAS	IDRD	RETIE	EL-CS-230327	INTERTEK
AISLADORES	IDRD	RETIE	5687	CIDET
CONDUCTORES ELECTRICOS	IDRD	RETIE	410	CIDET
CANALETAS PLASTICAS	IDRD	RETIE	5398	CIDET
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	IDRD	RETIE	2599	CIDET
INTERRUPTORES	IDRD	RETIE	4453	CIDET
LUMINARIAS	IDRD	RETILAP	CS-LCO-14853-2022/044	LENOR
CINTA AISLANTES ELECTRICAS	IDRD	RETIE	3538	QCERT
CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS	IDRD	RETIE	4925	CIDET
ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	IDRD	RETIE	3138	QCERT
INTERRUPTORES AUTOMATIZADOS DE BAJA TENSION	IDRD	RETIE	1460	QCERT
EMPALMES DE MEDIA TENSION	IDRD	RETIE	CSR-CER954686	ICONTEC
VIDRIO DE SEGURIDAD	IDRD	NTC 1578, NTC 5756, NTC 5783	21112025	VITELSA

Fuente: Informes mensuales Consorcio Innova parques.

Con base a la tabla anterior se puede concluir que se utilizaron grandes volúmenes de materiales como vinilos para el mantenimiento de parques naturales , un segundo grupo de materiales que correspondieron a gramas y cauchos las cuales cumplían con estándares internacionales incluyendo estándares FIFA , otro tipo materiales relacionados con las mallas de cerramientos y malla de canchas de futbol y un último grupo de materiales eléctricos con cumplimiento RETIE Y RETILAB además de vidrio utilizado para la construcción de la cancha de PADEL los cuales cumplieron con los términos de referencia de las normas establecidas y relacionadas en la tabla Nro. 7.

3789

Además de las conclusiones mencionadas podemos adicionar lo siguiente:

a) **Cumplimiento Normativo Robusto:** La totalidad de los materiales listados cuenta con un marco normativo claro. Predominan las normas técnicas colombianas (**NTC**), internacionales (**ASTM, EN**) y reglamentos técnicos obligatorios como **RETIE** (para componentes eléctricos) y **RETILAP** (para iluminación).
b) **Estandarización para Escenarios Deportivos:** Existe un enfoque específico en la calidad para campos deportivos, evidenciado por el cumplimiento de estándares **FIFA** en las gramas sintéticas y especificaciones técnicas del **IDRD** (Instituto Distrital de Recreación y Deporte).
c) **Seguridad Eléctrica Garantizada:** Todos los componentes eléctricos (tableros, cables, interruptores, etc.) presentan certificados de conformidad con el reglamento **RETIE**, emitidos principalmente por entes acreditados como **CIDET** y **QCERT**, lo que asegura la seguridad de las instalaciones.

8.2 Control de Inspección y Ensayos.

Durante el desarrollo del contrato se hizo necesario hacer uso de materiales pétreos y cauchos granulado los cuales fueron sometidos a ensayos para verificación del cumplimiento de los parámetros requeridos de calidad, en laboratorio.

Esto permitió evaluar la conformidad del grupo de materiales que eran instalados en la medida que se iba ejecutando la obra, correspondiendo al laboratorio que las adelanto , tipo de inspección o ensayo ,especificación técnica entre otras , lo que permitió asegurar la calidad y el cumplimiento de los requisitos contractuales, y que en caso de que alguno de estos no cumpliera con los parámetros establecidos, se realizara el tratamiento de producto no conforme por calidad en los materiales proporcionados.

Los puntos de control y verificación se realizaron de manera constante en obra al recibo de los materiales y documentados como parte de los informes mensuales dejando la trazabilidad registrada en el anexo del plan de inspección y ensayos de cada informe, los cuales fueron aprobados por la interventoría. A continuación, se muestra el consolidado de los ensayos realizados en la ejecución del proyecto ejecutado por el consorcio INNOVAPARQUES:

Tabla Nro. 9 Materiales controlados por inspección y ensayos

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
21/11/2024	ARENA SILICE	N/A	Centro desarrollo Tecnológico Minero ENERGETICO SAS	análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos para agregados	NTC - 77	X		NO
8/07/2024	CAUCHO	N/A	ACOUSTO SCAN LATAM	CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO*TAMAÑO DE PARTÍCULA*DENSIDAD*FORMA	IDRD	X		NO
5/03/2025	ARENA DE PEÑA	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
		N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN.	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
	CAUCHO	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
5/06/2025	ARENA SILICE	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver Informe DGP-2564-25-1 CONCRELAB
5/06/2025	CAUCHO GRANULADO	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver Informe DGP-2564-25-2 CONCRELAB
5/06/2025	ARENA DE RIO	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver Informe DGP-2564-25-3 CONCRELAB
26/06/2025	Caucho Granulado	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver informe DGP-2904-25-1 CONCRELAB
26/06/2025	Arena de Silice	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS	IDRD	X		Ver Informe DGP 2904-25-2 CONCRELAB

3792

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
				DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)				
9/07/2025	ARENA, FECHA DE TOMA (2025-05-06)	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver informe DGP-3135-25-1 CONCRELAB
9/07/2025	Caucho	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver Informe DGP-3137-25-1 CONCRELAB
10/09/2025	Arena Junio	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013	IDRD	X		Ver Informe DGP-4324-25-1
10/09/2025	Caucho Junio	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013	IDRD	X		Ver Informe DGP-4324-25-1
10/09/2025	Arena Julio	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013	IDRD	X		Ver Informe DGP-DGP-4324-25-3
10/09/2025	Caucho Julio	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013	IDRD	X		Ver Informe DGP-DGP-4324-25-3

De la tabla anterior se puede inferir que los ensayos se centraron de mayor a menor frecuencia en Caucho Granulado, Arena Sílice, arena de Rio y grava. De igual manera se puede concluir que la granulometría fue apropiada para la idoneidad de los materiales instalados en los diferentes parques además que la precisión de los datos obtenidos evito los errores dados los laboratorios utilizados para esta activicad los cuales contaban con certificados por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC.

Además de lo anteriormente expuesto también podemos concluir lo siguiente:

a) Cumplimiento de Normativas y Especificaciones

Apego a Estándares Nacionales: El Programa de Inspección y Ensayos se basó en normas colombianas del INVIAS, como la **INV E 123:2013** para el análisis

1792

granulométrico y la **INV E 228:2013** para la resistencia a la degradación. Esto aseguró que los materiales (grava, arena, caucho) cumplieran con los requisitos técnicos exigidos en el país asi como las del Instituto de Recreación y Deporte IDRD

Criterios de Aceptación Claros: Se definieron criterios de aceptación específicos para cada material, como el cumplimiento de especificaciones técnicas del proveedor/contratista y parámetros de norma, lo cual fue fundamental para la **calidad** del proyecto.

b) **Control Riguroso de Materiales e Instalación**

Trazabilidad y Registros: Cada proceso requirió un registro documental (resultados de laboratorio, certificados de calidad, formatos específicos como el PS-F-11), garantizando la trazabilidad completa desde el origen del material hasta su instalación final.

c) **Asignación de Responsabilidades y Verificación**

Roles Definidos: Se designo a un **Ingeniero Residente** como principal responsable de la ejecución e inspección de los ensayos, y a los inspectores para la verificación de la instalación. Esta asignación de responsabilidades fue crucial para el desarrollo del proyecto.
Verificación Visual: Además de los ensayos de laboratorio, se incluyeron inspecciones visuales para elementos como la grama sintética y las mallas, asegurando la correcta instalación y estado de los materiales en sitio.

En resumen, el plan de inspección fue una herramienta **robusta** que garantizo la **calidad**, **seguridad** y **durabilidad** de las canchas sintéticas, al establecer un sistema completo de pruebas, responsabilidades y registros.

Los registros de los ensayos realizados durante la ejecución del proyecto se encuentran disponibles en el ***anexo D / 2 Inspección y Ensayos.***

9. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El objetivo principal de esta actividad o documento es de proporcionar una guía detallada para **garantizar la conservación a largo plazo, la seguridad y la funcionalidad** de las instalaciones y áreas verdes de los parques intervenidos.

Los puntos clave giraran en torno a:

a) **La Importancia del Cuidado Preventivo:** El mantenimiento regular será fundamental para evitar fallos graves y costosos.

b) **Seguridad y Fiabilidad:** Seguir las instrucciones garantizara un funcionamiento seguro y prolongara la vida útil área intervenida.

c) **Responsabilidad del Usuario:** El uso adecuado y el seguimiento de las pautas de limpieza y revisión son responsabilidad del operador y/o administrador del parque.

1793

Estos documentos se encuentran relacionados en el HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE **DOCUMENTOS** y disponibles en el **anexo E Manual de uso y mantenimiento** que corresponden a los parques de Pijao, Palermo SUR, Valle de Refous, Victoria Norte, primavera, La esperanza, Carlos Lleras y Modelia

10. PLANOS RÉCORD

Los **planos récord**, también conocidos como planos "as-built" o "conforme a obra", son documentos técnicos que reflejan la **realidad exacta y final** de una construcción o instalación una vez que se ha completado, incluyendo todas las modificaciones realizadas durante el proceso de obra. Para nuestro caso, los planos récord que se relacionan en este informe corresponden a los realizados en los parques de Pijao, Palermo SUR, Valle de Refous, Victoria Norte, primavera, La esperanza, Carlos Lleras y Modelia los cuales están disponibles **en el anexo F**.

11. CONTROL DE LA GESTION

11.1 Control de Cambios

Durante la ejecución del contrato se presentaron cambios que garantizaron la correcta ejecución de este minimizando los riesgos y las interrupciones con base al alcance del proyecto. Estos cambios fueron documentados e informados con el cliente y partes interesadas desde el punto de vista técnico y legal en el alcance del contrato, documentado la novedad respectiva.

Los pilares de los cambios estuvieron enfocados en los Balances, Programaciones y adición del contrato los cuales se describen a continuación

Tabla Nro.10 Control de Cambios de los Balances

CAMBIOS EN LOS BALANCES	
VERSION	ACTIVIDAD DEL CAMBIO
1	Entrega primera versión de balance, incluye presupuesto general+D30 de mantenimiento rutinario y correctivo para los campos Toberín, alameda 170, Verbenal, cedritos, servita, pijaos y Palermo sur
2	Se ajustan los presupuestos de los campos pijaos y Palermo sur
3	Se adicionan los presupuestos de los campos Marsella, tejar, miravalle, marruecos, villa sauces, cafam los gavilanes, burgos britalia, Tibabuyes, Florencia tronquitos, Normandía, la europa, carmelo, villas madrigal, marsella, san andres, Gaitana natural, alqueria, juan amarillo, marsella natural, fragua, fontanar y tabora
4	Se adicionan los presupuestos de los campos florencia tronquitos, la europa, Normandía, villas de madrigal, Marsella, prd playa, complejo acuatico, ciudad montes playa, ciudad montes softbol, uds playa, uds softbol, tunal softbol, fontanar mini beisbol, Gaitana playa, gorgonzola, Hayuelos, lombardía, chicala, parque industrial los ejidos, milenta tejar, Jazmín, Alfonso López, luces villa rica, santa Isabel, pradera sur, Américas occidental y porvenir
5	Se adicionan los presupuestos de los campos Vilanova, valle de refous, victoria norte, primavera, esperanza, carlos lleras, Modelia y PRD padel, por motivo de adicion al contrato

6	Se presenta balance final con ajuste en los presupuestos de los campos de adición y PRD padel

Tabla Nro.11 Control de Cambios de las programaciones.

CAMBIOS EN LAS PROGRAMACIONES	
VERSION	**ACTIVIDAD DEL CAMBIO**
1	Establece los mantenimiento de los campos sintéticos de USAQUEN (CAMPO TOBERIN COD: 01-079, CAMPO ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540, CAMPO VERBENAL COD: 01-313, CAMPO CEDRITOS COD: 01-031, CAMPO SERVITA F11 COD: 01-023
2	Se hacen ajustes a los mantenimiento de los campos sintéticos de USAQUEN (CAMPO TOBERIN COD: 01-079, CAMPO ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540, CAMPO VERBENAL COD: 01-313, CAMPO CEDRITOS COD: 01-031, CAMPO SERVITA F11 COD: 01-023
3	Se ajusta la programación incluyendo los mantenimientos generales por 133,5 días.
4	Inclusión de nuevos parques con base a la información suministrada por el cliente. San Andrés F11 y F5, Florencia tronquitos, la Europa, Normandía, villas del madrigal y Marsella F5
5	Se incluyen los MANTENIMIENTOS PIJAOS-PALERMO 2024 y priorización de canchas , PARQUE MIRAVALLE F8-2 COD: 05-042, PARQUE MIRAVALLE F8-1 COD: 05-042, PARQUE MIRAVALLE F5 COD: 05-042, PARQUE MARRUECOS COD: 18-041, PARQUE BURGOS BRITALIA - 2 COD: 11-058, PARQUE CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD: 11-1101, PARQUE BURGOS BRITALIA - 1 COD: 11-058, PARQUE TIBABUYES 1 COD: 11-084, PARQUE TIBABUYES 2 COD: 11-084, PARQUE VILLA DE LOS SAUCES COD: 08-180, PARQUE SAN ANDRES F5, PARQUE SAN ANDRES F11, CARMELO F5, CARMELO F11, FLORENCIA_TRONQUITOS, LA EUROPA, NORMANDIA, VILLAS DE MADRIGAL, MARSELLA F5 y MANTENIMIENTO RUTINARIO.
6	Se ajusta la programación con la adición del tiempo y alcance de cachas incluyendo la de PADEL a 19 de octubre de 2025 por 506,38 días
7	Se ajustan fechas a la programación y se desglosa las actividades del mantenimiento correctivo priorizado de canchas naturales de **ALQUERÍA, GAITANA NATURAL, JUAN AMARILLO, MARSELLA NATURAL, UDS PLAYA – ROTOVO , PRD PLAYA – ROTOVO, UDS SOFTBALL – ROTOVO, UDS BEISBOL – ROTOVO, GAITANA VOLEY PLAYA – ROTOVO, CIUDAD MONTES VOLEY PLAYA – ROTOVO, CIUDAD MONTES SOFTBALL – ROTOVO, TUNAL SOFTBALL – ROTOVO, HAYUELOS 2 - F5, ETC.**
8	Ajustes a la programación final a la fecha de terminación del contrato del 19 de octubre de 2025

Tabla Nro.12 Control de Cambios del contrato.

CAMBIOS EN LA DURACION DEL CONTRATO	
DESCRIPCION	**ACTIVIDAD DEL CAMBIO**
Adición 001 y prorroga 001	"adición y prórroga del mismo, por un valor de dos mil ochocientos cuarenta y siete millones pesos mcte ($ 2.847.000.000.00) y por un periodo de tres (3) meses, a partir del 20 de julio de 2025 hasta el 19 de octubre de 2025" (adición 001 y prorroga 001) para cubrir el mantenimiento de los parques Victoria norte, valle de refous, Primavera, Esperanza, Carlos lleras, Modelia, gimnasio del norte y luna park ; posteriormente se excluyen estos 2 últimos parques por solicitud del cliente para construir una cancha de PADEL.

Esta documentación se encuentra registrada en **el anexo G**

1795

11.2 Salidas no conformes

El consorcio durante ejecución del contrato realizo el seguimiento a la conformidad del cliente, con relación a los productos suministrados establecidos. A continuación, se presenta una tabla consolidada de las salidas no conformes en el proyecto.

Tabla Nro. 13 Consolidado de salidas no conformes

Informe No.	Fuente	Descripción	Estado
2	Requisitos de Cliente	No se ha realizado la presentación de las caracterizaciones iniciales de los materiales pétreos correspondientes con base a las especificaciones TECNICAS del Contrato.	Cerrada
3	Requisitos de Cliente	No se encuentra evidencia objetiva de la aprobación de los informes mensuales afectando el indicador de entrega de productos.	Cerrada
4	Auditoria Interna / Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores.	Cerrada
6	Proceso de Prestación del Servicio	No se observa trazabilidad objetiva del envió de la programación V5 mediante comunicado a la interventoría, ni con fecha que identifique su elaboración según lo descrito en "7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y 10. PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.	Cerrada
7	PLAN DE CALIDAD	No se observa realización de los ensayos de materiales (caucho y arena) con la frecuencia establecida en el plan de ensayos V5	Cerrada

Estos registros se encuentran disponibles en el **anexo H**

12. AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento del plan de calidad presentado por el consorcio, se adelantaron Auditorías Internas por parte de un profesional asignado por una de las empresas consorciadas cuyo propósito fue evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a los componentes: ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos. A continuación, se presenta una tabla consolidada de las auditorías internas realizadas en la ejecución del proyecto.

Tabla Nro. 14 Consolidado de Auditorías realizadas

No. Auditoria Interna	Hallazgos (No conformidades u observaciones)
1	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores. **Cerrada.**
2	No se observa trazabilidad objetiva del envió de la programación V5 mediante comunicado a la interventoría, ni con fecha que identifique su elaboración según lo descrito en "7. CONTROL DE

1796

	DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y 10. PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.

Con base a la tabla anterior se concluye que con base a los resultados obtenidos de las auditorias se implementaron los controles y acciones de mejora que permitieron la optimización de la gestión del Consorcio y el mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas las cuales fueron entregadas en cada informe respectivo-mensual permitiendo cerrar los hallazgos identificados. Los registros de las auditorias internas se encuentran en el **anexo I,** así como el programa de auditorías, plan de las 2 auditorias realizadas y hoja de vida del auditor que corresponde al Ing. John Jairo Marín López.

Este requisito se cumplió aplicando los siguientes registros:

HSEQ-F-08 PROGRAMA DE AUDITORIAS
HSEQ-F-30 PLAN DE AUDITORIAS CI
HSEQ-F-39 INFORME DE AUDITORIA
HSEQ-F-06 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
GG-F-03 ACTA REUNION
RH-F-02 CONTROL FORMACION Y ENTRENAMIENTO v2

13. LISTADO DE ANEXOS

A Actividades ejecutadas en el proyecto
B Seguimiento a las comunicaciones
C Control de Documentos
D Control de Calidad de Materiales
E Manual de uso y Mantenimiento
F Planos Récord
G Control de cambios
H Salidas no Conformes
I Auditoria Interna.

1797

2. ANEXO 1
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-025

Bogotá D. C., 02 de diciembre de 2024

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **RESPUESTA CINNOVAPARQUES-CE-010 - APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD V.2**

Cordial saludo

Revisado el Plan de Calidad versión 2, presentado como anexo del comunicado **CINNOVAPARQUES-CE-010**, informamos que este cumple con los requisitos mininos, por tanto, se emite aprobación del mismo.

Quedamos atentos,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lista de chequeo (4 folios)
Con copia: N/A
Elaboró: VLU
Revisó: N/A

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN PLAN DE CALIDAD
COMPONENTE DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD

Contrato N. 4041-2024 **Parque:** *CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS*

Objeto contractual: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Supervisión: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO **Fecha Revisión:** lunes, 2 de diciembre de 2024 **Rev.** 02 **Version** 02

Apoyo a Supervisión: AFD LILIANA BARBOSA **Revisa:** ING YIANNEY LEAÑO

Concepto de revisión:

PRE APROBADO			APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ENTRADAS CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoria) Descripción del contrato con mínimo la siguiente información: • Contrato N • Contratista: • Objeto: • Localización: • Plazo Total: • Plazo de la etapa de Pre construcción: • Plazo de la etapa de Obra • Fecha de Inicio: • Fecha de Terminación • Alcance del Proyecto: (Descripción general de las actividades contratadas				X	CONTRATO DE OBRA Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES NIT: 901885635-2 N° Contrato: 4041 DE 2024 Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2024 Fecha Final: Julio 19 de 2025 Plazo Actual: Ocho (8) meses
Indicadores de gestión Contractual Presentar los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto. Establecer metas de cumplimiento y plantear plan de acción.				X	Cumple lo mínimo requerido Tabla 12
Planeación de los recursos humanos Presentar organigrama de la interventoria con el personal asignado y aprobados al proyecto (clave y mínimo) con sus % dedicaciones. Así mismo definir los roles, responsabilidades y autoridades en el desarrollo de las actividades del objeto contractual de cada uno de estos. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente plan.				X	Organigrama Cumple lo mínimo requerido Roles y responsabilidades Cumple lo mínimo requerido
Planificación, Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Operativa y de gestión) Identificar los riesgos asociados basado en la Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales asociada al contrato de obra que puedan afectar el cumplimiento de los resultados previstos en el objeto contractual, prevenir o reducir efectos no deseados y determinar las acciones y controles para prevenir su materialización durante la ejecución del contrato.				X	Cumple lo mínimo requerido
Planeación de las comunicaciones Informar donde y a quien se deben dirigir las comunicaciones (dirección, teléfono, correo electrónico) y los datos de contacto del personal involucrado en el proyecto (teléfono, correo electrónico) Definir metodología para el seguimiento a los compromisos de reuniones, mesas de trabajo o comités que se celebren dentro de la ejecución del contrato. Definir el manejo para la bitácora de obra, incluyendo la metodología para su trazabilidad, uso y responsables.				X	Cumple lo mínimo requerido

1800

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN PLAN DE CALIDAD
COMPONENTE DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD

Contrato N. 4041-2024 **Parque:** *CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS*

Objeto contractual: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Supervisión:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	**Fecha Revisión:**	lunes, 2 de diciembre de 2024	**Rev.**	02	**Versión**	02
Apoyo a Supervisión:	ARQ LILIANA BARBOSA	**Revisa:**	ING VIANNEY LEAÑO				

Concepto de revisión:

PRE APROBADO			APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento				OBSERVACIONES
	N/A	0%	51%	100%	
Información documentada de Entrada *Presentar un listado maestro de documentos (documentos, manuales, formatos, especificaciones técnicas, planos técnicos, presupuesto, programación, etc.) necesarios para llevar a cabo las actividades objeto del contrato. En dicho listado se debe identificar claramente los documentos y registros externos e internos a aplicar.				X	Cumple lo mínimo requerido
Planeación de la información documentada Describir la metodología utilizada para el control de la documentación de origen interno y externo requerida, que proporcionen evidencia y resultado del desarrollo de las actividades objeto del contrato, haciendo énfasis en que se dispone de información documentada que define las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar que requiere para cumplir el alcance del contrato.				X	Cumple lo mínimo requerido
Plan de adquisiciones Presentar la metodología de seguimiento a el cumplimiento del plan de adquisiciones del contratista de obra.				X	Cumple lo mínimo requerido
PLANEACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN					
Elementos de entrada al diseño Evidenciar la identificación de las entradas al "Proyecto de Diseño", los cuales son los requisitos esenciales a los cuales se les debe dar salida en el producto final (Funcionales, de desempeño, legales y reglamentarios.)	X				El objeto contractual no contempla estudios y diseños
Proceso de Revisión y Verificación Presentar la metodología de trabajo para la revisión y verificación de cada uno de los entregables de acuerdo con las etapas propias de cada estudio y diseño objeto del alcance del presente proceso. Identificando los criterios de aceptación de cada producto a verificar conforme los estándares normativos, técnicos y legales asociados a cada paquete de entregables, además de los descritos en la documentación publicada por el IDRD aplicable al objeto contractual. Presentar los formatos de REVISIÓN Y VERIFICACIÓN a implementar, incluyendo los emitidos por la entidad y los propios de la interventoría según necesidad y especialidad.	X				El objeto contractual no contempla estudios y diseños
Proceso de Validación Describir claramente la metodología para la coordinación técnica entre especialidades, con el fin de garantizar que el producto final "Proyecto de Diseño" cumpla con la funcionalidad requerida para dar salida a las entradas definidas al inicio de la ejecución. Presentar los formatos de VALIDACIÓN a implementar, incluyendo los emitidos por la entidad y los propios de la interventoría según necesidad y especialidad.	X				El objeto contractual no contempla estudios y diseños
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación *Relacionar la ubicación de las instalaciones físicas donde se realizarán las actividades objeto del contrato de interventoría y de obra (Dirección, ciudad). Relacionar los recursos a utilizar y la metodología de preservación.				X	Cumple lo mínimo requerido

1801

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN PLAN DE CALIDAD
COMPONENTE DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD

Contrato N. 4041-2024 **Parque:** *CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS*

Objeto contractual: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Supervisión: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO **Fecha Revisión:** lunes, 2 de diciembre de 2024 **Rev.** 02 **Version** 02

Apoyo a Supervisión: ARQ LILIANA BARBOSA **Revisa:** ING YIANKEY LEAÑO

Concepto de revisión:

PRE APROBADO			APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento				OBSERVACIONES
	N/A	0%	51%	100%	
Planificación operacional en la ejecución de obra Se debe evidenciar como se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios. Incluir programación y presupuesto versión 1. Evidenciar como se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.				X	Describen los siguientes controles, los cuales se requiere sean evidenciados en los informes mensuales -Control de los procesos y de los parámetros de monitorización y medición en las etapas adecuadas, entre ellos el cronograma de obra. -Procedimientos, planes de inspección y ensayo, protocolos de realización de servicios. -Procesos constructivos con base a la cartilla del IDRD. -Plan de la calidad. -Especificaciones de los productos y servicios establecidos por el IDRD -Instrucciones de trabajo que definen los criterios y métodos de operación y control, criterios de proceso y criterios operacionales. -Especificación de la infraestructura y ambiente de trabajo establecidos en el Numeral 8.2 del presente documento. -Especificación de las competencias requeridas para las personas requeridas en el proyecto según el anexo técnico en la ejecución del proyecto o la provisión.
Seguimiento y control operacional en la ejecución de obra En este numeral se debe determinar la metodología y controles a seguir por la interventoría, para asegurar el cumplimiento del objeto contractual en las diferentes etapas del contrato asociado, debe incluir los registros que soportan estas actividades por parte de la interventoría conforme lo que se describa en: **PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO** (Incluye control a actividades y materiales de obra) - Descripción del recurso (Material, actividad o equipo) - Norma o especificación aplicable - Variable y Criterio de aceptación - Método de inspección - Frecuencia de inspección (contratista de obra e interventoría) - Responsable - Registros (Si se aplica formato se debe adjuntar el modelo)				X	<u>Plan de inspección y ensayo OBRA</u> Cumple lo mínimo requerido

1602

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN PLAN DE CALIDAD
COMPONENTE DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD

Contrato N.	4041-2024	Parque:	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"		
Supervisión:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	Fecha Revisión:	lunes, 2 de diciembre de 2024 — Rev. 02 — Versión 02
Apoyo a Supervisión:	ARQ LILIANA BARBOSA	Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO

Concepto de revisión:

PRE APROBADO			APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
Planeación para el seguimiento de los Equipos de inspección, medición y ensayo Describir si se requieren para las actividades objeto del contrato equipos de seguimiento y medición y el control que se llevara a cabo en cumplimiento del numeral y describir como se verificarán los equipos de medición y ensayo del contrato de obra, y como se hará seguimiento a los equipos a cargo de la interventoría.				X	**Revisión y control a Equipos de medición y ensayo** Realizar a los equipos de topografía (Estación y Nivel) de acuerdo a lo establecido en el Sistema de gestión de calidad del IDRD, describir las frecuencias, formato y mecanismos para su control.
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios Presentar la metodología de revisión y control a los cambios generados durante la ejecución del proyecto con el fin de asegurar la conformidad con los requisitos contractuales. Describir la manera de presentar la trazabilidad de la información documentada, sus registros de revisión, justificación y aprobación de los cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la revisión.				X	Cumple lo mínimo requerido
Salidas no conformes Definir cómo se planea la identificación, tratamiento, seguimiento, control y cierre de las salidas no conformes de acuerdo a su naturaleza y su efecto sobre la conformidad del proyecto en ejecución. Presentar un listado preliminar de lo que se considerará como Salida No Conforme.				X	Cumple lo mínimo requerido
Auditorías internas El interventor deberá establecer la frecuencia y alcance de las auditorías internas a realizar al cumplimiento de los requisitos definidos contractualmente, debe establecer y presentar, el programa y plan de auditoría de cada uno de los contratos asociados. Debe tener en cuenta lo establecido en el apéndice de calidad de cada contrato. Es importante definir la estrategia que interventoría llevara a cabo para el cumplimiento del presente requisito por parte del ejecutor. Nota: los contratos asociados deben garantizar la independencia e imparcialidad del grupo auditor.				X	Cumple lo mínimo requerido

ANEXOS (Copias y Originales)

Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:

A Matriz de Riesgos	F Control adquisiciones
B Equipos de medicion	G Compras
C Correspondencia	H Propiedad del Cliente
D Programacion	I ACCIONES CORRECTIVAS
E Plan de ensayos	J Auditorias

OBSERVACIONES GENERALES

2803

2.1. ANEXO 1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1.1. NOVIEMBRE 2024

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE NATURALES RUTINARIOS																			
CORTE No. 1 MES NOVIEMBRE																			
N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA
1	TABORA	2	2			1													
2	PRD ESTADIO	2	2			5													
3	PARQUE NACIONAL	2	2			4													
4	SAN CRISTOBAL	2	2			4													
5	TUNAL FUTBOL	1	1			1					1620.5								
6	TIMIZA ESTADIO	1	1			1													
7	COUNTRY				2														
8	SERVITA F11			1						112.8									
9	SERVITA F5			1						27									
10	CABRERA JAPON			1						30									
11	CANTALEJO			1						25.8									
12	PRADO PINZON		1	1						51	154.56								
13	MAZUREN			1						39									
14	VILANOVA			1						30									
15	VERBENAL			1						33									
16	UDS SINT		1	1						48	552.89								
17	EDUARDO SANTOS			1						40.2									
18	GUSTAVO RESTREPO			1						30									
19	VENECIA 1			1						31.8									
20	VENECIA 2			1						31.8									
21	LAGUNETA			1						52.8									
22	SAN JOSE CENTRO			1						24.6									
23	PARQUE OLAYA HERRERA			1						102.36									
24	SAN ANDRES F5			1						48.18									
25	SAN ANDRES F11			1						102.6									
26	EL CARMELO F5			1						46.32									
27	EL CARMELO F11			1						117									
28	VILLA LUZ F5			1						48									

2806

29	VILLA LUZ F11			1						92.94										
30	VILLAS DEL MADRIGAL			1						42										
31	FLORENCIA										216.06									
32	FLORENCIA TRONQUITOS			1						54.6										
33	PAVCO		1	1						40	517									
34	JAZMIN			1						97.2										
35	PEPITA			1						30.22										
36	CIUDAD MONTES 1			1						21										
37	CIUDAD MONTES 2			1						21										
38	SIERRA MORENA 1			1						30										
39	SIERRA MORENA 2			1						30										
40	CASA BLANCA			1						54.6										
41	FONTANAR DEL RIO F11			1						90.6										
42	FONTANAR DEL RIO F5			1						30										
43	FONTANAR MINI BEISBOL			1						69.96										
44	LA GAITANA			1						68.4										
45	URB LOMBARDIA			1						30										
46	CIUDADELA CAFAM			1						43.2										
47	BERLIN			1						38.4										
48	TIBABUYES 1			1						50.4										
49	TIBABUYES 2			1						60										
50	CAFAM LOS GAVILANES			1						90										
51	BILBAO			1						123										
52	LA ESPERANZA			1						46.8										
53	CLARELANDIA F11		1	1						87										
54	CLARELANDIA MINI		1	1						40.2										
55	TEJAR			1						91.2										
56	ATALAYAS			1						55.74										
57	PORTAL DEL SOL			1						84										
58	CAMPO VERDE 1			1						58.8										
59	CAMPO VERDE 2			1						56.4										
60	CAMPO VERDE 3			1						29.4										
61	HAYUELOS F8			1						68.09										
62	HAYUELOS F5			1						41.4										
63	NORMANDIA			1						88.8										
64	VILLEMAR		1	1						91.2	602									
65	PRADERA SUR		1	1						34.59	102									

3804

66	LICORERA F5			1						36.6									
67	ESTRELLA NORTE		1	1						47.31	139.42								
68	TOBERIN						1	4191.2	4191.2			2	1	1	3	111.05	5000	40	40
69	BURGOS BRITALIA 1		1	1						40.2	188.2								
70	BURGOS BRITALIA 2		1	1						40.2	230.68								
71	LINDARAJA			1						30									
72	COMETAS			1						48									
73	PTAR			1						104.4									
74	PRD 1			1						104.4									
75	PRD 2			1						105.6									
76	GIMNASIO DEL NORTE			1						41.4									
77	BACHUE			1						103.8									
78	VILLA MAYOR			1						93									
79	LAS CRUCES			1						42									
80	LACHES			1						66									
81	TERCER MILENIO 1 F5			1						32.4									
82	TERCER MILENIO 2 F5			1						32.4									
83	TERCER MILENIO 3 F11			1						99.6									
84	LOURDES			1						21									
85	CAYETANO CAÑIZARES		1	1						99	898.2								
86	GILMA F11			1						93									
87	GILMA F8			1						48.6									
88	GILMA F5 1			1						35.4									
89	GILMA F5 2			1						35.4									
90	GILMA MINI			1						9.6									
91	GORGONZOLA			1						45.12									
92	MARSELLA F11			1						84									
93	MARSELLA F5			1						46.42									
94	SANTA ISABEL 1			1						48									
95	SANTA ISABEL 2			1						30									
96	JUAN AMARILLO F5 1			1						28.2									
97	JUAN AMARILLO F5 2			1						28.2									
98	JUAN AMARILLO F5 3			1						28.2									
99	JUAN AMARILLO F5 4			1						28.2									
100	JUAN AMARILLO F8 1			1						48									
101	JUAN AMARILLO F8 2			1						48									
102	BONANZA			1						106.94									

TOTAL	10	21	93	2	16	1	4191.2	4191.2	5132	5221.5	2	1	1	3	111.05	5000	40	40

2809

2.1.2. DICIEMBRE 2024

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
CORTE No. 2 - 01 AL 31 DE DICIEMBRE

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINSTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
1	PRD ALTERNA 3	4	4			5															
2	PRD ESTADIO	8	8			8															
3	TABORA	8	8			8															
4	ATAHUALPA	4	4			4															
5	PARQUE NACIONAL	4	4			4															
6	SAN CRISTOBAL	4	4			4															
7	TUNAL FUTBOL	4	4			4					6482										
8	TIMIZA ESTADIO	8	8			8															
9	PAVCO NATURAL	2	2			2															
10	SERENA	5	5			6															
11	COUNTRY				5																
12	SERVITA F11			2						112,8											
13	SERVITA F5			2						27											
14	CABRERA JAPON			2						30											
15	CANTALEJO			2						25,8											
16	PRADO PINZON		2	2						51	154,56										
17	MAZUREN			2						39											
18	VILANOVA			2						30											
19	VERBENAL			2			1	700	700	33				1		84,25					
20	UDS SINT		2	2						48	552,89										
21	EDUARDO SANTOS			2						40,2											
22	GUSTAVO RESTREPO			2						30											
23	VENECIA 1			2						31,8											
24	VENECIA 2			2						31,8											
25	LAGUNETA			2						52,8											
26	SAN JOSE CENTRO			2						24,6											
27	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36											
28	PIJAOS						1													5276,89	24
29	SAN ANDRES F5			2						48,18											
30	SAN ANDRES F11			2						102,6											
31	EL CARMELO F5			2						46,32											
32	EL CARMELO F11		2	2							798,4										
33	VILLA LUZ F5			2						48											
34	VILLA LUZ F11			2						92,94											
35	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42											
36	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			2						54,6											
37	PAVCO		2	2						40	517										
38	JAZMIN			2						97,2											

1811

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
CORTE No. 2 - 01 AL 31 DE DICIEMBRE

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDÓN SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
39	PEPITA			2						30,22											
40	CIUDAD MONTES 1			2						21											
41	CIUDAD MONTES 2			2						21											
42	SIERRA MORENA 1			2						30											
43	SIERRA MORENA 2			2						30											
44	CASA BLANCA			2						54,6											
45	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6											
46	FONTANAR DEL RIO F5			2						30											
47	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96											
48	LA GAITANA			2						68,4											
49	URB LOMBARDIA			2						30											
50	CIUDADELA CAFAM			2						43,2											
51	BERLIN			2						38,4											
52	TIBABUYES 1			2						50,4											
53	TIBABUYES 2			2						60											
54	CAFAM LOS GAVILANES			2						90											
55	LA ESPERANZA			2						46,8											
56	CLARELANDIA F11		2	2						87											
57	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2											
58	TEJAR			2						91,2											
59	CHICALA			2						78,6											
60	ATALAYAS			2						55,74											
61	PORTAL DEL SOL			2						84											
62	CAMPO VERDE 1			2						58,8											
63	CAMPO VERDE 2			2						56,4											
64	CAMPO VERDE 3			2						29,4											
65	SANTA CLARA			2						55,31											
66	HAYUELOS F8			2						68,09											
67	HAYUELOS F5			2						41,4											
68	NORMANDIA			2						88,8											
69	VILLEMAR		2	2						91,2	570										
70	PRADERA SUR		2	2						34,59	102										
71	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4											
72	LICORERA F5			2						36,6											
73	CEDRITOS		2	2			1	2253,3	2253,3	58,74	553,65			3		80,4	3000	40	40		
74	TOBERIN		2	2						80,46	472,3										
75	CALLE 170		2	2			1	989	989	39,6	145,26			1		108,5	2000	78,94	78,94		
76	ESTRELLA NORTE		2	2						47,31	139,4										

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

CORTE No. 2 - 01 AL 31 DE DICIEMBRE

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
77	BURGOS BRITALIA 1		2	2						40,2	188,2										
78	BURGOS BRITALIA 2		2	2						40,2	230,68										
79	LINDARAJA			2						30											
80	COMETAS			2						48											
81	PTAR			2						104,4											
82	PRD 1		2	2						104,4	414,4										
83	PRD 2		2	2						105,6											
84	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37										
85	BACHUE			2						103,8											
86	FRAGUA		2	2						97,2	704										
87	VILLA MAYOR			2						93											
88	AURORA		2	2						84	951,8										
89	VALLES DEL CAFAM			2						40,2											
90	VILLA ALEMANA			2						31,8											
91	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99										
92	MIRAVALLE F8-2			2						35,6											
93	MIRAVALLE F5			1						35,6											
94	ALFONSO LOPEZ			2						35,24											
95	NUEVO USME			2						30											
96	MOLINOS		2	2						70,05	799,2										
97	PALERMO SUR						1							1				714,61	714,61	714,61	8
98	MARRUECOS			2						46,2											
99	EL TUNAL 1			2						64,62											
100	EL TUNAL 2			2						64,62											
101	EL TUNAL 3			2						55,62											
102	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4											
103	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990										
104	SANTA LUCIA 1			2						55,5											
105	SANTA LUCIA 2			2						66,3											
106	URB TUNJUELITO			2						81											
107	NUEVO MILENIO 1			2						29,4											
108	NUEVO MILENIO 2			2						25,8											
109	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			2						27,6											
110	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			2						27,6											
111	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1										
112	ILLIMANI F5			2						30											
113	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30											
114	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9											

1813

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

CORTE No. 2 - 01 AL 31 DE DICIEMBRE

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACION	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
115	ESTANCIA			2						42,6											
116	PARAISO			2						21,6											
117	LA JOYA			2						36											
118	DOMINGO LAIN			2						21,6											
119	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6											
120	CARACOLI			2						31,5											
121	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2											
122	LA VICTORIA 1			2						26,4											
123	LA VICTORIA 2			2						26,4											
124	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68											
125	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62											
126	ANTIOQUIA			2						24											
127	GAITAN CORTES		2	2						93	610										
128	NARANJOS		2	2						89,4											
129	VILLA DEL RIO			2						111,6											
130	EL RECREO			2						78											
131	LA TINGUA TIBANICA			2						78											
132	EL PORVENIR 1			2						48											
133	EL PORVENIR 2			2						48											
134	EL PORVENIR 3			2						48											
135	EL PORVENIR 4			2						38,04											
136	EL PORVENIR 5			2						38,04											
137	EL PORVENIR MINI			2						10,8											
138	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,69											
139	LUCES VILLA RICA			2						72,3											
140	LA ALEJANDRA			1						41,4											
141	AMERICAS OCCIDENTAL			1						66											
142	VILLA DE LOS SAUCES			2						48											
143	CARVAJAL			2						91,2											
144	TIMIZA F8			2						48											
145	TIMIZA F11			2						103,8											
146	LA IGUALDAD			2						97,5											
147	CASTILLA			2						55,8											
148	LAGO TIMIZA			2						46,2											
149	LAS CRUCES			2						42											
150	LACHES			2						66											
151	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4											
152	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4											

1814

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

CORTE No. 2 - 01 AL 31 DE DICIEMBRE

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
153	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6											
154	LOURDES			2						21											
155	DINDALITO			2						68,4											
156	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2										
157	GILMA F11			2						93											
158	GILMA F8			2						48,6											
159	GILMA F5 1			2						35,4											
160	GILMA F5 2			2						35,4											
161	GILMA MINI			2						19,2											
162	GORGONZOLA			2						45,12											
163	MARSELLA F11			2						84											
164	MARSELLA F5			2						46,42											
165	SANTA ISABEL 1			2						48											
166	SANTA ISABEL 2			2						30											
167	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2											
168	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2											
169	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2											
170	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2											
171	JUAN AMARILLO F8 1			2						48											
172	JUAN AMARILLO F8 2			2						48											
173	LA EUROPA			1						36											
174	METROPOLIS			2						36											
175	BONANZA			2						106,94											
	TOTAL	**51**	**103**	**320**	**5**	**53**	**5**	**3942,3**	**3942,3**	**8726,4**	**17043,4**	**0**	**0**	**6**	**0**	**273,15**	**5000**	**833,55**	**833,55**	**5991,5**	**32**

1815

2.1.3. ENERO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
1	PRD ALTERNA 3	3	3			3															
2	PRD ESTADIO																				
3	TABORA																				
4	ATAHUALPA	2	2			2															
5	PARQUE NACIONAL	2	2			2															
6	SAN CRISTOBAL	5	5			5															
7	TUNAL FUTBOL	5	5			5					8102,5										
8	TUNAL SOFTBOL	3	3			3															
9	TIMIZA ESTADIO																				
10	PAVCO NATURAL		2			2															
11	SERENA	2	2			2															
12	UDS BEISBOL	2	2			2															
13	UDS SOFTBOL	2	2			2															
14	UDS ATLETISMO		2			2															
15	MILENTA TEJAR	2	2			2															
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2															
17	CIUDAD MONTES VOLEY		2																		
18	COUNTRY				7																
19	SERVITA F11			2						112,8											
20	SERVITA F5			2						27											
21	CABRERA JAPON			2						30											
22	CANTALEJO			2						25,8											
23	PRADO PINZON		2	2						51	154,56										
24	MAZUREN			2						39											
25	VILANOVA			2						30											
26	VERBENAL			2						33											
27	UDS SINT		2	2						48	552,89										
28	EDUARDO SANTOS			2						40,2											
29	GUSTAVO RESTREPO			2						30											
30	VENECIA 1			2						31,8											
31	VENECIA 2			2						31,8											
32	LAGUNETA			2						52,8											
33	SAN JOSE CENTRO			2						24,6											
34	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36											
35	PIJAOS						2					2	1	1		186,25		1055,4		5276,88	8
36	SAN ANDRES F5			2						48,18											

37	SAN ANDRES F11			2						102,6												
38	EL CARMELO F5			2						46,32												
39	EL CARMELO F11		2	2						117												
40	VILLA LUZ F5			2						48												
41	VILLA LUZ F11			2						92,94												
42	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42												
43	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1						54,6												
44	PAVCO		2	2						40	517											
45	JAZMIN			2						97,2												
46	PEPITA			2						30,22												
47	CIUDAD MONTES 1			2						21												
48	CIUDAD MONTES 2			2						21												
49	SIERRA MORENA 1			2						30												
50	SIERRA MORENA 2			2						30												
51	CASA BLANCA			2						54,6												
52	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6												
53	FONTANAR DEL RIO F5			2						30												
54	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96												
55	LA GAITANA			2						68,4												
56	URB LOMBARDIA			2						30												
57	CIUDADELA CAFAM			2						43,2												
58	BERLIN			2						38,4												
59	TIBABUYES 1			2						50,4												
60	TIBABUYES 2			2						60												
61	CAFAM LOS GAVILANES			2						90												
62	LA ESPERANZA			2						46,8												
63	CLARELANDIA F11		2	2						87												
64	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2												
65	TEJAR			2						91,2												
66	CHICALA			2						78,6												
67	ATALAYAS			2						55,74												
68	PORTAL DEL SOL			2						84												
69	CAMPO VERDE 1			2						58,8												
70	CAMPO VERDE 2			2						56,4												
71	CAMPO VERDE 3			2						29,4												
72	SANTA CLARA			2						55,31												
73	HAYUELOS F8			2						68,09												
74	HAYUELOS F5			2						41,4												
75	NORMANDIA			2						88,8												
76	VILLEMAR		2	2						91,2	570											
77	PRADERA SUR		2	2						34,59												
78	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4												
79	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2						36,6												

2819

80	CEDRITOS		1	1						58,74	553,65											
81	TOBERIN		1	1						80,46	472,3											
82	CALLE 170		2	2						39,6	145,26											
83	ESTRELLA NORTE		2	2						47,31	139,4											
84	BURGOS BRITALIA 1		2	2						40,2	188,2											
85	BURGOS BRITALIA 2		2	2						40,2	230,68											
86	LINDARAJA			2						30												
87	COMETAS			2																		
88	PTAR			2						104,4												
89	PRD 1			2						104,4												
90	PRD 2			2						105,6												
91	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37											
92	BACHUE			2						103,8												
93	FRAGUA			2						97,2	704			3								
94	VILLA MAYOR			2						93												
95	AURORA		2	2						84	951,8											
96	VALLES DEL CAFAM			2						40,2												
97	VILLA ALEMANA			2						31,8												
98	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99											
99	MIRAVALLE F8-2			2						35,6												
100	MIRAVALLE F5			2						35,6												
101	ALFONSO LOPEZ			2						35,24												
102	NUEVO USME			2						30												
103	MOLINOS		2	2						70,05	799,2											
104	PALERMO SUR																					
105	MARRUECOS			2						46,2												
106	EL TUNAL 1			2						64,62												
107	EL TUNAL 2			2						64,62												
108	EL TUNAL 3			2						55,62												
109	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4												
110	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990											
111	SANTA LUCIA 1			2						55,5												
112	SANTA LUCIA 2			2						66,3												
113	URB TUNJUELITO			2						81												
114	NUEVO MILENIO 1			2						29,4												
115	NUEVO MILENIO 2			2						25,8												
116	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			2						27,6												
117	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			2						27,6												
118	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1											
119	ILLIMANI F5			2						30												
120	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30												
121	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9												
122	ESTANCIA			2						42,6												
123	PARAISO			2						21,6												
124	LA JOYA			2						36												

125	DOMINGO LAIN			2						21,6												
126	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6												
127	CARACOLI			2						31,5												
128	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2												
129	LA VICTORIA 1			2						26,4												
130	LA VICTORIA 2			2						26,4												
131	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68												
132	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62												
133	ANTIOQUIA			2						24												
134	GAITAN CORTES		2	2						93	610											
135	NARANJOS		2	2						89,4												
136	VILLA DEL RIO			2						111,6												
137	EL RECREO			2						78												
138	LA TINGUA TIBANICA			2						78												
139	EL PORVENIR 1			2						48												
140	EL PORVENIR 2			2						48												
141	EL PORVENIR 3			2						48												
142	EL PORVENIR 4			2						38,04												
143	EL PORVENIR 5			2						38,04												
144	EL PORVENIR MINI			2						10,8												
145	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,69												
146	LUCES VILLA RICA			2						72,3												
147	LA ALEJANDRA			2						41,4												
148	AMERICAS OCCIDENTAL			2						66												
149	VILLA DE LOS SAUCES			2						48												
150	CARVAJAL			2						91,2												
151	TIMIZA F8			2						48												
152	TIMIZA F11			2						103,8												
153	LA IGUALDAD			2						97,5												
154	CASTILLA		2	2						55,8												
155	LAGO TIMIZA			2						46,2												
156	LAS CRUCES			2						42												
157	LACHES			2						66												
158	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4												
159	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4												
160	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6												
161	LOURDES			2						21												
162	DINDALITO			2						68,4												
163	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2											
164	GILMA F11			2						93												
165	GILMA F8			2						48,6												
166	GILMA F5 1			2						35,4												
167	GILMA F5 2			2						35,4												
168	GILMA MINI			2						9,6												
169	GORGONZOLA			2						45,12												

170	MARSELLA F11			2						84											
171	MARSELLA F5			2						46,42											
172	SANTA ISABEL 1			2						48											
173	SANTA ISABEL 2			2						30											
174	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2											
175	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2											
176	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2											
177	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2											
178	JUAN AMARILLO F8 1			2						48											
179	JUAN AMARILLO F8 2			2						48											
180	LA EUROPA			2						36											
181	METROPOLIS			2						36											
182	BONANZA			2						106,94											
183	CIUDAD HONDA		2	2						25,44	176,12										
	TOTAL	**30**	**84**	**321**	**7**	**34**	**2**	**0**	**0**	**8785,8**	**17349,1**	**2**	**1**	**4**	**0**	**186,25**	**0**	**1055,4**	**0**	**5276,88**	**8**

2.1.4. FEBRERO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2															
2	PRD ESTADIO																				
3	TABORA																				
4	ATAHUALPA	5	4			4															
5	PARQUE NACIONAL	2	2			2															
6	SAN CRISTOBAL	2	2			2															
7	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241										
8	TUNAL SOFTBOL	2	2			2															
9	TIMIZA ESTADIO																				
10	PAVCO NATURAL		2			2															
11	SERENA	2	2			2															
12	UDS BEISBOL	2	2			2															
13	UDS SOFTBOL	2	2			2															
14	UDS ATLETISMO		2			2															
15	MILENTA TEJAR	2	2			2															
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2															
17	CIUDAD MONTES VOLEY		2																		
18	COUNTRY				8																
19	PRD PLAYA		4																		
20	UDS VOLEY PLAYA		2																		
21	COMPLEJO ACUÁTICO		2																		
22	BOCHICA	2	2	2																	
23	MARSELLA	3	3	3																	
24	JUAN AMARILLO NATURAL	3	3	3																	
25	FLORIDA 1		4	4																	
26	FLORIDA 2		4	4																	
27	FLORIDA 4	4	4	4																	
28	FLORIDA 5	4	4	4																	
29	ESTADIO ALQUERIA	3	3	3																	
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	1	1	1																	
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2	2																	
32	LA GAITAINA	3	3	3																	
33	SERVITA F11	5					1	8267,2	8267,2	112,8			1			280,5					
34	SERVITA F5			2						27											
35	CABRERA JAPON			2						30											
36	CANTALEJO			2						25,8											

1823

37	PRADO PINZON		2	2						51	154,56											
38	MAZUREN			2						39												
39	VILANOVA			2						30												
40	VERBENAL			2						33												
41	UDS SINT		2	2						48	552,89											
42	EDUARDO SANTOS			2						40,2												
43	GUSTAVO RESTREPO			2						30												
44	VENECIA 1			2						31,8												
45	VENECIA 2			2						31,8												
46	LAGUNETA			2						52,8												
47	SAN JOSE CENTRO			2						24,6												
48	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36												
49	PIJAOS													1								
50	SAN ANDRES F5			5				1515	1515	48,18			1	1	8	81,75	3000					
51	SAN ANDRES F11			5			1	7200	7200	102,6			3	3		149	10000					
52	EL CARMELO F5			2						46,32												
53	EL CARMELO F11		2	2						117	798,4											
54	VILLA LUZ F5			2						48												
55	VILLA LUZ F11			2						92,94												
56	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42												
57	FLORENCIA LOS TRONQUITOS																					
58	PAVCO		2	2						40	517											
59	JAZMIN			2						97,2												
60	PEPITA			2						30,22												
61	CIUDAD MONTES 1			2						21												
62	CIUDAD MONTES 2			2						21												
63	SIERRA MORENA 1			2						30												
64	SIERRA MORENA 2			2						30												
65	CASA BLANCA			2						54,6												
66	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6												
67	FONTANAR DEL RIO F5			2						30												
68	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96												
69	LA GAITANA			2						68,4												
70	URB LOMBARDIA			2						30												
71	CIUDADELA CAFAM			2						43,2												
72	DESARROLLO BILBAO			1						20,64												
73	BERLIN			2						38,4												
74	TIBABUYES 1			1						50,4												
75	TIBABUYES 2			4			1	2400	2400	60			2	2	12	162,5	4000	60	60			
76	CAFAM LOS GAVILANES			2						90												
77	LA ESPERANZA			2						46,8												
78	CLARELANDIA F11		2	2						87												
79	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2												
80	TEJAR			2						91,2												
81	CHICALA			2						78,6												

2024

82	ATALAYAS			2						55,74											
83	PORTAL DEL SOL			2						84											
84	CAMPO VERDE 1			2						58,8											
85	CAMPO VERDE 2			2						56,4											
86	CAMPO VERDE 3			2						29,4											
87	SANTA CLARA			2						55,32											
88	HAYUELOS F8			2						68,1											
89	HAYUELOS F5			2						41,4											
90	NORMANDIA			2						88,8											
91	VILLEMAR		2	2						91,2	570										
92	PRADERA SUR		2	2						34,59											
93	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4											
94	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2						36,6											
95	CEDRITOS		2	2						58,74	553,65										
96	TOBERIN		1	1						80,46	472,3										
97	CALLE 170		2	2						39,6	145,26										
98	ESTRELLA NORTE		2	2						47,31	139,4										
99	BURGOS BRITALIA 1		2	4			1	1050	1050		188,2		1	1		127,5	2000	141,78	141,78		
100	BURGOS BRITALIA 2		2	4				1050	1050		230,68		1	1		120,5	2000				
101	LINDARAJA			2						30											
102	COMETAS			2																	
103	PTAR			2						104,4											
104	PRD 1		2	2						104,4	414,4										
105	PRD 2		2	2						105,6											
106	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37										
107	BACHUE			2						103,8											
108	FRAGUA		2	2						97,2	704										
109	VILLA MAYOR			2						93											
110	AURORA		2	2						84	951,8										
111	VALLES DEL CAFAM			2						40,2											
112	VILLA ALEMANA			2						31,8											
113	MIRAVALLE F8-1		2	5				854,96	854,96	47,4	83,99		1	1		80					
114	MIRAVALLE F8-2			4			1	1350	1350				3	3		119,5	1500	20	20		
115	MIRAVALLE F5			5			1	600	600	35,6			1	1		80					
116	ALFONSO LOPEZ			2						35,24											
117	NUEVO USME			2						30											
118	MOLINOS		2	2						70,05	799,2										
119	PALERMO SUR			3						33,22											
120	MARRUECOS			5			1	1315,8	1315,8	46,2			1	1		80	2000	20	20		
121	EL TUNAL 1			2						64,62											
122	EL TUNAL 2			2						64,62											
123	EL TUNAL 3			2						55,62											
124	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4											
125	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990										

3825

126	SANTA LUCIA 1			2						55,5												
127	SANTA LUCIA 2			2						66,3												
128	URB TUNJUELITO			2						81												
129	NUEVO MILENIO 1			2						29,4												
130	NUEVO MILENIO 2			2						25,8												
131	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			2						27,6												
132	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			2						27,6												
133	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1											
134	ILLIMANI F5			2						30												
135	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30												
136	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9												
137	ESTANCIA			2						42,6												
138	PARAISO			2						21,6												
139	LA JOYA			2						36												
140	DOMINGO LAIN			2						21,6												
141	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6												
142	CARACOLI			2						31,5												
143	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2												
144	LA VICTORIA 1			2						26,4												
145	LA VICTORIA 2			2						26,4												
146	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68												
147	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62												
148	ANTIOQUIA			2						24												
149	GAITAN CORTES		2	2						93	610											
150	NARANJOS		2	2						89,4												
151	VILLA DEL RIO			2						111,6												
152	EL RECREO			2						78												
153	LA TINGUA TIBANICA			2						78												
154	EL PORVENIR 1			2						48												
155	EL PORVENIR 2			2						48												
156	EL PORVENIR 3			2						48												
157	EL PORVENIR 4			2						38,04												
158	EL PORVENIR 5			2						38,04												
159	EL PORVENIR MINI			2						10,8												
160	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68												
161	LUCES VILLA RICA			2						72,3												
162	LA ALEJANDRA			1																		
163	AMERICAS OCCIDENTAL			2						66												
164	VILLA DE LOS SAUCES			2						48												
165	CARVAJAL			2						91,2												
166	TIMIZA F8			2						48												
167	TIMIZA F11			2						103,8												
168	LA IGUALDAD			2						97,5												
169	CASTILLA		2	2						55,8												
170	VILLA ALSACIA			3						192												

171	LAGO TIMIZA			2						46,2											
172	LAS CRUCES			2						42											
173	LACHES			2						66											
174	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4											
175	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4											
176	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6											
177	LOURDES			2						21											
178	DINDALITO			2						68,4											
179	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2										
180	GILMA F11			2						93											
181	GILMA F8			2						48,6											
182	GILMA F5 1			2						35,4											
183	GILMA F5 2			2						35,4											
184	GILMA MINI			2						9,6											
185	GORGONZOLA			2						45,12											
186	MARSELLA F11			2						84											
187	MARSELLA F5			2						46,42											
188	SANTA ISABEL 1			2						48											
189	SANTA ISABEL 2			2						30											
190	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2											
191	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2											
192	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2											
193	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2											
194	JUAN AMARILLO F8 1			2						48											
195	JUAN AMARILLO F8 2			2						48											
196	LA EUROPA			1						36											
197	LA EUROPA MINI			1						15											
198	METROPOLIS			2						36											
199	BONANZA			2						106,94											
200	CIUDAD HONDA		1	1						25,44	176,12										
	TOTAL	55	125	381	8	28	7	25603	25603	8860,1	13876,52	0	15	15	20	1281,25	24500	241,78	241,78	0	0

2.1.5. MARZO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACION MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR	ROTOVACTOR	RELLENO EN ARENA DE RIO	VERTICUTTER	APLICACION DE FERTILIZANTE
1	PRD ALTERNA 3	3	3			3																			
2	PRD ESTADIO																								
3	TABORA																								
4	EL CAJON ATAHUALPA	4	4			4																			
5	TIMIZA ESTADIO																								
6	TUNAL FUTBOL	3	3			3																			
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2																			
8	SERENA	2	2			2																			
9	PARQUE NACIONAL	2	2			2																			
10	COUNTRY				8																				
11	UDS BESBOL	3	3			3	1			6413,68												6			
12	UDS SOFTBOL	3	3			3				3174,4												5			
13	UDS ATLETISMO		3			3																			
14	MILENTA TEJAR	2	2			2																			
15	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2																			
16	CIUDAD MONTES VOLEY		2																			4			
17	TUNAL SOFTBOL	2	2			2																5			
18	PAVCO NATURAL		2			2																			
19	PRD PLAYA		4							159,6												8			
20	UDS VOLEY PLAYA		3							83,2												5			
21	COMPLEJO ACUÁTICO		3							84,2												4			
22	BOCHICA	2	2	2																					
23	MARSELLA	1	4	4																					
24	JUAN AMARILLO NATURAL	4	4	4																					
25	FLORIDA 1		4	4																					
26	FLORIDA 2		4	4																					
27	FLORIDA 3		4	4																					
28	FLORIDA 4	4	4	4																					
29	FLORIDA 5	4	4	4																					
30	ESTADIO ALQUERIA		4	4			1	8000	8000	8000	8000												36	8000	200
31	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2	2			1															5			
32	NUEVO MUZU NATURAL	2	2	2																					
33	LA GAITANA NATURAL	2	3	3			1	7523	7523	7523	7523												36	7523	300
34	LA GAITANA PLAYA																								
35	SERVITA F11			2						112,8															
36	SERVITA F5			2						27															
37	CABRERA JAPON			2						30															
38	CANTALEJO			2						25,8															
39	PRADO PINZON		2	2						51	154,56														
40	MAZUREN			2						39															
41	VILANOVA			2						30															
42	VERBENAL			2						33															
43	UDS SINT		2	2						48	552,89														
44	EDUARDO SANTOS			2						40,2															
45	GUSTAVO RESTREPO			2						30															
46	VENECIA 1			2						31,8															
47	VENECIA 2			2						31,8															
48	LAGUNETA			2						52,8															
49	SAN JOSE CENTRO			2						24,6															

1826

50	PARQUE OLAYA HERRERA			2					102,36																
51	PUAOS																								
52	SAN ANDRES F5			2					48,18																
53	SAN ANDRES F11			2					102,6																
54	EL CARMELO F5			5			1433,71	1433,71	46,52			1	1		82,5	2000									
55	EL CARMELO F11		2	4		1	8750	8750	117	798,4		1	1		213,25	5000	39,96	39,96							
56	VILLA LUZ F5			2					48																
57	VILLA LUZ F11			2					92,94																
58	VILLAS DEL MADRIGAL			5		1	1200	1200	42			1	1		101	2000	5	4							
59	FLORENCIA LOS TRONQUETOS			5		1	1008	1008	38,4			1	1		199,5	2000									
60	PAVCO		2	2					40	517															
61	JAZMIN			2					97,2																
62	PEPITA			2					30,22																
63	CIUDAD MONTES 1			2					21																
64	CIUDAD MONTES 2			2					21																
65	SIERRA MORENA 1			2					30																
66	SIERRA MORENA 2			2					30																
67	CASA BLANCA			2					54,6																
68	FONTANAR DEL RIO F11			2					90,6																
69	FONTANAR DEL RIO F5			2					30																
70	FONTANAR MINI BEISBOL			2					69,96																
71	LA GAITANA			2					68,4																
72	URB LOMBARDIA			5		1	600	600	30							1000									
73	CIUDADELA CAFAM			2					43,2																
74	DESARROLLO BILBAO			2					20,64																
75	BERLIN			2					38,4																
76	TIBABUYES 1			2					50,4																
77	TIBABUYES 2			2					60																
78	CAFAM LOS GAVILANES			4		1	5000	5000	90			1	1			6000									
79	LA ESPERANZA			2					46,8																
80	CLARELANDIA F11		2	2					87																
81	CLARELANDIA MINI		2	2					40,2																
82	TEJAR			2					91,2																
83	CHICALA			2					78,6																
84	ATALAYAS			2					55,74																
85	PORTAL DEL SOL			2					84																
86	CAMPO VERDE 1			2					58,8																
87	CAMPO VERDE 2			2					56,4																
88	CAMPO VERDE 3			2					29,4																
89	SANTA CLARA			2					55,32																
90	HAYUELOS F6			5		1	2947,58	2947,58	68,1			3				5000									
91	HAYUELOS F5			5		1	1121,87	1121,87	41,4			1				2000									
92	NORMANDIA			4		1	5000	5000	88,8			1	1		95	4800									
93	VILLEMAR		2	2					91,2	570															
94	PRADERA SUR		2	2					34,59	102															
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2					86,4																
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2					36,6																
97	CEDRITOS		2	2					58,74	553,65															
98	TOBERIN		2	2					80,46	472,3															
99	CALLE 170		2	2					39,6	145,26															
100	ESTRELLA NORTE		2	2					47,52	139,42															
101	BURGOS BRITALIA 1		3	3					40,2	376,4															
102	BURGOS BRITALIA 2		3	3					40,2	461,36															
103	LINDARAJA			2					30																
104	COMETAS			2					48																
105	PTAR			2					104,4																
106	PRD 1		2	2					104,4	414,4															

107	PRO 2		2	2						105,6																
108	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37															
109	BACHUE			2						103,8																
110	FRAGUA		2	2						97,2	704															
111	VILLA MAYOR			2						93																
112	AURORA		2	2						84	951,8															
113	VALLES DEL CAFAM			2						40,2																
114	VILLA ALEMANA			2						31,8																
115	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99															
116	MIRAVALLE F8-2			2						35,6																
117	MIRAVALLE F5			2						30																
118	ALFONSO LOPEZ			2						35,24																
119	NUEVO USME			2						30																
120	MOLINOS		2	2						70,06	799,2															
121	PALERMO SUR			2						33,22																
122	MARRUECOS			2						46,2																
123	EL TUNAL 1			2						64,62																
124	EL TUNAL 2			2						60,62																
125	EL TUNAL 3			2						55,62																
126	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4																
127	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990															
128	SANTA LUCIA 1			2						55,5																
129	SANTA LUCIA 2			2						66,3																
130	URB TUNJUELITO			2						81																
131	NUEVO MILENIO 1			2						29,4																
132	NUEVO MILENIO 2			2						25,8																
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			2						27,6																
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			2						27,6																
135	ILLIMANI F11		2	2						88,44	673,1															
136	ILLIMANI F5			2						30																
137	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30																
138	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9																
139	ESTANCIA			2						42,6																
140	PARAISO			2						31,6																
141	LA JOYA			2						30																
142	DOMINGO LAIN			2						21,6																
143	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6																
144	CARACOLI			2						31,5																
145	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2																
146	LA VICTORIA 1			2						26,4																
147	LA VICTORIA 2			2						26,4																
148	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68																
149	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62																
150	ANTIOQUIA			2						24																
151	GAITAN CORTES		2	2						93	610															
152	NARANJOS		2	2						89,4																
153	VILLA DEL RIO			2						111,6																
154	EL RECREO			2						78																
155	LA TINGUA TIBANICA			2						78																
156	EL PORVENIR 1			2						48																
157	EL PORVENIR 2			2						48																
158	EL PORVENIR 3			2						48																
159	EL PORVENIR 4			2						38,04																
160	EL PORVENIR 5			2						38,04																
161	EL PORVENIR MINI			2						30,8																
162	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68																
163	LUCES VILLA RICA			2						72,3																
164	LA ALEJANDRA			2						41,4																
165	AMERICAS OCCIDENTAL			2						66																

7831

166	VILLA DE LOS SAUCES			5			1	1500	1500	48							2000								
167	CARVAJAL			2						91,3															
168	TIMIZA F8			2						48															
169	TIMIZA F11			2						103,8															
170	LA IGUALDAD			2						97,5															
171	CASTILLA		2	2						55,8															
172	VILLA ALSACIA			2						96															
173	LAGO TIMIZA			2						46,2															
174	LAS CRUCES			2						42															
175	LACHES			2						66															
176	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4															
177	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4															
178	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6															
179	LOURDES			2						21															
180	DINDALITO			2						68,4															
181	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	806,2														
182	GILMA F11			2						93															
183	GILMA F8			2						48,6															
184	GILMA F5 1			2						35,4															
185	GILMA F5 2			2						35,4															
186	GILMA MINI			2						9,6															
187	GORGONZOLA			2						45,12															
188	MARSELLA F11			2						84															
189	MARSELLA F5			5			1	1306	1309	46,42			1	1		194	2000								
190	SANTA ISABEL 1			2						48															
191	SANTA ISABEL 2			2						30															
192	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2															
193	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2															
194	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2															
195	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2															
196	JUAN AMARILLO F8 1			2						48															
197	JUAN AMARILLO F8 2			2						48															
198	LA EUROPA			6			1	840	840				1	1		122,5	1500								
199	LA EUROPA MINI			1																					
200	METROPOLIS			2						36															
201	BONANZA			2						106,94															
202	CIUDAD HONDA		2	2						25,44	176,12														

	TOTAL	49	144	408	8	33	15	46233,2	46233,2	34589,37	28679,42	0	12	8	0	1009,75	35800	44,96	43,96	0	0	42	72	15523	500

3832

2.1.6. ABRIL 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Nº		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	VERTICUTTER	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2													
2	PRD ESTADIO																		
3	TABORA																		
4	EL CAJON ATAHUALPA	4	4			4													
5	TIMIZA ESTADIO																		
6	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241								
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2													
8	SERENA	3	3			3													
9	PARQUE NACIONAL	2	2			2													
10	COUNTRY				8														
11	UDS BEISBOL	2	2			2													
12	UDS SOFTBOL	2	2			2													
13	UDS ATLETISMO		2			2													
14	UDS ATLETISMO MARTE		2			2													
15	MILENTA TEJAR	2	2			2													
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2													
15	CIUDAD MONTES VOLEY		2																
16	TUNAL SOFTBOL	2	2			2													
17	PAVCO NATURAL		2			2													
18	PRD PLAYA		4																
19	UDS VOLEY PLAYA		2																
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2																
21	BOCHICA	2	2			2													
22	MARSELLA		4			4													
23	JUAN AMARILLO NATURAL	3	4			4	1	7888			7888							7888	
24	FLORIDA 1	4	5			5													
25	FLORIDA 2	4	5			5													
26	FLORIDA 3	4	5			5													
27	FLORIDA 4	5	5			5													
28	FLORIDA 5	5	5			5													
29	ESTADIO ALQUERIA		3			9			8000	8000									100
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2			2													
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2			2													
32	LA GAITAINA NATURAL	2	5			5			7523										

33	LA GAITANA PLAYA																		
34	RINCON DE LOS ANGELES	1	1			2													
35	SERVITA F11			2						112,8									
36	SERVITA F5			2						27									
37	CABRERA JAPON			2						30									
38	CANTALEJO																		
39	PRADO PINZON		2	2						51	154,56								
40	MAZUREN			2						39									
41	VILANOVA			2						30									
42	VERBENAL			2						33									
43	UDS SINT		2	2						48	552,89								
44	EDUARDO SANTOS			2						40,2									
45	GUSTAVO RESTREPO			2						30									
46	VENECIA 1			2						31,8									
47	VENECIA 2			2						31,8									
48	LAGUNETA			2						52,8									
49	SAN JOSE CENTRO			2						24,6									
50	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36									
51	PIJAOS																		
52	SAN ANDRES F5			2						48,18									
53	SAN ANDRES F11			2						102,6									
54	EL CARMELO F5			2						46,32									
55	EL CARMELO F11		2	1						117	798,4								
56	VILLA LUZ F5			2						48									
57	VILLA LUZ F11			2						92,94									
58	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42									
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			2						38,4									
60	PAVCO		2	2						40	517								
61	JAZMIN			4			1	6032	6032	97,2		2	1	280,75	8000	40,7	40,7		
62	PEPITA			2						30,22									
63	CIUDAD MONTES 1			2						21									
64	CIUDAD MONTES 2			2						21									
65	SIERRA MORENA 1			2						30									
66	SIERRA MORENA 2			2						30									
67	CASA BLANCA			2						54,6									
68	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6									
69	FONTANAR DEL RIO F5			2						30									
70	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96									
71	LA GAITANA			2						68,4									
72	URB LOMBARDIA			1						30		1	1	120					
73	CIUDADELA CAFAM			1						43,2									
74	DESARROLLO BILBAO			2						20,64									

1835

75	BERLIN			2						38,4									
76	TIBABUYES 1			2						50,4									
77	TIBABUYES 2			2						60									
78	CAFAM LOS GAVILANES			1						90									
79	LA ESPERANZA			2						46,8									
80	CLARELANDIA F11		2	2						87									
81	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2									
82	TEJAR			5			1	5520	5520	91,2		1	3	272	6000	99,9	99,9		
83	CHICALA			2						78,6									
84	ATALAYAS			2						55,74									
85	PORTAL DEL SOL			1						84									
86	CAMPO VERDE 1			2						58,8									
87	CAMPO VERDE 2			2						56,4									
88	CAMPO VERDE 3			2						29,4									
89	SANTA CLARA			2						55,32									
90	HAYUELOS F8			2						68,1			3	141,75					
91	HAYUELOS F5			2						41,4			1	492					
92	NORMANDIA			2						88,8									
93	VILLEMAR		2	2						91,2	570								
94	PRADERA SUR		2	5			1	816,63	816,63	34,59	102	1	1	153,75	1500	15,65	14,65		
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4		3							
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2						36,6									
97	CEDRITOS		2	2						58,74	553,65								
98	TOBERIN		2	2						80,46	472,3								
99	CALLE 170		2	2						39,6	145,26								
100	ESTRELLA NORTE		2	2						47,32	139,42								
101	BURGOS BRITALIA 1		2	2						40,2	376,4								
102	BURGOS BRITALIA 2		2	2						40,2	461,36								
103	LINDARAJA			2						30									
104	COMETAS			1						48									
105	PTAR			2						104,4									
106	PRD 1		2	2						104,4	414,4								
107	PRD 2		2	2						105,6									
108	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37								
109	BACHUE			2						103,8									
110	FRAGUA		2	2						97,2	704								
111	VILLA MAYOR			2						93									
112	AURORA		2	2						84	951,8								
113	VALLES DEL CAFAM			2						40,2									
114	VILLA ALEMANA			2						31,8									
115	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99								

1836

116	MIRAVALLE F8-2																		
117	MIRAVALLE F5			2						30									
118	ALFONSO LOPEZ			2						35,24									
119	NUEVO USME			2						30									
120	MOLINOS		1	1						70,06	799,2								
121	PALERMO SUR			2						33,22									
122	MARRUECOS			2						46,2									
123	EL TUNAL 1			2						64,62									
124	EL TUNAL 2			2						64,62									
125	EL TUNAL 3			2						55,62									
126	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4									
127	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990	3	3	149,75					
128	SANTA LUCIA 1			2						55,5									
129	SANTA LUCIA 2			2						66,3									
130	URB TUNJUELITO			2						81									
131	NUEVO MILENIO 1			2						29,4									
132	NUEVO MILENIO 2			2						25,8									
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1						27,6									
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1						27,6									
135	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1								
136	ILLIMANI F5			2						30									
137	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30									
138	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9									
139	ESTANCIA			2						42,6									
140	PARAISO			2						21,6									
141	LA JOYA			2						36									
142	DOMINGO LAIN			1						21,6									
143	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6									
144	CARACOLI			2						31,5									
145	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2									
146	LA VICTORIA 1			2						26,4									
147	LA VICTORIA 2			2						26,4									
148	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68									
149	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62									
150	ANTIOQUIA			2						24									
151	GAITAN CORTES		2	2						93	610								
152	NARANJOS		2	2						89,4									
153	VILLA DEL RIO			2						111,6									
154	EL RECREO			5			1	4125	4125	78		3			7000	79,99	79,99		
155	LA TINGUA TIBANICA			2						78									
156	EL PORVENIR 1			2						48									
157	EL PORVENIR 2			2						48									
158	EL PORVENIR 3			2						48									

4837

159	EL PORVENIR 4			2						38,04										
160	EL PORVENIR 5			2						38,04										
161	EL PORVENIR MINI			2						10,8										
162	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68										
163	LUCES VILLA RICA			5			1	3297	3297	72,3		3			4000	2				
164	LA ALEJANDRA			2						41,4										
165	AMERICAS OCCIDENTAL			5			1	2800	2800	66		3			5000	83,99	83,99			
166	VILLA DE LOS SAUCES			2						48			3	102,5						
167	CARVAJAL			2						91,2		3	1	347						
168	TIMIZA F8			2						48										
169	TIMIZA F11			2						103,8										
170	LA IGUALDAD			2						97,5										
171	CASTILLA		2	2						55,8										
172	VILLA ALSACIA			1						96										
173	LAGO TIMIZA			2						46,2										
174	LAS CRUCES			2						42										
175	LACHES			2						66										
176	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4										
177	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4										
178	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6										
179	CANDELARIA MINI			3						16,8										
180	LOURDES			2						21										
181	DINDALITO			1						68,4										
182	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2									
183	GILMA F11			2						93										
184	GILMA F8			2						48,6										
185	GILMA F5 1			2						35,4										
186	GILMA F5 2			2						35,4										
187	GILMA MINI			2						9,6										
188	GORGONZOLA			5			1	1364,76	1364,76	45,12		3	3	191	2500					
189	MARSELLA F11			2						84										
190	MARSELLA F5			2						46,42										
191	SANTA ISABEL 1			4			1	1500	1500	48		3			3000					
192	SANTA ISABEL 2			4				600	600	30		1			1000					
193	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2										
194	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2										
195	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2										
196	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2										
197	JUAN AMARILLO F8 1			2						48										
198	JUAN AMARILLO F8 2			2						48										
199	LA EUROPA			2						36										
200	LA EUROPA MINI			2						15										
201	METROPOLIS			2						36										

202	BONANZA			2						106,94									
203	CIUDAD HONDA		2	2						25,44	176,12								
	TOTAL	**59**	**144**	**345**	**8**	**86**	**9**	**33943,39**	**41578,39**	**16957,69**	**22285,42**	**30**	**20**	**2250,5**	**38000**	**322,23**	**319,23**	**7888**	**100**

1839

2.1.7. MAYO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR	ROTOVACTOR	RELLENO EN ARENA DE RIO	VERTICUTTER	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	REPARACIÓN DE DIVOTS
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2																		
2	PRD ESTADIO																							
3	TABORA																							
4	EL CAJÓN ATAHUALPA	2	2			2																		
5	TIMIZA ESTADIO																							
6	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241													
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2																		
8	SERENA	2	2			2																		
9	PARQUE NACIONAL	3	3			3																		
10	COUNTRY				9																			
11	UDS BEISBOL	2	2			2				3206,84														
12	UDS SOFTBOL	2	2			2				1587,2														
13	UDS ATLETISMO		2			2																		
14	UDS ATLETISMO MARTE		2			2																		
15	MILENTA TEJAR	2	2			2																		
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2																		
15	CIUDAD MONTES VOLEY		1							50,4														
16	TUNAL SOFTBOL	2	2			2				1328,96														
17	PAVCO NATURAL		2			2																		
18	PRD PLAYA		4							159,6														
19	UDS VOLEY PLAYA		2							41,6														
20	COMPLEJO ACUÁTICO		3							42,4														
21	BOCHICA	2	2			2																		
22	MARSELLA		4			4															36			
23	JUAN AMARILLO NATURAL	3	4			4																		
24	FLORIDA 1	5	5			5																		
25	FLORIDA 2	5	5			5																		
26	FLORIDA 3	5	5			5																		
27	FLORIDA 4	5	5			5																		
28	FLORIDA 5	5	5			5																		
29	ESTADIO ALQUERIA	6	7			9																	200	20
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2			2				1400														
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2			2																		
32	LA GAITAINA NATURAL	4	3			4																		
33	LA GAITANA PLAYA																							
34	RINCON DE LOS ANGELES	2	2			2																		
35	SERVITA F11			1						112,8														
36	SERVITA F5			1						27														

1849

37	CABRERA JAPON			1						30														
38	CANTALEJO			1						25,8														
39	PRADO PINZON		1	1						51	154,56													
40	MAZUREN			1						39														
41	VILANOVA			1						30														
42	VERBENAL			1						33														
43	UDS SINT		1	1						48	552,89													
44	EDUARDO SANTOS			1						40,2														
45	GUSTAVO RESTREPO			1						30														
46	VENECIA 1			1						31,8														
47	VENECIA 2			1						31,8														
48	LAGUNETA			1						52,8														
49	SAN JOSE CENTRO			1						24,6														
50	PARQUE OLAYA HERRERA			1						102,36														
51	PIJAOS																							
52	SAN ANDRES F5			1						48,18														
53	SAN ANDRES F11			1						102,6														
54	EL CARMELO F5			1						46,32														
55	EL CARMELO F11		1	1						117	798,4													
56	VILLA LUZ F5			1						48														
57	VILLA LUZ F11			1						92,94														
58	VILLAS DEL MADRIGAL			1						42														
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1						38,4														
60	PAVCO		1	1						40	517													
61	JAZMIN			1						97,2														
62	PEPITA			1						30,22														
63	CIUDAD MONTES 1			1						21														
64	CIUDAD MONTES 2			1						21														
65	SIERRA MORENA 1			1						30														
66	SIERRA MORENA 2			1						30														
67	CASA BLANCA			1						54,6														
68	FONTANAR DEL RIO F11			1						90,6														
69	FONTANAR DEL RIO F5			1						30														
70	FONTANAR MINI BEISBOL			1						69,96														
71	LA GAITANA			1						68,4														
72	URB LOMBARDIA			1						30														
73	CIUDADELA CAFAM			1						43,2														
74	DESARROLLO BILBAO			1						20,64														
75	BERLIN			1						38,4														
76	TIBABUYES 1			1						50,4														
77	TIBABUYES 2			1						60														
78	CAFAM LOS GAVILANES			1						90														
79	LA ESPERANZA			1													967,86							
80	CLARELANDIA F11		1	1						87														
81	CLARELANDIA MINI		1	1						40,2														
82	TEJAR			1						91,2														
83	CHICALA			4			1	3910	3910	78,6					223,25	5000	59,94	59,94						
84	ATALAYAS			1						55,74														

2942

85	PORTAL DEL SOL			1						84														
86	CAMPO VERDE 1			1						58,8														
87	CAMPO VERDE 2			1						56,4														
88	CAMPO VERDE 3			1						29,4														
89	SANTA CLARA			1						55,32														
90	HAYUELOS F8			1						68,1														
91	HAYUELOS F5			1						41,4														
92	NORMANDIA			1						88,8														
93	VILLEMAR		1	1						91,2	570													
94	PRADERA SUR		1	1						34,59	102													
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			1						86,4			3	180										
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1						36,6														
97	CEDRITOS		1	1						58,74	553,65													
98	TOBERIN		1	1						80,46	472,25													
99	CALLE 170		1	1						39,6	145,26													
100	ESTRELLA NORTE		1	1						47,32	139,42													
101	BURGOS BRITALIA 1		1	1						40,2	188,2													
102	BURGOS BRITALIA 2		1	1						40,2	230,68													
103	LINDARAJA			1						30														
104	COMETAS			1						48														
105	PTAR			1						104,4														
106	PRD 1		1	1						104,4	414,4													
107	PRD 2			1						105,6														
108	GIMNASIO DEL NORTE		1	1						41,4	62,37													
109	BACHUE			1						103,8														
110	FRAGUA		1	1						97,2	704													
111	VILLA MAYOR			1						93		3	3	322,5										
112	AURORA		1	1						84	951,8													
113	VALLES DEL CAFAM			1						40,2														
114	VILLA ALEMANA			1						31,8														
115	MIRAVALLE F8-1		1	1						47,4	83,99													
116	MIRAVALLE F8-2																							
117	MIRAVALLE F5			1						30														
118	ALFONSO LOPEZ			3			1	812,39	812,39	35,24				487,77	3000	61,05	61,05							
119	NUEVO USME			1						30														
120	MOLINOS		1	1						70,06	799,2													
121	PALERMO SUR			1						33,22														
122	MARRUECOS			1						46,2														
123	EL TUNAL 1			1						64,62														
124	EL TUNAL 2			1						64,62														
125	EL TUNAL 3			1						55,62														
126	EL TUNAL ALTERNA			1						86,4														
127	NUEVO MUZU		1	1						67,2	990													
128	SANTA LUCIA 1			1						55,5														
129	SANTA LUCIA 2			1						66,3														
130	URB TUNJUELITO			1						81														
131	NUEVO MILENIO 1			1						29,4														

132	NUEVO MILENIO 2			1						25,8														
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1						27,6														
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1						27,6														
135	ILLIMANI F11		1	1						88,44	623,1													
136	ILLIMANI F5			1						30														
137	ILLIMANI EL MIRADOR			1						30														
138	TALLER EL ENSUEÑO			1						45,9														
139	ESTANCIA			1						42,6														
140	PARAISO			1						21,6														
141	LA JOYA			1						36														
142	DOMINGO LAIN			1						21,6														
143	ARBORIZADORA ALTA			1						21,6														
144	CARACOLI			1						31,5														
145	BALMORAL GUADALUPE			1						37,2														
146	LA VICTORIA 1			1						26,4														
147	LA VICTORIA 2			1						26,4														
148	SAN CRISTOBAL 1			1						85,68														
149	SAN CRISTOBAL 2			1						97,62														
150	ANTIOQUIA			1						24														
151	GAITAN CORTES		1	1						93	610													
152	NARANJOS		1	1						89,4														
153	VILLA DEL RIO			1						111,6														
154	EL RECREO			1						78			3	263,75										
155	LA TINGUA TIBANICA			1						78														
156	EL PORVENIR 1			1						48			1	219,6										
157	EL PORVENIR 2			1						48														
158	EL PORVENIR 3			1						48														
159	EL PORVENIR 4			1						38,04														
160	EL PORVENIR 5			1						38,04														
161	EL PORVENIR MINI			1						10,8			2	61,6										
162	SAN JOSE DE MARYLAND			1						62,68														
163	LUCES VILLA RICA			1						72,3			3	284,69										
164	LA ALEJANDRA			1						41,4														
165	AMERICAS OCCIDENTAL			1						66			3	224,4										
166	VILLA DE LOS SAUCES			1						48		3												
167	CARVAJAL			1						91,2		3												
168	TIMIZA F8			1						48														
169	TIMIZA F11			1						103,8														
170	LA IGUALDAD			1						97,5														
171	CASTILLA		1	1						55,8														
172	VILLA ALSACIA			1						96														
173	LAGO TIMIZA			1						46,2														
174	LAS CRUCES			1						42														
175	LACHES			1						66														
176	TERCER MILENIO 1 F5			1						32,4														
177	TERCER MILENIO 2 F5			1						32,4														
178	TERCER MILENIO 3 F5			1						99,6														
179	CANDELARIA MINI			1						16,8														

180	LOURDES			1						21														
181	DINDALITO			1						68,4														
182	CAYETANO CAÑIZARES		1	1						99	898,2													
183	GILMA F11			1						93														
184	GILMA F8			1						48,6														
185	GILMA F5 1			1						35,4														
186	GILMA F5 2			1						35,4														
187	GILMA MINI			1						9,6														
188	GORGONZOLA			1						45,12		3												
189	MARSELLA F11			1						84														
190	MARSELLA F5			1						46,42														
191	SANTA ISABEL 1			1						48			3	398,75										
192	SANTA ISABEL 2			1						30			1	135										
193	JUAN AMARILLO F5 1			1						28,2														
194	JUAN AMARILLO F5 2			1						28,2														
195	JUAN AMARILLO F5 3			1						28,2														
196	JUAN AMARILLO F5 4			1						28,2														
197	JUAN AMARILLO F8 1			1						48														
198	JUAN AMARILLO F8 2			1						48														
199	LA EUROPA			1						36														
200	LA EUROPA MINI			1						15														
201	METROPOLIS			1						36														
202	BONANZA			1						106,94														
203	CIUDAD HONDA		1	1						25,44	176,12													
204	CARLOS LLERAS															1018,2								
205	MODELIA															674,24								
206	PRIMAVERA															692,3								
207	VALLE DE REFOUS															735								
208	VICTORIA NORTE															563,5								
	TOTAL	**69**	**116**	**172**	**9**	**83**	**2**	**4722,39**	**4722,39**	**16753,69**	**13978,49**	**12**	**22**	**2801,31**	**8000**	**4752,1**	**120,99**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**200**	**20**

2845

2.1.8. JUNIO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	REPARACIÓN DE DIVOTS	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	RELLENO EN ARENA DE RIO	SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO	TRANSPORTE	ROTOVACTOR	VIBROCOMPACTADOR	VERTICUTTER	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	DESMONTE DE ARCOS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA
1	PRD ALTERNA 3	2	2					2																				
2	PRD ESTADIO																											
3	TABORA																											
4	EL CAJON ATAHUALPA	3	3					3																				
5	TIMIZA ESTADIO																											
6	TUNAL FUTBOL	2	2					2											3241									
7	SAN CRISTOBAL	2	2					2																				
8	SERENA	2	2					2																				
9	PARQUE NACIONAL	3	3					3																				
10	COUNTRY						9																					
11	UDS BEISBOL	2	2					2		8							3206,84											
12	UDS SOFTBOL	2	2					2		8							1587,2											
13	UDS ATLETISMO		2					2																				
14	UDS ATLETISMO MARTE		1					2																				
15	MILENTA TEJAR	2	2					2																				
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2					2																				
15	CIUDAD MONTES VOLEY		2														50,4											
16	TUNAL SOFTBOL	2	2					2									1328,96											
17	PAVCO NATURAL		3					3																				
18	PRD PLAYA		4														159,6											
19	UDS VOLEY PLAYA		2														41,6											
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2														42,4											
21	BOCHICA	2	2					2																				
22	MARSELLA		2					2			1			16090	8045	8045		300	8045									
23	JUAN AMARILLO NATURAL	4	4					4										300										
24	FLORIDA 1	4	4					4																				
25	FLORIDA 2	4	4					4																				
26	FLORIDA 3	4	4					4																				
27	FLORIDA 4	4	4					4																				
28	FLORIDA 5	4	4					4																				
29	ESTADIO ALQUERIA	5	7			80		8										200										
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2					2		8							1400											
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2					2																				
32	LA GAITANA NATURAL	4	4					4																				
33	LA GAITANA PLAYA																											
34	RINCON DE LOS ANGELES	2	2					2																				
35	SERVITA F11			1													112,8											
36	SERVITA F5			1													27											
37	CABRERA JAPON																											

1844

38	CANTALEJO			1													38,3												
39	PRADO PINZON		1	1													51		154,56										
40	MAZUREN			1													39												
41	VILANOVA			1													30				1	1			133,5				
42	VERBENAL			1													33												
43	UDS SINT		1	1													48		552,89										
44	EDUARDO SANTOS			1													40,2												
45	GUSTAVO RESTREPO			1													30												
46	VENECIA 1			1													31,8												
47	VENECIA 2			1													31,8												
48	LAGUNETA			1													52,8												
49	SAN JOSE CENTRO			1													24,6												
50	PARQUE OLAYA HERRERA			1													102,36												
51	PIJAOS			2																									
52	SAN ANDRES F5			1													48,18												
53	SAN ANDRES F11			1													102,6												
54	EL CARMELO F5			1													46,32												
55	EL CARMELO F11		1	1													117		798,4										
56	VILLA LUZ F5			1													48												
57	VILLA LUZ F11			1													92,94												
58	VILLAS DEL MADRIGAL			1													42												
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1													38,4												
60	PAVCO		1	1													40		517										
61	JAZMIN			1													97,2												
62	PEPITA			1													30,22												
63	CIUDAD MONTES 1			1													21												
64	CIUDAD MONTES 2			1													21												
65	SIERRA MORENA 1			1													30												
66	SIERRA MORENA 2			1													30												
67	CASA BLANCA			1													54,6												
68	FONTANAR DEL RIO F11			1													90,6												
69	FONTANAR DEL RIO F5			1													30												
70	FONTANAR MINI BEISBOL			1													60,96								602,75				
71	LA GAITANA			1													68,4												
72	URB LOMBARDIA			1													30												
73	CIUDADELA CAFAM			1													43,2												
74	DESARROLLO BILBAO			1													20,64												
75	BERLIN			1													38,4												
76	TIBABUYES 1			1													50,4												
77	TIBABUYES 2			1													60												
78	CAFAM LOS GAVILANES			1													90								98,75				
79	LA ESPERANZA																												1354,08
80	CLARELANDIA F11		1	1													87												
81	CLARELANDIA MINI		1	1													40,2												
82	TEJAR			1													91,2												
83	CHICALA																												
84	ATALAYAS			1													55,74												
85	PORTAL DEL SOL			1													84												
86	CAMPO VERDE 1			1													58,8												
87	CAMPO VERDE 2			1													56,4												

88	CAMPO VERDE 3			1													29,4												
89	SANTA CLARA			1													55,32												
90	HAYUELOS F6			1													68,1												
91	HAYUELOS F5			1													41,4												
92	NORMANDIA			1													88,8												
93	VILLEMAR		1	1													91,2		570										
94	PRADERA SUR		1	1													34,59		102										
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			1													86,4												
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1													36,6												
97	CEDRITOS		1	1													58,74		553,65										
98	TOBERIN		1	1													80,46		472,25										
99	CALLE 170		1	1													39,6		145,26										
100	ESTRELLA NORTE		1	1													47,32		139,42										
101	BURGOS BRITALIA 1		1	1													40,2		188,2										
102	BURGOS BRITALIA 2		1	1													40,2		230,68										
103	LINDARAJA			1													30												
104	COMETAS			1													48												
105	PTAR			1													104,4												
106	PRD 1		1	1															414,4										
107	PRD 2			1													105,6												
108	GIMNASIO DEL NORTE		1	1													41,4		62,37										
109	BACHUE			1													103,8												
110	FRAGUA		1	1													97,2		704										
111	VILLA MAYOR			1													93												
112	AURORA		1	1													84		951,8										
113	VALLES DEL CAFAM			1													40,2												
114	VILLA ALEMANA			1													31,8												
115	MIRAVALLE F8-1		1	1													47,4		83,99										
116	MIRAVALLE F8-2			1													35,6												
117	MIRAVALLE F5			1													30												
118	ALFONSO LOPEZ			1													35,24												
119	NUEVO USME			1													30												
120	MOLINOS		1	1													70,06		799,2										
121	PALERMO SUR			1													33,22												
122	MARRUECOS			1													46,2												
123	EL TUNAL 1			1													64,62												
124	EL TUNAL 2			1													64,62												
125	EL TUNAL 3			1													55,62												
126	EL TUNAL ALTERNA			1													86,4												
127	NUEVO MUZU		1	1													67,2		990										
128	SANTA LUCIA 1			1													55,5												
129	SANTA LUCIA 2			1													66,3												
130	URB TUNJUELITO			1													81												
131	NUEVO MILENIO 1			1													29,4												
132	NUEVO MILENIO 2			1													25,8												
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1													27,6												
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1													27,6												
135	ILLIMANI F11		1	1													88,44		623,1										

1844

136	ILLIMANI F5			1													30													
137	ILLIMANI EL MIRADOR			1													30													
138	TALLER EL ENSUEÑO			1													45,9													
139	ESTANCIA			1													42,6													
140	PARAISO			1													21,6													
141	LA JOYA			1													16													
142	DOMINGO LAIN			1													21,6													
143	ARBORIZADORA ALTA			1													21,6													
144	CARACOLI			1													31,5													
145	BALMORAL GUADALUPE			1													37,2													
146	LA VICTORIA 1			1													26,4													
147	LA VICTORIA 2			1													26,4													
148	SAN CRISTOBAL 1			1													85,68													
149	SAN CRISTOBAL 2			1													97,62													
150	ANTIOQUIA			1													24													
151	GAITAN CORTES		1	1													93		610											
152	NARANJOS		1	1													89,4													
153	VILLA DEL RIO			1													111,6													
154	EL RECREO			1													78													
155	LA TINGUA TIBANICA			1													78													
156	EL PORVENIR 1			1													48													
157	EL PORVENIR 2			1													48													
158	EL PORVENIR 3			1													48													
159	EL PORVENIR 4			1													38,04													
160	EL PORVENIR 5			1													38,04													
161	EL PORVENIR MINI			1													10,8													
162	SAN JOSE DE MARYLAND			1													62,68													
163	LUCES VILLA RICA			1													72,3													
164	LA ALEJANDRA			1													41,4													
165	AMERICAS OCCIDENTAL			1													66												22,46	22,46
166	VILLA DE LOS SAUCES			1													48													
167	CARVAJAL			1													91,2													
168	TIMIZA F8			1													48													
169	TIMIZA F11			1													103,8													
170	LA IGUALDAD			1													97,5													
171	CASTILLA		1	1													55,8													
172	VILLA ALSACIA			1													96													
173	LAGO TIMIZA			1													46,2													
174	LAS CRUCES			1													42													
175	LACHES			1													66													
176	TERCER MILENIO 1 F5			1													32,4													
177	TERCER MILENIO 2 F5			1													32,4													
178	TERCER MILENIO 3 F5			1													99,6													
179	CANDELARIA MINI			1													16,8													
180	LOURDES			1													21													
181	DINDALITO			1													68,4													
182	CAYETANO CAÑIZARES		1	1													99		898,2											
183	GILMA F11			1													93				3	3								
184	GILMA F8			1													48,6													
185	GILMA F5 1			1													35,4													

1850

186	GILMA F5 2			1													35,4											
187	GILMA MINI			1													9,6											
188	GORGONZOLA			1													45,12											
189	MARSELLA F11			1													84											
190	MARSELLA F5			1													40,42											
191	SANTA ISABEL 1			1													48											
192	SANTA ISABEL 2			1													30											
193	JUAN AMARILLO F5 1			1													28,2											
194	JUAN AMARILLO F5 2			1													28,2											
195	JUAN AMARILLO F5 3			1													28,2											
196	JUAN AMARILLO F5 4			1													28,2											
197	JUAN AMARILLO F8 1			1													48											
198	JUAN AMARILLO F8 2			1													48											
199	LA EUROPA			1													36											
200	LA EUROPA MINI			1													15											
201	METROPOLIS			1													36											
202	BONANZA			1													106,94											
203	CIUDAD HONDA		1	1													25,44		176,12									
204	CARLOS LLERAS																											
205	MODELIA																											
206	PRIMAVERA																											989
207	VALLE DE REFOUS				1055								8										1				320	1055
208	VICTORIA NORTE				805,92						1		8								1	1					242,42	805,92
	TOTAL	**65**	**112**	**167**	**1860,92**	**80**	**9**	**77**	**0**	**24**	**2**	**0**	**16**	**16090**	**8045**	**8045**	**16588,79**	**800**	**22023,49**	**0**	**5**	**5**	**1**	**0**	**835**	**0**	**584,88**	**4226,46**

3853

2.1.9. JULIO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	REPARACIÓN DE DIVOTS	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	RELLENO EN ARENA DE RIO	SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO	TRANSPORTE	ROTOVIACTOR	VIBROCOMPACTADOR	VERTICUTTER	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	DESMONTE DE ARCOS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	GRAVILLA	LIMPIEZA DE CARCAMO
1	PRD ALTERNA 3	2	2					2																						
2	PRD ESTADIO																													
3	TABORA																													
4	EL CAJON ATAHUALPA	2	2					2																						
5	TIMIZA ESTADIO																													
6	TUNAL FUTBOL	2	2					2											3241											
7	SAN CRISTOBAL	2	2					2									6889,45													
8	SERENA	1	1					1	36				5510	5510	5510				5510											
9	PARQUE NACIONAL	2	2					2																						
10	COUNTRY						9																							
11	UDS BEISBOL	2	2					2									3206,84													
12	UDS SOFTBOL	2	2					2									1587,2													
13	UDS ATLETISMO		2					2																						
14	UDS ATLETISMO MARTE		2					2																						
15	MILENTA TEJAR	2	2					2																						
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2					2																						
15	CIUDAD MONTES VOLEY		3														50,4													
16	TUNAL SOFTBOL	2	2					2									1328,96													
17	PAVCO NATURAL		2					2																						
18	PRD PLAYA		4														155,6													
19	UDS VOLEY PLAYA		2														41,6													
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2														42,4													
21	BOCHICA	3	3					3																						
22	MARSELLA		5					5									8045													
23	JUAN AMARILLO NATURAL	5	5					5																						
24	FLORIDA 1	5	5					5																						
25	FLORIDA 2	5	5					5																						
26	FLORIDA 3	5	5					5																						
27	FLORIDA 4	5	5					5																						
28	FLORIDA 5	5	5					5																						
29	ESTADIO ALQUERIA	4	9			90		9																						
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2					2									1400													
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2					2																						
32	LA GAITANA NATURAL	5	5					5																						
33	LA GAITANA PLAYA																													
34	RINCON DE LOS ANGELES	2	2					2																						
35	SERVITA F11			1													112,8													
36	SERVITA F5			1													27													
37	CABRERA JAPON																													
38	CANTALEJO			1													25,8													
39	PRADO PINZON		1	1													51		154,56											
40	MAZUREN			1													39													
41	VILANOVA			1													30													
42	VERBENAL			1													33													

43	UDS SINT		1	1												48		552,89											
44	EDUARDO SANTOS			1												40,2													
45	GUSTAVO RESTREPO			1												30													
46	VENECIA 1			1												31,8													
47	VENECIA 2			1												31,8													
48	LAGUNETA			1												52,8													
49	SAN JOSE CENTRO			1												24,6													
50	PARQUE OLAYA HERRERA			1												102,36													
51	PIJAOS			1												88,88													
52	SAN ANDRES F5			1												48,18													
53	SAN ANDRES F11			1												102,6													
54	EL CARMELO F5			1												46,32													
55	EL CARMELO F11		1	1												117		798,4											
56	VILLA LUZ F5			1												48													
57	VILLA LUZ F11			1												92,94													
58	VILLAS DEL MADRIGAL			1												42													
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1												38,4													
60	SALITRE EL GRECO		1	1												43,4		118											
61	PAVCO		1	1												40		517											
62	JAZMIN			1												97,2													
63	PEPITA			1												30,72													
64	CIUDAD MONTES 1			1												21													
65	CIUDAD MONTES 2			1												21													
66	SIERRA MORENA 1			1												30													
67	SIERRA MORENA 2			1												30													
68	CASA BLANCA			1												54,6													
69	FONTANAR DEL RIO F11			1												90,6								257,5					
70	FONTANAR DEL RIO F5			1												30													
71	FONTANAR MINI BEISBOL			1					3							69,96													
72	LA GAITANA			1												68,4													
73	URB LOMBARDIA			1												30													
74	CIUDADELA CAFAM			1												43,2													
75	DESARROLLO BILBAO			1												20,64													
76	BERLIN			1												38,4													
77	TIBABUYES 1			1												50,4													
78	TIBABUYES 2			1												60													
79	CAFAM LOS GAVILANES			1												90													
80	LA ESPERANZA			1	1354,08				2		8					46,8				3	3			144		406,22		22	
81	CLARELANDIA F11		1	1												87													
82	CLARELANDIA MINI		1	1												40,2													
83	TEJAR			1												91,2													
84	CHICALA			1												78,6													
85	ATALAYAS			1												55,74													
86	PORTAL DEL SOL			1												84													
87	CAMPO VERDE 1			1												58,8													
88	CAMPO VERDE 2			1												56,4													
89	CAMPO VERDE 3			1												29,4													
90	SANTA CLARA			1												55,32													
91	HAYUELOS F8			1												68,1													
92	HAYUELOS F5			1												41,4													
93	NORMANDIA			1												88,8													
94	VILLEMAR		1	1												91,2		570											
95	PRADERA SUR		1	1												34,59		102											

1954

96	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			1													86,4												
97	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1													56,6												
98	CEDRITOS		1	1													58,74		553,65										
99	TOBERIN		1	1													80,46		472,35										
100	CALLE 170		1	1													39,6		145,36										
101	ESTRELLA NORTE		1	1													47,32		139,42										
102	BURGOS BRITALIA 1		1	1													40,2		188,2										
103	BURGOS BRITALIA 2		1	1													40,2		230,68										
104	LINDARAJA			1													30												
105	COMETAS																												
106	PTAR			1													104,4												
107	PRO 1		1	1													104,4		414,4										
108	PRO 2			1													105,6												
109	GIMNASIO DEL NORTE		1	1													41,4		62,37										
110	BACHUE			1													101,8												
111	FRAGUA		1	1													97,2		704										
112	VILLA MAYOR			1													93												
113	AURORA		1	1													84		551,8										
114	VALLES DEL CAFAM			1													40,2												
115	VILLA ALEMANA			1													31,8												
116	MIRAVALLE F8-1		1	1													47,4		83,93										
117	MIRAVALLE F8-2			1													35,6												
118	MIRAVALLE F5			1													30												
119	ALFONSO LOPEZ			1													35,24												
120	NUEVO USME			1													30												
121	MOLINOS		1	1													70,06		799,2										
122	PALERMO SUR			1													33,23											6	
123	MARRUECOS			1													46,2												
124	EL TUNAL 1			1													64,62												
125	EL TUNAL 2			1													64,62												
126	EL TUNAL 3			1													55,62												
127	EL TUNAL ALTERNA			1													86,4												
128	NUEVO MUZU		1	1													67,3		980										
129	SANTA LUCIA 1			1													55,5												
130	SANTA LUCIA 2			1													66,3												
131	URB TUNJUELITO			1													81												
132	NUEVO MILENIO 1			1													29,4												
133	NUEVO MILENIO 2			1													25,8												
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1													27,6												
135	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1													27,6												
136	ILLIMANI F11		1	1													88,44		623,1										
137	ILLIMANI F5			1													30												
138	ILLIMANI EL MIRADOR			1													30												
139	TALLER EL ENSUEÑO			1													45,9												
140	ESTANCIA			1													42,6												
141	PARAISO			1													21,6												
142	LA JOYA			1													36												
143	DOMINGO LAIN			1													21,6												
144	ARBORIZADORA ALTA			1													21,6												
145	CARACOLI			1													31,5												
146	BALMORAL GUADALUPE			1													37,2												
147	LA VICTORIA 1			1													26,4												
148	LA VICTORIA 2			1													26,4												

1854

149	SAN CRISTOBAL 1			1													85,68												
150	SAN CRISTOBAL 2			1													97,62												
151	ANTIOQUIA			1													24												
152	GAITAN CORTES		1	1													93		810										
153	NARANJOS		1	1													89,4												
154	VILLA DEL RIO			1													111,6												
155	EL RECREO			1													78												
156	LA TINGUA TIBANICA			1													78												
157	EL PORVENIR 1			1													48												
158	EL PORVENIR 2			1													48												
159	EL PORVENIR 3			1													48												
160	EL PORVENIR 4			1													38,04												
161	EL PORVENIR 5			1													38,04												
162	EL PORVENIR MINI			1													30,8												
163	SAN JOSE DE MARYLAND			1													62,68												
164	LUCES VILLA RICA			1													72,3												
165	LA ALEJANDRA																												
166	AMERICAS OCCIDENTAL			1													66												
167	VILLA DE LOS SAUCES			1													48												
168	CARVAJAL			1													91,2												
169	TIMIZA F8			1													48												
170	TIMIZA F11			1													103,8												
171	LA IGUALDAD			1													97,5												
172	CASTILLA		1	1													55,8												
173	VILLA ALSACIA			1													56												
174	LAGO TIMIZA			1													46,2												
175	LAS CRUCES			1													42												
176	LACHES			1													66												
177	TERCER MILENIO 1 F5			1													32,4												
178	TERCER MILENIO 2 F5			1													32,4												
179	TERCER MILENIO 3 F5			1													99,6												
180	CANDELARIA MINI			1													16,8												
181	LOURDES			1													21												
182	DINDALITO			1													88,4												
183	CAYETANO CANIZARES		1	1													99		898,2										
184	GILMA F11			1													93								211,5				
185	GILMA F8			1													48,6												
186	GILMA F5 1			1													35,4												
187	GILMA F5 2			1													35,4												
188	GILMA MINI			1													9,6												
189	GORGONZOLA			1													45,12												
190	MARSELLA F11			1													84												
191	MARSELLA F5			1													46,42												
192	SANTA ISABEL 1			1													48												
193	SANTA ISABEL 2			1													30												
194	JUAN AMARILLO F5 1			1													28,2												
195	JUAN AMARILLO F5 2			1													28,2												
196	JUAN AMARILLO F5 3			1													28,2												
197	JUAN AMARILLO F5 4			1													28,2												
198	JUAN AMARILLO F8 1			1													48												
199	JUAN AMARILLO F8 2			1													48												
200	LA EUROPA			1													36												
201	LA EUROPA MINI			1													15												
202	METROPOLIS			1													36												
203	BONANZA			1													100,94												

38,55

204	CIUDAD HONDA		1	1													25,44		176,12										
204	CARLOS LLERAS				1455,53						2		8														437,36	1455,53		
205	MODELIA																											963,2		
206	PRIMAVERA				380						1		8											158,25		286,7		22	133,6
207	VALLE DE REFOUS										1													233,25				3,5	
208	VICTORIA NORTE																		459,6					284,25				3,5	
	TOTAL	69	124	107	3798,61	90	9	85	36	3	6	0	24	5510	5510	5510	31763,42	0	20066,05	0	3	3	0	0	1280,75	0	1140,1	2418,73	57	133,6

2.1.10. AGOSTO 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

N°		DEMARCACION	BORDEO	CEPILLADO	IMPRIMACION ASFALTICA	REPARACION DE DRENTE	CORTE CAMPO FOLD	CORTE CESPED	RELLENO EN ARENA DE RIO	SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO	TRANSPORTE	ROTOVACTOR	VIBROCOMPACTADOR	VERTICUTTER	EMPRADIZACIÓN	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	DESMONTE DE ARCOS	CORDON BOLADURA	SUMINISTRO Y REPARACION MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	GRAVILLA	JORNAL CUADRILLA MANO DE OBRA	PLACA CONCRETO	AFINADO PLACA CONCRETO	LIMPIEZA DE CARCAMO
1	PRD ALTERNA 3	2	2					2																										
2	PRD ESTADIO																																	
3	TABORA																																	
4	EL CAJON ATAHUALPA	2	2					2																										
5	TIMIZA ESTADIO																																	
6	TUNAL FUTBOL	2	2					4											5243															
7	SAN CRISTOBAL	2	2					4										6866,65																
8	SERENA		4					4				6			15			5530	300															
9	PARQUE NACIONAL	2	2					2																										
10	COUNTRY						12																											
11	UDS BOSQUE	2	2					2										5706,84																
12	UDS SOFTBOL	2	2					2										1587,2																
13	UDS ATLETISMO		2					2										105																
14	UDS ATLETISMO MARTE		2					2																										
15	MILENTA TEJAR	2	2					4																										
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	3	3					5																										
15	CIUDAD MONTES VOLEY		3																															
16	TUNAL SOFTBOL	2	2					4										1328,96																
17	PAUCO NATURAL		2					2																										
18	PRD PLAYA		4															159,6																
19	UDS VOLEY PLAYA		2															43,6																
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2															42,4																
21	BOCHICA	2	2					2																										
22	MARSELLA	3	4					4																										
23	JUAN AMARILLO NATURAL	4	4					8										7888																
24	FLORIDA 1	4	4					4																										
25	FLORIDA 2	4	4					4																										
26	FLORIDA 3	4	4					4																										
27	FLORIDA 4	4	4					4																										
28	FLORIDA 5	4	4					4																										
29	ESTADIO ALQUERIA	4	8			20		8			1			7140		8000	7140		700															
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	3	3					5																										
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2					2																										
32	LA QUITANA NATURAL	4	4					4																										
33	LA QUITANA PLAYA																																	
34	RINCON DE LOS ANGELES	2	2					2																										
35	PLAZA DE TOROS										1	10																						
36	SERVITA F11			1														132,8																
37	SERVITA F5			1														27																
38	CARRERA JAPON																																	
39	CANTALEJO			1														25,8																
40	PRADO PINZON		1	1														84		154,56														
41	MAZUREN			1														39																
42	VILANOVA			1														30																
43	VERSENAL			1														33																
44	UDS SINT		1	1														48		552,89														
45	EDUARDO SANTOS			1														40,2																
46	GUSTAVO RESTREPO			1														30																
47	VENECIA 1			1														33,8																
48	VENECIA 2			1														33,8																
49	LAGUNETA			1														52,8																
50	SAN JOSE CENTRO			1														24,6																
51	PARQUE OLAYA HERRERA			1														102,36																
52	PLMOS																																	
53	SAN ANDRES F5			1														46,16																

1858

54	SAN ANDRES F11			1														102,6																
55	EL CARMELO F8			1														45,12																
56	EL CARMELO F11		1	1														117		798,4														
57	VILLA LUZ F8			1														66																
58	VILLA LUZ F11			1														82,94																
59	VILLAS DEL MADRIGAL			1														40																
60	FLORENCIA LOS TROMQUITOS			1														38,4																
60	SALITRE EL GRECO			1													1180	1300																
61	PASCO		1	1														40		537														
62	JAZMIN			1														97,2																
63	PEPITA			1														30,22																
64	CIUDAD MONTES 1			1														21																
65	CIUDAD MONTES 2			1														21																
66	SIERRA MORENA 1			1														30																
67	SIERRA MORENA 2			1														30																
68	CASA BLANCA			1														54,6																
69	FONTANAR DEL RIO F11			1														50,6																
70	FONTANAR DEL RIO F8			1														30																
71	FONTANAR MINI RESIDEL			1														69,96																
72	LA GAITANA			1														68,4																
73	URB LOMBARDIA			1														30																
74	CIUDADELA CAFAM			1														64,2																
75	DESARROLLO BILBAO			1														20,84																
76	BERLIN			1														38,4																
77	TIBAGUYES 1			1														50,6																
78	TIBAGUYES 2			1														60																
79	CAFAM LOS CAVILANES			1														90																
80	LA ESPERANZA			1														46,8																
81	CLARELANDIA F11		1	1														97																
82	CLARELANDIA MINI		1	1														40,2																
83	TEJAR			1														91,2																
84	CHICALA			1														38,6																
85	ATALAYAS			1														55,74																
86	PORTAL DEL SOL			1														84																
87	CAMPO VERDE 1			1														58,8																
88	CAMPO VERDE 2			1														56,4																
89	CAMPO VERDE 3			1														29,8																
90	SANTA CLARA			1														55,32																
91	HAYUELOS F8			1														68,1																
92	HAYUELOS F9			1														43,8																
93	NORMANDIA			1														88,8																
94	VILLEMAR		1	1														93,2		570														
95	PRADERA SUR																																	
96	PARQUE INDUSTRIAL LOS BUHOS			1														66,4																
97	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1														36,6																
98	CRORITOS		1	1														58,74		553,65														
99	TOBERIN		1	1														80,46		472,25														
100	CALLE 170		1	1														30,6		145,36														
101	ESTRELLA NORTE		1	1														47,52		148,42														
102	BURGOS BRITALIA 1		1	1														40,2		188,2														
103	BURGOS BRITALIA 2		1	1														40,2		130,68														
104	LINDARAJA			1														30																
105	COMETAS			1														48																
106	PTAR			1														504,4																
107	PRD 1		1	1														304,8		814,4														
108	PRD 2		1	1														305,6																
109	GIMNASIO DEL NORTE		1	1														43,4		62,37														
110	BACHUE			1														305,8																
111	FRAGUA		1	1														97,2		708														
112	VILLA MAYOR			1														93																
113	AURORA		1	1														84		953,6														
114	VALLES DEL CAFAM			1														40,2																
115	VILLA ALEMANA			1														31,8																

3854

| | | |

181	LOURDES			1														21																	
182	DINDALITO			1														68,4																	
183	CAYETANO CAÑIZARES		1	1														99		858,2															
184	GILMA F11			1														33																	
185	GILMA F8			1														48,9																	
186	GILMA F5 1			1														35,4																	
187	GILMA F5 2			1														35,4																	
188	GILMA MINI			1														9,0																	
189	GORGONZOLA			1														45,12																	
190	MARSELLA F11			1														83																	
191	MARSELLA F5			1														46,47																	
192	SANTA ISABEL 1			1														48																	
193	SANTA ISABEL 2			1														32																	
194	JUAN AMARILLO F5 1			1														28,2																	
195	JUAN AMARILLO F5 2			1														28,2																	
196	JUAN AMARILLO F5 3			1														28,2																	
197	JUAN AMARILLO F5 4			1														28,2																	
198	JUAN AMARILLO F8 1			1														48																	
199	JUAN AMARILLO F8 2			1														48																	
200	LA EUROPA			1														16																	
201	LA EUROPA MINI			1														15																	
202	METROPOLIS			1														16																	
203	SONANZA			1														106,94																	
204	CIUDAD HONDA		1	1														25,44		176,12															
205	CARLOS LLERAS		1	1														67,68		1806,9		3	5			193,5				10					
206	MODELIA		1	1	963,2						1		8					98,68				3	1			185,5		283		5					
207	PRIMAVERA			1							1							33,6																	
208	VALLE DE REPOUS			1							1																						2			
209	VICTORIA MONTE			1														88,68																	
210	PADEL PRO																																	194	200	
	TOTAL	65	130	184	963,2	20	12	92	0	0	5	16	8	7540	15	9200	6520	3585,6	500	37665,99	0	6	6	0	0	349	4800	289	0	15	2	194	200	0

1863

2.1.11. SEPTIEMBRE 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	IMPRIMACIÓN ASFALTICA	REPARACIÓN DE BACHES	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	RELLENO EN ARENA DE RIO	SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO	TRANSPORTE	ROTOVACTOR	VIBROCOMPACTADOR	VERTICUTTER	EMPRADIZACIÓN	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACION	APLICACION DE FERTILIZANTE	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	DESMONTE DE ARCOS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	GRAVILLA	JORNAL CHAGRILLA MANO DE OBRA	PLACA CONCRETO	APISONADO PLACA CONCRETO	LIMPIEZA DE CARCAMO	TRASIEGO	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA PARALISMO	SUMINISTRO CANCHA PADEL
1	PRO ALTERRA 3	3	3					3																												
2	PRO ESTADIO																																			
3	TABORA																																			
4	EL CAJON ATAHUALPA	2	3					2																												
5	TIMIZA ESTADIO																																			
6	TUNAL FUTBOL	3	3					5											6661,5																	
7	SAN CRISTOBAL	3	4					5																												
8	SERENA	2	5					5																												
9	PARQUE NACIONAL	2	3					2																												
10	COUNTRY						14																													
11	UDS RHISRO	3	4					3										1200,84																		
12	UDS SOFTBOL	3	3					8										1587,7																		
13	UDS ATLETISMO		3					3																												
14	UDS ATLETISMO MARTE		3					3																												
15	MILENTA TEJAR	2	2					6																												
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	3					5																												
17	CIUDAD MONTES VOLEY		3															39,2																		
18	TUNAL SOFTBOL	3	3					5										1326,95																		
19	PAVCO NATURAL		2					2																												
20	PRO PLAYA		6															350,6																		
21	UDS VOLEY PLAYA		3															61,6																		
22	COMPLEJO ACUATICO		3															42,4																		
23	BOCHICA	3	3					3																												
24	MARBELLA	4	4					4																												
25	JUAN AMARILLO NATURAL	5	5					5																												
26	FLORIDA 1	4	4					6																												
27	FLORIDA 2	4	4					6																												
28	FLORIDA 3	4	4					6																												
29	FLORIDA 4	4	4					6																												
30	FLORIDA 5	4	4					6																												
31	ESTADIO ALQUERIA	5	10					10																												
32	CIUDAD MONTES SOFTBOL	3	3					5										1400																		
33	NUEVO MUZU NATURAL	2	2					2																												
34	LA GAITANA NATURAL	5	5					5																												
35	LA GAITANA PLAYA																																			
36	RINCON DE LOS ANGELES	2	2					2																												
37	PLAZA DE TOROS																																			
38	SERVITA F11			1														112,8																		
39	SERVITA F5			1														27																		
40	CABRERA JAPON																																			
41	CANTALEJO			1														25,8																		
42	PRADO PINZON		1	1														55		166,66																
43	MAZUREN			1														35																		
44	VILANOVA			1														50																		
45	VERBENAL			1														33																		
46	UDS SNT		1	1														48		552,89																
47	EDUARDO SANTOS			1														40,2																		
48	GUSTAVO RESTREPO			1														30																		
49	VENECIA 1			1														31,8																		
50	VENECIA 2			1														31,8																		
51	LAGUNETA			1														52,8																		
52	SAN JOSE CENTRO			1														24,6																		
53	PARQUE OLAYA HERRERA			1														102,36																		
54	PUMOS																																			
55	SAN ANDRES F5			1														46,18																		

3863

54	SAN ANDRES F11			1														107,6																			
55	EL CARMELO F5			1														46,32																			
56	EL CARMELO F11		1	1														117	798,4																		
57	VILLA LUZ F5			1														48																			
58	VILLA LUZ F11			1														92,94																			
59	VILLAR DEL MADRIGAL			1														42							382,5												
60	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1														38,4																			
60	SALITRE EL GRECO		1	1														43,4	116																		
61	POZO		1	1														48	517																		
62	JAZMIN			1														92,2																			
63	PEPITA			1														30,22																			
64	CIUDAD MONTES 1			1														71																			
65	CIUDAD MONTES 2			1														71																			
66	SIERRA MORENA 1			1														30																			
67	SIERRA MORENA 2			1														30																			
68	CASA BLANCA			1														54,6																			
69	FONTANAR DEL RIO F11			1														90,6																			
70	FONTANAR DEL RIO F5			1														30																			
71	FONTANAR MINI BEISBOL			1														89,56																			
72	LA GAITANA			1														68,4																			
73	LINB LOMMARDIA			1														30																			
74	CIUDADELA CAFAM			1														43,2																			
75	DESARROLLO BILBAO			1														20,64																			
76	BERLIN			1														48,4																			
77	TIBABUYES 1			1														50,4																			
78	TIBABUYES 2			1														60																			
79	CAFAM LOS GAVILANES																	60																			
80	LA ESPERANZA			1														46,8																		325,5	
81	CLARELANDIA F11		1	1														87																			
82	CLARELANDIA MINI			1														40,3																			
83	TEJAR			1														90,3																			
84	CHICALA			1														78,6																			
85	ATALAYAS			1														95,76																			
86	PORTAL DEL SOL			1														84																			
87	CAMPO VERDE 1			1														58,8																			
88	CAMPO VERDE 2			1														56,4																			
89	CAMPO VERDE 3			1														28,4																			
90	SANTA CLARA			1														55,32																			
91	HAYUELOS F8			1														68,3																			
92	HAYUELOS F5			1														41,4																			
93	NORMANDIA			1														88,8																			
94	VILLEMAR		1	1														91,2	570																		
95	PRADERA SUR																																				
96	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			1														86,4																			
97	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1														38,8																			
98	CEDRITOS		1	1														98,26	553,65																		
99	TORERIN		1	1														80,96	472,26																		
100	CALLE 170		1	1														38,6	245,26																		
101	ESTRELLA NORTE		1	1														47,42	139,42																		
102	BURGOS BRITALIA 1		1	1														40,3	188,2																		
103	BURGOS BRITALIA 2		1	1														40,2	230,68																		
104	LINDARAJA			1														80																			
105	COMETAS			1														48																			
106	PTAR			1														104,4																			
107	PRD 1		1	1														104,4	434,4																		
108	PRD 2		1	1														105,6																			
109	OMNIBUS DEL NORTE		1	1														41,4	62,37																		
110	BACHUE			1														103,8																			
111	FRAGUA		1	1														97,2	704																		
112	VILLA MAYOR			1														93																			
113	AURORA		1	1														84	551,8																		
114	VALLES DEL CAFAM			1														48,2																			
115	VILLA ALEMANA			1														31,8																			

3864

| | | |

| | | |

2.1.12. OCTUBRE 2025

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025

Nº		DEMARCACION	BORDEO	CEPILLADO	IMPRIMACION ASFALTICA	REPARACION DE DIQUES	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	RELLENO EN ARENA DE RIO	SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO	TRANSPORTE	ROTOVIATOR	VIBROCOMPACTADOR	VERTICUTTER	EMPRADIZACIÓN	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	DESMONTE DE ARCOS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACION MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	GRAVILLA	JORNAL CUADRILLA MANO DE OBRA	PLACA CONCRETO	AFINADO PLACA CONCRETO	LIMPIEZA DE CARICAMO	TRASIEGO	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA PAISAJISMO	SUMINISTRO CANCHA PADEL
1	PRD ALTERNA 2	1	2					2																												
2	PRD ESTADIO																																			
3	TABORA																																			
4	EL CAJON ATAHUALPA	2	3					3																												
5	TIMIZA ESTADIO																																			
6	TUNAL FUTBOL	2	1					3											6383																	
7	SAN CRISTOBAL	1	1					1																												
8	SERENA	2	2					1																												
9	PARQUE NACIONAL	3	3					3																												
10	COUNTRY						9																													
11	UDS BEISBOL	1	1					2									3206,84																			
12	UDS SOFTBOL	1	1					2									1667,2																			
13	UDS ATLETISMO		1					2																												
14	UDS ATLETISMO MARTE		1					2																												
15	MILENTA TEJAR	1	1					2																												
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	1	1					1																												
17	CIUDAD MONTES VOLEY		1														25,2																			
18	TUNAL SOFTBOL	1	1					3									1328,96																			
19	PAVCO NATURAL		1					2																												
20	PRD PLAYA		1														185,99																			
21	UDS VOLEY PLAYA		1														41,6																			
22	COMPLEJO ACUÁTICO		1														62,4																			
23	BOCHICA	1	1					2																												
24	MARSELLA	2	2					4																												
25	JUAN AMARILLO NATURAL	2	1					3																												
26	FLORIDA 1	3	4					5																												
27	FLORIDA 2	3	4					5																												
28	FLORIDA 3	3	4					5																												
29	FLORIDA 4	3	3					4																												
30	FLORIDA 5	3	3					4																												
31	ESTADIO ALQUERIA	4	5					6																												
32	CIUDAD MONTES SOFTBOL	1	3					3									1600																			
33	NUEVO MUZU NATURAL	1	1					2																												
34	LA GAITANA NATURAL	3	3					3																												
35	LA GAITANA PLAYA																																			
36	RINCON DE LOS ANGELES	1	1					2																												
37	PLAZA DE TOROS																																			
38	UDS FUTBOL		1					2																												
37	SERVITA F11			1													112,8																			
38	SERVITA F5			1													27																			
39	CARRERA JAPON			1													90																			
40	CANTARIJO			1													25,8																			
41	PRADO PINZON		1	1													51		154,56																	
42	MAZUREN			1													39																			
43	VILANOVA			1													30																			
44	VERDENAL			1													33																			
45	UDS SINT		1	1													68		552,88																	
46	EDUARDO SANTOS																																			
47	GUSTAVO RESTREPO																																			
48	VENECIA 1																																			
49	VENECIA 2																																			
50	LAGUNETA																																			
51	SAN JOSE CENTRO																																			
52	PARQUE OLAYA HERRERA																																			
53	PUNOS																																			

3866

| | | |

| | | |

| | | |

2.2. ANEXO 1.2. CONTROL DE ACTIVIDADES

2.2.1. DICIEMBRE 2024

REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INNOVAPARQUES

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 09 de Diciembre
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 02 al 08 de Diciembre de 2024

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	del 02 al 06 de diciembre	TITO PABON	VINILO TIPO 2	9	CANECA	CAMPOS NATURALES
2	4/12/2024	ECO TIRE GREEN	CAUCHO GRANULAR (REPARACIONES	734,4	kl	verbenal
3	4/12/2024	ECO TIRE GREEN	CAUCHO GRANULAR (REPARACIONES	1341,98	kl	alameda 170
4	4/12/2024	ECO TIRE GREEN	CAUCHO GRANULAR (SUMINISTRO)	2000	kl	verbenal
5	4/12/2024	ECO TIRE GREEN	CAUCHO GRANULAR (SUMINISTRO)	2000	kl	alameda 170
6	3/12/2024	MALLAS NM	MALLA DE CACHAS DE MICRO FUTBOL	1	JGO	alameda 170
7	3/12/2024	MALLAS NM	MALLA DE CACHAS DE MICRO FUTBOL	1	JGO	verbenal
8						
9						
10						
11						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
/CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



3814

REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INNOVAPARQUES

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	13 de Diciembre
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 10 al 13 de Diciembre de 2024

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	10 al 13 de diciembre	TITO PABON	VINILO TIPO 2	10	CANECA	CAMPOS NATURALES
2	12/12/2024	MALLAS NM	MALLA NYLON	80.4	M2	cedritos
3	12/12/2024	MALLAS NM	MALLA DE CACHAS DE FUTBOL T11	1	UÑ	cedritos
4	12/12/2024	MALLAS NM	MALLA DE CACHAS DE MICRO FUTBOL	2	JGO	cedritos
5	12/12/2024	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO 50MM	22	M2	cedritos
6	13/12/2024	ECO TIRE GREEN	CAUCHO GRANULAR (reparacion)	374	kl	cedritos
7	13/12/2024	BEPE	ARENA SILICE	374	kl	cedritos
8	13/12/2024	SILLECO	PEGANTE BICOMPONENTE PARA GRAMA	11	kl	cedritos
9	13/12/2024	ECO TIRE GREEN	CAUCHO GRANULAR top dressing	3000	kl	cedritos
10						
11						
12						
13						
14						
15						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1873

REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INNOVAPARQUES

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	20 de Diciembre
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 16 al 20 de Diciembre de 2024

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	16 al 20 de diciembre	TITO PABON	VINILO TIPO 2	9	CANECA	CAMPOS NATURALES
2	16/12/2024	FERRETERIA	TRITURADO DE 1/2	6	M3	PALERMO
3	18/12/2024	INGENIERIA CMC SAS	VIBRO COMPACTADOR	8	HR	PALERMO
3	19/12/2024	GREGORIO VARGAS HERNANDEZ	IMPRIMACION ASFALTICA	714.61	M2	PALERMO
4	20/12/2024	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO 60MM	714.61	M2	PALERMO
7						
8						
9						
10						
11						
12						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1876

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	27 de Diciembre
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 23 al 27 de Diciembre

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	ene-25	TITO PABON	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
1	dic-24	CAUCHOS DINAMICOS	CAUCHO GRANULAR	12150	KILOS	PALERMO
2	dic-24	SUMINISTROS BEPE SAS	ARENA	12150	KILOS	PALERMO
3	dic-24	MALLAS Y GRANAS	CINTA DE UNION	330	ML	PALERMO
3	dic-24	PINTURAS BLEER	ANTICORROSIVO	1	GL	PALERMO
4	dic-24	PINTURAS BLEER	ESMALTE BLANCO	1	GL	PALERMO
7	dic-24	MALLAS NM	MALLAS CERRAMIENTO NYLON	88	M2	PALERMO
8						
9						
10						


III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CIVIC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

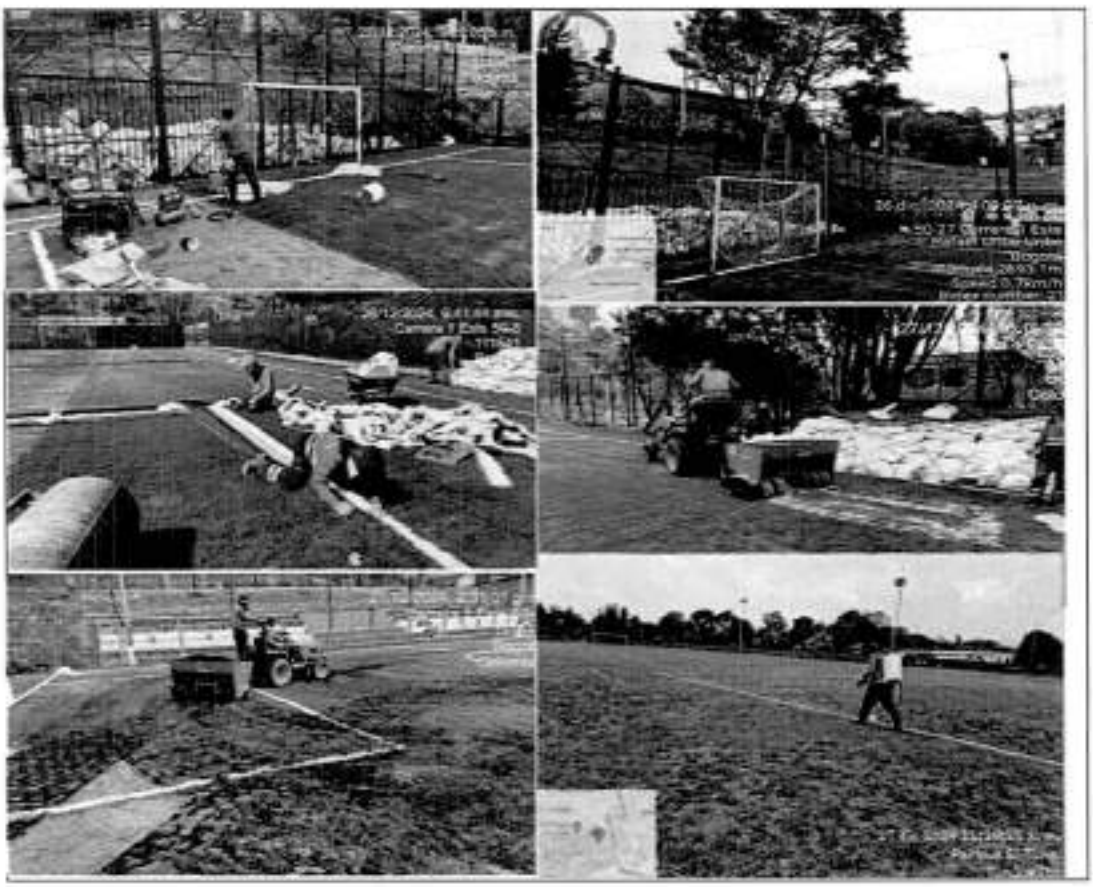

JB77

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.			
Fecha de Verificación:	06-17-24		
Ubicación:	Alameda Calle 170		
Inspector que verifica	Carol Lopez F.		
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Orci)	Norte - Sur		
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-023		
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	ARCOS PORTERIA	X 39

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaco	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	2.10 x 5.20 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador:[Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Andres Juarez		
Fecha de Aprobación: [Fecha]	6/17/24		

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	06-17-24			
Ubicación:	Alameda Calle 170			
Inspector que verifica	Carol Lopez T.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Oec, Occi)	Peatonal			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Ventacol	Material de la Red	Nylon #7
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	168,5 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Oscar Arcila		
Fecha de Aprobación: [Fecha]	6/17/24		

1874

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-G
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	02-12-24
Ubicación:	Alameda Calle 170
Inspector que verifica	Carol Lopez
Tipo de uso del cesped:	Deportivo Campo de futbol
Nro de Lote instalado	24N321 - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Primark	Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	Verde	Altura de las fibras: [Medida en cm]	6

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	X		
4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Colocación del Césped:		Si	
Union de Paños (Costuras):	X		
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:	X		
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: (Caucho)		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente]		Si	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme]		Si	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado]		Si	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada [sin hundimientos o bultos]:[Si, no]		Si	
Lineas de Marcado: (correcta)		Si	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados]: (correcta)		Si	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: [correcta]		Si	
Verificación de Impacto/Absorción [si es necesario]:Adecuada		Si	

7. Aprobación y Firma:	
Firma del Inspector/Verificador:[Firma]	
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Johan Rivera Diaz
Fecha de Aprobación: [Fecha]	3/12/24

3880

SOLUCIONES INNOVADORAS	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-G
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	12-12-24
Ubicación:	Ecuitos 5
Inspector que verifica	Cristi Lopez T
Tipo de uso del césped:	Deportivo / Cancha de futbol
Nro de Lote instalado	24 N° 321.- FS148

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cumpiz	Material del Cesped	Monofilamento polietileno
Color del Césped:	Verde	Altura de las fibras: (Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	X		

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):	X		
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:	X		
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho]		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente]		Si	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme]		Si	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado]		Si	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		Si	
Líneas de Marcado: (correcta)		Si	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): [correcta)		Si	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		Si	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		Si	

7. Aprobación y Firma:	
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]	
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Jhony Diaz
Fecha de Aprobación: [Fecha]	17/12/24

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.			
Fecha de Verificación:	11-12-24		
Ubicación:	Cedritos		
Inspector que verifica	Cabral Lopez F.		
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Norte Sur		
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224 - 017		
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	ARCOS PORTERIA	X Sy

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol.	Material de la Red	Nylon # 6
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	2.5 x 7.5 m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si.	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	. Cumple
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador:[Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]		Andres Lopez	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		11/12/24	

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.			
Fecha de Verificación:	11-11-24		
Ubicación:	Cedritos.		
Inspector que verifica	Carlo Lopez F.		
ubicación Porteria : (Norte . Sur . Occ. Occl)	Occ - Oriente		
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023		
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	ARCOS PORTERIA	X 2 und

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	2,10 x 3.30

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si.	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si.	Cumple.
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]	D.A		
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	CARLOS ALEJANDRO		
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11/11/24		

1083

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	11-17-24			
Ubicación:	Cuadritos			
Inspector que verifica	Carol Lopez F.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ. Occi)	Principal			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-032			
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Treanca	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	80.4 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No.	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Johan Diaz		
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11/17/24		

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-N
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:			
Fecha de Verificación:	7E-12-24		
Ubicación:	Tolemaida Sur		
Inspector que verifica	Cpl Lopez F		
ubicacion Porteria : (Norte , Sur , Occ. Occi)	Norte - Sur		
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023		
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	ARCOS PORTERIA	X 3/9

2. Detalles de las redes			
Marca	Inventado	Material de la Red	Polipropileno
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	2,10 x 3,30 m.

3. Condicion de la Red Instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	

4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion	X		Se evega para instalacion de inauguracion.
Estado de sistema de fijacion	X		
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		

5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK

6. Aprobación y Firma:	
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]	
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Jhony Diaz
Fecha de Aprobación: [Fecha]	7E/12/24

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:					
Fecha de Verificación:	16-12-24				
Ubicación:	Palermo Sur				
Inspector que verifica	Carol Lopez F.				
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ. Occi)	Fpm motta 1				
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774 -037				
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA		

2. Detalles de las redes			
Marca	Ignacca.	Material de la Red	Nylon PE.
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	80 m2.

3. Condicion de la Red Instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado del sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X.		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No.	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Jhony Diaz		
Fecha de Aprobación: [Fecha]	16/12/24		

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.					
Fecha de Verificación:	06-12-24				
Ubicación:	Vallanca				
Inspector que verifica	Carol Lopez F.				
ubicación Portería : (Norte , Sur , Occ. Orci)	Fachada Sur				
Nro de certificado de calidad del Hilo	8224-032				
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA		

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaxcol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	84,25 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde paso el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	Carol Lopez Diaz		
Fecha de Aprobación: [Fecha]	6/12/24		

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:			
Fecha de Verificacion:	06-12-24		
Ubicación:	Yaubema!		
Inspector que verifica	Coral Lopez F.		
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Orci)	Norte - Sur		
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274 - 273		
Uso de la Malla (Marque una X)	CERRAMIENTO	ARCOS PORTERIA	X 3

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaad!	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	2,10 x 5,0 m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		Si	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma:			
Firma del Inspector/Verificador: [Firma]			
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]	6/12/24		

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-G
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.	
Fecha de Verificación:	18-12-24
Ubicación:	Vecinal
Inspector que verifica	Cesar Lopez I
Tipo de uso del césped:	Deportivo. Cancha de Futbol
Nro de Lote instalado	JUN 371 - ESTAB.

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuprz	Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	Verde/Blanco	Altura de las fibras: (Medida en cm)	6

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	X		

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):	X		
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:	X		
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: (Caucho)		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: (Suficiente)		Si	
Distribución Uniforme del Relleno: (Uniforme)		Si	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: (Adecuado)		Si	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o baltos):(Si, no)		Si	
Lineas de Marcado: (correcta)		Si	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		Si	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		Si	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		Si	

7. Aprobación y Firma:	
Firma del Inspector/Verificador:[Firma]	
Nombre del Inspector/Verificador: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	18/12/24

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 28 días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGA Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-035

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Palermo Sur

DIRECCIÓN: Carrera 1 Este Calle 49 C sur **LOCALIDAD:** Rafael Uribe

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte total y reemplazo de grama sintética, nivelación de grava en zonas afectadas, suministro de gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo total de grama sintética, suministro e instalación de grava en zonas afectadas, suministro de gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN



2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

1890

ZONA DE LA CANCHA





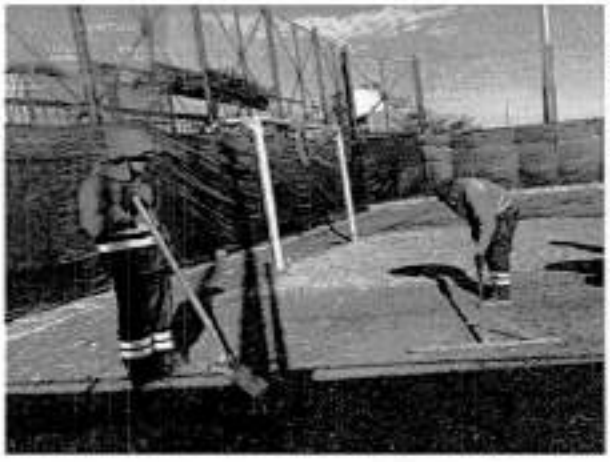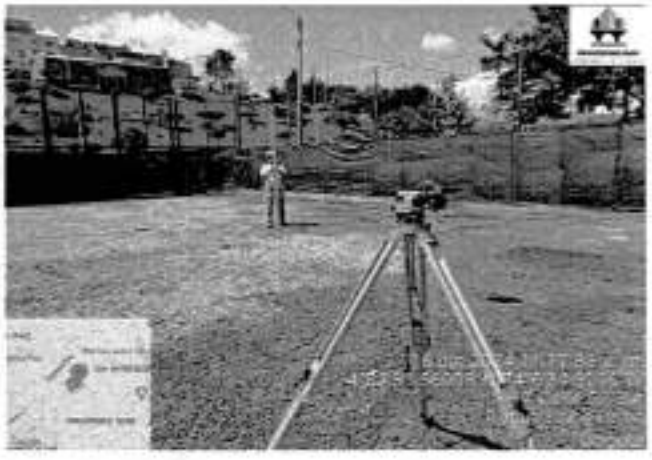




Carrera 1 Este 50-8
#11841
Bogotá
Colombia





















2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte total de grama sintética, suministro e instalación de grava en zonas afectadas, suministro e instalación de grama sintética, suministro e instalación de caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento correctivo a arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	700,00 m2	100,00%
		TOTAL ÁREA INTERVENIDA	700,00 m2	100,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	700	Nueva
12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm (Andamios+Guaya+Acc)	M2	85	Mantenimiento

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409520	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Camilo Andrés Rojas - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3124188213	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2024

(día en letras) *(día en números)* *(mes en letras)* *(Año)*

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

1897

2.2.2. ENERO 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 10 de Enero de 2025
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 2 al 10 de Enero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	ene-25	TITO PABON	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
1	ene-25	MALLAS NM	MALLAS DE ARCOS	1	JG	PUAOS
2						
3						
3						
4						
7						
8						
9						
10						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1896

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 17 de Enero de 2025
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 13 al 17 de Enero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	ene-25	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	5276.88	m2	PUACIS
1	ene-25	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1900	ML	PUACIS
2	ene-25	TITO PABON	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
3	ene-25	MALLAS NM	MALLA PERIMETRAL CERRAMIENTO	186.25	m2	PUACIS
3						
4						
7						
8						
9						
10						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER UNARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO






1894

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 17 de Enero de 2025
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 13 al 17 de Enero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	ene-25	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	5276,88	m2	PUAOS
1	ene-25	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1900	ML	PUAOS
2	ene-25	TITO PABON	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
3	ene-25	MALLAS NM	MALLA PERIMETRAL CERRAMIENTO	186,25	m2	PUAOS
3						
4						
7						
8						
9						
10						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER UNARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO






3898

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	24 de Enero de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 20 al 24 de Enero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	ene-25	TITO PABON	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	ene-25	MALLAS NM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	280	M2	SERVITA
3	ene-25	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5272	KILOS	SERVITA
4	ene-25	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	16	M2	SERVITA
5	ene-25	BEPE	ARENA SILICE	272	KILOS	SERVITA
6	ene-25	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	SERVITA
7	ene-25	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	18	ML	SERVITA
8	ene-25	MALLAS NM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	80	M2	MIRAVALLE F8 1
9	ene-25	MALLAS NM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	80	M2	MIRAVALLE F8 2
10	ene-25	MALLAS NM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	80	M2	MIRAVALLE F5
11	ene-25	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2340	KILOS	MIRAVALLE F8 2
12	ene-25	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	20	M2	MIRAVALLE F8 2
13	ene-25	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1	M2	MIRAVALLE F8 1
14	ene-25	BEPE	ARENA SILICE	340	KILOS	MIRAVALLE F8 2
15	ene-25	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	MIRAVALLE F8 2
16	ene-25	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	20	ML	MIRAVALLE F8 2
17	ene-25	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1500	kilos	MIRAVALLE F8-1
18	ene-25	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1000	KILOS	MIRAVALLE F5
19	ene-25	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	120	CANECAS	PUACOS
20	feb-25	MALLAS NM	MALLAS PARA ARCOS	3	JG	FRAGUA

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1899




23 ene. 2025 9:49:00 a. m.
52° NE
Usme
Bogotá
Altitude:2694.0m
Speed:2.2km/h


31 ene. 2025 2:04:30 p. m.
35° NE
Usme
Bogotá
Altitude:2700.2m
Speed:0.0km/h


23 ene. 2025 10:17:02 a. m.
83° E
Usme
Bogotá
Altitude:2701.7m
Speed:0.3km/h



1900

Remisión No.
16

CERTIFICADO RUCOM No. RUCOM-2021080115500

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	SR. JUAN MANUEL	28/01/2025	BOGOTA
Teléfono	Dirección	E-Mail	Orden de compra No.	
3134466429	BOGOTA			
Vehiculo	Placas/Modelo	Conductor- arl	Cédula	
CAMION	XFJ743	SAIR EDUARDO BARRETO	1056928731	

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARE12	ARENA SÍLICE MALLA 12-30	Toneladas	14		

Despachado por:	Recibido por:	TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermúdez Molina - Comercial. Teléfono: 57 311 2226644 – 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Materiales y Suministros BePe SAS Nit. 900.708.640-9
Dirección: Cle. 64A No. 52 – 33 bl 7 ap 903 Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: bepe_sas@yahoo.es

Powered by CamScanner

1 de 1

Remisión No.
17

CERTIFICADO RUCOM No. RUCOM-20210801195G0

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	SR. JUAN MANUEL	28/01/2025	BOGOTA
Teléfono	Dirección	E-Mail	Orden de compra No.	
3134668429	BOGOTA			
Vehículo	Placas/Modelo	Conductor- arl	Cédula	
CAMION	SZX719	YEMERSON FONSECA	1056930762	

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARE12	ARENA SÍLICE MALLA 12-30	Tonelada	13		

Despachado por:	Recibido por:	TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermúdez Molina - Comercial. Telefono: 57 311 2226644 – 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Materiales y Suministros BePe SAS Nit. 900.708.640-9
Dirección: Clle. 64A No. 52 – 53 bl 7 ap 903 Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: bepe_sas@yahoo.es

Powered by CamScanner

1902

Remisión No.
18

CERTIFICADO RUCOM No. RUCOM-202108119568

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	SR. JUAN MANUEL	28/01/2025	BOGOTA
Teléfono	Dirección	E-Mail	Orden de compra No.	
3134466429	BOGOTA			
Vehículo	Placas/Modelo	Conductor- art	Cédula	
CAMION	MYW891	YEISON GUIO	1056929915	

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARE12	ARENA SÍLICE MALLA 12-30	Tonelada	17		

Despachado por:	Recibido por:	TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermúdez Molina - Comercial. Teléfono: 57 311 2228644 – 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Materiales y Suministros BePe SAS Nit. 900.708.640–9
Dirección: Cll. 64A No. 52 – 53 bl 7 ap 903 Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: bepe_sas@yahoo.es

Powered by CamScanner

Remisión No.
19

CERTIFICADO RUCOM No. RUCOM-2021080119560

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	SR. JUAN MANUEL	28/01/2025	BOGOTA
Telefono	Dirección	E-Mail	Orden de compra No.	
3134468429	BOGOTA			
Vehiculo	Placas/Modelo	Conductor- arl	Cedula	
CAMION	SXU792	JAVIER AYALA	1050938532	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARE12	ARENA SÍLICE MALLA 12-30	Tonelada	13		

Despachado por:	Recibido por:	TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermúdez Molina - Comercial. Teléfono: 57 311 2220044 – 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Materiales y Suministros BePe SAS Nit. 900.708.640-9
Dirección: Clle. 64A No. 57 – 53 M 7 ap 903 Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: bepe_sas@yahoo.es

Powered by CamScanner

Remisión No.
21

CERTIFICADO RUCOM No. RUCOM-2021080119560

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	SR. JUAN MANUEL	30/01/2025	BOGOTA
Teléfono	Dirección	E-Mail	Ordes de compra No.	
3134666429	BOGOTA			
Vehiculo	Placas/Modelo	Conductor- ari	Cédula	
CAMION	XFJ743	SAIR EDUARDO BARRETO	1056928731	

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARE12	ARENA SÍLICE MALLA 12-30	Tonelada	11		

Despachado por:	Recibido por:	TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermúdez Molina - Comercial. Teléfono: 57 311 2226644 – 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Powered by CamScanner

	BOGOTA			

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1				11		

Despachado por	Recibido por		
		TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
		VALOR TOTAL	$ -

Materiales y Suministros BePe SAS Nit. 900.708.640-9

Powered by CamScanner

Remisión No.
23

CERTIFICADO RUCOM No. RUCOM-2021088119560

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	SR. JUAN MANUEL	30/01/2025	BOGOTA
Telefono	Dirección	E-Mail	Orden de compra No.	
3134400429	BOGOTA			
Vehiculo	Placas/Modelo	Conductor- arl	Cédula	
CAMION	SZX719	YEMERSON FONSECA	1056938762	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARE12	ARENA SÍLICE MALLA 12-30	Tonelada	11		

Despachado por:	Recibido por:	TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermúdez Molina - Comercial. Teléfono: 57 311 2226644 – 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Materiales y Suministros BePe SAS Nit. 900.708.640–9
Dirección: Cle. 94A No. 53 – 53 of 7 ap 903 Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: bepe_sas@yahoo.es

Powered by CamScanner

1907

Remisión No
22

CERTIFICADO INVIMA No. RUCOM 2024045119583

Nit	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
901032192-6	INGENIERIA EVE SAS	SR. JUAN MANUEL	30/01/2025	BOGOTA
Teléfono	Dirección	E-Mail	Orden de compra No.	
3134916429	BOGOTA			
Vehículo	Placa/Modelo	Conductor/a	Cédula	
CAMION	SXI375J	JAVIER AYALA	1056026532	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AM-12	ARENA DE RIO MALLA 12-30	Tonelada	11		

Despachado por:	Recibido por:		
		TOTAL	$ -
		DESCUENTO	$ -
		SUBTOTAL	$ -
		IVA 19%	$ -
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Remisión, favor contactar a: Mauricio Bermudez Molina - Comercial. Teléfono: 57 311 2226641 - 57 1 759 0513		VALOR TOTAL	$ -

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los _31_ días del mes de _Enero_ de _2025_., se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por _INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD_, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 01-023

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Servitá

DIRECCIÓN: Carrera 7H Calle 165 **LOCALIDAD:** Usaquén

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)			
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)	
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

















2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 6217m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	16,00 m2	0,26%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**16,00 m2**	**0,26%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CID	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Treinta y un (día en letras) | (31) (día en números) | días del mes de Enero (mes en letras) | de 2025 (Año)

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

1912

2.2.3. FEBRERO 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	19/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 07 de Febrero
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 3 al 7 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	3/02/2025	TITO PASION	PINTURA VINILO BLANCO TT	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	3/02/2025	MALLAS NM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	30	M2	MARRUECOS
3	3/02/2025	CU PERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	20	M2	MARRUECOS
4	3/02/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	MARRUECOS
5	3/02/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	18	ML	MARRUECOS
6	3/02/2025	MALLAS NM	MALLAS PARA ARCOS	1	JG	MARRUECOS
7	6/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2468	KILOS	MARRUECOS
8	6/02/2025	BEPE	ARENA SILICE	540	KILOS	MARRUECOS
9	7/02/2025	CU PERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	144,51	M2	BURGOS BRITALIA
10	7/02/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	5	CANECA	BURGOS BRITALIA
11	7/02/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	180	ML	BURGOS BRITALIA

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC


EDWIN JAVIER LIZARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO





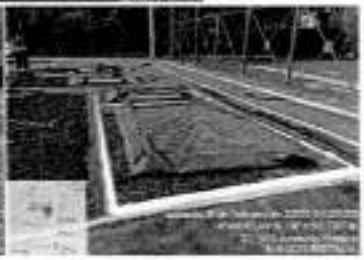

1999

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	10/11/2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 14 de febrero
RESPONSABLE: Juan el Sabogal
PERIODO: Del 10 al 14 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	10/02/2025	TITO JABON	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	10/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2500	KILOS	BURGOS BRITALIA
3	10/02/2025	BRPE	ARENA SILICE	2500	KILOS	BURGOS BRITALIA
4	10/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	4000	KILOS	BURGOS BRITALIA
5	10/02/2025	MALLAS NIVI	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	240	MT	BURGOS BRITALIA
6	10/02/2025	MALLAS NIVI	MALLAS PARA ARCOS	2	JG	BURGOS BRITALIA
7	10/02/2025	CAUCHOS DIBAMBICOS	CAUCHO GRANULAR	10000	KILOS	PUMOS
8	11/02/2025	CUPIEZ	UBRAMA MENOR LANAMIENTO	65	MT	TIBABUYES FB - 2
9	11/02/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	75	ML	TIBABUYES FB - 2
10	11/02/2025	SELLEDO	PEGANTE BICOMPONENTE	3	CANECA	TIBABUYES FB - 2
11	11/02/2025	BRPE	ARENA SILICE	3250	KILOS	TIBABUYES FB - 2
12	11/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	3250	KILOS	TIBABUYES FB - 2

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	FS-T-08
		Version:	1
		Fecha:	30/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 17 de febrero
RESPONSABLE: Daniel Salvagal
PERIODO: Del 17 al 21 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	17/02/2025	TITO PASION	PINTURA VINILO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	21/02/2025	MALLAS MM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	162,5	M2	TIBABUYES FB - 2
3	21/02/2025	MALLAS MM	MALLAS PARA ARCOS	2	JG	TIBABUYES FB - 2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SALVAGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1916

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	30/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 28 de febrero de 2024
RESPONSABLE: Daniel Salcedo
PERIODO: Del 24 al 28 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	24/02/2025	TITO PAGON	PINTURA VINILO BLANCO T1	56	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	25/02/2025	MALLAS Y UNIFORMES	CINTA DE UNION	20	MT.	SAN ANDRES F11
3	25/02/2025	MILLICO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	SAN ANDRES F11
4	26/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	SAN ANDRES F11
5	26/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	8000	KILOS	SAN ANDRES F11 F5
6	28/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	6000	KILOS	SUBA CAYMA SAN ANDRES
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO







CONSTRUCTORA INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-02-25			
Ubicación:	Tibabuyes, TB-2			
Inspector que verifica	Oscar J Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occ)	Occ - Orient.			
Nro de certificado de calidad del Hilo	12241-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2. Jg.

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaco	Material de la Red	Nylon # 4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	2,10 x 3 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si.	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Ok
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente: [Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo	
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente: [Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

Scanned with CamScanner

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-G
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	25/02/2025.
Ubicación:	Parque San Andres F.11
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo, campo de Futbol.
Nro de Lote instalado	24N321 - FBIRS

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Supra.	Material del Cesped	Mantenimiento polietileno
Color del Césped:	Verde/blanco Negro	Altura de las fibras: (Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	✓		

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:	X		Pegue Cesped existente Verde
Unión de Paños (Costuras):		Si Si	
Pegado de Costuras:	X	Si	
Fijación a la Base:			
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:	X	-	Pegue Cesped Verde existente

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: (Caucho)		Ok	
Cantidad de Relleno Aplicado: (Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: (Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: (Adecuada)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):(Si, no)		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		Ok.	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario): Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

Scanned with CamScanner

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	24-02-25			
Ubicación:	Tibabuyes, TB-2.			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Beltran			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ. Occi)	Occidental			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-037			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Incazco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	167,5 m².

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balon) cumple?	X		
6. Aprobacion y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo	
Fecha de Aprobacion: [Fecha]			
6. Aprobacion y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 11-058

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Burgos Britalia 1

DIRECCIÓN: Carrera 73 Calle 160 **LOCALIDAD:** Suba

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

















2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 1050m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	141,78 m2	13,50%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	141,78 m2	13,50%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B ENEL VANTI

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPED

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025

(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

Entrega: Recibe:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área **Técnica**
Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad **IDRD**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 11-058

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Burgos Britalia 2

DIRECCIÓN: Carrera 73 Calle 160 **LOCALIDAD:** Suba

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 25 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

1925

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA













2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	1.050,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	1.050,00 m2	100,00%

3926

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	03 Mallas Semiprofes Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213960386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (día en letras) (19) (día en números) días del mes de Febrero (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de Interventoría

Área **Técnica**

Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad **IDRD**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-041

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Marruecos

DIRECCIÓN: Calle 48 P sur Carrera 5L **LOCALIDAD:** Rafael Uribe

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA













2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 1275 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	20,00 m2	1,57%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	20,00 m2	1,57%

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (Indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545587	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102823167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025

(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de Interventoría

Área **Técnica**

Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad **IDRD**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Miravalle F6

DIRECCIÓN: Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA









2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 1530m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	20,00 m2	1,48%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	20,00 m2	1,48%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Codigo CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2	Nueva
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A.	INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica)	Folios:
Comentarios:	No Aplica	
N.A.	ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)	
	E.A.A.B **ENEL** **VANTI**	
	UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**	
Comentarios:	No Aplica	
N.A.	MANUAL DE MANTENIMIENTO	
Comentarios:	No aplica	
N.A.	OTROS (Indicar cuales)	
Comentarios:	No aplica	

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve	(19)	días del mes de	Febrero	de	2025
(día en letras)	(día en números)		(mes en letras)		(Año)

Entrega: Recibe:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de Interventoría
Área **Técnica**
Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad **IDRD**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Miravalle F5-1

DIRECCIÓN: Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA
















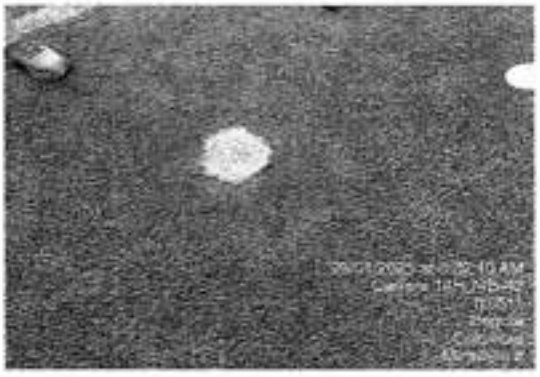

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 600m2). Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	1,00 m2	0,17%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	1,00 m2	0,17%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13549	03 Mallas Semiprofes.Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoria	Consorcio Santa Teresa 28	3213960386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025

(día en letras) *(día en números)* *(mes en letras)* *(Año)*

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de Interventoría

Área **Técnica**

Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad **IDRD**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Miravalle F5-2

DIRECCIÓN: Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA









2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL : Mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	600.00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	600,00 m2	100,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13549	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A.	INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica)	Folios:
Comentarios:	No Aplica	
N.A.	ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)	
	E.A.A.B **ENEL** **VANTI**	
	UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**	
Comentarios:	No Aplica	
N.A.	MANUAL DE MANTENIMIENTO:	
Comentarios:	No aplica	
N.A.	OTROS (Indicar cuales)	
Comentarios:	No aplica	

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213960386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025

(día en letras) *(día en números)* *(mes en letras)* *(Año)*

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área **Técnica**
Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad IDRD

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 10 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Áreas de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGA Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-090

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintetica Parque Pijaos

DIRECCIÓN: Av Cra 10 Calle 35 sur **LOCALIDAD:** Rafael Uribe

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte total y reemplazo de grama sintética, nivelación de zonas afectadas, suministro de gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)	
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE 2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 25 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE 2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)					

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo total de grama sintética, suministro de gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA


















PARQUE PIJAOS


lunes, 3 de febrero de 2025 10:57
PARQUE PIJAOS


PARQUE PIJAOS


jueves, 6 de febrero de 2025 13:33
34 Sur-35 Carrera 10
PARQUE PIJAOS


PIJAOS


PIJAOS





2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte total de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, suministro e instalación de caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento correctivo a arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	5.276,88 m2	100,00%
		TOTAL ÁREA INTERVENIDA	**5.276,88 m2**	**100,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UNO	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	5276,88	Nueva
12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
10581	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	2	Nueva
13549	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	146,25	Mantenimiento

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142613079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diez	(10)	días del mes de	Febrero	de	2025
(día en letras)	*(día en números)*		*(mes en letras)*		*(Año)*

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

2.2.4. MARZO 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	7 de Marzo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 3 al 7 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	3/03/2025	INVERSIONES LOS I SAS	ARENA DE RIO	36	M3	MARSELLA NATURAL
2	4/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO 60MM	40	M2	CARMELO F11
3	4/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	2	CANECA	CARMELO F11
4	4/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	40	ML	CARMELO F11
5	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA CERRAMIENTO	215,25	M2	CARMELO F11
6	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA CERRAMIENTO	82,5	M2	CARMELO F5
7	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	CARMELO F11
8	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	CARMELO F5
9	5/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	CARMELO F11 top dressing
10	5/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	CARMELO F5 top dresing
11	5/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	720	KILOS	CARMELO F11 correctivo
12	5/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	720	KILOS	CARMELO F11 correctivo
13	5/03/2025	TITO PABON	VINILO TIPO 2	50	CANECAS	CAMPOS NATURALES
14	7/03/2025	MALLAS NM	MALLA ARCOS CAL 8	1	JUEGO	SUBA GAVILANES


III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

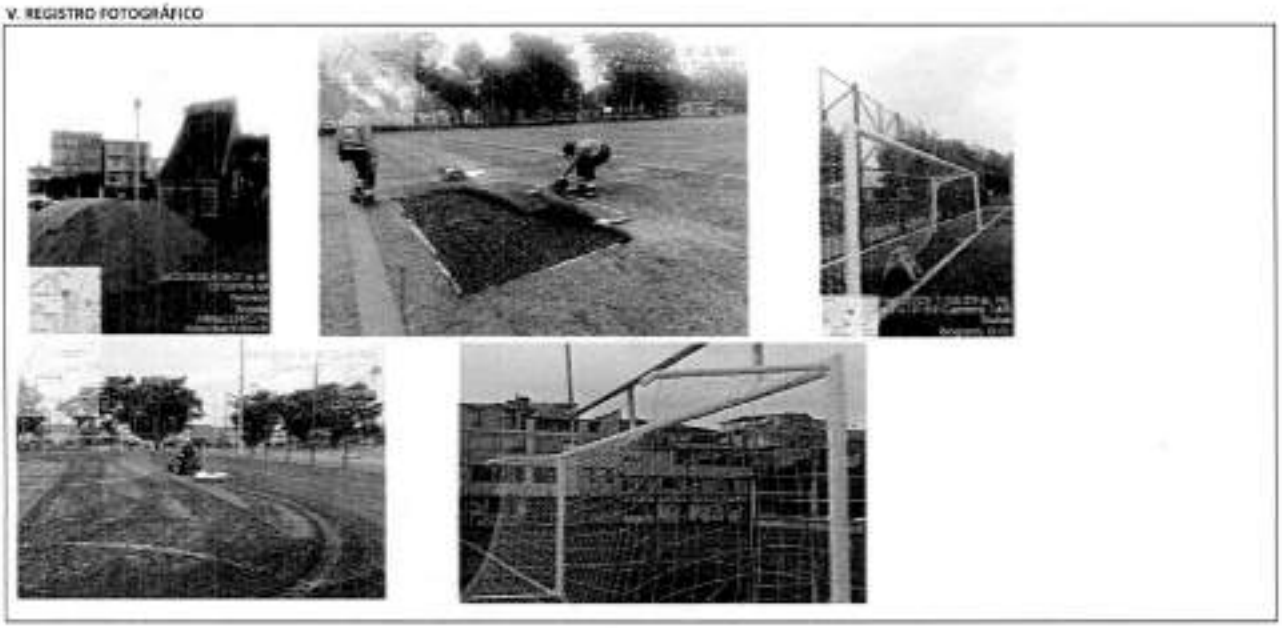

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 14 de Marzo de 2025
RESPONSABLE: Damir Sabogal
PERIODO: Del 10 al 14 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	VILLAS DE MADRIGAL Top d
2	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	72	KILOS	VILLAS DE MADRIGALCorr
3	11/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	72	KILOS	VILLAS DE MADRIGALCorr
4	11/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	4	M2	VILLAS DE MADRIGAL
5	11/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	VILLAS DE MADRIGAL
6	11/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	20	ML	VILLAS DE MADRIGAL
7	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	101	M2	VILLAS DE MADRIGAL
8	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	VILLAS DE MADRIGAL
9	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	FLORENCIA TRONQUITOS Top
10	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	TRONQUITOS correctivo
11	11/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	TRONQUITOS correctivo
12	11/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1,6	ML	TRONQUITOS
13	11/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	TRONQUITOS
14	11/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1,6	ML	TRONQUITOS
15	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	199,5	M2	TRONQUITOS
16	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	TRONQUITOS
17	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1500	KILOS	EUROPA Top Dressing
18	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	EUROPA correctivo
19	11/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	EUROPA correctivo
20	11/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1,6	ML	EUROPA
21	11/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	EUROPA
22	11/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1,6	ML	EUROPA
23	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	122,1	M2	EUROPA
24	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	EUROPA
25	11/03/2025	INVERSIONES LOS I SAS	ARENA DE RIO	36	M3	ALQUERÍA NATURAL

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1947

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 21 de Marzo de 2025
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 17 al 21 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	19/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	ARENA DE RIO	36	M3	GAITANA NATURAL
2	20/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	NORMANDIA Corr.
3	20/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	NORMANDIA Corr.
4	20/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	3000	KILOS	NORMANDIA Top dressing
5	20/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	3	ML	NORMANDIA
6	20/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	NORMANDIA
7	20/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	3	ML	NORMANDIA
8	20/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	MARSELLA FS
9	20/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1	ML	MARSELLA FS
10	20/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	MARSELLA FS
11	20/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1	ML	MARSELLA FS
12	20/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMINENTO	194	M2	MARSELLA FS
13	20/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	MARSELLA FS
14	21/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMINENTO	95	M2	NORMANDIA
15	21/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	NORMANDIA
16	21/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	3000	KILOS	VILLA DE LOS SAUCES
17	21/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	HAYUELOS FS
18	21/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	HAYUELOS FS
19	21/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	HAYUELOS FB
20	21/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 151515	100	KILOS	ALQUERIA NATURAL
21	21/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 181818	100	KILOS	ALQUERIA NATURAL

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1098

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	30/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 28 de Marzo de 2025
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 24 al 28 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	26/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	2	ML	HAYUELOS FS
2	26/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	HAYUELOS FS
3	26/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	2	ML	HAYUELOS FS
4	26/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	HAYUELOS FB
5	26/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	3	ML	HAYUELOS FB
6	26/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	HAYUELOS FB
7	27/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1800	KILOS	LOMBARDIA
8	27/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	6	ML	LOMBARDIA
9	27/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	LOMBARDIA
10	27/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	6	ML	LOMBARDIA
11	28/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 151515	150	KILOS	GAITANA NATURAL
12	28/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 181818	150	KILOS	GAITANA NATURAL


III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CIME

EDWIN JAVIER LIMARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

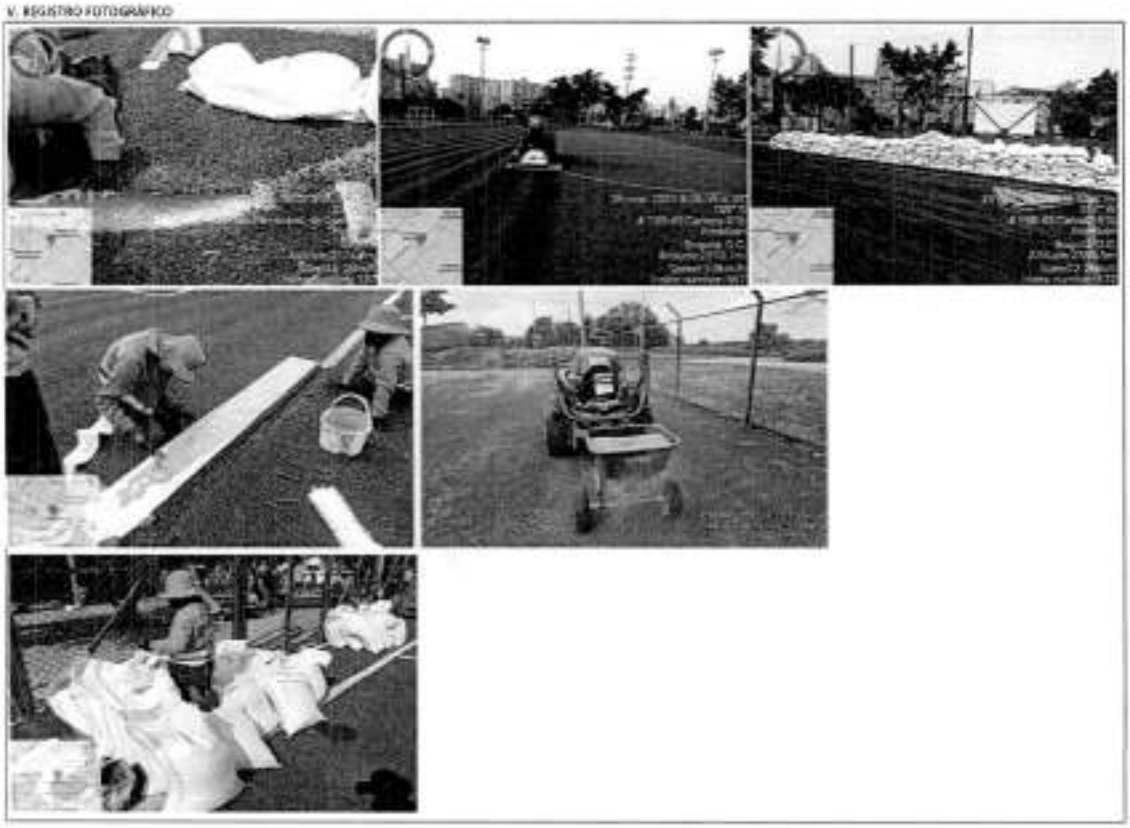

1099

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.	
Fecha de Verificación:	06/03/2025
Ubicación:	PARQUE El Carmelo F11
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL
Nro de Lote instalado	24M32L-E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	LUDEZZ	Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	VERDE/BLANCO	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Lineas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	07 - 03 - 25			
Ubicación:	Suba Cafam Ocvitanes			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Baena			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	-N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274 -027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X 90

2. Detalles de las redes			
Marca	Tronroco!	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7.20 x 2,4 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	18-03-25			
Ubicación:	Carmelo II F11			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bonal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occidente			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	~	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tregarcol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	215.25 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		Si	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	✓		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	✓		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	11-03-2025
Ubicación:	PARQUE VILLAS DE MADRIGAL
Inspector que verifica	Oscar Horacio Acevedo Borrero
Tipo de uso del césped:	DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL
Nro de Lote instalado	24N322 - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	CUPERZ	Material del Cesped	MONOFILAMENTO POLETILENO
Color del Césped:	VERDE / BLANCO	Altura de las fibras: [Medida en cm]	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		SI	
Compactación de la Base:		SI	
Pendientes para Drenaje:		SI	
Verificación de Drenaje Adecuado:		SI	
Tipo de Base Utilizada:		SI	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		SI	
Unión de Paños (Costuras):		SI	
Pegado de Costuras:		SI	
Fijación a la Base:		SI	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		SI	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:			

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho]		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente]		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme]		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado]		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	7/10/3/2025
Ubicación:	PARQUE FLORENCIA TRONQUITOS
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Reinal
Tipo de uso del césped:	DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL
Nro de Lote instalado	24N324 - C81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	CUPED2	Material del Cesped	HONDEILAMENTO POLIETILENO
Color del Césped:	Blanca	Altura de las fibras: [Medida en cm]	

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		SI	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:			

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho]		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente]		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme]		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado]		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-MI
		Version	2
		Fecha	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	11/03/2026
Ubicación:	PARQUE EUROPA F5
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo Campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24N32L - E51AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca		Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		SI	
Compactación de la Base:		SI	
Pendientes para Drenaje:		SI	
Verificación de Drenaje Adecuado:		SI	
Tipo de Base Utilizada:		SI	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		SI	Pegue Sramo demarcación
Unión de Paños (Costuras):		SI	
Pegado de Costuras:		SI	
Fijación a la Base:		SI	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		SI	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		SI	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: (Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-05-25			
Ubicación:	Cancha 7+1 Antonio Nariño Bernal			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Norte - Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224 - 027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 de

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivantrucol	Material de la Red	Nylon #6
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	7.30 x 2.50 m 1/5

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria,		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
5. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

1956

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Carmelo F8			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tramco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	82.50 m2

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	x		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	x		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INFOVIARIO	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Villas del Madrigal			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bonal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	On - Occi - N - S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Ingrecol	Material de la Red	Nylon PE
Tamaño de la malla	NA	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	101 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Villas del Madrigal			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Cint			
Nro de certificado de calidad del Hilo	122M-073			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 juego.

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	5 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	21-03-25			
Ubicación:	Floresta Tramontes			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Nort - Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	4774-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tramico	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	199,50 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	x		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	x		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	22/03/2025
Ubicación:	Parque villa de los sauces
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo Campo de futbol
Nro de Lote instalado	24N32V - 651AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Lupere	Material del Cesped	Monofilamento-Polietileno
Color del Césped:	Blanco/verde	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	X		

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:	X		Pegue de grama existente
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:	X		
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:	X		Pegue de grama existente

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)			
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)			
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)			
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)			

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]			
Líneas de Marcado: (correcta)			
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)			
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)			
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada			

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	Floresia - Tramo 1			
Inspector que verifica	Oscar - Mauricio - Alexis Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ. Occi)	Occ - Occ			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Inmaculada	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	5 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO MANTENIMIENTO	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	Carmelo F8			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Norte- Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 juego

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzaco	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	5 x 2.10 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INTERVIAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	La Europa F5			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Peatonal			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	OK	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tentacul	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	122.50 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		OK	
Estado de cuerdas o amarres		OK	
Presencia de Roturas en la malla		N/A	
Tension de la Red		OK	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		OK	
Estado de sistema de fijacion		OK	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto.				
Fecha de Verificación:	14-03-25			
Ubicación:	La Europa 75			
Inspector que verifica	Oscar . A correcto √Bien			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Nor - Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	122M-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaccl	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	3x 2m Ts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente: [Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente: [Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO MIROVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	25-03-25			
Ubicación:	Normandia			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	U-5			
Nro de certificado de calidad del Hilo	12.24 -027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1,80

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaza	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7 x 2.50 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	25-03-25			
Ubicación:	Yarmenia			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Portería : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Occ			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-037			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tomaco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	95 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

3967

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	26-03-25			
Ubicación:	Marsella FS			
Inspector que verifica	Oscar. Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Portería : (Norte , Sur , Occ. Occi)	O-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 Jg

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaflex	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	NA	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3x2 mts.

3. Condicion de la Red Instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	26-03-25			
Ubicación:	Marsella FS			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	1224-037 Posterior			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Ineltrado	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	1.94 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	
