Boyacá Contratación
PUBLICADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE CINTUZ
Fecha 20/01/2026

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	2		FECHA:	10	de	SEPTIEMBRE	de	2025			
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2025	AL	31	de	AGOSTO	de	2025

CONTRATO No:	**2070**	DE	2025	REGISTRO BP Y P No	**2024004150388**

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

CALLE 25 ENTRE PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y MARQUETALIA LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO RYP - NIT 901.963.394-7	**LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ - C.C. 1.049.603.584**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL LAFER - NIT 901.941.593-1	**OSCAR IVÁN PINZÓN SANCHEZ - C.C. 1.049.605.512**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
-	NO APLICA	$ 0.00	-
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

VALOR INICIAL:	$ 7,166,268,115.93	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 7,166,268,115.93

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31	de	DICIEMBRE	de	**2025**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	de	DICIEMBRE	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**27.81%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**0.95%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**2.84%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	96-44-101198205	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO						FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd mm aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA						
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa							
CUMPLIMIENTO DEL CONTATO	15	7	2025	7	7	2026	$ 1,433,253,623.19						
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15	7	2025	7	7	2026	$ 2,149,880,434.78						
INDEMNIZACIONES	15	7	2025	7	1	2029	$ 1,433,253,623.19						
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS						$ 2,149,880,434.78						

No PÓLIZA	96-40-101070552	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO						FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd mm aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA						
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa							
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15	7	2025	7	1	2026	$ 711,750,000.00						
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15	7	2025	7	1	2026	$ 711,750,000.00						
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15	7	2025	7	1	2026	$ 711,750,000.00						

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO		REGULAR	**X**	MALO		PÉSIMO	
Descripción: En visitas de campo, se ha registrado lluvias esporadicas durante el periodo comprendido en el presente informe.							

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO CONTRATO NO.2103 DE 2025	8	7	2025
ACTA DE INICIO CONTRATO NO.2070 DE 2025	15	7	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Excavación para cajas y localización de cruces electricos
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Mejoramiento en afirmado para base de cajas eléctricas
CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	
CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES	
ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PMT	
REVISIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA Y SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	
ASISTENCIA A COMITÉS Y REUNIONES CON LA COMUNIDAD	

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES MANUALES	100%	NO APLICA
CANGURO	COMPACTACIÓN MATERIAL AFIRMADO	100%	NO APLICA

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
MATERIAL GRANULAR TIPO AFIRMADO	CANTERA MASTERCAD	-
ARENA	CANTERA MASTERCAD	-
GRAVILLA	CANTERA MASTERCAD	-
CEMENTO	ARGOS	-

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
-	-	-	NO APLICA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO APLICA		-
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN RADICADO ACTAS PARCIALES DE COBRO		-
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
01-ago-2025	VEEDURÍA CIUDADANA	REMISIÓN INFORMACIÓN SOLICITADA EN COMITÉ	
01-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	REMISIÓN AUTORIZACIÓN PARA APROBACIÓN DE ANTICIPO	
01-ago-2025	CONSORCIO RYP	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME PLAN DE	
01-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	AVAL Y RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025	
06-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.03	
11-ago-2025	CONSORCIO RYP	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO.01	
11-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.04	

12-ago-2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
12-ago-2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS POTENCIALMENTE MALICIOSOS	
13-ago-2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	
15-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
15-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	ACLARACIÓN CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
19-ago-2025	CONSORCIO RYP	REITERACIÓN No.01 OBSERVACIONES MENSUAL No.01	
19-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.05	
22-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO OBSERVACIONES A SOLICITUD MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025	
25-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.06	
28-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	NOTIFICACIÓN INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025	
28-ago-2025	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	SOLICITUD COMITÉ DE OBRA	
29-ago-2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	REMISIÓN OFICIO CTO 2070-CONS-RYP-39-2025	

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	PERIODO HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
LAURA LIZETH LACHE TAPIAS	1.049.614.691	X	X	X	1	8	2025	15	8	2025
JUAN PABLO CASTIBLANCO PINTO	1.052.379.237	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
ALEX CIGIFREDO SALDOVAL PINZÓN	79.577.759	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
DIEGO FERNANDO SUAREZ OCAMPO	1.053.776.001	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
CRISTIAN ANDRES CORREDOR TAPIAS	1,049,658,635	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
LUIS ALBERTO GORDILLO	6.765.918	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
EDWIN FERNANDO ECHEVERRIA CUERVO	1.049.604.684	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR	79.969.466	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO	4.179.386	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1,049,603,584	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	7,181,346	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
MARIA FERNANDA ROMERO CASTILLO	1,015,474,192	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
YENNY PAOLA MEDINA BERNAL	33,366,983	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
EMILIO BLADIMIR PANQUEVA	7,318,490	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
IVAN DARIO SICHACA GÁMEZ	1,049,644,688	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
OSCAR MAURICIO SUAREZ AVELLA	4,192,543	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
JORGE ELIECER SUAREZ AVELLA	1,053,610,948	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
LUIS ALFONSO AVELLA OCHOA	1,007,305,445	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
DOMINGO AVELLA RAMOS	74,359,038	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
JHON GUILLERMO DIAZ SAAVEDRA	1,058,274,476	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
JORGE LUIS BENAVIDES GUERRERO	1,053,608,931	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
BRAYAN ALEXANDER GUERRERO SUAREZ	1,053,606,607	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
GILBERT JAVIER BENAVIDES GUERRERO	1,053,613,359	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
JENNIFER ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SALAMANCA	1,053,611,978	X	X	X	1	8	2025	24	8	2025
JEYSSON ALEXANDER MARTÍNEZ PINZÓN	1,053,615,447	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025
YERSON JAVIER MARTÍNEZ MOLANO	1,054,146,089	X	X	X	1	8	2025	31	8	2025

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO	6.765.918
RESIDENTE DE OBRA	EDWIN FERNANDO ECHEVERRIA CUERVO	1.049.604.684
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN URBANISMO	IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR	79.969.466
PROFESIONAL ELECTRICO O INGENIERO ESPECIALISTA ELECTRICO	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO	4.179.386

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ALEX CIGIFREDO SALDOVAL PINZÓN	79.577.759
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN PABLO CASTIBLANCO PINTO	1.052.379.237
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN URBANISMO	ALEX CIGIFREDO SALDOVAL PINZÓN	79.577.759
INGENIERO ESPECIALISTA ELECTRICO	DIEGO FERNANDO SUAREZ OCAMPO	1.053.776.001

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
El realizó la primer reunión del grupo de gestión social y ambiental	N/A
El contratista realizó dos capacitaciones ambientales por el profesional ofertado	N/A
El contratista garantizó el manejo integral del material de construcción dispuesto en obra	N/A
El contratista mantuvo todas las áreas (oficina, frentes de obra) demarcados y señalizados de acuerdo a los riesgos identificados	N/A
Los residuos derivados de las excavaciones realizadas en este periodo fueron dejadas en obra por el contratista, ya que fueron excavaciones mínimas, de manera señalizada y sin interrumpir los pasos peatonales	N/A
El contratista continúa en obra con puntos ecológicos, los cuales fueron debidamente señalizados, así mismo, el contratista realizó la debida disposición de los residuos con la colaboración de una asociación de recicladores y la empresa de recolección de residuos del municipio.	N/A
El contratista hizo uso del agua proveniente de la vivienda que tienen como bodega y/u oficina, la interventoría validó que dicho consumo se realizara de manera responsable.	N/A
Para este periodo el contratista continuó con el alquiler de una vivienda para uso de bodega, oficina y baño. Adicional, el contratista continúa con el uso de dos baños adicionales, en el área de intervención con el fin de garantizar las necesidades básicas de los colaboradores.	N/A
Se instaló en obra por el contratista, los debidos elementos de atención a emergencias, cerca a los frentes de obra, a fin de garantizar la pronta reacción en caso de situaciones de emergencia.	N/A
El contratista realiza la entrega de las actas de vecindad de las áreas aledañas.	N/A
El contratista continúa en obra con el punto de atención a la comunidad, con el fin de atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad y así generar un canal de comunicación asertivo con la misma.	N/A
Se realizó por parte del contratista la debida evaluación médica de retiro para la colaboradora que se retiró en el periodo.	N/A
Se suministró por parte del consorcio a todos los colaboradores, los debidos epp's que requerían ser repuestos por desgaste.	N/A
El consorcio realizó las debidas inspecciones preoperacionales a las herramientas empleadas en obra y el vehículo disponible para el proyecto.	N/A
Dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones entregado previamente a la interventoría, el contratista realizó las sesiones de sensibilización en materia de sst.	N/A
El contratista mantuvo el orden y aseo en los frentes de obra y la vivienda dispuesta como bodega y oficina.	N/A
Se dio cumplimiento por parte del contratista al plan de manejo de tránsito, el cual ya se encuentra aprobado por la interventoría y secretaria de movilidad.	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
La interventoría continúa promoviendo el uso compartido de un solo vehículo para los desplazamientos del equipo y evitó su uso en trayectos cortos, priorizando medios alternativos.	N/A
Se continúa priorizando por parte del equipo interventor el uso de medios digitales y se limitaron las impresiones a casos necesarios, aplicando criterios de eficiencia y uso racional del papel.	N/A
La interventoría continúa con la separación de residuos en la oficina, con puntos diferenciados para reciclables y no reciclables, y se mantuvo activa la política de manejo responsable de RAEE.	N/A
Se realizó una sesión de sensibilización sobre sostenibilidad en obra, orientada a fortalecer prácticas ambientales entre los colaboradores dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones.	N/A
La interventoría continúa con la oficina cercana a la obra, debidamente dotada y señalizada, así como un vehículo para los desplazamientos requeridos.	N/A
Se continúa empleando por parte del equipo interventor, equipos eficientes energéticamente, como portátiles de bajo consumo, evitando el uso de dispositivos obsoletos.	N/A

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
RESISTENCIA Y LÍMITES	5	8	2025	Ensayo de seguimiento de calidad a Base granular previo a inicio de actividades. No cumple; se
DENSIDAD	8	8	2025	Ensayo efectuado a afirmado. Cumple
RESISTENCIA Y LÍMITES	5	8	2025	Ensayo efectuado a afirmado. Cumple

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO	30	7	2025	Se adjuntan resultados de ensayos descritos en el informe mensual No.01
GRANULOMETRÍA Y LÍMITES	6	8	2025	Cumple con los requisitos de calidad exigidos en la resolución 1524 de 2022
GRANULOMETRÍA Y LÍMITES	19	8	2025	Cumple con los requisitos de calidad exigidos en la resolución 1524 de 2022
ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO	4	8	2025	Se adjuntan resultados de ensayo
ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO	13	8	2025	Se adjuntan resultados de ensayo

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CANTERA DE AGREGADOS GRANULARES	CANTERA MASTERCAD	9.7	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
ACTA DE COMITÉ NO.09	1	8	2025	
ACTA DE COMITÉ NO.10	14	8	2025	
ACTA DE COMITÉ NO.11	15	8	2025	
ACTA DE COMITÉ NO.12	15	8	2025	
ACTA DE COMITÉ NO.13	15	8	2025	

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0	30	4	2025	7	7	2025	
Informe de Interventoría No. 1	8	7	2025	31	7	2025	

OBSERVACIONES:

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	ANEXO NO.06
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	11
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	9
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	10
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	ANEXO NO.01
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	-
Amortización del anticipo	N.A.	-
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	26
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	-
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	44
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	YA SE RADICO	-
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	49
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	-
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	44
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	ANEXO NO.06
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	ANEXO NO.06
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	-
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	ANEXO NO.06
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	ANEXO NO.06
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	ANEXO NO.06
Generales		
Registro fotográfico	SI	41
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	51

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:		FIRMA:	
	Interventor / RL. Interventoría		Interventor / Director de interventoría
NOMBRE:	LESLY JHOANA OJEDA SANCHEZ	NOMBRE:	ALEX CIGIFREDO SANDOVAL

INFORME N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. 2103 DE 2025

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

UNION TEMPORAL

LAFER

CORTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL LAFER
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2025

VERSIÓN NO.0.0

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Gobernación de Boyacá

CORTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTADO POR: ALEX CIGIFREDO SANDOVAL PINZÓN

UNIÓN TEMPORAL LAFER
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2025

LISTA DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

REVISIONES

ESTADO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
INTERVENTORÍA	ALEX CIGIFREDO SANDOVAL PINZÓN	10 de septiembre de 2025	

UNION TEMPORAL
LAFER

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. LOCALIZACIÓN 8
1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

2. RESUMEN GENERAL CONTRATOS 9
2.1 RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2103 de 2025 9
2.2 RESUMEN CONTRATO DE OBRA NO. 2070 de 2025 10
2.3 CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO No.2103 DE 2025 10

3. GARANTÍAS 11
3.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2103 DE 2025 11
3.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA NO. 2070 de 2025 12

4. AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA 14
4.1 BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO 23
4.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 39

5. CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD 42

6. ANÁLISIS EJECUTADO VS PROGRAMADO 44
6.1 AVANCE FINANCIERO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 44
6.2 RESUMEN ACTAS PARCIALES DE OBRA 44
6.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 45
6.4 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 45
6.4.1 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 45

7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA 46
7.1 ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ 47
7.2 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 49
7.3 ESTADO DEL CLIMA 52

8. SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE PMT 53
8.1 ALCANCE 53
8.2 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 53
8.3 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PMT 54
8.3.1 SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 54
8.3.2 MANEJO DE FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL 55
8.3.3 PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL PMT 55
8.3.4 REGISTRO DE INCIDENTES 55
8.3.5 RESULTADOS DE VERIFICACIÓN 55
8.3.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO 57

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59

10. ANEXOS 60

UNION TEMPORAL LAFER

LISTADO DE ILUSTRACIONES

	Pág.
Ilustración 1. Ubicación Proyecto	8
Ilustración 2. Seguimiento a programación contrato No.2070 de 2025	46

UNION TEMPORAL
LAFER

LISTADO DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1: Resumen General Contrato No. 2103 De 2025	9
Tabla 2: Resumen General Contrato No. 2070 De 2025	10
Tabla 3: Relación De Pólizas Contrato De Interventoría No. 2103 De 2025	11
Tabla 4: Relación De Pólizas Contrato De Obra No. 2070 De 2025	12
Tabla 5. Relación ensayos de calidad	44
Tabla 6: Resumen Financiero Contrato	46
Tabla 7. Relación de correspondencia generada	51
Tabla 8. Relación de correspondencia recibida	51

UNION TEMPORAL LAFER

1. LOCALIZACIÓN

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


El proyecto se encuentra localizado en el municipio de paipa departamento de Boyacá, más específicamente sobre la calle 25. Paipa está localizado en el valle de Sogamoso, uno de los valles internos más importantes de la región andina, en la parte centro oriental del País y noroccidental del departamento de Boyacá a 2525 mts sobre el nivel del mar, dista aproximadamente 184 Km de Santafé de Bogotá y 40 Km de Tunja.

La calle 25 cuenta con un uso predominante de comercio y servicios turísticos, compatible con usos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, la vía se convierte en el corredor principal de acceso al lago de Sochagota, en límites con la vereda la Esperanza y la vereda Romita, atravesando los barrios Villa Panorama y Villa Jardín.

El tramo por intervenir se encuentra delimitado entre el rio Chicamocha y hasta el límite del casco urbano del municipio, en límite natural con el canal de desagüe del lago Sochagota vereda la Esperanza.

El proyecto comprende el mejoramiento del espacio público Mediante la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas de la calle 25 entre el puente del rio Chicamocha y el puente de Marquetalia en el municipio de Paipa-Boyacá. Esta calle tiene un uso predominante de comercio y servicios turísticos, compatible con usos de vivienda unifamiliar y multifamiliar. Lo que la convierte en el corredor principal de acceso al Lago Sochagota.

Ilustración 1. Ubicación Proyecto

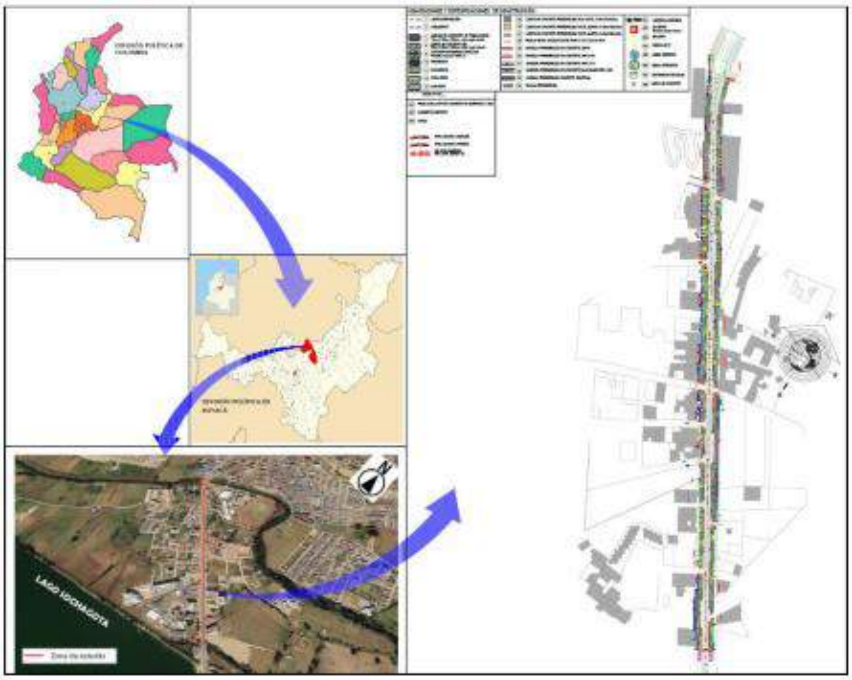

Fuente: Secretaría de infraestructura departamental

2. RESUMEN GENERAL CONTRATOS

En el presente capítulo se presentan los procesos administrativos generados durante la ejecución del contrato desde su inicio hasta su estado actual.

2.1 RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2103 de 2025

Tabla 1: Resumen General Contrato No. 2103 De 2025

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NUMERO DE CONTRATO:	2103 DE 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT: 891.800.498-1
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LAFER R/L LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ NIT: 901.941.593-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($530.566.747,90)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	8 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración Propia

Nota: No se relacionan actos administrativos del contrato 2103 de 2025 suscritos durante el periodo comprendido en el presente informe, por lo cual, la información presentada anteriormente podrá ser consultada en el **ANEXO NO.1** del **INFORME MENSUAL NO.01**.

2.2 RESUMEN CONTRATO DE OBRA NO. 2070 de 2025

Tabla 2: Resumen General Contrato No. 2070 De 2025

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DE CONTRATO:	2070-2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
	NIT: 891.800.498-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
	LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
	NIT: 901.963.394-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR INICIAL	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($7.166.268.115,93),
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración Propia

Nota: No se relacionan actos administrativos del contrato No.2070 de 2025 suscritos durante el periodo comprendido en el presente informe, por lo cual, la información presentada anteriormente podrá ser consultada en el **ANEXO NO.2** del **INFORME MENSUAL NO.01**.

2.3 CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO No.2103 DE 2025

Durante el periodo comprendido en el presente informe se efectuó un cambio de profesional por parte del contratista de interventoría. La ingeniera **LAURA LIZETH LACHÉ TAPIAS** manifestó que, por motivos de índole personal, no podría continuar desempeñando sus funciones como **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**. En consecuencia, mediante oficio CTO.2103/2025-034 del 15 de agosto de 2025, se notificó a la supervisión del Contrato de Interventoría No. 2103 de 2025 la situación presentada y, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, se allegó la documentación correspondiente al arquitecto **ALEX CIGIFREDO SANDOVAL PINZÓN**, quien asumió el cargo a partir del 16 de agosto de 2025.

3. GARANTÍAS

Durante la ejecución del contrato se deben expedir conforme a la ley pólizas que amparen la ejecución de los contratos tanto de obra como de interventoría; en el presente capítulo se realiza la relación de pólizas expedidas de ambos contratos.

3.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2103 DE 2025

Tabla 3: Relación De Pólizas Contrato De Interventoría No. 2103 De 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO - 600 47 994000075876					
NO. ANEXO	**FECHA EXPEDICIÓN**	**OBJETO DEL SEGURO O MODIFICACIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA HASTA**
0	02-may-2025	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2103 de 2025, REFERENTE A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$106,113,349.58	01-may-2026
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$26,528,337.40	01-ene-2029
			CALIDAD DEL SERVICIO	$106,113,349.58	30-abr-2030
1	17-jul-2025	SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$106,113,349.58	10-jul-2026
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$26,528,337.40	10-mar-2029
			CALIDAD DEL SERVICIO	$106,113,349.58	10-jul-2030

Fuente: Elaboración Propia

Nota: No se relacionan garantías para el contrato de interventoría No.2103 de 2025 suscritas durante el periodo comprendido en el presente informe. Las garantías presentadas anteriormente podrán ser consultadas en el **ANEXO NO.3** del **INFORME MENSUAL NO.01.**

3.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA NO. 2070 de 2025

Tabla 4: Relación De Pólizas Contrato De Obra No. 2070 De 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 96-44-101196536 SEGUROS DEL ESTADO					
NO. ANEXO	**FECHA EXPEDICIÓN**	**OBJETO DEL SEGURO O MODIFICACIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA HASTA**
0	23-abr-2025	EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070-2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ. ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1,433,253,623.19	22-jun-2026
			BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$2,149,880,434.78	22-jun-2026
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1,433,253,623.19	22-dic-2028
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$2,149,880,434.78	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DÍAS
0	10-jul-2025	EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, EN DESARROLLO DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERÍA RYD SAS A CONSORCIO RYP REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1,433,253,623.19	30-jun-2026
			BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$2,149,880,434.78	30-jun-2026
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1,433,253,623.19	31-dic-2028
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$2,149,880,434.78	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DÍAS
2	16-jul-2025	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/07/2025.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1,433,253,623.19	7-jul-2026
			BUENA MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$2,149,880,434.78	7-jul-2026
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1,433,253,623.19	7-ene-2029
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$2,149,880,434.78	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DÍAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVA DE CUMPLIMIENTO-RCE CONTRATOS NO.96-40-101069915 SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
NO. ANEXO	**FECHA EXPEDICIÓN**	**OBJETO DEL SEGURO O MODIFICACIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA HASTA**
0	4/23/2025	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070-2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y DE CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$711,750,000.00	22-dic-2025
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$711,750,000.00	22-dic-2025
			VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$711,750,000.00	22-dic-2025
0	7/10/2025	EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA CESION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERÍA RYD SAS A CONSORCIO RYP REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$711,750,000.00	31-dic-2025
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$711,750,000.00	31-dic-2025
			VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$711,750,000.00	31-dic-2025
2	7/16/2025	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/07/2025.	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$711,750,000.00	7-ene-2026
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$711,750,000.00	7-ene-2026
			VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$711,750,000.00	7-ene-2026

Fuente: Elaboración Propia

Nota: No se relacionan garantías para el contrato de obra No.2070 de 2025 suscritas durante el periodo comprendido en el presente informe. Las garantías presentadas anteriormente podrán ser consultadas en el **ANEXO NO.4** del **INFORME MENSUAL NO.01.**

4. AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA

Como se establece en la documentación contractual del contrato de obra No.2070 de 2025, se establece una metafísica de 780 metros lineales a cada costado de la vía, es decir, 1.560 metros lineales de mejoramiento del espacio público mediante construcción de andenes peatonales y ciclorrutas en ambos costados de la vía. Para lograr el objetivo trazado y dar cumplimiento al alcance anteriormente mencionado se plantearon las siguientes actividades y cantidades (los valores reportados incluyen AIU):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
1	**PRELIMINARES**				**$ 158,361,028.12**
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	7876.51	$ 6,517.00	$ 51,331,215.67
1,2	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	1430.60	$ 7,589.00	$ 10,856,823.40
1,3	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	355.90	$ 22,704.00	$ 8,080,353.60
1,4	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	20.10	$ 324,944.00	$ 6,531,374.40
1,5	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	7876.51	$ 8,821.00	$ 69,478,694.71
1,6	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	M2	7876.51	$ 1,534.00	$ 12,082,566.34
Subtotal					**$ 158,361,028.12**
2	**PISOS**				**$ 595,677,061.31**
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	276.77	$ 79,253.00	$ 21,934,852.81
2,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	964.54	$ 90,550.00	$ 87,339,097.00
2,3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	2070.49	$ 117,166.00	$ 242,591,031.34

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
2,4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	207.40	$ 136,259.00	$ 28,260,116.60
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	31481.54	$ 2,839.00	$ 89,376,092.06
2,6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	105.80	$ 43,366.00	$ 4,588,122.80
2,7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	3140.24	$ 9,205.00	$ 28,905,909.20
2,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	105.80	$ 162,882.00	$ 17,232,915.60
2,9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	8603.07	$ 8,770.00	$ 75,448,923.90
Subtotal					**$ 595,677,061.31**
3	**OBRAS DE URBANISMO**				**$ 1,611,364,253.52**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	1430.60	$ 64,826.00	$ 92,740,075.60
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	3668.08	$ 66,075.00	$ 242,368,386.00
3,3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	ML	251.80	$ 60,115.00	$ 15,136,957.00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	ML	78.00	$ 76,202.00	$ 5,943,756.00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	ML	132.80	$ 118,003.00	$ 15,670,798.40

UNION TEMPORAL LAFER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
3,6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	M3	366.81	$ 882,879.00	$ 323,848,845.99
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	1367.37	$ 95,404.00	$ 130,452,567.48
3,8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	M2	587.86	$ 233,089.00	$ 137,023,699.54
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	441.08	$ 102,435.00	$ 45,182,029.80
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	169.76	$ 106,777.00	$ 18,126,463.52
3,11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	M2	221.32	$ 171,288.00	$ 37,909,460.16
3,12	LOSETA PREFABRICA A-20	M2	2974.76	$ 129,906.00	$ 386,439,172.56
3,13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	ML	531.10	$ 75,009.00	$ 39,837,279.90
3,14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	M3	65.84	$ 1,614,049.00	$ 106,268,986.16
3,15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	1316.82	$ 5,334.00	$ 7,023,917.88
3,16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	2021.29	$ 3,657.00	$ 7,391,857.53
Subtotal					**$ 1,611,364,253.52**
4	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 17,626,339.14**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	61.70	$ 106,475.00	$ 6,569,507.50
4,2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	5.00	$ 1,371,673.00	$ 6,858,365.00
4,3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	UND	5.00	$ 752,187.00	$ 3,760,935.00
4,4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	M3	3.09	$ 141,596.00	$ 437,531.64
Subtotal					**$ 17,626,339.14**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 4,037,491,761.13**
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 31,565,380.00**
5,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	ML	1,920.00	$ 2,814.00	$ 5,402,880.00
5,2	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	ML	1,400.00	$ 9,672.00	$ 13,540,800.00
5,3	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	ML	1,900.00	$ 6,643.00	$ 12,621,700.00
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA				**$ 403,366,110.00**
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	ML	850.00	$ 63,957.00	$ 54,363,450.00
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	ML	1,450.00	$ 175,053.00	$ 253,826,850.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	ML	120.00	$ 53,787.00	$ 6,454,440.00
5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	ML	120.00	$ 37,106.00	$ 4,452,720.00
5,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	180.00	$ 72,966.00	$ 13,133,880.00
5,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	300.00	$ 55,177.00	$ 16,553,100.00
5,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	995.00	$ 41,886.00	$ 41,676,570.00
5,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	ML	450.00	$ 28,678.00	$ 12,905,100.00
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T				**$ 927,476,715.00**
5,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	ML	1,445.00	$ 13,700.00	$ 19,796,500.00
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	480.00	$ 18,608.00	$ 8,931,840.00
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	355.00	$ 18,608.00	$ 6,605,840.00

UNION TEMPORAL LAFER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	ML	1,450.00	$ 259,484.00	$ 376,251,800.00
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	ML	1,450.00	$ 178,374.00	$ 258,642,300.00
5,17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	UND	10.00	$ 1,399,406.00	$ 13,994,060.00
5,18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	UND	80.00	$ 1,923,268.00	$ 153,861,440.00
5,19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	UND	25.00	$ 3,157,324.00	$ 78,933,100.00
5,20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	UND	5.00	$ 2,091,967.00	$ 10,459,835.00
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN				**$ 2,302,744,431.13**
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	UND	1.00	$ 88,726,488.00	$ 88,726,488.00
5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	UND	4.00	$ 94,858,667.00	$ 379,434,668.00
5,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	UND	3.00	$ 3,093,309.00	$ 9,279,927.00
5,24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO	UND	2.00	$ 10,492,566.00	$ 20,985,132.00

UNION TEMPORAL LAFER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
	AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002				
5,25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	UND	9.00	$ 3,645,249.00	$ 32,807,241.00
5,26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	UND	9.00	$ 791,448.00	$ 7,123,032.00
5,27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	ML	1,650.00	$ 758,226.00	$ 1,251,072,900.00
5,28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	ML	539.21	$ 348,753.00	$ 188,051,105.13
5,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	UND	14.00	$ 16,000,217.00	$ 224,003,038.00
5,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	UND	52.00	$ 1,947,325.00	$ 101,260,900.00
	ALUMBRADO PÚBLICO				**$ 372,339,125.00**
5,31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	UND	30.00	$ 1,320,629.00	$ 39,618,870.00
5,32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	UND	30.00	$ 694,068.00	$ 20,822,040.00
5,33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	UND	30.00	$ 3,076,261.00	$ 92,287,830.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
5,34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	30.00	$ 779,961.00	$ 23,398,830.00
5,35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	30.00	$ 600,971.00	$ 18,029,130.00
5,36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	UND	30.00	$ 312,275.00	$ 9,368,250.00
5,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	ML	880.00	$ 28,919.00	$ 25,448,720.00
5,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	ML	900.00	$ 21,497.00	$ 19,347,300.00
5,39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	UND	90.00	$ 69,390.00	$ 6,245,100.00
5,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	ML	105.00	$ 13,700.00	$ 1,438,500.00
5,41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	UND	30.00	$ 1,399,406.00	$ 41,982,180.00
5,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	UND	145.00	$ 512,775.00	$ 74,352,375.00
Subtotal					**$ 4,037,491,761.13**

UNION TEMPORAL LAFER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
6	**OBRAS DE PAISAJISMO**				**$ 85,702,307.00**
6,1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	M2	715.00	$ 106,607.00	$ 76,224,005.00
6,2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	UND	94.00	$ 100,833.00	$ 9,478,302.00
Subtotal					**$ 85,702,307.00**
7	**MOBILIARIO**				**$ 472,301,123.00**
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	UND	36.00	$ 434,247.00	$ 15,632,892.00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	UND	22.00	$ 2,276,022.00	$ 50,072,484.00
7,3	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	UND	89.00	$ 1,589,262.00	$ 141,444,318.00
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	UND	227.00	$ 529,191.00	$ 120,126,357.00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	4.00	$ 36,256,268.00	$ 145,025,072.00
Subtotal					**$ 472,301,123.00**
8	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				**$ 33,003,422.70**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(A)	(B)	(AxB)
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	UND	3.00	$ 1,030,427.00	$ 3,091,281.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	UND	13.00	$ 1,224,369.00	$ 15,916,797.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	UND	11.00	$ 1,079,541.00	$ 11,874,951.00
8.4	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	M2	24.30	$ 87,259.00	$ 2,120,393.70
Subtotal					**$ 33,003,422.70**
				TOTAL (INCLUYE IVA)	**$ 7,011,527,295.92**
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	$ 45,567,597.42
				PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	$ 43,157,525.00
				TOTAL PROPUESTA ECONOMICA	**$ 7,166,268,115.93**

4.1 BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

En el marco del desarrollo del contrato de obra No.2070 de 2025, se han ejecutado actividades referentes a excavaciones manuales, construcción de cajas subterráneas eléctricas tipo CD-2008 y CD-2009 y mejoramiento de la subrasante con afirmado.

Como soporte a la ejecución de actividades de obra, al presente informe se adjunta bitácora de obra mediante **ANEXO NO.01**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
1	**PRELIMINARES**				**$ 158,361,028.12**						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	7876.51	$ 6,517.00	$ 51,331,215.67	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1,2	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	1430.60	$ 7,589.00	$ 10,856,823.40	0.00	$ -	26.63	$ 202,095.07	26.63	$ 202,095.07
1,3	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	355.90	$ 22,704.00	$ 8,080,353.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1,4	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3	20.10	$ 324,944.00	$ 6,531,374.40	0.00	$ -	0.37	$ 120,229.28	0.37	$ 120,229.28
1,5	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	7876.51	$ 8,821.00	$ 69,478,694.71	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1,6	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	M2	7876.51	$ 1,534.00	$ 12,082,566.34	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 158,361,028.12**	**Subtotal acumulado**	**$ -**	**Subtotal parcial**	**$ 202,095.07**	**Subtotal acumulado**	**$ 322,324.35**
2	**PISOS**				**$ 595,677,061.31**						
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	276.77	$ 79,253.00	$ 21,934,852.81	91.98	$ 7,289,690.94	140.77	$ 11,156,444.81	232.75	$ 18,446,135.75
2,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	964.54	$ 90,550.00	$ 87,339,097.00	8.74	$ 791,407.00	96.69	$ 8,755,279.50	105.43	$ 9,546,686.50

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
2,3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	2070.49	$ 117,166.00	$ 242,591,031.34	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2,4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	207.40	$ 136,259.00	$ 28,260,116.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	31481.54	$ 2,839.00	$ 89,376,092.06	0.00	$ -	1,022.67	$ 2,903,360.13	1,022.67	$ 2,903,360.13
2,6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	105.80	$ 43,366.00	$ 4,588,122.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2,7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	3140.24	$ 9,205.00	$ 28,905,909.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	105.80	$ 162,882.00	$ 17,232,915.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2,9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	8603.07	$ 8,770.00	$ 75,448,923.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 595,677,061.31**	**Subtotal acumulado**	**$ 8,081,097.94**	**Subtotal parcial**	**$ 22,815,084.44**	**Subtotal acumulado**	**$ 30,896,182.38**

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
3	**OBRAS DE URBANISMO**				**$ 1,611,364,253.52**						
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	1430.60	$ 64,826.00	$ 92,740,075.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	3668.08	$ 66,075.00	$ 242,368,386.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	ML	251.80	$ 60,115.00	$ 15,136,957.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	ML	78.00	$ 76,202.00	$ 5,943,756.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	ML	132.80	$ 118,003.00	$ 15,670,798.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	M3	366.81	$ 882,879.00	$ 323,848,845.99	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	1367.37	$ 95,404.00	$ 130,452,567.48	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNIÓN TEMPORAL LATER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
3,8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	M2	587.86	$ 233,089.00	$ 137,023,699.54	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	441.08	$ 102,435.00	$ 45,182,029.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	169.76	$ 106,777.00	$ 18,126,463.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	M2	221.32	$ 171,288.00	$ 37,909,460.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,12	LOSETA PREFABRICA A-20	M2	2974.76	$ 129,906.00	$ 386,439,172.56	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	ML	531.10	$ 75,009.00	$ 39,837,279.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	M3	65.84	$ 1,614,049.00	$ 106,268,986.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	1316.82	$ 5,334.00	$ 7,023,917.88	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM,	M3-KM	2021.29	$ 3,657.00	$ 7,391,857.53	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
	(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).										
Subtotal					**$ 1,611,364,253.52**	**Subtotal acumulado**	**$ -**	**Subtotal parcial**	**$ -**	**Subtotal acumulado**	**$ -**
4	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 17,626,339.14**						
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	61.70	$ 106,475.00	$ 6,569,507.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4,2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	5.00	$ 1,371,673.00	$ 6,858,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4,3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	UND	5.00	$ 752,187.00	$ 3,760,935.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4,4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	M3	3.09	$ 141,596.00	$ 437,531.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 17,626,339.14**	**Subtotal acumulado**	**$ -**	**Subtotal parcial**	**$ -**	**Subtotal acumulado**	**$ -**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 4,037,491,761.13**						
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 31,565,380.00**						
5,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	ML	1,920.00	$ 2,814.00	$ 5,402,880.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
5,2	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	ML	1,400.00	$ 9,672.00	$ 13,540,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,3	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	ML	1,900.00	$ 6,643.00	$ 12,621,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA				**$ 403,366,110.00**						
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	ML	850.00	$ 63,957.00	$ 54,363,450.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	ML	1,450.00	$ 175,053.00	$ 253,826,850.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	ML	120.00	$ 53,787.00	$ 6,454,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	ML	120.00	$ 37,106.00	$ 4,452,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	180.00	$ 72,966.00	$ 13,133,880.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	300.00	$ 55,177.00	$ 16,553,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	ML	995.00	$ 41,886.00	$ 41,676,570.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	ML	450.00	$ 28,678.00	$ 12,905,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T				**$ 927,476,715.00**	0.00				0.00	
5,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	ML	1,445.00	$ 13,700.00	$ 19,796,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	480.00	$ 18,608.00	$ 8,931,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	355.00	$ 18,608.00	$ 6,605,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	ML	1,450.00	$ 259,484.00	$ 376,251,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	ML	1,450.00	$ 178,374.00	$ 258,642,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	UND	10.00	$ 1,399,406.00	$ 13,994,060.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
5,18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	UND	80.00	$ 1,923,268.00	$ 153,861,440.00	2.00	$ 3,846,536.00	2.00	$ 3,846,536.00	4.00	$ 7,693,072.00
5,19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	UND	25.00	$ 3,157,324.00	$ 78,933,100.00	4.00	$ 12,629,296.00	5.00	$ 15,786,620.00	9.00	$ 28,415,916.00
5,20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	UND	5.00	$ 2,091,967.00	$ 10,459,835.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN				**$ 2,302,744,431.13**	0.00				0.00	
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	UND	1.00	$ 88,726,488.00	$ 88,726,488.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	UND	4.00	$ 94,858,667.00	$ 379,434,668.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	UND	3.00	$ 3,093,309.00	$ 9,279,927.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
5,24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002	UND	2.00	$ 10,492,566.00	$ 20,985,132.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	UND	9.00	$ 3,645,249.00	$ 32,807,241.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	UND	9.00	$ 791,448.00	$ 7,123,032.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	ML	1,650.00	$ 758,226.00	$ 1,251,072,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	ML	539.21	$ 348,753.00	$ 188,051,105.13	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	UND	14.00	$ 16,000,217.00	$ 224,003,038.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS	UND	52.00	$ 1,947,325.00	$ 101,260,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNIÓN TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
	PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS										
	ALUMBRADO PÚBLICO				**$ 372,339,125.00**	0.00				0.00	
5,31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	UND	30.00	$ 1,320,629.00	$ 39,618,870.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	UND	30.00	$ 694,068.00	$ 20,822,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	UND	30.00	$ 3,076,261.00	$ 92,287,830.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	30.00	$ 779,961.00	$ 23,398,830.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	30.00	$ 600,971.00	$ 18,029,130.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNION TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
5,36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	UND	30.00	$ 312,275.00	$ 9,368,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	ML	880.00	$ 28,919.00	$ 25,448,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	ML	900.00	$ 21,497.00	$ 19,347,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	UND	90.00	$ 69,390.00	$ 6,245,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	ML	105.00	$ 13,700.00	$ 1,438,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	UND	30.00	$ 1,399,406.00	$ 41,982,180.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	UND	145.00	$ 512,775.00	$ 74,352,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNIÓN TEMPORAL LAFER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
Subtotal					**$ 4,037,491,761.13**	**Subtotal acumulado**	**$ 16,475,832.00**	**Subtotal parcial**	**$ 19,633,156.00**	**Subtotal acumulado**	**$ 36,108,988.00**
6	**OBRAS DE PAISAJISMO**				**$ 85,702,307.00**						
6,1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	M2	715.00	$ 106,607.00	$ 76,224,005.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6,2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	UND	94.00	$ 100,833.00	$ 9,478,302.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 85,702,307.00**	**Subtotal acumulado**	**$ -**	**Subtotal parcial**	**$ -**	**Subtotal acumulado**	**$ -**
7	**MOBILIARIO**				**$ 472,301,123.00**						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	UND	36.00	$ 434,247.00	$ 15,632,892.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	UND	22.00	$ 2,276,022.00	$ 50,072,484.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7,3	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN	UND	89.00	$ 1,589,262.00	$ 141,444,318.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
	GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA										
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	UND	227.00	$ 529,191.00	$ 120,126,357.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	4.00	$ 36,256,268.00	$ 145,025,072.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 472,301,123.00**	**Subtotal acumulado**	**$ -**	**Subtotal parcial**	**$ -**	**Subtotal acumulado**	**$ -**
8	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				**$ 33,003,422.70**						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	UND	3.00	$ 1,030,427.00	$ 3,091,281.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	UND	13.00	$ 1,224,369.00	$ 15,916,797.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

UNIÓN TEMPORAL LAFEP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENSUAL NO.01		MENSUAL NO.02			
			(A)	(B)	(AxB)	CANT ACUM	VALOR ACUM	CANT PARC.	VALOR PARCIAL	CANT ACUM	VALOR ACUM
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	UND	11.00	$ 1,079,541.00	$ 11,874,951.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.4	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	M2	24.30	$ 87,259.00	$ 2,120,393.70	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					**$ 33,003,422.70**	**Subtotal acumulado**	**$ -**	**Subtotal parcial**	**$ -**	**Subtotal acumulado**	**$ -**
TOTAL (INCLUYE IVA)					**$ 7,011,527,295.92**	**SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)**	$ 24,556,929.94	**SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)**	$ 42,650,335.51	**SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)**	$ 67,327,494.73
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)					$ 45,567,597.42	**PMT**	$ 0.00	**PMT**	$ 0.00	**PMT**	$ 0.00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)					$ 43,157,525.00	**PAGA**	$ 0.00	**PAGA**	$ 384,533.55	**PAGA**	$ 384,533.55

4.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO


















PELIGRO NO PASE








PELIGRO NO PASE









5. CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD

A continuación, se presenta la relación de ensayos de calidad ejecutados en el periodo relacionado en presente informe. Se adjuntan ensayos mediante **ANEXO NO.02**

Tabla 5. Relación ensayos de calidad

CONTRATO DE OBRA NO 2070 DE 2025		**CONTRATISTA:**			CONSORCIO RYP		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2103 DE 2025		**INTERVENTOR:**			UNIÓN TEMPORAL LAFER		
FECHA	ENSAYO	LOCALIZACIÓN Y/O ESTRUCTURA	MATERIAL	NORMA	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	VALOR OBTENIDO	OBSERVACIONES
miércoles, agosto 06, 2025	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	CALLE 25 PAIPA PLACA CAJAS DE INSPECCIÓN	CONCRETO 3000PSI	NTC 673	7 días≥60% 14 días≥90% 28 días≥100%	7 días= 67.3% 14 días= 98.6% 28 días= 107.5%	CUMPLE. La resistencia del concreto se encuentra de acuerdo con las exigencias contenidas en la norma NSR-10.
miércoles, agosto 13, 2025	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	CALLE 25 PAIPA PLACA CAJAS DE INSPECCIÓN	CONCRETO 3000PSI	NTC 673	7 días≥60% 14 días≥90% 28 días≥100%	7 días= 72.3% 14 días= 105.3% 28 días= 112.3%	CUMPLE. La resistencia del concreto se encuentra de acuerdo con las exigencias contenidas en la norma NSR-10.
miércoles, agosto 04, 2025	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	CALLE 25 PAIPA PLACA CAJAS DE INSPECCIÓN	CONCRETO 3000PSI	NTC 673	7 días≥60% 14 días≥90% 28 días≥100%	7 días= 69.6% 14 días= 99.3% 28 días= 108.7%	CUMPLE. La resistencia del concreto se encuentra de acuerdo con las exigencias contenidas en la norma NSR-10.
miércoles, agosto 06, 2025	FRANJA GRANULOMÉTRICA	CALLE 25 PAIPA	AFIRMADO	INV-E-213-22	SEGÚN NORMA INVIAS		CUMPLE. Se encuentra dentro de las franjas granulométricas para una gradación A-38, el material se acerca al limite inferior, sin embargo, presenta un comportamiento homogéneo y no muestra saltos bruscos entre tamices

miércoles, agosto 06, 2025	LIMITES DE CONSISTENCIA	CALLE 25 PAIPA	AFIRMADO	INV-E-311-22	LL<40%	32.70%	CUMPLE. El índice de plasticidad se encuentra cercano al limite superior que establece la norma, por lo cual, se aceptan el material, sin embargo, se realiza el llamado de atención al contratista.
					4%<IP<9%	4.12%	
martes, agosto 19, 2025	FRANJA GRANULOMÉTRICA	CALLE 25 PAIPA	AFIRMADO	INV-E-213-22	SEGÚN NORMA INVIAS		CUMPLE. Se encuentra dentro de las franjas granulométricas para una gradación A-38, el material se acerca al limite inferior, sin embargo, presenta un comportamiento homogéneo y no muestra saltos bruscos entre tamices
martes, agosto 19, 2025	LIMITES DE CONSISTENCIA	CALLE 25 PAIPA	AFIRMADO	INV-E-311-22	LL<40%	31.90%	CUMPLE. El índice de plasticidad se encuentra cercano al limite superior que establece la norma, por lo cual, se aceptan el material, sin embargo, se realiza el llamado de atención al contratista.
					4%<IP<9%	4.15%	

Fuente: Elaboración propia.

6. ANÁLISIS EJECUTADO VS PROGRAMADO

Ilustración 2. Seguimiento a programación contrato No.2070 de 2025



Fuente: Elaboración Propia

El porcentaje de ejecución con corte a 31 de agosto de 2025 corresponde a 0.95% lo que es equivalente a $67,712,028.28 incluyendo gastos de AIU.

Se anexan al presente informe, los informes semanales mediante el **ANEXO No.03.**

6.1 AVANCE FINANCIERO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO DE OBRA

Tabla 6: Resumen Financiero Contrato

CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL (1)	$7,166,268,115.93
VALOR ACTUALIZADO (2)	$7,166,268,115.93
VR AVANCES ANTERIORES	$ 24,556,929.94
VR PRESENTE CORTE DE AVANCE	$ 43,034,869.06
VR ACUMULADO (3)	$67,712,028.28

Fuente: Elaboración Propia

6.2 RESUMEN ACTAS PARCIALES DE OBRA

A la fecha de radicado del presente informe, no se han suscritos actas de recibo parcial.

6.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL (1)	$530,566,747.90
VALOR ACTUALIZADO (2)	$530,566,747.90
VR AVANCES ANTERIORES	$1,858,238.59
VR PRESENTE CORTE DE AVANCE	$3,154,935.64
VR ACUMULADO (3)	$5,013,174.23

6.4 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A continuación, se presenta el plan de inversión y manejo del anticipo, al igual, se relaciona la documentación de soporte para el seguimiento al plan de inversión del anticipo presentado por contratista de obra.



CONSORCIO RYP

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO

CONTRATO No.	2070 DE 2025	FIDUCIARIA	ALIANZA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA	CONSORCIO RYP	SUPERVISOR	ING. OSCAR IVAN PINZON
VALOR DEL ANTICIPO	$ 2,149,880,434.78		
FECHA	viernes, 25 de julio de 2025		

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 23 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

ITEM	CONCEPTO	VALOR MES 1 ($)	VALOR MES 2 ($)	VALOR MES 3 ($)	VALOR MES 4 ($)	VALOR TOTAL ($)	%
1	COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS E INSUMOS	$ 1,074,940,217.39	$ 537,470,108.69	$ 537,470,108.70		$ 2,149,880,434.78	100.00%
2							
3							
TOTAL		$ 1,074,940,217.39	$ 537,470,108.69	$ 537,470,108.70	$ 0.00	$ 2,149,880,434.78	100.00%

LUIS EDUARDO BETANCA GAMEZ
R.L CONSORCIO RYP
CONTRATISTA DE OBRA

LESLY JOHANA MEJIA SANCHEZ
R.L UNIÓN TEMPORAL LAFER
INTERVENTOR

6.4.1 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

A la fecha de radicado del presente informe, no se ha realizado el pago por concepto de anticipo, por lo cual, no se anexa soportes de inversión de este.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido en el presente informe, esta interventora ha realizado las siguientes actividades a fin de realizar control técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental al presente proyecto.

Control técnico

- Verificación de planos y diseños del proyecto.
- Acompañamiento técnico de profesionales ofertados.
- Revisión del adecuado proceso constructivo y calidad de los materiales.

Control administrativo

- Revisión y control administrativo de información suministrada por contratista, entidad.
- Recibo y envió de oficios referentes al proyecto Informar oportunamente a las partes del proyecto.
- Seguimiento y atención PQRS de la comunidad.
- Socialización a la comunidad de temas referentes al proyecto.

Control financiero

- Control de cantidades de obra.
- Seguimiento contable de los ingresos y egresos realizados al contratista.
- Acompañamiento tributario según normatividad vigente.

Control jurídico

- Control del cumplimiento legal del contrato.
- Control sobre actas o modificatorios contractuales.

Control contable

- Control de soportes y aportes contables
- Control al manejo e inversión del anticipo.

Control ambiental

- Seguimiento a afectaciones ambientales imputables a las actividades de obra.

7.1 ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

En el contexto del desarrollo del contrato de obra e interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones asumidas con la firma de este, se han llevado a cabo diversos comités, los cuales se resumen a continuación:

		GOBERNACIÓN DE BOYACÁ			VERSIÓN NO.01
		UNIÓN TEMPORAL LAFER			15 DE JULIO 2025
		RELACIÓN DE COMITÉS			ADMINISTRATIVA
FECHA DE REALIZACIÓN	**CONSEC.**	**LUGAR DE REALIZACIÓN**	**PARTICIPANTES**	**COMPROMISOS PACTADOS**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
01/ago/2025	9	SALÓN COMUNAL BARRIO VILLA PANORAMA	- CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA -SUPERVISIÓN -VEEDURÍA CIUDADANA -ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	Presentar documentos de acceso público referente a los contratos de obra e interventoría, al igual que las pólizas de dichos contratos a la veeduría	08 de agosto de 2025
				En atención a la solicitud emitida por parte de las veedurías ciudadanas, se realizará una reunión con la comunidad para dar respuesta a algunas inquietudes.	05 de agosto de 2025
14/ago/2025	10	FRENTE DE OBRA	- CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA -SECRETARIA DE AGRICULTURA (MUNICIPIO DE PAIPA)	Suscribir documentación para solicitud de permiso de aprovechamiento forestal de arboles localizados en el tramo vial	14 de agosto de 2025

FECHA DE REALIZACIÓN	CONSEC.	LUGAR DE REALIZACIÓN	PARTICIPANTES	COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
15/ago/2025	11	FRENTE DE OBRA	- CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA -SUPERVISIÓN -PDA	Allegar planos récord de los elementos que componen la red de tubería y pozos de inspección de los andenes sobre la calle 25 del municipio de paipa.	-
				Radicar documentación solicitada por PDA para intervención y nivelación de pozos	-
15/ago/2025	12	FRENTE DE OBRA	- CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA - SUPERVISIÓN	Gestionar formalmente la solicitud de información ante la alcaldía municipal.	-
				Radicar formalmente la documentación relacionada con el cambio de profesional.	
15/ago/2025	13	FRENTE DE OBRA	- CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA - REPRESENTANTES AMTEC	No se cuenta con compromisos	-

Nota: Se presentan comités relacionados anteriormente en el **ANEXO NO.04.**

7.2 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta la relación de correspondencia generada durante el periodo comprendido en el presente informe:

Tabla 7. Relación de correspondencia generada

No.	Número de oficio	Fecha de Emisión	Remitente	Destinatario	Asunto
24	CTO.2103/2025-023	01-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	VEEDURÍA CIUDADANA	REMISIÓN INFORMACIÓN SOLICITADA EN COMITÉ
25	CTO.2103/2025-024	01-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	REMISIÓN AUTORIZACIÓN PARA APROBACIÓN DE ANTICIPO
26	CTO.2103/2025-025	01-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	CONSORCIO RYP	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
27	CTO.2103/2025-027	01-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	AVAL Y RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025
28	CTO.2103/2025-028	06-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.03
29	CTO.2103/2025-029	11-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	CONSORCIO RYP	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO.01
30	CTO.2103/2025-030	11-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.04
31	CTO.2103/2025-031	12-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN
32	CTO.2103/2025-032	12-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS POTENCIALMENTE MALICIOSOS
33	CTO.2103/2025-033	13-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

No.	Número de oficio	Fecha de Emisión	Remitente	Destinatario	Asunto
34	CTO.2103/2025-034	15-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
34.1	SIN NUMERO DE RADICADO	15-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	ACLARACIÓN CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
35	CTO.2103/2025-035	19-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	CONSORCIO RYP	REITERACIÓN No.01 OBSERVACIONES MENSUAL No.01
36	CTO.2103/2025-036	19-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.05
37	CTO.2103/2025-037	22-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO OBSERVACIONES A SOLICITUD MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025
38	CTO.2103/2025-038	25-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	RADICADO INFORME SEMANAL NO.06
39	CTO.2103/2025-039	28-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	NOTIFICACIÓN INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025
40	CTO.2103/2025-040	28-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ	SOLICITUD COMITÉ DE OBRA
41	CTO.2103/2025-041	29-ago-2025	UNIÓN TEMPORAL LAFER	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA	REMISIÓN OFICIO CTO 2070-CONS-RYP-39-2025

Tabla 8. Relación de correspondencia recibida

No.	Número de oficio	Fecha de Emisión	Remitente	Destinatario	Asunto
21	CTO 2070- CONS- RYP – 029- 2025	02-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PROYECTO

No.	Número de oficio	Fecha de Emisión	Remitente	Destinatario	Asunto
22	CTO 2070- CONS- RYP – 031- 2025	07-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES
23	CTO 2070- CONS- RYP – 032- 2025	09-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RADICACIÓN INFORME MENSUAL
24	CTO 2070- CONS- RYP – 033- 2025	09-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	REMISIÓN INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA
25	SIN NUMERO DE RADICADO	11-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.04
26	CTO 2070- CONS- RYP – 034- 2025	12-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	REMISIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR SU DEPENDENCIA AL PMT
27	SIN NUMERO DE RADICADO	19-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.05
28	CTO 2070- CONS- RYP – 037- 2025	20-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RADICADO CORRECCIONES INFORME TÉCNICO GERENCIAL DE OBRA
29	138-11-552	27-ago-2025	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BOYACÁ	UNIÓN TEMPORAL LAFER	PERMISO DE INTERVENCIÓN A BOCA CALLES
30	CTO 2070- CONS- RYP – 038- 2025	27-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 22/08/2025
31	CTO 2070- CONS- RYP – 041- 2025	27-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	TRANSLADO DERECHO DE PETICIÓN
32	SIN NUMERO DE RADICADO	27-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	REMISIÓN INFORME SEMANAL 006
33	CTO 2070- CONS- RYP – 040- 2025	28-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO Y

No.	Número de oficio	Fecha de Emisión	Remitente	Destinatario	Asunto
					ADOPCIÓN DE MEDIDAS FRENTE A OPOSICIÓN DE VECINOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.2070-2025
34	CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025	28-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RADICACIÓN INVENTARIO VIAL
35	130-11-558	28-ago-2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (PAIPA)	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RESPUESTA RADICADO INVENTARIO VIAL
36	SIN NUMERO DE RADICADO	28-ago-2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (PAIPA)	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RESPUESTA RADICADO INVENTARIO VIAL Y PERMISO INTERVENCIÓN BOCACALLES
37	CTO 2070- CONS- RYP – 039- 2025	29-ago-2025	CONSORCIO RYP	UNIÓN TEMPORAL LAFER	COMPROMISOS DE GESTIÓN PREDIAL PENDIENTES

Nota: Mediante **ANEXO NO.05** se adjunta correspondencia relacionada.

7.3 ESTADO DEL CLIMA

Durante el periodo abarcado en el presente informe, se registraron lluvias esporádicas, siendo el estado del tiempo predominante un clima soleado. Sin embargo, se registraron fuertes lluvias durante 31 horas, en las cuales no se pudo llevar a cabo actividades constructivas.

8. SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE PMT

El presente capitulo tiene como finalidad documentar y evaluar el seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) implementado en el marco del desarrollo del Contrato de Obra No. 2070 de 2025. En este capítulo se presenta el seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito y transporte, particularmente lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial (Ministerio de Transporte, 2024), así como de las obligaciones contractuales relacionadas.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, y como medida de mitigación de los impactos generados a la movilidad por las actividades de obra, se implementaron de manera rigurosa los lineamientos establecidos en el PMT aprobado. A continuación, se detalla el seguimiento a las acciones y estrategias desarrolladas:

8.1 ALCANCE

El plan de manejo de tránsito (PMT) para el proyecto de mejoramiento del espacio público en la calle 25 de Paipa, Boyacá entre los puentes del río Chicamocha y Marquetalia, tiene como propósito mitigar los impactos en la movilidad vehicular, peatonal y ciclista durante la construcción de senderos y ciclorrutas.

El alcance del presente plan de manejo de tránsito comprende los siguientes componentes:

- Diagnóstico del comportamiento de tránsito en el corredor y su zona de influencia.
- Definición de cierres mínimamente invasivas, garantizando la accesibilidad a predios, comercios y viviendas.
- Diseño y señalización de rutas, asegurando senderos peatonales continuos de al menos 1,50 m y canalización adecuada para ciclistas según el Manual de Señalización Vial.
- Implementación de señalización preventiva, reglamentaria e informativa.
- Estrategia de comunicación y socialización con comunidad y autoridades locales.

8.2 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

El presente informe de seguimiento al plan de manejo de tránsito implementado en el desarrollo del proyecto se sustenta en la normativa vigente que regula la seguridad y operación vial en el territorio nacional. Dentro de la normativa tomada como referencia para la evaluación de seguimiento destacan:

- Ley 769 de 2022. Código Nacional de tránsito
- Manual de Señalización Vial (Ministerio de Transporte, 2024)
- NTC 4739. Laminas retrorreflectivas para el control de tránsito

La normativa relacionada, además del plan de manejo de tránsito aprobado por la secretaria de tránsito y transporte municipal, constituyen los insumos para verificar el cumplimiento del plan de manejo de tránsito y realizar un seguimiento a su implementación.

8.3 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PMT

Ya que las actividades de obra que se desarrollan para dar cumplimiento al objeto del contrato No.2070 de 2025 se desarrollan actualmente sobre la calle 25 del municipio de paipa, entre puentes del rio Chicamocha y Marquetalia y teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto no contempla un impacto significativo en la movilidad vehicular, se puede definir un área de influencia la cual abarca la zona de intervención del proyecto y los corredores vehiculares y peatonales que dan acceso a los barrios localizados sobre la calle 25 del municipio de paipa.

Acorde con el cronograma de obra, en la fecha comprendida en el presente informe, se desarrollaron actividades de excavación manual y construcción de cajas de inspección eléctricas. El impacto en la movilidad generado por el desarrollo de estas actividades se constituye como bajo, pues al ser actividades localizadas no se han presentado afectaciones al flujo peatonal y los cierres viales generados por el ingreso y salida de vehículos de carga a la obra al ser inferiores a 1 minuto no generan perturbaciones considerables a la movilidad.

Como parte de las estrategias de mitigación de los impactos generados por el desarrollo de la obra, destaca la implementación de señalización temporal y el cierre de las zonas en las cuales se desarrollan trabajos. A demás, para el control de ingreso y salida de vehículos de carga se cuenta con controladores de tránsito para evitar incidentes en este tipo de maniobras.

8.3.1 SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

Como parte fundamental de las estrategias contempladas en el PMT, se verificó la instalación de elementos de señalización vertical, demarcación y dispositivos complementarios en las áreas donde se desarrollan actividades de obra. Asimismo, se constató el cumplimiento de las dimensiones mínimas, materiales y demás características definidas en el Manual de Señalización Vial 2024 y NTC 4739. De igual manera, se constató la correcta ubicación de dichos elementos, garantizando que la distancia de ubicación de las señales permita a los actores viales contar con un adecuado tiempo de percepción-reacción para tomar decisiones oportunas ante cierres en senderos de circulación peatonal o vehicular.

En lo referente a la señalización de los puntos de acopio de materiales requeridos para el desarrollo de la obra, se verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el PMT, contando con demarcación de los sitios de acopio y verificando que los horarios de descargue de material no generasen afectaciones significativas a la movilidad. Finalmente, como parte indispensable de la evaluación y seguimiento al PMT por parte del contratista de obra e interventoría, se realizaron recorridos periódicos con el fin de verificar que el estado de la señalización fuese el óptimo y que este fuese coherente con los reportes e inspecciones elaborados por los auxiliares de tránsito antes del inicio de cada jornada.

8.3.2 MANEJO DE FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL

Dado que el área de influencia del proyecto se localiza en un sector turístico del municipio de Paipa, donde se presenta un alto volumen vehicular y peatonal, fue necesario implementar estrategias sólidas que permitieran mitigar los impactos sobre la movilidad. Dentro de las acciones ejecutadas, en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente, se destacan:

- Corredores peatonales provisionales, con anchos mínimos reglamentarios, para garantizar un nivel de servicio adecuado que no afecte el flujo peatonal ni ponga en riesgo a los usuarios no motorizados.
- Direccionamiento del flujo vehicular mediante auxiliares de tránsito, especialmente durante cierres temporales generados por la entrada y salida de vehículos de obra.
- Acompañamiento permanente de auxiliares de tránsito para orientar la circulación peatonal y minimizar conflictos con el tránsito vehicular en las zonas de influencia.

8.3.3 PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL PMT

Como parte del personal de apoyo que se contempla en el presupuesto del plan de manejo de tránsito, se cuenta con tres (3) auxiliares de tránsito, este personal se ha encargado en obra de realizar seguimiento al estado y ubicación de la señalización, al igual, que coordinar cierres temporales para el ingreso y salida de vehículos de carga al proyecto.

8.3.4 REGISTRO DE INCIDENTES

En el periodo abarcado en el presente informe, no se han presentado incidentes de gravedad en materia de seguridad vial ocasionados por el desarrollo del proyecto.

8.3.5 RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

Contratista de obra ha dado cumplimiento al desarrollo del plan de manejo de tránsito acorde con la normativa vigente, además, se ha dado cumplimiento al presupuesto allí contenido de la siguiente forma:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT PMT	CANT OBRA	OBSERVACIONES
1	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS (TRABAJO EN LA VIA)	2	2	CUMPLE
2	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS (AUXILIAR DE TRANSITO)	2	2	CUMPLE
3	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS (INICIO DE OBRA)	2	2	CUMPLE
4	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES	80	80	CUMPLE
5	DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - CINTA DE SEÑALIZACIÓN	46.29	21.38	CUMPLE. No se ha instalado la totalidad de cinta, sin embargo, el contratista cuenta con la cantidad exigida
6	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS (FIN DE OBRA)	2	2	CUMPLE
7	PALETERO (INCLUYE SALARIO BASE+FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	3	3	CUMPLE
8	SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO - PALETAS PARE/SIGA	2	2	CUMPLE
9	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES)	6	6	CUMPLE

Dentro de los riesgos identificados en materia de seguridad vial se evidenció la indumentaria utilizada por los auxiliares de tránsito. Si bien esta cuenta con elementos reflectivos, se consideró necesario reforzar las condiciones de visibilidad, por lo cual se solicitó al contratista de obra la implementación de chalecos reflectivos adicionales. Esta medida busca mejorar la percepción de los auxiliares por parte de los actores viales y, en consecuencia, reducir la probabilidad de incidentes asociados a la baja visibilidad durante la operación del Plan de Manejo de Tránsito.

UNIÓN TEMPORAL LAFER

8.3.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO









LAFER


TRANSITE POR LA
ACERA DE ENFRENTE











9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el marco del desarrollo del contrato de obra No.2070 de 2025, se registra un avance, a la fecha de presentación del informe, del 0.95% lo que es equivalente a $ 67,712,028.28 incluyendo gastos de AIU. Esto frente a un 2.84% programado, lo cual es un indicador negativo del proyecto, el atraso generado en el cronograma de obra es atribuible a actividades que se enmarcan dentro de la ruta crítica del proyecto, las cuales están en espera de aprobación por parte de la entidad contratante mediante modificatorio de cantidades e inclusión de ítems no previstos No.01.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta interventoría realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la documentación que forma parte integral del contrato, así como el cumplimiento de los factores de calidad exigidos por la entidad en cada una de las actividades ejecutadas.

Por otra parte, y dentro del seguimiento integral al desarrollo del contrato de obra No.2070 de 2025, se realizó una verificación del cumplimiento e implementación del plan de manejo de tránsito. Así mismo, con el fin de garantizar la seguridad de los actores viales y en especial del personal que ejerce labores de controladores viales, se solicitó a contratista de obra disponer de prendas de un color llamativo y elementos reflectivos con el fin de garantizar una mejor visibilidad del personal ante los demás actores viales.

Finalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido, esta interventoría recomienda una vez suscrito el acto administrativo que permita ejecutar las actividades que forman parte de la ruta crítica del proyecto, dar inicio de manera inmediata a dichas actividades y destinar la mayor parte del personal para así, dar cumplimiento al cronograma.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

10. ANEXOS

ANEXO No.01: Bitácora de obra

ANEXO No.02: Ensayos de calidad

ANEXO No.03: Informes semanales

ANEXO No.04: Comités de obra

ANEXO No.05: Correspondencia

ANEXO No.06: Informe SST, ambiental y social

UNION TEMPORAL
LAFER

ANEXO NO.01

BITÁCORA DE OBRA

UNION TEMPORAL

LAFER

1-8-2025

- Personal en obra:
  Residente de obra
  Profesional SST
  Ayudantes 3
  Maestro 1
  oficiales 4
  controladores viales 2
- Clima: Mañana Soleada Tarde: Soleada
- Actividades:
  Se realizan Construccion de placas de fondo para cajas electricas CD2008-CD 2009. Continuan excavaciones para cajas electricas

Firma obra

2-8-2025

- Personal en obra
  Residente de obra
  Profesional SST
  Maestro = 1 Controladores viales = 2
  oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Mañana Soleada Tarde Soleada
- Actividades:
  Se realiza Construccion de muros para Cajas electricas CD 2008 y CD 2009

Firma obra

Powered by CamScanner

4-8-2025.

- Personal en obra
- Residente de obra
- Profesional SST
- Maestro obra = 1 Controladores viales = 2
- Oficiales = 4 Ayudantes obra = 3
- Clima: Mañana Soleada Tarde Soleada
- Actividades

Excavaciones manuales para Cajas y p... buscar Cruces electricos se realizan excavaciones manuales para buscar acome... Se Construyen placas de fondo para Cajas electricas.

Firma obra

5-8-2025

- Personal en obra

Residente de obra
Profesional SST
Maestro obra = 1 Controladores viales = 2
Oficiales = 4 Ayudantes de obra = 3

- Clima: Mañana Soleada Tarde Soleada
- Actividades

Se realizan excavaciones para Cruces electricos, Se evidencia que en todos los planos record enviados por la alcaldía de pasto, estan ubicados los Cruces en determinadas abscisas y tambien se encuentran marcas en los sardineles, Sin embargo al

realizar la busqueda en esos puntos, no se encuentran estos ductos de tuberias, estos cruces son de vital importancia para el proyecto electrico para realizar la distribucion de circuitos en baja y media tension. algunos cruces se encuentran hasta 10 m desplazados de las marcas y de los puntos de referencia de los planos record, esta situación genera demoras y mayores cantidades de excavaciones y rellenos.

- Se realizan bloqueos en vias Nacionales y veredales a causa del paro minero en el municipio de Paipa, situacion que impide la llegada de materiales a la obra.

Firma obra:

6-8-2025

- Personal en obra
  Residente obra
  Profesional SST
  Maestro obra = 1 Controladores viales = 2
  Oficiales = 4 Ayudantes = 3

- Clima: Mañana Soleada Tarde Soleada

Powered by CamScanner

- Actividades:
Continuan actividades de excavaciones manuales para busqueda de cruces de tuberia electrica, se evidencia que estos cruces en algunos extremos estan llenos de concreto y estan enfrentados con servicios publicos como acueducto y alcantarillados.

Firma obra

8-8-2025

- Personal en obra:
Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 Contratistas viales = 2
Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde, las cuales afectan la realizacion de excavaciones, ademas se presentan tormentas electricas.

- Actividades
Se realiza la construccion de cajas donde se suspenden actividades por fuertes lluvias y tormenta electrica
Se da capacitacion SST sobre primeros auxilios.

Firma obra

Profesional SST

9-8-2025

- Personal en obra
  Residente de obra
  Profesional sst
  Maestro = 1 Contadores viales = 2
  Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Se presentan lluvias durante el dia, se pierden 4 horas de la jornada laboral
- Actividades:
  Se realiza limpieza de cajas, ajustes de señalizacion de cajas, la lluvia hace perder mas de media jornada laboral

Firma obra

11-8-2025

- Personal en obra
  Residente de obra -
  Profesional SST
  Maestro 1 Contadores viales 3
  oficiales 4 Ayudantes 2
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizan excavaciones manuales para cajas en curvas elevadas

firma obra

Powered by CamScanner

12-8-2025
- Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro 1 Contraladores viales 3
Oficiales 4 Ayudantes 2
- Clima: Mañana soleada Tarde soleada
- Actividades
Se realizan excavaciones para cruces electricos, debido a que no estan en la ubicación marcada se presentan grandes excavaciones hacia los lados, las cuales son medidas en conjunto con la interventoria

Firma obra

13-8-2025
Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro 1 Contraladores viales = 3
Oficiales = 4 Ayudantes = 2
Clima: Mañana Soleada Tarde Soleada
- Actividades

Continuan excavaciones y Rellenos con material de afirmado para cruces

electricos por costado izquierdo, se realizan excavaciones manuales para cajas electricas.

Firma obra

14-8-2025
- Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 Controladores viales = 3
oficiales = 4 Ayudantes = 2
Clima: Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde, se pierden 2 horas de trabajo por las lluvias

Actividades:
Se realizan excavaciones manuales para buscar cruces de tuberia electrica por costado izquierdo, se realiza de forma manual teniendo en cuenta la interferencia de redes que hay en el sector.

Firma obra

Powered by CamScanner

15-8-2025

- Personal en obra
  Residente de obra
  Profesional sst
  Maestro = 1 Cantidades Viales = 3
  Oficiales = 4 Ayudantes = 2
- Clima: Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde se pierden dos horas por la lluvia, ademas se presenta Saturacion del suelo
- Actividades realizadas
  Se realizan excavaciones manuales para construccion de Cajas electricas, se presenta la rotura al tubo de gas de 3/4 de pulgada a la altura del Sector del edificio Rustico por anden Izquierdo, Se activan los protocolos de seguridad explicados por Vanti antes del inicio de las actividades, Se acordona un Carril y se realiza manejo de transito con los Controladores viales.

no se realizan afectaciones a terceros ni se presentan daños mayores a la red de gas.

Firma obra

18-8-2025
- Personal en obra
Residente de obra
Profesional sst
Maestro = 2 Contadores viales = 3
oficiales = 3 Ayudantes = 3
- Clima: Soleado en mañana y en la tarde
- Actividades realizadas.
Se realiza la construcción de placas de fondo para cajas CD2008 y CD2009

Firma obra

19-8-2025
- Personal en obra
Residente de obra
Profesional sst
Maestro = 2 Contadores viales = 3
oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Actividades realizadas
inician actividades de Busqueda de cruces en anden costado derecho, se inicia desde punto marqueteria
- Clima: Soleado

Firma obra

Powered by CamScanner

20-8-2025.
- Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 Controladores viales = 3
Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Mañana soleada Tarde soleada
- Actividades
Busqueda de cruces de tuberia electrica por anden derecho.

Firma obra

21-8-2025
- Personal obra
Residente obra
Profesional SST
Maestro = 1 Controladores viales = 3
Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima = soleado en mañana y tarde
- Actividades
Busqueda de cruces electricos por anden derecho, apertura de cajas con excavaciones manuales

Firma obra

Powered by CamScanner

22-8-2025

- Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 Contraladores viales = 3
oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima, lluvias en horas de la tarde, se pierden 4 horas de jornada laboral
- Actividades
Construccion de cajas de inspeccion
- Se da charla sobre "importancia del correcto paso en el puesto de trabajo"

Firma obra

23-8-2025

- Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 contraladores viales = 3
oficiales = 4 Ayudantes = 3
- clima: se presentan lluvias en toda la jornada
- Actividades:
Jornada de aseo en la via para evitar taponamiento de sumideros.

Firma obra

Powered by CamScanner

25-8-2025

- Personal en obra
  Residente de obra
  Profesional SST
  Maestro = 1 Contboladores viales = 3
  oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Se presentan lluvias en horas de la tarde
- Actividades:
  Excavaciones para cajas. El primero de agosto se radicó modificatorio para incluir anchos e items no previstos (losa) en el contrato a la fecha No ha sido aprobada para dar avance a obras actividades que son ruta crítica para la obra,

Firma obra

26-8-2025

- Personal en obra
  Residente de obra
  Profesional SST
  Maestro = 1 Contboladores viales = 3
  oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Mañana soleada tarde soleada
- Actividades:
  Busqueda de cruces electricos de acuerdo a planos Retie entregados por el municipio

Firma

27-8-2025
-Personal en obra
Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 Controladores viales = 3
Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: mañana: soleado tarde: soleado
- Actividades:
Se realizan actividades de excavaciones en cajas para cajas electricas

Firma obra

28-8-2025
-Personal en obra =
Residente de obra
Profesional SST
Maestro de obra = 1 Controladores viales = 3
Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: soleado
- Actividades
Se realizan placas de fondo para las cajas

Firma obra

Powered by CamScanner

29-8-2025
- Personal en obra
Residente obra
Profesional SST
Maestro = 1 controladores viales = 3
Oficiales = 4 Ayudantes = 3
- Clima: Mañana soleada, Tarde soleada
- Actividades
Construcción de placas de fondo para cajas eléctricas)
- Se da capacitación SST sobre clasificación de riesgos

firma obra Profesional SST.

30-8-2025
- Personal obra
- Residente de obra
Profesional SST
Maestro = 1 controladores viales = 3
Ayudantes obra = 3 oficiales = 4
- Clima: Mañana soleada Tarde = soleada
- Actividades:
Se realizan adecuaciones a señalización existente en cajas abiertas, se realiza jornada de aseo.

Firma obra

ANEXO NO.02


ENSAYOS DE CALIDAD

UNION TEMPORAL

LAFER

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC 673


Codigo cliente:	0045 -OSP-CT-RC- 01
Fecha ingreso:	01 DE AGOSTO DE 2025
Nombre o razón social	UNIÓN TEMPORAL LAFER
Cédula o Nit	901.941.593-1
Dirección	Calle 25, Paipa (Boyacá)
Teléfono Contacto	310 4828105
Obra	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
Correo electrónico	interventoria.andespaipa25@gmail.com

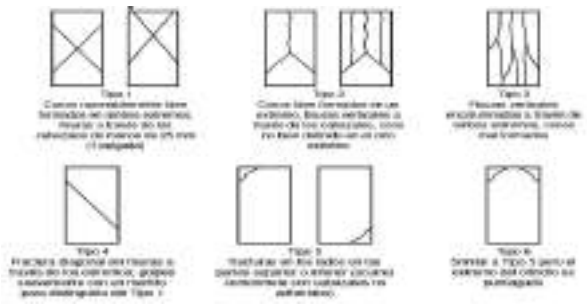

Datos de especímenes											Resultados Falla compresión						
N°	Cód APP	Cód. Cliente	Fecha		Edad (días)	Slump cm	f'c psi Diseño	Elemento estructural	Diámet cm	Altura cm	Peso Kg	Carga		Falla	Resistencia		Peso Unitario gr/cm³	f'c (%)
			Toma	Falla								KN	Kg		Kg/cm²	psi		
1	778	045	mié,30/jul/2025	mié,06/ago/2025	7	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.1	12.77	244.93	24975	2	141.3	2019.0	2.4	67.3%
2	779	045	mié,30/jul/2025	mié,13/ago/2025	14	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.3	12.85	358.69	36576	3	207.0	2956.8	2.4	98.6%
3	780	045	mié,30/jul/2025	mié,27/ago/2025	28	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.2	12.81	391.37	39908	3	225.8	3226.2	2.4	107.5%
4																		
5																		
6																		

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC 673

Codigo cliente:	0045 -OSP-CT-RC- 01
Fecha ingreso:	01 DE AGOSTO DE 2025
Nombre o razón social	UNIÓN TEMPORAL LAFER
Cédula o Nit	901.941.593-1
Dirección	Calle 25, Paipa (Boyacá)
Teléfono Contacto	310 4828105
Obra	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
Correo electrónico	interventoria.andespaipa25@gmail.com

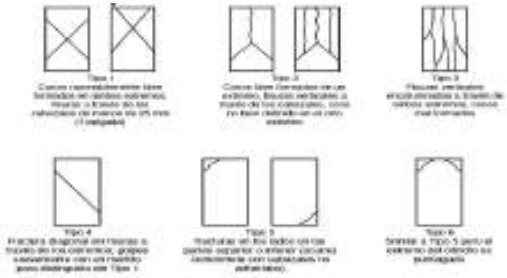

REGISTRO FOTOGRAFICO







OSPAM INGENIERIA


LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS I.N.V. E – 125- 126 – 13


PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ		
CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL LAFER		
PROCEDENCIA:	CANTERA TUNAL		
LOCALIZACIÓN:	CALLE 25, PAIPA (BOYACÁ)		
DESCRIPCIÓN:	MATERIAL GRANULAR CON GRAVAS DE FORMA SUB ANGULAR		
FECHA ENSAYO :	4 de agosto de 2025	FECHA INFORME:	6 de agosto de 2025

ENSAYO DE LIMITES ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO			
PRUEBA Nº	1	2	3
RECIPIENTE Nº	83	63	6
PESO RECIPIENTE (g)	8.22	8.58	8.74
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	33.87	30.11	30.12
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	28.07	25.04	24.36
NÚMERO DE GOLPES	36	27	15
CONTENIDO DE AGUA (%)	**29.22**	**30.80**	**36.88**

LÍMITE PLÁSTICO			HUMEDAD NATURAL	
PRUEBA Nº	1	2	No CAPSULA	28
RECIPIENTE Nº	89	62	PESO MUESTRA HUMEDA + CAP(g)	52.35
PESO RECIPIENTE (g)	6.18	6.58	MUESTRA SECA+CAP (g)	45.94
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	12.54	11.49	PESO CAPSULA(g)	4.42
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	11.14	10.39	**CONTENIDO DE HUMEDAD(%)**	**15.4**
CONTENIDO DE AGUA (%)	**28.2**	**28.9**		

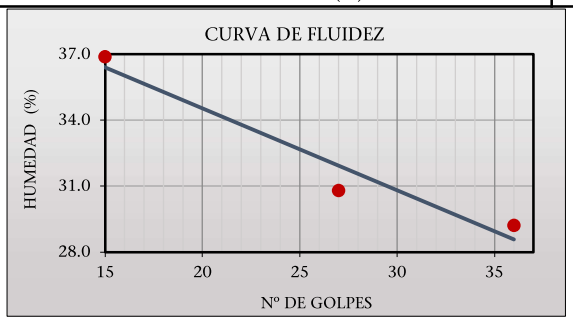

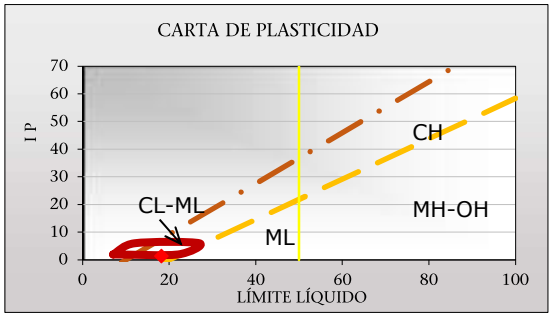

LÍMITE LÍQUIDO:	32.7	LÍMITE PLÁSTICO:	28.5	ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP):	4.12

ESPECIFICACION INVIAS:	TIPO DE MATERIAL	CARACTERISTICA	CLASE	RANGO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ARTICULO 311-13	AFIRMADO GRANULAR	LÍMITE LÍQUIDO	A	40 % MAX	SI CUMPLE
			B		
			C		
		ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)	A	4 - 9 % MAX	SI CUMPLE
			B		
			C		

OBSERVACIONES EL MATERIAL FUE SUMINSTRADO POR EL CLIENTE

OSPAM INGENIERIA	PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL LAFER
PROCEDENCIA:	CANTERA TUNAL
LOCALIZACIÓN:	CALLE 25, PAIPA (BOYACÁ)
DESCRIPCIÓN:	MATERIAL GRANULAR CON GRAVAS DE FORMA SUB ANGULAR

FECHA ENSAYO :	4 de agosto de 2025	FECHA INFORME:	6 de agosto de 2025

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOSI.N.V. E – 213 – 13


ANTES DE LAVADO	
PESO PLATÓN (gr)	2743
PESO PLATÓN + MUEST (gr)	5314
PESO MUESTRA (gr)	2571

DESPUÉS DE LAVADO	
PESO PLATÓN (gr)	2743
PESO PLATÓN + MUESTRA (gr)	5167
PESO MUESTRA SECA (gr)	2424
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	5.72

CORRECCIÓN	
PESO TOTAL MUESTRA (gr)	2571.00
Σ PESOS RETENIDOS (gr)	2424.00
ERROR (gr)	147.00
ERROR (%)	5.72

TAMIZ Nº	DIÁMETRO, mm	PESO RETENIDO, gr	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%PASA
1 1/2"	38.1	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.4	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.0	216.70	8.94	8.94	91.06
3/8"	9.51	316.39	13.05	21.99	78.01
4	4.76	468.23	19.32	41.31	58.69
10	2.00	442.01	18.23	59.54	40.46
40	0.425	323.16	13.33	72.88	27.12
200	0.074	356.38	14.70	87.58	12.42
FONDO		301.13	12.42	100.00	0.00
Σ		2424.00			

CURVA GRANULOMÉTRICA

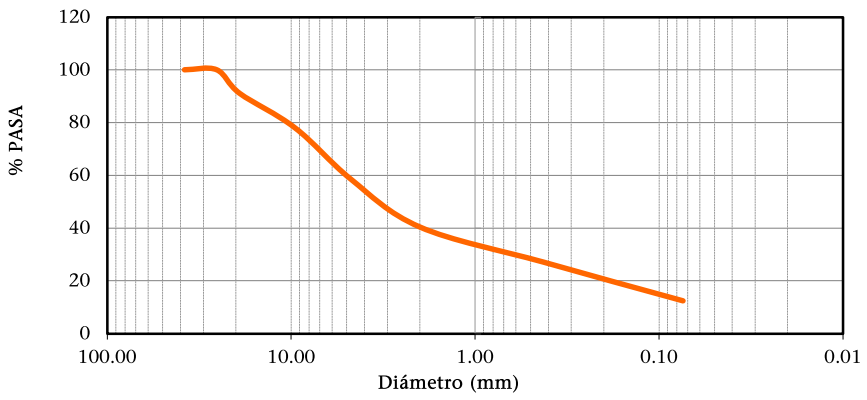



% Gravas	41.31
% Arenas	46.27
% Finos	12.42

OSPAM INGENIERIA	PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL LAFER		
PROCEDENCIA:	CANTERA TUNAL		
LOCALIZACIÓN:	CALLE 25, PAIPA (BOYACÁ)		
DESCRIPCIÓN:	MATERIAL GRANULAR CON GRAVAS DE FORMA SUB ANGULAR		
FECHA ENSAYO :	4 de agosto de 2025	FECHA INFORME:	6 de agosto de 2025

TAMIZ N°	DIÁMETRO mm	% PASA INV- TABLA 311.2			
		A-38		A-25	
1 1/2"	38.1	100.0	100.00	100.00	100.00
1"	25.4	100.0	100.00	100.00	100.00
3/4"	19.0	80.0	100.00	90.00	100.00
3/8"	9.51	60.00	85.00	65.00	90.00
4	4.76	40.00	65.00	45.00	70.00
10	2.00	30.00	50.00	35.00	55.00
40	0.425	13.000	30.00	15.00	35.00
200	0.074	9.000	18.00	10.00	20.00

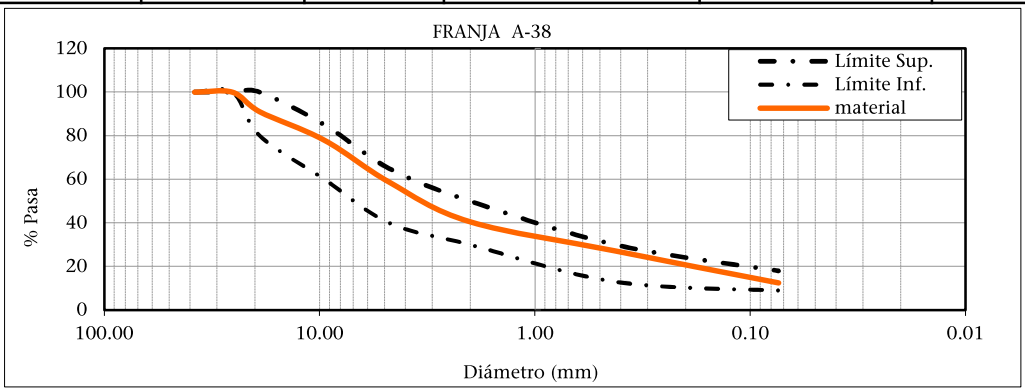

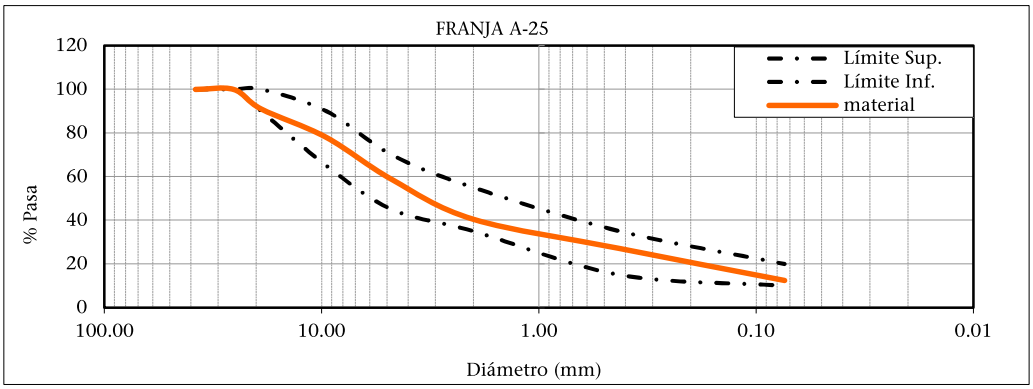

OBSERVACIONES: EL MATERIAL FUE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

OSPAM INGENIERIA


LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS I.N.V. E – 125- 126 – 13


PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ		
CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL LAFER		
PROCEDENCIA:	CANTERA TUNAL		
LOCALIZACIÓN:	CALLE 25, PAIPA (BOYACÁ)		
DESCRIPCIÓN:	MATERIAL GRANULAR CON GRAVAS DE FORMA SUB ANGULAR		
FECHA ENSAYO :	19 de agosto de 2025	**FECHA INFORME:**	19 de agosto de 2025

ENSAYO DE LIMITES ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO			
PRUEBA Nº	1	2	3
RECIPIENTE Nº	97	87	47
PESO RECIPIENTE (g)	8.76	8.38	8.59
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	33.37	34.35	35.84
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	27.83	28.18	28.77
NÚMERO DE GOLPES	34	27	15
CONTENIDO DE AGUA (%)	**29.05**	**31.16**	**35.04**

LÍMITE PLÁSTICO			HUMEDAD NATURAL	
PRUEBA Nº	1	2	No CAPSULA	28
RECIPIENTE Nº	4	76	PESO MUESTRA HUMEDA + CAP(g)	52.35
PESO RECIPIENTE (g)	6.56	6.03	MUESTRA SECA+CAP (g)	45.94
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	11.66	12.91	PESO CAPSULA(g)	4.42
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	10.56	11.41	CONTENIDO DE HUMEDAD(%)	15.4
CONTENIDO DE AGUA (%)	**27.5**	**27.9**		

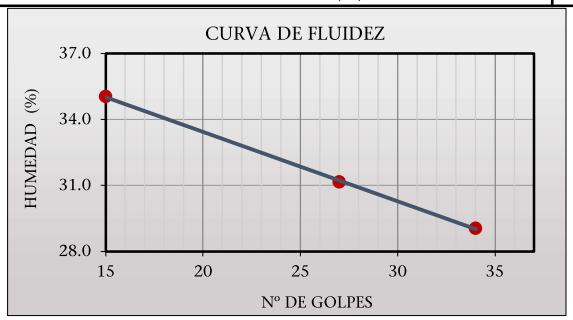

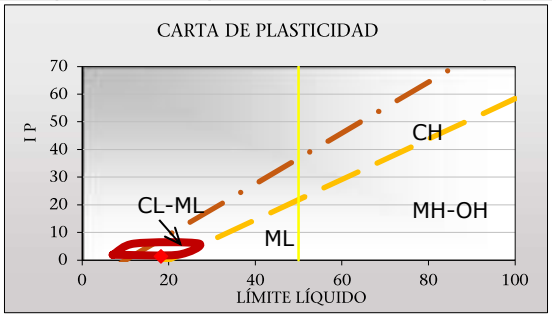

LÍMITE LÍQUIDO:	31.9	LÍMITE PLÁSTICO:	27.7	ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP):	4.15

ESPECIFICACION INVIAS:	TIPO DE MATERIAL	CARACTERISTICA	CLASE	RANGO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ARTICULO 311-13	AFIRMADO GRANULAR	LÍMITE LÍQUIDO	A	40 % MAX	SI CUMPLE
			B		
			C		
		ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)	A	4 - 9 % MAX	SI CUMPLE
			B		
			C		

OBSERVACIONES EL MATERIAL FUE SUMINSTRADO POR EL CLIENTE

OSPAM INGENIERIA	PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL LAFER
PROCEDENCIA:	CANTERA TUNAL
LOCALIZACIÓN:	CALLE 25, PAIPA (BOYACÁ)
DESCRIPCIÓN:	MATERIAL GRANULAR CON GRAVAS DE FORMA SUB ANGULAR

FECHA ENSAYO :	19 de agosto de 2025	FECHA INFORME:	19 de agosto de 2025


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOSI.N.V. E – 213 – 13

ANTES DE LAVADO	
PESO PLATÓN (gr)	2717
PESO PLATÓN + MUEST (gr)	5064
PESO MUESTRA (gr)	2347

DESPUÉS DE LAVADO	
PESO PLATÓN (gr)	2717
PESO PLATÓN + MUESTRA (gr)	4919
PESO MUESTRA SECA (gr)	2202
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	6.18

CORRECCIÓN	
PESO TOTAL MUESTRA (gr)	2347.00
Σ PESOS RETENIDOS (gr)	2202.00
ERROR (gr)	145.00
ERROR (%)	6.18

TAMIZ Nº	DIÁMETRO, mm	PESO RETENIDO, gr	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%PASA
1 1/2"	38.1	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.4	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.0	196.86	8.94	8.94	91.06
3/8"	9.51	287.41	13.05	21.99	78.01
4	4.76	425.35	19.32	41.31	58.69
10	2.00	401.53	18.23	59.54	40.46
40	0.425	293.56	13.33	72.88	27.12
200	0.074	323.74	14.70	87.58	12.42
FONDO		273.55	12.42	100.00	0.00
Σ		2202.00			

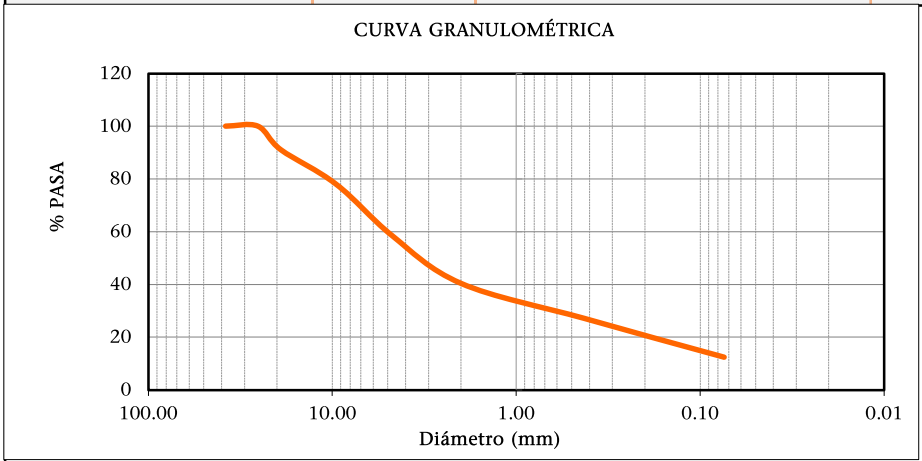


% Gravas	41.31
% Arenas	46.27
% Finos	12.42


OSPAM INGENIERIA	PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL LAFER
PROCEDENCIA:	CANTERA TUNAL
LOCALIZACIÓN:	CALLE 25, PAIPA (BOYACÁ)
DESCRIPCIÓN:	MATERIAL GRANULAR CON GRAVAS DE FORMA SUB ANGULAR

FECHA ENSAYO :	19 de agosto de 2025	FECHA INFORME:	19 de agosto de 2025

TAMIZ N°	DIÁMETRO mm	% PASA INV- TABLA 311.2			
		A-38		A-25	
1 1/2"	38.1	100.0	100.00	100.00	100.00
1"	25.4	100.0	100.00	100.00	100.00
3/4"	19.0	80.0	100.00	90.00	100.00
3/8"	9.51	60.00	85.00	65.00	90.00
4	4.76	40.00	65.00	45.00	70.00
10	2.00	30.00	50.00	35.00	55.00
40	0.425	13.000	30.00	15.00	35.00
200	0.074	9.000	18.00	10.00	20.00

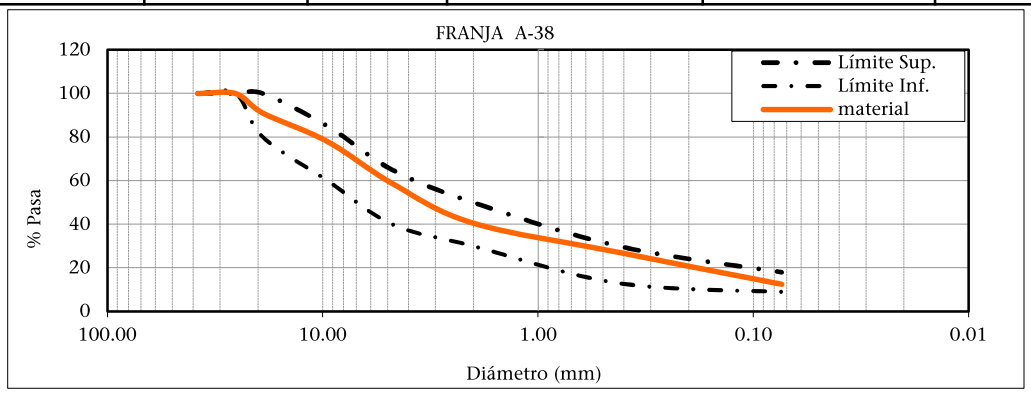

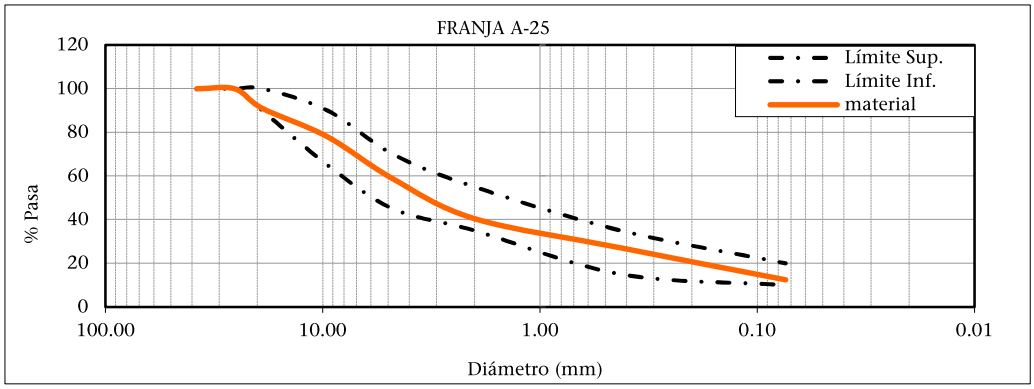


OBSERVACIONES: EL MATERIAL FUE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC 673

OSPAM

Codigo cliente:	0045 -OSP-CT-RC- 01
Fecha ingreso:	AGOSTO DE 2025
Nombre o razón social	UNIÓN TEMPORAL LAFER
Cédula o Nit	901.941.593-1
Dirección	Calle 25, Paipa (Boyacá)
Teléfono Contacto	310 4828105
Obra	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
Correo electrónico	interventoria.andespaipa25@gmail.com

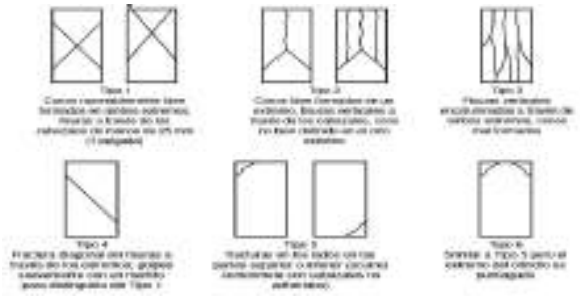

Datos de especímenes											Resultados Falla compresión						
N°	Cód	Cód. Cliente	Fecha		Edad (días)	Slump cm	f'c psi Diseño	Elemento estructural	Diámet cm	Altura cm	Peso Kg	Carga		Falla	Resistencia		Peso Unitario gr/cm³	f'c (%)
			Toma	Falla								KN	Kg		Kg/cm²	psi		
1	978	045	lun,04/ago/2025	lun,11/ago/2025	7	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.1	12.77	253.15	25814	2	146.1	2086.8	2.4	69.6%
2	979	045	lun,04/ago/2025	lun,18/ago/2025	14	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.1	12.77	361.37	36848	3	208.5	2978.8	2.4	99.3%
3	980	045	lun,04/ago/2025	lun,01/sep/2025	28	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30	12.72	395.62	40342	3	228.3	3261.2	2.4	108.7%
4	981	000	mié,13/ago/2025	mié,20/ago/2025	7	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.2	12.81	263.27	26845	3	151.9	2170.2	2.4	72.3%
5	982	000	mié,13/ago/2025	mié,27/ago/2025	14	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.1	12.77	383.37	39092	3	221.2	3160.2	2.4	105.3%
6	983	000	mié,13/ago/2025	mié,10/sep/2025	28	NE	3000	PLACA BASE CAJAS DE INSPECCIÓN	15	30.2	12.81	408.62	41667	3	235.8	3368.4	2.4	112.3%

ANEXO NO.03

INFORMES SEMANALES

UNION TEMPORAL

LAFER

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2103 DE 2025

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

Contrato ___X___ Convenio _____	**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA SEMANA No.**	3	**CONTRATO / CONVENIO No.**	2103 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

MUNICIPIO:	PAIPA	**DEPARTAMENTO:**	BOYACÁ	**PERIODO DEL INFORME DESDE:**	28/jul/2025	**HASTA:**	03/ago/2025	**FECHA INFORME:**	04/ago/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2070 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	217.65%
VALOR INICIAL :	$ 7,166,268,115.93
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7,166,268,115.93


CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	2103 DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LAFER
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	217.65%
VALOR INICIAL :	$ 530,566,747.90
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 530,566,747.90

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL
PROYECTO		**100.000%**	**0.347%**	**0.347%**
I	**PRELIMINARES**	**2.210%**	**0.000%**	**0.000%**
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	**0.716%**	0.000%	0.000%
1.02	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	**0.151%**	0.000%	0.000%
1.03	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	**0.113%**	0.000%	0.000%
1.04	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	**0.091%**	0.000%	0.000%
1.05	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	**0.970%**	0.000%	0.000%
1.06	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	**0.169%**	0.000%	0.000%
II	**PISOS**	**8.312%**	**0.113%**	**0.113%**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**0.306%**	0.102%	0.102%
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	**1.219%**	0.011%	0.011%
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**3.385%**	0.000%	0.000%
2.4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**0.394%**	0.000%	0.000%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**1.247%**	0.000%	0.000%
2.6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	**0.064%**	0.000%	0.000%
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	**0.403%**	0.000%	0.000%
2.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**0.240%**	0.000%	0.000%
2.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**1.053%**	0.000%	0.000%
III	**OBRAS DE URBANISMO**	**22.485%**	**0.000%**	**0.000%**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	**1.294%**	0.113%	0.000%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	**3.382%**	0.000%	0.000%
3.3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	**0.211%**	0.000%	0.000%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	**0.083%**	0.000%	0.000%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	**0.219%**	0.000%	0.000%
3.6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	**4.519%**	0.000%	0.000%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	**1.820%**	0.000%	0.000%
3.8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	**1.912%**	0.000%	0.000%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	**0.630%**	0.000%	0.000%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	**0.253%**	0.000%	0.000%
3.11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	**0.529%**	0.000%	0.000%
3.12	LOSETA PREFABRICA A-20	**5.392%**	0.000%	0.000%
3.13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	**0.556%**	0.000%	0.000%
3.14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	**1.483%**	0.000%	0.000%
3.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	**0.098%**	0.000%	0.000%
3.16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**0.103%**	0.000%	0.000%
IV	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**	**0.246%**	**0.000%**	**0.000%**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	**0.092%**	0.000%	0.000%
4.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	**0.096%**	0.000%	0.000%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	**0.052%**	0.000%	0.000%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

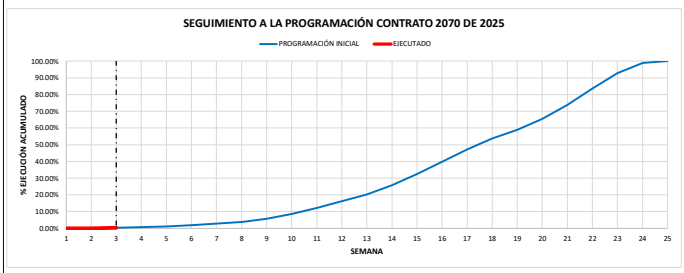

Observaciones:

Se registra un avance semanal inferior al programado, para el periodo que comprende el informe semanal No.02, se tiene un avance del 0.35% frente a un programado de 0.41%, lo cual es un indicador negativo del desarrollo del proyecto. En la semana reportada en el presente informe se efectuaron trabajos administrativos con el fin de suscribir la modificatoria de cantidades No.01 necesaria para dar inicio a las actividades que hacen parte de la ruta critica de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	**0.006%**	0.000%	0.000%
V	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**56.340%**	**0.230%**	**0.230%**
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.440%**	**0.000%**	**0.000%**
5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.075%**	0.000%	0.000%
5.02	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.189%**	0.000%	0.000%
5.03	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.176%**	0.000%	0.000%
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA	**5.629%**	0.000%	0.000%
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÀNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	**0.759%**	0.000%	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	**3.542%**	0.000%	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	**0.090%**	0.000%	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÀNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	**0.062%**	0.000%	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.183%**	0.000%	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.231%**	0.000%	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	**0.582%**	0.000%	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	**0.180%**	0.000%	0.000%
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T	**12.942%**	0.230%	0.230%
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.276%**	0.000%	0.000%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	**0.125%**	0.000%	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB).	**0.092%**	0.000%	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**5.250%**	0.000%	0.000%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**3.609%**	0.000%	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.195%**	0.000%	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	**2.147%**	0.054%	0.054%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	**1.101%**	0.176%	0.176%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	**0.146%**	0.000%	0.000%
	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSION	**32.133%**	0.000%	0.000%
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	**1.238%**	0.000%	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	**5.295%**	0.000%	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	**0.129%**	0.000%	0.000%
5.24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÀNEO TR-2002	**0.293%**	0.000%	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	**0.458%**	0.000%	0.000%







5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	**0.099%**	0.000%	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**17.458%**	0.000%	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**2.624%**	0.000%	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**3.126%**	0.000%	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**1.413%**	0.000%	0.000%
	ALUMBRADO PÚBLICO	**5.196%**	0.000%	0.000%
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	**0.553%**	0.000%	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	**0.291%**	0.000%	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	**1.288%**	0.000%	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.327%**	0.000%	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.252%**	0.000%	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	**0.131%**	0.000%	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	**0.355%**	0.000%	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	**0.270%**	0.000%	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	**0.087%**	0.000%	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.020%**	0.000%	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.586%**	0.000%	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	**1.038%**	0.000%	0.000%
VI	**OBRAS DE PAISAJISMO**	**1.196%**	**0.000%**	**0.000%**
6.1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	**1.064%**	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	**0.132%**	0.000%	0.000%
VII	**MOBILIARIO**	**6.591%**	**0.000%**	**0.000%**
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	**0.218%**	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	**0.699%**	0.000%	0.000%
7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	**1.974%**	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	**1.676%**	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	**2.024%**	0.000%	0.000%
VIII	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**0.461%**	**0.000%**	**0.000%**
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	**0.043%**	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	**0.222%**	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	**0.166%**	0.000%	0.000%

8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	**0.030%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**0.636%**	0.002%	0.002%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	**0.602%**	0.002%	0.002%
		PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL	**0.347%**	
		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	**0.347%**	

CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %
Acumulado anterior	$ 9,311,204.58	$ -	0.00%
Durante el periodo de reporte	$ 14,123,416.44	$ -	0.00%
Acumulado actual	$ 29,388,924.58	$ 24,556,929.94	83.56%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			0.4101%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			0.3427%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Valor total del contrato	$ 7,166,268,115.93
Valor total proyectado inicial	$ 7,166,268,115.93
Valor total ejecutado periodo	$ 24,556,929.94
% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA	0.343%

ELABORA INTERVENTORIA:

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2103 DE 2025

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA SEMANA No.	4	CONTRATO / CONVENIO No.	2103 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ	PERIODO DEL INFORME DESDE:	04/ago/2025	HASTA:	10/ago/2025	FECHA INFORME:	11/ago/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2070 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	223.53%
VALOR INICIAL :	$ 7,166,268,115.93
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7,166,268,115.93


CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	2103 DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LAFER
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	223.53%
VALOR INICIAL :	$ 530,566,747.90
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 530,566,747.90

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL
PROYECTO		**100.000%**	**0.670%**	**0.328%**
I	**PRELIMINARES**	**2.210%**	**0.001%**	**0.001%**
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	**0.716%**	0.000%	0.000%
1.02	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	**0.151%**	0.000%	0.000%
1.03	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	**0.113%**	0.000%	0.000%
1.04	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	**0.091%**	0.001%	0.001%
1.05	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	**0.970%**	0.000%	0.000%
1.06	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	**0.169%**	0.000%	0.000%
II	**PISOS**	**8.312%**	**0.351%**	**0.238%**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**0.306%**	0.204%	0.102%
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	**1.219%**	0.113%	0.102%
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**3.385%**	0.000%	0.000%
2.4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**0.394%**	0.000%	0.000%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**1.247%**	0.034%	0.034%
2.6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	**0.064%**	0.000%	0.000%
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	**0.403%**	0.000%	0.000%
2.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**0.240%**	0.000%	0.000%
2.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**1.053%**	0.000%	0.000%
III	**OBRAS DE URBANISMO**	**22.485%**	**0.000%**	**0.000%**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	**1.294%**	0.000%	0.000%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	**3.382%**	0.000%	0.000%
3.3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	**0.211%**	0.000%	0.000%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	**0.083%**	0.000%	0.000%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	**0.219%**	0.000%	0.000%
3.6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	**4.519%**	0.000%	0.000%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	**1.820%**	0.000%	0.000%
3.8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	**1.912%**	0.000%	0.000%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	**0.630%**	0.000%	0.000%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	**0.253%**	0.000%	0.000%
3.11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	**0.529%**	0.000%	0.000%
3.12	LOSETA PREFABRICA A-20	**5.392%**	0.000%	0.000%
3.13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	**0.556%**	0.000%	0.000%
3.14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	**1.483%**	0.000%	0.000%
3.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	**0.098%**	0.000%	0.000%
3.16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**0.103%**	0.000%	0.000%
IV	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**	**0.246%**	**0.000%**	**0.000%**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	**0.092%**	0.000%	0.000%
4.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	**0.096%**	0.000%	0.000%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	**0.052%**	0.000%	0.000%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

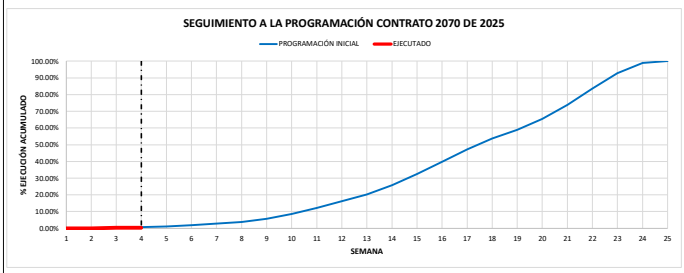

Observaciones:

Se registra un avance semanal inferior al programado, para el periodo que comprende el presente informe semanal, se tiene un avance del 0.670% frente a un programado de 0.686% lo cual es un indicador negativo del desarrollo del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	**0.006%**	0.000%	0.000%
V	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**56.340%**	**0.318%**	**0.088%**
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.440%**	**0.000%**	**0.000%**
5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.075%**	0.000%	0.000%
5.02	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.189%**	0.000%	0.000%
5.03	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.176%**	0.000%	0.000%
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA	**5.629%**	0.000%	0.000%
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	**0.759%**	0.000%	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	**3.542%**	0.000%	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	**0.090%**	0.000%	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	**0.062%**	0.000%	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.183%**	0.000%	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.231%**	0.000%	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	**0.582%**	0.000%	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	**0.180%**	0.000%	0.000%
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T	**12.942%**	0.318%	0.088%
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.276%**	0.000%	0.000%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	**0.125%**	0.000%	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB).	**0.092%**	0.000%	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**5.250%**	0.000%	0.000%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**3.609%**	0.000%	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.195%**	0.000%	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	**2.147%**	0.054%	0.000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	**1.101%**	0.264%	0.088%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	**0.146%**	0.000%	0.000%
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	**32.133%**	0.000%	0.000%
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	**1.238%**	0.000%	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	**5.295%**	0.000%	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	**0.129%**	0.000%	0.000%
5.24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002	**0.293%**	0.000%	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	**0.458%**	0.000%	0.000%

5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	**0.099%**	0.000%	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**17.458%**	0.000%	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**2.624%**	0.000%	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**3.126%**	0.000%	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**1.413%**	0.000%	0.000%
	ALUMBRADO PÚBLICO	**5.196%**	0.000%	0.000%
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	**0.553%**	0.000%	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	**0.291%**	0.000%	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	**1.288%**	0.000%	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.327%**	0.000%	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.252%**	0.000%	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	**0.131%**	0.000%	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	**0.355%**	0.000%	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	**0.270%**	0.000%	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	**0.087%**	0.000%	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.020%**	0.000%	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.586%**	0.000%	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	**1.038%**	0.000%	0.000%
VI	**OBRAS DE PAISAJISMO**	**1.196%**	**0.000%**	**0.000%**
6.1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	**1.064%**	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	**0.132%**	0.000%	0.000%
VII	**MOBILIARIO**	**6.591%**	**0.000%**	**0.000%**
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	**0.218%**	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	**0.699%**	0.000%	0.000%
7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	**1.974%**	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	**1.676%**	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	**2.024%**	0.000%	0.000%
VIII	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**0.461%**	**0.000%**	**0.000%**
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	**0.043%**	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	**0.222%**	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	**0.166%**	0.000%	0.000%

8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	**0.030%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**0.636%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	**0.602%**	0.002%	0.002%
		PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL	**0.328%**	
		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	**0.670%**	

CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %
Acumulado anterior	$ 29,388,924.58	$ 24,556,929.94	83.56%
Durante el periodo de reporte	$ 19,793,400.97	$ 23,474,087.43	118.60%
Acumulado actual	$ 49,182,325.55	$ 48,031,017.37	97.66%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			0.6863%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			0.6702%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Valor total del contrato	$ 7,166,268,115.93
Valor total proyectado inicial	$ 7,166,268,115.93
Valor total ejecutado periodo	$ 48,031,017.37
% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA	0.670%

ELABORA INTERVENTORIA:

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2103 DE 2025

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA SEMANA No.	5	CONTRATO / CONVENIO No.	2103 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ	PERIODO DEL INFORME DESDE:	11/ago/2025	HASTA:	17/ago/2025	FECHA INFORME:	18/ago/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2070 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	20.12%
VALOR INICIAL :	$ 7,166,268,115.93
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7,166,268,115.93


CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	2103 DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LAFER
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	20.12%
VALOR INICIAL :	$ 530,566,747.90
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 530,566,747.90

INFORMACION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL
PROYECTO		**100.000%**	**0.897%**	**0.226%**
I	**PRELIMINARES**	**2.210%**	**0.004%**	**0.003%**
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	**0.716%**	0.000%	0.000%
1.02	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	**0.151%**	0.003%	0.003%
1.03	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	**0.113%**	0.000%	0.000%
1.04	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	**0.091%**	0.001%	0.000%
1.05	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	**0.970%**	0.000%	0.000%
1.06	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	**0.169%**	0.000%	0.000%
II	**PISOS**	**8.312%**	**0.383%**	**0.032%**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**0.306%**	0.230%	0.026%
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	**1.219%**	0.118%	0.005%
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**3.385%**	0.000%	0.000%
2.4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**0.394%**	0.000%	0.000%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**1.247%**	0.036%	0.001%
2.6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	**0.064%**	0.000%	0.000%
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	**0.403%**	0.000%	0.000%
2.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**0.240%**	0.000%	0.000%
2.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**1.053%**	0.000%	0.000%
III	**OBRAS DE URBANISMO**	**22.485%**	**0.000%**	**0.000%**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	**1.294%**	0.000%	0.000%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	**3.382%**	0.000%	0.000%
3.3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	**0.211%**	0.000%	0.000%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	**0.083%**	0.000%	0.000%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	**0.219%**	0.000%	0.000%
3.6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	**4.519%**	0.000%	0.000%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	**1.820%**	0.000%	0.000%
3.8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	**1.912%**	0.000%	0.000%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	**0.630%**	0.000%	0.000%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	**0.253%**	0.000%	0.000%
3.11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	**0.529%**	0.000%	0.000%
3.12	LOSETA PREFABRICA A-20	**5.392%**	0.000%	0.000%
3.13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	**0.556%**	0.000%	0.000%
3.14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	**1.483%**	0.000%	0.000%
3.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	**0.098%**	0.000%	0.000%
3.16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**0.103%**	0.000%	0.000%
IV	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**	**0.246%**	**0.000%**	**0.000%**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	**0.092%**	0.000%	0.000%
4.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	**0.096%**	0.000%	0.000%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	**0.052%**	0.000%	0.000%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

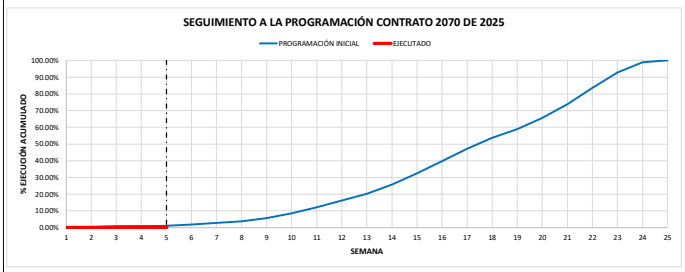

Observaciones:

Se registra un avance semanal inferior al programado, para el periodo que comprende el presente informe semanal, se tiene un avance del 0.897% frente a un programado de 1.157% lo cual es un indicador negativo del desarrollo del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	**0.006%**	0.000%	0.000%
V	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**56.340%**	**0.504%**	**0.186%**
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.440%**	**0.000%**	**0.000%**
5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.075%**	0.000%	0.000%
5.02	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.189%**	0.000%	0.000%
5.03	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.176%**	0.000%	0.000%
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA	**5.629%**	0.000%	0.000%
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	**0.759%**	0.000%	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	**3.542%**	0.000%	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	**0.090%**	0.000%	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	**0.062%**	0.000%	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.183%**	0.000%	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.231%**	0.000%	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	**0.582%**	0.000%	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	**0.180%**	0.000%	0.000%
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T	**12.942%**	0.504%	0.186%
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.276%**	0.000%	0.000%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	**0.125%**	0.000%	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB).	**0.092%**	0.000%	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**5.250%**	0.000%	0.000%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**3.609%**	0.000%	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.195%**	0.000%	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	**2.147%**	0.107%	0.054%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	**1.101%**	0.397%	0.132%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	**0.146%**	0.000%	0.000%
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	**32.133%**	0.000%	0.000%
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	**1.238%**	0.000%	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	**5.295%**	0.000%	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	**0.129%**	0.000%	0.000%
5.24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002	**0.293%**	0.000%	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	**0.458%**	0.000%	0.000%

5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	**0.099%**	0.000%	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**17.458%**	0.000%	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**2.624%**	0.000%	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**3.126%**	0.000%	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**1.413%**	0.000%	0.000%
	ALUMBRADO PÚBLICO	**5.196%**	0.000%	0.000%
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	**0.553%**	0.000%	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	**0.291%**	0.000%	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	**1.288%**	0.000%	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.327%**	0.000%	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.252%**	0.000%	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	**0.131%**	0.000%	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	**0.355%**	0.000%	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	**0.270%**	0.000%	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	**0.087%**	0.000%	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.020%**	0.000%	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.586%**	0.000%	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	**1.038%**	0.000%	0.000%
VI	**OBRAS DE PAISAJISMO**	**1.196%**	**0.000%**	**0.000%**
6.1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	**1.064%**	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	**0.132%**	0.000%	0.000%
VII	**MOBILIARIO**	**6.591%**	**0.000%**	**0.000%**
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	**0.218%**	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	**0.699%**	0.000%	0.000%
7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	**1.974%**	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	**1.676%**	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	**2.024%**	0.000%	0.000%
VIII	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**0.461%**	**0.000%**	**0.000%**
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	**0.043%**	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	**0.222%**	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	**0.166%**	0.000%	0.000%

8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	**0.030%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**0.636%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	**0.602%**	0.002%	0.002%
		PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL	**0.226%**	
		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	**0.897%**	

CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %
Acumulado anterior	$ 49,182,325.55	$ 23,474,087.43	47.73%
Durante el periodo de reporte	$ 33,732,780.33	$ 16,217,163.34	48.08%
Acumulado actual	$ 82,915,105.88	$ 64,248,180.71	77.49%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			1.1570%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			0.8965%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Valor total del contrato	$ 7,166,268,115.93
Valor total proyectado inicial	$ 7,166,268,115.93
Valor total ejecutado periodo	$ 64,248,180.71
% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA	0.897%

ELABORA INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2103 DE 2025

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA SEMANA No.	6	CONTRATO / CONVENIO No.	2103 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ	PERIODO DEL INFORME DESDE:	18/ago/2025	HASTA:	24/ago/2025	FECHA INFORME:	25/ago/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2070 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	24.26%
VALOR INICIAL :	$ 7,166,268,115.93
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7,166,268,115.93


CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	2103 DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LAFER
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	24.26%
VALOR INICIAL :	$ 530,566,747.90
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 530,566,747.90

INFORMACION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL
PROYECTO		**100.000%**	**0.945%**	**0.048%**
I	**PRELIMINARES**	**2.210%**	**0.004%**	**0.000%**
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	**0.716%**	0.000%	0.000%
1.02	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	**0.151%**	0.003%	0.000%
1.03	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	**0.113%**	0.000%	0.000%
1.04	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	**0.091%**	0.002%	0.000%
1.05	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	**0.970%**	0.000%	0.000%
1.06	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	**0.169%**	0.000%	0.000%
II	**PISOS**	**8.312%**	**0.431%**	**0.048%**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**0.306%**	0.257%	0.027%
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	**1.219%**	0.133%	0.016%
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**3.385%**	0.000%	0.000%
2.4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**0.394%**	0.000%	0.000%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**1.247%**	0.041%	0.005%
2.6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	**0.064%**	0.000%	0.000%
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	**0.403%**	0.000%	0.000%
2.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**0.240%**	0.000%	0.000%
2.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**1.053%**	0.000%	0.000%
III	**OBRAS DE URBANISMO**	**22.485%**	**0.000%**	**0.000%**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	**1.294%**	0.000%	0.000%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	**3.382%**	0.000%	0.000%
3.3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	**0.211%**	0.000%	0.000%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	**0.083%**	0.000%	0.000%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	**0.219%**	0.000%	0.000%
3.6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	**4.519%**	0.000%	0.000%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	**1.820%**	0.000%	0.000%
3.8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	**1.912%**	0.000%	0.000%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	**0.630%**	0.000%	0.000%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	**0.253%**	0.000%	0.000%
3.11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	**0.529%**	0.000%	0.000%
3.12	LOSETA PREFABRICA A-20	**5.392%**	0.000%	0.000%
3.13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	**0.556%**	0.000%	0.000%
3.14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	**1.483%**	0.000%	0.000%
3.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	**0.098%**	0.000%	0.000%
3.16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**0.103%**	0.000%	0.000%
IV	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**	**0.246%**	**0.000%**	**0.000%**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	**0.092%**	0.000%	0.000%
4.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	**0.096%**	0.000%	0.000%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	**0.052%**	0.000%	0.000%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

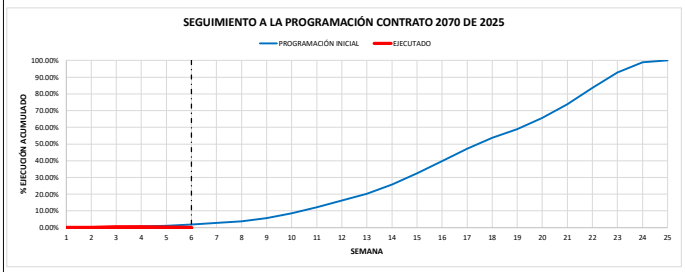

Observaciones:

Se registra un avance semanal inferior al programado, para el periodo que comprende el presente informe semanal, se tiene un avance del 0.947% frente a un programado de 1.943% lo cual es un indicador negativo del desarrollo del proyecto.Con el fin de mitigar el atraso reportado, se solicita a contratista de obra intensificar actividades, sin embargo, una de las causas que se atribuyen al retraso generado es la modificatoria de cantidades No.1 para dar inicio a actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	**0.006%**	0.000%	0.000%
V	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**56.340%**	**0.504%**	**0.000%**
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.440%**	**0.000%**	**0.000%**
5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.075%**	**0.000%**	0.000%
5.02	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.189%**	**0.000%**	0.000%
5.03	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.176%**	**0.000%**	0.000%
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA	**5.629%**	**0.000%**	0.000%
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	**0.759%**	**0.000%**	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	**3.542%**	**0.000%**	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	**0.090%**	**0.000%**	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	**0.062%**	**0.000%**	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.183%**	**0.000%**	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.231%**	**0.000%**	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	**0.582%**	**0.000%**	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	**0.180%**	**0.000%**	0.000%
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T	**12.942%**	**0.504%**	0.000%
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.276%**	**0.000%**	0.000%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	**0.125%**	**0.000%**	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB).	**0.092%**	**0.000%**	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**5.250%**	**0.000%**	0.000%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**3.609%**	**0.000%**	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.195%**	**0.000%**	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	**2.147%**	**0.107%**	0.000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	**1.101%**	**0.397%**	0.000%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	**0.146%**	**0.000%**	0.000%
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	**32.133%**	**0.000%**	0.000%
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	**1.238%**	**0.000%**	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	**5.295%**	**0.000%**	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	**0.129%**	**0.000%**	0.000%
5.24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002	**0.293%**	**0.000%**	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	**0.458%**	**0.000%**	0.000%

5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	**0.099%**	**0.000%**	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**17.458%**	**0.000%**	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**2.624%**	**0.000%**	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**3.126%**	**0.000%**	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**1.413%**	**0.000%**	0.000%
	ALUMBRADO PÚBLICO	**5.196%**	**0.000%**	0.000%
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	**0.553%**	**0.000%**	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	**0.291%**	**0.000%**	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	**1.288%**	**0.000%**	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.327%**	**0.000%**	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.252%**	**0.000%**	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	**0.131%**	**0.000%**	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	**0.355%**	**0.000%**	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	**0.270%**	**0.000%**	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	**0.087%**	**0.000%**	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.020%**	**0.000%**	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.586%**	**0.000%**	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	**1.038%**	**0.000%**	0.000%
VI	**OBRAS DE PAISAJISMO**	**1.196%**	**0.000%**	**0.000%**
6.1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	**1.064%**	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	**0.132%**	0.000%	0.000%
VII	**MOBILIARIO**	**6.591%**	**0.000%**	**0.000%**
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	**0.218%**	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	**0.699%**	0.000%	0.000%
7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	**1.974%**	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	**1.676%**	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	**2.024%**	0.000%	0.000%
VIII	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**0.461%**	**0.000%**	**0.000%**
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	**0.043%**	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	**0.222%**	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	**0.166%**	0.000%	0.000%

8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	**0.030%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**0.64%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	**0.602%**	0.005%	0.000%
		PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL	**0.048%**	
		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	**0.945%**	

CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %
Acumulado anterior	$ 82,915,105.88	$ 64,399,334.13	77.67%
Durante el periodo de reporte	$ 56,355,046.27	$ 3,463,847.57	6.15%
Acumulado actual	$ 139,270,152.15	$ 67,863,181.70	48.73%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			1.9434%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			0.9470%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Valor total del contrato	$ 7,166,268,115.93
Valor total proyectado inicial	$ 7,166,268,115.93
Valor total ejecutado periodo	$ 67,863,181.70
% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA	0.947%

ELABORA INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2103 DE 2025

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA SEMANA No.	7	CONTRATO / CONVENIO No.	2103 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ	PERIODO DEL INFORME DESDE:	25/ago/2025	HASTA:	31/ago/2025	FECHA INFORME:	01/sep/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2070 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	28.40%
VALOR INICIAL :	$ 7,166,268,115.93
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7,166,268,115.93


CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	2103 DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LAFER
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	N/A
PLAZO ADICIONAL (DIAS)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EJECUTADO %	28.40%
VALOR INICIAL :	$ 530,566,747.90
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 530,566,747.90

INFORMACION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL
PROYECTO		**100.000%**	**0.945%**	**0.000%**
I	**PRELIMINARES**	**2.210%**	**0.004%**	**0.000%**
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	**0.716%**	0.000%	0.000%
1.02	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	**0.151%**	0.003%	0.000%
1.03	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	**0.113%**	0.000%	0.000%
1.04	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	**0.091%**	0.002%	0.000%
1.05	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	**0.970%**	0.000%	0.000%
1.06	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	**0.169%**	0.000%	0.000%
II	**PISOS**	**8.312%**	**0.431%**	**0.000%**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	**0.306%**	0.257%	0.000%
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	**1.219%**	0.133%	0.000%
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**3.385%**	0.000%	0.000%
2.4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	**0.394%**	0.000%	0.000%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**1.247%**	0.041%	0.000%
2.6	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	**0.064%**	0.000%	0.000%
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	**0.403%**	0.000%	0.000%
2.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**0.240%**	0.000%	0.000%
2.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**1.053%**	0.000%	0.000%
III	**OBRAS DE URBANISMO**	**22.485%**	**0.000%**	**0.000%**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	**1.294%**	0.000%	0.000%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	**3.382%**	0.000%	0.000%
3.3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	**0.211%**	0.000%	0.000%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	**0.083%**	0.000%	0.000%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	**0.219%**	0.000%	0.000%
3.6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	**4.519%**	0.000%	0.000%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	**1.820%**	0.000%	0.000%
3.8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	**1.912%**	0.000%	0.000%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	**0.630%**	0.000%	0.000%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	**0.253%**	0.000%	0.000%
3.11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	**0.529%**	0.000%	0.000%
3.12	LOSETA PREFABRICA A-20	**5.392%**	0.000%	0.000%
3.13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	**0.556%**	0.000%	0.000%
3.14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	**1.483%**	0.000%	0.000%
3.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	**0.098%**	0.000%	0.000%
3.16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**0.103%**	0.000%	0.000%
IV	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**	**0.246%**	**0.000%**	**0.000%**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	**0.092%**	0.000%	0.000%
4.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	**0.096%**	0.000%	0.000%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	**0.052%**	0.000%	0.000%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

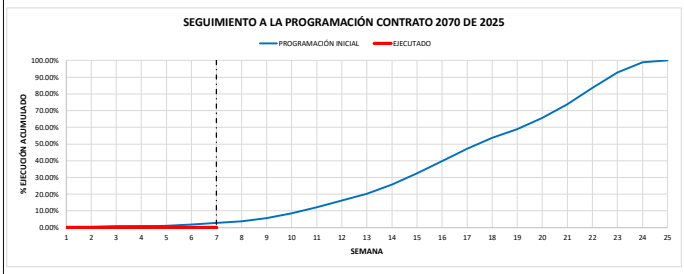

Observaciones:

Se registra un avance semanal inferior al programado, para el periodo que comprende el presente informe semanal, se tiene un avance del 0.945% frente a un programado de 2.838% lo cual es un indicador negativo del desarrollo del proyecto.El atraso presentado es atribuible al acto administrativo de modificatoria de cantidades e inclusión de ítems no previstos No.01, se espera aprobación para dar inicio con actividades que componen la ruta crítica del proyecto. Por parte del contratista de obra se efectua revisión y mantenimiento al plan de manejo de tránsito.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





4.4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	**0.006%**	0.000%	0.000%
V	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**56.340%**	**0.504%**	**0.000%**
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.440%**	**0.000%**	**0.000%**
5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	**0.075%**	**0.000%**	0.000%
5.02	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.189%**	**0.000%**	0.000%
5.03	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	**0.176%**	**0.000%**	0.000%
	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA	**5.629%**	**0.000%**	0.000%
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.	**0.759%**	**0.000%**	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.	**3.542%**	**0.000%**	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.	**0.090%**	**0.000%**	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.	**0.062%**	**0.000%**	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.183%**	**0.000%**	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	**0.231%**	**0.000%**	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	**0.582%**	**0.000%**	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	**0.180%**	**0.000%**	0.000%
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T	**12.942%**	**0.504%**	0.000%
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.276%**	**0.000%**	0.000%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	**0.125%**	**0.000%**	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB).	**0.092%**	**0.000%**	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**5.250%**	**0.000%**	0.000%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	**3.609%**	**0.000%**	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.195%**	**0.000%**	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	**2.147%**	**0.107%**	0.000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	**1.101%**	**0.397%**	0.000%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	**0.146%**	**0.000%**	0.000%
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	**32.133%**	**0.000%**	0.000%
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 75KVA	**1.238%**	**0.000%**	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÍASICO 150KVA	**5.295%**	**0.000%**	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO	**0.129%**	**0.000%**	0.000%
5.24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002	**0.293%**	**0.000%**	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	**0.458%**	**0.000%**	0.000%

5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN	**0.099%**	**0.000%**	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**17.458%**	**0.000%**	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	**2.624%**	**0.000%**	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**3.126%**	**0.000%**	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	**1.413%**	**0.000%**	0.000%
	ALUMBRADO PÚBLICO	**5.196%**	**0.000%**	0.000%
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	**0.553%**	**0.000%**	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	**0.291%**	**0.000%**	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	**1.288%**	**0.000%**	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.327%**	**0.000%**	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	**0.252%**	**0.000%**	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	**0.131%**	**0.000%**	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓNSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.	**0.355%**	**0.000%**	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIONPARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	**0.270%**	**0.000%**	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	**0.087%**	**0.000%**	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	**0.020%**	**0.000%**	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	**0.586%**	**0.000%**	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	**1.038%**	**0.000%**	0.000%
VI	**OBRAS DE PAISAJISMO**	**1.196%**	**0.000%**	**0.000%**
6.1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	**1.064%**	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICOALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	**0.132%**	0.000%	0.000%
VII	**MOBILIARIO**	**6.591%**	**0.000%**	**0.000%**
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	**0.218%**	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	**0.699%**	0.000%	0.000%
7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	**1.974%**	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	**1.676%**	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	**2.024%**	0.000%	0.000%
VIII	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	**0.461%**	**0.000%**	**0.000%**
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	**0.043%**	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	**0.222%**	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	**0.166%**	0.000%	0.000%

8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	**0.030%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**0.64%**	0.000%	0.000%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	**0.602%**	0.005%	0.000%
		PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL	**0.000%**	
		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	**0.945%**	

CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %
Acumulado anterior	$ 139,270,152.15	$ 67,712,028.28	48.62%
Durante el periodo de reporte	$ 64,134,334.14	$ -	0.00%
Acumulado actual	$ 203,404,486.29	$ 67,712,028.28	33.29%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			2.8384%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			0.9449%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Valor total del contrato	$ 7,166,268,115.93
Valor total proyectado inicial	$ 7,166,268,115.93
Valor total ejecutado periodo	$ 67,712,028.28
% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA	0.945%

ELABORA INTERVENTORIA

ANEXO NO.04

COMITÉS DE OBRA

UNION TEMPORAL

LAFER

Acta de comité 01 de agosto de 2025

Siendo las 8:50 am, en las instalaciones del salón comunal del barrio villa panorama se reunen contratista de obra, interventoria, supervisión y veeduria ciudadana. se abordan los temas relacionados a continuación:

1. Se realiza la socialización general del proyecto y se responde a las inquietudes planteadas por las veedurias. En conjunto con secretaria de infraestructura municipal se realiza una contextualización de la linea de tiempo que antecede al proyecto.

2. El señor Polo manifiesta inconformismo respecto a los diseños contemplados y aprobados. Solicitan se realice un rediseño y se contemplen nuevos materiales

3. Se presentan inquietudes en lo referente al nivel de terminado del proyecto, comunidad manifiesta incertidumbre acerca de los niveles. Contratista de obra comparte la metodología proyectada para solucionar los problemas referentes a niveles de terminado.

4. Veeduria ciudadana solicita se alleguen documentos como lo son:

   - Contrato obra, contrato interventoría
   - Documento de cesión
   - Pólizas contrato obra e interventoría

   Interventoría, se compromete a allegar dicha documentación.

5. Dentro de la socialización al proyecto, contratista de interventoría y obra presentan problemas que han surgido en cuanto a sitios de parqueo no autorizados. Para la reunión planteada con la comunidad se solicita la presencia de personeria, espacio público, planeación y secretaria de infraestructura.

Powered by CamScanner

6. Veedurias presentan la inquietud de localización de subestación eléctrica, solicito el tema sea socializado en la próxima reunión.

7. Se reitera por parte de los participantes del comité la reunión programada con la comunidad el día martes 05 de agosto de 2025

A la presente acta de comité se anexa listado de asistencia:

Powered by CamScanner

01 de agosto de 2025 → Acta de comité.

Listado de asistencia.

- Jaime Andres Carlos Director Interv [signature] 3104828105
- Angie S. Rojas M. - Veeduría Ciudadana. [signature] 321-4946810
- Jairo Eduardo Sichacá G Dir. Obra. [signature] 3133307269
- Edwin Echeverria Cuervo [signature] 3123568416.
- Víctor Eleuterio Miranda [signature] 3134543265

Jorge Guillermo Tarazona. B [signature] 3182434092

Carlos Marro Fonseca [signature] 3153164330

Jorge Alberto Lee R [signature] 3106899289

Wilson Quiroz [signature] 3203489951

David Leonardo Hernandez Guerrero [signature] 3213980547

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	**ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO**	Gobernación de Boyacá

ACTA DE COMITÉ N°___

FECHA PRESENTE ACTA: 14 agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA	
N° CONTRATO:	2070-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
N° CONTRATO:	2103-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR

No se cuenta con acta de comité que preceda la presente reunión.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS

N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
-	No se cuenta con compromisos.		

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

TEMAS A DESARROLLAR

1. Verificación de la ubicación de los arboles que se requieren retirar.

DESARROLLO DEL COMITE

Siendo las 8:30 am, se reunen en el frente de obra localizado sobre la calle 25, entre puentes del rio Chicamocha y marqueta contratista de obra, interventoría y delegado de la secretaria de (planeación) del municipio de paipa (Ing. juan camilo larota sanabria). agricultura

Con base al tema a desarrollar, se da respuesta de la siguiente manera:

1. Previo al recorrido en campo, se realiza una breve socialización del proyecto y la razón que antecede la solicitud de aprovechamiento forestal. En campo se realiza el recorrido e identificación de las especies que se requiere retirar.

   Por parte del ingeniero juan camilo se realiza caracterización de las especies identificadas en el recorrido. El ingeniero juan camilo manifiesta que una vez se complete la caracterización y toma de información en campo, se dara inicio a actividades administrativas que permitan suscribir la documentación necesaria para solicitar el

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER / CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

Permiso de aprovechamiento forestal ante la corporación autonoma regional de Boyacá.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER / CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

COMPROMISOS PACTADOS			
N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Suscribir documentación para Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.	ing. Juan Camilo Lorotta.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CONTROL DE ASISTENCIA

Ing. Alejandro Hernandez — Interventoría

Ing Juan Camilo LoRotto — Ing. SADR/Alc Paipa

Edwin Echeverría Cuervo — Consorcio RYP

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	**ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO**	Gobernación de Boyacá

ACTA DE COMITÉ N°___

FECHA PRESENTE ACTA: 15 agosto 2025

CONTRATO DE OBRA	
N° CONTRATO:	2070-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
N° CONTRATO:	2103-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR
No se cuenta con acta anterior.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS			
N°	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
—	—	—	—

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL LAFER — CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

TEMAS A DESARROLLAR

1. Intervención a pozos de inspección

DESARROLLO DEL COMITE

Siendo las 9:00 am, se reunen en el frente de obra contratista de obra, interventoría y representantes del PDA. Se da respuesta al tema a desarrollar así:

1. Se realiza una breve descripción del objeto y actividades que se contemplan en el desarrollo de la daa. Posterior a esto, se realiza la solicitud verbal de requisitos para intervención y nivelación de pozos sobre andenes de la calle 25, representantes del PDA responden:
   - Representantes del PDA responden que se radico un oficio en el cual se describen requerimientos en cuanto a metodología y documentación para realizar la intervención.
   - Por parte de PDA se geneva el compromiso de entrega de planos record existentes en cuanto pozos (bien sea iniciales o finales)
   - Contratista de obra se compromete a entregar la documentación en el menor tiempo posible.

Powered by CamScanner

• Se realiza recorrido de obra para evidenciar nivel de pozos y la necesidad de intervención.

I

UNIÓN TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

COMPROMISOS PACTADOS			
N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Radicar planos record existentes	PDA	
2	Radicar informe solicitado por PDA	contratista obra e interventoria	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CONTROL DE ASISTENCIA

Nombre	Celular	dependencia	Firma
David Leonardo Hernandez	3213980547	Gobernación de Boyacá	
Diego Alejandro Coronado M.	321 930 2284	EPB	
Dayana Stephana Garago	3223859414	CCB	
Edwin Echeverria	3123568410	Consorcio RYP	
Alejandro Hernández	3203751169	UT LAFER	

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER / CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

ACTA DE COMITÉ N°__

FECHA PRESENTE ACTA: 15 de agosto 2025

CONTRATO DE OBRA	
N° CONTRATO:	2070-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
N° CONTRATO:	2103-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR

No se cuenta con un acta que preceda este documento.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS

N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
	No aplica		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

TEMAS A DESARROLLAR

Visita y socialización para reubicación de redes de telecomunicaciones de la empresa AMTEC.

DESARROLLO DEL COMITE

Siendo las 2:30 pm, en el frente de obra localizado en el municipio de Paipa, se reunen contratista de obra, interventoría y personal técnico de la empresa AMTEC con el fin de tratar los temas presentados anteriormente.

Se da solución de la siguiente forma:


1. Debido al objeto del contrato de obra, es necesario el desmonte de redes para posterior sobtarganización de redes, por lo cual, se socialita a personal técnico la ubicación de cajas electricas con el fin de generar un rediseño para instalación de redes.

2. Se identifican en el terreno la ubicación de las cajas y cruces proyectados en el contrato para que AMTEC Realize su diseño

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

- AMEC Recomienda instalacion de tuberia desde cajas de paso hasta cada predio, recomiendan ducto de 1" para viviendas unifamiliares.
- para edificaciones tratar de dejar 2 tubos en 2" o 3"
- Se finaliza la reunión y quedan atentos a pasar a realizar visitas periodicamente

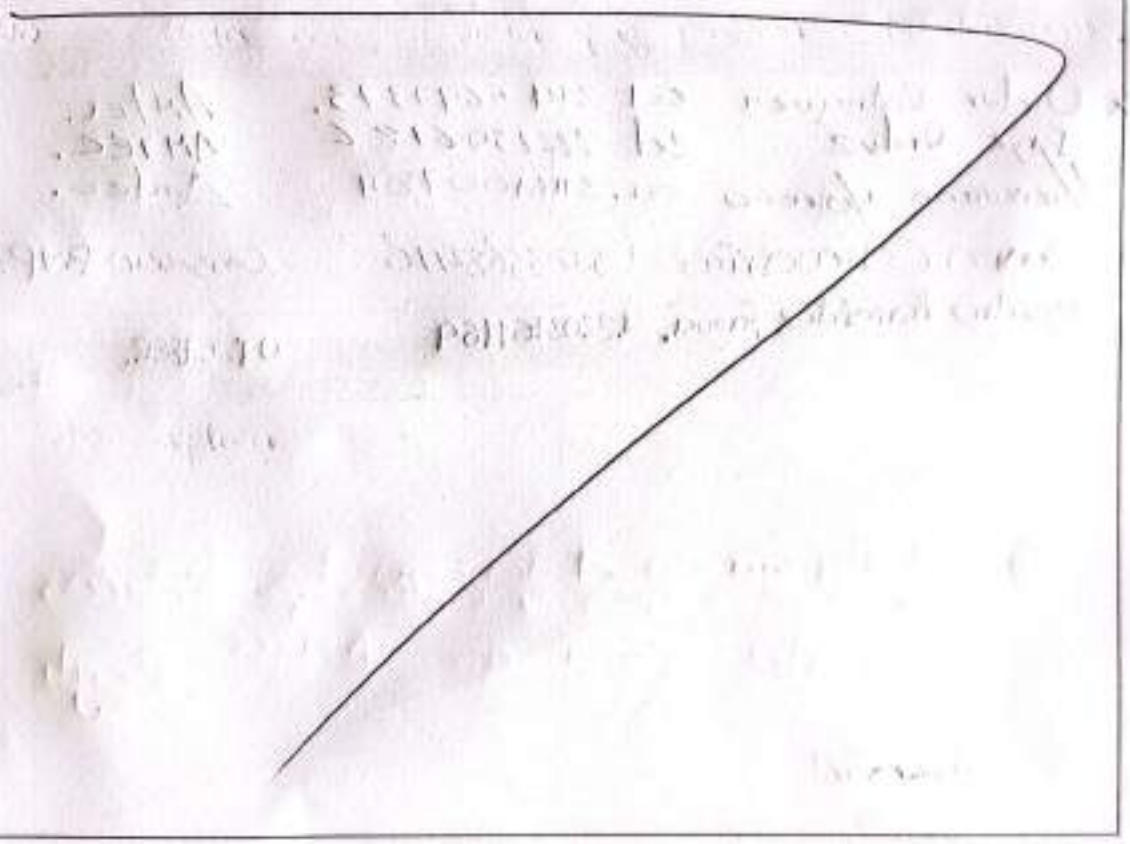

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

COMPROMISOS PACTADOS			
Nº	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CONTROL DE ASISTENCIA

x Victor Rodriguez	cel. 314 5697373.	Amtec.
Jorge Orduz	cel. 3222306186	AMTEC.
Heikeenn Moreno	cel. 3116100784	Amtec.
x Edwin Echeverria	cel 3123568416	Consorcio RYP.
Alejandro Hernández Fagua.	Cel. 3203751169	UT. LAFER.

Powered by CamScanner

ANEXO NO.05

CORRESPONDENCIA

UNION TEMPORAL

LAFER

ENVIADA

UNION TEMPORAL

LAFER

Paipa, 01 de agosto de 2025

LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
R/L CONSORCIO RYP
CONTRATISTA DE OBRA

CTO. 2103/2025-025

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en atención al plan de manejo de tránsito radicado el 25 de julio de 2025 por contratista de obra, y una vez realizada una revisión detallada de la documentación allegada, contrastando su cumplimiento con lo estipulado en la normativa vigente, esta interventoría se permite remitir las siguientes observaciones:

1. Actualizar tabla de contenido del documento ya que genera marcadores no definidos.
2. En el cuerpo del informe se debe mencionar el profesional encargado de la implementación y seguimiento al plan de manejo de tránsito.
3. Corregir información referente al contrato de interventoría.
4. Incluir en el contenido del informe las dimensiones y características de las zonas destinadas a la circulación de peatones y/o usuarios no motorizados. Al igual, se debe presentar las dimensiones y características de la señalización a implementar para el cumplimiento del PMT.
5. Anexar cronograma de obra indicando la fecha de inicio y fin de cada una de las actividades.
6. Verificar los horarios de trabajo planteados ya que no son consistentes a lo largo del desarrollo del informe.
7. Corregir el tiempo de ejecución del proyecto.
8. Ajustar presupuesto del plan de manejo de tránsito al tiempo de ejecución contractual.

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

AVAL Y RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025

2 mensajes

Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com> 2 de agosto de 2025, 7:33 p.m.
Para: direccion.infraestructuravial@boyaca.gov.co
CC: wilsonguerrerof@gmail.com
CCO: andenespaipa2025@gmail.com

Paipa, 01 de agosto de 2025

Ingeniero
OSCAR IVÁN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

SUPERVISIÓN

CTO. 2103/2025-027

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: AVAL Y RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025

Cordial saludo

Adjunto se envía documentos del asunto.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada a la presente,

Vo.Bo.
LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORÍA

2. DOCS AJUSTE FINANCIERO.rar

1.CONDICIONES CONTRACTUALES.rar

3 archivos adjuntos

0. INFORME TECNICO DE AJUSTE PAIPA V1.0.pdf
1974K

27. CTO.2103-2025-027- 01-08-2025 APROBACIÓN MODIFICATORIA.pdf
1611K

29. CTO 2070-CONS-RYP–029- 2025.pdf
7042K

Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com> 4 de agosto de 2025, 8:28 a.m.
Para: edinsonestepa@yahoo.com.co

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

0. INFORME TECNICO DE AJUSTE PAIPA V1.0.pdf
1974K

27. CTO.2103-2025-027- 01-08-2025 APROBACIÓN MODIFICATORIA.pdf
1611K

29. CTO 2070-CONS-RYP–029- 2025.pdf
7042K

Tunja, 06 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-028

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: RADICADO INFORME SEMANAL NO.03

Cordial saludo

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato de la referencia, se remite informe semanal No.03 para su revisión y aprobación.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA
Anexo: Informe semanal No.03

Tunja, 11 de agosto de 2025

LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L CONSORCIO RYP

CTO. 2103/2025-029

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.01

Cordial saludo

En atención al oficio CTO 2070- CONS- RYP – 032- 2025 del 09 de agosto de 2025 y una vez efectuada una revisión detalla a la documentación allegada correspondiente al informe mensual No.01, esta interventoría se permite remitir las siguientes observaciones:

1. Anexar resultados de ensayos de calidad del material granular tipo afirmado de acuerdo a lo dispuesto en el plan de ensayos presentado en el informe preliminar de obra.
2. No se anexa bitácora de obra.
3. No se abarcan los parámetros e indicadores mínimos dispuestos en el plan de gerencia de proyectos.
4. El anexo No.02 mezcla anexos del plan de calidad en el plan de gerencia.
5. No se evidencia el pago de seguridad social del personal operativo, así como algunos profesionales.
6. Anexar los contratos de los profesionales mínimos requeridos.

En virtud de lo anterior, se solicita que el informe sea revisado y ajustado acorde a las observaciones realizadas. El informe, con las correcciones efectuadas deberá ser presentado en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, esto con el fin de garantizar el adecuado control y seguimiento del contrato No.2070 de 2025.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Tunja, 11 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-030

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: RADICADO INFORME SEMANAL NO.04

Cordial saludo

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato de la referencia, se remite informe semanal No.04 para su revisión y aprobación. Al igual, se remite informe semanal No.04 allegado por contratista de obra.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Paipa, 12 de agosto de 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

CTO. 2103/2025-031

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cordial saludo.

Por medio de la presente, y en atención a las diversas solicitudes de información realizadas por el contratista de obra del Contrato No. 2070 de 2025, esta interventoría reitera la necesidad urgente de allegar la documentación relacionada en la Tabla No. 01. Cabe señalar que dicha información es fundamental para el adecuado desarrollo del contrato y resulta indispensable para garantizar el cumplimiento del cronograma de obra. En este sentido, las demoras en la entrega de la información afectan directamente el normal desarrollo del proyecto, generando incertidumbre respecto al inicio de algunas actividades contempladas en el cronograma y poniendo en riesgo la adecuada planeación y ejecución de las labores previstas.


Tabla 1. Relación información solicitada

N° RADICADO SALIDA	FECHA	ASUNTO	DEPENDENCIA
CTO 2070-CONS-RYP-030-2025	6 DE AGOSTO DE 2025	SOLICITUD INFORMACIÓN PREDIAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CTO 2070-CONS-RYP-027-2025	30 DE JULIO DE 2025	RADICACIÓN INVENTARIO VIAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CTO 2070-CONS-RYP-027-2025	24 DE JULIO DE 2025	SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE COMITÉ	22 DE JULIO DE 2025	ACLARACIÓN CONCEPTO INTERVENCIÓN EN ANTEJARDINES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN

En virtud de lo anterior, instamos a priorizar la entrega de la información solicitada en un término perentorio no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente



LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
ALCALDIA PAIPA
CLARO, GAS, EBSA ETC
FACTURAS
FIDUCIA
INTERVENTORIA
SST-AMB
Actualizar
7 de 59
solicitud información predial
Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com>
para planeacion
mié, 6 ago, 9:22 a.m. (hace 6 días)
Paipa, 6 de agosto de 2025
CTO 2070-CONS-RYP–030-2025
Doctora
MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACION
Municipio de Paipa
Ciudad.
Referencia: Contrato N°2070 de 2025
Objeto: ''MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRELOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ''
Asunto: solicitud información predial
Cordial saludo,
Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores desde su dependencia nos han remitido información referente a predios aledaños al proyecto, se evidencia que dentro del listado hacen falta algunos predios por identificar los cuales tienen los siguientes códigos catastrales:
01000000021509019000000000
01000000021500110000000000
01000000021500140000000000

Paipa, 6 de agosto de 2025

CTO 2070-CONS-RYP–030-2025

Doctora
MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACION
Municipio de Paipa
Ciudad.

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRELOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: solicitud información predial

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores desde su dependencia nos han remitido información referente a predios aledaños al proyecto, se evidencia que dentro del listado hacen falta algunos predios por identificar los cuales tienen los siguientes códigos catastrales:

01000000021509019000000000

01000000021500110000000000

01000000021500140000000000

01000000021500150000000000

Para estos predios se solicita la siguiente información:

CODIGO CATASTRAL
FOLIO DE MATRICULA
DIRECCION
NOMBRE PROPIETARIO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
USO DEL SUELO
VIA
FRENTE DEL PREDIO
ANCHO DE ANDEN
ANCHO DE ANTEJARDIN "ZONA DURA"

Lo anterior para revisar el ancho de intervención de acuerdo con los diseños que tenemos actualmente

Quedo atento a comentarios o inquietudes

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
Representante legal
CONSORCIO RYP



Gmail

infraestructura@paipa-boyaca.gov.co

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

ALCALDIA PAIPA
CLARO, GAS, EBSA ETC
FACTURAS
FIDUCIA
INTERVENTORIA
SST-AMB

Actualizar

2 de 10

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025 - RADICACIÓN INVENTARIO VIAL

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> mié, 30 jul, 6:22 a.m. (hace 13 días)
para infraestructura

Tunja, 30 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: RADICACIÓN INVENTARIO VIAL

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades contractuales del contrato de obra mencionado, me permito radicar ante su despacho el **inventario vial** y el **acta de vecindad de dicho inventario**, documentos que fueron elaborados con el fin de dejar constancia del estado de los elementos viales presentes en el área del proyecto.
El inventario vial se entrega con **registro fotográfico** de cada uno de los elementos identificados, incluyendo su abscisa, tipo de señal y descripción detallada del estado en que se encuentra. Por su parte, el acta de vecindad incluye la descripción, localización (abscisa) y tipo de cada señal existente en el tramo, permitiendo así validar su condición previo al inicio del proyecto. Dicho levantamiento comprende señales verticales, sumideros y sardineles ubicados a lo largo del trazado de la calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia.
Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o solicitud adicional relacionada con esta entrega.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

4 archivos adjuntos - Analizado por Gmail

Tunja, 30 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: RADICACION INVENTARIO VIAL

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades contractuales del contrato de obra mencionado, me permito radicar ante su despacho el **inventario vial** y el **acta de vecindad de dicho inventario**, documentos que fueron elaborados con el fin de dejar constancia del estado de los elementos viales presentes en el área del proyecto.

El inventario vial se entrega con **registro fotográfico** de cada uno de los elementos identificados, incluyendo su abscisa, tipo de señal y descripción detallada del estado en que se encuentra. Por su parte, el acta de vecindad incluye la descripción, localización (abscisa) y tipo de cada señal existente en el tramo, permitiendo así validar su condición previo al inicio del proyecto. Dicho levantamiento comprende señales verticales, sumideros y sardineles ubicados a lo largo del trazado de la calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o solicitud adicional relacionada con esta entrega.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N° 1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

CONSORCIO RYP	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	CÓDIGO: GPDI-INV-0525-00
		VERSIÓN- V-00

INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN

NÚMERO	ABSCISA	COSTADO	SEÑAL	DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA SEÑAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	K0+47	DER	SP-25	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y CON STICKERS PEGADOS. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
2	K0+65	DER	SR-30	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
3	K0+74	DER	SP-25	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
4	K0+102	DER	SP-25A	COMO SE OBSERVA, EL RESTAURANTE "TRONCOS Y BRASAS" HACE USO DE LA SEÑAL COMO SOPORTE PARA SUS ANUNCIOS PUBLICITARIOS. LA SEÑAL SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
5	K0+162	DER	SP-46B	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
6	K0+178	DER	SR-01	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y CON STICKERS PEGADOS. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	 

7	K0+184	DER	SR-28	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	 
8	K0+201	DER	SR-26	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
9	K0+215	DER	SP-26	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
10	K0+279	DER	SR-01	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
11	K0+283	DER	SR-28	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
12	K0+307	DER	SP-46B	EL TABLERO SE ENCUENTRA DAÑADO EN UNO DE SUS COSTADOS. PRESENTA OXIDO EN SU ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
13	K0+351	DER	SP-25	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	

14	K0+386	DER	SP-25A	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
15	K0+429	DER	SP-47B	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
16	K0+448	DER	SR-01	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
17	K0+471	DER	SP-25A	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
18	K0+496	DER	SR-01	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
19	K0+500	DER	SR-28	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
20	K0+540	DER	SR-01	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO. SE ENCUENTRA COMO SOPORTE PUBLICITARIO DE LOCAL COMERCIAL.	

21	K0+553	DER	SR-28	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. SE ENCUENTRA COMO SOPORTE DE VENDEDOR INFORMAL.	
22	K0+570	DER	SP-47B	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
23	K0+600	DER	SR-01	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
24	K0+602	DER	SR-28	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
25	K0+695	DER	SP-47B	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
26	K0+775	DER	SP-46	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
27	K0+785	IZQ	SR-30	SE ENCUENTRA TORCIDA. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TABLERO.	

28	K0+690	IZQ	SR-26	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE. TABLERO SE ENCUENTRA TORCIDO EN EL COSTADO DERECHO. TIENE UNA VARILLA EXTERNA OXIDANDOSE	
29	K0+661	IZQ	SP-26	SE ENCUENTRA COMO SOPORTE PUBLICITARIO DEL ESTABLECIMIENTO "POCO COCO", PRESENTA OXIDO EN SU ESTRUCTURA DE SOPORTE	 
30	K0+613	IZQ	SP-26	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
31	K0+570	IZQ	SP-47B	SEÑAL TORCIDA. PRESENTA DESGASTE EN LOS BORDES DEL TABLERO. PRESENTA OXIDO EN EL TAVLERO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	
32	K0+500	IZQ	SP-25	PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TABLERO	
33	K0+471	IZQ	SP-25A	SEÑAL TORCIDA. UN COSTADO DEL TABLERO SE ENCUENTRA TORCIDO Y PRESENTA OXIDO EN LA BASE DE SOPORTE	
34	K0+450	IZQ	SR-28	SEÑAL EN BUEN ESTADO. NO SE ECUENTRA DENTRO DEL INVENTARIO ENTREGADO COMO INSUMO BASE	

35	K0+446	IZQ	SR-01	SEÑAL SE ENCUENTRA TORCIDA. PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
36	K0+430	IZQ	SP-47B	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TABLERO. PRESENTA STICKERS EN EL TABLERO	
37	K0+426	IZQ	SP-25A	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE	
38	K0+310	IZQ	SP-46B	SEÑAL SE ENCUENTRA BASTANTE DESGASTADA EN EL TABLERO Y SE EVIDENCIA OXIDO TANTO EN EL TABLERO COMO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
39	K0+135	IZQ	SR-01	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
40	K0+165	IZQ	SP-46B	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
41	K0+153	IZQ	SP-55	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	

42	K0+132	IZQ	SP-25	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
43	K0+105	IZQ	SP-25A	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO. SE EVIDENCIA QUE EL RESTAURANTE "TRONCOS Y BRASAS" TIENE LA SEÑAL COMO SOPORTE DE PUBLICIDAD.	
44	K0+073	IZQ	SP-36	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
45	K0+000 a K0+780	AMBOS COSTADOS	SUMIDEROS	LA MAYORIA SE ENCUENTRA OBSTRUIDO EN MATERIAL GRANULAR LO CUAL DIFICULTA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. SE ADJUNTA REGISTRO DE LOS MÁS AFECTADOS	    
46	K0+000 a K0+780	AMBOS COSTADOS	SARDINEL A-10	LA GRAN MAYORÍA DE SARDINELES SE ENCUENTRAN DAÑADOS, PRESENTAN AFECTACIONES Y DESPRENDIMIENTOS . POR LO ANTERIOR, SE NOTIFICA EL DETERIORO DE LOS SARDINELES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INVENTARIO VIAL. SE ADJUNTAN REGISTRO DE LOS MÁS AFECTADOS.	   

CONSORCIO RYP	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	CÓDIGO: GPDI-INV-0525-00 VERSIÓN- V-00

INVENTARIO VIAL

Número	Abscisa	Elemento	Descripción Estado Actual	Registro fotográfico
1	K0+040	REDUCTOR DE VELOCIDAD	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
2	K0+100	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
3	K0+245	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
4	K0+320	REDUCTOR DE VELOCIDAD	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
5	K0+365	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
6	K0+405	REDUCTOR DE VELOCIDAD	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
7	K0+505	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
8	K0+625	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	

***NOTA:** SE ADELANTA LEVANTAMIENTO EN CAMPO EN EL MES DE JULIO DE 2025

s



Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
CONTRATO	CTO N°2079/2025
CONTRATISTA	Consorcio R Y F
ELABORO	

FECHA	22/04/2025
INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Registro N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Alcaldía municipal Paipa
Dirección: Paipa
Teléfono: N° De pisos:
Long. Del frente (m): 330 m Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía		X	
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial		Salud			
Valor intervenido		Oficinas		Inst. educativa sup.			
Sin edificar		Institucional		Vía Urbana	X		
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mampostería		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metálicas				otra	
ventas		marmeta		calle		X internas		garaje	
cubierta		concreto		teja arcilla		subsuelo com.		otra	
N° de pisos									

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

1 (SP25) (KD+147) Presenta oxido en la estructura de soporte. Paramos se encuentra tapada, rayada y con stickers pegados.
2 (SP30) (KD+165) Presenta oxido en la estructura de soporte. Se encuentra rota y tablero en buen estado
3 (SP25) (KD+174) Presenta oxido en la estructura de soporte. Se encuentra rota y el tablero en buen estado.
4 (SP25A) (KD+202) Presenta oxido en la estructura de soporte. Se encuentra rota y el tablero en buen estado. El letrero "Tarros y bueno" la tiene como soporte pero no presenta problemas.
5 (SP46A) (KD+262) Presenta poco tanto en el tablero como en la estructura de soporte. Se encuentra rota
6 (SP8A) (KD+119) Se presenta tapada, presenta oxido en la estructura de soporte alrededor del tablero. Cuenta con stickers pegados y se observan marcas aparentemente de pintura negra en la estructura de soporte.
7 (SP15A) (KD+234) Señal se encuentra con oxido en el tablero y en la estructura de soporte. Se encuentra tapada.
8 (SP29) (KD+301) Señal se observa a punto de caerse (tapada). Presenta oxido en la estructura de soporte, tablero en buen estado.
9 (SP26) (KD+215) Señal presenta oxido en la estructura de soporte, el tablero presenta stickers y un poco de oxido
10 (SP24) (KD+179) Señal presenta poco oxido en el tablero y la estructura de soporte. Se encuentra rota.
11 (SP28) (KD+248) Señal presenta oxido en el tablero y estructura de soporte. Se encuentra rota.
12 (SP46B) (KD+304) Señal presenta oxido en estructura de soporte. el tablero se encuentra doblado (Tapado en su costado derecho).
13 (SP12) (KD+322) Señal se encuentra tapada. Presenta oxido en su estructura de soporte. Tablero en buenas condiciones
14 (SP25A) (KD+336) Señal se encuentra tapada, tablero desprendido y presenta oxido en su estructura de soporte.
15 (SP48) (KD+429) Señal se encuentra con oxido en tablero y estructura metálica. Presenta rayones de marcador.
16 (SP20) (KD+446) Señal presenta oxido en la estructura de soporte y en el tablero se encuentra rota.
17 (SP15A) (KD+463) Señal presenta oxido en estructura de soporte y se encuentra tapada
18 (SP20) (KD+496) Señal presenta oxido en la estructura de soporte. Tablero en buen estado. se encuentra rota.
19 (SP28) (KD+506) Señal tapada. Presenta oxido en su estructura de soporte.
20 (SP25) (KD+534) Señal se encuentra tapada. Presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado
21 (SP28) (KD+553) Señal presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado
22 (SP48) (KD+590) Señal presenta oxido en estructura de soporte y en el tablero
23 (SP08) (KD+600) Señal Tapada. Presenta oxido en la estructura de soporte y tablero
24 (SP28) (KD+602) Señal presenta oxido en la estructura de soporte. Tablero en buen estado.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	CTO N°2070/2025	FECHA	22/04/2025
CONTRATISTA	Convenio R Y P	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
ELABORO		REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Alcaldía Municipal - Paya
Dirección: Paya
Teléfono: N° De pisos:
long. Del frente (m): 380 m Latotes:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía		X	
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor arquitectura		Comercial		Lote	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educativas Sup.	
Sin edificar		Institucional		Vía de acceso	X
Readificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mampostería		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
pavetas		madera		metálicas				otra	
puertas		ventana		calle			X	externas		general	
cubierta		concreto		teja acrilica				externo com.		otra	
N° de pisos											

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

25 (SM78) (JD4095) Semaf. fundida. Presenta oxido en estructura de soporte y en el tablero
26 (SM16) (JD4775) Semaf. presenta oxido en el tablero y estructura de soporte.
27 (SM50) (JD4778) Semaf. fundida. Tablero en buen estado, presenta oxido en estructura de soporte.
28 (SM78) (JD4690) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. El tablero está fundido en el costado derecho. Tiene una varilla externa sobresaliente.
29 (SM16) (JD4660) Se encuentra como soporte peatonal del establecimiento "Bodegas", presenta oxido en su estructura de soporte.
30 (SM26) (JD4695) Se evidencia oxido en su estructura de soporte. Tablero en buen estado.
31 (SM78) (JD4790) Semaf. fundida. Presenta desgastes en los bordes del tablero. Presenta oxido en el tablero y la estructura de soporte.
32 (SM25) (JD4500) Presenta oxido en estructura de soporte y tablero.
33 (SM25A) (JD4511) Semaf. fundida. El unidad del tablero está fundido y presenta oxido en la estructura de soporte.
34 (SM28) (JD4512) Semaf. en buen estado no se encuentra inventariado.
35 (SM01) (JD4466) Semaf. se encuentra fundido. Presenta oxido en estructura de soporte.
36 (SM-38) (JD4465) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte y tablero. Se encuentra con stickers.
37 (SM39) (JD4526) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte.
38 (SM66) (JD4530) Semaf. Se encuentra fundido desgastado en tableros, y se evidencia oxido tanto en tablero como en estructura de soporte.
39 (SM01) (JD4485) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
40 (SM46) (JD4465) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
41 (SM55) (JD4562) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
42 (SM25) (JD4530) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
43 (SM39A) (JD4560) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
44 (SM36) (JD4573) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte tablero, en buen estado.

*OBSERVACIONES: La gran mayoría (casi todos) se encuentran con material grafitado, lo cual puede generar obstrucciones.

*CONCLUSIONES FINALES: Se observan semáforos dañados, desgastados, en cinco días, como en la alguna de calle blanca, rosa, evidencian daños considerables. Por lo anterior, notificamos por medio de la presente el gran deterioro de semáforos encontrados al momento de recibir la vía.

PROPIETARIO

Edwin Echeverría.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN CONTRATO N°2070-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> jue, 24 jul, 3:05 p.m.
para infraestructura

Paipa, 24 de julio de 2025

CTO 2070-CONS-RYP-025-2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN

Cordial saludo,

Se adjunta oficio según el asunto presentado

Sin otro particular, quedo pendiente de su respuesta

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
R/L CONSORCIO RYP
CONTRATISTA
Correo: andenespaipa2025@gmail.com
Cel: 3138307269

Paipa, 24 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 025- 2025

Arquitecto
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario de infraestructura
Municipio de paipa
Ciudad.

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contrato de obra contempla la instalación de cámaras y ductería para la subterranización de redes eléctricas y de comunicaciones, solicitamos el permiso para intervención de los boca calles ubicados en las intersecciones de la calle 25 con las carreras aledañas, las cuales se encuentran en cobijadas por garantías contractuales dentro del CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ" celebrado entre la alcaldia de Paipa y el CONSORCIO VIAL MARQUETALIA

Actualmente las bocacalles se encuentran en buen estado terminadas en mezcla asfálticas y una vez terminadas las obras del contrato 2070 de 2025, estas bocacalles se dejarán en buen estado

Es de vital importancia contar con estos permisos de intervención para así dar cumplimiento al objeto del proyecto el cual contempla la instalación de ductos para realizar la subterranización de las redes.

Teniendo en cuenta las indicaciones de dimensiones aproximadas de intervención, se remiten en la siguiente tabla con dimensiones de las Bocacalles que se deben intervenir dentro del contrato 2070 de 2025.

DESCRIPCION	LONGITUD (m)	ANCHO DE INTERVENCION (m)	ALTO (m)
COSTADO DERECHO			
BOCA CALLE CARRERA 13	6.40	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 12	6.25	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 10	7.80	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 9	6.60	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 8A	6.50	1.0	1.5
BOCA CALLE CALLEJUELA CRA 8	4.80	1.0	1.5
BOCA CALLE HOTEL PANORAMA	6.70	1.0	1.5
COSTADO IZQUIERDO			
BOCA CALLE ACCESO HOTEL SPA	7.20	1.0	1.5
BOCA CALLE HOTEL PAIPA MAYOR	5.10	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 10	6.90	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 13	6.40	1.0	1.5

También se solicita un detalle de la estructura de pavimento de estas bocacalles para posteriormente reconstruir el pavimento con los mismos espesores y especificaciones de materiales con los que fue diseñado.

Sin otro particular, quedo pendiente de su respuesta

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
C.C. N°1.049.603.584 DE TUNJA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RYP

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	**ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO**	Gobernación de Boyacá

ACTA DE COMITÉ N°___

FECHA PRESENTE ACTA: 22 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA	
N° CONTRATO:	2070-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
N° CONTRATO:	2103-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS			
N°	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

TEMAS A DESARROLLAR

1. Gestión predial
2. Retiro de árboles identificados.
3. Actas de vecindad y problemas con comunidad.
4. Verificación niveles en diseños.

DESARROLLO DEL COMITE

En el municipio de paipa, siendo las 3:00pm, en la alcaldía municipal de paipa se reunen contratista de obra, interventoría, supervisión, secretaria de infraestructura municipal y planeación con el fin de tratar los temas listados anteriormente.

con base a los temas a tratar, se da respuesta de la siguiente forma:

1. Gestion predial.

Contratista de obra solicita acompañamiento a alcaldía municipal con el fin de establecer de manera efectiva enlaces con propietarios. Sin embargo, alcaldía municipal, solicita que en compensacion al predio que se tiene previsto solicitar a la señora Elizabeth, se reponga cerramiento perimetral.

Interventoría contesta:

No es posible invertir recursos en la intervención a un predio privado, de igual forma, no se tiene contemplado en el Proyecto ninguna actividad para ejecutar la construcción del cerramiento solicitado.

Powered by CamScanner

Contratista de obra manifiesta: se genera compromiso de gestionar estructuras de contención siempre y cuando alcaldía municipal gestione los predios y se oficialice la sesión de predios.

2. En lo referente al retiro de árboles, contratista de obra manifiesta que ya se radico la solicitud para iniciar el trámite de permisos respectivos.

3. Inconvenientes con comunidad.

Contratista de obra manifiesta inconvenientes presentados con algunos propietarios al momento de desarrollar actividades, los cuales expresan que no se permitira ejecutar actividades en algunos predios.

Alcaldía municipal manifiesta el acompañamiento con las instancias respectivas con el fin de permitir el desarrollo del proyecto y dar cumplimiento a orden judicial.

En lo referente a la localización de subestación se solicita iniciar el proceso de indigación acerca de compenzación económica por ocupación del espacio público.

4. En lo referente a diseños se plantea la posibilidad de intervenir zonas de antejardín con el fin de homogenizar la sección de andenes, sin embargo, se solicita el acompañamiento por parte de la alcaldía en cuanto a gestión social. Alcaldía se compromete a emitir un concepto dando claridad a que antejardín hace parte del espacio público

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

COMPROMISOS PACTADOS			
Nº	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Una vez realizada negociación con propietarios se materializa parámetros	Secretaria de Infraestructura.	
2	Emitir aclaración de concepto de uso de espacio publico y dar claridad.	secretaria de planeación	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CONTROL DE ASISTENCIA

1. Alexandra Manuela Machuca Fonseca — Jefe OAJ. Paipa
2. Martha Lucia Rodriguez Ubaque — Planeación
3. Jorge Guillermo Tarazona Bolaz — Planeación
4. David Leonardo Hernandez Guevara — D.D.I.V - Gobernación de Boyacá
5. Jasra Dzeth Doche Topros — Opt. Interventoria.
6. Luis Eduardo Sichacá P. — Dis. Obra.
7. Diana Carolina Alarcon Cruz — Juridica Departamento Especi
8. Jorge Edwin Lopez Turco — Sec. Infraestructura Obras Paipa
9. Oscar I. Pinzón Sanchez — Sec. Infra – Gobar:
10. Jairo H. Garcia Granados — Oficina Asesora Juridica Paipa

Powered by CamScanner

Paipa, 12 de agosto de 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

CTO. 2103/2025-032

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN SOBRE RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS POTENCIALMENTE MALICIOSOS


Cordial saludo.


Por medio de la presente, nos permitimos informar que en fechas recientes se ha detectado la recepción de correos electrónicos provenientes de direcciones asociadas a su entidad, los cuales contienen archivos adjuntos o enlaces que han sido identificados como posibles archivos maliciosos o infectados con virus.

En aras de prevenir incidentes que puedan comprometer la seguridad de la información y la integridad de los sistemas de ambas partes, se solicita muy amablemente realizar una verificación interna que permita identificar y subsanar el origen de dichos envíos.

Se adjunta captura de pantalla de los correos electrónicos recibidos:


• Proceso ordinario por daños y perjuicios
infraestructura paipa-boyaca.gov.co
Traducir al español
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura pública y movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14 Tercer Piso
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 15044
Municipio de Paipa
Un archivo adjunto · Analizado por Gmail
citacion_fgn_202...

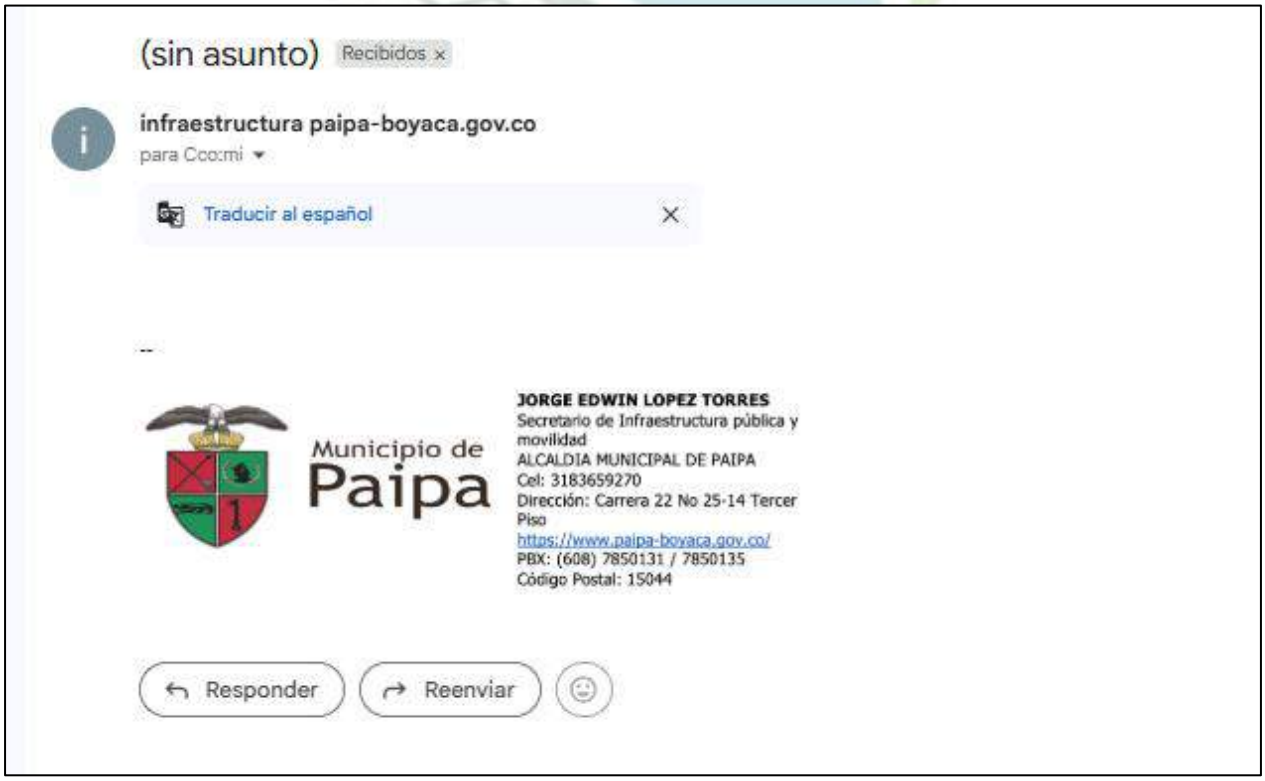
(sin asunto)
Recibidos
infraestructura paipa-boyaca.gov.co
para Cco:mi
Traducir al español
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura pública y movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14 Tercer Piso
https://www.paipa-boyaca.gov.co/
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 15044
Municipio de Paipa
Responder
Reenviar

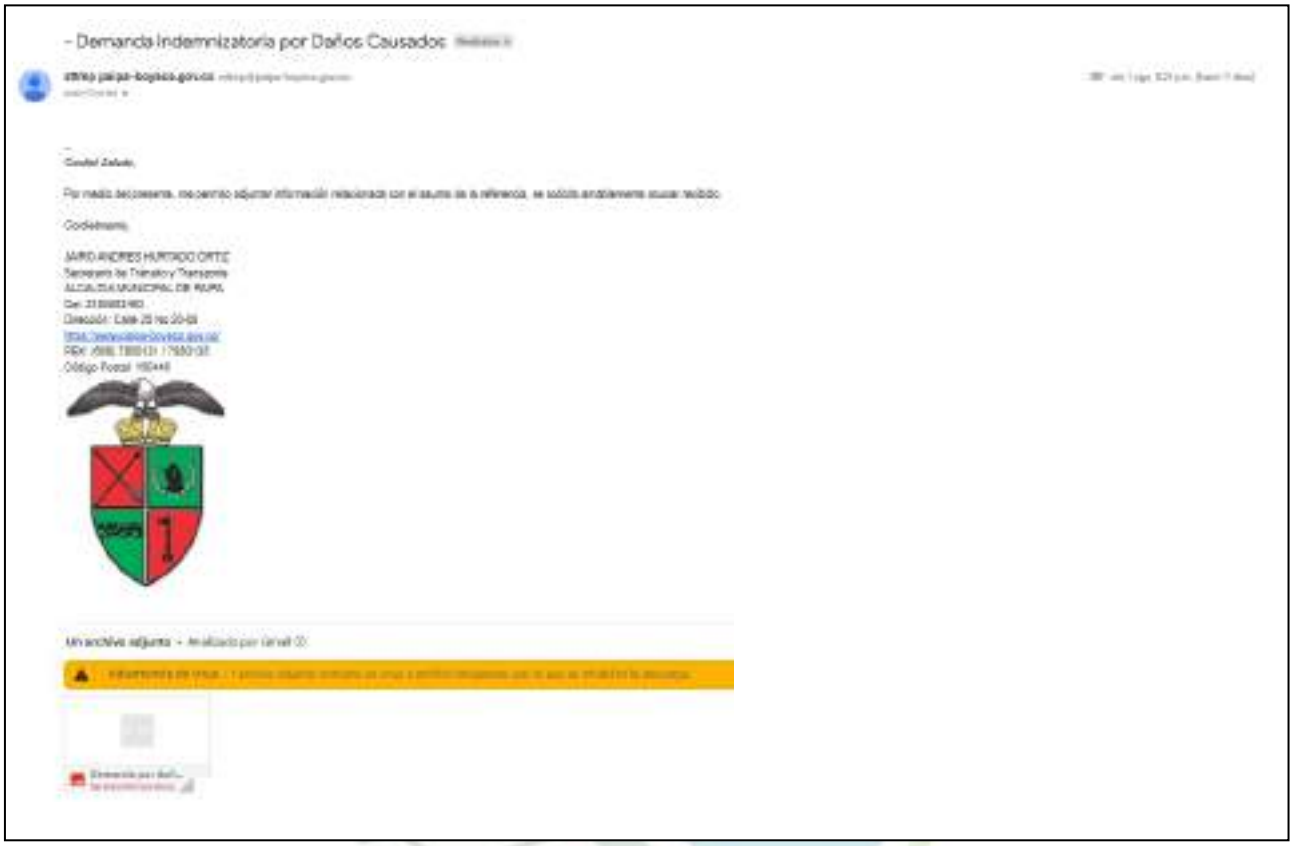

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Paipa, 13 de agosto de 2025

MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE PAIPA

CTO. 2103/2025-033

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

Cordial saludo.

Por medio de la presente y en atención al acta de comité de fecha 22 de julio de 2025, mediante la cual se estableció el compromiso de la Secretaría de Planeación de adelantar la gestión predial con los propietarios ELIZABETH BARRERA, POLICARPO MOLANO y CLARA CUSGÜEN (posible propietaria del predio antiguos CARS), esta interventoría solicita formalmente allegar información sobre el estado de dicha gestión.

La entrega oportuna de la información solicitada es de carácter prioritario, ya que la información requerida constituye un insumo indispensable para iniciar las actividades administrativas y técnicas que integran la ruta crítica del proyecto, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución de las obligaciones legales derivadas del mismo.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Paipa, 15 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-034

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL LAFER, en el marco del desarrollo del contrato de interventoría referido en el asunto, solicita de manera atenta la aprobación para el cambio del profesional que actualmente desempeña el cargo de director de Interventoría.

El profesional propuesto es el Ingeniero **EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS**, quien cumple con los requisitos establecidos en el proceso de contratación. Adicionalmente, el Ingeniero **EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS** ha manifestado su disponibilidad para asumir el cargo.

Se adjunta al presente oficio la carta de disponibilidad y demás documentos exigidos, conforme a lo estipulado en la documentación que hace parte integral del contrato en mención. La información complementaria se encuentra disponible para consulta a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1nLJuCY-a3WYPDxMCUBUeRXoWdlKsdZ5Z?usp=sharing

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Paipa, 15 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: ACLARACIÓN CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, y en atención al radicado CTO. 2103/2025-034 del 15 de agosto de 2025, la UNIÓN TEMPORAL LAFER, se permite aclarar lo siguiente:

- Persiste el cambio de profesional para el cargo “DIRECTOR DE INTERVENTORÍA”
- El profesional ofertado para desempeñar dicho cargo es el arquitecto **ALEX CIGIFREDO SANDOVAL PINZÓN**, y no el ingeniero **EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS** como se indicó inicialmente.
- La documentación y los soportes documentales referentes al profesional propuesto fueron allegados mediante el enlace compartido en el oficio con número de radicado CTO. 2103/2025-034, emitido por esta interventoría.

En virtud de lo anterior, agradecemos se tenga en cuenta la presente aclaración para los efectos contractuales y administrativos a que haya lugar.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Paipa, 15 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: ACLARACIÓN CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, y en atención al radicado CTO. 2103/2025-034 del 15 de agosto de 2025, la UNIÓN TEMPORAL LAFER, se permite aclarar lo siguiente:

- Persiste el cambio de profesional para el cargo "DIRECTOR DE INTERVENTORÍA"
- El profesional ofertado para desempeñar dicho cargo es el arquitecto **ALEX CIGILFREDO SANDOVAL PINZÓN**, y no el ingeniero **EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS** como se indicó inicialmente.
- La documentación y los soportes documentales referentes al profesional propuesto fueron allegados mediante el enlace compartido en el oficio con número de radicado CTO. 2103/2025-034, emitido por esta interventoría.

En virtud de lo anterior, agradecemos se tenga en cuenta la presente aclaración para los efectos contractuales y administrativos a que haya lugar.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Recibido 15-08-2025

Powered by CamScanner

Paipa, 19 de agosto de 2025

LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L CONSORCIO RYP

CTO. 2103/2025-035

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: REITERACIÓN No.1 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.01

Cordial saludo.

En atención al oficio CTO. 2103/2025-029 del 11 de agosto de 2025 en el cual se solicitó allegar observaciones al informe mensual No.01 y se establece un plazo máximo de entrega el cual ya fue superado, y teniendo en cuenta que, a la fecha de radicado del presente oficio no se ha recibido la información solicitada, esta interventoría solicita radicar la información en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio. Cabe mencionar que información solicitada es de carácter obligatorio y el cumplimiento en su entrega es indispensable para generar los parámetros mínimos de control y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas con la firma del contrato de obra No.2070 de 2025.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Tunja, 19 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-036

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.


ASUNTO: RADICADO INFORME SEMANAL NO.05

Cordial saludo

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato de la referencia, se remite informe semanal No.05 para su revisión y aprobación. Al igual, se remite informe semanal No.05 allegado por contratista de obra.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente



LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Tunja, 22 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-037

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: RADICADO OBSERVACIONES A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NO.01 CONTRATO DE OBRA NO.2070

Cordial saludo

Por medio de la presente y en atención a las observaciones allegadas por su dependencia a la solicitud de modificación No.01 al contrato de obra No.2070 de 2025, realizada mediante oficio CTO. 2103/2025-027 del 01 de agosto de 2025, esta interventoria se permite remitir subsanación a dichas observaciones en los documentos adjuntos al presente oficio.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

Lesly Ojeda S.

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Tunja, 25 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-038

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.


ASUNTO: RADICADO INFORME SEMANAL NO.06

Cordial saludo

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato de la referencia, se remite informe semanal No.06 para su revisión y aprobación.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente



LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Tunja, 28 de agosto de 2025

OSCAR IVAN PINZÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CTO. 2103/2025-039

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No.2070 DE 205.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato objeto de la referencia, esta interventoría informa que en el marco del desarrollo de la ejecución del contrato de obra No.2070 de 2025, se han presentado diversos inconvenientes relacionados con el acompañamiento administrativo, gestión predial y respuesta oportuna a diversas solicitudes de información necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual por parte de la alcaldía municipal de Paipa.

Pese a las diversas solicitudes emitidas por parte de contratista de obra e interventoría la Alcaldía Municipal de Paipa no ha suministrado oportunamente la información requerida ni prestado el acompañamiento solicitado, lo cual ha generado incertidumbre respecto a procesos administrativos necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual.

En consecuencia, amablemente solicitamos que en su calidad del supervisor del contrato objeto de la referencia y, que, en el marco de sus competencias, adelante las gestiones pertinentes ante la administración municipal con el fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto y así mitigar los riesgos asociados con incumplimiento al cronograma de obra.

Anexo al presente oficio se encuentran las diversas solicitudes remitidas a la Alcaldía Municipal de Paipa, enfatizando que la información solicitada constituye un insumo fundamental para desarrollar las actividades contratadas.

Sin otro particular, agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER

ANEXOS

UNION TEMPORAL
LAFER

Tunja, 30 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: RADICACION INVENTARIO VIAL

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades contractuales del contrato de obra mencionado, me permito radicar ante su despacho el **inventario vial** y el **acta de vecindad de dicho inventario**, documentos que fueron elaborados con el fin de dejar constancia del estado de los elementos viales presentes en el área del proyecto.

El inventario vial se entrega con **registro fotográfico** de cada uno de los elementos identificados, incluyendo su abscisa, tipo de señal y descripción detallada del estado en que se encuentra. Por su parte, el acta de vecindad incluye la descripción, localización (abscisa) y tipo de cada señal existente en el tramo, permitiendo así validar su condición previo al inicio del proyecto. Dicho levantamiento comprende señales verticales, sumideros y sardineles ubicados a lo largo del trazado de la calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o solicitud adicional relacionada con esta entrega.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N° 1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Paipa, 12 de agosto de 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

CTO. 2103/2025-031

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cordial saludo.

Por medio de la presente, y en atención a las diversas solicitudes de información realizadas por el contratista de obra del Contrato No. 2070 de 2025, esta interventoría reitera la necesidad urgente de allegar la documentación relacionada en la Tabla No. 01. Cabe señalar que dicha información es fundamental para el adecuado desarrollo del contrato y resulta indispensable para garantizar el cumplimiento del cronograma de obra. En este sentido, las demoras en la entrega de la información afectan directamente el normal desarrollo del proyecto, generando incertidumbre respecto al inicio de algunas actividades contempladas en el cronograma y poniendo en riesgo la adecuada planeación y ejecución de las labores previstas.


Tabla 1. Relación información solicitada

N° RADICADO SALIDA	FECHA	ASUNTO	DEPENDENCIA
CTO 2070-CONS-RYP-030-2025	6 DE AGOSTO DE 2025	SOLICITUD INFORMACIÓN PREDIAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CTO 2070-CONS-RYP-027-2025	30 DE JULIO DE 2025	RADICACIÓN INVENTARIO VIAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CTO 2070-CONS-RYP-027-2025	24 DE JULIO DE 2025	SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE COMITÉ	22 DE JULIO DE 2025	ACLARACIÓN CONCEPTO INTERVENCIÓN EN ANTEJARDINES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN

En virtud de lo anterior, instamos a priorizar la entrega de la información solicitada en un término perentorio no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente



LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
ALCALDIA PAIPA
CLARO, GAS, EBSA ETC
FACTURAS
FIDUCIA
INTERVENTORIA
SST-AMB
Actualizar
7 de 59
solicitud información predial
Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com>
para planeacion
mié, 6 ago, 9:22 a.m. (hace 6 días)
Paipa, 6 de agosto de 2025
CTO 2070-CONS-RYP–030-2025
Doctora
MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACION
Municipio de Paipa
Ciudad.
Referencia: Contrato N°2070 de 2025
Objeto: ''MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRELOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ''
Asunto: solicitud información predial
Cordial saludo,
Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores desde su dependencia nos han remitido información referente a predios aledaños al proyecto, se evidencia que dentro del listado hacen falta algunos predios por identificar los cuales tienen los siguientes códigos catastrales:
01000000021509019000000000
01000000021500110000000000
01000000021500140000000000

Paipa, 6 de agosto de 2025

CTO 2070-CONS-RYP–030-2025

Doctora
MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACION
Municipio de Paipa
Ciudad.

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRELOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: solicitud información predial

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores desde su dependencia nos han remitido información referente a predios aledaños al proyecto, se evidencia que dentro del listado hacen falta algunos predios por identificar los cuales tienen los siguientes códigos catastrales:

01000000021509019000000000

01000000021500110000000000

01000000021500140000000000

01000000021500150000000000

Para estos predios se solicita la siguiente información:

CODIGO CATASTRAL
FOLIO DE MATRICULA
DIRECCION
NOMBRE PROPIETARIO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
USO DEL SUELO
VIA
FRENTE DEL PREDIO
ANCHO DE ANDEN
ANCHO DE ANTEJARDIN "ZONA DURA"

Lo anterior para revisar el ancho de intervención de acuerdo con los diseños que tenemos actualmente

Quedo atento a comentarios o inquietudes

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
Representante legal
CONSORCIO RYP



Gmail

infraestructura@paipa-boyaca.gov.co

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

ALCALDIA PAIPA
CLARO, GAS, EBSA ETC
FACTURAS
FIDUCIA
INTERVENTORIA
SST-AMB

Actualizar

2 de 10

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025 - RADICACIÓN INVENTARIO VIAL

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> mié, 30 jul, 6:22 a.m. (hace 13 días)
para infraestructura

Tunja, 30 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: RADICACIÓN INVENTARIO VIAL

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades contractuales del contrato de obra mencionado, me permito radicar ante su despacho el **inventario vial** y el **acta de vecindad de dicho inventario**, documentos que fueron elaborados con el fin de dejar constancia del estado de los elementos viales presentes en el área del proyecto.
El inventario vial se entrega con **registro fotográfico** de cada uno de los elementos identificados, incluyendo su abscisa, tipo de señal y descripción detallada del estado en que se encuentra. Por su parte, el acta de vecindad incluye la descripción, localización (abscisa) y tipo de cada señal existente en el tramo, permitiendo así validar su condición previo al inicio del proyecto. Dicho levantamiento comprende señales verticales, sumideros y sardineles ubicados a lo largo del trazado de la calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia.
Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o solicitud adicional relacionada con esta entrega.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

4 archivos adjuntos - Analizado por Gmail

Tunja, 30 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 027- 2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: RADICACION INVENTARIO VIAL

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades contractuales del contrato de obra mencionado, me permito radicar ante su despacho el **inventario vial** y el **acta de vecindad de dicho inventario**, documentos que fueron elaborados con el fin de dejar constancia del estado de los elementos viales presentes en el área del proyecto.

El inventario vial se entrega con **registro fotográfico** de cada uno de los elementos identificados, incluyendo su abscisa, tipo de señal y descripción detallada del estado en que se encuentra. Por su parte, el acta de vecindad incluye la descripción, localización (abscisa) y tipo de cada señal existente en el tramo, permitiendo así validar su condición previo al inicio del proyecto. Dicho levantamiento comprende señales verticales, sumideros y sardineles ubicados a lo largo del trazado de la calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o solicitud adicional relacionada con esta entrega.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N° 1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

CONSORCIO RYP	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	CÓDIGO: GPDI-INV-0525-00
		VERSIÓN- V-00

INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN

NÚMERO	ABSCISA	COSTADO	SEÑAL	DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA SEÑAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	K0+47	DER	SP-25	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y CON STICKERS PEGADOS. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
2	K0+65	DER	SR-30	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
3	K0+74	DER	SP-25	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
4	K0+102	DER	SP-25A	COMO SE OBSERVA, EL RESTAURANTE "TRONCOS Y BRASAS" HACE USO DE LA SEÑAL COMO SOPORTE PARA SUS ANUNCIOS PUBLICITARIOS. LA SEÑAL SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
5	K0+162	DER	SP-46B	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
6	K0+178	DER	SR-01	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y CON STICKERS PEGADOS. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	 

7	K0+184	DER	SR-28	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	 
8	K0+201	DER	SR-26	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
9	K0+215	DER	SP-26	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
10	K0+279	DER	SR-01	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
11	K0+283	DER	SR-28	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
12	K0+307	DER	SP-46B	EL TABLERO SE ENCUENTRA DAÑADO EN UNO DE SUS COSTADOS. PRESENTA OXIDO EN SU ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
13	K0+351	DER	SP-25	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	

14	K0+386	DER	SP-25A	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
15	K0+429	DER	SP-47B	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
16	K0+448	DER	SR-01	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
17	K0+471	DER	SP-25A	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
18	K0+496	DER	SR-01	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
19	K0+500	DER	SR-28	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
20	K0+540	DER	SR-01	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO. SE ENCUENTRA COMO SOPORTE PUBLICITARIO DE LOCAL COMERCIAL.	

21	K0+553	DER	SR-28	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. SE ENCUENTRA COMO SOPORTE DE VENDEDOR INFORMAL.	
22	K0+570	DER	SP-47B	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
23	K0+600	DER	SR-01	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
24	K0+602	DER	SR-28	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
25	K0+695	DER	SP-47B	SE ENCUENTRA TORCIDA, RAYADA Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, SUCIEDAD POR INTERPERISMO.	
26	K0+775	DER	SP-46	SE ENCUENTRA RECTA CON TABLERO EN BUEN ESTADO. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
27	K0+785	IZQ	SR-30	SE ENCUENTRA TORCIDA. PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TABLERO.	

28	K0+690	IZQ	SR-26	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE. TABLERO SE ENCUENTRA TORCIDO EN EL COSTADO DERECHO. TIENE UNA VARILLA EXTERNA OXIDANDOSE	
29	K0+661	IZQ	SP-26	SE ENCUENTRA COMO SOPORTE PUBLICITARIO DEL ESTABLECIMIENTO "POCO COCO", PRESENTA OXIDO EN SU ESTRUCTURA DE SOPORTE	 
30	K0+613	IZQ	SP-26	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
31	K0+570	IZQ	SP-47B	SEÑAL TORCIDA. PRESENTA DESGASTE EN LOS BORDES DEL TABLERO. PRESENTA OXIDO EN EL TAVLERO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	
32	K0+500	IZQ	SP-25	PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TABLERO	
33	K0+471	IZQ	SP-25A	SEÑAL TORCIDA. UN COSTADO DEL TABLERO SE ENCUENTRA TORCIDO Y PRESENTA OXIDO EN LA BASE DE SOPORTE	
34	K0+450	IZQ	SR-28	SEÑAL EN BUEN ESTADO. NO SE ECUENTRA DENTRO DEL INVENTARIO ENTREGADO COMO INSUMO BASE	

35	K0+446	IZQ	SR-01	SEÑAL SE ENCUENTRA TORCIDA. PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE.	
36	K0+430	IZQ	SP-47B	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TABLERO. PRESENTA STICKERS EN EL TABLERO	
37	K0+426	IZQ	SP-25A	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE	
38	K0+310	IZQ	SP-46B	SEÑAL SE ENCUENTRA BASTANTE DESGASTADA EN EL TABLERO Y SE EVIDENCIA OXIDO TANTO EN EL TABLERO COMO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE	
39	K0+135	IZQ	SR-01	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
40	K0+165	IZQ	SP-46B	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
41	K0+153	IZQ	SP-55	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	

42	K0+132	IZQ	SP-25	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
43	K0+105	IZQ	SP-25A	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO. SE EVIDENCIA QUE EL RESTAURANTE "TRONCOS Y BRASAS" TIENE LA SEÑAL COMO SOPORTE DE PUBLICIDAD.	
44	K0+073	IZQ	SP-36	SEÑAL PRESENTA OXIDO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE, TABLERO EN BUEN ESTADO	
45	K0+000 a K0+780	AMBOS COSTADOS	SUMIDEROS	LA MAYORIA SE ENCUENTRA OBSTRUIDO EN MATERIAL GRANULAR LO CUAL DIFICULTA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. SE ADJUNTA REGISTRO DE LOS MÁS AFECTADOS	    
46	K0+000 a K0+780	AMBOS COSTADOS	SARDINEL A-10	LA GRAN MAYORÍA DE SARDINELES SE ENCUENTRAN DAÑADOS, PRESENTAN AFECTACIONES Y DESPRENDIMIENTOS . POR LO ANTERIOR, SE NOTIFICA EL DETERIORO DE LOS SARDINELES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INVENTARIO VIAL. SE ADJUNTAN REGISTRO DE LOS MÁS AFECTADOS.	   

CONSORCIO RYP	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	CÓDIGO: GPDI-INV-0525-00 VERSIÓN- V-00

INVENTARIO VIAL

Número	Abscisa	Elemento	Descripción Estado Actual	Registro fotográfico
1	K0+040	REDUCTOR DE VELOCIDAD	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
2	K0+100	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
3	K0+245	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
4	K0+320	REDUCTOR DE VELOCIDAD	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
5	K0+365	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
6	K0+405	REDUCTOR DE VELOCIDAD	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
7	K0+505	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	
8	K0+625	PASO PEATONAL	BUEN ESTADO/PRESENCIA DE SUCIEDAD POR INTEMPERISMO	

***NOTA:** SE ADELANTA LEVANTAMIENTO EN CAMPO EN EL MES DE JULIO DE 2025

s



Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
CONTRATO	CTO N°2079/2025
CONTRATISTA	Consorcio R Y F
ELABORO	

FECHA	22/04/2025
INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Registro N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Alcaldía municipal Paipa
Dirección: Paipa
Teléfono: N° De pisos:
Long. Del frente (m): 330 m Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía		X	
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial		Salud			
Valor intervenido		Oficinas		Inst. educativa sup.			
Sin edificar		Institucional		Vía Urbana	X		
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mampostería		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metálicas				otra	
ventas		marmeta		calle		X internas		garaje	
cubierta		concreto		teja arcilla		subsuelo com.		otra	
N° de pisos									

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

1 (SP25) (KD+147) Presenta oxido en la estructura de soporte. Paramos se encuentra tapada, rayada y con stickers pegados.
2 (SP30) (KD+165) Presenta oxido en la estructura de soporte. Se encuentra rota y tablero en buen estado
3 (SP25) (KD+174) Presenta oxido en la estructura de soporte. Se encuentra rota y el tablero en buen estado.
4 (SP25A) (KD+202) Presenta oxido en la estructura de soporte. Se encuentra rota y el tablero en buen estado. El letrero "Tarros y bueno" la tiene como soporte pero no presenta problemas.
5 (SP46A) (KD+262) Presenta poco tanto en el tablero como en la estructura de soporte. Se encuentra rota
6 (SP8A) (KD+119) Se presenta tapada, presenta oxido en la estructura de soporte alrededor del tablero. Cuenta con stickers pegados y se observan marcas aparentemente de pintura negra en la estructura de soporte.
7 (SP15A) (KD+234) Señal se encuentra con oxido en el tablero y en la estructura de soporte. Se encuentra tapada.
8 (SP29) (KD+301) Señal se observa a punto de caerse (tapada). Presenta oxido en la estructura de soporte, tablero en buen estado.
9 (SP26) (KD+215) Señal presenta oxido en la estructura de soporte, el tablero presenta stickers y un poco de oxido
10 (SP24) (KD+179) Señal presenta poco oxido en el tablero y la estructura de soporte. Se encuentra rota.
11 (SP28) (KD+248) Señal presenta oxido en el tablero y estructura de soporte. Se encuentra rota.
12 (SP46B) (KD+304) Señal presenta oxido en estructura de soporte. el tablero se encuentra doblado (Tapado en su costado derecho).
13 (SP12) (KD+322) Señal se encuentra tapada. Presenta oxido en su estructura de soporte. Tablero en buenas condiciones
14 (SP25A) (KD+336) Señal se encuentra tapada, tablero desprendido y presenta oxido en su estructura de soporte.
15 (SP48) (KD+429) Señal se encuentra con oxido en tablero y estructura metálica. Presenta rayones de marcador.
16 (SP20) (KD+446) Señal presenta oxido en la estructura de soporte y en el tablero se encuentra rota.
17 (SP15A) (KD+463) Señal presenta oxido en estructura de soporte y se encuentra tapada
18 (SP20) (KD+496) Señal presenta oxido en la estructura de soporte. Tablero en buen estado. se encuentra rota.
19 (SP28) (KD+506) Señal tapada. Presenta oxido en su estructura de soporte.
20 (SP25) (KD+534) Señal se encuentra tapada. Presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado
21 (SP28) (KD+553) Señal presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado
22 (SP48) (KD+590) Señal presenta oxido en estructura de soporte y en el tablero
23 (SP08) (KD+600) Señal Tapada. Presenta oxido en la estructura de soporte y tablero
24 (SP28) (KD+602) Señal presenta oxido en la estructura de soporte. Tablero en buen estado.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	CTO N°2070/2025	FECHA	22/04/2025
CONTRATISTA	Convenio R Y P	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
ELABORO		REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Alcaldía Municipal - Paya
Dirección: Paya
Teléfono: N° De pisos:
long. Del frente (m): 380 m Latotes:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía		X	
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor arquitectura		Comercial		Lote	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educativas Sup.	
Sin edificar		Institucional		Vía de acceso	X
Readificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mampostería		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
pavetas		madera		metálicas				otra	
puertas		ventana		calle			X	externas		general	
cubierta		concreto		teja acrilica				externo com.		otra	
N° de pisos											

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

25 (SM78) (JD4095) Semaf. fundida. Presenta oxido en estructura de soporte y en el tablero
26 (SM16) (JD4775) Semaf. presenta oxido en el tablero y estructura de soporte.
27 (SM50) (JD4778) Semaf. fundida. Tablero en buen estado, presenta oxido en estructura de soporte.
28 (SM78) (JD4690) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. El tablero está fundido en el costado derecho. Tiene una varilla externa sobresaliente.
29 (SM16) (JD4660) Se encuentra como soporte peatonal del establecimiento "Bodegas", presenta oxido en su estructura de soporte.
30 (SM26) (JD4695) Se evidencia oxido en su estructura de soporte. Tablero en buen estado.
31 (SM78) (JD4790) Semaf. fundida. Presenta desgastes en los bordes del tablero. Presenta oxido en el tablero y la estructura de soporte.
32 (SM25) (JD4500) Presenta oxido en estructura de soporte y tablero.
33 (SM25A) (JD4511) Semaf. fundida. El unidad del tablero está fundido y presenta oxido en la estructura de soporte.
34 (SM28) (JD4512) Semaf. en buen estado no se encuentra inventariado.
35 (SM01) (JD4466) Semaf. se encuentra fundido. Presenta oxido en estructura de soporte.
36 (SM-38) (JD4465) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte y tablero. Se encuentra con stickers.
37 (SM39) (JD4526) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte.
38 (SM66) (JD4530) Semaf. Se encuentra fundido desgastado en tableros, y se evidencia oxido tanto en tablero como en estructura de soporte.
39 (SM01) (JD4485) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
40 (SM46) (JD4465) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
41 (SM55) (JD4562) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
42 (SM25) (JD4530) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
43 (SM39A) (JD4560) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte. Tablero en buen estado.
44 (SM36) (JD4573) Semaf. presenta oxido en estructura de soporte tablero, en buen estado.

*OBSERVACIONES: La gran mayoría (casi todos) se encuentran con material grafitado, lo cual puede generar obstrucciones.

*CONCLUSIONES FINALES: Se observan semáforos dañados, desgastados, en cinco días, como en la alguna de calle blanca, rosa, evidencian daños considerables. Por lo anterior, notificamos por medio de la presente el gran deterioro de semáforos encontrados al momento de recibir la vía.

PROPIETARIO

Edwin Echeverría.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN CONTRATO N°2070-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> jue, 24 jul, 3:05 p.m.
para infraestructura

Paipa, 24 de julio de 2025

CTO 2070-CONS-RYP-025-2025

ARQUITECTO
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PAIPA

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN

Cordial saludo,

Se adjunta oficio según el asunto presentado

Sin otro particular, quedo pendiente de su respuesta

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
R/L CONSORCIO RYP
CONTRATISTA
Correo: andenespaipa2025@gmail.com
Cel: 3138307269

Paipa, 24 de julio de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 025- 2025

Arquitecto
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario de infraestructura
Municipio de paipa
Ciudad.

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contrato de obra contempla la instalación de cámaras y ductería para la subterranización de redes eléctricas y de comunicaciones, solicitamos el permiso para intervención de los boca calles ubicados en las intersecciones de la calle 25 con las carreras aledañas, las cuales se encuentran en cobijadas por garantías contractuales dentro del CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ" celebrado entre la alcaldia de Paipa y el CONSORCIO VIAL MARQUETALIA

Actualmente las bocacalles se encuentran en buen estado terminadas en mezcla asfálticas y una vez terminadas las obras del contrato 2070 de 2025, estas bocacalles se dejarán en buen estado

Es de vital importancia contar con estos permisos de intervención para así dar cumplimiento al objeto del proyecto el cual contempla la instalación de ductos para realizar la subterranización de las redes.

Teniendo en cuenta las indicaciones de dimensiones aproximadas de intervención, se remiten en la siguiente tabla con dimensiones de las Bocacalles que se deben intervenir dentro del contrato 2070 de 2025.

DESCRIPCION	LONGITUD (m)	ANCHO DE INTERVENCION (m)	ALTO (m)
COSTADO DERECHO			
BOCA CALLE CARRERA 13	6.40	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 12	6.25	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 10	7.80	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 9	6.60	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 8A	6.50	1.0	1.5
BOCA CALLE CALLEJUELA CRA 8	4.80	1.0	1.5
BOCA CALLE HOTEL PANORAMA	6.70	1.0	1.5
COSTADO IZQUIERDO			
BOCA CALLE ACCESO HOTEL SPA	7.20	1.0	1.5
BOCA CALLE HOTEL PAIPA MAYOR	5.10	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 10	6.90	1.0	1.5
BOCA CALLE CARRERA 13	6.40	1.0	1.5

También se solicita un detalle de la estructura de pavimento de estas bocacalles para posteriormente reconstruir el pavimento con los mismos espesores y especificaciones de materiales con los que fue diseñado.

Sin otro particular, quedo pendiente de su respuesta

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
C.C. N°1.049.603.584 DE TUNJA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RYP

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	**ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO**	Gobernación de Boyacá

ACTA DE COMITÉ N°___

FECHA PRESENTE ACTA: 22 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA	
N° CONTRATO:	2070-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
N° CONTRATO:	2103-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS			
N°	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

TEMAS A DESARROLLAR

1. Gestión predial
2. Retiro de árboles identificados.
3. Actas de vecindad y problemas con comunidad.
4. Verificación niveles en diseños.

DESARROLLO DEL COMITE

En el municipio de paipa, siendo las 3:00pm, en la alcaldía municipal de paipa se reunen contratista de obra, interventoría, supervisión, secretaria de infraestructura municipal y planeación con el fin de tratar los temas listados anteriormente.

con base a los temas a tratar, se da respuesta de la siguiente forma:

1. Gestion predial.

Contratista de obra solicita acompañamiento a alcaldía municipal con el fin de establecer de manera efectiva enlaces con propietarios. Sin embargo, alcaldía municipal, solicita que en compensacion al predio que se tiene previsto solicitar a la señora Elizabeth, se reponga cerramiento perimetral.

Interventoría contesta:

No es posible invertir recursos en la intervención a un predio privado, de igual forma, no se tiene contemplado en el Proyecto ninguna actividad para ejecutar la construcción del cerramiento solicitado.

Powered by CamScanner

Contratista de obra manifiesta: se genera compromiso de gestionar estructuras de contención siempre y cuando alcaldía municipal gestione los predios y se oficialice la sesión de predios.

2. En lo referente al retiro de árboles, contratista de obra manifiesta que ya se radico la solicitud para iniciar el trámite de permisos respectivos.

3. Inconvenientes con comunidad.

Contratista de obra manifiesta inconvenientes presentados con algunos propietarios al momento de desarrollar actividades, los cuales expresan que no se permitira ejecutar actividades en algunos predios.

Alcaldía municipal manifiesta el acompañamiento con las instancias respectivas con el fin de permitir el desarrollo del proyecto y dar cumplimiento a orden judicial.

En lo referente a la localización de subestación se solicita iniciar el proceso de indigación acerca de compenzación económica por ocupación del espacio público.

4. En lo referente a diseños se plantea la posibilidad de intervenir zonas de antejardín con el fin de homogenizar la sección de andenes, sin embargo, se solicita el acompañamiento por parte de la alcaldía en cuanto a gestión social. Alcaldía se compromete a emitir un concepto dando claridad a que antejardín hace parte del espacio público

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL LAFER · CONSORCIO RYP	ACTA DE COMITÉ Y/O SEGUIMIENTO	Gobernación de Boyacá

COMPROMISOS PACTADOS			
Nº	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1	Una vez realizada negociación con propietarios se materializa parámetros	Secretaria de Infraestructura.	
2	Emitir aclaración de concepto de uso de espacio publico y dar claridad.	secretaria de planeación	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CONTROL DE ASISTENCIA

1. Alexandra Manuela Machuca Fonseca — Jefe OAJ. Paipa
2. Martha Lucia Rodriguez Ubaque — Planeación
3. Jorge Guillermo Tarazona Bolaz — Planeación
4. David Leonardo Hernandez Guevara — D.D.I.V - Gobernación de Boyacá
5. Jasra Dzeth Doche Topros — Opt. Interventoria.
6. Luis Eduardo Sichacá P. — Dis. Obra.
7. Diana Carolina Alarcon Cruz — Juridica Departamento Especi
8. Jorge Edwin Lopez Turco — Sec. Infraestructura Obras Paipa
9. Oscar I. Pinzón Sanchez — Sec. Infra – Gobar:
10. Jairo H. Garcia Granados — Oficina Asesora Juridica Paipa

Powered by CamScanner

Paipa, 13 de agosto de 2025

MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE PAIPA

CTO. 2103/2025-033

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

Cordial saludo.

Por medio de la presente y en atención al acta de comité de fecha 22 de julio de 2025, mediante la cual se estableció el compromiso de la Secretaría de Planeación de adelantar la gestión predial con los propietarios ELIZABETH BARRERA, POLICARPO MOLANO y CLARA CUSGÜEN (posible propietaria del predio antiguos CARS), esta interventoría solicita formalmente allegar información sobre el estado de dicha gestión.

La entrega oportuna de la información solicitada es de carácter prioritario, ya que la información requerida constituye un insumo indispensable para iniciar las actividades administrativas y técnicas que integran la ruta crítica del proyecto, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución de las obligaciones legales derivadas del mismo.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Paipa, 25 de agosto de 2025

CTO 2070 – CONS – RYP – 040 – 2025

Señor,
Germán Ricardo Camacho Barrera
Alcalde Municipal de Paipa
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto: Solicitud de acompañamiento y adopción de medidas frente a oposición de vecinos en ejecución del Contrato de Obra Pública No. 2070-2025 – Calle 25 Paipa.

Respetado señor alcalde,

En cumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción popular relacionada con la Calle 25 del municipio de Paipa, el Departamento de Boyacá suscribió el **Contrato de Obra Pública No. 2070-2025** el 22 de abril de 2025 con la firma **INGENIERÍA RYD S.A.S.**, identificada con NIT 901.499.915-4, representada legalmente por la señora Yeimy Alexander Velasco Angarita.
El objeto del contrato consiste en el ***"Mejoramiento de espacio público mediante la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas de la vía Calle 25 entre los puentes del rio Chicamocha y de Marquetalia en el municipio de Paipa, Boyacá"***, con lo cual se busca materializar lo ordenado en la sentencia, asegurando la construcción de la ciclovía y los andenes de la referida vía.

En el marco de la ejecución contractual, se han presentado inconvenientes con algunos vecinos colindantes, quienes:

1. Se han rehusado a suscribir el acta de vecindad.
2. Han manifestado su negativa a permitir la ejecución de las obras al frente de sus predios.

Tal es el caso de:

NOMBRE PROPIETARIO	IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO	SITUACIÓN PRESENTADA
Fernando Corredor Cel. 311 262 4933 hotelhorizonsarawa@gmail.com	Calle 25 12 83 Br Villa Panorama Matrícula catastral: 010000000208000100000000 Folio de matrícula: 074 – 8794 Acta de vecindad: Páginas N°1 y 2 del archivo adjunto.	Manifiesta no estar de acuerdo con el proyecto, por ende, no firma acta de vecindad. Indica que la molestia se da, ya que es **propietario del restaurante "La Cavita Prado", y dice que requiere de los** parqueaderos. Además, indica que el antejardín es de su propiedad, no del estado, y por ello no dejará intervenir esta zona ya que la usa como parqueadero. No ha asistido a ninguna reunión con personería a las que se le ha invitado.
Sandra Corredor Cel. 310 558 1558 sandracorredorabogados@hotmail.com	Calle 25 12 59 Br Villa Panorama Matrícula catastral: 010000000208000200000000 Folio de matrícula: 074 – 300 Acta de vecindad: Páginas N°3 y 4 del archivo adjunto.	Indica que el contratista que ejecutó la vía principal, le generó bastantes daños de los cuales no se hizo responsable. Por ello, dice que no firma el acta de vecindad, ya que para ella no es garantía de nada. Pese a múltiples citaciones a reuniones, no ha asistido.
Policarpo Molano Cel. 312 479 8976	Calle 25 12 46 68 Br Villa Panorama Matrícula catastral: 010000000127000100000000 Folio de matrícula: 074 – 5158 Acta de vecindad: Páginas N°5 y 6 del archivo adjunto.	Manifiesta estar en total desacuerdo con el proyecto, desde el objeto hasta los materiales, pese a que ha asistido a las reuniones con veedurías y personería, no cambia de opinión y se retracta en la decisión de no querer firmar el acta de vecindad.

Así mismo, se presenta el listado de predios cuyos propietarios no han podido ser identificados, a pesar de las múltiples gestiones de verificación realizadas con los residentes del sector. Esta situación ha impedido la suscripción de las respectivas actas de vecindad, requisito indispensable para la continuidad del proceso.

CONSECUTIVO INTERNO	FOLIO DE MATRICULA	DIRECCIÓN	TIPO DE PREDIO
3	074-72283	CL 25 13 41	Lote
11	074-12127	CL 25 10 135	Vivienda
28	074-50030	CL 25 8 03	Vivienda
36	074-59316	CL 25 6 51	Lote
37	074-17213	CL 25 6 39	Lote
43	0	Calle 25 5 90	Lote
49	0	CL 25 5 34	Lote
51	074-17002	CL 25 5 56	Lote
52	074-120671	Lo Br Villa Panorama	Lote
55	074-23044	CL 25 5 100	Lote
