	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y INGSERH S.A.S, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL

(HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ, en calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS designado como supervisor del *contrato de obra* número SPOPM-CO-SA-MC-456-2025, suscrito con INGSERH S.A.S, identificado con NIT 900128087-6, R/L JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

I. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO			
1.- Número del Contrato	**SPOPM-CO-SA-MC-456-2025**		
2.- Modalidad Selección:	**Menor Cuantía**		
3.- Clase de Contrato	**CONTRATO DE OBRA**		
4.- Partes:	**MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ** Nit 800102912-2 R/L **JEURIN ZAN MENESES GOMEZ** Alcalde Municipal		
	CONTRATISTA: **INGSERH S.A.S** **Nit: 900128087-6** R/L JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL Cédula: 1.126.456.040 Valle del Guamuez		
5.- Supervisor del Contrato	*HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ* *C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán* *Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal*		
6.- Objeto del Contrato:	AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
7.- Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	SETENSETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($70.937.365,50.) M/CTE	
	Adición	VEINTICUATRO MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS DIECISETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 24.999.717.84)	
	Valor final contrato	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($95,937,083.34 M/CTE)	
8.- Certificado(S) de disponibilidad presupuestal y Registro(S) presupuestal (es)	Disponibilidad presupuestal: No.2025000184 Fecha:18/02/2025 Valor: 70.997.184,73	Registro presupuestal: No.202500613 Fecha:01/08/2025 Valor: 70.937.365,50	Disminución a Disponibilidad No. 2025000065 Fecha: 01/08/2025 Valor: 59.819,23

	Disponibilidad presupuestal: No.2025000842 Fecha:09/10/2025 Valor: 24.999.717,84	Registro presupuestal: No.2025000934 Fecha:14/10/2025 Valor: 24.999.717,84
9.- Estampillas	Recibo N° 2025005159	Fecha 04/08/2025
	Recibo N° 2025007154	Fecha 27/10/2025
10.- Duración y Ejecución del Contrato:	Plazo inicial:	DOS (02) MES
	F. de Suscripción:	01 de agosto del 2025
	F. de Acta de inicio	15 de agosto del 2025
	Fecha de Terminación inicial:	14 de octubre del 2025
	Fecha de Prórroga:	15 de octubre del 2025
	Fecha de terminación final:	14 de noviembre del 2025
	Fecha de Terminación Anticipada	05 de noviembre del 2025
11.- Suspensión y reinicio Contrato :	**Acta de Suspensión**	**Acta de Reinicio**
	NA	NA

2. DATOS DEL SUPERVISOR

La supervisión del presente *contrato de obra* fue ejercida por el siguiente funcionario:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CARGO	SECRETARIO DE DEPENDENCIA
PERIODO DE SUPERVISIÓN	15 de agosto de 2025 al 05 de noviembre de 2025

3. MODIFICACIONES

A. PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	15 de octubre del 2025 – (1 mes)

B. ADICIONES:

ADICIONAL	OTRO SI No. 01 MODIFICATORIO EN TIEMPO Y EN VALOR DE VEINTICUATRO MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS DIECISETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 24.999.717.84)

4. RELACIÓN DE PÓLIZAS

Tipo de póliza: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
Tipo de movimiento: Expedición
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-47-994000000932 (Anexo o)
Fecha de expedición: 05/08/2025
RESOLUCION No. OJMVG180-2025
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01/08/2025	11/04/2026	$ 7.093.736.55
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2025	11/10/2028	$ 3.546.868.28
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/09/2025	01/09/2030	$ 7.093.736.55

Tipo de póliza: RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Tipo de movimiento: Expedición
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-74-994000000113 (Anexo o)
Fecha de expedición: 05/08/2025
RESOLUCION No. OJMVG180-2025
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/08/2025	01/10/2025	$ 284.700.000,00
PATRONAL	01/08/2025	01/10/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/08/2025	01/10/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/08/2025	01/10/2025	$ 284.700.000,00

Tipo de póliza: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
Tipo de movimiento: PRORROGA
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-47-994000000932 (Anexo 1)
Fecha de expedición: 26/08/2025
RESOLUCION No. OJMVG-223-2025

Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	15/08/2025	26/04/2026	$ 7.093.736.55
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2025	26/10/2028	$ 3.546.868.28
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/09/2025	01/09/2030	$ 7.093.736.55

Tipo de póliza: RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Tipo de movimiento: PRORROGA
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-74-994000000113 (Anexo 1)
Fecha de expedición: 26/08/2025
RESOLUCION No. OJMVG-223-2025
Estado de póliza: No Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00
PATRONAL	01/10/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/10/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/10/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00

Tipo de póliza: RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Tipo de movimiento: Modificación
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-74-994000000113 (Anexo 2)
Fecha de expedición: 26/08/2025
RESOLUCION No. OJMVG-223-2025
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/08/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00
PATRONAL	15/08/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15/08/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15/08/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00

Tipo de póliza: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
Tipo de movimiento: PRORROGA
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-47-994000000932 (Anexo 2)
Fecha de expedición: 15/10/2025
RESOLUCION No. OJMVG-290-2025
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	15/08/2025	26/05/2026	$ 7.093.736.55
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2025	26/11/2028	$ 3.546.868.28
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	$ 7.093.736.55

Tipo de póliza: RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Tipo de movimiento: PRORROGA
Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-47-994000000113 (Anexo 3)
Fecha de expedición: 15/10/2025
RESOLUCION No. OJMVG-290-2025
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/08/2025	16/11/2025	$ 284.700.000,00
PATRONAL	15/08/2025	16/11/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15/08/2025	16/11/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15/08/2025	16/11/2025	$ 284.700.000,00

Tipo de póliza: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
Tipo de movimiento: RECIBO FINAL

Entidad aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia NIT: 860.524.654-6
Tomador: Municipio Valle del Guamuez
Póliza No.: 585-47-994000000932 (Anexo 3)
Fecha de expedición: 07/11/2025
RESOLUCION No. OJMVG-290-2025
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	15/08/2025	26/05/2026	$ 7.093.736.55
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2025	26/11/2028	$ 3.546.868.28
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/11/2025	05/11/2030	$ 7.093.736.55

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

OBLIGACIÓN GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Ejecutar y Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio.	X		Cumplió con la obligación de ejecutar y cumplir con el objeto del contrato con total autonomía técnica y administrativa. No hay indicios de subordinación ni de relación laboral entre tú y el Municipio, lo que demuestra que has actuado bajo tu propia responsabilidad.
Ejecutar idónea y oportunamente el objeto convenido, de forma directa y con diligencia, utilizando los recursos materiales, técnicos y humanos que se requieran.	X		Cumplió con la obligación de ejecutar el objeto convenido de manera adecuada y puntual, actuando de forma directa y con el nivel de diligencia requerido. Además, has utilizado eficientemente los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo esta tarea.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato evitando todas aquellas dilaciones que pudieran presentarse.	X		Actuó con lealtad y buena fe en todas las fases del contrato, evitando cualquier tipo de dilación que pudiera haber surgido. Esto demuestra tu compromiso y seriedad en el cumplimiento de tus obligaciones contractuales.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	X		Identifico las oportunidades para fomentar el empleo local durante la ejecución del contrato.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio y la interventoría.	X		Acato las instrucciones proporcionadas por el Municipio y la interventoría durante el desarrollo del contrato, lo que demuestra tu disposición a seguir las directrices establecidas y colaborar eficazmente en el proceso.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	x		se facilitó la labor de seguimiento y control que realizó el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a todas las observaciones y requerimientos que se presentaron.
Avisar oportunamente al Municipio las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	X		Aviso oportunamente al Municipio sobre las situaciones previsibles que podrían afectar el equilibrio económico del contrato.
Informar oportunamente al supervisor del contrato y/o al interventor, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.	X		Informo de manera oportuna al supervisor del contrato y/o al interventor sobre cualquier situación que pudiera afectar la correcta ejecución del mismo.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informar al Municipio y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.	X		Cumplió con la obligación de no acceder a las peticiones o amenazas de personas que actúan fuera de la ley, manteniendo tu integridad y autonomía.
Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad con lo estipulado en el estudio previo, invitación pública, sus adendas y especificaciones técnicas, así como con su oferta presentada.	X		Cumplió con el objeto del contrato según los términos y condiciones establecidos en el estudio previo, la invitación pública, sus adendas y las especificaciones técnicas.
Efectuar la provisión objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato.	X		efectuó la provisión objeto del contrato, cumpliendo con los precios y condiciones establecidos en la propuesta que presentaste, la cual forma parte integral del contrato.
Informar de inmediato y por escrito, al supervisor del contrato la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato,	X		Informo de inmediato y por escrito al supervisor del contrato sobre la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que podrían afectar la ejecución del contrato, incluyendo las

incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.			recomendaciones pertinentes según cada situación. Esto refleja tu responsabilidad y proactividad en la gestión del contrato.
Cumplir con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	X		Cumplió con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las normas reglamentarias
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	X		realizó todos los pagos de honorarios y/o salarios, así como los parafiscales e indemnizaciones correspondientes. También cumplió con las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondían según el personal empleado en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. Además, demostró, cuando fue requerido por la entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Permitir que el personal designado por el municipio inspeccione en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso.	X		Permitió que el personal designado por el municipio inspeccionara en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato. Asimismo, facilitó el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según fuera el caso
Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley.	X		Cumplió con las demás obligaciones que se derivan del objeto contractual y con todas aquellas que, de acuerdo con la naturaleza del contrato, establece la ley.
El contratista debe estar a paz y salvo en todo concepto con el municipio.	X		El contratista está a paz y salvo en todo concepto con el municipio. Esto garantiza que cumplió con todas las obligaciones financieras y legales requeridas, asegurando así una relación contractual transparente y en conformidad con las normativas establecidas.
Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	X		Mantuvo la reserva sobre la información que le fue suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.	X		Respondió por el pago de los impuestos que causó la legalización del contrato.
Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de la interventoría del contrato o por el municipio.	X		Presentó oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de la interventoría del contrato o por el municipio.
Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantías, en los plazos exigidos por la ley y por los montos establecidos en el contrato y los documentos precontractuales.	X		Mantuvo en vigor, renovó, prorrogó y adicionó las garantías, cumpliendo con los plazos exigidos por la ley y los montos establecidos en el contrato y los documentos precontractuales.
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la Ley	X		Respondió por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la Ley.
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y aquellas determinadas por el supervisor	X		Cumplió con las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto contratado, así como con aquellas determinadas por el supervisor.
OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por el Municipio.	X		Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por el Municipio.
Colocar las vallas de información del contrato, señalización temporal y preventiva de las obras para el control del tránsito.	X		Colocó las vallas de información del contrato, así como la señalización temporal y preventiva de las obras para el control del tránsito.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contractual.	X		Respondió por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato
Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual.	X		Suministró y mantuvo, en las etapas pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual.
En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Administración municipal.	X		No hubo materiales defectuosos

Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra.	X		No hubo necesidad de aplicar esta obligación, todos los trabajos se realizaron correctamente.
Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc.	X		No hubo necesidad de aplicar esta obligación, no hubo daños que reparar.
En caso de requerir cambios de personal mínimo de trabajo deberá obtener la aprobación de la de la supervisión y la entidad con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos.	X		No hubo necesidad de aplicar esta obligación, no se realizó cambio de personal.
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y LA ENTIDAD CONTRATANTE.	X		Asumió el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupó en la ejecución de la obra
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA ENTIDAD CONTRATANTE, por causa o con ocasión del contrato.	X		No hubo necesidad de aplicar esta obligación, no hubo reclamación judicial o extrajudicial.
EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas a satisfacción de la supervisión.	X		El contratista entrego la obra funcionando en las condiciones contratadas, a satisfacción de la supervisión.
El contratista deberá garantizar los requerimientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) el cual estar pendiente de la obra y de la afiliación al sistema integral de seguridad social del equipo de trabajo y del personal que labore	X		El contratista cumplió con garantizar los requerimientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), asegurándose de que el equipo de trabajo y el personal en la obra estuvieran debidamente afiliados al sistema integral de seguridad social.

en la obra y desarrollar las demás funciones propias del personal en obra.			Además, desarrolló todas las funciones necesarias que correspondían al personal en obra.
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales idóneos y los demás elementos necesarios, relacionados en el presente proceso precontractual y documentos contractuales.	X		El contratista cumplió con la ejecución de la obra utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas y materiales adecuados, así como los demás elementos necesarios que se detallaron en el proceso precontractual y en los documentos contractuales.
Las demás que por Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo y las demás determinadas en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	X		Cumplió.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(En caso de haber entregables, deberá indicarse en qué consisten y dejarse constancia expresa de su entrega y aprobación. En caso contrario, suprimir este acápite.)


ITEM	*DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO*	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	**EXCAVACION MECANICA** Esta actividad comprende la ejecución de excavaciones que se deben realizar con maquinaria amarilla, comprende en general la excavación necesaria para la instalación de redes de alcantarillado.	M3	
2	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN** Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de permitir la conformación de la estructura de las cámaras de inspección, acometida domiciliaria y cajillas de inspección según los diseños técnicos del proyecto.	M3	

3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC Ø = 10"** Se refiere a la instalación de tubería de PVC tipo Novafort o similar con diámetro de 10in en los sitios indicados en los planos. Previo a la instalación de la tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los planos, esquemas y diseños del proyecto.	M	
4	**SUMINISTRO CAMA CIMENTACIÓN CON RECEBO E=0,20 COMPACTADO MECÁNICAMENTE** Esta actividad comprende en la colocación de una capa de material de recebo, en la cual, descansara la tubería, esta capa de recebo debe ser compactada mecánicamente en capas de 10cm, con la finalidad de hacer resistente esta capa y no permitir que la tubería se mueva, perdiendo líneas de pendiente	M3	
5	**CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,2 PROF: H <= 2,00 M, INCLUYE 6 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" Y TAPA EN FERROCONCRETO.** Se refiere a la construcción de cámara de inspección en concreto de 3000psi con un diámetro de 1.2m y una profundidad no mayor a 2.0m.	UND	
6	**SUMINISTRO DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.** Esta actividad comprende el suministro, colocación, humedecimiento, extensión y compactación de material común seleccionado proveniente de las excavaciones para el relleno de zanjas o áreas específicas del proyecto.	M3	

7	**SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC Ø = 6"** Se refiere a la instalación de tubería sanitaria de PVC o similar en los sitios indicados en los planos para las acometidas domiciliarias, estas tuberías serán suministrada a los propietarios de las viviendas para que estos realicen la instalación de esta tubería, ya que este ítem no incluye mano de obra para la instalación.	M	
8	**SUMINISTRO KID SILLA YEE ESTRUCTURADA 250MM X 160MM.** Esta actividad hace referencia al suministro del kit silla yee a los beneficiarios del proyecto, con el propósito de que realicen la acometida para conectarse a la tubería sanitaria principal, esta actividad deberá ser supervisada por el contratista, para la verificación de la correcta instalación de las conexiones de las tuberías.	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO

EXCAVACION MECANICA

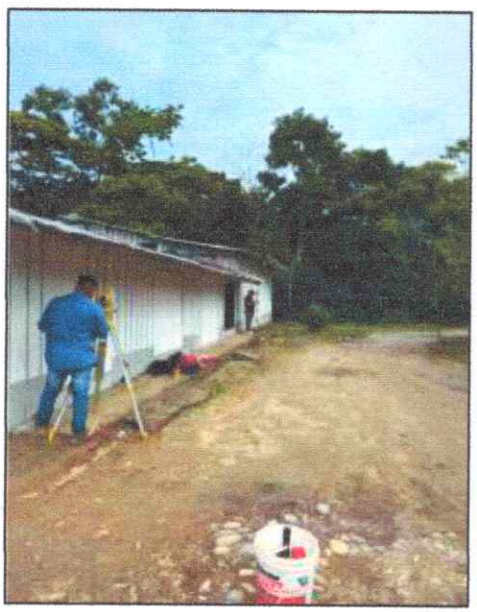



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC Ø = 10"





SUMINISTRO CAMA CIMENTACIÓN CON RECEBO E=0,20 COMPACTADO MECÁNICAMENTE





CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,2 PROF: H <= 2,00 M, INCLUYE 6 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" Y TAPA EN FERROCONCRETO.





	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

SUMINISTRO DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.





SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC Ø = 6"





	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-023
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	20-06-2025

SUMINISTRO KID SILLA YEE ESTRUCTURADA 250MM X 160MM.





CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000 PSI DE 0,70X0,70M MEDIDAS INTERNAS





7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ITEM 01	PERIODO DE PAGO 2025 - agosto	ENTREGA DE PLANILLA
LUIS ESCOBAR		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9492261133 de 24/09/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 121.500**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: Nueva EPS S.A. Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 52.900**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**
JULIETH ORTEGA		
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 121.500**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 4.000**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 24/09/2025 Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**
Franklin Diaz		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9490840089 de 28/08/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Protección Fecha: 28/08/2025 Valor: $ 121.500**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR Fecha: 28/08/2025 Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros Fecha: 28/08/2025 Valor: $ 33.100**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO Fecha: 28/08/2025**	**CUMPLE**

	Valor: $ 30.400	
JIMMER FIGUEROA		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9490840089 de 28/08/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Colpensiones** **Fecha: 28/08/2025** **Valor: $ 121.500**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 28/08/2025** **Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 28/08/2025** **Valor: $ 33.100**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 28/08/2025** **Valor: $ 30.400**	**CUMPLE**

ÍTEM 2	PERIODO DE PAGO 2025 - septiembre	ENTREGA DE PLANILLA
Luis Escobar		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9492261169 de 24/09/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 227.800**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: Nueva EPS S.A.** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 99.100**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
JULIETH ORTEGA		
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 227.800**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 7.500**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 24/09/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**

Franklin Diaz		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9491845306 de 22/09/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Protección** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 113.900**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 31.000**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9493799784 de 28/10/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Protección** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 113.900**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 31.000**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**
JIMMER FIGUEROA		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9491845306 de 22/09/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Colpensiones** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 113.900**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 31.000**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 22/09/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9493799816 de 28/10/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Colpensiones** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 113.900**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR**	**CUMPLE**

	Fecha: 28/10/2025 **Valor: $ 28.500**	
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 31.000**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 28/10/2025** **Valor: $ 28.500**	**CUMPLE**

ÍTEM 01	PERIODO DE PAGO 2025 - octubre	ENTREGA DE PLANILLA
LUIS ESCOBAR		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9493802763 de 24/11/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 227.800**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: Nueva EPS S.A.** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 99.100**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
JULIETH ORTEGA		
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 227.800**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 7.500**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
Franklin Diaz		
PENSIÓN	**Entidad: Protección** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 227.800**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros**	**CUMPLE**

	Fecha: 24/11/2025 **Valor: $ 99.100**	
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
JIMMER FIGUEROA		
PENSIÓN	**Entidad: Colpensiones** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 227.800**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 99.100**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 24/11/2025** **Valor: $ 57.000**	**CUMPLE**

ÍTEM 01	PERIODO DE PAGO 2025 - noviembre	ENTREGA DE PLANILLA
LUIS ESCOBAR		
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	**No. 9494436420 de 06/11/2025**	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 38.000**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: Nueva EPS S.A.** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 16.600**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**
JULIETH ORTEGA		
PENSIÓN	**Entidad: Porvenir** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 38.000**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 1.300**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO**	**CUMPLE**

	Fecha: 06/11/2025 **Valor: $9.500**	
Franklin Diaz		
PENSIÓN	**Entidad: Protección** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 38.000**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 16.600**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**
JIMMER FIGUEROA		
PENSIÓN	**Entidad: Colpensiones** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 38.000**	**CUMPLE**
SALUD	**Entidad: EMSSANAR** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**
RIESGOS PROFESIONALES	**Entidad: Positiva compañía de seguros** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 16.600**	**CUMPLE**
CCF	**Entidad: CONFAMILIAR PUTUMAYO** **Fecha: 06/11/2025** **Valor: $ 9.500**	**CUMPLE**

8. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

1. El suscrito supervisor, en cumplimiento de las funciones asignadas y con fundamento en la verificación de la ejecución contractual, certifica que INGSERH S.A.S identificado con NIT: 900128087-6, dio Cumplimiento a la totalidad de las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025 del 01 de agosto de 2025, suscrito con la Administración Municipal del Valle del Guamuez.

El contrato fue ejecutado en el periodo comprendido entre el 15 agosto de 2025 y el 05 noviembre del 2025. alcanzando el 100% de cumplimiento a satisfacción de su objeto, metas, actividades y compromisos establecidos en los estudios y documentos contractuales.

El contratista presento el informe de ejecución contractual final de fecha cinco (05) de noviembre de 2025, acompañado de algunos soportes documentales, por lo cual la secretaria de Planeación Y Obras Públicas Municipal deja claridad en el acta de recibo final al contratista el día 05 de noviembre del 2025 para que haga entrega de los soportes faltantes, El día cuatro (04) de noviembre se realizó la solicitud de entrega de la factura correspondiente a las fechas de terminación anticipada, la cual debía ser entregada el cinco (05) de noviembre, sin embargo, la factura fue entregada el diecinueve (19) de diciembre, el último documento entregado por el contratista, por lo tanto.

En consecuencia, se certifica que el contrato ha sido ejecutado y recibido a satisfacción, razón por la cual se autoriza proceder con su correspondiente liquidación en los términos de la Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones concordantes.

2. El supervisor en relación Con el CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025 del 01 de agosto, suscrito entre la Administración Municipal del Valle del Guamuez e INGSERH S.A.S, identificado con NIT: 900128087-6, se verificó que:

Durante el periodo comprendido entre el 15 agosto de 2025 y el 05 noviembre del 2025, fecha en la cual se dio inicio y culminación anticipada al proyecto objeto del contrato, la entidad ejecutora cumplió de manera satisfactoria con pago la oportuna consignación de los aportes parafiscales correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

De tal sentido INGSERH S.A.S. se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales generados durante la ejecución del mencionado contrato de obra.

Relación pago planillas:
Planilla No. 9492261133 fecha de pago 24/09/2025 (Periodo pensión: 2025/08. Periodo Salud: 2025/09).
Planilla No 9490840089 fecha de pago 28/08/2025 (Periodo pensión: 2025/08. Periodo Salud: 2025/09).
Planilla No 9492261169 fecha de pago 24/09/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud 2025/10).
Planilla No. 9491845306 fecha de pago 22/09/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud: 2025/10).
Planilla No. 9493799784 fecha de pago 28/10/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud: 2025/10).
Planilla No 9493799816 fecha de pago 28/10/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud: 2025/10).
Planilla No. 9493802763 fecha de pago 24/11/2025 (Periodo pensión: 2025/10. Periodo Salud: 2025/11).
Planilla No .9494436420 fecha de pago 06/11/2025 (Periodo pensión: 2025/11. Periodo Salud: 2025/12).

Certificación de Cumplimiento de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social durante el periodo de ejecución, suscrito por BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA, TP 289542-T, con fecha de expedición de certificación: 03/12/2025.

9. SOPORTES DOCUMENTALES

1.Informe de ejecución final con sus respectivos elementos documentales anexos presentado por el beneficiario INGSERH S.A.S de fecha 05 de noviembre de 2025.

2.Acta de Recibo Final anticipada del CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025, suscita, suscrita el día cinco (05) de noviembre de 2025 entre el Supervisor, y el Representante legal de INGSERH S.A.S.

3.Facturas de venta electrónica No FVIN 7 del 19/12/2025 expedida por el beneficiario,

4. Relación pago planillas:
Planilla No. 9492261133 fecha de pago 24/09/2025 (Periodo pensión: 2025/08. Periodo Salud: 2025/09).
Planilla No 9490840089 fecha de pago 28/08/2025 (Periodo pensión: 2025/08. Periodo Salud: 2025/09).
Planilla No 9492261169 fecha de pago 24/09/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud 2025/10).
Planilla No. 9491845306 fecha de pago 22/09/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud: 2025/10).
Planilla No. 9493799784 fecha de pago 28/10/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud: 2025/10).
Planilla No 9493799816 fecha de pago 28/10/2025 (Periodo pensión: 2025/09. Periodo Salud: 2025/10).

Planilla No. 9493802763 fecha de pago 24/11/2025 (Periodo pensión: 2025/10. Periodo Salud: 2025/11).
Planilla No .9494436420 fecha de pago 06/11/2025 (Periodo pensión: 2025/11. Periodo Salud: 2025/12).

5.Certificación de Cumplimiento de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social durante el periodo de ejecución, suscrito por BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA, TP 289542-T, con fecha de expedición de certificación: 03/12/2025.

6. Informe Final de Obra del 05/11/2025.

7.Acta de recibo anticipada a satisfacción final de supervisión del 05/11/2025

8. Pago, Certificación Fic Sena. Fecha 12/11/2025

9.Certificado de cumplimiento del 19/12/2025

10. Informe de supervisión final del 19/12/2025

INFORME PERIODO	CUMPLE
El contratista presentó informe del periodo: **DOCUMENTOS SOPORTADOS DESDE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025** 1. Informe del Contratita 2. Planillas de seguridad social 3. Factura No. FVIN 7 de 19/12/2025 4. Certificado de parafiscales 5. Ensayo de densidades 6. Ensayos de concretos 7. Desglose de imprevistos 8. Plano récords	SI

10. RESUMEN DE LA EJECUCCION FINANCIERA

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos:

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 70.937.365,50**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	**N/A**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	**$ 24.999.717.84**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 95,937,083.34**
VALOR DISMINUIDO DEL CONTRATO	**$ 00,00**
INFORMACION DEL ACTA FINAL	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO	**100 %**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (Valor total contratado X porcentaje ejecutado)	**$ 95,937,083.34**
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	**$ 00,00**
TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	**$ 95,937,083.34**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL	**100 %**
VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 00.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 95,937,083.34
VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 00.00**
VALOR POR AMORTIZAR:	**00%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	**00%**

NOTA: En caso de ser necesario indicar las observaciones frente a la ejecución financiera. Adicionar las filas necesarias en caso de convenios donde existan rendimientos financieros, reembolsos, entre otros.

CONSTANCIA DE REFRENDACIÓN:

Obrando en mi condición de supervisor del contrato de obra, dejo constancia de que la refrendación realizada a los documentos del expediente contractual objeto de vigilancia, da cuenta de la verificación de la existencia de los originales dentro de la carpeta contentiva de los mismos; sin embargo la veracidad de la información allí contenida es de exclusiva responsabilidad del emisor o de quien haga su aporte, teniendo en cuenta lo invocado en el principio de buena fe contenido en el Art. 83 de la C.P., el que obliga a que las autoridades públicas presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares y obliga a que tanto autoridades públicas como particulares actúen de buena fe.

"C.P. 1991. ARTICULO 83. *Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".*

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes diciembre del 2025

SUPERVISOR:

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Elaboró Parte técnica	David Ortiz	Cargo Apoyo SPOPM	Firma
