ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

7 V 2014

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO (UNIFICADO)
CONVENIO No. 212047 (FONADE) – 040 DE 2012 DPS SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL DPS
CONVENIO No. 211041 (FONADE) – 160 DE 2011 DPS SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL DPS
CONVENIO No. 212080 (FONADE) – 069 DE 2011 DPS SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL DPS

Lugar de la reunión:	SALA DE JUNTAS ASESORES DPS Piso 4
Fecha de la reunión:	11 DE OCTUBRE DE 2013
Hora de inicio de la reunión:	11:00 am
Hora de terminación de la reunión	12:30 pm

Asistentes:

Por Fonade:	Dra. Patricia Troncoso – Gerente General (E)
Por el cliente:	Dra. Mariana Escobar - Subdirectora General DPS
Invitados:	**Por el DPS:** • Diana Blanco - Asesora de Dirección encargada de las funciones de Coordinación del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat – Supervisora Convenio • Lenny Farley Diaz – Profesional Especializado GT Infraestructura y Hábitat - Supervisora Convenio Fonade 160-11 • Jaime Eduardo Ortiz C – Profesional Especializado GT Infraestructura y Hábitat - Supervisor Convenio 040-12 • Felipe Amaya – Asesor Dirección General **Por FONADE:** • Alejandro Serrano Roa • Elkin Cantor – Gerente convenio 040-12 • Oscar Acevedo – Gerente Convenio Fonade 069-12 • Jose Insuasti – Gerente Convenio Fonade 160-11 • Claudia Jaramillo


Orden del Día:

TEMA	RESPONSABLE
1. Estado de avance de los Proyectos 2. Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos 3. Decisiones en torno el Listado Inicial 4. Finanzas 5. Puntos varios	Fonade – Gerencia del Convenio

Desarrollo de la reunión:


1. Estado de avance de los Proyectos

FONADE presenta el informe consolidado con corte 02 de octubre de 2013, en el que se refleja el estado de avance de los proyectos que se encuentran en ejecución con cargo a los convenios de gerencia integral, tal como se relaciona a continuación:

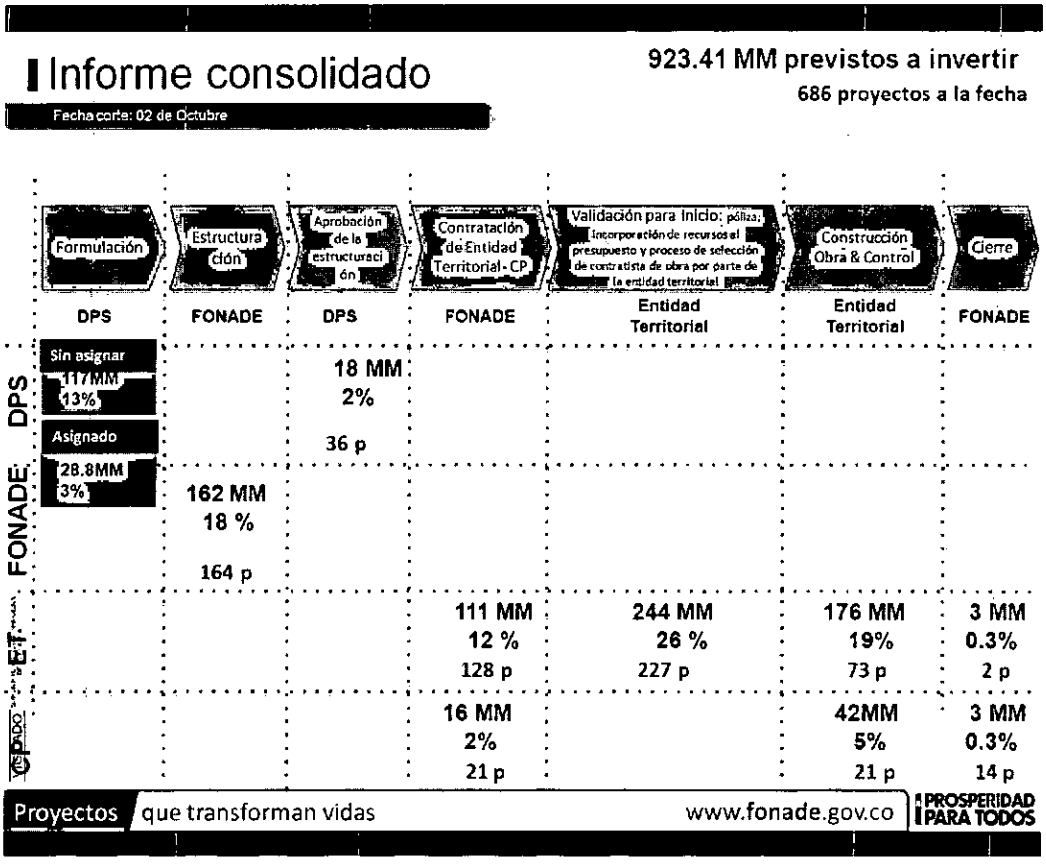


Del cuadro anterior se establece que se cuenta con un universo de 686 proyectos para una inversión prevista de *923.41 MM (miles de millones)*

La ejecución de los convenios en avance acumulado refleja un consolidado de la siguiente forma, con una tendencia positiva

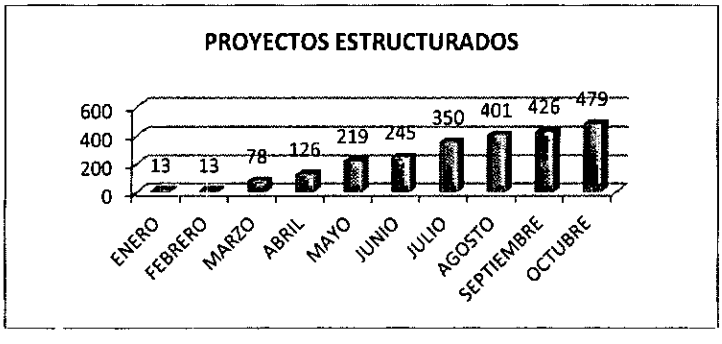


- **ESTRUCTURACION DE PROYECTO** - 11 % ($) $26 mm- 22 Proyectos
- **CONTRATACION** - 2% ($) $4 mm - 2 Proyectos (Incluye la contratación con ente territorial y privado)
- **EJECUCION** - 73% ($) $171 mm - 58 Proyectos (Incluye la contratación con ente territorial y privado)


***** (Cifras en miles de millones)***

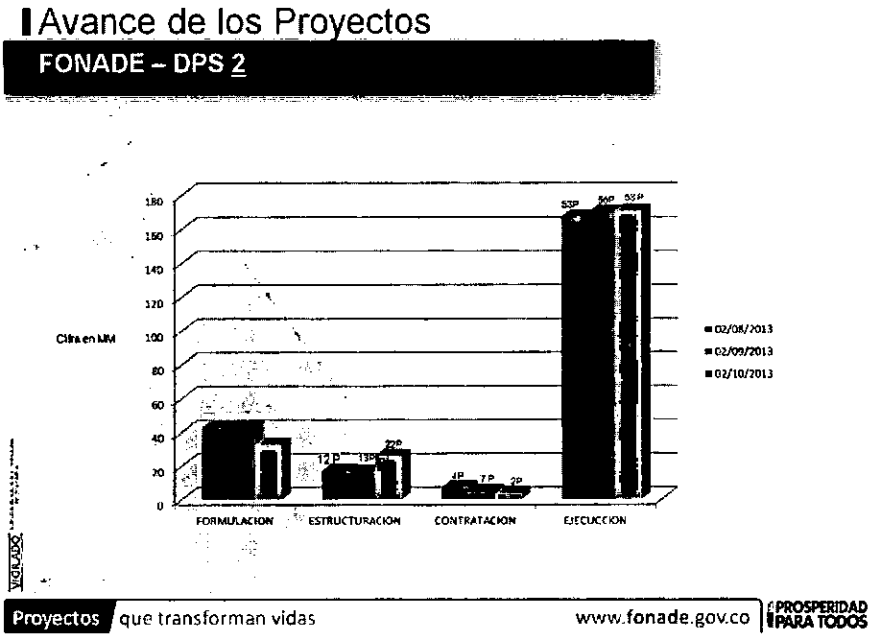

- **FONADE- DPS 3 - CONVENIO 069 DE 2012:**

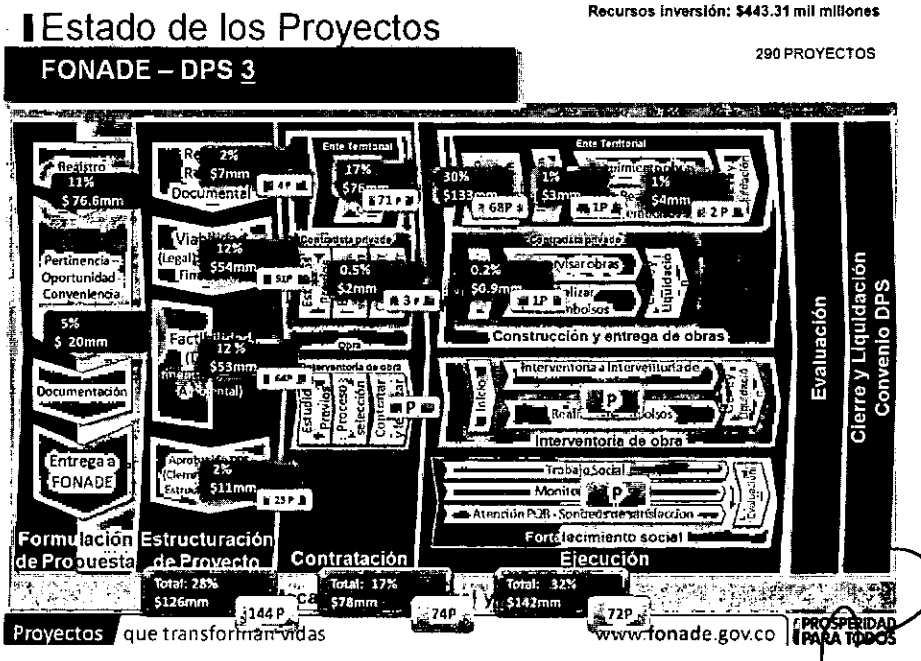

- **FORMULACION DE PROPUESTA** – Registro 11% ($) $76.6 mm Pertinencia oportunidad Conveniencia 5% $ 20 mm
- **ESTRUCTURACION DE PROYECTO** - 28 % ($) $126 mm- 144 Proyectos
- **CONTRATACION** - 17% ($) $78 mm - 74 Proyectos (Incluye la contratación con ente territorial y privado)
- **EJECUCION** - 32% ($) $142 mm - 72 Proyectos (Incluye la contratación con ente territorial y privado)

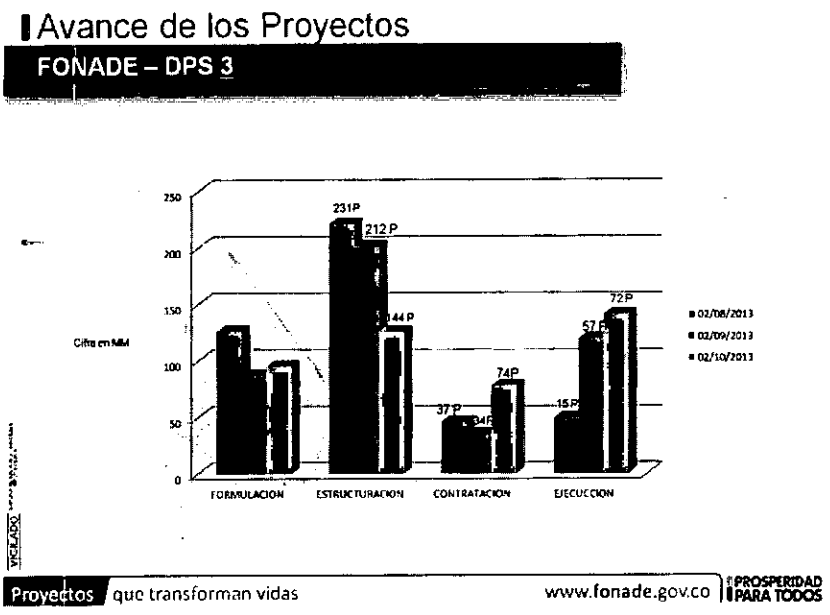


2. Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos

a. Proyectos pendientes de asignación de recursos

- **FONADE – DPS 1- CONVENIO 160 DE 2011:**


Se presenta ante el comité cuatro (4) Proyectos para cierre financiero.

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO	VALOR	JUSTIFICACION
357	OPP	BOYACA	OTANCHE	Construcción del coliseo cubierto del municipio de Otanche - Boyacá.	$ 729,956,749.00	$ 1,086,771,769.00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
406	DPS	BOYACA	SIACHOQUE	construcción unidades sanitarias vereda guatchá, Municipio de Siachoque - Boyaca	$ 80,000,000.00	$ 54,383,621.00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
407	DPS	BOYACA	CHIVATA	construcción de unidades sanitarias en el sector rural, Municipio de Chivata - Boyaca	$ 80,000,000.00	$ 37,842,813.00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
408	DPS	BOYACA	SORACA	construcción de unidades sanitarias en el área rural, Municipio de Soraca – Boyaca	$ 80,000,000.00	$ 40,123,468.00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
TOTAL OPP						1,086,771,769	
TOTAL DPS						132,349,902	
TOTAL ASIGNACION DE RECURSOS						1,219,121,671	

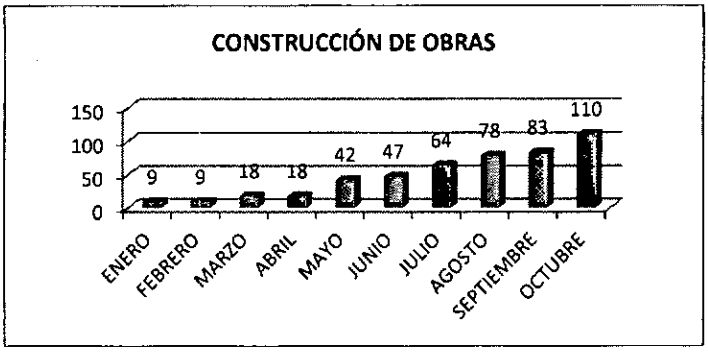


A continuación se presenta el estado de los proyectos para cada uno de los convenios:


- **FONADE- DPS 1 - CONVENIO 160 DE 2011:**

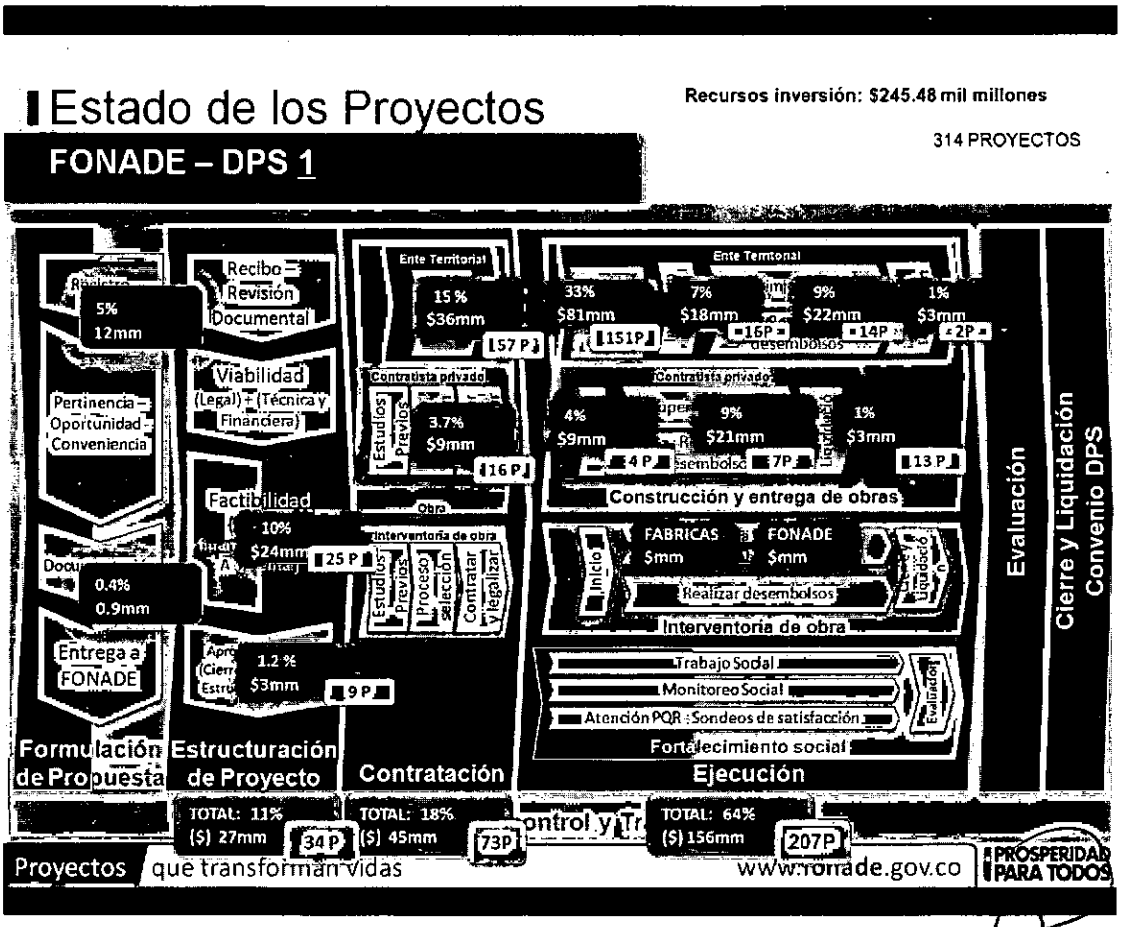

FORMULACION DE PROPUESTA - Registro 5% ($) 12mm Documentación 0.4% ($) 0.9 mm
ESTRUCTURACION DE PROYECTO – 11 % ($) $27 mm- 34 Proyectos
CONTRATACION - 18 % ($) $45 mm - 73 Proyectos (Incluye la contratación con ente territorial y privado)
EJECUCION - 64% $156 mm - 207 Proyectos (Incluye la contratación con ente territorial y privado)

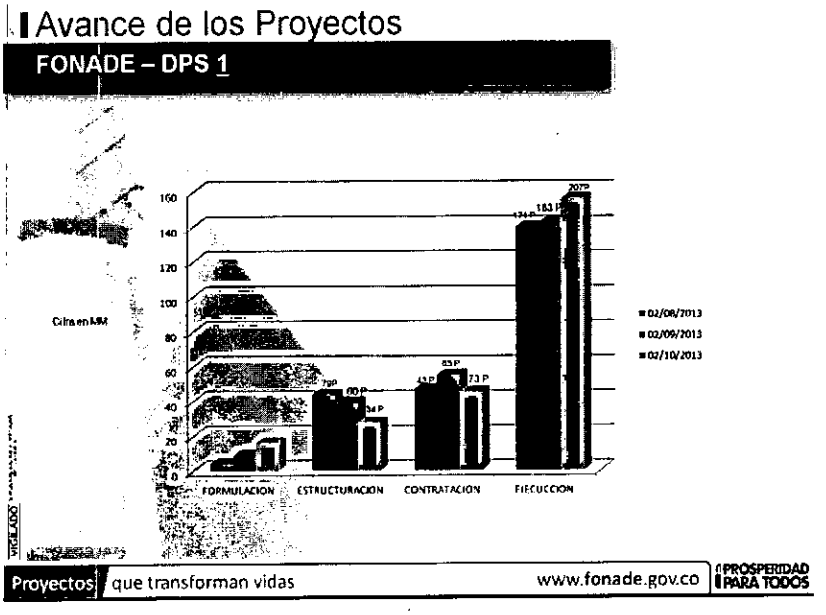

- **FONADE- DPS 2 - CONVENIO 040 DE 2012:**

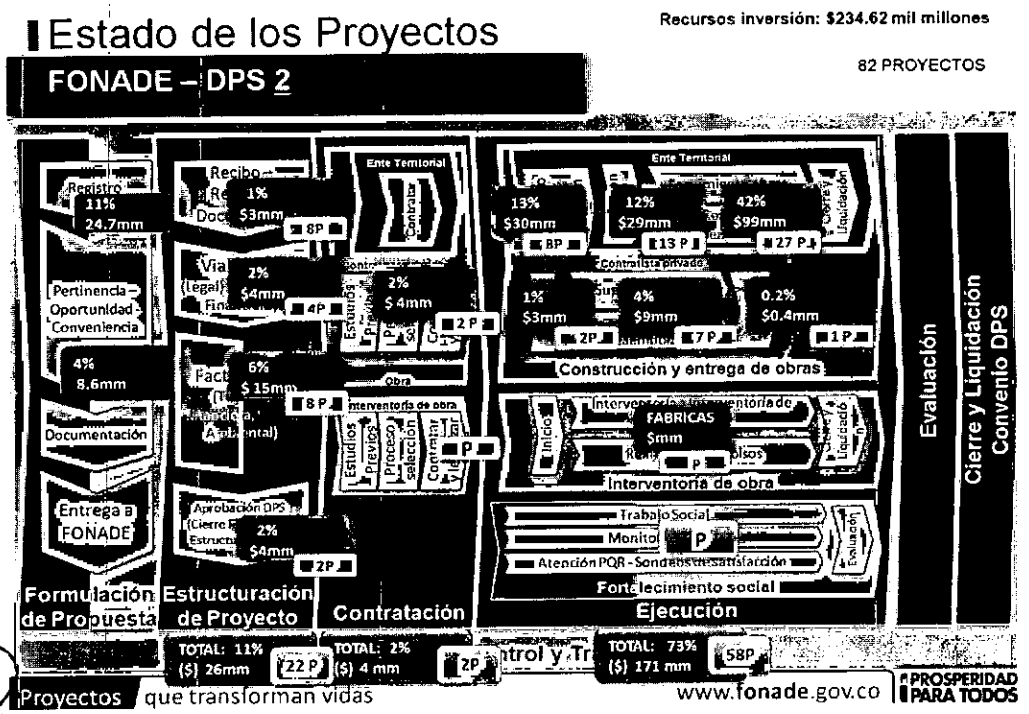

- **FONADE – DPS 2 - CONVENIO 040 DE 2012:**

  - Se presenta ante el comité un (1) Proyecto para cierre financiero.

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO	VALOR REQUERIDO	JUSTIFICACION
44	OPP	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA	$3,042,501,548.00	$ 1,000,000,000	Se cancela el proyecto 090 de Fusagasugá por el convenio 040 de 2012 y se traslada recursos por $1.000.000.000 para adicionar a este proyecto y así dar el cierre financiero al proyecto 44 debido a las mayores cantidades de obra presentadas y que son necesarias para la construcción de la plaza de mercado en la fase funcional.

- **FONADE – DPS 3 - CONVENIO 069 DE 2012:**

  b. Se presenta ante el comité veinticinco (25) Proyectos para cierre financiero.

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO	VALOR REQUERIDO	JUSTIFICACION
103	OPP	CAUCA	ROSAS	Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de familias de los estratos 1 y 2 mediante la construcción y/o mejoramiento de cocinas saludables en el municipio de Rosas - Cauca.	$ 378.658.247,00	$ 71.163.819,00	El mpio cofinancia con 150.000.000
104	OPP	CAUCA	SAN SEBASTIAN	Construcción polideportivo cubierto corregimiento de Paramillos, municipio de San Sebastián - Cauca.	$ 226.959.150,00	$ 126.848.490,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
139	OPP	CUNDINAMARCA	CAQUEZA	Construcción cerramiento IEd Placitas, del municipio de Caqueza - Cundinamarca.	$ 60.000.000,00	$ 32.420.546,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
191	OPP	HUILA	PITALITO	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO I.E. VEREDA EL PORVENIR CORREGIMEINTO DE BRUSELAS EN PITALITO HUILA	$ 230.000.000,00	$ 91.364.719,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
195	OPP	HUILA	TESALIA	CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL EL ROSARIO DEL MPIO DE TESALIA HUILA	$ 198.962.353,00	$ 15.627.174,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
226	OPP	NORTE DE SANTANDER	CHINACOTA	ADECUACION CANCHA COLEGIO DEL CORREGIMIENTO LA DON JUANA, CHINACOTA	$ 73.013.475,80	$ 8.319.050,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
231	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	ADECUCION CANCHA COLEGIO, BARRIO AEROPUERTO	$ 218.981.774,93	$ 6.059.438,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
234	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PROYECTO PARQUE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE CUCUTA	$ 202.002.892,62	$ 86.167.990,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
237	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	ADECUACION CANCHA LA ESPERANZA, BARRIO PALMERAS PARTE BAJA, CUCUTA	$ 95.587.996,52	$ 19.250.961,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
311	OPP	VALLE DEL CAUCA	CAICEDONIA	ADECUACION Y CONSTRUCCION SENDERO BIOSALUDABLE PARQUE CIUDADELA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA	$ 444.444.600,00	$ 45.320.423,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
316	OPP	VALLE DEL CAUCA	RIOFRIO	CUBIERTA PARA GRADERIA ESTADIO MUNICIPAL RICARDO ALVARADO CRUZ	$ 276.000.000,00	$ 23.204.887,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
321	OPP	VALLE DEL CAUCA	ULLOA	con carrera 48 esquina, hasta la carrera 44 con calle 65 (entrada barrio	$ 200.000.000,00	$ 2.084.560,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO	VALOR REQUERIDO	JUSTIFICACION
232	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CON ACABADOS CANCHA SINTETICA SAN LUIS, MUNICIPIO DE CUCUTA	$ 161.235.625,00	$ 35.823.676,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
206	OPP	META	EL CALVARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIA UBICADA ENTRE EL ALTO DE CRISTO HASTA EL ALTO DE SOBRETANA, LIMITES DEL DEPARTAMETNO DE META CON EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL K0+000 AL K23 + 000 EN EL MPIO DE CALVARIO	$ 1.500.000.000,00	$ 127.647.813,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
299	OPP	TOLIMA	FRESNO	Construcción de huellas en concreto, red terciaria del municipio de Fresno - Tolima.	$ 300.000.000,00	$ 7.093.638,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
300	OPP	TOLIMA	FRESNO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PARTIDAS EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO	$ 539.359.876,00	$ 86.532.860,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
11	OPP	ANTIOQUIA	YOLOMBO	Mantenimiento de la calzada y construcción de obras de drenaje en la via Los Aceites del municipio de Yolombo - Antioquia.	$ 250.000.000,00	$ 77.710.990,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
83	OPP	CAUCA	CAJIBIO	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO EL CARMELO CORREGIMIENTO DE EL CARMELO MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 364.810.755,00	$ 31.810.755,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
105	OPP	CAUCA	SAN SEBASTIAN	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CIGARRAS MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN	$ 227.344.775,00	$ 127.244.953,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
162	OPP	CUNDINAMARCA	SESQUILE	CONSTRUCCIÓN COLISEO DEPORTIVO TIERRA NEGRA	$ 249.990.000,00	$ 150.000.000,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero, el municipio $47,010,419
32	OPP	ATLANTICO	SOLEDAD	Construcción de la via en concreto rígido de la calle 59 entre carreras 12 y 14 barrio la Inmaculada del municipio de soledad	$ 1.000.000.000,00	$ 50.656.509,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
315	OPP	VALLE DEL CAUCA	LA UNION	CONTRUCCIÓN PAVIMENTO URBANO CARRERA 9 ENTRE CALLE 16 Y 17 BARRIO LAS LAJAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALEL DEL CAUCA	$ 97.048.299,00	$ 20.592.695,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
376	OPP	ATLANTICO	SABANAGRANDE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 3 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO	$ 608.787.436,00	$ 35.026.070,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
29	OPP	ATLANTICO	SABANALARGA	CONSTRUCCIÓN CUATRO AULAS ESCOLARES, BATERIA SANITARIA, CANCHA MULTIPLE Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS SE DE MARIANA BARRAZA DE ISABEL LOPEZ, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO MOLINEROS, MUNCIIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO	$ 688.916.039,00	$ 94.424.161,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
219	OPP	NARIÑO	SAN PABLO	ADECUACIÓN DE AREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE SAN PABLO	$ 250.000.000,00	$ 23.061.624,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
					TOTAL	1.395.657.801,00	

Conclusión: El comité de seguimiento acepta los cierres financieros presentados para cada uno de los convenios.

c. Cancelación de proyectos

El comité operativo recomienda a los miembros de Comité de Seguimiento la cancelación de los siguientes proyectos:

- **FONADE – DPS 1- CONVENIO 160 DE 2012:**

No	ESTRA	DPTO		PROYECTO	VALOR	JUSTIFICACION
271	DPS	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	Construcción polideportivo barrio Lleras, comuna 3 en el municipio de Buenaventura - Valle del Cauca.	743,007,847.00	El estudio de suelos arroja como conclusiones y recomendaciones que los suelos encontrados son orgánicos, no aptos para soportar ningún tipo de estructura ni pavimento a no ser que se hagan obras de mejoramiento (densificación) del suelo. Como resultado de los ítems adicionales se requeriría un presupuesto definitivo para la construcción del polideportivo de $1.574.582.336, requiriendo así un valor adicional de $1.055.274.825. Dicho costo no puede ser adicionado contractualmente, dado que superaría el 50% del valor total del contrato. Se propone al comité de seguimiento su cancelación debido a la no viabilidad financiera para la ejecución del proyecto, sin embargo se liberaran solo los saldos disponibles después de la liquidación de los contratos que se encuentran suscritos.
164	OPP	HUILA	SUAZA	Construcción parque Gallardo en el municipio Suaza - Huila.	250,000,000.00	El 26 de abril de 2013 mediante comunicación 20132320093481 se solicitó cofinanciación al Municipio por valor de $684.078.016. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido documento que cofinancie el proyecto, se propone al comité de seguimiento su cancelación debido a la no viabilidad financiera para la ejecución del proyecto.
16	DPS	BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el cual se incluyen los componentes de diagnostico y mejoramiento de vivienda para familias ubicadas en el corregimiento de El Salado y veredas El Bálsamo y Santa Clara, del municipio de El Carmen de Bolívar - Bolivar.	701,494,627.00	Se recomienda la cancelación de este proyecto para ser ejecutado directamente por el DPS, debido a su nivel de maduración era bajo, sin diagnóstico de intervención por vivienda .
TOTAL RECURSOS A CANCELAR ESTRATEGIA OPP					250,000,000.00	
TOTAL RECURSOS A CANCELAR ESTRATEGIA DPS					1,444,502,474.00	

Los miembros del comité de seguimiento aprueban la cancelación de los proyectos atendiendo las justificaciones presentadas por el comité operativo.

- **FONADE – DPS 2 - CONVENIO 040 DE 2012:**

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACION
90	OPP	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	ACTUALIZACIÓN A DISEÑOS, TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA.	$1,400,000,000.00	De acuerdo al informe de patología se evidencio que la obra presenta problemas de carácter técnico con losas de entrepisos que evidencian diferencias de nivel como consecuencia de realizar la construcción por etapas, adicionalmente se encuentran aceros expuestos, inexistencia de juntas constructivas y concretos hormigonados. Por lo tanto se hace necesario realizar un estudio de vulnerabilidad y pruebas de carga con el fin de determinar la intervención necesaria a nivel de estructura. En este senãdo y según el informe relacionado se considera que técnicamente la intervención del proyecto se vuelve inviable por tal motivo se recomienda su cancelación.

Los miembros del comité de seguimiento aprueban la cancelación de los proyectos atendiendo las justificaciones presentadas por el comité operativo.

- **FONADE – DPS 3 - CONVENIO 069 DE 2012:**

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACION
50	OPP	BOYACA	PAIPA	Dotación bio parques saludables zona urbana y corredor internacional lago sochagota, municipio de Paipa - Boyacá.	$ 116.516.000,00	No se a complementado la documentación basica por parte del municipio, (predios)
270	OPP	SANTANDER	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO VIAL VEREDAL DE LAS VEREDAS MONSERRATE, BOLARQUI ALTO Y CUCHILLA ALTO, DEL CORREGIMIENTO #2 MPIO DE BUCARAMANGA	$ 500.000.000,00	Proyecto sin respuesta por parte del ente territorial
362	OPP	HUILA	SAN AGUSTIN	Construcción puente vehicular El Centenario y mejoramiento del puente colgante acceso Colegio Nacional Laureano Gómez, municipio de San Agustin - Huila.	$ 359.675.784,00	Pese a múltiples solicitudes realizadas al Municipio para que alleguen los documentos faltantes del proyecto, el cual tiene un estado de maduración bajo, no se pudo obtener ninguna respuesta, no es viable financieramente.
TOTAL					$ 976.191.784,00	

Los miembros del comité de seguimiento aprueban la cancelación de los proyectos atendiendo las justificaciones presentadas por el comité operativo.

c. Precisiones de alcance de proyectos en estructuración

- **FONADE – DPS 3 CONVENIO 069 DE 2012:**

FONADE al realizar el informe de estructuración verificó en zona los diferentes proyectos relacionados a continuación de los cuales solicita precisar el alcance así:

NO	ESTRAT	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
40	OPP	BOLIVAR	MAHATES	Pavimentación vías urbanas desde el hospital local barrio Loma Ivera, calle 18 con las carreras 40, 39, 38, 37, 36, 36a y 34, municipio de Mahates - Bolívar.	Pavimentación de las vías urbanas principales (calle 18 y carrera 33), en la cabecera municpal de Mahates-Bolivar	Para ajustar las metas fiscas, con el fin de invertir la totalidad de los recursos asignados.
217	OPP	NARIÑO	OSPINA	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CENTRO CULTURAL MUNICIPIO DE OSPINA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Se ajusta la meta fisica, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para el proyecto

De conformidad con la justificación presentada, los miembros del comité de seguimiento, aceptan la precisión al objeto presentada.

d. Liberación de saldos - proyectos estructurados

- **FONADE – DPS 3 CONVENIO 069 DE 2012:**

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO	VALOR LIBERADO	JUSTIFICACION
357	OPP	ATLANTICO	MANATI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y ARROYO CALLE 10, CALLE 9 ENTRE ARROYO CALLE 10 Y CARRERA 5B, CALLE 8A ENTRE CARRERAS 4 Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y 8 A Y CARRERA 5 A ENTRE CALLES 8 A Y 9 EN EL MUNICIPIO DE MANATÍ ATLÁNTICO	$ 1,499,980,398.00	$ 288,766,901.00	El proyecto ya cuenta con cierre financiero.
20	OPP	ATLANTICO	GALAPA	ADECUACIÓN GENERAL DEL COLISEO Y CANCHA SINTETICA DE FUTBOLDEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GALAPA	$ 3,034,164,278.00	$ 275,494,701.00	El proyecto ya cuenta con cierre financiero.
TOTAL						564,261,602.00	

Por las razones presentadas, el comité de seguimiento, acepta la liberación de saldos presentada.

3. Decisiones en torno el Listado Inicial

a. Inclusión de nuevas propuestas en listado

El Dps propone la inclusión de nuevas propuestas en el listado, tal y como se relacionan a continuación:

- **FONADE – DPS 1 CONVENIO 160 DE 2011:**

ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR
OPP	NARIÑO	PUERRES	Construcción pavimentación vías urbanas sector centro del Municipio de Puerres- Nariño	$ 300,000,000

El comité de seguimiento aprueba la inclusión del proyecto anteriormente relacionado.

- **FONADE – DPS 2 CONVENIO 040 DE 2012:**

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO
	DPS	CESAR	SABANA DE CRESPO	ESTUDIOS y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN SABANA DE CRESPO	$ 60,000,000.00
	DPS	BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAMANGA ENTRADA MAMÓN DE MARIA DE CARMEN DE BOLÍVAR.	$ 468,610,598.40
	DPS	ANTIOQUIA	ANORI	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLE DE ANORÍ - ANTIOQUIA	$ 471,132,698.04
	DPS	CAUCA	CALOTO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USO MÚLTIPLE VEREDA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA	$ 144,710,767.04
	DPS	CAUCA	CALOTO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USO MÚLTIPLE VEREDA BODEGA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA	$ 144,710,767.04
	DPS	CAUCA	CORINTO	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CORINTO	$ 389,939,544.96
	DPS	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7, DEL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA.	$ 195,771,642.08
	DPS	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA MOTILANDIA EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA.	$ 307,817,046.88
	DPS	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA CRA 12 DEL BARRIO VILLA MARQUEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA.	$ 184,690,227.68
	DPS	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA FARACHE, SANTA FE Y LA VÍA FARACHE-PULPITOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA	$ 334,101,718.72
	DPS	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	$ 504,000,000.00
	DPS	NORTE DE SANTANDER	TIBU	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y PROTECCION EN LA VÍA EL ENCANTO - MATECOCO DEL MUNICIPIO DE TIBU	$ 117,494,088.32
	DPS	NORTE DE SANTANDER	TIBU	CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA PEATONAL VEREDA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ	$ 94,326,892.80
	APP	HUILA	RIVERA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTISTICO DEL SAN JUANERO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	$ 3,500,000,000.00

El comité de seguimiento aprueba la inclusión del proyecto anteriormente relacionado.

- **FONADE – DPS 3 CONVENIO 069 DE 2012:**

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO
395	OPP	TOLIMA	ALPUJARRA	CONSTRUCCION AULAS TECNOLOGICAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIZA ZUAREZ DE ORTIZ	$ 704,900,000.00
396	OPP	TOLIMA	HERVEO	CONSTRUCCIÓN AULA VEREDA MESONES	$ 300,000,000.00
397	OPP	TOLIMA	LÍBANO	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO BLOQUE DE AULAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA EL TESORO	$ 300,000,000.00
398	OPP	BOYACÁ	SIACHOQUE	INTERVENCION Y RECONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA MUNICIPIO DE SIACHOQUE	$ 1,200,000,000.00
399	OPP	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	CERRAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL. PENDIENTE PRESENTAR EL PROYECTO	$ 200,000,000.00
400	OPP	NARIÑO	COLON GÉNOVA	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN TÉCNICO INDUSTRIAL EDUCATIVA DIVINO NIÑO	$ 487,765,610.00
401	OPP	HUILA	PALESTINA	PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	$ 800,000,000.00
402	OPP	HUILA	TIMANÁ	RESTAURACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CENTRO POBLADO NARANJAL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA	$ 300,000,000.00
403	OPP	RISARALDA	QUINCHIA	RESPOSICÓN PAVIMENTO RIGIDO TERCERA ETAPA ZONA URBANA MUNICIPIO DE QUINCHIA	$ 1,018,000,000.00
404	OPP	RISARALDA	LA CELIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 2 SALIDA A VILLANUEVA MUNICIPIO DE LA CELIA	$ 1,192,000,000.00
405	OPP	SANTANDER	CEPITA	ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CEPITA SANTANDER	$ 200,000,000.00
406	OPP	MAGDALENA	EL BANCO	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CON CANCHA POLIDEPORTIVA GRADERIA CUBIERTA SENDEROS PEATONALES, JARDINES E ILUMINACION EN EL BARRIO MANZANARES	$ 300,000,000.00
407	OPP	MAGDALENA	EL BANCO	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CON CANCHA POLIDEPORTIVA GRADERIA CUBIERTA SENDEROS PEATONALES, JARDINES E ILUMINACION EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE	$ 300,000,000.00

El comité de seguimiento aprueba la inclusión del proyecto anteriormente relacionado.

b. Cancelación de propuestas en listado

- **FONADE- DPS 3 CONVENIO 069 DE 2012:**


El Comité Operativo propone cancelar las siguientes propuestas del listado:

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACION
72	OPP	CALDAS	VILLAMARIA	Mejoramiento de viviendas en el municipio de Villamaria - Caldas.	$ 100.000.000,00	Se cancelan los poryectos MCH Caldas, teniendo en cuenta que se ejecutarán a través del Convenio con FNC
101	OPP	CAUCA	PIENDAMO	Mejoramiento de vivienda, construcción de cocinas en el municipio de Piendamo - Cauca.	$ 350.000.000,00	sin cdp de cofinanciacion, ni requisitos minimos

El comité de seguimiento aprueba la cancelación de las propuestas anteriormente relacionadas.

4. Finanzas

El consolidado de ejecución de los convenios presenta el siguiente panorama en cuanto a tema financiero se refiere:

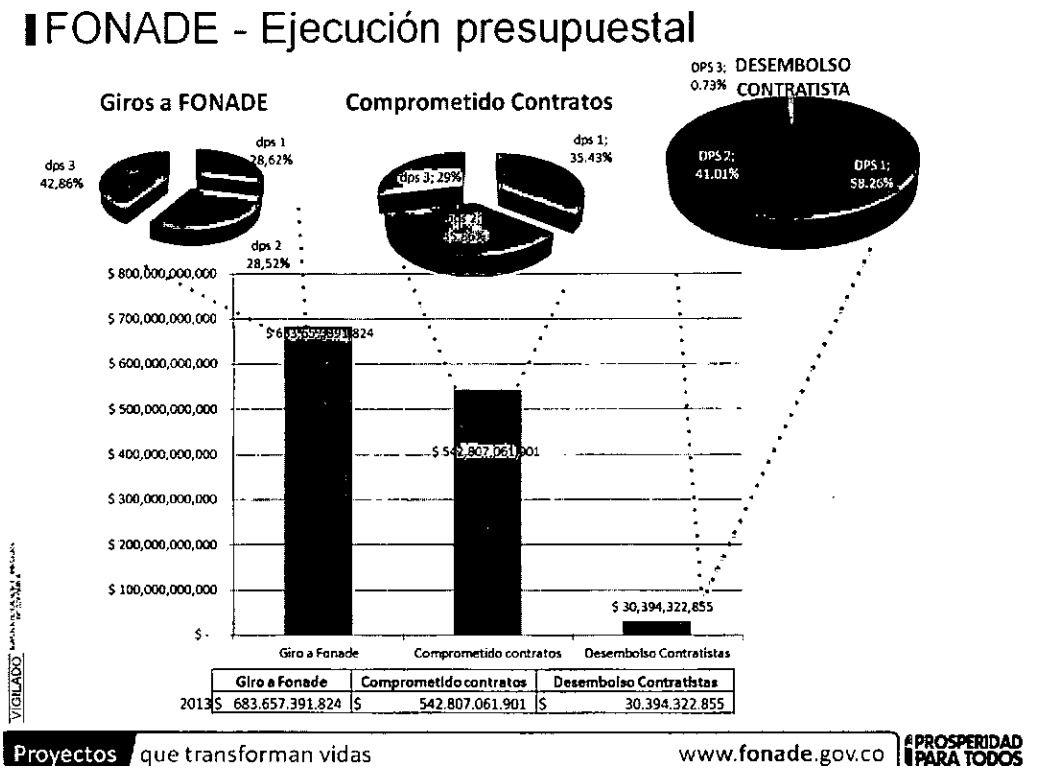

- **Para el Convenio de Gerencia Integral No. 160 – 11 se tiene:**

Estado Actual:

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	ESTADO ACTUAL RESUMEN FINANCIERO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	$ 12,769,686,932	$ 555,810,319	$ 200,000,000	$ 12,013,876,613
DPS	$ 35,279,058,552	$ 1,907,636,302	$ 270,000,000	$ 33,101,422,250
OPP	$ 194,211,550,498	$ 9,685,771,235	$ 450,000,000	$ 184,075,779,263
SUB TOTAL [redacted]	$ [redacted] 242,260,295,982	$ [redacted] 12,149,217,856	$ [redacted] 920,000,000	$ [redacted] 229,191,078,126
RENDIMIENTOS	$ 3,224,000,000	$ 3,038,145,753		$ 185,854,247
SUB TOTAL [redacted]	$ [redacted] 3,224,000,000	$ [redacted] 3,038,145,753	[redacted]	$ [redacted] 185,854,247
TOTALES [redacted]	$ [redacted] 245,484,295,982	$ [redacted] 15,187,363,609	$ [redacted] 920,000,000	$ [redacted] 229,376,932,373

Movimientos financieros presentados en el comité de seguimiento del día 11 de Octubre de 2013:

ESTRATEGIA	Propuestas de modificaciones 2 de Octubre					
	Propuestas a incluir en listado	Propuestas a cancelar del listado	Cierre Financiero	Liberación de saldos de proyectos	Cancelación de Proyecto	Total
APP						$ -
DPS			$ (132,349,902)		$ 1,444,502,474	$ 1,312,152,572
OPP	$ (300,000,000)		$ (1,086,771,769)		$ 250,000,000	$ (1,136,771,769)
SUB TOTAL	**$ (300,000,000)**	**$ -**	**$ (1,219,121,671)**	**$ -**	**$ 1,694,502,474**	**$ 175,380,803**
RENDIMIENTOS						$ -
SUB TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTALES	**$ (300,000,000)**	**$ -**	**$ (1,219,121,671)**	**$ -**	**$ 1,694,502,474**	**$ 175,380,803**

Estado financiero actual del convenio 160-11 según lo aprobado en el comité de seguimiento del día 11 de Octubre de 2013:

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	RESUMEN CON APROBACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	$ 12,769,686,932	$ 555,810,319	$ 200,000,000	$ 12,013,876,613
DPS	$ 35,279,058,552	$ 3,219,788,874	$ 270,000,000	$ 31,789,269,678
OPP	$ 194,211,550,498	$ 8,548,999,466	$ 750,000,000	$ 184,912,551,032
SUB TOTAL	**$ 242,260,295,982**	**$ 12,324,598,659**	**$ 1,220,000,000**	**$ 228,715,697,323**
RENDIMIENTOS	$ 3,224,000,000	$ 3,038,145,753		$ 185,854,247
SUB TOTAL	**$ 3,224,000,000**	**$ 3,038,145,753**		**$ 185,854,247**
TOTALES	**$ 245,484,295,982**	**$ 15,362,744,412**	**$ 1,220,000,000**	**$ 228,901,551,570**

- **Para el Convenio de Gerencia Integral No. 040 – 12 se tiene:**

Estado Actual:

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	ESTADO ACTUAL RESUMEN FINANCIERO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	34,700,000,000	4,809,317,867	7,053,000,000	22,837,682,133
DPS	28,717,580,000	19,503,623,737	1,087,570,676	8,126,385,587
OPP	171,200,000,000	462,037,386	500,000,000	170,237,962,614
SUBTOTAL	**234,617,580,000**	**24,774,978,990**	**8,640,570,676**	**201,202,030,334**
RENDIMIENTOS	0	0	0	0
SUBTOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**
OPERATIVOS. CUOTA DE GERENCIA Y GMF	13,398,420,000			
TOTALES	**248,016,000,000**	**24,774,978,990**	**8,640,570,676**	**201,202,030,334**

Movimientos financieros presentados en el comité de seguimiento del día 11 de Octubre de 2013

ESTRATEGIA	Propuestas de modificaciones Comité seguimiento de septiembre					
	Propuestas a incluir en listado	Propuestas a cancelar del listado	Adicion de Recursos	Liberación de saldos de proyectos	Cancelación de Proyecto	Total
APP	3,500,000,000					3,500,000,000
DPS	3,417,305,989					3,417,305,989
OPP		-1,400,000,000	1,000,000,000			-400,000,000
SUBTOTAL	**6,917,305,989**	**-1,400,000,000**	**1,000,000,000**	**0**	**0**	**6,517,305,989**
RENDIMIENTOS						0
SUBTOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OPERATIVOS. CUOTA DE GERENCIA Y GMF						0
TOTALES	**6,917,305,989**	**-1,400,000,000**	**1,000,000,000**	**0**	**0**	**6,517,305,989**

Estado financiero actual del convenio 040-12 según lo aprobado en el comité de seguimiento del dia 11 de Octubre de 2013:

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	RESUMEN CON APROBACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO			FONADE
		Sin Asignar	Asignado		VALOR PROYECTOS ENTREGADOS A FONADE
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE	
APP	34,700,000,000	1,309,317,867	10,553,000,000	22,837,682,133	33,390,682,133
DPS	28,717,580,000	16,086,317,748	4,504,876,665	8,126,385,587	12,631,262,252
OPP	171,200,000,000	862,037,386	500,000,000	169,837,962,614	170,337,962,614
SUBTOTAL	**234,617,580,000**	**18,257,673,001**	**15,557,876,665**	**200,802,030,334**	**216,359,906,999**
RENDIMIENTOS	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OPERATIVOS. CUOTA DE GERENCIA Y GMF	13,398,420,000				
TOTALES	**248,016,000,000**	**18,257,673,001**	**15,557,876,665**	**200,802,030,334**	**216,359,906,999**

- **Para el Convenio de Gerencia Integral No. 069 – 12 se tiene:**

Estado Actual:

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	ESTADO ACTUAL DPS3		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	4,133,271,997	86,115,847	0	4,047,156,150
DPS	60,686,014,278	57,750,140,258	1,365,000,000	1,570,874,020
OPP	378,497,477,453	18,830,029,980	18,871,538,479	340,795,908,993
FONDO PAZ	-	0	0	0
SUB TOTAL	**443,316,763,728**	**76,666,286,085**	**20,236,538,479**	**346,413,939,163**
RENDIMIENTOS	-	0	0	0
SUB TOTAL	**-**	**0**		**0**
TOTALES	**443,316,763,728**	**76,666,286,085**	**20,236,538,479**	**346,413,939,163**

ESTRATEGIA	FONADE	Propuestas de modificaciones Comité seguimiento 2 de Octubre de 2013						
	VALOR PROYECTOS ENTREGADOS A	Propuestas a incluir en listado	Propuestas a cancelar del listado	PROPUETA ADICION DE RECURSOS A PROPUESTAS	PROPUESTA - ADICION DE RECURSOS A PROYECTOS	Liberación de saldos de proyectos	Cancelación de Proyecto	Total
APP	4,047,156,150	0	0	0	0	0	0	0
DPS	1,570,874,020	0	0	0	0	0	0	0
OPP	340,795,908,993	7,302,666,610	450,000,000	0	1,396,657,801	564,261,602	976,191,784	-6,707,870,025
FONDO PAZ	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL	**346,413,939,163**	**7,302,666,610**	**450,000,000**	**0**	**1,396,657,801**	**564,261,602**	**976,191,784**	**-6,707,870,025**
RENDIMIENTOS	0	0	0	0		0	0	0
SUB TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALES	**346,413,939,163**	**7,302,666,610**	**450,000,000**	**0**	**1,396,657,801**	**564,261,602**	**976,191,784**	**-6,707,870,025**

Estado financiero actual del convenio 069-12 según lo aprobado en el comité de seguimiento del día 11 de Octubre de 2013:

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	RESUMEN CON APROBACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	4,133,271,997	86,115,847	0	4,047,156,150
DPS	60,686,014,278	57,750,140,258	1,365,000,000	1,570,874,020
OPP	378,497,477,453	12,122,159,955	25,724,204,089	340,651,113,408
FONDO PAZ	-	0	0	0
SUB TOTAL	**443,316,763,728**	**69,958,416,060**	**27,089,204,089**	**346,269,143,578**
RENDIMIENTOS	-	0	0	0
SUB TOTAL	**-**	**0**		**0**
TOTALES	**443,316,763,728**	**69,958,416,060**	**27,089,204,089**	**346,269,143,578**

5. Puntos varios

a. MODELO DE REGIONALIZACIÓN

PARA LOS CONVENIOS FONADE – DPS - 1 - 160 de 2011 y FONADE – DPS - 3 - 069 de 2012

En el marco del modelo de regionalización para la ejecución de los proyectos de la estrategia Obras para la Prosperidad incluidos en el Convenio Marco DPS-FONADE, en donde se establece la celebración de Convenios y/o Contratos Derivados entre FONADE y entidades territoriales para que estas sean las encargadas de la contratación y ejecución de las obras, y considerando que los Entes Territoriales se encuentran en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 ante sus respectivas asambleas y/o concejos, el comité operativo recomienda que el comité de seguimiento solicite se inicie la suscripción de convenios en primera instancia con los municipios que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia.

Una vez revisada la recomendación presentada por el comité operativo, el comité de seguimiento considera viable la misma y para tal efecto solicita se modifique en tal sentido el Manual Operativo de los convenios, no obstante lo anterior, cada caso en particular deberá ser presentado y aprobado por el comité de seguimiento.

Atendiendo el pronunciamiento del comité, se presenta para su aprobación los siguientes proyectos:

CONVENIO FONADE – DPS - 1 - 160 de 2011

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
310	OPP	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	Construcción de pantallas ancladas por afectación de la ola invernal en el municipio de Cartago, Valle.	Construcción de obras de mitigación por afectación de la ola invernal en el municipio de Cartago, Valle.	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
314	OPP	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	Mejoramiento vía cabecera Dagua - Queremal	Mejoramiento vía cabecera Dagua-Queremal	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
363	OPP	RISARALDA	BELEN DE UMBRIA	Remodelación fase II del parque principal del municipio de Belén de Umbria-Risaralda	Remodelación del parque principal del municipio de Belén de Umbria-Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
366	OPP	RISARALDA	SANTUARIO	construcción cubierta termoacustica para la cancha múltiple en el municipio de Santuario -Risaralda	Adecuación de la cancha múltiple en el municipio de Santuario -Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
367	OPP	RISARALDA	SANTUARIO	adecuación parque principal en el Municipio de Santuario-Risaralda	Adecuación parque principal en el Municipio de Santuario-Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
385	OPP	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Parque recreacional, deportivo, cultural y ecológico la hermosa. Municipio de Santa rosa de Cabal - Risaralda	Adecuación del Parque la Hermosa. Municipio de Santa rosa de Cabal - Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
401	OPP	HUILA	PITALITO	Construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 13 sur, entre carreras 2 sur y 2 Este del barrio el jardín del municipio de pitalito, departamento del Huila	Construcción de vías urbanas en el barrio el jardín del municipio de pitalito, departamento del Huila	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
404	DPS	MAGDALENA	ARIGUANI	Recuperación y adecuación de la plaza central del municipio de Ariguani - Magdalena	Adecuación de la plaza central del municipio de Ariguani - Magdalena	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
412	DPS	AMAZONAS	LETICIA	Construcción de puente peatonal en la Comunidad Macedonia del municipio de Leticia - Amazonas	Construcción de puente peatonal en la Comunidad Macedonia del municipio de Leticia - Amazonas	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
414	OPP	META	VILLAVICENCIO	Reconstrucción Institucional educativa oficial Francio Arango Municipio de Villavicencio, Meta	Reconstrucción de la Institución educativa oficial Francisco Arango Municipio de Villavicencio, Meta	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
415	DPS	AMAZONAS	LETICIA	Construcción, pavimentación de la transversal 2 entre calle 14 y 15 A (Barrio La Sarita) en el municipio de Leticia Amazonas	Construcción de vías urbanas en el barrio La Sarita en el municipio de Leticia Amazonas	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
416	OPP	ANTIOQUIA	APARTADO	Red de acueducto, alcantarillado y concretos del urbanismo del proyecto Palmeras de Abibes municipio de Apartado Departamento de Antioquia	Obras hidrosanitarias y de arte del proyecto Palmeras de Abibes en el municipio de Apartado Departamento de Antioquia	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.

CONVENIO FONADE – DPS - 3 - 069 de 2012

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
3	OPP	ANTIOQUIA	ENVIGADO	CONSTRUCCIÓN COLISEO MUNICIPIO DE ENVIGADO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
6	OPP	ANTIOQUIA	SABANETA	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR JUVENIL EN EL MUNCIPIO DE SABANETA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
7	OPP	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
16	OPP	ATLANTICO	BARRANQUILLA	LA CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN AFLUENTE VILLA DEL ROSARIO MUNICIPIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
28	OPP	ATLANTICO	SABANALARGA	RECUPERACIÓN AMBIENTAL ARROYO SAN ANTONIO 2A ETAPA (K 0+00+560 AL K1+160) MUNICIPIO DE SABANALARGA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
37	OPP	BOLIVAR	ARJONA	MEJORAMEINTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
38	OPP	BOLIVAR	ARROYO HONDO	Construcción de Pavimento en Concreto Rígido en Vias de los Barrios Santa Elena y La Iglesia, Casco Urbano del Municipio de Arroyohondo – Bolívar	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
39	OPP	BOLIVAR	CLEMENCIA	PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL ACCESO PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS CARAS DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLIVAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
44	OPP	BOLIVAR	TALAIGUA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CALLES DE LA CABECERA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
45	OPP	BOLIVAR	TURBACO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DEL BARRIO EL RODEO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
48	OPP	BOYACA	DUITAMA	RENOVACIÓN URBANISTICA ZONA CENTRO CRA 16 ENTRE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYAA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
53	OPP	BOYACA	SUSACON	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
60	OPP	CALDAS	LA DORADA	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD LAS FERIAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
63	OPP	CALDAS	NORCASIA	PRIMERA FASE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
67	OPP	CALDAS	SALAMINA	Adecuación del centro panelero en la cabecera municipal	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
71	OPP	CALDAS	VICTORIA	PARQUE RECREACIONAL DOÑA JUANA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
72	OPP	CALDAS	VILLAMARIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
74	OPP	CAQUETA	FLORENCIA	MEJORAMIENTO MALLA VIAL REALIZANDO PAVIMENTACIÓN EN CALIENTE CON MEZCLA DENSA TIPO 2 CIUDAD DE FLORENCIA CAQUETA SOBRE LA AVENIDA ROBERTO CLAROS ENTRE CALLES 15C Y 17, LA ENTRADA Y SALIDA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA Y LA GLORIETA DEL TERMINAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
76	OPP	CAUCA	ARGELIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
84	OPP	CAUCA	CAJIBIO	CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD CORREGIMIENTO CASAS BAJAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
87	OPP	CAUCA	EL TAMBO	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL MODULO No 1 DE LA GALERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TAMBO - CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
91	OPP	CAUCA	FLORENCIA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE MARSELLA Y EL ROSARIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
96	OPP	CAUCA	LA VEGA	SANEAMIENTO BASICO PARA EL MEJORAMIENTO DE COCINAS E IMPLEMENTACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL RESGUARDO INDIGENA YANACONA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
97	OPP	CAUCA	MERCADERES	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
99	OPP	CAUCA	MORALES	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO SOBRE ESTRUCTURA METALIZA VEREDA PORVENIR CORREGIMIENTO DE CARPINTERO - MUNICIPIO DE MORALES CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
100	OPP	CAUCA	PATIA	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL RURAL COMPRENDIDO VIA PANAMERICANAKM 18 + 200 VEREDA EL PURO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
111	OPP	CAUCA	TIMBIO	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA CANCHA Y CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
140	OPP	CUNDINAMARCA	CAQUEZA	CONSTRUCCION GRADERIAS ESTADIO ANTONIO SANCHEZ LUQUE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
144	OPP	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AJUSTE A DISEÑOS DE VIAS CALLE 17 Y CALLE 18 URBANIZACION MARIA PAULA SECTOR VILLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
149	OPP	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	CONSTRUCCION REMODELACION, ADECUACION Y AJUSTE A DISEÑOS DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 5 Y 8 BARRIO ZAMBRANO MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
150	OPP	CUNDINAMARCA	FOSCA	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y MEJORAMIENTO VIA SAN ANTONIO, ARRAYANAL, MESA DE CASTRO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
155	OPP	CUNDINAMARCA	MANTA	CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS Y MANTENIMEINTO VIA SECTOR ESCUELA CUBIA, ESCUELA EL BOSQUE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
159	OPP	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	Construcción de pavimento rígido en las vías urbanas del municipio de san Bernardo Cundinamarca	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e Infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
160	OPP	CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL COMPARTIR DE VISITANTES Y LUGAREÑOS, EN LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EN CUNDINAMARCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
167	OPP	CUNDINAMARCA	UBAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN LAS VEREDAS DE PUEBLONUEVO CENTRO Y AFUERA SECTOR CATATUMBO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e Infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
168	OPP	CUNDINAMARCA	UNE	CONSTRUCCIÓN POLIDEPROTIVO VEREDA TIMASITA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e Infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
176	OPP	HUILA	ALTAMIRA	Construcción de una batería sanitaria, y mejoramiento de pisos y muros interiores de la casa de la cultura del municipio de Altamira – Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
182	OPP	HUILA	ELIAS	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOGAR PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
188	OPP	HUILA	NEIVA	COSNTRUCCIÓN SALON JARDIN INFANTIL PICARDIA BARRIO LOS PARQUES	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 e sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
190	OPP	HUILA	PALESTINA	Construcción cancha de futbol ocho zona urbana	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir

						estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO.	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
192	OPP	HUILA	RIVERA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
196	OPP	HUILA	VILLAVIEJA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA VICTORIA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
211	OPP	NARIÑO	EL TAMBO	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EL TAMBO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
212	OPP	NARIÑO	GUALMATAN	REPOSICIÓN DE LA RED PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE CUATIS TRAMO 2	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
215	OPP	NARIÑO	LA UNION	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA SANTANDER MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
229	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCIÓN GRADAS DISIPADORAS EN GAVIONES, CALLE 9 CON AVENIDAS 15, 15A 16 Y 17 DEL BARRIO LA LIBERTAD, SECTOR SANTA TERESITA, MUNCIIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
230	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PARQUE ROJAS PINILLA, MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
233	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION GRADERIAS BARRIO VALLLESTER, MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
248	OPP	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ADECUACIONES GENERALES A CAMERINOS, BAÑOS, CABINAS DE TRANSMISION Y AREA ADMINISTRATIVA DEL COLISEO ARGELINO DURAN QUINTERO MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
249	OPP	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SAN	CONSTRUCCION PATINODROMO BARRIO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

250	OPP	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	AECUACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
253	OPP	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	ADECUACION PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TOLEDO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
261	OPP	QUINDIO	CALARCA	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO GUADUALES IV ETAPA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUIDIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
262	OPP	QUINDIO	CALARCA	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DOS TRAMOS CALLE 12 ACCESO SECTOR PLAYA RICA DEL CENTRO DEL POBLADO CORREGIMIENTO BARCELONA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUIDIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
265	OPP	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Proyecto de optimización del sistema de alcantarillado y acueducto y reposición de pavimento en la carrera 11 entre calles 16A y 18 y la calle 18 entre Carrera 11 y que brada Italia.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

266	OPP	RISARALDA	VIRGINIA	CONSTRUCCUCIÓN PABELLON DE CARNE PLAZA DE MERCADO LA VIRGINIA RISARALDA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
272	OPP	SANTANDER	CHARALA	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CHARALA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
276	OPP	SANTANDER	FLORIDABLANCA	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO CARACOLI, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
278	OPP	SANTANDER	PIEDECUESTA	CANALIZACIÓN AGUAS NEGRAS DEL BARRIO VILLAS DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
280	OPP	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	CONSTRUCIÓN AREA DE CONSULTA EXTERNA HOSPITAL SAN ANTONIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

281	OPP	SANTANDER	SANTA HELENA OPON	CONSTRUCCIÓN AULAS ESCOLARES VEREDA LA ARAGUA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA.	DPTO.	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
283	OPP	SANTANDER	SOCORRO	CONCRETO RIGIDO VIAS Y CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS VILLA MADRIGAL Y PUEBLITO VIEJO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
289	OPP	SUCRE	GUARANDA	Intervención vial en la Avenida Juan de Matas en el Municipio de Guaranda Departamento de Sucre	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
290	OPP	SUCRE	OVEJAS	REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE OVEJAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
298	OPP	TOLIMA	EL GUAMO	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAS LAS MERCEDES, PORVENIR, OVAL, CAÑADA BAJA, CALLEJON DE GUADUAS Y EL SAMAN (ACUANORTE IV ETAPA) DEL MUNICIPIO DEL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

				GUAMO TOLIMA		

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
301	OPP	TOLIMA	HERVEO	PAVIMENTACIÓN VIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL CORREGIMIENTO DE PADUA MUNICIPIO DE HERVEO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
303	OPP	TOLIMA	IBAGUE	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO 14 BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
305	OPP	TOLIMA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2011 EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO TOLIMA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
314	OPP	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y CANCHAS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CERRITO VALLE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
318	OPP	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	PAVIMENTACIÓN VIA CORREGIMIENTO SANTA RITA MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y

						concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
324	OPP	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
328	OPP	SANTANDER	BUCARAMANGA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO GRANJAS DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
342	OPP	ATLANTICO	MALAMBO	Construcción del polideportivo santa maria Magdalena del municipio de malambo	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION

343	OPP	HUILA	SUAZA	Renovación urbanística de la carrera 5 entre Calle 6 y 7, parque central Municipio de Suaza-Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
344	OPP	ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	restauración de la casa museo tomas carrasquilla	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
345	OPP	HUILA	PITALITO	Pavimentación vías urbanas en el municipio de Pitalito - Huila.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
347	OPP	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de viviendas en el corregimiento la laguna zona rural municipio de Pitalito - Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
348	OPP	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de vivienda chiyurco-bruselas en el municipio de pitalito Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

351	OPP	SANTANDER	VARIOS MUNICIPIOS	Construcción de estufas para leña en los sectores rurales de los municipio de san Vicente de chucuri, el Carmen de chucuri, puerto wilches, cimitarra, sucre, la paz, velez, aguada, coromoro, charala, onzaga, gambita, suaita, carcasi, concepción, san miguel y guaca - Departamento de Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
352	OPP	SANTANDER	VARIOS MUNICIPIOS	Construcción de estufas para leña en los sectores rurales de los Municipios del playón , lebrija, rionegro, matanza california, surata y tona - Departamento de Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
353	OPP	VALLE DEL CAUCA	CALI	Construcción cancha múltiple ciudad córdoba ubicada en la calle 50 y 51 con carrera 46 barrio ciudad córdoba de la comuna 15 Municipio de Santiago de Cali - valle del cauca	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
361	OPP	CAUCA	BALBOA	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, VEREDA BERMEJA BAJA, MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

365	OPP	SANTANDER	PALMAR	Construcción del cerramiento e instalación del alumbrado de la cancha de futbol ubicada en la vereda Cincomil del municipio de Palmar-Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
366	OPP	ANTIOQUIA	SANTA BARBARA	Terminación de la ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital santa Bárbara - Antioquia	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
367	OPP	HUILA	ALGECIRAS	Construcción de puentes en Pr 0+740 Qda la perdiz Pr 2+475 - Qda los negros y construcción de pavimento flexible vía Algeciras - Paraiso, en el municipio de Algeciras - Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
369	OPP	NARIÑO	IMUES	Construcción pavimentación de las calles 1 entre carrera 1 y 5; calle 5 entre carreras 1 y 2 y carrera 1 entre calles 1 y 5, del casco urbano del municipio de Imués - Nariño	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
372	OPP	BOLIVAR	TURBANA	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO RIGIDO EN LA CALLE CENTELLA CABECERA MUNICIPAL DE TURBANA-BOLIVAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se

						solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
373	OPP	ATLANTICO	BARRANQUILLA	PAVIMENTACION DE VÍAS EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LAS FLORES Y REPOSOCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNCIPIO DE ATLANTICO-BARRANQUILLA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
101	OPP	CAUCA	PIENDAMO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
228	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION DE UNACANCHA DE FUTBOL CONCO CON ACABADA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO LA ERMITA - MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
325	OPP	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MARIA SANCHEZ	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

339	OPP	VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	Optimización redes de distribución de acueducto de los corregimientos El Carmelo, San Joaquin y El Tiple.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
370	OPP	CORDOBA	MONTERIA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANÍSTICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS ARAUJOS, LOS NOGALES Y LOS COLORES EN LA CIUDAD DE MONTERÍA-CORDOBA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
371	OPP	CORDOBA	CERETE	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E.S.E. CAMU DEL PRADO Y UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CERETÉ - CORDOBA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
380	OPP	TOLIMA	DOLORES	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL RETORNO DE LA GUACAMAYA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
381	OPP	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	CONSTRUCCION Y RECREACION DEL ESPACIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EXISTENTES EN EL PARQUE DEL AGUA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

382	OPP	META	EL DORADO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PLANTA REGIONAL DE SACRIFICIO ANIMAL LOCALIZADA EN LA INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DEL ARIARI	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
383	OPP	ANTIOQUIA	SOPETRÁN	CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO HORIZONTES MUNICIPIO DE SOPETRÁN	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
384	OPP	CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	CONSTRUCCIÓN PARQUE LAS BANDERAS, MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
385	OPP	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	RECUPERACION DEL PARQUE ELIAS GUERRERO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
386	OPP	SANTANDER	SUCRE	CONSTRUCCIÓN CASA DE MERCADO-SEGUNDA PLANTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la

						entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
387	OPP	TOLIMA	VILLAHERMOSA	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
388	OPP	ANTIOQUIA	GIRARDOTA	CONSTRUCCIÓN TEATRO MUNICIPAL DE GIRARDOTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
389	OPP	TOLIMA	COELLO	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AULAS EDUCATIVAS CABECERA MUNICIPAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus

						presupuestos de la siguiente vigencia
390	OPP	CUNDINAMARCA	SOACHA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO LEON XIII PRIMER SECTOR COMUNA 3	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
391	OPP	VALLE DEL CAUCA	EL DOVIO	MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIA URBANA COSTADO SUR DEL PARQUE PRINCIPAL, CALLE 7 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
392	OPP	BOYACÁ	LA UVITA	ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA ZONA CONTINUA AL PARQUE MUNICIPAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
393	OPP	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA VÍAS INTERNAS Y PARQUE LOS MOCOANITOS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma

						de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
394	OPP	SANTANDER	LEBRIJA	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ALTERNAS EN EL SECTOR VÍA COLMERCEDES CARRERA 16 VÍA AL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
76	OPP	CAUCA	ARGELIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
91	OPP	CAUCA	FLORENCIA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE MARSELLA Y EL ROSARIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
96	OPP	CAUCA	LA VEGA	SANEAMIENTO BASICO PARA EL MEJORAMIENTO DE COCINAS E IMPLEMENTACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL RESGUARDO INDIGENA YANACONA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

192	OPP	HUILA	RIVERA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
347	OPP	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de viviendas en el corregimiento la laguna zona rural municipio de Pitalito – Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
348	OPP	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de vivienda chiyurco-bruselas en el municipio de pitalito Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
351	OPP	SANTANDER	VARIOS MUNICIPIOS	Construcción de estufas para leña en los sectores rurales de los municipio de san Vicente de chucuri, el Carmen de chucuri, puerto wilches, cimitarra, sucre, la paz, velez, aguada, coromoro, charala, onzaga, gambita, suaita, carcasi, concepción, san miguel y guaca – Departamento de Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

352	OPP	SANTANDER	VARIOS MUNICIPIOS	Construcción de estufas para leña en los sectores rurales de los Municipios del playón , lebrija, rionegro, matanza california, surata y tona - Departamento de Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

El comité de seguimiento aprueba que los proyectos mencionados se firmen sin estructuración aprobada, de acuerdo a la solicitud del comité operativo en el marco de fortalecimiento territorial, así como los proyectos adicionados en el presente comité.

b. NOVEDADES A LOS CONVENIOS

Mediante documento CONPES 3777 de fecha 30 de septiembre de 2013 se sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto "Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional – FIP" del Programa de Infraestructura y Hábitat del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

El proyecto contempla inversiones en infraestructura social y mejora de condiciones de habitabilidad, que en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", aportan a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. El proyecto responde a las solicitudes presentadas por los entes territoriales, el gobierno nacional, y las entidades adscritas y vinculadas al sector de la inclusión social y la reconciliación, por lo que su desarrollo requiere desplegar una operación articulada a nivel regional, cuya intervención y ejecución excede el actual periodo de gobierno.

En consonancia con el documento CONPES 3777 de 2013 y toda vez que a la fecha existen proyectos en estructuración que podrían sobrepasar la vigencia actual de los convenios en su etapa de ejecución, se solicita:

CONVENIO 160-11 - DPS1. 211041 -

- Prorroga hasta el 30 de abril de 2015.
- Recomposición de vigencias así: La vigencia actual 2014 es por 10.000mill, se recompone de la siguiente manera: 2014 - 9.500mill y 2015 - 500mill.
- Adición rendimientos financieros por 5.000mill

CONVENIO 040-12 - DPS2. 212017

- Prorroga hasta el 30 de junio de 2015
- Recomposición de vigencias así: La vigencia actual 2014 es por 20.000mill, se recompone de la siguiente manera: 2014-15.000mill y 2015 - 5.000mill
- Adición rendimientos financieros por 5.000mill

CONVENIO 069-12 - DPS 3. 212080

- Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015
- Recomposición de vigencias así: La vigencia actual 2014 es por 30.000mill, se recompone de la siguiente manera: 2014 -20.000mill y 2015 -10.000mill

- Adición rendimientos financieros por 5.000mill
- Adición recursos para la estrategia APP, por $ 29.732.032.658.

Siendo la 12:30 pm se da por terminado el presente comité de seguimiento.

Firma de los delegados al comité de seguimiento:

MARIANA ESCOBAR
Subdirectora General
Departamento para la Prosperidad Social

PATRICIA TRONCOSO
Gerente General (E)
Fonade

Descripción del documento soporte
Presentación en Power Point efectuada por Fonade

Revisado por OPS
Diana Blanco
Claudia Mercedes Niño C.
Jaime Ortiz
Lenny Farley Diaz

Revisado por FONADE
Alejandro Serrano
Claudia Jaramillo
Oscar Acevedo
José David Insuasti
Elkin Rodrigo Cantor

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Convenios FONADE - DPS

11 de Octubre de 2013

VIGILADO

Agenda

- Estado de avance de los Proyectos
- Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos
- Decisiones en torno el Listado Inicial
- Finanzas
- Puntos varios

VIGILADO

Informe consolidado

923.41 MM previstos a invertir
686 proyectos a la fecha

Fecha corte: 02 de Octubre


	Formulación (DPS)	Estructuración (FONADE)	Aprobación de la estructuración (DPS)	Contratación de Entidad Territorial - CP (FONADE)	Validación para Inicio: póliza, incorporación de recursos al presupuesto y proceso de selección de contratista de obra por parte de la entidad territorial (Entidad Territorial)	Construcción Obra & Control (Entidad Territorial)	Cierre (FONADE)
DPS	Sin asignar 117MM 13%		18 MM 2% 36 p				
DPS	Asignado 28.8MM 3%	162 MM 18 % 164 p					
FONADE				111 MM 12 % 128 p	244 MM 26 % 227 p	176 MM 19% 73 p	3 MM 0.3% 2 p
FONADE				16 MM 2% 21 p		42MM 5% 21 p	3 MM 0.3% 14 p

Proyectos que transforman vidas — www.fonade.gov.co — PROSPERIDAD PARA TODOS


Avance consolidado

Fecha corte: 02 Octubre

PROYECTOS ESTRUCTURADOS




CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Proyectos que transforman vidas — www.fonade.gov.co — PROSPERIDAD PARA TODOS

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

1. Estructuración y aprobación
200 Proyectos



1. Tiempos

	Viabilidad	Factibilidad	Estudios previos	Aprobación DPS	Total
Verde	30	7	38	27	102
Amarillo	4	0	0	0	4
Rojo	48	1	36	9	94


Verde: A tiempo o máximo un 10% atraso
Amarillo: Entre un 11% y un 30% de atraso
Rojo: Más del 30% de atraso

VIGILADO

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

estructuracion


2. Causas de situaciones en rojo

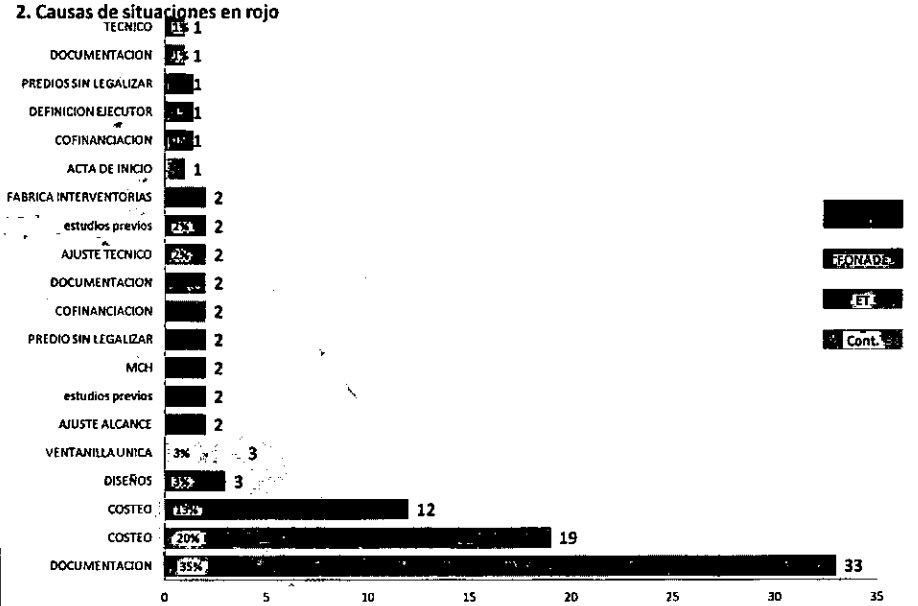

VIGILADO

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

2. Contratación
149 Proyectos



2.1. Tiempos Contratista Privado

	Elaboración Estudios previos	Proceso Selección	Adjudicación y contratación	Total
Verde	1	8	6	15
Amarillo	1	0	2	3
Rojo	0	0	3	3


2.2. Tiempos contrato con Ente Territorial


	Elaboración Minuta	Sub contratación	Asesoria-gerencia	Total
Verde	68	3	14	85
Amarillo	0	0	0	0
Rojo	22	5	16	43

VIGILADO

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

2. Contratación
46 Proyectos en ROJO (ET+CP)




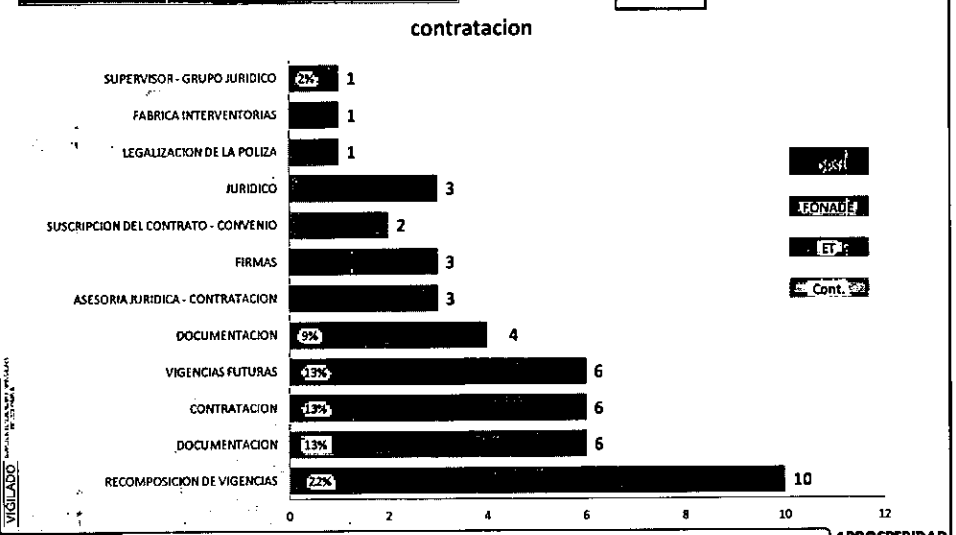

VIGILADO

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

3. Ejecución
337 Proyectos



3. Ejecución acumulado

Verde: A tiempo ó máximo un 10% de atraso
Amarillo: Entre un 11% y un 30% de atraso
Rojo: Más del 30% de atraso

Verde 157
Amarillo 55
Rojo 125

3.1. Validación para inicio


	Legalización	Publicación	Proceso selección	Adjudicación	Total
Verde	11	8	61	12	92
Amarillo	7	10	1	1	19
Rojo	54	57	3	2	116

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

3. Ejecución
337 Proyectos



3. Ejecución acumulado

Verde: A tiempo ó máximo un 10% de atraso
Amarillo: Entre un 11% y un 30% de atraso
Rojo: Más del 30% de atraso

Verde 157
Amarillo 55
Rojo 125

3.2. Construcción de obras


	Inicio CP-Inicio ET	Seguimiento obra	Cierre y liquidación	Total
Verde	13	36	16	65
Amarillo	15	21		36
Rojo	9			9

VIGILADO


Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3

3. Ejecución
125 Proyectos



EJECUCIÓN

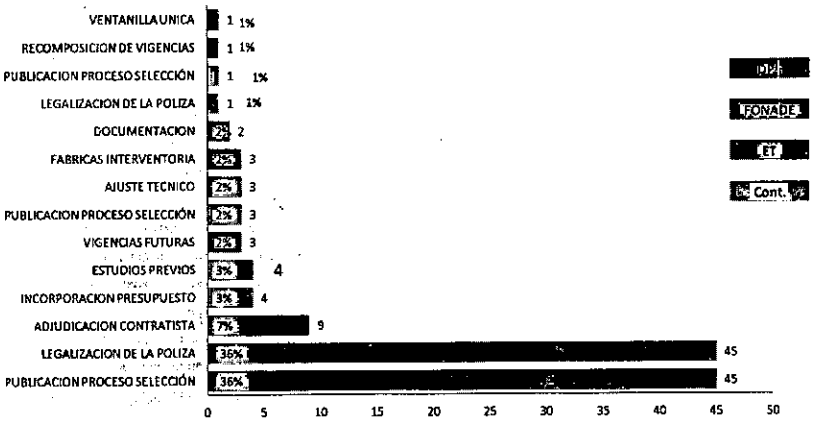


VIGILADO

Seguimiento y control de fases y etapas DPS 1,2 y 3


Control Social
77 Proyectos





1. Tiempos




VIGILADO

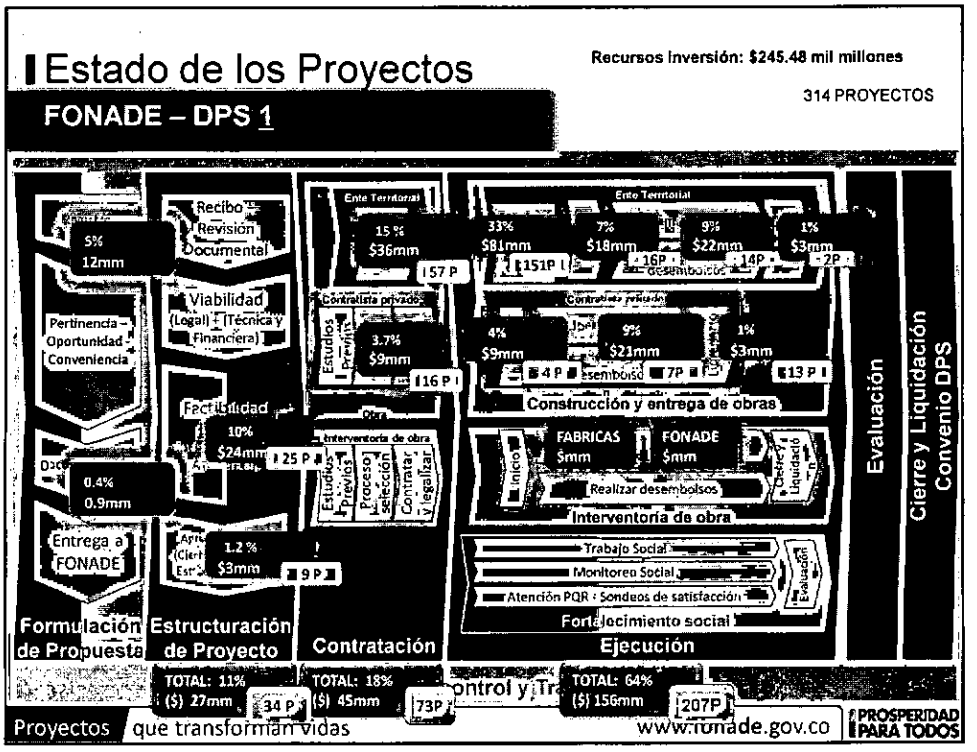
Estado de los Proyectos
Recursos Inversión: $245.48 mil millones
314 PROYECTOS
FONADE – DPS 1
Recibo y Revisión Documental
5%
12mm
Viabilidad (Legal) (Técnica y Financiera)
Pertinencia – Oportunidad Conveniencia
Factibilidad
10%
$24mm
25 P
0.4%
0.9mm
Entrega a FONADE
1.2 %
$3mm
9 P
Ente Territorial
15 %
$36mm
57 P
Contratista privado
3.7%
$9mm
16 P
Interventoría de obra
Estudios Previos
Proceso selección
Contratar y legalizar
Ente Territorial
33%
$81mm
151P
7%
$18mm
16P
9%
$22mm
14P
1%
$3mm
2P
Contratista privado
4%
$9mm
4 P
9%
$21mm
7P
1%
$3mm
13 P
Construcción y entrega de obras
FABRICAS
$mm
FONADE
$mm
Realizar desembolsos
Interventoría de obra
Trabajo Social
Monitoreo Social
Atención PQR - Sondeos de satisfacción
Fortalecimiento social
Evaluación
Evaluación
Cierre y Liquidación Convenio DPS
Formulación de Propuesta
Estructuración de Proyecto
Contratación
Ejecución
TOTAL: 11%
($) 27mm
34 P
TOTAL: 18%
($) 45mm
73P
TOTAL: 64%
($) 156mm
207P
Proyectos que transforman vidas
www.fonade.gov.co
PROSPERIDAD PARA TODOS

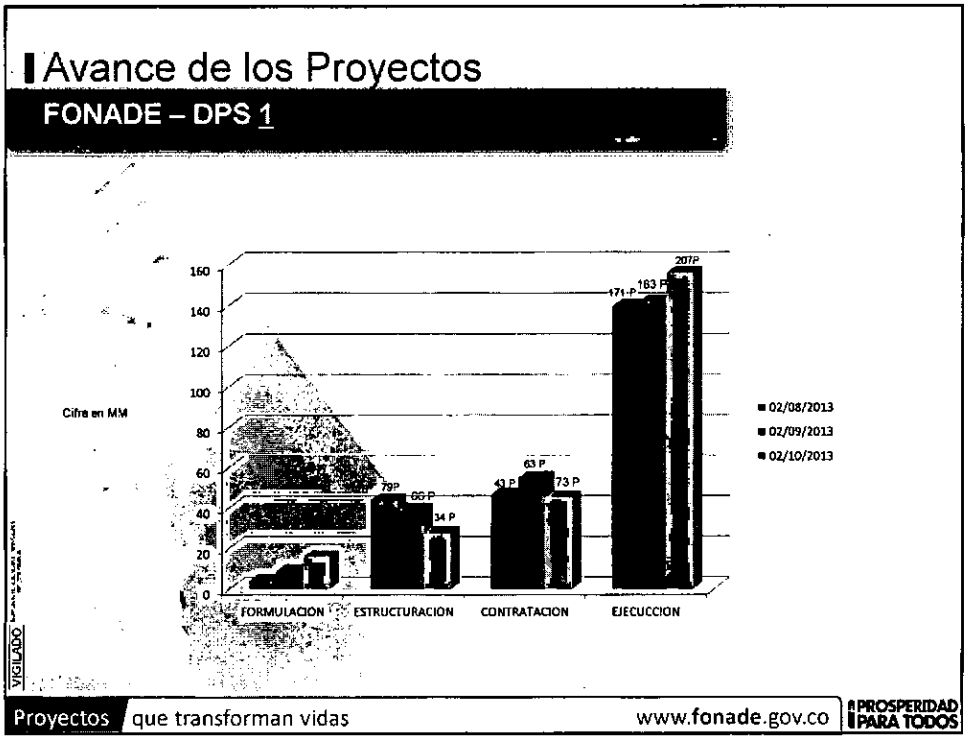

Avance de los Proyectos
FONADE – DPS 1
Cifra en MM
160
140
120
100
80
60
40
20
0
79P
66 P
34 P
43 P
63 P
73 P
171 P
183 P
207P
FORMULACION
ESTRUCTURACION
CONTRATACION
EJECUCCION
02/08/2013
02/09/2013
02/10/2013
VIGILADO
Proyectos que transforman vidas
www.fonade.gov.co
PROSPERIDAD PARA TODOS

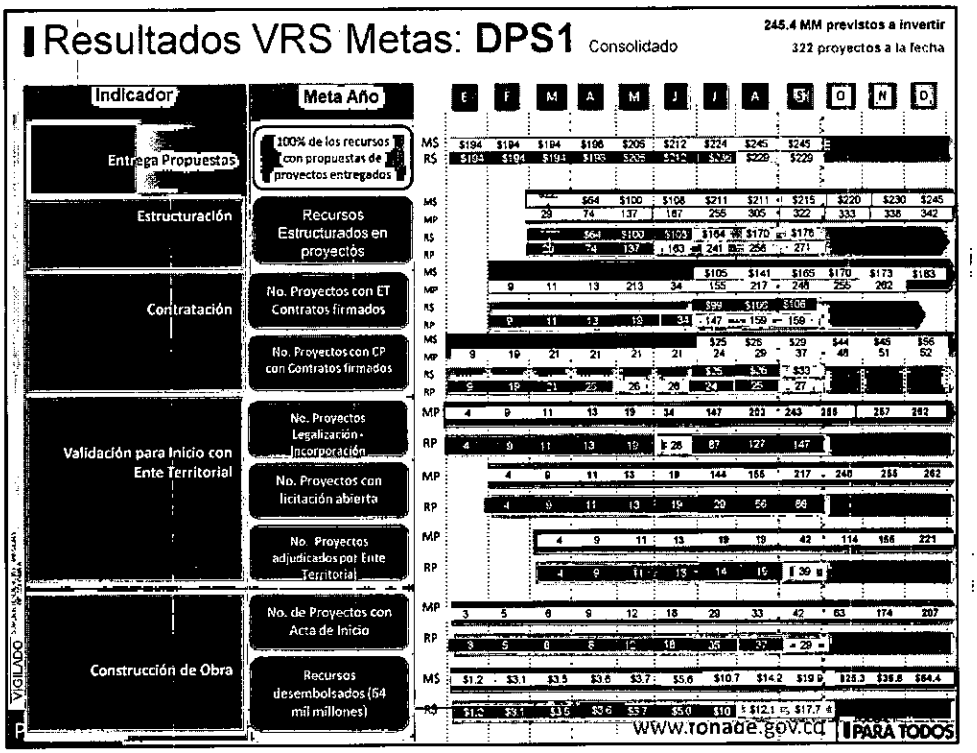
Resultados VRS Metas: DPS1
Consolidado
245.4 MM previstos a invertir
322 proyectos a la fecha
Indicador
Meta Año
Entrega Propuestas
100% de los recursos con propuestas de proyectos entregados
Estructuración
Recursos Estructurados en proyectos
Contratación
No. Proyectos con ET Contratos firmados
No. Proyectos con CP con Contratos firmados
Validación para Inicio con Ente Territorial
No. Proyectos Legalización - Incorporación
No. Proyectos con licitación abierta
No. Proyectos adjudicados por Ente Territorial
Construcción de Obra
No. de Proyectos con Acta de Inicio
Recursos desembolsados (54 mil millones)
E F M A M J J A S O N D
MS
MP
RS
RP
www.fonade.gov.co
PARA TODOS

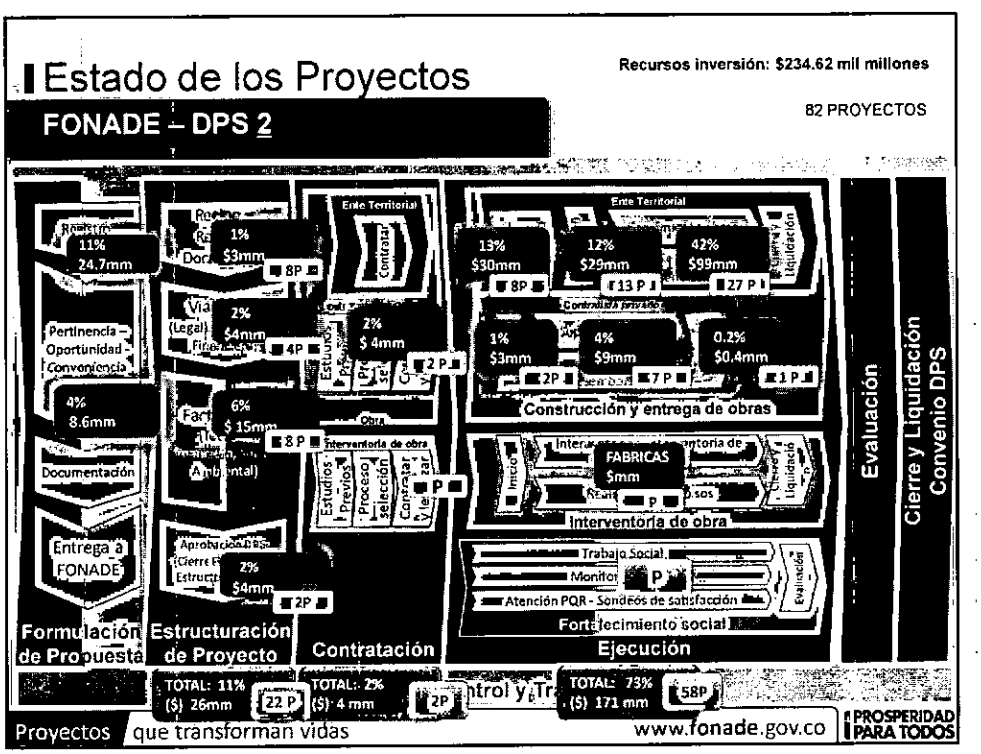
Estado de los Proyectos
Recursos inversión: $234.62 mil millones
82 PROYECTOS
FONADE – DPS 2
Ente Territorial
11%
24.7mm
1%
$3mm
8P
2%
$4mm
4P
2%
$ 4mm
2 P
4%
8.6mm
6%
$ 15mm
8 P
Documentación
Entrega a FONADE
2%
$4mm
2P
13%
$30mm
8P
12%
$29mm
13 P
42%
$99mm
27 P
1%
$3mm
2P
4%
$9mm
7 P
0.2%
$0.4mm
1 P
Construcción y entrega de obras
FABRICAS
$mm
P
Interventoría de obra
Trabajo Social
Monitoreo
P
Atención PQR - Sondeos de satisfacción
Fortalecimiento social
Ejecución
Evaluación
Cierre y Liquidación Convenio DPS
Formulación de Propuesta
Estructuración de Proyecto
Contratación
TOTAL: 11%
($) 26mm
22 P
TOTAL: 2%
($) 4 mm
2P
TOTAL: 73%
($) 171 mm
58P
Proyectos que transforman vidas
www.fonade.gov.co
PROSPERIDAD PARA TODOS

Avance de los Proyectos

FONADE – DPS 2

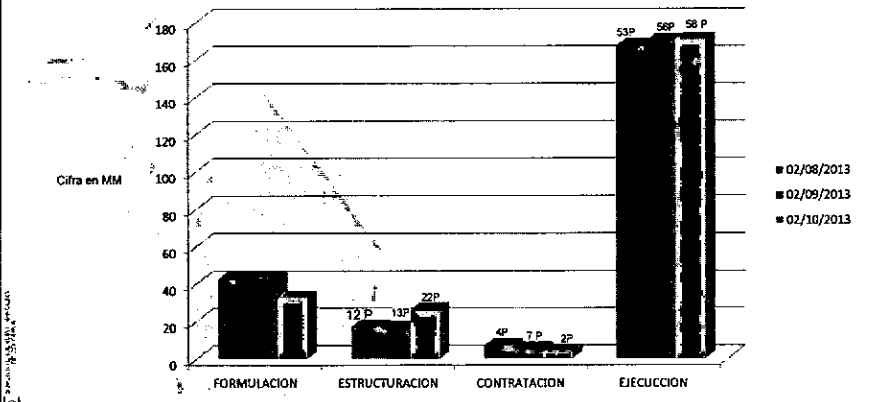


VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS


Resultados VRS Metas: DPS 2 Consolidado


234.62 MM previstos a invertir
74 proyectos a la fecha

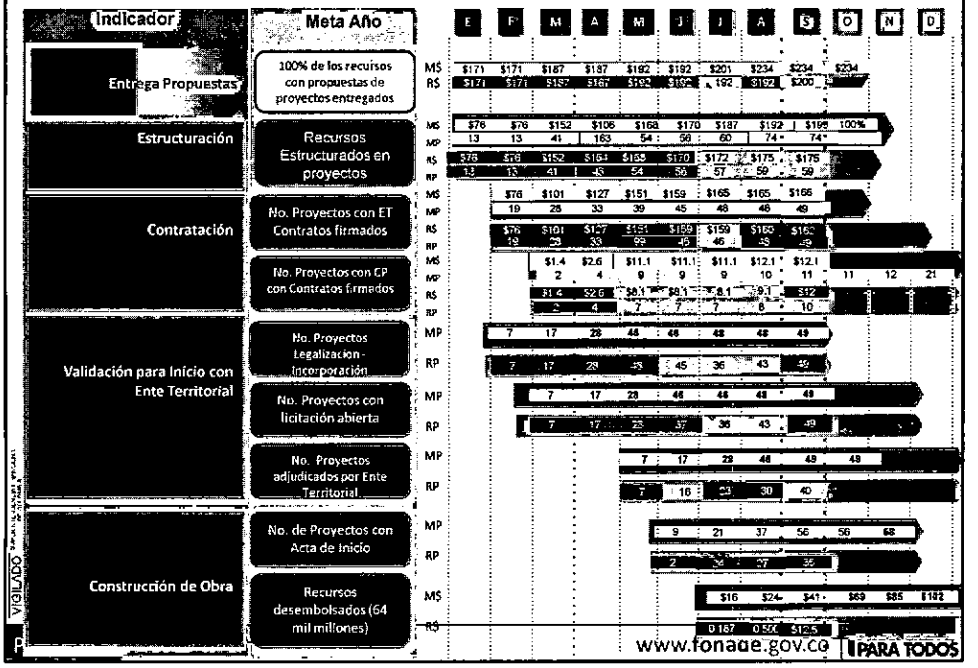



VIGILADO

www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

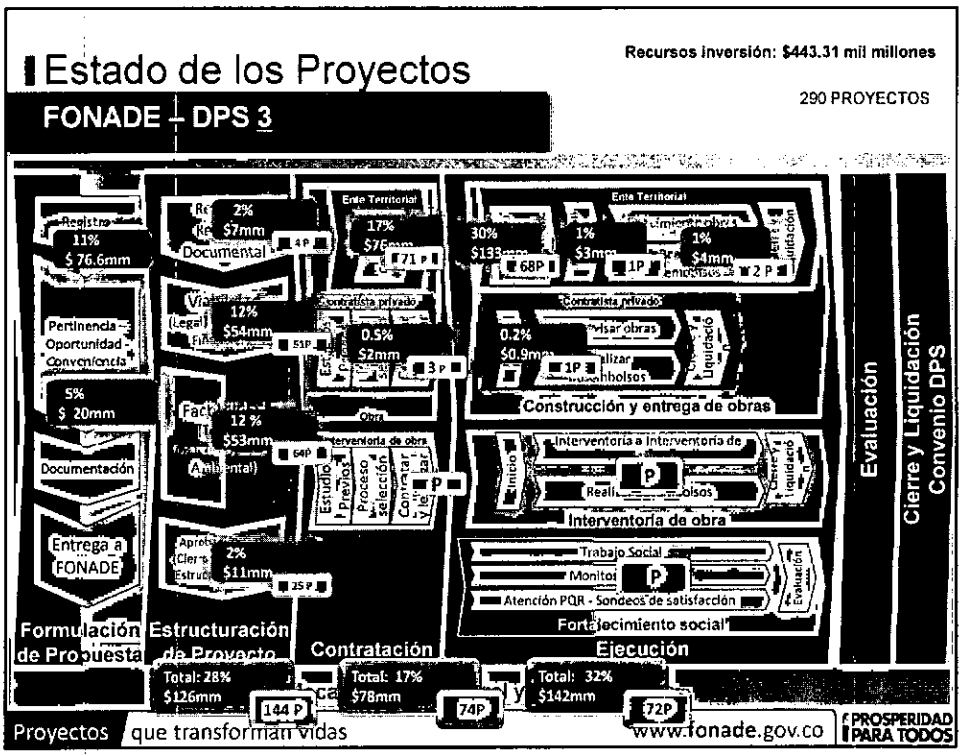
Estado de los Proyectos
FONADE – DPS 3
Recursos inversión: $443.31 mil millones
290 PROYECTOS
Registro
11%
$ 76.6mm
Pertinencia
Oportunidad
Conveniencia
5%
$ 20mm
Documentación
Entrega a FONADE
Formulación de Propuesta
2%
$7mm
Documental
12%
$54mm
12 %
$53mm
2%
$11mm
Estructuración de Proyecto
Total: 28%
$126mm
144 P
Ente Territorial
17%
$76mm
71 P
Contratista privado
0.5%
$2mm
3 P
Interventoría de obra
Estudio Previos
Proceso selección
Contratar
Contratación
Total: 17%
$78mm
74P
30%
$133mm
68P
1%
$3mm
1P
1%
$4mm
2 P
0.2%
$0.9mm
1P
Construcción y entrega de obras
Interventoría a Interventoría de
P
Interventoría de obra
Trabajo Social
Monitoreo
Atención PQR - Sondeos de satisfacción
Fortalecimiento social
Ejecución
Total: 32%
$142mm
72P
Evaluación
Cierre y Liquidación
Convenio DPS
Proyectos que transforman vidas
www.fonade.gov.co
PROSPERIDAD PARA TODOS

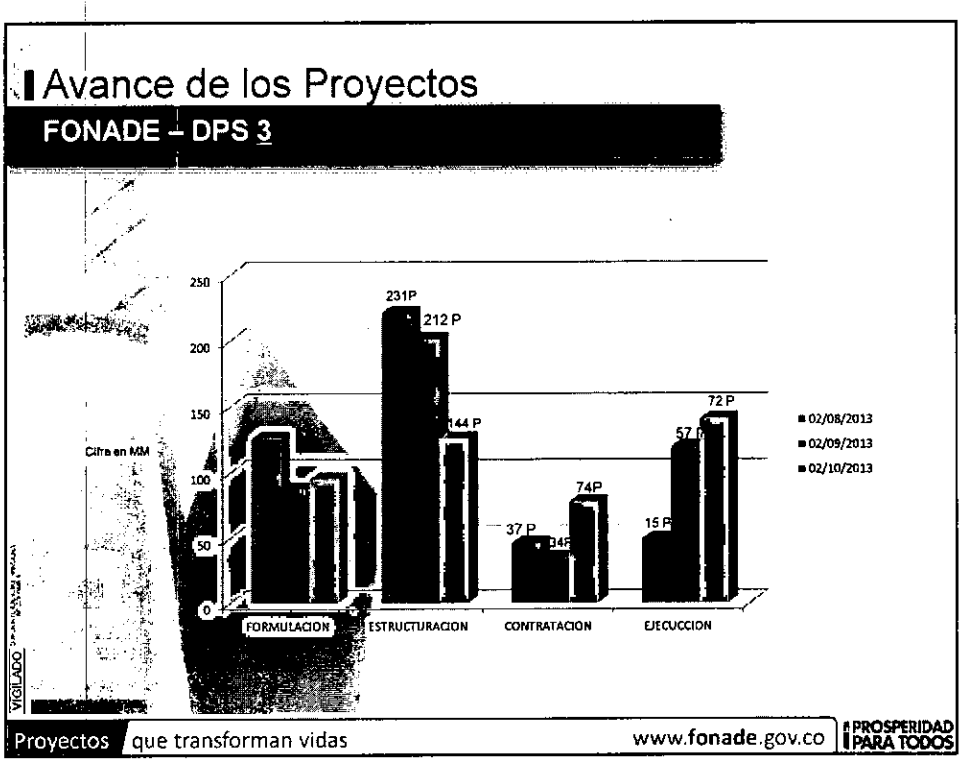
Avance de los Proyectos
FONADE – DPS 3
Cifra en MM
250
200
150
100
50
0
231P
212 P
144 P
37 P
74P
15 P
72 P
FORMULACION
ESTRUCTURACION
CONTRATACION
EJECUCCION
02/08/2013
02/09/2013
02/10/2013
VIGILADO
Proyectos que transforman vidas
www.fonade.gov.co
PROSPERIDAD PARA TODOS

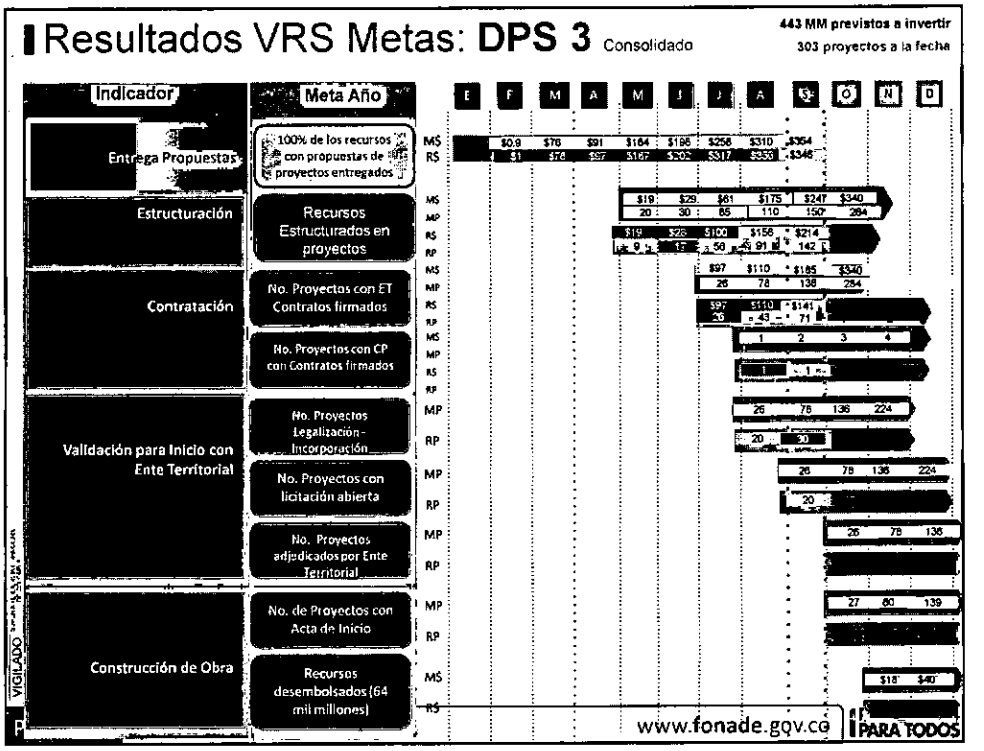
Resultados VRS Metas: DPS 3 Consolidado
443 MM previstos a invertir
303 proyectos a la fecha
Indicador
Meta Año
Entrega Propuestas
100% de los recursos con propuestas de proyectos entregados
Estructuración
Recursos Estructurados en proyectos
Contratación
No. Proyectos con ET Contratos firmados
No. Proyectos con CP con Contratos firmados
Validación para Inicio con Ente Territorial
No. Proyectos Legalización - Incorporación
No. Proyectos con licitación abierta
No. Proyectos adjudicados por Ente Territorial
Construcción de Obra
No. de Proyectos con Acta de Inicio
Recursos desembolsados (64 mil millones)
E F M A M J J A S O N D
MS
RS
MP
RP
www.fonade.gov.co
PARA TODOS

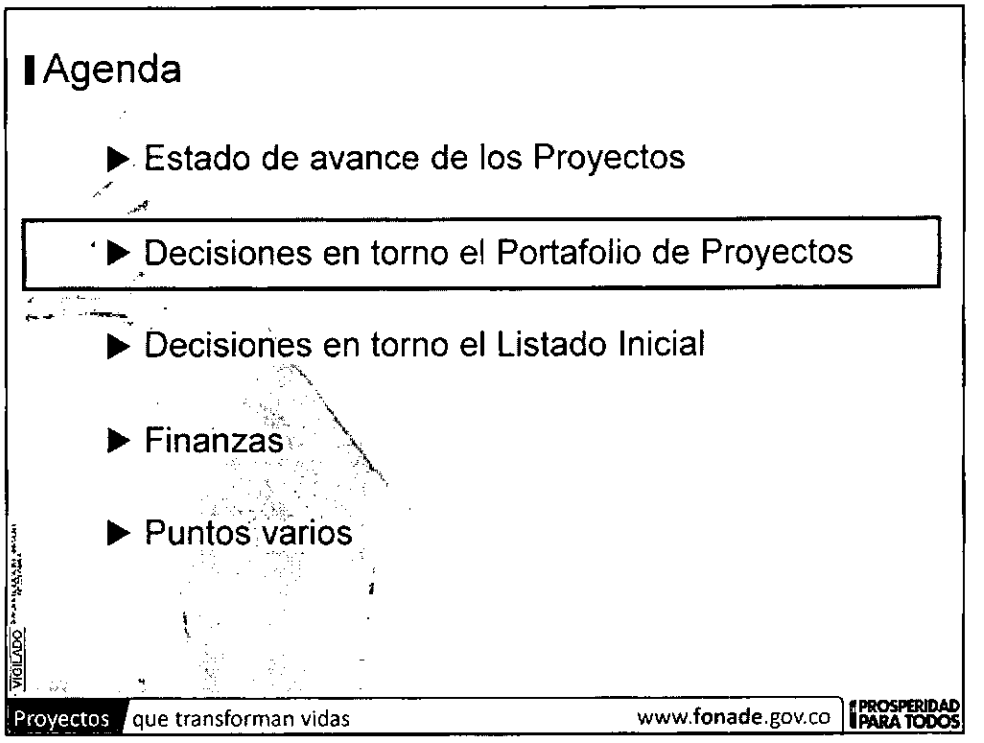
Agenda
Estado de avance de los Proyectos
Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos
Decisiones en torno el Listado Inicial
Finanzas
Puntos varios
Proyectos que transforman vidas
www.fonade.gov.co
PROSPERIDAD PARA TODOS

Proyectos pendientes de asignación de recursos

DPS1

▶ **DPS 1**

- 4 Proyectos sin cierre financiero. Estos proyecto se presentan hoy.

VIGILADO

Proyectos pendientes de asignación de recursos

DPS 1 – Cierres Financieros

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ACTUAL ASIGNADO PROYECTO	VALOR	JUSTIFICACION
357	CFP	BOYACA	CIANCHE	Construcción del coliseo cubierto del municipio de Cianche - Boyacá	$ 729.958.749,00	$ 1.088.771.709,00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
408	DPS	BOYACA	SIACHOQUE	construcción unidades sanitarias vereda guaticha, Municipio de Siachoque - Boyaca	$ 80.000.000,00	$ 54.363.821,00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
407	DPS	BOYACA	CHIVATA	construcción de unidades sanitarias en el sector rural, Municipio de Chivata - Boyaca	$ 80.000.000,00	$ 37.842.813,00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
408	DPS	BOYACA	SORACA	construcción de unidades sanitarias en el área rural, Municipio de Soraca – Boyaca	$ 80.000.000,00	$ 40.123.488,00	EL COMITÉ OPERATIVO RECOMIENDA ASIGNAR ESTOS RECURSOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, BASADO EN EL COSTEO REALIZADO POR EL AREA DE ESTUDIOS PREVIOS DE FONADE
				TOTAL CFP		1.088.771.709	
				TOTAL DPS		132.349.802	
				TOTAL ASIGNACION DE RECURSOS		1.219.121.671	

VIGILADO

Proyectos pendientes de asignación de recursos

DPS2

▶ **DPS 2**

- 1 Proyecto pendiente de cierre financiero. Este proyecto se presenta hoy.

Proyecto pendiente de asignación de recursos

DPS 2 – Cierre Financiero

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO	VALOR REQUERIDO	JUSTIFICACION
44	OPP	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA	$3,042,503,548.00	$ 1.000.000.000	Se cancela el proyecto 090 de Fusagasugá por el convenio 040 de 2012 y se traslada recursos por $1.000.000.000 para adicionar a este proyecto y así dar el cierre financiero al proyecto 44 debido a las mayores cantidades de obra presentadas y que son necesarias para la construcción de la plaza de mercado en la fase funcional.

Proyectos pendientes de asignación de recursos

DPS3

▶ **DPS 3**

- 25 Proyectos sin cierre financiero. Estos se presentan hoy.

Proyectos pendientes de asignación de recursos

DPS 3 – Cierres Financieros

No.	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO	VALOR SOLICITADO	OBSERVACIONES
108	DPS	CAUCA	ROSAS	Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de familias de los estratos 1 y 2 mediante la construcción y/o mejoramiento de cocinas saludables en el municipio de Rosas - Cauca.	$ 174.856.347,00	$ 71.163.819,00	El mismo enfocado con 150.000.000
104	DPS	CAUCA	SAN SEBASTIAN	Construcción polideportivo cubierto corregimiento de Pancitara, municipio de San Sebastián - Cauca.	$ 276.959.130,00	$ 126.848.490,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
139	DPS	CUNDINAMARCA	CAQUEZA	Construcción cerramiento IEd Piedras, del municipio de Caqueza - Cundinamarca.	$ 80.000.000,00	$ 32.430.548,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
191	DPS	HUILA	PITALITO	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO I.E. VEREDA EL PORVENIR CORREGIMIENTO DE BRASILIA EN PITALITO HUILA	$ 230.000.000,00	$ 91.364.739,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
195	DPS	HUILA	TESALIA	CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL EL ROSARIO DEL MPIO DE TESALIA HUILA	$ 198.863.353,00	$ 15.617.174,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
226	DPS	NORTE DE SANTANDER	CHINACOTA	ADECUACION CANCHA COLEGIO DEL CORREGIMIENTO LA DON JUANA, CHINACOTA	$ 73.018.475,60	$ 8.319.050,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
231	DPS	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	ADECUCION CANCHA COLEGIO, BARRIO AEROPUERTO	$ 318.981.774,93	$ 6.059.416,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
234	DPS	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PROYECTO PARQUE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE CUCUTA	$ 202.002.892,07	$ 86.167.990,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
237	DPS	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	ADECUACION CANCHA LA ESPERANZA, BARRIO PALMERAS PARTE BAJA CUCUTA	$ 95.387.998,32	$ 19.350.981,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
811	DPS	VALLE DEL CAUCA	CALCEDONIA	ADECUACION Y CONSTRUCCION SENDERO BIOSALUDABLE PARQUE CIUDADELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CALCEDONIA - VALLE DEL CAUCA	$ 444.444.400,00	$ 43.320.478,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
816	DPS	VALLE DEL CAUCA	RIOFRIO	CUBIERTA PARA GRADERIA ESTADIO MUNICIPAL RICARDO ALVARADO CRUZ	$ 276.000.000,00	$ 23.204.867,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero
333	DPS	VALLE DEL CAUCA	ULLOA	Con carrera 48 vaupés, hasta la carrera 44 con calle 85 (entrada barrio	$ 200.000.000,00	$ 2.084.560,00	Aprobado según comité operativo del 10 de Octubre de 2013, se adiciona para dar cierre financiero

Proyectos pendientes de asignación de recursos

DPS 3 – Adición de recursos

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR APROBADO DEL PROYECTO	VALOR SOLICITADO	OBSERVACIÓN
232	OPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CON ACABADOS SINTETICA SINTETICA SAN LUIS, MUNICIPIO DE CUCUTA	$ 361.295.825,00	$ 55.823.679,20	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
206	OPP	META	EL CALVARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIA UBICADA ENTRE EL ALTO DE CRISTO HASTA EL ALTO DE HONDURAS, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE META CON EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL K0+000 AL K29 +000 EN EL MPIO DE CALVARIO.	$ 1.500.000.000,00	$ 127.847.413,80	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
299	OPP	TOLIMA	FRESNO	Construcción de huellas en concreto, vereda la Isla del municipio de Fresno - Tolima.	$ 300.000.000,00	$ 7.065.638,80	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
300	OPP	TOLIMA	FRESNO	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PARTIENDO EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO	$ 518.359.676,80	$ 86.512.880,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
31	OPP	ANTIOQUIA	TOLEDO	Mejoramiento de la calzada y construcción de obras de drenaje en la vía Las Arboles del municipio de Toledo - Antioquia	$ 250.000.000,00	$ 77.210.960,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
83	OPP	CAUCA	CAMBIO	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO EL CARMELO CORREGIMIENTO DE EL CARMELO MUNICIPIO DE CAMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 384.610.755,20	$ 31.810.755,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
105	OPP	CAUCA	SAN SEBASTIAN	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CISNERAS MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	$ 727.344.775,20	$ 727.244.993,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
162	OPP	CUNDINAMARCA	SESQUILE	CONSTRUCCIÓN COLISEO DEPORTIVO TIERRA NEGRA	$ 749.990.000,00	$ 150.000.000,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero, el municipio $47.818.419
53	OPP	ATLANTICO	SOLEDAD	Construcción de la vía en concreto rígido de la calle 39 entre carreras 12 y 14 barrio la Inmaculada del municipio de soledad	$ 1.000.000.000,00	$ 50.858.309,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
515	OPP	VALLE DEL CAUCA	LA UNION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO URBANO CARRERA 9 ENTRE CALLE 36 Y 37 BARRIO LAS LUAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA	$ 87.000.798,00	$ 20.382.870,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
376	OPP	ATLANTICO	SABANAGRANDE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO	$ 888.787.416,00	$ 35.036.870,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013, se adicionara para dar cierre financiero
29	OPP	ATLANTICO	SABANALARGA	CONSTRUCCION CUATRO AULAS ESCOLARES, BATERIA SANITARIA, CANCHA MULTIPLE Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS DE MARIANA MARAUZA DE PADILLA LOPEZ, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO MOLINEROS, MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO	$ 884.910.038,00	$ 94.424.161,80	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013 se adicionara para dar cierre financiero
218	OPP	NARIÑO	SAN PABLO	ADECUACIÓN DE AREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE SAN PABLO	$ 250.000.000,00	$ 23.061.834,00	Aprobado según acuerdo aprobatorio del 10 de Octubre de 2013 se adicionara para dar cierre financiero
					TOTAL	1.395.657.881,80	

VIGILADO

Cancelación Proyecto

FONADE – DPS 1

No	ESTRA	DPTO		PROYECTO	VALOR	JUSTIFICACION
271	DPS	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	Construcción polideportivo barrio Lleras, comuna 3 en el municipio de Buenaventura - Valle del Cauca.	743.007.847,00	El estudio de suelos arroja como conclusiones y recomendaciones que los suelos encontrados son orgánicos, no aptos para soportar ningún tipo de estructura ni pavimentos a no ser que se hagan obras de mejoramiento (densificación) del suelo. Como resultado de los ítems adicionales se requeriría un presupuesto definitivo para la construcción del polideportivo de $1.574.582.956, requiriendo así un valor adicional de $1.055.274.925. Dicho costo no puede ser adicionado contractualmente, dado que superaría el 50% del valor total del contrato. Se propone al comité de seguimiento su cancelación debido a la no viabilidad financiera para la ejecución del proyecto, sin embargo se liberarían solo los saldos disponibles después de la liquidación de los contratos que se encuentran suscritos.
164	OPP	HUILA	SUAZA	Construcción parque Gallardo en el municipio Suaza - Huila.	250.000.000,00	El 26 de abril de 2013 mediante comunicación 20132320083481 se solicito cofinanciación al Municipio por valor de $684.078.016. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido documento que cofinancie el proyecto, se propone al comité de seguimiento su cancelación debido a la no viabilidad financiera para la ejecución del proyecto.
16	DPS	BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el cual se incluyen los componentes de diagnostico y mejoramiento de vivienda para familias ubicadas en el corregimiento de El Salado y veredas El Bálsamo y Santa Clara, del municipio de El Carmen de Bolívar - Bolívar.	701.494.627,00	Se recomienda la cancelación de este proyecto para ser ejecutado directamente por el DPS
			TOTAL RECURSOS A CANCELAR ESTRATEGIA OPP		250.000.000,00	
			TOTAL RECURSOS A CANCELAR ESTRATEGIA DPS		1.444.502.474,00	

VIGILADO

Cancelación Proyecto

FONADE – DPS 2

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACION
90	OPP	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	ACTUALIZACIÓN A DISEÑOS, TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA.	$1,400,000,000.00	De acuerdo al informe de patología se evidenció que la obra presenta problemas de carácter técnico con losas de entrepisos que evidencian diferencias de nivel como consecuencia de realizar la construcción por etapas, adicionalmente se encuentran aceros expuestos, inexistencia de juntas constructivas y concretos hormigonedos. Por lo tanto se hace necesario realizar un estudio de vulnerabilidad y pruebas de carga con el fin de determinar la intervención necesaria a nivel de estructura. En este sentido y según el informe relacionado se considera que técnicamente la intervención del proyecto se vuelve inviable por tal motivo se recomienda su cancelación.

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Cancelación Proyecto

FONADE – DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACION
50	OPP	BOYACA	PAIPA	Dotación bio parques saludables zona urbana y corredor internacional lago sochagota, municipio de Paipa - Boyacá.	$ 116.516.000,00	No se ha complementado la documentación basica por parte del municipio, (predios)
270	OPP	SANTANDER	BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO VIAL VEREDAL DE LAS VEREDAS MONSERRATE, BOLARQUI ALTO Y CUCHILLA ALTO, DEL CORREGIMIENTO #2 MPIO DE BUCARAMANGA	$ 500.000.000,00	Proyecto sin respuesta por parte del ente territorial
362	OPP	HUILA	SAN AGUSTIN	Construcción puente vehicular El Centenario y mejoramiento del puente colgante acceso Colegio Nacional Laureano Gómez, municipio de San Agustín - Huila.	$ 359.675.784,00	Pese a múltiples solicitudes realizadas al Municipio para que alleguen los documentos faltantes del proyecto, el cual tiene un estado de maduración bajo, no se pudo obtener ninguna respuesta, no es viable financieramente.
			TOTAL		$ 976.191.784,00	

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Precisiones de alcance de proyectos en estructuración

FONADE – DPS 3

NO	ESTRAT	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
40	OPP	BOLIVAR	MAHATES	Pavimentación vías urbanas desde el hospital local barrio toma ivera, calle 18 con las carreras 40, 39, 38, 37, 36, 36a y 34, municipio de Mahates - Bolivar.	Pavimentación de las vías urbanas principales (calle 18 y carrera 33), en la cabecera municpal de Mahates-Bolivar	Para ajustar las metas físicas, con el fin de invertir la totalidad de los recursos asignados.
217	OPP	NARIÑO	OSPINA	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CENTRO CULTURAL MUNICIPIO DE OSPINA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Se ajusta la meta física, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para el proyecto

VIGILADO

Liberación de saldos - proyectos estructurados

FONADE – DPS 3

No.	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO	VALOR LIBERADO	JUSTIFICACION
357	OPP	ATLANTICO	MANATI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y ARROYO CALLE 10, CALLE 9 ENTRE ARROYO CALLE 10 Y CARRERA 5B, CALLE 8A ENTRE CARRERAS 4 Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y 8 A Y CARRERAS 4 ENTRE CALLES 8 A Y 9 EN EL MUNICIPIO DE MANATÍ ATLÁNTICO	$ 1.486.980.386,00	$ 286.766.900,00	El proyecto ya cuenta con cierre financiero
20	OPP	ATLANTICO	GALAPA	ADECUACIÓN GENERAL DEL COLISEO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA DEL CAMPO DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GALAPA	$ 3.034.164.298,00	$ 275.494.700,00	El proyecto ya cuenta con cierre financiero
TOTAL						$562.261.600,00	

VIGILADO

Agenda

- Estado de avance de los Proyectos
- Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos
- Decisiones en torno el Listado Inicial
- Finanzas
- Puntos varios

DPS solicita la inclusión de nuevas propuestas en listado

FONADE – DPS 1

ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR
CFP	NARIÑO	PUERRES	Construcción pavimentación vías urbanas sector centro del Municipio de Puerres-Nariño	$ 300.000.000

DPS solicita la inclusión de nuevas propuestas en listado

FONADE – DPS 2

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO
	DPS	CESAR	SABANA DE CRESPO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN SABANA DE CRESPO	$ 60.000.000,00
	DPS	BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAMANGA ENTRADA MAMÓN DE MARIA DE CARMEN DE BOLÍVAR.	$ 468.610.598,40
	DPS	ANTIOQUIA	ANORI	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLE DE ANORI - ANTIOQUIA	$ 471.132.698,04
	DPS	CAUCA	CALOTO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USO MÚLTIPLE VEREDA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA	$ 144.710.767,04
	DPS	CAUCA	CALOTO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USO MÚLTIPLE VEREDA BODEGA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA	$ 144.710.767,04
	DPS	CAUCA	CORINTO	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CORINTO	$ 389.939.544,96
	DPS	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7, DEL BARRIO PRIMERO DE ENERO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA.	$ 195.771.642,08
	DPS	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA MOTILANDIA EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA.	$ 307.817.046,88
	DPS	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA CRA 12 DEL BARRIO VILLA MARQUEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA.	$ 184.690.227,68
	DPS	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA FARACHE, SANTA FE Y LA VÍA FARACHE-PULPITOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA	$ 334.101.718,72
	DPS	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	$ 504.000.000,00
	DPS	NORTE DE SANTANDER	TIBU	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y PROTECCIÓN EN LA VÍA EL ENCANTO - MATECOCO DEL MUNICIPIO DE TIBU	$ 117.494.088,32
	DPS	NORTE DE SANTANDER	TIBU	CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA PEATONAL VEREDA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ	$ 94.316.892,80
	APP	HUILA	RIVERA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTISTICO DEL SAN JUANERO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	$ 3.500.000.000,00

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

DPS solicita la inclusión de nuevas propuestas en listado

FONADE – DPS 3

No	ESTRATEGIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO AL PROYECTO
395	OPP	TOLIMA	ALPUJARRA	CONSTRUCCION AULAS TECNOLOGICAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEUZA ZUAREZ DE ORTIZ	$ 704.900.000,00
396	OPP	TOLIMA	HERVEO	CONSTRUCCIÓN AULA VEREDA MESONES	$ 300.000.000,00
397	OPP	TOLIMA	LÍBANO	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO BLOQUE DE AULAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA EL TESORO	$ 300.000.000,00
398	OPP	BOYACÁ	SIACHOQUE	INTERVENCION Y RECONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA MUNICIPIO DE SIACHOQUE	$ 1.200.000.000,00
399	OPP	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	CERRAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL. PENDIENTE PRESENTAR EL PROYECTO	$ 200.000.000,00
400	OPP	NARIÑO	COLON GÉNOVA	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN TÉCNICO INDUSTRIAL EDUCATIVA DIVINO NIÑO	$ 487.765.610,00
401	OPP	HUILA	PALESTINA	PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	$ 800.000.000,00
402	OPP	HUILA	TIMANÁ	RESTAURACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CENTRO POBLADO NARANJAL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA	$ 300.000.000,00
403	OPP	RISARALDA	QUINCHIA	REPOSICIÓN PAVIMENTO RIGIDO TERCERA ETAPA ZONA URBANA MUNICIPIO DE QUINCHIA	$ 1.018.000.000,00
404	OPP	RISARALDA	LA CELIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 2 SALIDA A VILLANUEVA MUNICIPIO DE LA CELIA	$ 1.192.000.000,00
405	OPP	SANTANDER	CEPITA	ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CEPITA SANTANDER	$ 200.000.000,00
406	OPP	MAGDALENA	EL BANCO	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CON CANCHA POLIDEPORTIVA GRADERIA CUBIERTA SENDEROS PEATONALES, JARDINES E ILUMINACION EN EL BARRIO MANZANARES	$ 300.000.000,00
407	OPP	MAGDALENA	EL BANCO	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CON CANCHA POLIDEPORTIVA GRADERIA CUBIERTA SENDEROS PEATONALES, JARDINES E ILUMINACION EN EL CORREGIMIENTO DE SAN AGOQUE	$ 300.000.000,00

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

DPS solicita la cancelaciones de propuestas en el listado

FONADE – DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACION
72	OPP	CALDAS	VILLAMARIA	Mejoramiento de viviendas en el municipio de Villamaria - Caladas.	$ 100.000.000,00	Se cancelan los poryectos MCH Caldas, teniendo en cuenta que se ejecutarán a través del Convenio con FNC
101	OPP	CAUCA	PIENDAMO	Mejoramiento de vivienda, construcción de cocinas en el municipio de Piendamo - Cauca.	$ 350.000.000,00	sin cdp de cofinanciacion, ni requisitos minimos


VIGILADO

Agenda

- Estado de avance de los Proyectos
- Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos
- Decisiones en torno el Listado Inicial
- Finanzas
- Puntos varios

VIGILADO

FONADE - Ejecución presupuestal

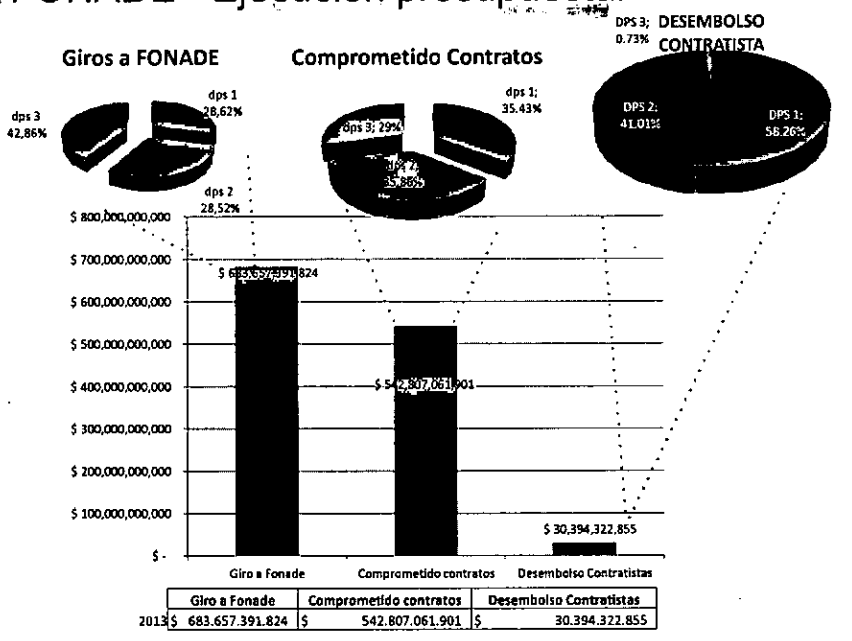

	Giro a Fonade	Comprometido contratos	Desembolso Contratistas
2013	$ 683.657.391.824	$ 542.807.061.901	$ 30.394.322.855

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

FINANCIERO

DPS 1 – Estado actual

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	ESTADO ACTUAL RESUMEN FINANCIERO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	$ 12.769.686.932	$ 555.810.319	$ 200.000.000	$ 12.013.876.613
DPS	$ 35.279.058.552	$ 1.907.636.302	$ 270.000.000	$ 33.101.422.250
OPP	$ 194.211.550.498	$ 9.685.771.235	$ 450.000.000	$ 184.075.779.263
SUB TOTAL	$ 242.260.295.982	$ 12.149.217.856	$ 920.000.000	$ 229.191.078.126
RENDIMIENTOS	$ 3.224.000.000	$ 3.038.145.753		$ 185.854.247
SUB TOTAL	$ 3.224.000.000	$ 3.038.145.753		$ 185.854.247
TOTALES	$ 245.484.295.982	$ 15.187.363.609	$ 920.000.000	$ 229.376.932.373

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

FINANCIERO

DPS 1 – con decisiones del comité

ESTRATEGIA	Propuestas de modificaciones 2 de Octubre					
	Propuestas a incluir en listado	Propuestas a cancelar del listado	Cierre Financiero	Liberación de saldos de proyectos	Cancelación de Proyecto	Total
APP						$ -
DPS			$ (132.349.902)		$ 1.444.502.474	$ 1.312.152.572
OPP	$ (300.000.000)		$ (1.086.771.769)		$ 250.000.000	$ (1.136.771.769)
SUB TOTAL	$ (300.000.000)	$ -	$ (1.219.121.671)	$ -	$ 1.694.502.474	$ 175.380.803
RENDIMIENTOS						$ -
SUB TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	$ (300.000.000)	$ -	$ (1.219.121.671)	$ -	$ 1.694.502.474	$ 175.380.803

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	RESUMEN CON APROBACIONES DEL COMITE DE SEGUIMIENTO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	$ 12.769.686.932	$ 555.810.319	$ 200.000.000	$ 12.013.876.613
DPS	$ 35.279.058.552	$ 3.219.788.874	$ 270.000.000	$ 31.789.269.678
OPP	$ 194.211.550.498	$ 8.548.999.466	$ 750.000.000	$ 184.912.551.032
SUB TOTAL	$ 242.260.295.982	$ 12.324.598.659	$ 1.220.000.000	$ 228.715.697.323
RENDIMIENTOS	$ 3.224.000.000	$ 3.038.145.753		$ 185.854.247
SUB TOTAL	$ 3.224.000.000	$ 3.038.145.753		$ 185.854.247
TOTALES	$ 245.484.295.982	$ 15.362.744.412	$ 1.220.000.000	$ 228.901.551.570

VIGILADO

FINANCIERO

DPS 2 - estado actual

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	ESTADO ACTUAL RESUMEN FINANCIERO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	34.700.000.000	4.809.317.867	7.053.000.000	22.837.682.133
DPS	28.717.580.000	19.503.623.737	1.087.570.676	8.126.385.587
OPP	171.200.000.000	462.037.386	500.000.000	170.237.962.614
SUBTOTAL	234.617.580.000	24.774.978.990	8.640.570.676	201.202.030.334
RENDIMIENTOS	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0	0
OPERATIVOS CUOTA DE GERENCIA Y GMF	13.398.420.000			
TOTALES	248.016.000.000	24.774.978.990	8.640.570.676	201.202.030.334

VIGILADO

FINANCIERO

DPS 2 - con decisiones del comité

ESTRATEGIA	Propuestas de modificaciones Comité seguimiento de septiembre					
	Propuestas a incluir en Estado	Propuestas a cancelar del listado	Adición de Recursos	Liberación de saldos de proyectos	Cancelación de Proyecto	Total
APP	3.500.000.000					3.500.000.000
DPS	3.417.305.989					3.417.305.989
OPP		-1.400.000.000	1.000.000.000			-400.000.000
SUBTOTAL	6.917.305.989	-1.400.000.000	1.000.000.000	0	0	6.517.305.989
RENDIMIENTOS						0
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
OPERATIVOS, CUOTA DE GERENCIA Y GMF						0
TOTALES	6.917.305.989	-1.400.000.000	1.000.000.000	0	0	6.517.305.989

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	RESUMEN CON APROBACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO			FONADE
		Sin Asignar	Asignado		VALOR PROYECTOS ENTREGADOS A FONADE
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE	
APP	34.700.000.000	1.309.317.867	10.553.000.000	22.837.682.133	33.390.682.133
DPS	28.717.580.000	16.086.317.746	4.504.876.665	8.126.385.587	12.631.262.252
OPP	171.200.000.000	862.037.388	500.000.000	169.837.962.614	170.337.962.614
SUBTOTAL	234.617.580.000	18.257.673.001	15.557.876.666	200.802.030.334	216.359.906.999
RENDIMIENTOS	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0	0	0
OPERATIVOS, CUOTA DE GERENCIA Y GMF	13.398.420.000				
TOTALES	248.016.000.000	18.257.673.001	15.557.876.666	200.802.030.334	216.359.906.999

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

FINANCIERO

DPS 3 – estado actual

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	ESTADO ACTUAL DPS3		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	4.133.271.997	86.115.847	0	4.047.156.150
DPS	60.686.014.278	57.750.140.258	1.365.000.000	1.570.874.020
OPP	378.497.477.453	18.830.029.980	18.871.538.479	340.795.908.993
FONDO PAZ	-	0	0	0
SUB TOTAL	443.316.763.728	76.666.286.086	20.236.538.479	346.413.939.163
RENDIMIENTOS	-	0	0	0
SUB TOTAL		0		0
TOTALES	443.316.763.728	76.666.286.086	20.236.538.479	346.413.939.163

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

FINANCIERO

DPS 3 – con decisiones del comité

ESTRATEGIA	FONADE: VALOR PROYECTOS ENTREGADOS A	Propuestas de modificaciones Comité seguimiento 2 de Octubre de 2013: Propuestas a incluir en listado	Propuestas a excluir del listado	PROPUESTA - ADICION DE RECURSOS A PROPUESTAS	PROPUESTA - ADICION DE RECURSOS A PROYECTOS	Liberación de saldos de proyectos	Cancelación de Proyecto	Total
APP	4.047.156.150	0	0	0	[illegible]	0	0	0
OPS	1.570.874.020	0	0	0	0	0	0	0
OPP	340.795.908.988	[illegible]	450.000.000	0	[illegible]	564.251.802	976.191.784	-6.707.870.026
FONDO PAZ	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL	346.413.939.163	7.302.666.610	450.000.000	0	1.394.587.801	564.251.802	976.191.784	-6.707.870.026
RENDIMIENTOS	0	0	0	0		0	0	0
SUB TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	346.413.939.163	7.302.666.610	450.000.000	0	1.394.587.801	564.251.802	976.191.784	-6.707.870.026

ESTRATEGIA	DISTRIBUCION DE RECURSOS DPS	RESUMEN CON APROBACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
		Sin Asignar	Asignado	
			Sin radicar en FONADE	Radicado en FONADE
APP	4.133.271.997	86.115.847	0	4.047.156.150
OPS	60.666.014.278	57.750.140.258	1.365.000.000	1.570.874.020
OPP	378.497.477.453	12.122.159.955	25.724.204.089	340.651.113.408
FONDO PAZ	-	0	0	0
SUB TOTAL	443.316.763.728	69.968.416.060	27.089.204.089	346.269.143.678
RENDIMIENTOS	-	0	0	0
SUB TOTAL		0		0
TOTALES	443.316.763.728	69.968.416.060	27.089.204.089	346.269.143.678

VIGILADO

Agenda

- Estado de avance de los Proyectos
- Decisiones en torno el Portafolio de Proyectos
- Decisiones en torno el Listado Inicial
- Finanzas
- Puntos varios

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 1 y 3

- En el marco del modelo de regionalización para la ejecución de los proyectos de la estrategia Obras para la Prosperidad incluidos en el Convenio Marco DPS-FONADE, en donde se establece la celebración de Convenios y/o Contratos Derivados entre FONADE y entidades territoriales para que estas sean las encargadas de la contratación y ejecución de las obras, y considerando que los Entes Territoriales se encuentran en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 ante sus respectivas asambleas y/o concejos, el comité operativo recomienda que el comité de seguimiento solicite se inicie la suscripción de convenios en primera instancia con los municipios que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia.

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 1 y 3

DPS 1

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
310	CPP	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	Construcción de pantallas anclados por afectación de la ola invernal en el municipio de Cartago, Valle	Construcción de obras de mitigación por afectación de la ola invernal en el municipio de Cartago, Valle.	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
314	CPP	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	Mejoramiento vía cabecera Dague - Cuerenral	Mejoramiento vía cabecera Dague-Cuerenral	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
383	CPP	RISARALDA	BELEN DE UMBRIA	Remodelación fase II del parque principal del municipio de Belén de Umbría Risaralda	Remodelación del parque principal del municipio de Belén de Umbría-Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
385	CPP	RISARALDA	SANTUARIO	construcción cubierta termoacustica para la cancha múltiple en el municipio de Santuario -Risaralda	Adecuación de la cancha múltiple en el municipio de Santuario -Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
387	CPP	RISARALDA	SANTUARIO	adecuación parque principal en el Municipio de Santuario-Risaralda	Adecuación parque principal en el Municipio de Santuario-Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
395	CPP	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Parque recreacional, deportivo, cultural y ecológico la herrosa, Municipio de Santa rosa de Cabal - Risaralda	Adecuación del Parque la Herrosa, Municipio de Santa rosa de Cabal - Risaralda	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 1 y 3

DPS 1

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
401	OPP	HUILA	PITALITO	Construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 13 sur, entre carreras 2 sur y 2 Este del barrio el jardín del municipio de pitalito, departamento del Huila	Construcción de vías urbanas en el barrio el jardín del municipio de pitalito, departamento del Huila	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
404	DPS	MAGDALENA	ARIGUANI	Recuperación y adecuación de la plaza central del municipio de Ariguani - Magdalena	Adecuación de la plaza central del municipio de Ariguani - Magdalena	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
412	DPS	AMAZONAS	LETICIA	Construcción de puente peatonal en la Comunidad Macedonia del municipio de Leticia - Amazonas	Construcción de puente peatonal en la Comunidad Macedonia del municipio de Leticia - Amazonas	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
414	OPP	META	VILLAVICENCIO	Reconstrucción Institucional educativa oficial Francisco Arango Municipio de Villavicencio, Meta	Reconstrucción de la Institución educativa oficial Francisco Arango Municipio de Villavicencio, Meta	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
415	DPS	AMAZONAS	LETICIA	Construcción, pavimentación de la transversal 2 entre calle 14 y 15 A (Barrio La Santa) en el municipio de Leticia Amazonas	Construcción de vías urbanas en el barrio La Santa en el municipio de Leticia Amazonas	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.
416	OPP	ANTIOQUIA	APARTADO	Red de acueducto, alcantarillado y concretos del urbanismo del proyecto Palmeras de Abibes municipio de Apartado Departamento de Antioquia	Obras hidrosanitarias y de arte del proyecto Palmeras de Abibes en el municipio de Apartado Departamento de Antioquia	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Se solicita la modificación del alcance para la suscripción de los contratos interadministrativos.

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
3	OPP	ANTIOQUIA	ENVIGADO	CONSTRUCCIÓN COLISEO MUNICIPIO DE ENVIGADO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Ydada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
6	OPP	ANTIOQUIA	SABANETA	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Ydada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
7	OPP	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Ydada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
16	OPP	ATLANTICO	BARRANQUILLA	LA CONSTRUCCION CANALIZACIÓN AFLUENTE VILLA DEL ROSARIO MUNICIPIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Ydada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
28	OPP	ATLANTICO	SABANALARGA	RECUPERACIÓN AMBIENTAL ARROYO SAN ANTONIO 2A ETAPA (E 0+00+560 AL K2+260) MUNICIPIO DE SABANALARGA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
37	OPP	BOLIVAR	ARJONA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
38	OPP	BOLIVAR	ARROYO HONDO	Construcción de Pavimento en Concreto Rígido en Vías de los Barrios Santa Elena y La Iglesia, Casco Urbano del Municipio de Arroyohondo – Bolívar	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
39	OPP	BOLIVAR	CLEMENCIA	PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL ACCESO PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLIVAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
44	OPP	BOLIVAR	TALAIGUA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CALLES DE LA CABECERA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
45	OPP	BOLIVAR	TURBACO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DEL BARRIO EL RODEO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
48	OPP	BOYACA	DUITAMA	RENOVACIÓN URBANISTICA ZONA CENTRO CRA 16 ENTRE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYAA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
53	OPP	BOYACA	SUSACON	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
60	OPP	CALDAS	LA DORADA	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD LAS FERIAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
63	OPP	CALDAS	NORCASIA	PRIMERA FASE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
67	OPP	CALDAS	SALAMINA	Adecuación del centro geriátrico en la cabecera municipal	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
71	OPP	CALDAS	VICTORIA	PARQUE RECREACIONAL DOÑA JUANA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
72	OPP	CALDAS	VILLAMARIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
74	OPP	CAQUETA	FLORENCIA	MEJORAMIENTO MALLA VIAL REALIZANDO PAVIMENTACIÓN EN CALIENTE CON MEZCLA DENSA TIPO 2 CIUDAD DE FLORENCIA CAQUETA SOBRE LA AVENIDA ROBERTO CLAROS ENTRE CALLES 15C Y 17, LA ENTRADA Y SALIDA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA Y LA GLORIETA DEL TERMINAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
76	OPP	CAUCA	ARGELIA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
84	OPP	CAUCA	CALDONO	CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD CORREGIMIENTO CASAS BAJAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
87	OPP	CAUCA	EL TAMBO	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL MODULO No 1 DE LA GALERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TAMBO - CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
91	OPP	CAUCA	FLORENCIA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE MARSELLA Y EL ROSARIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
96	OPP	CAUCA	LA VEGA	SANEAMIENTO BASICO PARA EL MEJORAMIENTO DE COCINAS E IMPLEMENTACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL RESGUARDO INDIGENA YANACONA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
97	OPP	CAUCA	MERCADERES	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
99	OPP	CAUCA	MORALES	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO SOBRE ESTRUCTURA METALICA VEREDA PORVENIR CORREGIMIENTO DE CARPINTERO - MUNICIPIO DE MORALES CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
100	OPP	CAUCA	PATIA	REHABILITACION PAVIMENTACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL RURAL COMPREVDIDO VIA PANAMERICANAKM 18 + 200 VEREDA EL PURO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
111	OPP	CAUCA	TIMBIO	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA CANCHA Y CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
140	OPP	CUNDINAMA RCA	CAQUEZA	CONSTRUCCION GRADERIAS ESTADIO ANTONIO SANCHEZ LUQUE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
144	OPP	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	REHABILITACION MEJORAMIENTO Y AJUSTE A DISEÑOS DE VIAS CALLE 17 Y CALLE 18 URBANIZACION MARIA PAULA SECTOR VILLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
149	OPP	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	CONSTRUCCION REMODELACION ADECUACION Y AJUSTE A DISEÑOS DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 5 Y 8 BARRIO ZAMBRANO MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
150	OPP	CUNDINAMARCA	FOSCA	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y MEJORAMIENTO VIA SAN ANTONIO, ARRAYANAL, MESA DE CASTRO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
155	OPP	CUNDINAMARCA	MANTA	CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS Y MANTENIMIENTO VIA SECTOR ESCUELA CUBIA, ESCUELA EL BOSQUE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
159	OPP	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	Construcción de pavimento rígido en las vías urbanas del municipio de san Bernardo Cundinamarca	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
160	OPP	CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL COMPARTIR DE VISITANTES Y LUGAREÑOS, EN LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EN CUNDINAMARCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
167	OPP	CUNDINAMARCA	UBAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN LAS VEREDAS DE PUEBLONUEVO CENTRO Y AFUERA SECTOR CATATUMBO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
168	OPP	CUNDINAMARCA	UNE	CONSTRUCCIÓN POLIDEPROTIVO VEREDA TIMASITA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
375	OPP	HUILA	ALTAMIRA	Construcción de una batería sanitaria, y mejoramiento de pisos y muros interiores de la casa de la cultura del municipio de Altamira - Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
340	OPP	HUILA	ELIAS	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOGAR PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
338	OPP	HUILA	PITAL	CONSTRUCCIÓN SALON JARDIN INFANTIL PICAROA BARRIO LOS PARQUES	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
290	OPP	HUILA	PALESTINA	Construcción cancha de futbol pasto para urbano	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
197	OPP	HUILA	RIVERA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
196	OPP	HUILA	VILLAVIEJA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA VICTORIA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
211	OPP	NARIÑO	EL TAMBO	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EL TAMBO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
212	OPP	NARIÑO	GUALMATAN	REPOSICIÓN DE LA RED PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE CUATIS TRAMO 3	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
225	OPP	NARIÑO	LA UNION	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA SANTANDER MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia


VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

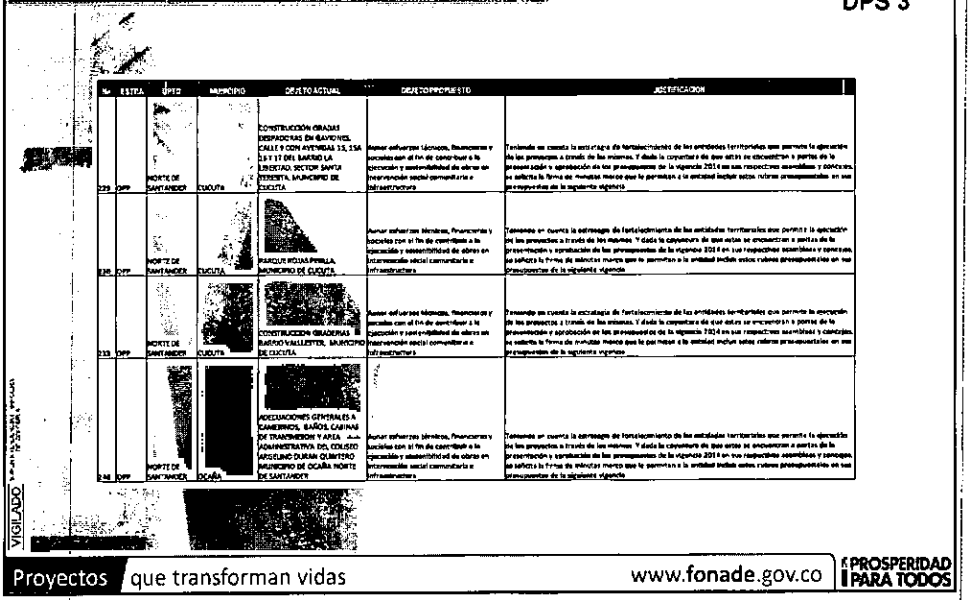


No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
239	DPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION GRADAS DISPADORAS EN GAVIONES, CALLE 9 CON AVENIDAS 15, 15A 16 Y 17 DEL BARRIO LA ESPERANZA SECTOR SANTA TERESITA, MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
240	DPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	PARQUE RIOMAS PERILLA MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
238	DPP	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION GRADERIAS BARRIO VALLESTER, MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
248	DPP	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ADECUACIONES GENERALES A CAMERINOS, BAÑOS, CABINAS DE TRANSMISION Y AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ARSELINO DURAN QUINTERO MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

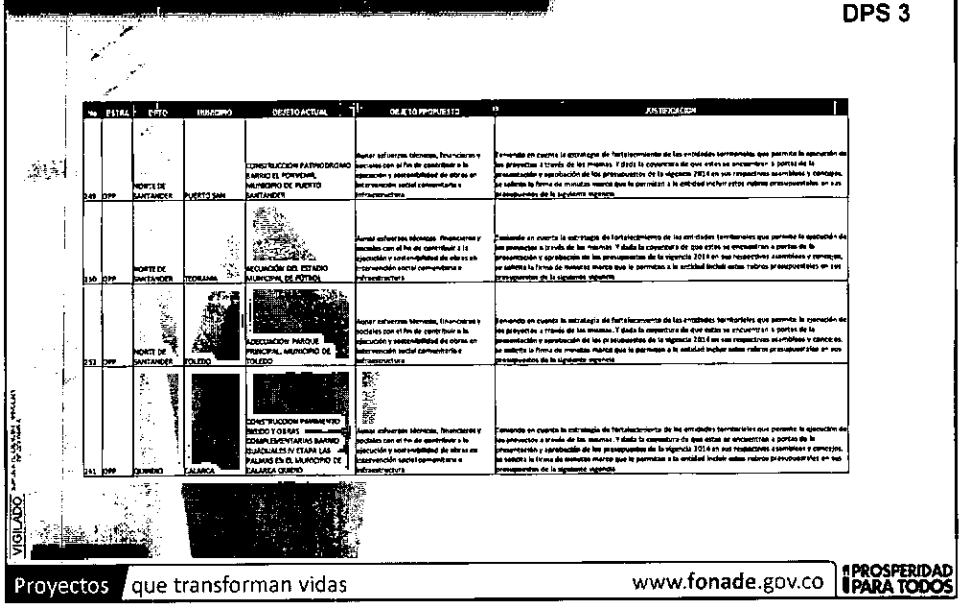

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
249	DPP	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SAN	CONSTRUCCION PATIVO DROMO BARRIO EL PONTHON, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
250	DPP	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	ADECUACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE TEORAMA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
252	DPP	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	ADECUACION PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE TOLEDO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
241	DPP	QUINDIO	CALARCA	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO CUADRUM IV ETAPA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de coordinar a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dada la cercanía de que estas se encuentran a punto de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos acuerdos y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROYECTO	JUSTIFICACION
263	DPP	QUINDIO	CALARCA	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DOS RAMAS CALLE 13 NORTE SECTOR PLAYA RICA DEL CENTRO DEL POBLADO CONSTRUCCIONTO BARCELONA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
265	DPP	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	Proyecto de optimización del sistema de alcantarillado y acueducto y reposición de pavimento en la carrera 11 entre calles 16A y 18 y la calle 18 entre Carrera 11 y casa grande #386.	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
266	DPP	RISARALDA	VIRGINIA	CONSTRUCCIÓN PABELLON DE CARNE PLAZA DE MERCADO LA VIRGINIA RISARALDA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
272	DPP	SANTANDER	CHARALA	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CHARALA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROYECTO	JUSTIFICACION
270	DPP	SANTANDER	FLORIDABLANCA	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO CARACOLI, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
278	DPP	SANTANDER	PIEDECUESTA	CANALIZACIÓN AGUAS NEGRAS DEL BARRIO VILLAS DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
280	DPP	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	CONSTRUCCIÓN AREA DE CONSULTA EXTERNA HOSPITAL SAN ANTONIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
281	DPP	SANTANDER	SANTA HELENA DEL OPON	CONSTRUCCIÓN AULAS ESCOLARES VEREDA LA ARAUJA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la conocimiento de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que la permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia


VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

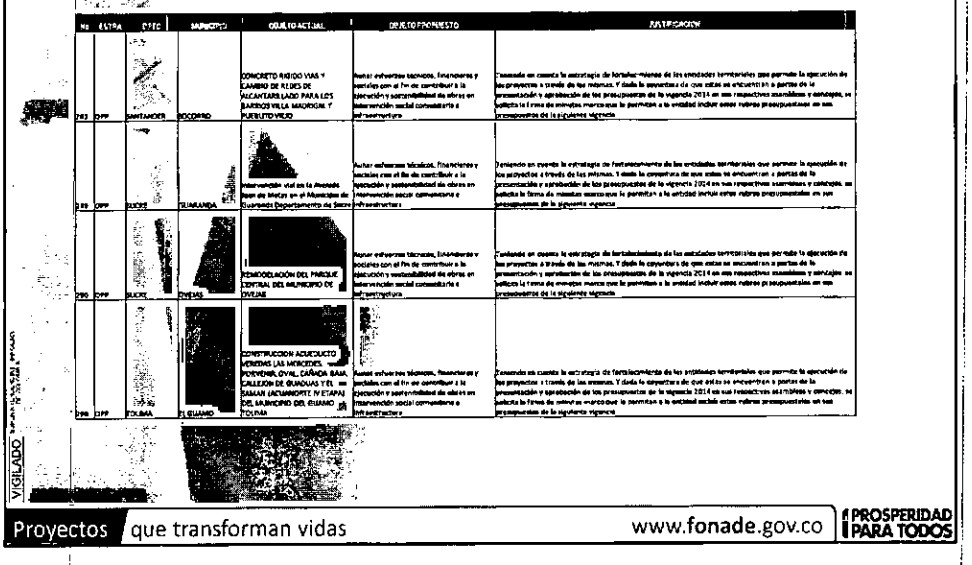


No	ENTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
293	OPP	SANTANDER	BOCORO	CONCRETO RIGIDO VIAS Y CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS VILLA MAGDALENA Y PUEBLITO VIEJO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
219	OPP	HUILA	TELAMANIA	Intervención vial en la Avenida [illegible] en el Municipio de Guinea Departamento de Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
290	OPP	HUILA	RIVERA	REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
298	OPP	TOLIMA	EL GUAMO	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAS LAS MERCEDES, [illegible] CALLEJON DE GUADUAS Y EL [illegible] DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

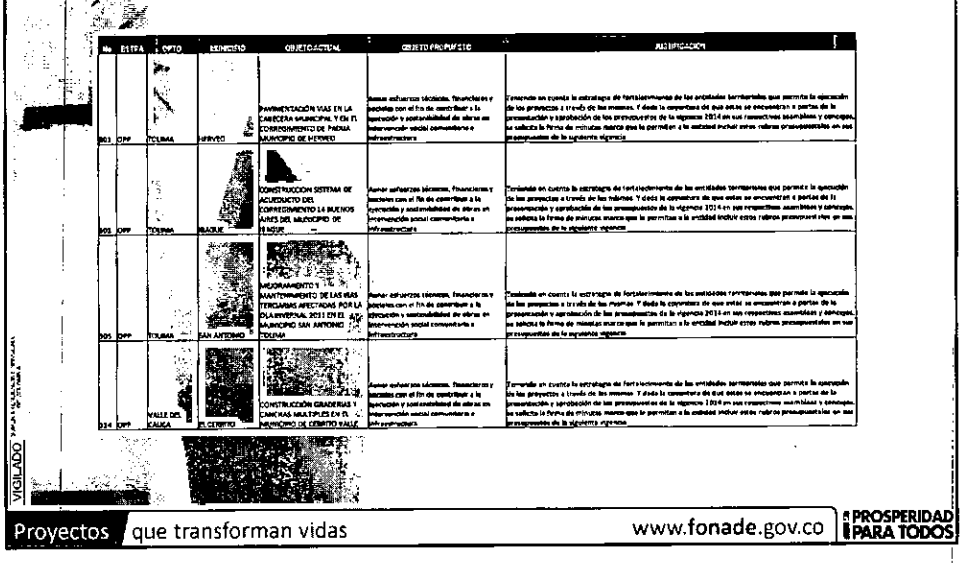

No	ENTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
303	OPP	TOLIMA	HERVEO	PAVIMENTACIÓN VIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL CORREGIMIENTO DE PADUA MUNICIPIO DE HERVEO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
305	OPP	TOLIMA	IBAGUE	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO 14 BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
305	OPP	TOLIMA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2011 EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO TOLIMA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
324	OPP	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y CANCHAS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CERRITO VALLE	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en infraestructura social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la cercanía de que estas se encuentran a partes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
518	DPS	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	PAVIMENTACIÓN VIA CORREGIMIENTO SANTA RITA MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
524	DPS	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
528	DPS	SANTANDER	BUCARAMANGA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO CUMBRES DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
542	DPS	ATLANTICO	MALAMBO	Construcción del polideportivo santa maría magdalena del municipio de malambo	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
543	DPS	HUILA	GARZA	Pavimentación urbanismo de la carrera 3 entre Calle 6 y 7, parque central , Municipio de Garzón- Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
544	DPS	ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	Pavimentación de la calle Nueva Aurora con adoquín	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
545	DPS	HUILA	PITALITO	Pavimentación vías urbanas en el municipio de Pitalito - Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
547	DPS	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de vivienda en el corregimiento la laguna zona rural municipio de Pitalito - Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de estudios marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia


VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

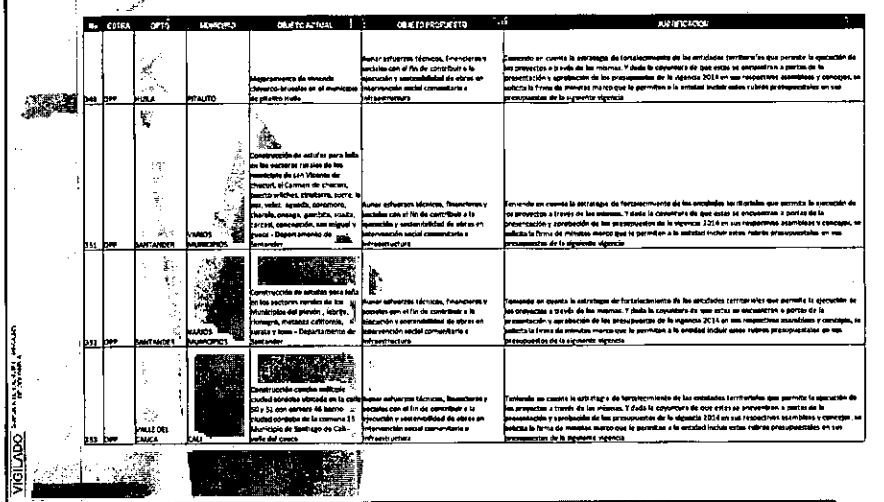


Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

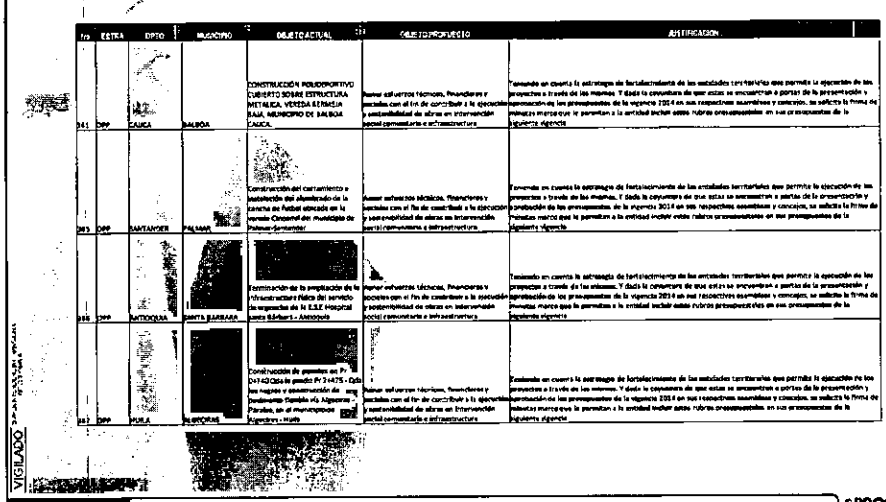


Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

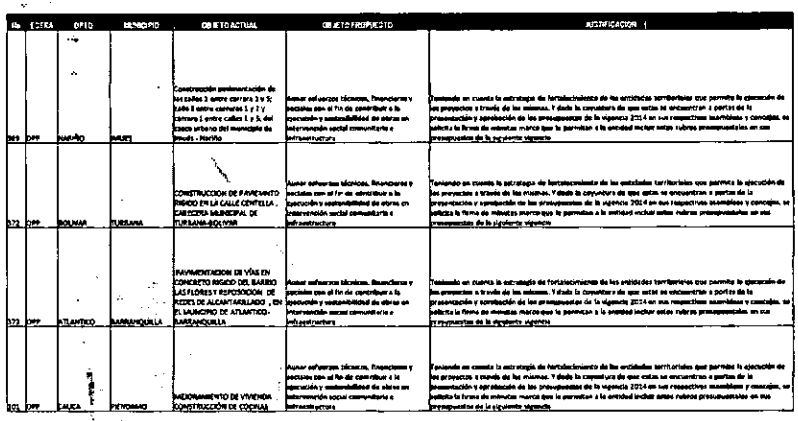


No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
369	DPS	NARIÑO	MAPIRI	Construcción pavimentación de las calles 3 entre carrera 3 y 5; calle 5 entre carreras 1 y 7 y carrera 1 entre calles 1 y 5, del casco urbano del municipio de Mapiri - Nariño	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
372	DPS	BOLIVAR	TURBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE CENTELLA - CABECERA MUNICIPAL DE TURBANA-BOLIVAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
373	DPS	ATLANTICO	BARRANQUILLA	PAVIMENTACION DE VÍAS EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LAS FLORES Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO , EN EL MUNICIPIO DE ATLANTICO-BARRANQUILLA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
801	DPS	CAUCA	PIENDAMO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

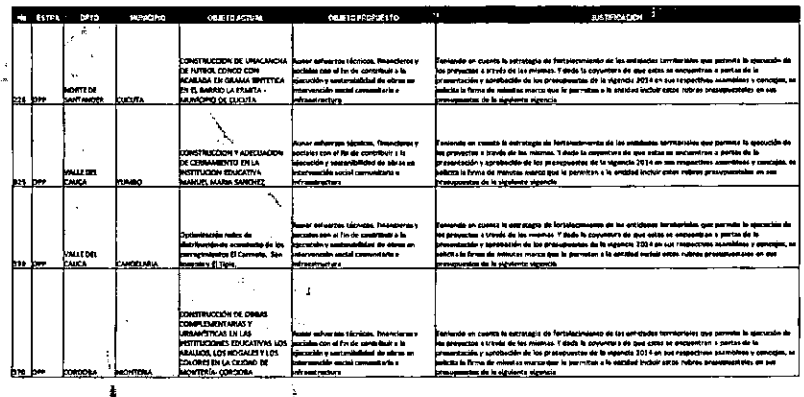

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
226	DPS	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CONSTRUCCION DE URBANCHA DE FUTBOL CONCO CON ACABADA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO LA ESPARTA - MUNICIPIO DE CUCUTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
825	DPS	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MARIA SANCHEZ	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
839	DPS	VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	Optimización redes de distribuyendo acometida de los corregimientos El Carmelo, San Antonio El Tigre,	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
878	DPS	CORDOBA	MONTERIA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANÍSTICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS ARAUJOS, LOS MOGALES Y LOS COLORES EN LA CIUDAD DE MONTERÍA- CORDOBA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivas asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia


VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

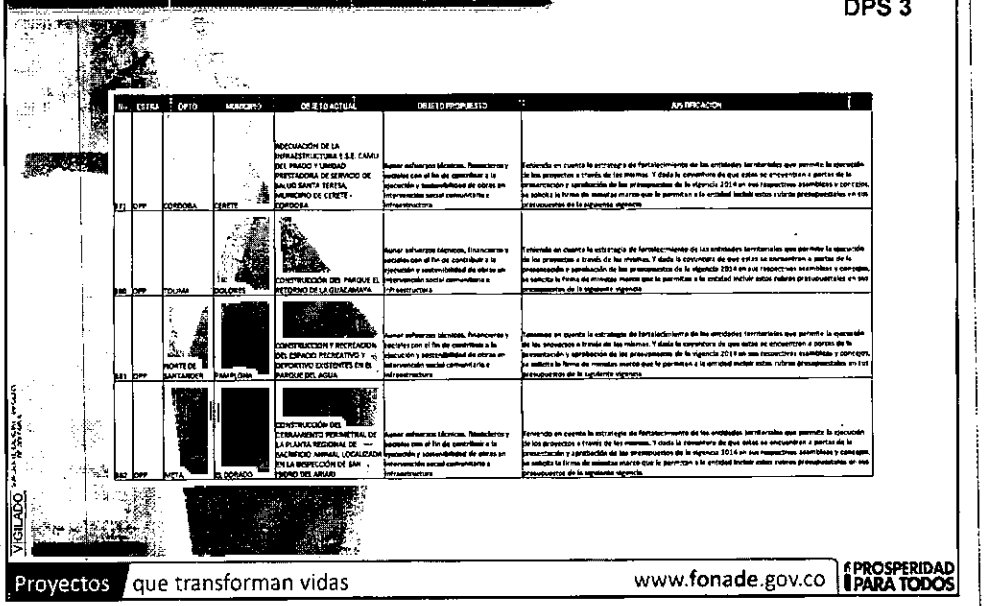

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
871	OPP	CORDOBA	CERETE	REDUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I.S.E. CAMU DEL PRADO Y UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
880	OPP	TOLIMA	DOLORES	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL RETORNO DE LA GUACAMAYA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
881	OPP	PUENTE DE SANTANDER	PAMPLONA	CONSTRUCCIÓN Y RECREACIÓN DEL ESPACIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EXISTENTES EN EL PARQUE DEL AGUA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
882	OPP	ARCTA	EL DORADO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PLANTA REGIONAL DE [illegible] MACHICHO NIRUAL, LOCALIZADA EN LA INSPECCIÓN DE SAN [illegible] PIEDRO DEL ARUAR	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia


VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

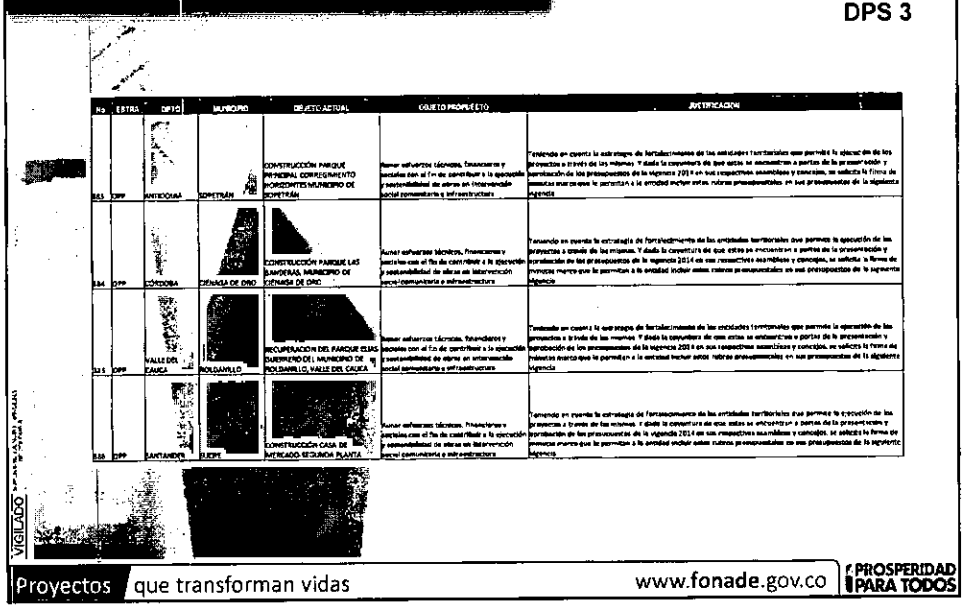

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
865	OPP	ANTIOQUIA	SOPETRÁN	CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO HORIZONTES MUNICIPIO DE SOPETRÁN	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
884	OPP	CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	CONSTRUCCIÓN PARQUE LAS BANDERAS, MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
885	OPP	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	RECUPERACIÓN DEL PARQUE ELIAS SUAREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
886	OPP	SANTANDER	SUCRE	CONSTRUCCIÓN CASA DE MERCADO- SEGUNDA PLANTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de convites marco que le permitan a la entidad iniciar estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
347	OPP	TOLIMA	VILLAHERMOSA	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
348	OPP	ANTIOQUIA	GRANDOTA	CONSTRUCCIÓN TEATRO MUNICIPAL DE GRANDOTA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
349	OPP	TOLIMA	COELLO	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AULAS EDUCATIVAS CABECERA MUNICIPAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
350	OPP	CUNDINAMARCA	SUACHA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO LEON XIII PRIMER SECTOR CONVENIA II	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	ESTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
351	OPP	VALLE DEL CAUCA	EL DOVIO	MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIA URBANA COSTADO SUR DEL PARQUE PRINCIPAL, CALLE 7 ENTRE CRA 7 Y 9 DEL MUNICIPIO DE EL DOVIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
352	OPP	BOYACÁ	LA UVITA	ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA ZONA CONTIGUA AL PARQUE MUNICIPAL	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
353	OPP	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA VÍAS INTERNAS Y PARQUE LOS MICOMONTOS	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
354	OPP	SANTANDER	LEBRIJA	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ALTERNAS EN EL SECTOR VÍA SOLMERCHES CARRERA 16 VÍA AL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social complementaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de los mismos. Y dado la coyuntura de que estas se encuentran a portes de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	EXTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
79	DPS	CAUCA	ARGELIA	SANEAMIENTO DE VIVIENDA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
81	DPS	CAUCA	FLORENCIA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE MARSELLA Y EL ROSARIO	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
96	DPS	CAUCA	LA VEGA	SANEAMIENTO BASICO PARA EL MEJORAMIENTO DE COCINAS E IMPLEMENTACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL RESGUARDO INDIGENA PANCHINA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
972	DPS	HUILA	ISNOTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ISNOTA HUILA	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO

Varios: modelo de regionalización

DPS 3

DPS 3

No.	EXTRA	DPTO	MUNICIPIO	OBJETO ACTUAL	OBJETO PROPUESTO	JUSTIFICACION
947	DPS	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de viviendas en el corregimiento la Regina zona rural municipio de Pitalito - Huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
948	DPS	HUILA	PITALITO	Mejoramiento de vivienda rural en zona-bioclimática en el municipio de pitalito huila	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
953	DPS	SANT. MINDER	VARIOS MUNICIPIOS	Construcción de estufas para leña en las sectores rurales de los municipios de san Vicente de chucuri, el Carmen de chucuri, puerto wilches, cimitarra, sucre, la paz, velez, aguada, cepitaneja, charalá, enciso, pinchote, mogotes, barbosa, concepción, san miguel y Suaco - Departamento de Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia
955	DPS	SANTANDER	VARIOS MUNICIPIOS	Construcción de estufas para leña en los sectores rurales de los Municipios del piñon , barbosa, barrancabermeja, rionegro confines, suratá y tona - Departamento de Santander	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en intervención social comunitaria e infraestructura	Teniendo en cuenta la estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales que permite la ejecución de los proyectos a través de las mismas. Y dada la coyuntura de que estas se encuentran a portas de la presentación y aprobación de los presupuestos de la vigencia 2014 en sus respectivos asambleas y concejos, se solicita la firma de minutas marco que le permitan a la entidad incluir estos rubros presupuestales en sus presupuestos de la siguiente vigencia

VIGILADO


Proyectos que transforman vidas www.fonade.gov.co PROSPERIDAD PARA TODOS

Varios: Recomposición de vigencias

DPS 1

Adición y prorroga

Se solicita la prórroga del convenio hasta 30 de Junio de 2015, dado que hay proyectos que pasan la ejecución de la vigencia actual.



Recomposición de vigencias convenio 211041.

Para la vigencia 2014, el convenio 211041 establece un valor de $10.000.000.000, el cual se solicitará su recomposición de la siguiente manera:

Vigencia 2014 $9.500.000.000
Vigencia 2015 $500.000.000

Adición de recursos de Rendimientos financieros

Dada la solicitud de prórroga del actual convenio hasta el 30 de junio del 2015, se solicita la inclusión de rendimientos financieros por un monto de $5.000.000.000 con el fin de destinarlos a los cierres financieros de los proyectos en curso, y a los gastos derivados de la operación del convenio hasta la fecha de terminación.


VIGILADO

Varios: Recomposición de vigencias

DPS 2

Adición y prorroga

El Comité Operativo solicita la prórroga del convenio hasta 30 de Junio de 2015, dado que hay proyectos que pasan la ejecución de la vigencia actual



Recomposición de vigencias convenio 212017.

Para la vigencia 2014, el convenio 212017 establece un valor de $20.000.000.000, el cual se solicitará su recomposición de la siguiente manera:

Vigencia 2014 $15.000.000.000
Vigencia 2015 $5.000.000.000

Adición de recursos de Rendimientos financieros

Dada la solicitud de prórroga del actual convenio hasta el 30 de junio del 2015, se solicita la inclusión de rendimientos financieros por un monto de $5.000.000.000 con el fin de destinarlos a los cierres financieros de los proyectos en curso, y a los gastos derivados de la operación del convenio hasta la fecha de terminación.

VIGILADO

Varios: Recomposición de vigencias

DPS 3

Adición y prorroga

El Comité Operativo solicita la prórroga del convenio hasta 31 de Diciembre de 2015, dado que hay proyectos que pasan la ejecución de la vigencia actual.

DPS solicita la adición de $ 28.732.032.658 a la estrategia APP.

Recomposición de vigencias convenio 212080.

Para la vigencia 2014, el convenio 212080 establece un valor de $30.000.000.000, el cual se solicitará su recomposición de la siguiente manera:

Vigencia 2014 $20.000.000.000
Vigencia 2015 $10.000.000.000

Adición de recursos de Rendimientos financieros

Dada la solicitud de prórroga del actual convenio hasta el 31 de Diciembre del 2015, se solicita la inclusión de rendimientos financieros por un monto de $5.000.000.000 con el fin de destinarlos a los cierres financieros de los proyectos en curso, y a los gastos derivados de la operación del convenio hasta la fecha de terminación.
