

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL**	**78 días?**	**lun 25/08/25**	**mié 10/12/25**	**$1,526,436,343.17**	
2	Firma acta de inicio	0 días	lun 25/08/25	lun 25/08/25	$0.00	
3	Reunión presentación requisitos entidad	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25	$0.00	2CC
4	Presentación documentación contractual	12 días	mar 26/08/25	mié 10/09/25	$0.00	3
5	Aprobación documentación de inicio	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	$0.00	4
6	Modificatorio contrato de obra	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$0.00	
7	**UBATE**	**36 días**	**jue 04/09/25**	**jue 23/10/25**	**$45,992,147.00**	
8	VISITA INICIAL	1 día	jue 04/09/25	jue 04/09/25	$0.00	2FC+8 días
9	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	vie 05/09/25	mar 09/09/25	$0.00	8
10	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mié 10/09/25	vie 12/09/25	$0.00	9
11	**PRELIMINARES**	**28 días**	**lun 15/09/25**	**mié 22/10/25**	**$3,191,350.90**	
12	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	lun 15/09/25	mar 16/09/25	$103,331.46	10,5
13	DESMONTE DE CUBIERTA	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25	$551,640.38	14
14	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	2 días	mié 17/09/25	jue 18/09/25	$1,820,260.16	12
15	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$716,118.90	40
16	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**4 días**	**lun 13/10/25**	**jue 16/10/25**	**$5,053,725.37**	
17	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$3,582,125.56	45
18	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$356,899.38	17CC
19	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$1,114,700.43	18
20	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**lun 29/09/25**	**$481,256.13**	
21	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	4 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	$481,256.13	23
22	**CUBIERTAS**	**2 días**	**lun 22/09/25**	**mar 23/09/25**	**$1,817,509.14**	
23	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	2 días	lun 22/09/25	mar 23/09/25	$1,817,509.14	13
24	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**4 días**	**mar 30/09/25**	**vie 03/10/25**	**$917,728.52**	
25	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	2 días	jue 02/10/25	vie 03/10/25	$798,807.53	26
26	LAVADO FACHADA	2 días	mar 30/09/25	mié 01/10/25	$118,920.99	21
27	**PINTURAS**	**5 días**	**jue 02/10/25**	**mié 08/10/25**	**$18,751,607.25**	
28	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	5 días	jue 02/10/25	mié 08/10/25	$18,751,607.25	26
29	**RED ELÉCTRICA**	**7 días**	**jue 09/10/25**	**vie 17/10/25**	**$4,160,228.24**	
30	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$462,618.55	32
31	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$88,253.13	30CC
32	CANALETA PLASTICA 100X45MM	3 días	jue 09/10/25	lun 13/10/25	$1,278,454.86	28
33	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	vie 17/10/25	vie 17/10/25	$42,411.32	35
34	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 09/10/25	jue 09/10/25	$317,584.55	32CC
35	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$1,970,905.83	32
36	**RED SANITARIA**	**8 días**	**mié 17/09/25**	**vie 26/09/25**	**$2,175,716.47**	
37	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	mié 17/09/25	jue 18/09/25	$866,708.48	14CC
38	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	3 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25	$1,309,007.99	23
39	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**lun 20/10/25**	**jue 23/10/25**	**$2,764,322.24**	
40	ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$739,927.07	12,13,14,17,18,19,21,2
41	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$354,152.19	40
42	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$575,973.77	41CC
43	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$1,094,269.21	41CC
44	**ADICIONALES**	**5 días**	**jue 09/10/25**	**mié 15/10/25**	**$1,670,295.23**	
45	MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	jue 09/10/25	vie 10/10/25	$628,285.18	28
46	MANTENIMIENTO MODULO GENERAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE HERRAJES,ANCLAJES, TENSORES, CADENAS, CHAPAS, TORNILLERÍA Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	lun 13/10/25	mié 15/10/25	$1,042,010.05	45
47	**NO PREVISTOS**	**27 días**	**mié 17/09/25**	**jue 23/10/25**	**$5,008,407.51**	
48	DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	jue 09/10/25	vie 10/10/25	$40,936.38	28,12CC
49	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	1 día	jue 02/10/25	jue 02/10/25	$38,803.64	28CC
50	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	2 días	jue 02/10/25	vie 03/10/25	$39,182.25	49CC
51	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	16 días	jue 02/10/25	jue 23/10/25	$764,971.79	26
52	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	1 día	jue 09/10/25	jue 09/10/25	$1,350,408.40	28
53	MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	2 días	jue 09/10/25	vie 10/10/25	$549,767.70	52CC
54	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	1 día	mié 17/09/25	mié 17/09/25	$397,271.03	12
55	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	jue 09/10/25	vie 10/10/25	$1,059,613.77	28

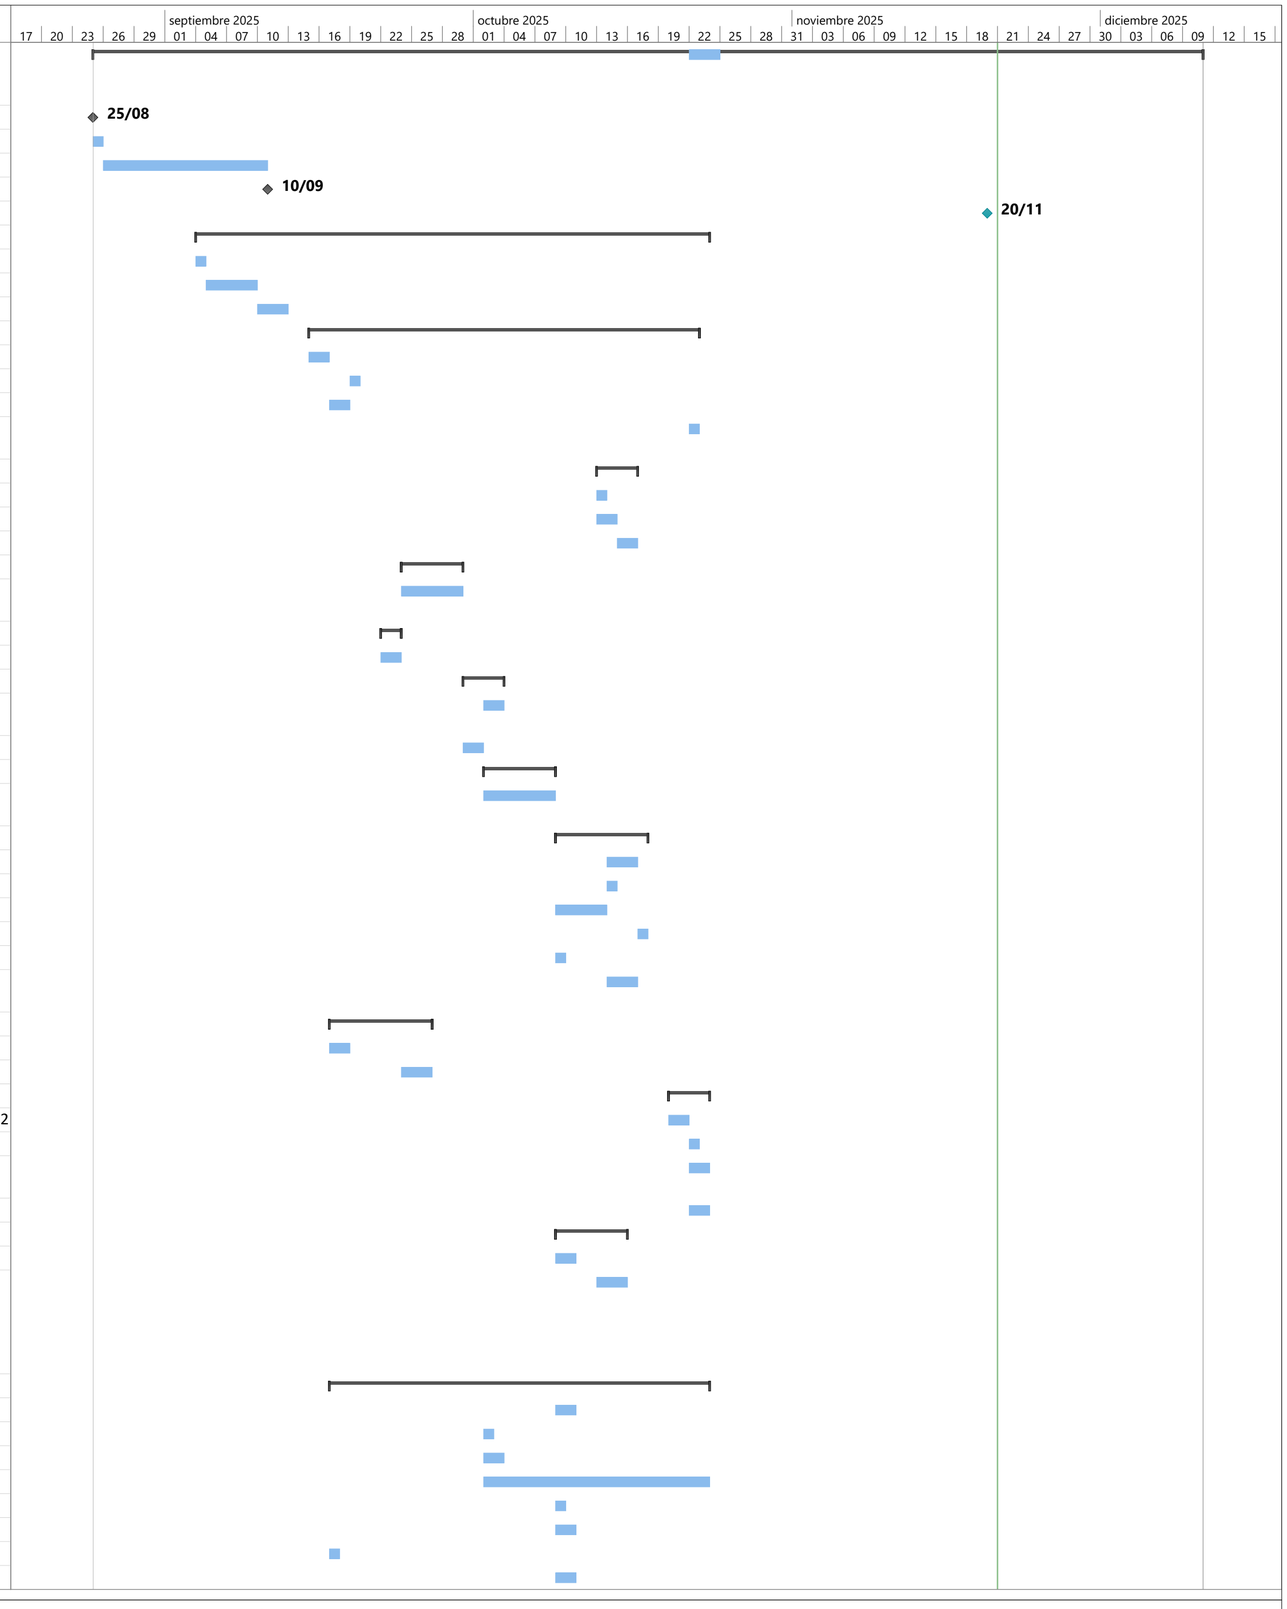

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
56	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$76,799.05	55
57	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$192,026.95	56
58	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	$498,626.55	57
59	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$0.00	12,13,14,15,17,18,19,2
60	**PURIFICACIÓN**	**53 días**	**mié 03/09/25**	**vie 14/11/25**	**$110,667,421.00**	
61	VISITA INICIAL	1 día	mié 03/09/25	mié 03/09/25	$0.00	2FC+7 días
62	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 04/09/25	lun 08/09/25	$0.00	61
63	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 09/09/25	jue 11/09/25	$0.00	62
64	**PRELIMINARES**	**6 días**	**jue 18/09/25**	**jue 25/09/25**	**$3,661,898.00**	
65	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	4 días	jue 18/09/25	mar 23/09/25	$3,412,847.00	88CC
66	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$84,979.00	65
67	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$164,072.00	66
68	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**mié 08/10/25**	**mié 08/10/25**	**$242,299.00**	
69	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	1 día	mié 08/10/25	mié 08/10/25	$242,299.00	82
70	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**11 días**	**vie 26/09/25**	**vie 10/10/25**	**$8,438,833.00**	
71	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	11 días	vie 26/09/25	vie 10/10/25	$8,438,833.00	67
72	**PINTURAS**	**15 días**	**lun 06/10/25**	**vie 24/10/25**	**$39,389,797.05**	
73	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	15 días	lun 06/10/25	vie 24/10/25	$39,389,797.05	75
74	**PISOS**	**3 días**	**mié 01/10/25**	**vie 03/10/25**	**$8,640,364.00**	
75	PISO GRES 30,5X30,5CM	3 días	mié 01/10/25	vie 03/10/25	$8,640,364.00	101
76	**RED ELÉCTRICA**	**9 días**	**lun 13/10/25**	**jue 23/10/25**	**$6,100,315.00**	
77	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	8 días	mar 14/10/25	jue 23/10/25	$5,782,730.00	78
78	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$317,585.00	71
79	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**vie 24/10/25**	**vie 24/10/25**	**$192,026.95**	
80	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$192,026.95	77
81	**URBANISMO**	**2 días**	**lun 06/10/25**	**mar 07/10/25**	**$556,248.00**	
82	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	2 días	lun 06/10/25	mar 07/10/25	$556,248.00	75
83	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**vie 07/11/25**	**mar 11/11/25**	**$2,483,013.00**	
84	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$1,538,463.00	65,66,67,69,73,75,77,7
85	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$287,988.00	84
86	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$656,562.00	85
87	**NO PREVISTOS**	**44 días**	**mar 16/09/25**	**vie 14/11/25**	**$40,962,627.00**	
88	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	jue 18/09/25	vie 19/09/25	$1,757,981.00	94
89	MANTEMIENTO PUERTA MADERA	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$2,374,961.00	102
90	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$1,769,772.00	89CC
91	CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$1,275,245.00	93
92	MUEBLE BAJO MESON DE COCINA	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$1,744,082.00	73
93	SANITARIO TIPO AHORRADOR	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$1,512,576.00	73
94	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mié 17/09/25	mié 17/09/25	$86,358.00	107
95	DESINSTALACION DE LAMPARAS	1 día	mié 17/09/25	mié 17/09/25	$645,820.00	94CC
96	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$1,673,917.00	73
97	DESMONTE PUERTA DE MADERA	5 días	mié 17/09/25	mar 23/09/25	$174,613.00	94CC
98	DEMOLICIÓN DE ALIST ADO DE PISO (E=3-6CM)	5 días	jue 18/09/25	mié 24/09/25	$2,193,932.00	88CC
99	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	5 días	vie 24/10/25	jue 30/10/25	$577,806.00	80CC
100	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	5 días	vie 31/10/25	jue 06/11/25	$2,356,213.00	99
101	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	3 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25	$5,723,443.00	67,98
102	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$9,638,672.00	73
103	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$2,101,268.00	73
104	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$498,627.00	85
105	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$747,211.00	73
106	REGATA SOBRE MURO+RESANE	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$2,379,934.00	73
107	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	1 día	mar 16/09/25	mar 16/09/25	$611,978.00	63FC+2 días
108	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	5 días	lun 10/11/25	vie 14/11/25	$1,118,218.00	84
109	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$0.00	65,66,67,69,71,73,75,7
110	**FRESNO**	**34 días**	**vie 05/09/25**	**mié 22/10/25**	**$56,995,925.00**	
111	VISITA INICIAL	1 día	vie 05/09/25	vie 05/09/25	$0.00	2FC+7 días,504
112	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	lun 08/09/25	mié 10/09/25	$0.00	111

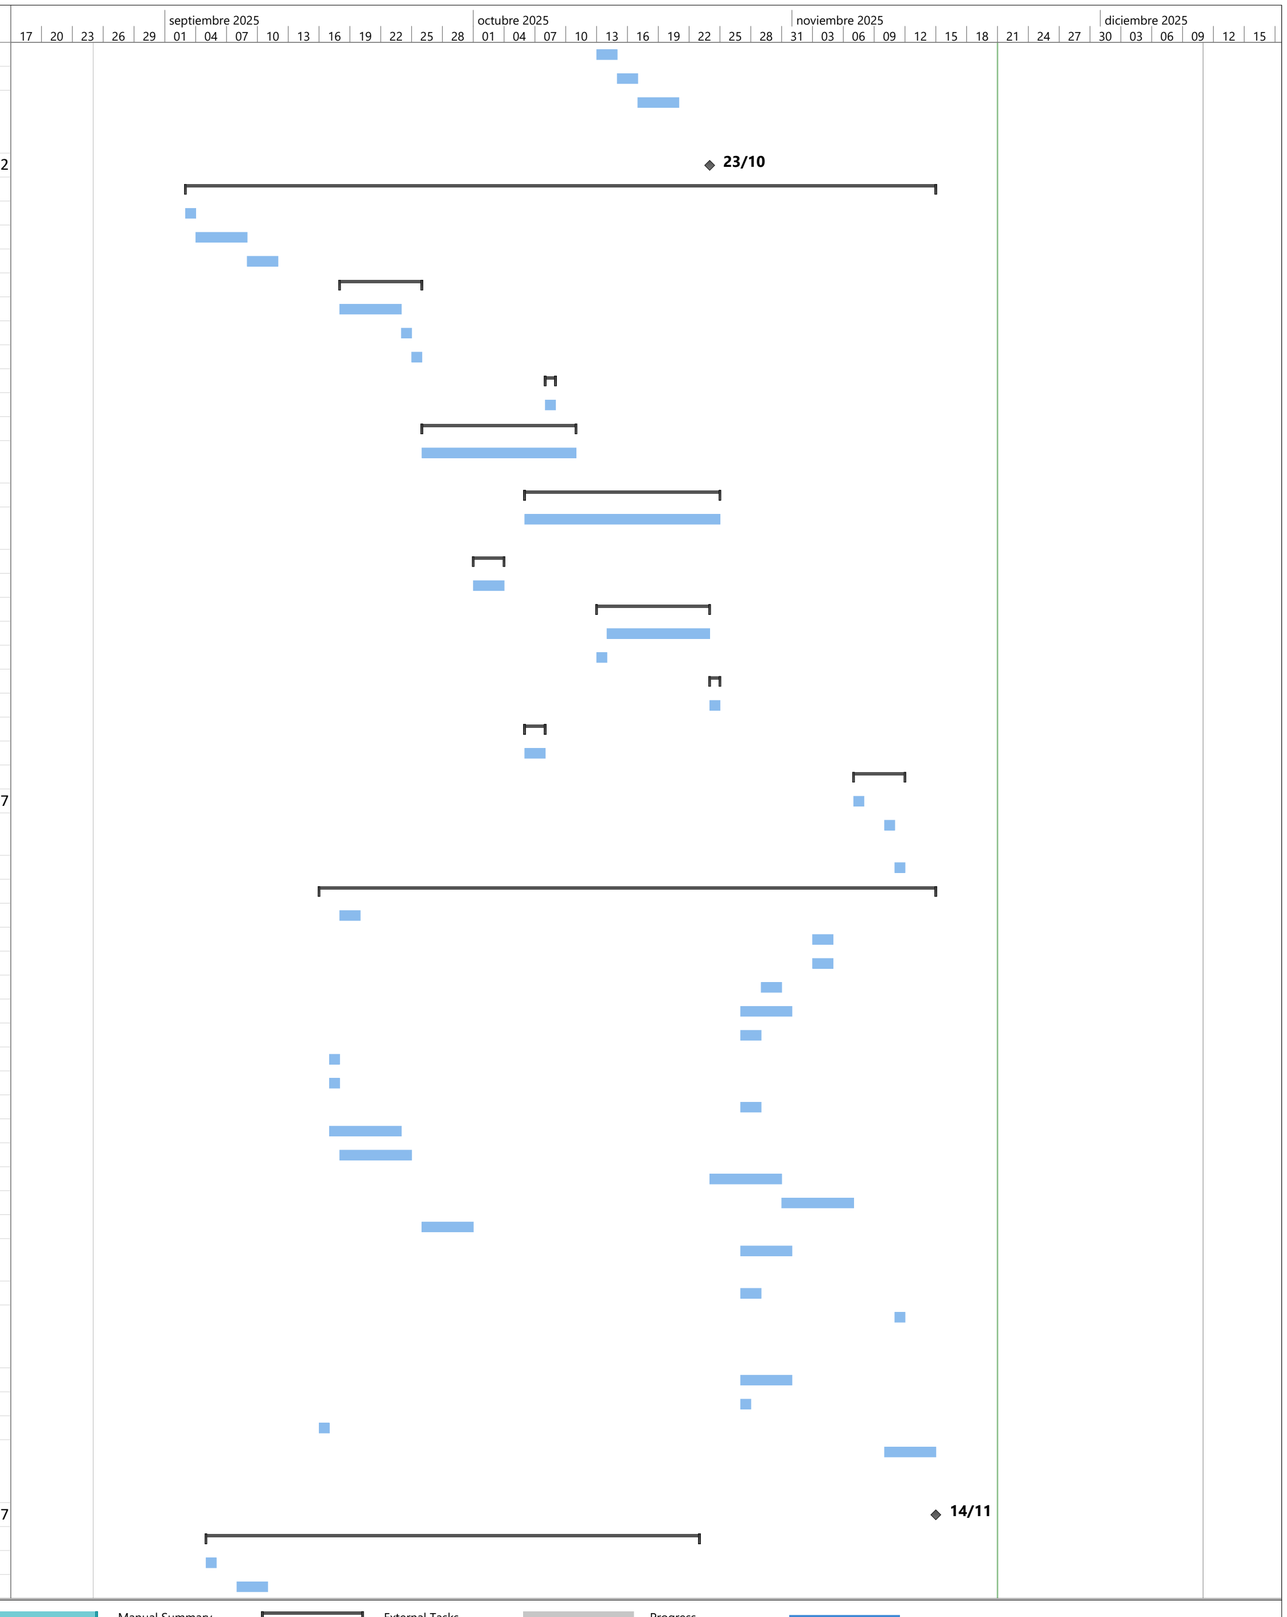

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
113	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25	$0.00	112
114	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	3 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25	$0.00	120FC-1 día
115	**PRELIMINARES**	**20 días**	**mié 17/09/25**	**mar 14/10/25**	**$6,143,031.78**	
116	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	2 días	jue 25/09/25	vie 26/09/25	$60,090.25	120
117	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25	$114,335.54	116FF
118	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mié 17/09/25	mié 17/09/25	$57,571.24	120CC
119	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	1 día	mié 17/09/25	mié 17/09/25	$101,996.75	113FC+1 día,5
120	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	6 días	mié 17/09/25	mié 24/09/25	$5,604,432.60	119CC
121	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$204,605.40	144CC
122	**CIELORRASOS**	**4 días**	**vie 03/10/25**	**mié 08/10/25**	**$5,951,707.24**	
123	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	4 días	vie 03/10/25	mié 08/10/25	$5,951,707.24	134,114
124	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**3 días**	**lun 29/09/25**	**mié 01/10/25**	**$242,553.65**	
125	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	3 días	lun 29/09/25	mié 01/10/25	$242,553.65	114
126	**CUBIERTAS**	**2 días**	**lun 29/09/25**	**mar 30/09/25**	**$486,354.05**	
127	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	$486,354.05	132
128	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**11 días**	**lun 29/09/25**	**lun 13/10/25**	**$9,011,601.08**	
129	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	5 días	mar 07/10/25	lun 13/10/25	$5,648,171.29	130,114
130	LAVADO FACHADA	6 días	lun 29/09/25	lun 06/10/25	$3,363,429.79	114
131	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**2 días**	**jue 25/09/25**	**vie 26/09/25**	**$719,245.99**	
132	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	2 días	jue 25/09/25	vie 26/09/25	$719,245.99	120
133	**PINTURAS**	**4 días**	**lun 29/09/25**	**jue 02/10/25**	**$25,347,623.65**	
134	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	4 días	lun 29/09/25	jue 02/10/25	$25,347,623.65	125CC,114
135	**PISOS**	**2 días**	**vie 03/10/25**	**lun 06/10/25**	**$1,249,418.74**	
136	PISO GRANITO MARMOL	2 días	vie 03/10/25	lun 06/10/25	$1,249,418.74	134,114
137	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**lun 29/09/25**	**lun 29/09/25**	**$192,026.95**	
138	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25	$192,026.95	114
139	**RED SANITARIA**	**7 días**	**lun 29/09/25**	**mar 07/10/25**	**$1,984,752.71**	
140	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25	$433,354.24	138CC,114
141	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	mar 30/09/25	mié 01/10/25	$1,047,206.14	140,114
142	SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	mar 07/10/25	mar 07/10/25	$504,192.33	136,114
143	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**7 días**	**mar 14/10/25**	**mié 22/10/25**	**$3,881,621.99**	
144	ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$978,022.74	116,117,118,119,120,1
145	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$997,254.38	144,114
146	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mar 21/10/25	mar 21/10/25	$236,101.89	114,145
147	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$575,973.77	114,146
148	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$1,094,269.21	144CC,114
149	**ADICIONALES**	**6 días**	**mar 07/10/25**	**mar 14/10/25**	**$560,445.43**	
150	MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	mar 07/10/25	mié 08/10/25	$502,628.15	129CC
151	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$57,817.28	144CC,114
152	**NO PREVISTOS**	**2 días**	**lun 29/09/25**	**mar 30/09/25**	**$1,225,541.74**	
153	ALISTADO DE PISO 4CM	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	$1,225,541.74	114
154	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$0.00	116,117,118,119,120,1
155	**CHOCONTA**	**77 días**	**mar 26/08/25**	**mié 10/12/25**	**$170,513,946.17**	
156	VISITA INICIAL	1 día	jue 04/09/25	jue 04/09/25	$0.00	2FC+8 días
157	APROBACIÓN PERSONAL	2 días	vie 05/09/25	lun 08/09/25	$0.00	156
158	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	2 días	mar 09/09/25	mié 10/09/25	$0.00	157
159	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$0.00	158FC+9 días
160	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25	$0.00	159
161	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	7 días	lun 06/10/25	mar 14/10/25	$0.00	165CC
162	**PRELIMINARES**	**41 días**	**lun 29/09/25**	**lun 24/11/25**	**$27,979,809.04**	
163	DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	mié 08/10/25	jue 09/10/25	$102,342.22	165
164	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$172,713.73	163
165	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	lun 06/10/25	mar 07/10/25	$284,160.57	166
166	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	1 día	vie 03/10/25	vie 03/10/25	$194,015.64	167
167	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	2 días	mié 01/10/25	jue 02/10/25	$4,967,299.03	173
168	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	$3,071,988.84	169CC,161,221
169	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	4 días	mié 15/10/25	lun 20/10/25	$7,667,585.51	161,164
170	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$187,526.91	198,161

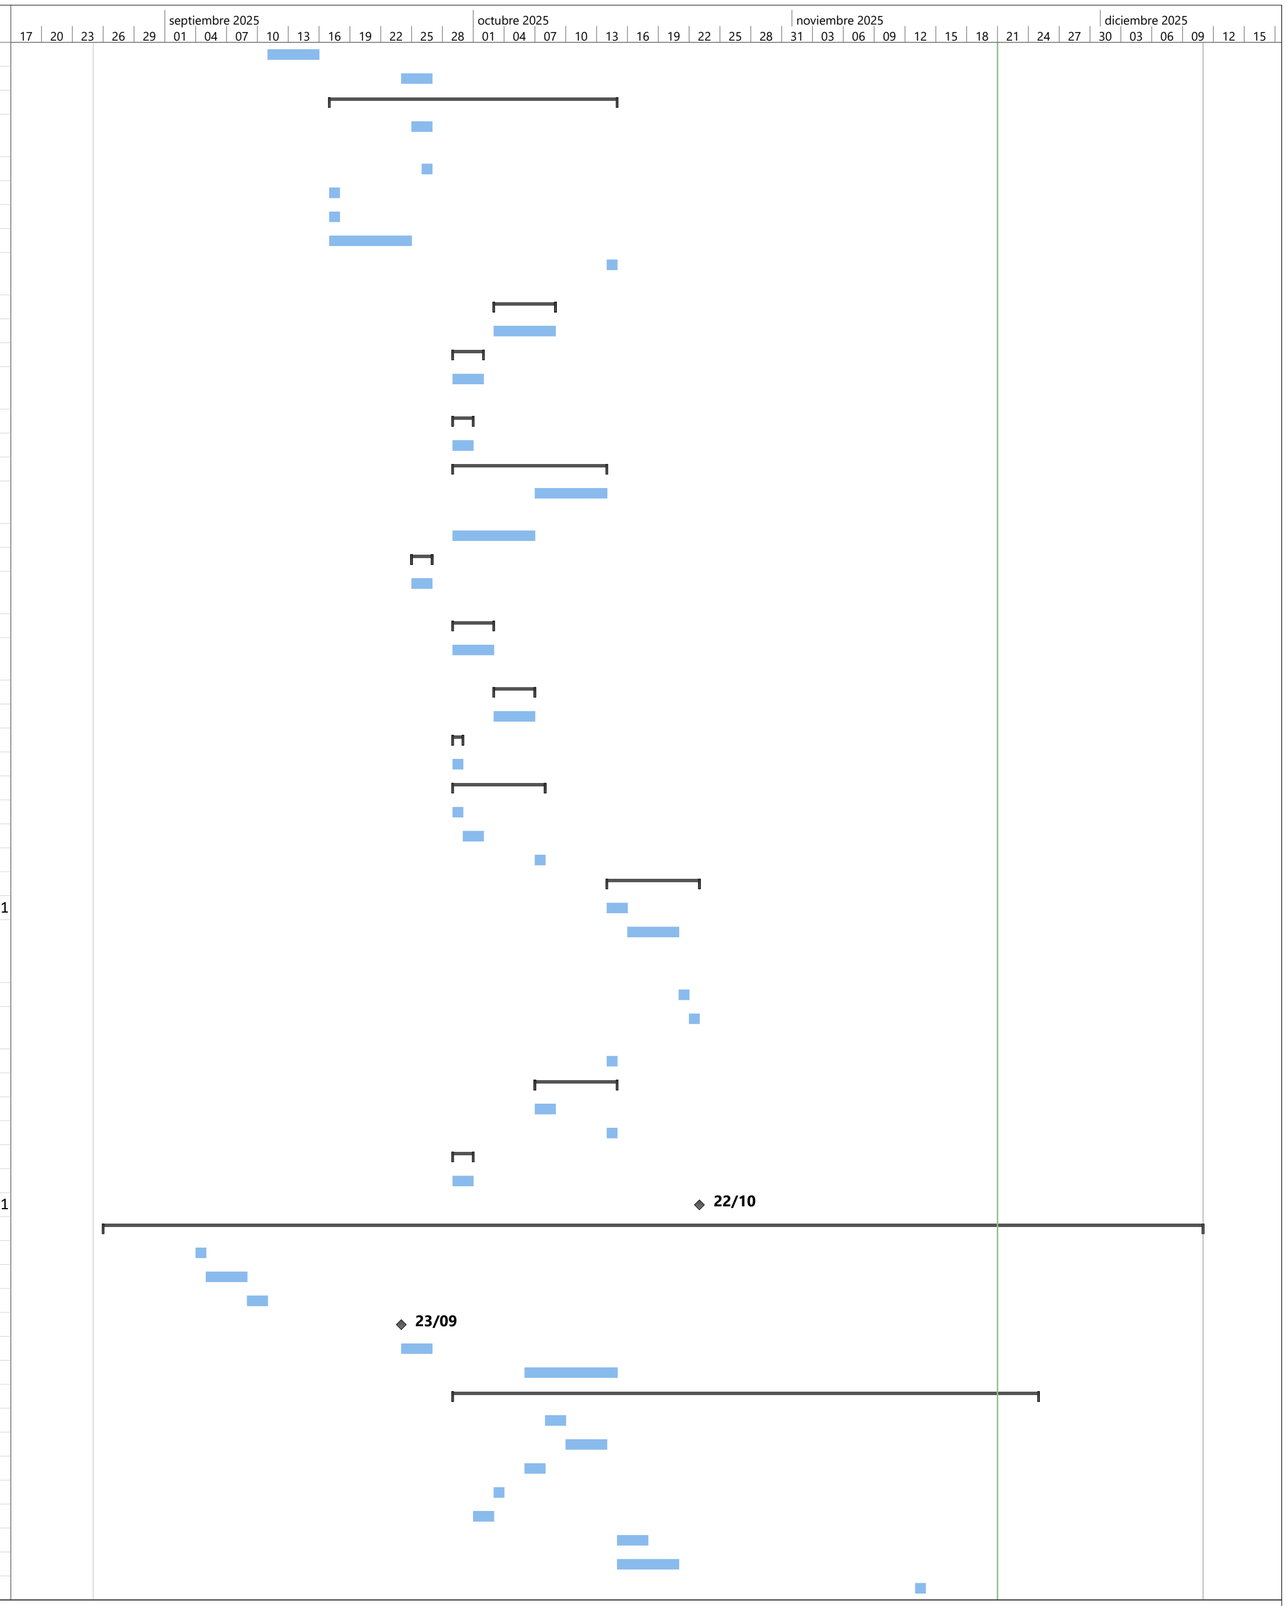

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
171	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$291,395.06	194CC,161
172	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	2 días	mar 04/11/25	mié 05/11/25	$6,561,459.38	189,161
173	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	$1,019,961.11	5,160
174	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	8 días	mié 15/10/25	vie 24/10/25	$594,886.70	168CC,161
175	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$2,864,474.34	208,161
176	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**10 días**	**mar 04/11/25**	**lun 17/11/25**	**$7,264,887.66**	
177	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	10 días	mar 04/11/25	lun 17/11/25	$2,025,612.60	189,161
178	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	8 días	mar 04/11/25	jue 13/11/25	$5,239,275.06	189,161
179	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**5 días**	**jue 13/11/25**	**mié 19/11/25**	**$955,954.68**	
180	ESPEJO BISELADO 5MM	5 días	jue 13/11/25	mié 19/11/25	$955,954.68	170CC,161
181	**ENCHAPE MUROS**	**9 días**	**lun 27/10/25**	**jue 06/11/25**	**$7,012,874.99**	
182	RESANE	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$2,684,963.38	174,161
183	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	5 días	vie 31/10/25	jue 06/11/25	$4,327,911.61	182,161
184	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**12 días**	**vie 24/10/25**	**lun 10/11/25**	**$21,588,762.37**	
185	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	12 días	vie 24/10/25	lun 10/11/25	$21,588,762.37	191,161
186	**PINTURAS**	**7 días**	**vie 31/10/25**	**lun 10/11/25**	**$15,262,896.22**	
187	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	7 días	vie 31/10/25	lun 10/11/25	$15,262,896.22	161,182
188	**PISOS**	**14 días**	**mié 15/10/25**	**lun 03/11/25**	**$41,606,085.13**	
189	PISO CERÁMICO DURO PISO	7 días	vie 24/10/25	lun 03/11/25	$21,320,211.72	161,191
190	ALISTADO DE PISO 4CM	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$8,252,257.23	169,161
191	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	3 días	mar 21/10/25	jue 23/10/25	$10,001,447.29	169,161
192	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25	$2,032,168.89	161
193	**RED ELÉCTRICA**	**13 días**	**lun 27/10/25**	**mié 12/11/25**	**$5,183,907.95**	
194	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	3 días	vie 07/11/25	mar 11/11/25	$2,144,593.51	161,216
195	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	3 días	vie 07/11/25	mar 11/11/25	$691,083.11	161,216
196	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC	7 días	lun 27/10/25	mar 04/11/25	$960,099.05	174,161
197	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	7 días	lun 27/10/25	mar 04/11/25	$317,584.55	196CC,161
198	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	6 días	mié 05/11/25	mié 12/11/25	$1,070,547.73	196,161
199	**RED HIDRÁULICA**	**24 días**	**mar 14/10/25**	**vie 14/11/25**	**$2,118,915.21**	
200	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$606,067.97	201CC
201	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$377,464.46	170,161
202	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$192,026.95	203CC
203	PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$943,355.83	164
204	**RED SANITARIA**	**3 días**	**mar 14/10/25**	**jue 16/10/25**	**$3,910,842.94**	
205	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$1,083,386.24	169CC,161
206	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$2,827,456.70	203CC
207	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**jue 20/11/25**	**lun 24/11/25**	**$2,862,294.45**	
208	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1,074,001.16	163,164,165,166,167,1
209	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$118,050.31	208,161
210	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$575,973.77	209,161
211	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1,094,269.21	210CC,161
212	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**3 días**	**mar 26/08/25**	**jue 28/08/25**	**$548,777.18**	
213	TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	3 días	mar 26/08/25	jue 28/08/25	$548,777.18	
214	**NO PREVISTOS**	**51 días**	**mié 01/10/25**	**mié 10/12/25**	**$34,217,938.35**	
215	DESMONTE DE MANTO EN VIGA CANAL	1 día	vie 03/10/25	vie 03/10/25	$84,477.17	167
216	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	5 días	vie 31/10/25	jue 06/11/25	$3,203,133.89	161,182
217	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$603,383.24	215
218	ALFAGÍA EN LADRILLO MACIZO PRENSADO.	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$682,581.47	217CC
219	TAPA REGISTRO 20X20CM	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$96,742.02	183
220	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	2 días	mar 04/11/25	mié 05/11/25	$583,505.28	189
221	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	10 días	mié 01/10/25	mar 14/10/25	$6,068,185.72	173
222	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION DE DIVISION OFICINA EXISTENTE	10 días	mar 04/11/25	lun 17/11/25	$437,832.61	189
223	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$4,503,999.74	234
224	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	3 días	mié 03/12/25	vie 05/12/25	$1,070,696.88	233



Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
225	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	lun 08/12/25	mar 09/12/25	$3,009,690.64	224
226	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	3 días	vie 28/11/25	mar 02/12/25	$1,179,713.95	223
227	ESTUCO EXTERIOR	2 días	vie 28/11/25	lun 01/12/25	$434,205.81	223
228	DESMONTE DE CUBIERTA	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$599,245.24	208
229	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	2 días	mié 26/11/25	jue 27/11/25	$1,974,352.89	228
230	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	1 día	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$510,516.61	233
231	CIRCUITOS ELÉCTRICOS RED DE ILUMINACIÓN 3 NO.12 + 1 NO.10	2 días	jue 04/12/25	vie 05/12/25	$297,756.31	230
232	SISTEMA DE BARRERA IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$2,029,066.03	223CC
233	SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.	3 días	vie 28/11/25	mar 02/12/25	$2,273,772.81	223
234	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 4"X2" 2MM	3 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$1,678,360.90	6
235	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$993,176.29	208
236	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$455,957.72	208
237	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$141,371.50	231
238	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$431,911.17	224CC
239	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	2 días	lun 08/12/25	mar 09/12/25	$655,726.53	231
240	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$218,575.93	239
241	FIN ACTIVIDADES FRENTE	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$0.00	163,164,165,166,167,1
242	**CHINACOTA**	**44 días**	**mié 10/09/25**	**mar 11/11/25**	**$26,177,822.00**	
243	VISITA INICIAL	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	$0.00	2FC+10 días,818
244	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25	$0.00	243
245	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 16/09/25	jue 18/09/25	$0.00	244
246	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$0.00	245FC+4 días
247	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	jue 25/09/25	lun 29/09/25	$0.00	246
248	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	5 días	lun 06/10/25	vie 10/10/25	$0.00	270FC-1 día
249	**PRELIMINARES**	**6 días**	**mar 30/09/25**	**mar 07/10/25**	**$109,665.94**	
250	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	lun 06/10/25	mar 07/10/25	$33,169.02	248CC
251	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	mar 30/09/25	mié 01/10/25	$76,496.92	5,247
252	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**vie 07/11/25**	**vie 07/11/25**	**$895,531.71**	
253	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$895,531.71	272
254	**ENCHAPE MUROS**	**1 día**	**lun 13/10/25**	**lun 13/10/25**	**$104,065.75**	
255	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$104,065.75	263,248
256	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**2 días**	**mar 14/10/25**	**mié 15/10/25**	**$1,230,564.45**	
257	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$1,118,731.34	255,248
258	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$111,833.11	257CC,248
259	**PINTURAS**	**11 días**	**mar 14/10/25**	**mar 28/10/25**	**$12,141,032.26**	
260	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$154,100.37	261,248
261	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	10 días	mar 14/10/25	lun 27/10/25	$11,986,931.89	258CC,248
262	**PISOS**	**3 días**	**mié 08/10/25**	**vie 10/10/25**	**$67,169.21**	
263	ALISTADO DE PISO 2CM	3 días	mié 08/10/25	vie 10/10/25	$67,169.21	250
264	**RED ELÉCTRICA**	**2 días**	**vie 31/10/25**	**lun 03/11/25**	**$2,697,999.48**	
265	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	vie 31/10/25	lun 03/11/25	$2,544,401.38	277,248,281,282
266	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$153,598.10	265CC,248
267	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**jue 02/10/25**	**jue 02/10/25**	**$1,461,652.55**	
268	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	1 día	jue 02/10/25	jue 02/10/25	$1,461,652.55	251
269	**RED SANITARIA**	**2 días**	**vie 03/10/25**	**lun 06/10/25**	**$902,822.29**	
270	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	vie 03/10/25	lun 06/10/25	$902,822.29	268
271	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**6 días**	**mar 04/11/25**	**mar 11/11/25**	**$2,535,558.09**	
272	ASEO GENERAL DE OBRA	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25	$549,451.55	250,251,255,257,258,2
273	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$488,655.06	272,248
274	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$403,182.27	273,248
275	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$1,094,269.21	274,248
276	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**9 días**	**mié 29/10/25**	**lun 10/11/25**	**$1,178,639.30**	
277	MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$785,357.12	258,260,261,248
278	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$335,464.90	248,272
279	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$57,817.28	248,278
280	**NPS**	**2 días**	**mié 29/10/25**	**jue 30/10/25**	**$2,853,120.97**	
281	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$1,365,194.80	258,260,261,248

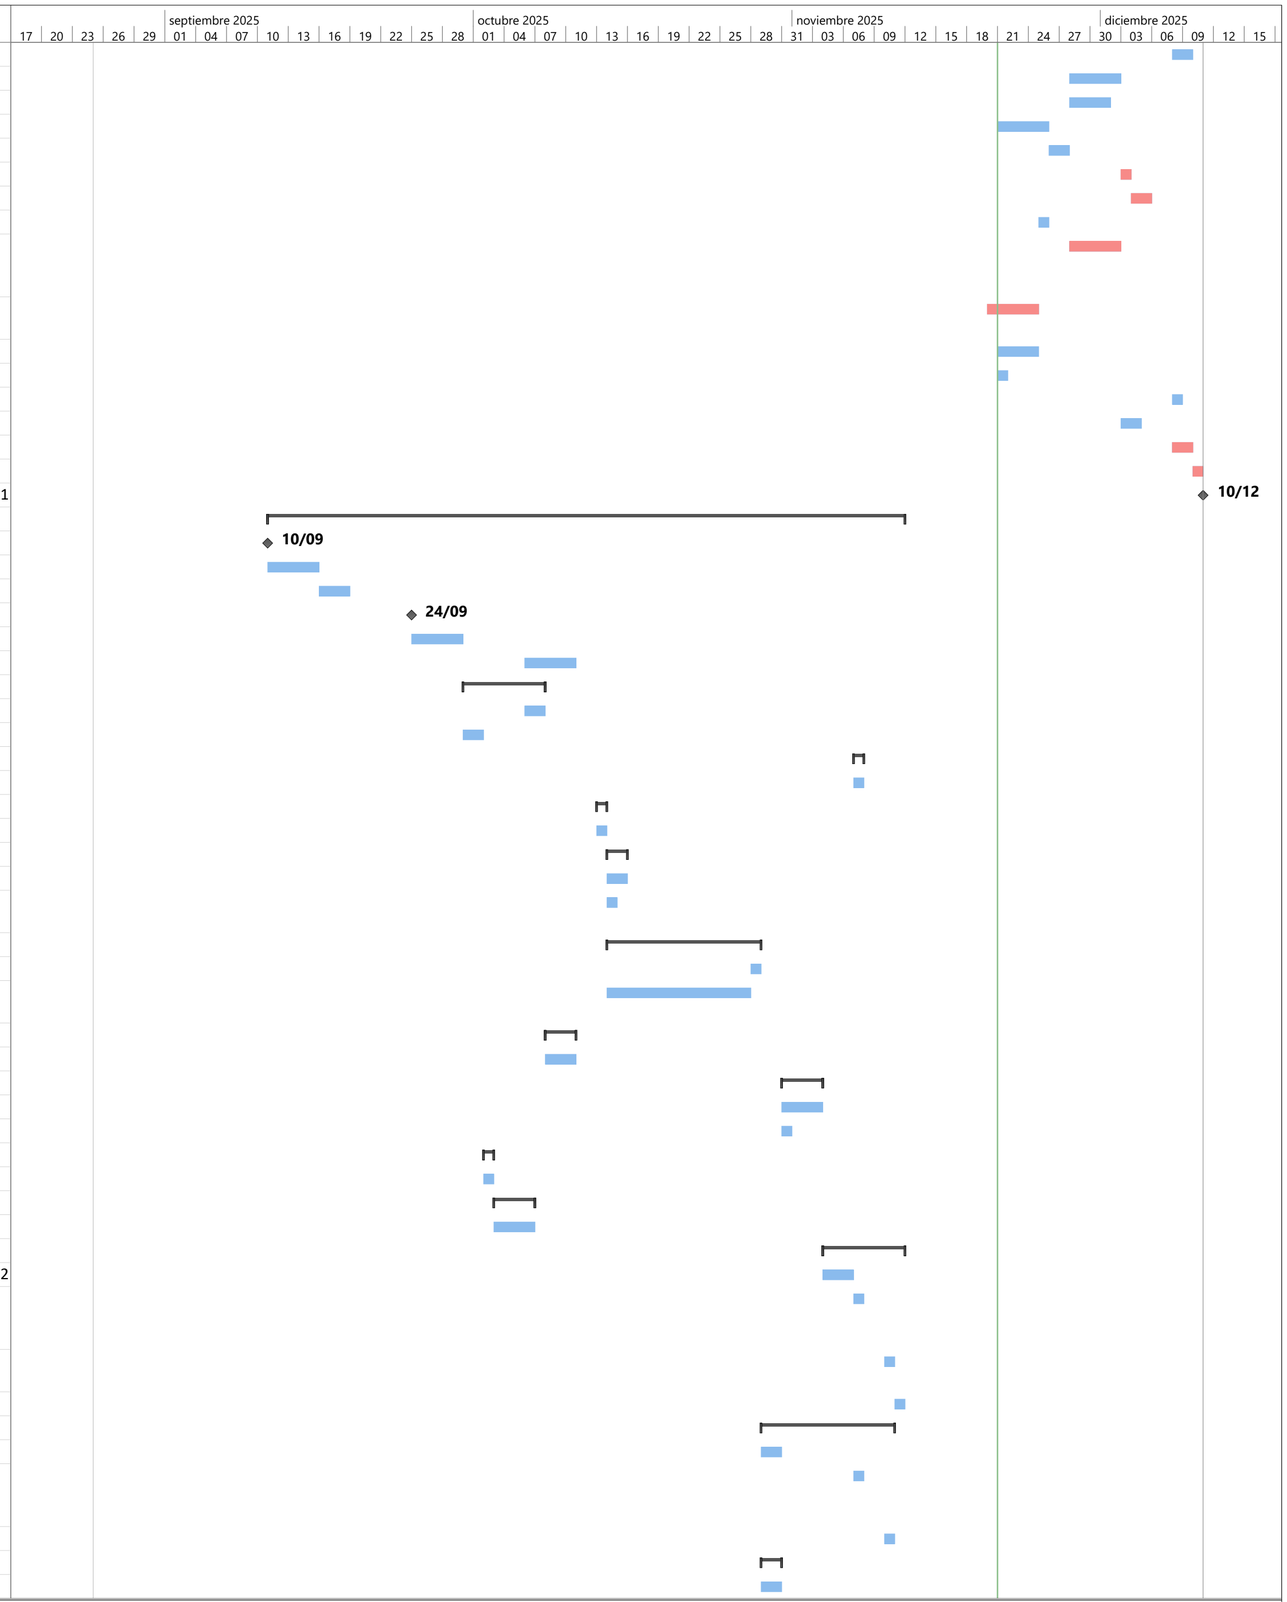

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
282	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$1,487,926.17	258,260,261,248
283	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$0.00	250,251,253,255,257,2
284	**EL COCUY**	**62 días**	**mar 02/09/25**	**mié 26/11/25**	**$177,300,227.00**	
285	VISITA INICIAL	1 día	mar 02/09/25	mar 02/09/25	$0.00	2FC+6 días
286	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 04/09/25	lun 08/09/25	$0.00	285FC+1 día
287	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 09/09/25	jue 11/09/25	$0.00	286
288	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$0.00	287FC+9 días
289	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	jue 25/09/25	lun 29/09/25	$0.00	288
290	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	5 días	vie 03/10/25	jue 09/10/25	$0.00	293
291	**PRELIMINARES**	**41 días**	**mar 30/09/25**	**mar 25/11/25**	**$9,856,120.38**	
292	DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	lun 06/10/25	mar 07/10/25	$457,126.98	294
293	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	jue 02/10/25	jue 02/10/25	$115,142.49	299
294	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	vie 03/10/25	vie 03/10/25	$361,659.49	290CC
295	DESMONTE DE CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRO Y ONDULADA	6 días	mar 14/10/25	mar 21/10/25	$1,016,919.44	300CC+1 día
296	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	2 días	mié 08/10/25	jue 09/10/25	$135,810.83	292
297	DESMONTE DE VIDRIO	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$5,182.06	296,290
298	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$349,263.33	5,289
299	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	1 día	mié 01/10/25	mié 01/10/25	$496,729.65	298
300	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$343,399.25	290,297
301	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$215,601.83	295,290
302	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$269,066.94	301,290
303	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$698,334.17	302FF,290
304	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$125,018.36	355,290
305	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$407,953.85	344,345CC,290
306	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$656,145.94	344,345,290
307	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$1,191,824.55	5,289
308	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$862,585.78	301CC,290
309	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$2,148,355.44	360,290
310	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**vie 14/11/25**	**mar 18/11/25**	**$6,098,699.33**	
311	PASAMANOS EN VARA 8CM CONTRAPARED	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$286,159.46	344,345,290
312	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$719,791.60	344,345,290
313	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$1,350,408.40	312,290
314	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$3,742,339.87	313CC,290
315	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**mar 25/11/25**	**mar 25/11/25**	**$371,244.71**	
316	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$371,244.71	290,360
317	**CIELORRASOS**	**4 días**	**mié 05/11/25**	**lun 10/11/25**	**$12,229,119.51**	
318	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	3 días	jue 06/11/25	lun 10/11/25	$6,583,180.70	339FF,290
319	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	4 días	mié 05/11/25	lun 10/11/25	$5,645,938.81	318FF,290
320	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**4 días**	**lun 03/11/25**	**jue 06/11/25**	**$2,677,711.04**	
321	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	4 días	lun 03/11/25	jue 06/11/25	$2,677,711.04	350,290
322	**CUBIERTAS**	**13 días**	**vie 24/10/25**	**mar 11/11/25**	**$42,415,107.65**	
323	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.8	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$2,176,453.31	369
324	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$7,281,666.57	327CC,290
325	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	3 días	lun 03/11/25	mié 05/11/25	$1,123,908.31	326CC,290
326	LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$889,891.99	323,324,290
327	TEJA DE BARRO NATURAL	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$26,809,693.06	290,308
328	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	2 días	jue 06/11/25	vie 07/11/25	$2,613,635.77	290,325,326
329	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$1,519,858.64	328,290
330	**ENCHAPE MUROS**	**4 días**	**mar 04/11/25**	**vie 07/11/25**	**$9,080,366.04**	
331	ESTUCO EXTERIOR	2 días	jue 06/11/25	vie 07/11/25	$668,155.83	333FF,290
332	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	4 días	mar 04/11/25	vie 07/11/25	$1,827,436.01	333FF,290
333	RESANE	4 días	mar 04/11/25	vie 07/11/25	$1,174,885.01	321FF+1 día,290
334	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	2 días	jue 06/11/25	vie 07/11/25	$5,409,889.19	333FF,290
335	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**5 días**	**mar 04/11/25**	**lun 10/11/25**	**$4,154,200.99**	
336	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	5 días	mar 04/11/25	lun 10/11/25	$4,154,200.99	339CC,290
337	**PINTURAS**	**5 días**	**mar 04/11/25**	**lun 10/11/25**	**$23,060,590.37**	
338	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25	$626,652.17	339CC,290
339	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	5 días	mar 04/11/25	lun 10/11/25	$22,433,938.20	331FF+1 día,332FF+1 día,290
340	**PISOS**	**15 días**	**vie 10/10/25**	**jue 30/10/25**	**$11,822,639.33**	
341	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	12 días	vie 10/10/25	lun 27/10/25	$11,153,104.17	290
342	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$669,535.16	302,290

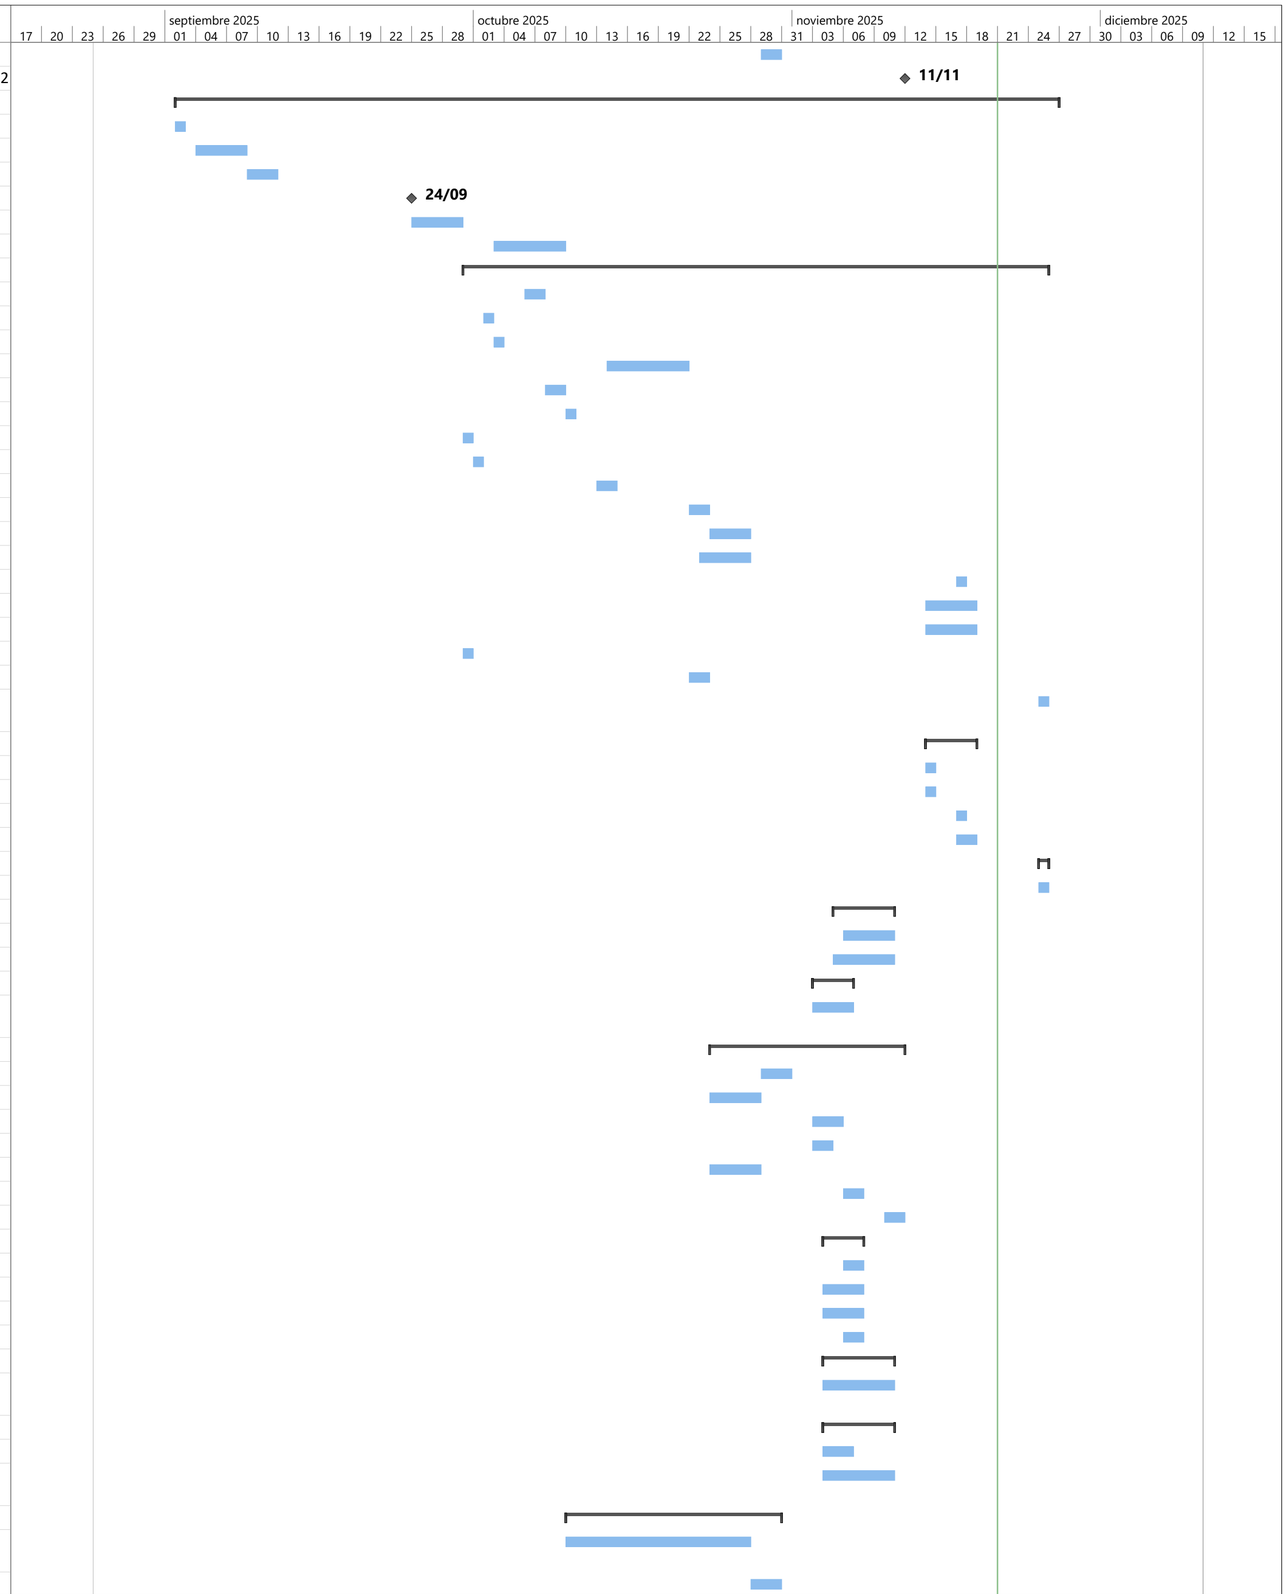

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
343	**RED ELÉCTRICA**	**13 días**	**mar 28/10/25**	**jue 13/11/25**	**$10,204,499.99**	
344	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$3,002,430.65	318,319,290
345	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$691,083.11	318,319,290
346	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$655,263.78	349,290
347	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$1,916,939.72	349,290
348	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$589,272.48	349,290
349	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$317,584.55	303,290
350	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$1,313,936.37	346,347,348,290
351	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$713,698.06	318,319,290
352	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$1,004,291.27	318,319,290
353	**RED HIDRÁULICA**	**2 días**	**vie 14/11/25**	**lun 17/11/25**	**$1,368,437.89**	
354	CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$425,082.06	290,355
355	PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$943,355.83	344,345,290
356	**RED SANITARIA**	**3 días**	**vie 14/11/25**	**mar 18/11/25**	**$2,267,808.03**	
357	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1,011,161.17	355CC,290
358	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$1,256,646.86	357CC+1 día,290
359	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**lun 24/11/25**	**mié 26/11/25**	**$4,444,353.12**	
360	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1,098,901.83	292,293,294,295,296,2
361	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	$283,321.75	360,290
362	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$979,156.04	360,290
363	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$1,094,269.21	360,290
364	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$988,704.29	360,290
365	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**2 días**	**vie 10/10/25**	**lun 13/10/25**	**$1,110,181.26**	
366	MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$1,110,181.26	341CC,290
367	**NO PREVISTOS**	**29 días**	**mar 14/10/25**	**vie 21/11/25**	**$36,139,147.36**	
368	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$164,257.98	346
369	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$3,072,313.91	327CC,290
370	PISO CERÁMICO DURO PISO	2 días	vie 31/10/25	lun 03/11/25	$1,427,255.89	342
371	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT (ORIP CHINACOTA- NORTE DE SANTANDER)	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$1,461,652.55	368
372	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25	$1,506,029.61	338CC
373	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	2 días	mar 04/11/25	mié 05/11/25	$400,062.84	372CC
374	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$3,660,908.20	323CC
375	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$998,151.83	354
376	SANITARIO TIPO AHORRADOR	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$1,008,384.65	375
377	DESMONTE DE CUBIERTA	6 días	mar 14/10/25	mar 21/10/25	$1,812,912.21	295CC
378	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	4 días	mié 22/10/25	lun 27/10/25	$5,044,101.90	295,377
379	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	3 días	vie 07/11/25	mar 11/11/25	$4,117,094.11	387
380	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$953,021.36	386
381	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1,070,696.88	380
382	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$2,106,782.94	381
383	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$222,841.42	385
384	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$372,593.45	383
385	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$1,986,353.85	388
386	PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$3,638,748.35	379
387	PLATINA DE ANCLAJE DE PEDESTAL 20X20 EN E=3/8" CON PERFOMRACIONES Y PEDESTALES	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25	$637,125.92	370
388	CIRCUITOS ELECTRICOS RED ILUMINACIÓN 3 No. 12 + 1 No. 10	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$477,857.51	386
389	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$0.00	292,293,294,295,296,2
390	**SALAZAR DE LAS PALMAS**	**77 días**	**mar 26/08/25**	**mié 10/12/25**	**$231,697,402.00**	
391	VISITA INICIAL	2 días	lun 08/09/25	mar 09/09/25	$0.00	2FC+10 días
392	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	lun 15/09/25	mié 17/09/25	$0.00	391FC+3 días
393	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	jue 18/09/25	lun 22/09/25	$0.00	392
394	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	3 días	mar 23/09/25	jue 25/09/25	$0.00	393
395	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	5 días	vie 26/09/25	jue 02/10/25	$0.00	394
396	DEFINICIÓN FINAL ALCANCE DE OBRA	30 días	vie 03/10/25	jue 13/11/25	$0.00	395
397	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	5 días	lun 06/10/25	vie 10/10/25	$0.00	400
398	**PRELIMINARES**	**37 días**	**vie 03/10/25**	**lun 24/11/25**	**$28,387,175.72**	
399	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$63,519.46	401

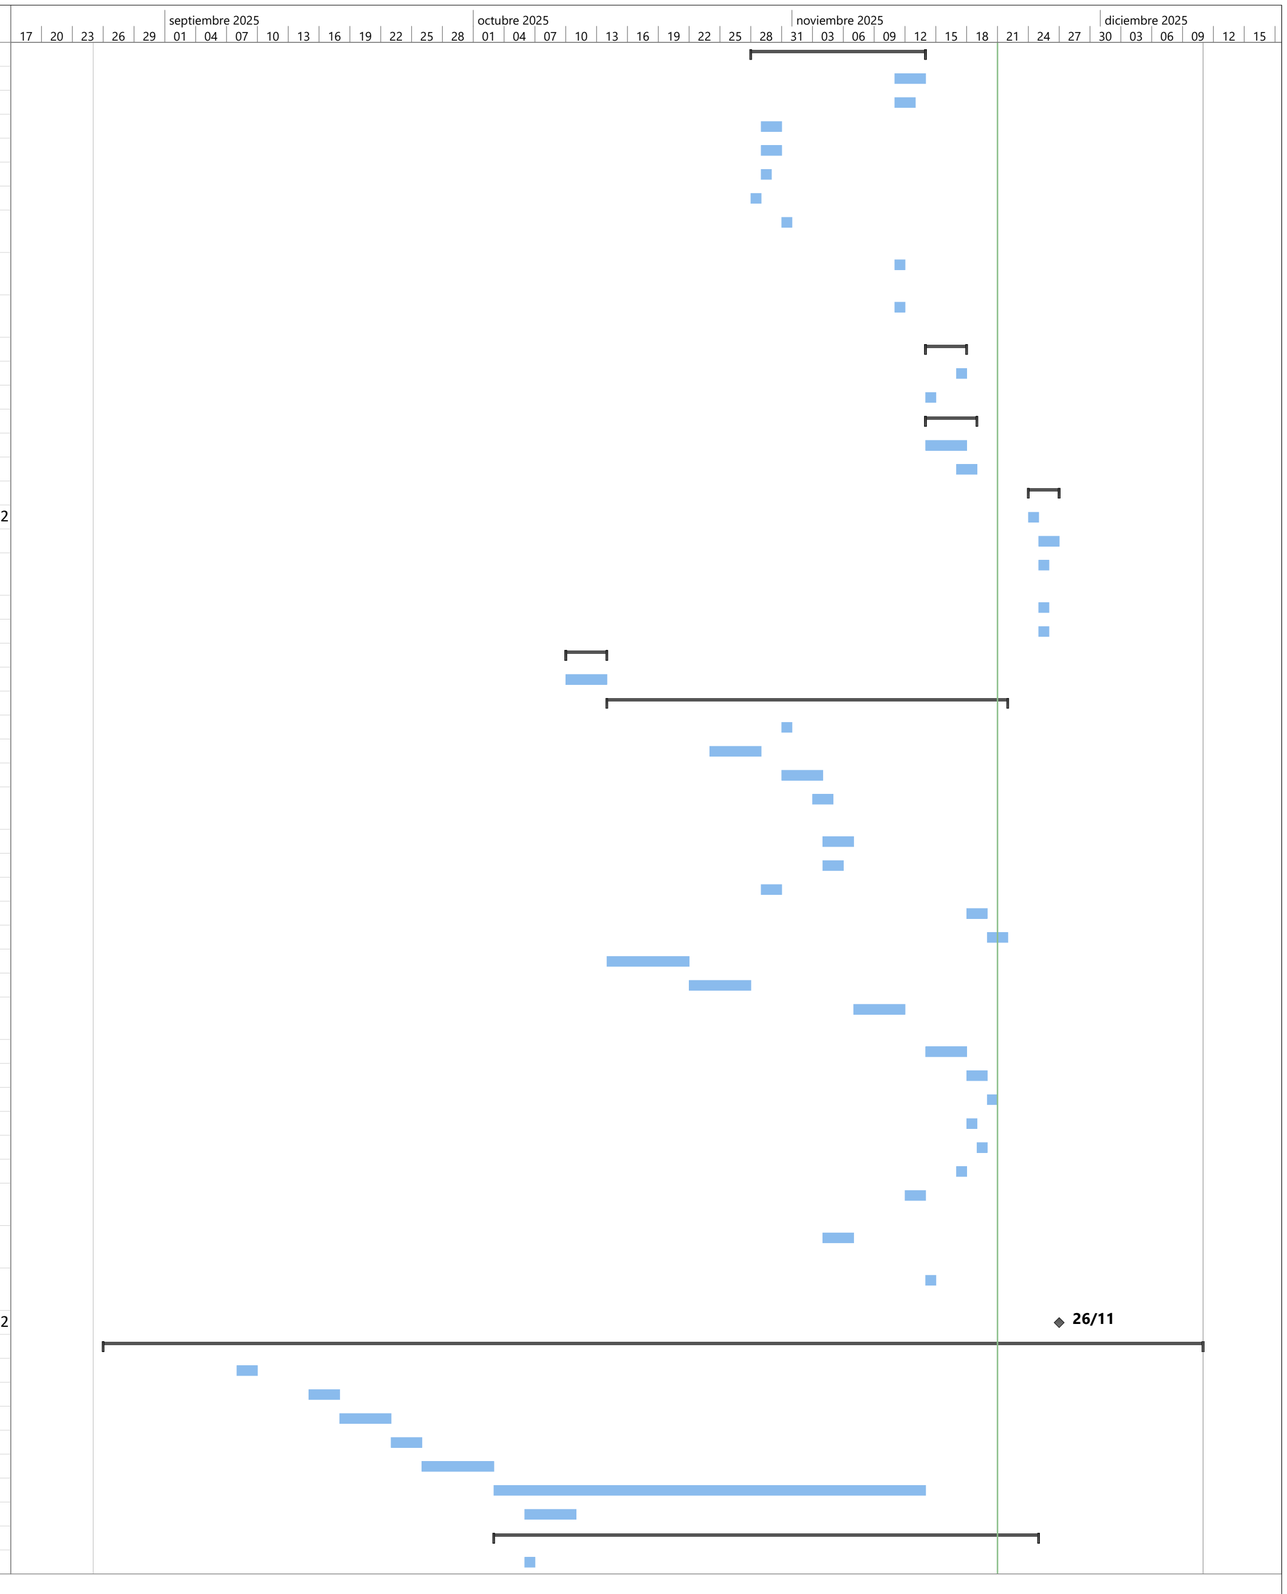

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
400	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	vie 03/10/25	vie 03/10/25	$19,055.73	395
401	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	vie 03/10/25	vie 03/10/25	$1,591,186.75	400CC
402	DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	vie 03/10/25	mié 08/10/25	$201,499.99	400CC
403	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$1,007,478.27	400
404	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$318,762.47	401
405	DESMONTE DE CUBIERTA	1 día	jue 09/10/25	jue 09/10/25	$3,219,891.14	402,400
406	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$2,919,493.44	403FC-1 día
407	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	1 día	mar 07/10/25	mar 07/10/25	$49,844.68	404
408	DESMONTE VENTANA EN MADERA	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$279,410.67	405
409	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	2 días	lun 06/10/25	mar 07/10/25	$2,124,305.06	400
410	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$72,951.71	416CC
411	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$2,651,098.32	397CC
412	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	8 días	mar 07/10/25	jue 16/10/25	$100,324.21	406
413	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$705,722.91	416CC
414	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	3 días	lun 13/10/25	mié 15/10/25	$218,781.18	397
415	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	37 días	vie 03/10/25	lun 24/11/25	$849,372.47	5,400CC
416	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	4 días	lun 13/10/25	jue 16/10/25	$1,861,898.95	397,406FC+3 días
417	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	$2,899,151.45	416,397
418	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$123,215.79	416CC
419	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$5,012,829.78	415FF,397
420	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$888,353.31	397
421	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$875,086.47	420FF,397
422	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	vie 03/10/25	lun 06/10/25	$333,941.51	400CC
423	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**5 días**	**vie 31/10/25**	**jue 06/11/25**	**$2,555,581.38**	
424	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	2 días	vie 31/10/25	lun 03/11/25	$679,594.61	452FC-3 días,397
425	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25	$1,875,986.77	424,397
426	**CIELORRASOS**	**3 días**	**mar 02/12/25**	**jue 04/12/25**	**$15,441,694.57**	
427	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	3 días	mar 02/12/25	jue 04/12/25	$15,441,694.57	434CC
428	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**6 días**	**mié 22/10/25**	**mié 29/10/25**	**$1,172,340.51**	
429	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	6 días	mié 22/10/25	mié 29/10/25	$1,172,340.51	397,447
430	**CUBIERTAS**	**9 días**	**vie 28/11/25**	**mié 10/12/25**	**$31,017,810.44**	
431	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	2 días	mar 02/12/25	mié 03/12/25	$763,709.74	397,432CC+2 días
432	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	9 días	vie 28/11/25	mié 10/12/25	$23,553,841.09	498CC+3 días
433	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	4 días	mar 02/12/25	vie 05/12/25	$3,591,135.85	434CC,397
434	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	4 días	mar 02/12/25	vie 05/12/25	$3,109,123.76	431CC,397
435	**ENCHAPE MUROS**	**10 días**	**jue 20/11/25**	**mié 03/12/25**	**$2,380,240.29**	
436	ESTUCO EXTERIOR	3 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$618,481.97	6
437	RESANE	5 días	jue 20/11/25	mié 26/11/25	$499,090.58	436CC,397
438	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	5 días	jue 27/11/25	mié 03/12/25	$1,262,667.74	437,397
439	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**4 días**	**lun 13/10/25**	**jue 16/10/25**	**$4,340,484.96**	
440	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$783,475.51	397
441	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	4 días	lun 13/10/25	jue 16/10/25	$3,557,009.45	397
442	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**3 días**	**lun 08/12/25**	**mié 10/12/25**	**$2,775,738.07**	
443	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	3 días	lun 08/12/25	mié 10/12/25	$2,775,738.07	445CC
444	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**3 días**	**lun 08/12/25**	**mié 10/12/25**	**$874,132.92**	
445	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	3 días	lun 08/12/25	mié 10/12/25	$874,132.92	397,433
446	**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mar 14/10/25**	**mar 21/10/25**	**$880,123.20**	
447	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	6 días	mar 14/10/25	mar 21/10/25	$323,759.68	440,397
448	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$556,363.52	447FF
449	**PINTURAS**	**16 días**	**jue 16/10/25**	**jue 06/11/25**	**$26,136,203.47**	
450	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$10,413,752.04	452FC-5 días,397
451	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	4 días	lun 03/11/25	jue 06/11/25	$1,690,564.56	397,450
452	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	14 días	jue 16/10/25	mar 04/11/25	$14,031,886.87	397,447CC+2 días
453	**PISOS**	**12 días**	**mar 25/11/25**	**mié 10/12/25**	**$9,061,328.18**	
454	PISO CERÁMICO DURO PISO	2 días	vie 05/12/25	lun 08/12/25	$725,138.11	456FC+4 días,455,397
455	POYO COCINA 55X10CM	2 días	lun 01/12/25	mar 02/12/25	$242,403.22	456,397
456	ALISTADO DE PISO 4CM	4 días	mar 25/11/25	vie 28/11/25	$5,706,500.74	499FF

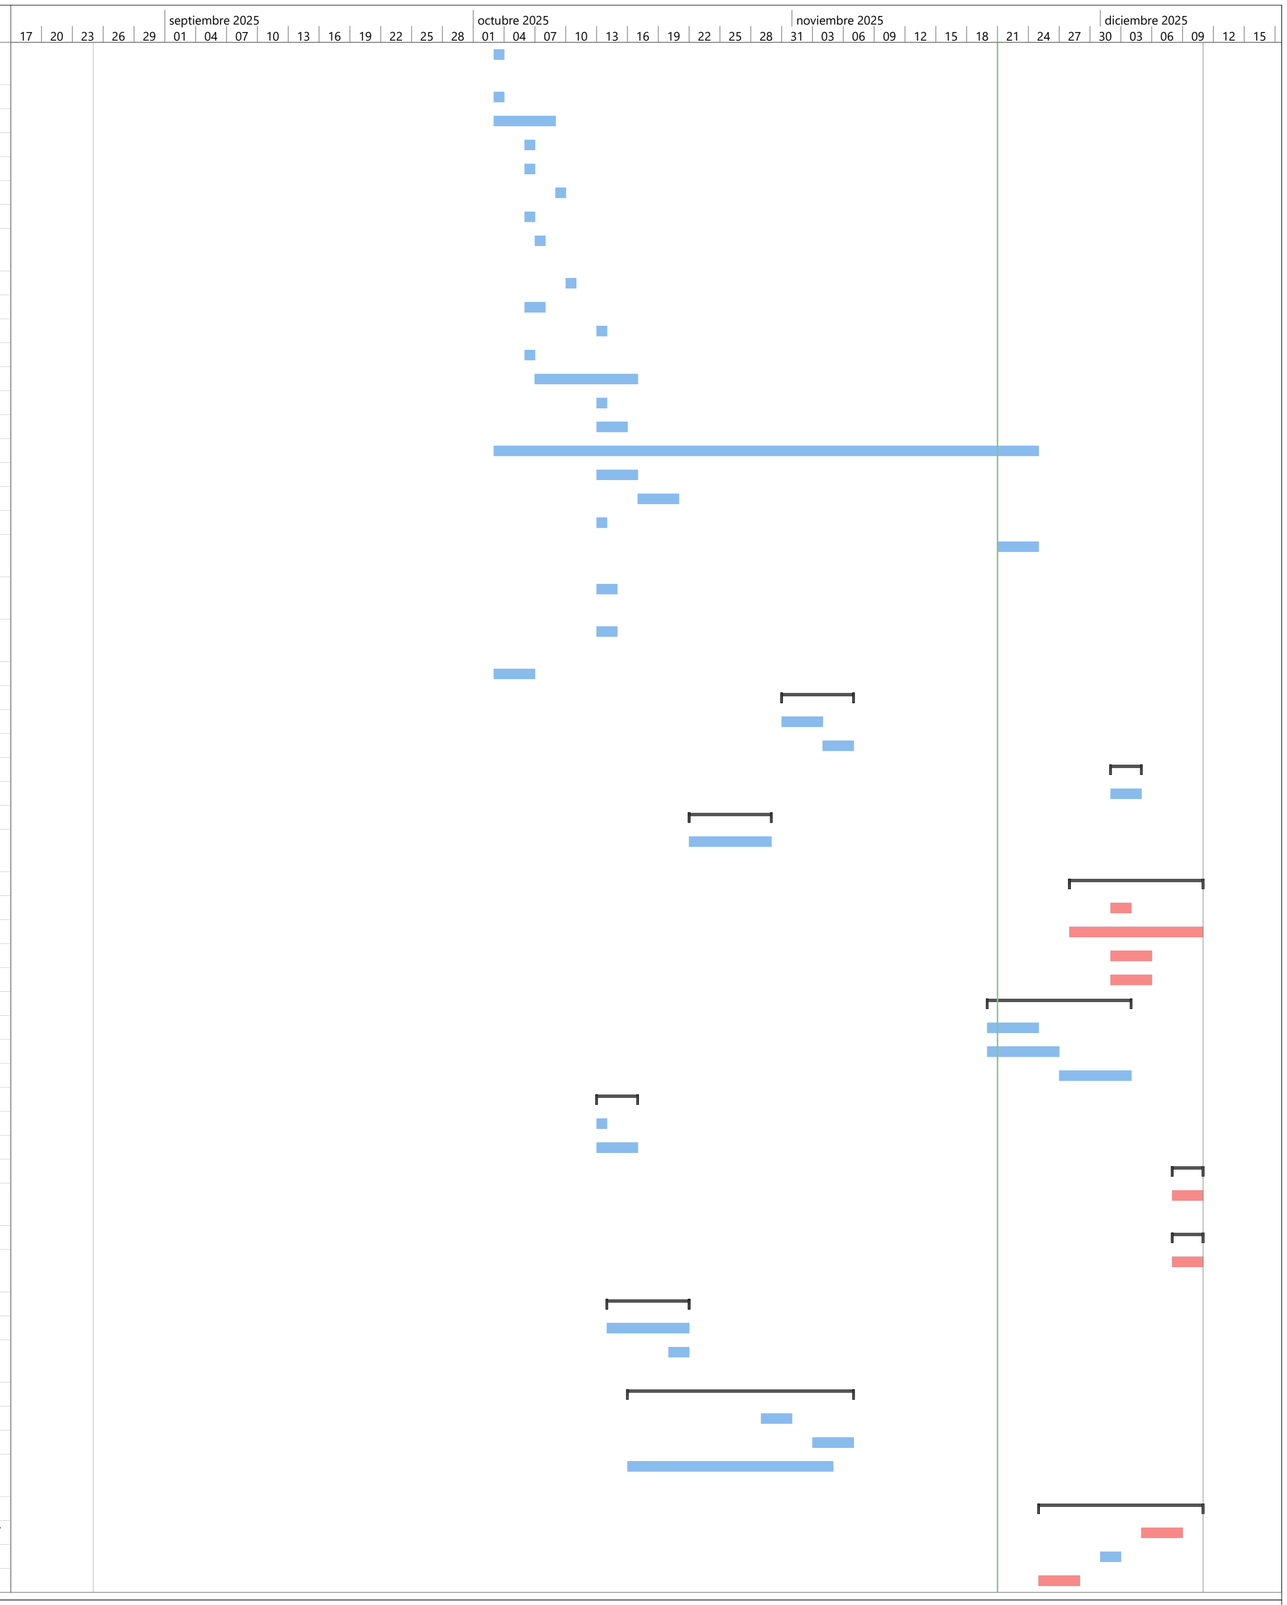

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
457	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing	4 días	vie 05/12/25	mié 10/12/25	$2,387,286.11	454FF+2 días,397
458	**RED ELÉCTRICA**	**10 días**	**mar 25/11/25**	**lun 08/12/25**	**$12,049,153.44**	
459	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$879,659.17	397,456CC
460	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$8,363,914.41	397,461
461	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	2 días	lun 01/12/25	mar 02/12/25	$353,012.52	462FC-1 día,397
462	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	2 días	vie 28/11/25	lun 01/12/25	$1,738,769.85	397,459CC+3 días
463	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$317,584.55	461,397
464	TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	2 días	vie 05/12/25	lun 08/12/25	$396,212.94	463,397
465	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**lun 08/12/25**	**lun 08/12/25**	**$192,026.95**	
466	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$192,026.95	457FC-3 días,397
467	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**20 días**	**lun 13/10/25**	**vie 07/11/25**	**$2,044,511.50**	
468	ASEO GENERAL DE OBRA	17 días	lun 13/10/25	mar 04/11/25	$512,565.21	397
469	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mié 05/11/25	mié 05/11/25	$472,202.50	397,452
470	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	jue 06/11/25	jue 06/11/25	$403,182.27	469,397
471	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$656,561.52	470,397
472	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**5 días**	**lun 13/10/25**	**vie 17/10/25**	**$1,785,924.70**	
473	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION AVISOS DE SEÑALIZACION	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$25,313.70	397
474	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	4 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25	$1,118,217.60	473,397
475	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$364,690.96	474CC,397
476	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$247,214.32	475,397
477	TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	1 día	jue 16/10/25	jue 16/10/25	$30,488.12	476,397
478	**NO PREVISTOS**	**77 días**	**mar 26/08/25**	**mié 10/12/25**	**$90,602,931.70**	
479	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	2 días	lun 08/12/25	mar 09/12/25	$677,871.08	466CC
480	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	4 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25	$202,055.80	418
481	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$622,848.16	480
482	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$412,024.29	468
483	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$1,511,339.15	482CC
484	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.8	5 días	jue 04/12/25	mié 10/12/25	$7,075,025.32	432FF
485	TEJA DE BARRO NATURAL	5 días	jue 04/12/25	mié 10/12/25	$14,341,646.70	484FF
486	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	1 día	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$739,442.65	433
487	DINTEL EN CONCRETO 5CM	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$658,955.60	483CC
488	PISO GRES 30,5X30,5CM	4 días	vie 05/12/25	mié 10/12/25	$9,927,289.63	454CC
489	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	$1,292,357.83	458CC
490	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	5 días	jue 27/11/25	mié 03/12/25	$5,340,048.00	489
491	MESON EN ACERO INOXIDABLE	1 día	mié 05/11/25	mié 05/11/25	$3,545,870.25	468
492	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	2 días	lun 08/12/25	mar 09/12/25	$719,206.47	486CC
493	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	1 día	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$290,965.45	496
494	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	1 día	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$152,134.63	493CC
495	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	lun 08/12/25	mar 09/12/25	$1,570,808.57	466CC
496	TUBERÍA PVCS 4"	1 día	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$604,122.62	495CC
497	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE PÓRTICO: TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 100X100X3MM	7 días	jue 20/11/25	vie 28/11/25	$8,910,205.74	500CC
498	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE PÓRTICO: TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 150X150X4.5MM	7 días	mar 25/11/25	mié 03/12/25	$15,415,361.03	497CC+3 días
499	ZAPATA DE CIMENTACIÓN 80X80X25CM Y PEDESTAL DE 30X30X60CM EN CONCRETO DE 3500 PSI ACELERADO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	jue 20/11/25	vie 28/11/25	$11,895,123.19	6,396
500	SUMINSTRO E INSTALACINO DE PLATINA DE ANCLAJE DE PEDESTAL 20X20 EN E=3/8" CON PERFORACIONES Y FIJACIONES.	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$2,803,354.06	499CC
501	CIRCUITOS ELÉCTRICOS RED DE ILUMINACIÓN 3 NO.12 + 1 NO.10	2 días	mar 26/08/25	mié 27/08/25	$1,894,875.48	
502	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$0.00	399,400,401,402,403,4
503	**GUAMO**	**56 días**	**jue 04/09/25**	**vie 21/11/25**	**$108,384,864.00**	
504	VISITA INICIAL	0 días	jue 04/09/25	jue 04/09/25	$0.00	2FC+7 días,61FC+1 día
505	APROBACIÓN PERSONAL	2 días	vie 05/09/25	lun 08/09/25	$0.00	504
506	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 09/09/25	jue 11/09/25	$0.00	505
507	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$0.00	506FC+17 días
508	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	mar 07/10/25	jue 09/10/25	$0.00	507
509	**PRELIMINARES**	**31 días**	**vie 10/10/25**	**vie 21/11/25**	**$17,610,550.07**	
510	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$158,799.29	511

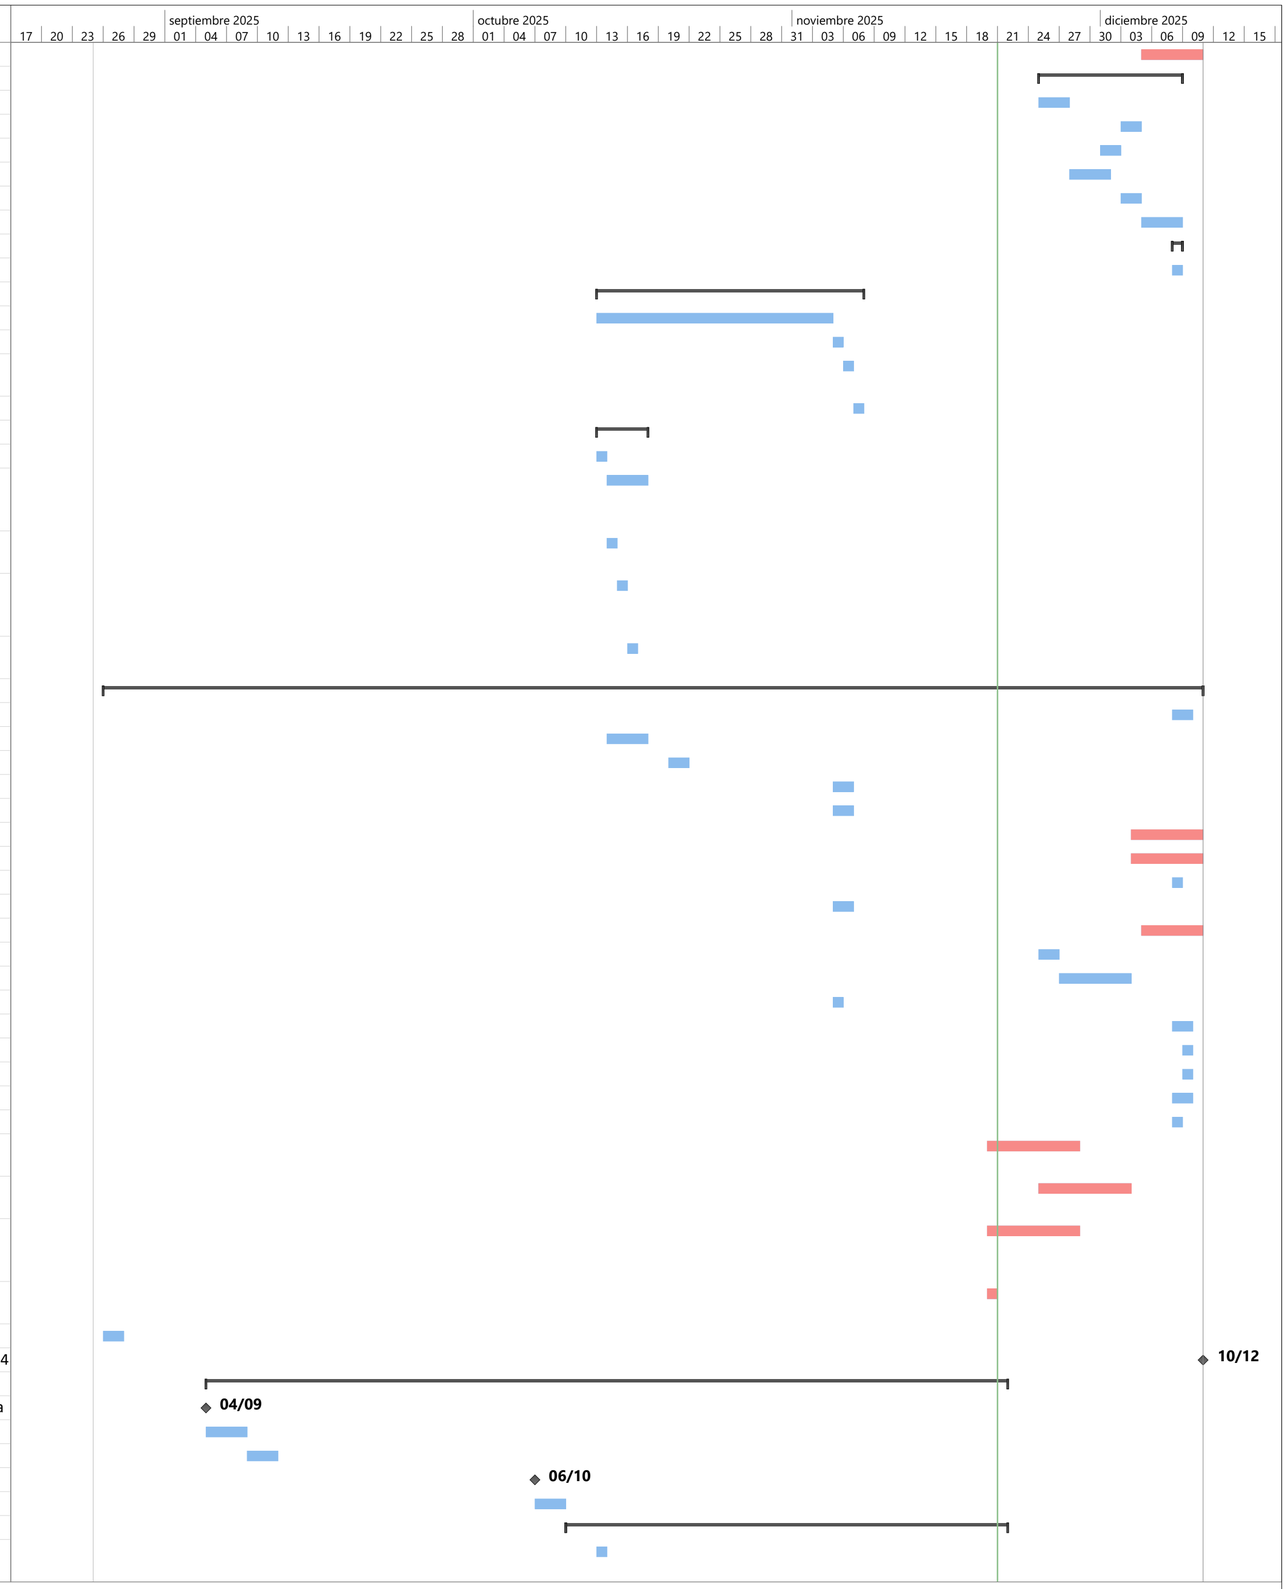

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
511	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$95,279.83	521CC
512	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$57,571.24	510
513	DESMONTE DE CUBIERTA	4 días	mié 15/10/25	lun 20/10/25	$5,737,062.79	512
514	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	4 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	$5,912,461.25	513CC+1 día
515	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$289,690.65	518CC
516	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25	$413,949.23	517CC
517	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	4 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	$1,557,044.56	514FF
518	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$512,631.50	516
519	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$62,508.54	568CC
520	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$291,395.06	556CC
521	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$254,990.60	5,508
522	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$424,897.22	515
523	LLENO EN ARENA	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$819,241.30	522
524	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$1,023,027.01	570
525	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**vie 14/11/25**	**mar 18/11/25**	**$3,488,578.17**	
526	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$518,269.94	556
527	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1,727,244.38	526CC
528	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$804,440.87	526,527
529	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$168,824.31	526,527
530	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$269,798.67	529FF
531	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**2 días**	**vie 14/11/25**	**lun 17/11/25**	**$1,992,573.60**	
532	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$356,899.38	527CC
533	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$242,298.69	532CC
534	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1,393,375.53	532CC
535	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**2 días**	**mar 21/10/25**	**mié 22/10/25**	**$10,155,786.06**	
536	PAÑETE LISO BAJA PLACA 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$2,936,939.08	547
537	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$7,218,846.98	536CC
538	**CUBIERTAS**	**6 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/10/25**	**$39,789,980.83**	
539	LIMATESA TEJA FIBROCEMENTE	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$613,325.41	540FF
540	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	6 días	jue 23/10/25	jue 30/10/25	$14,146,950.32	541CC
541	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	5 días	jue 23/10/25	mié 29/10/25	$18,889,344.03	536
542	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$591,554.37	543CC
543	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$2,509,090.70	540FF
544	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$3,039,716.00	540FF
545	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**3 días**	**jue 16/10/25**	**lun 20/10/25**	**$2,747,431.13**	
546	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$2,631,897.28	517CC
547	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	$115,533.85	546FF
548	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**2 días**	**jue 23/10/25**	**vie 24/10/25**	**$1,593,112.47**	
549	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$998,510.05	550CC
550	LAVADO FACHADA	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$594,602.42	537
551	**PINTURAS**	**15 días**	**jue 23/10/25**	**mié 12/11/25**	**$15,019,195.94**	
552	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	15 días	jue 23/10/25	mié 12/11/25	$15,019,195.94	549CC
553	**PISOS**	**2 días**	**vie 07/11/25**	**lun 10/11/25**	**$1,630,257.59**	
554	PISO GRES 30,5X30,5CM	2 días	vie 07/11/25	lun 10/11/25	$1,630,257.59	565
555	**RED ELÉCTRICA**	**3 días**	**mar 11/11/25**	**jue 13/11/25**	**$5,715,887.09**	
556	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$2,313,091.47	558CC
557	CANALETA PLASTICA 100X45MM	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$1,278,454.86	559CC
558	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$70,686.39	561FF
559	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$317,584.55	554
560	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$1,313,936.37	561FF
561	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$422,133.45	557CC
562	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**jue 30/10/25**	**jue 30/10/25**	**$192,026.95**	
563	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$192,026.95	542
564	**RED SANITARIA**	**7 días**	**jue 30/10/25**	**vie 07/11/25**	**$5,099,178.36**	
565	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$465,461.35	567
566	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$1,570,808.57	563CC
567	TUBERÍA PVCS 4"	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$2,013,742.93	566
568	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$1,049,165.51	565
569	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**jue 20/11/25**	**jue 20/11/25**	**$2,183,064.43**	
570	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$512,821.45	510,511,512,513,514,5

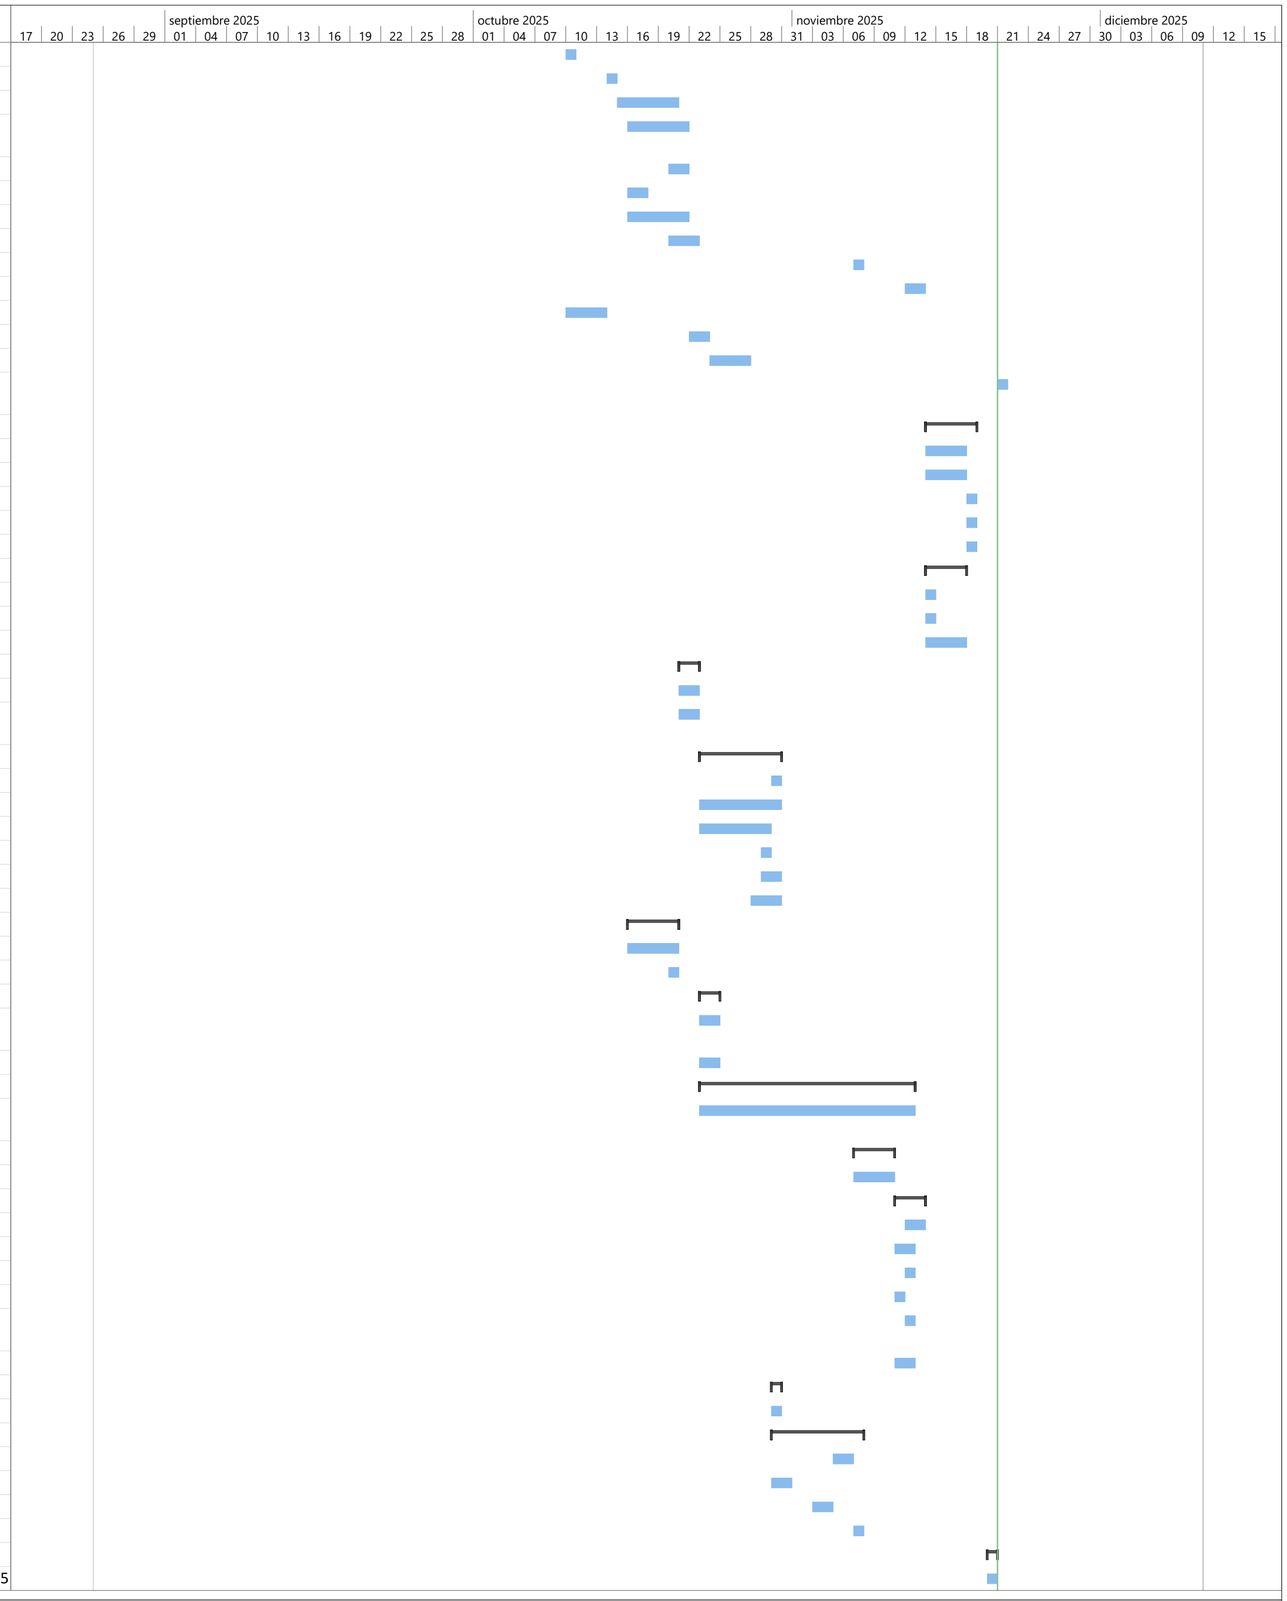

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
571	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$575,973.77	570CC
572	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1,094,269.21	570CC
573	**ADICIONALES**	**7 días**	**mar 11/11/25**	**mié 19/11/25**	**$1,167,241.31**	
574	MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$628,285.18	534
575	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$117,219.14	526
576	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$421,736.99	561CC
577	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$0.00	510,511,512,513,514,5
578	**RAMIRIQUI**	**59 días**	**mié 03/09/25**	**lun 24/11/25**	**$204,250,938.00**	
579	VISITA INICIAL	1 día	mié 03/09/25	mié 03/09/25	$0.00	2FC+7 días,678
580	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 04/09/25	lun 08/09/25	$0.00	579
581	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 09/09/25	jue 11/09/25	$0.00	580
582	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	lun 06/10/25	lun 06/10/25	$0.00	581FC+17 días
583	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	mar 07/10/25	jue 09/10/25	$0.00	582
584	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$0.00	592
585	**PRELIMINARES**	**32 días**	**vie 10/10/25**	**lun 24/11/25**	**$19,736,030.35**	
586	DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25	$1,591,982.24	587FF
587	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$172,714.07	590FF
588	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$955,813.06	586FF
589	DESMONTE DE CUBIERTA	4 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$3,530,500.41	584CC
590	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$4,074,164.15	589CC
591	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$310,604.12	594
592	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	3 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$189,837.30	591
593	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25	$699,349.26	629CC,584
594	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	6 días	vie 10/10/25	vie 17/10/25	$3,094,442.71	596CC
595	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$2,148,355.85	651,584
596	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	3 días	vie 10/10/25	mar 14/10/25	$2,431,609.91	5,583
597	RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$536,657.27	588CC+1 día
598	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**mar 11/11/25**	**jue 13/11/25**	**$2,457,384.70**	
599	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$881,839.24	584,626
600	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$1,575,545.46	599,584
601	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**jue 20/11/25**	**jue 20/11/25**	**$354,489.21**	
602	HERRAJES, TORNILLERÍA, LUBRICANTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ARCHIVO RODANTE	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$354,489.21	584,651CC
603	**CIELORRASOS**	**7 días**	**lun 03/11/25**	**mar 11/11/25**	**$15,449,418.86**	
604	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	7 días	lun 03/11/25	mar 11/11/25	$15,449,418.86	584
605	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**3 días**	**vie 31/10/25**	**mar 04/11/25**	**$3,850,051.98**	
606	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	3 días	vie 31/10/25	mar 04/11/25	$3,850,051.98	623
607	**CUBIERTAS**	**15 días**	**mié 22/10/25**	**mar 11/11/25**	**$33,829,612.51**	
608	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$1,220,952.10	591
609	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	4 días	jue 30/10/25	mar 04/11/25	$12,463,525.93	588
610	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$2,279,787.41	611FF,584
611	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	5 días	mié 05/11/25	mar 11/11/25	$17,865,347.07	609,584
612	**ENCHAPE MUROS**	**5 días**	**mié 05/11/25**	**mar 11/11/25**	**$6,511,573.32**	
613	ESTUCO EXTERIOR	5 días	mié 05/11/25	mar 11/11/25	$3,126,279.51	614CC,584
614	RESANE	3 días	mié 05/11/25	vie 07/11/25	$1,762,326.90	606,584
615	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$1,622,966.91	606,584
616	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**mié 12/11/25**	**mié 19/11/25**	**$19,713,195.44**	
617	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	6 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$9,728,096.57	618CC,584
618	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	6 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$9,985,098.87	613,584
619	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**2 días**	**vie 24/10/25**	**lun 27/10/25**	**$6,017,960.83**	
620	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$4,662,044.35	608
621	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$1,355,916.48	620CC
622	**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**3 días**	**mar 28/10/25**	**jue 30/10/25**	**$4,927,343.16**	
623	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$4,927,343.16	584FF-1 día,588CC
624	**PINTURAS**	**11 días**	**jue 06/11/25**	**jue 20/11/25**	**$45,719,265.81**	
625	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	jue 06/11/25	lun 10/11/25	$398,534.06	627CC,584
626	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	jue 06/11/25	lun 10/11/25	$408,227.13	625CC,584
627	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	11 días	jue 06/11/25	jue 20/11/25	$44,912,504.62	613CC+1 día,584
628	**RED ELÉCTRICA**	**4 días**	**jue 06/11/25**	**mar 11/11/25**	**$7,870,933.85**	

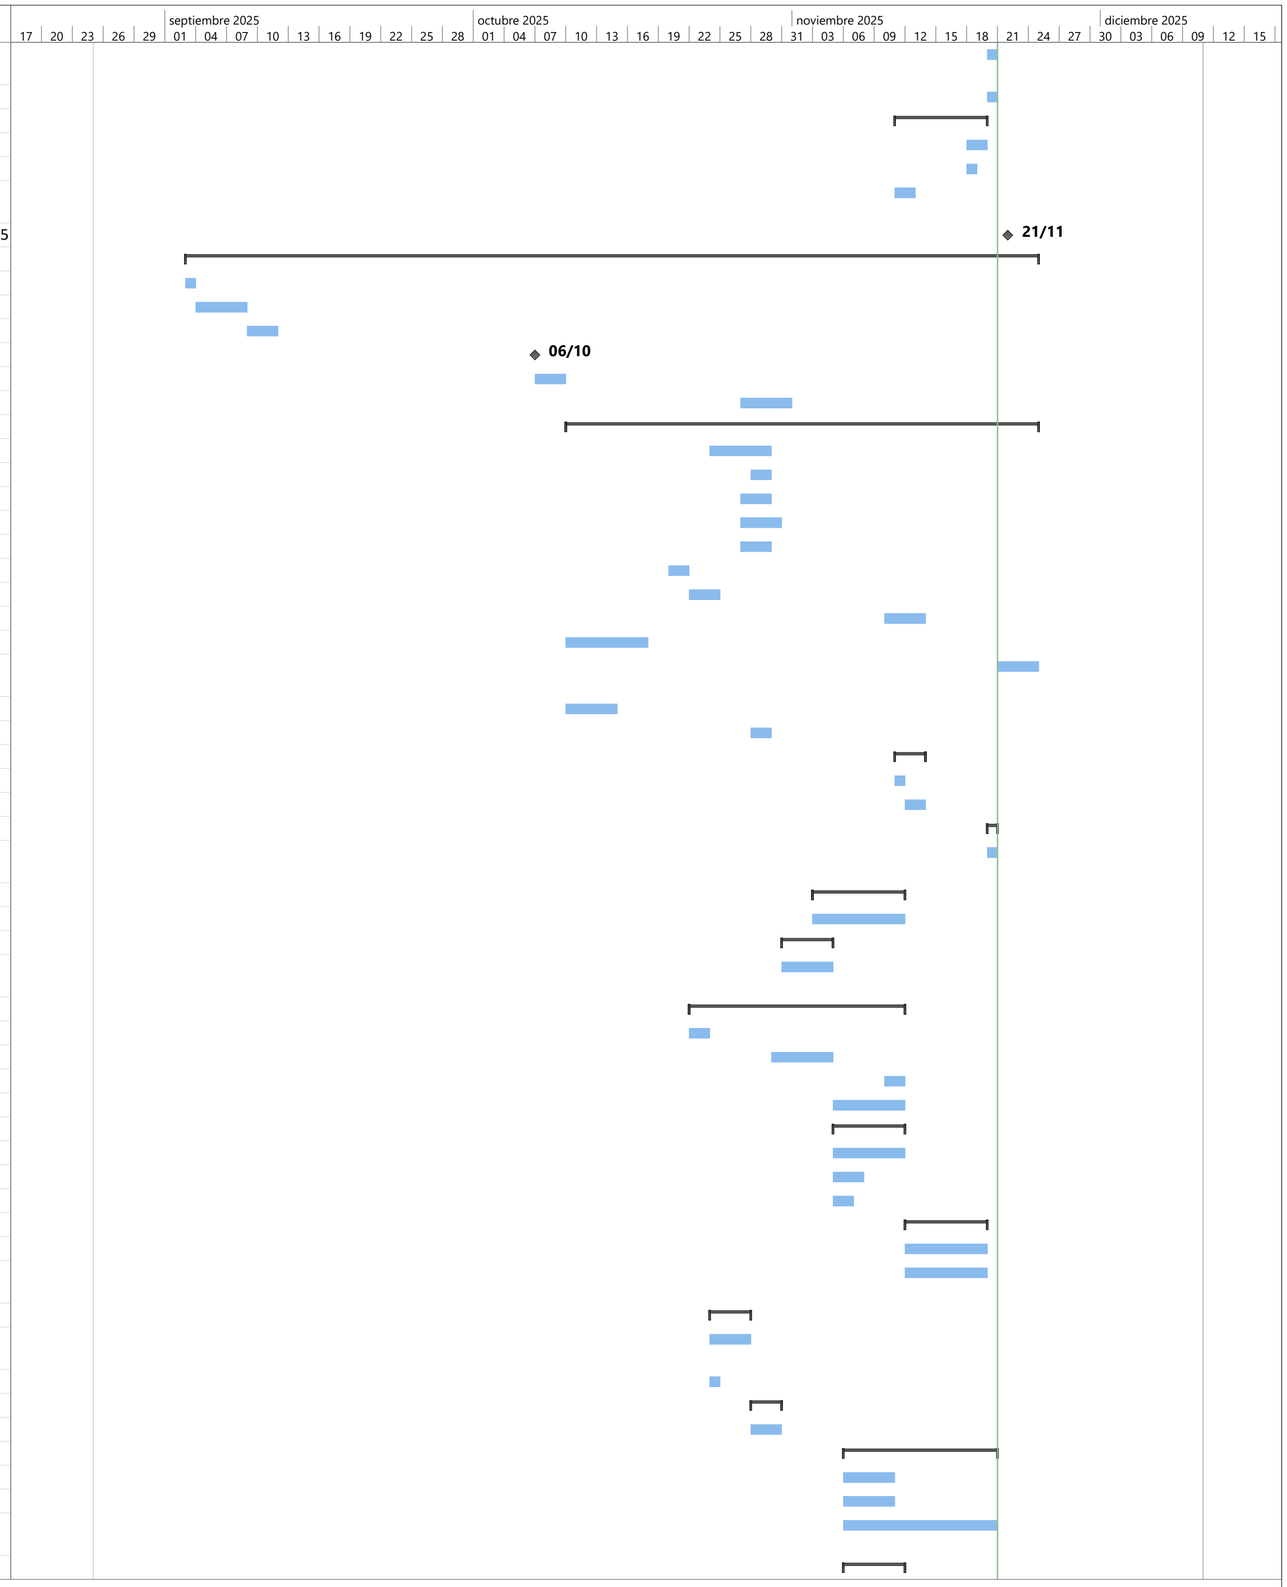

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
629	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$925,236.71	633,584
630	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$1,072,296.71	629CC,584
631	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$74,280.35	629CC,584
632	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$345,541.76	629CC,584
633	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$589,272.03	634,584
634	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 06/11/25	jue 06/11/25	$317,584.55	626CC,584
635	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$2,627,873.75	634,584
636	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$713,698.31	633,584
637	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1,205,149.68	629CC,584
638	**RED HIDRÁULICA**	**6 días**	**lun 10/11/25**	**lun 17/11/25**	**$3,352,297.15**	
639	TUBERÍA PVCP 1"	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$113,008.82	643,584
640	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$279,406.42	584,645
641	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1,497,226.92	584,645
642	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$192,026.82	639CC,584
643	PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$943,355.29	630CC,584
644	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$261,378.98	641CC,584
645	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$65,893.90	639,584
646	**RED SANITARIA**	**5 días**	**lun 10/11/25**	**vie 14/11/25**	**$4,527,900.15**	
647	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$1,444,515.11	643CC,584
648	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1,570,808.99	647CC,584
649	SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$1,512,576.05	641CC,584
650	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**28 días**	**mié 15/10/25**	**vie 21/11/25**	**$4,707,460.91**	
651	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1,098,902.34	586,587,588,589,590,5
652	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$498,627.08	651FF,584
653	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$1,038,845.58	652CC,584
654	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$921,558.32	652CC,584
655	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1,094,268.84	652CC,584
656	PODA CESPED	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$55,258.75	596
657	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**13 días**	**jue 06/11/25**	**lun 24/11/25**	**$3,745,774.02**	
658	MANTENIMIENTO REJA METALICA	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	$2,670,214.33	584,626
659	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$148,328.74	651,584
660	TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$457,313.80	584,659
661	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8"	1 día	jue 06/11/25	jue 06/11/25	$412,099.62	634CC,584
662	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$57,817.53	651,584
663	**NO PREVISTOS**	**32 días**	**vie 10/10/25**	**lun 24/11/25**	**$21,480,245.75**	
664	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	4 días	lun 03/11/25	jue 06/11/25	$869,277.33	587CC,584
665	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	2 días	vie 07/11/25	lun 10/11/25	$167,852.56	664,584
666	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$1,148,255.30	651,584
667	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	28 días	vie 10/10/25	mar 18/11/25	$764,971.79	596CC
668	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$719,791.09	600,584
669	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$3,091,682.72	668,584
670	BARANDA TUBO REDONDO (Tres hilos)	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1,515,808.60	584,651CC
671	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	3 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$216,050.59	670CC,584
672	CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX060CM	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$4,418,783.18	604,584
673	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$1,090,505.29	609,584
674	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$4,790,672.94	666,584
675	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$2,686,594.36	651,584
676	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0.00	586,587,588,589,590,5
677	**PUERTO BOYACA**	**77 días**	**mar 26/08/25**	**mié 10/12/25**	**$150,203,474.00**	
678	VISITA INICIAL	1 día	mar 02/09/25	mar 02/09/25	$0.00	2FC+6 días
679	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	mié 03/09/25	vie 05/09/25	$0.00	678
680	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	lun 08/09/25	mié 10/09/25	$0.00	679
681	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	jue 09/10/25	jue 09/10/25	$0.00	680FC+21 días
682	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	vie 10/10/25	mar 14/10/25	$0.00	681

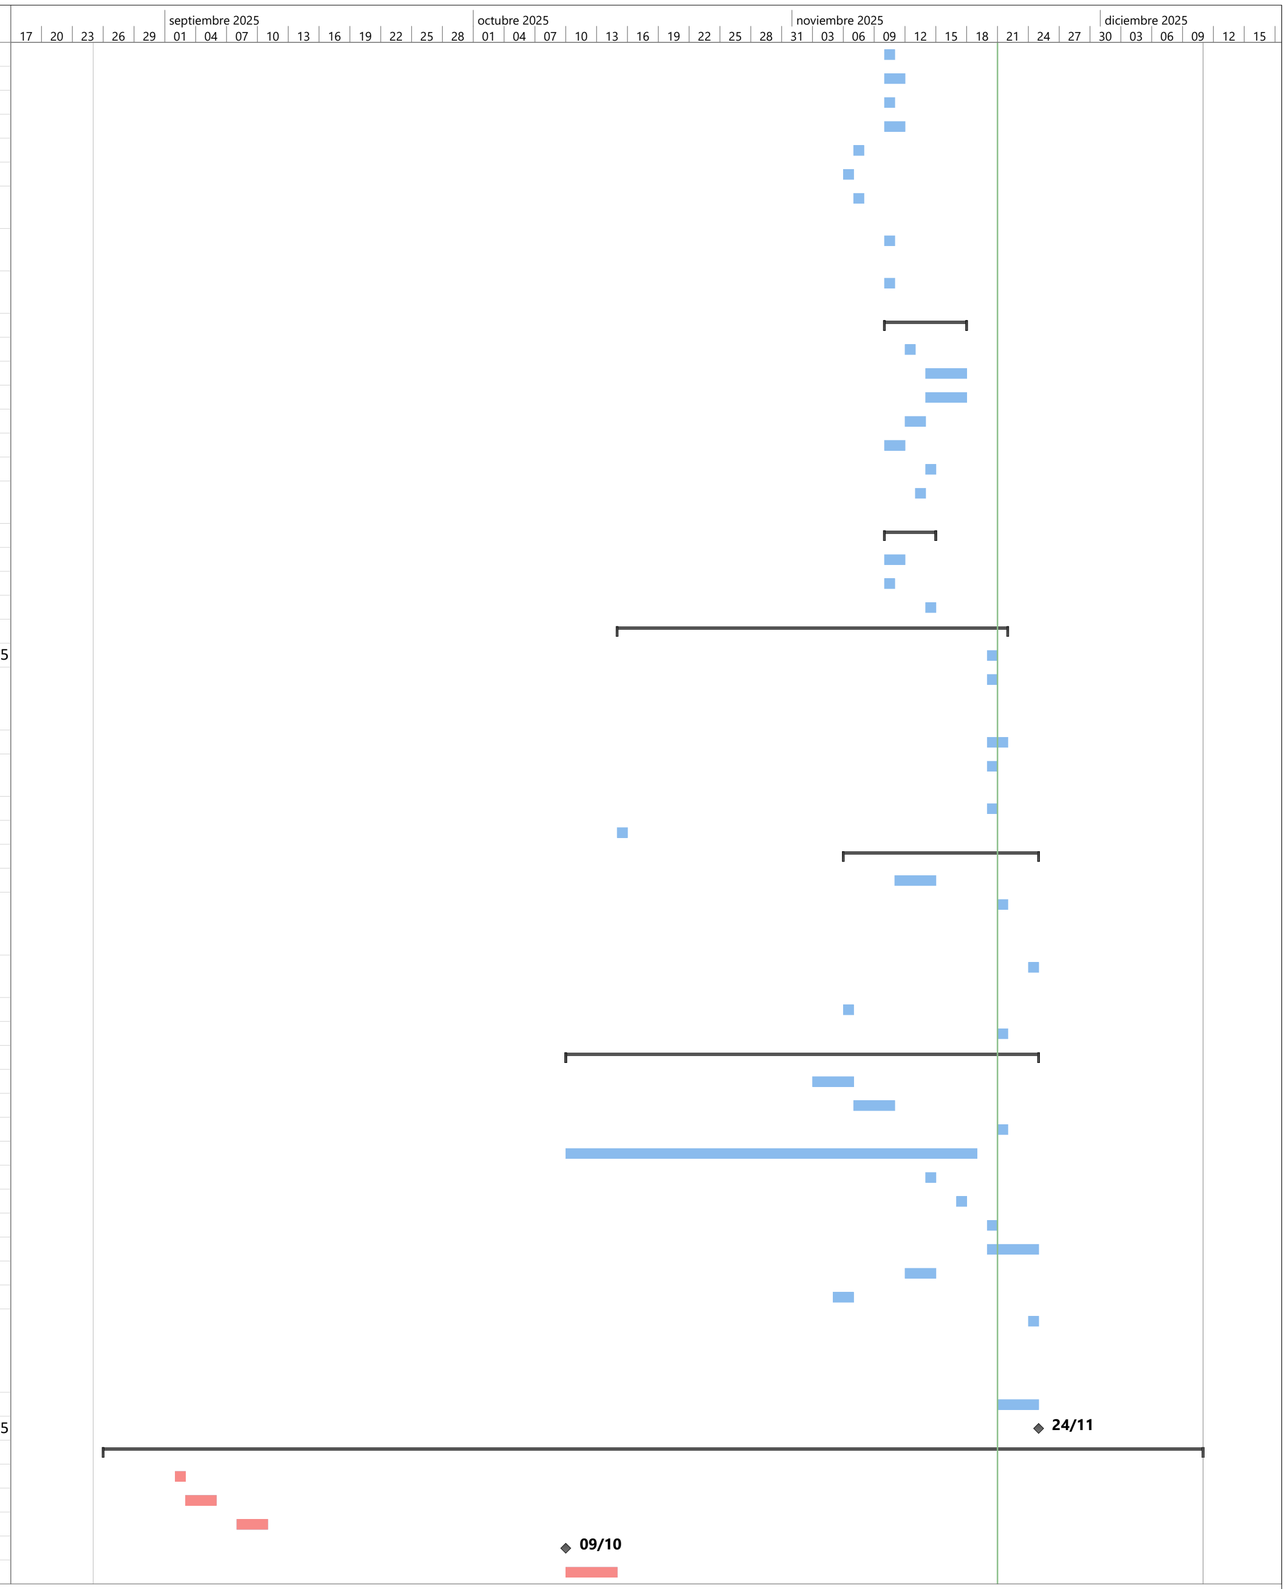

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
683	**PRELIMINARES**	**34 días**	**lun 20/10/25**	**jue 04/12/25**	**$12,020,279.02**	
684	DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$1,569,239.29	694
685	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$206,661.45	682FC+3 días
686	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$155,212.00	684
687	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	$52,168.64	685CC
688	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$347,283.57	684
689	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$433,405.23	688CC
690	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	3 días	lun 03/11/25	mié 05/11/25	$1,557,044.56	691CC
691	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25	$536,725.22	689FF
692	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$1,476,328.04	743FF
693	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$1,019,961.11	696CC
694	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	5 días	mar 21/10/25	lun 27/10/25	$3,877,882.99	693CC+1 día
695	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$306,908.10	743FF
696	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$481,458.82	5,685CC
697	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**2 días**	**mar 18/11/25**	**mié 19/11/25**	**$5,841,215.23**	
698	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1,350,408.40	722CC
699	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$4,490,806.83	698CC
700	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**6 días**	**mar 18/11/25**	**mar 25/11/25**	**$5,282,716.42**	
701	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1,070,696.88	698CC
702	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$2,106,782.94	701
703	REJA TIPO BANCO	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$779,364.28	706FF
704	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$1,325,872.32	703
705	**CIELORRASOS**	**5 días**	**mar 18/11/25**	**lun 24/11/25**	**$7,830,586.53**	
706	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	5 días	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$7,830,586.53	722CC
707	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**4 días**	**vie 07/11/25**	**mié 12/11/25**	**$3,850,051.55**	
708	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	4 días	vie 07/11/25	mié 12/11/25	$3,850,051.55	733
709	**CUBIERTAS**	**6 días**	**mié 05/11/25**	**mié 12/11/25**	**$3,321,274.71**	
710	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	3 días	mié 05/11/25	vie 07/11/25	$984,238.67	691
711	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25	$2,337,036.04	710
712	**ENCHAPE MUROS**	**5 días**	**jue 13/11/25**	**mié 19/11/25**	**$3,173,828.79**	
713	ESTUCO EXTERIOR	3 días	jue 13/11/25	lun 17/11/25	$1,469,125.42	708
714	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	5 días	jue 13/11/25	mié 19/11/25	$1,704,703.37	713CC
715	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**2 días**	**mié 05/11/25**	**jue 06/11/25**	**$2,755,597.50**	
716	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$2,755,597.50	688
717	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**mar 18/11/25**	**mar 25/11/25**	**$4,252,871.78**	
718	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	3 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	$2,675,226.46	713
719	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$1,577,645.32	718
720	**PINTURAS**	**11 días**	**mar 18/11/25**	**mar 02/12/25**	**$36,927,152.26**	
721	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1,028,285.56	714CC+3 días
722	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	11 días	mar 18/11/25	mar 02/12/25	$25,501,086.63	721CC
723	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE DE BASE ACUOSA NULLFIRE o Similar. Incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y preparación de la superficie y elementos para trabajo en alturas. Se debe cubrir las superficies horizonta	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$10,397,780.07	722CC
724	**PISOS**	**7 días**	**vie 07/11/25**	**lun 17/11/25**	**$6,395,403.94**	
725	PISO GRES 30,5X30,5CM	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1,706,879.45	728
726	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	2 días	vie 07/11/25	lun 10/11/25	$1,130,649.45	716
727	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$2,331,113.32	726
728	SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$1,226,761.72	727
729	**RED ELÉCTRICA**	**15 días**	**jue 06/11/25**	**mié 26/11/25**	**$7,888,493.05**	
730	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	$6,476,657.14	706
731	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$230,397.16	706
732	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	$863,854.20	706
733	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 06/11/25	jue 06/11/25	$317,584.55	690
734	**RED HIDRÁULICA**	**2 días**	**jue 13/11/25**	**vie 14/11/25**	**$2,510,165.35**	
735	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$1,117,626.09	708
736	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$384,053.90	735CC
737	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$834,232.95	735CC
738	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$174,252.41	737
739	**RED SANITARIA**	**4 días**	**mar 28/10/25**	**vie 31/10/25**	**$3,384,828.58**	

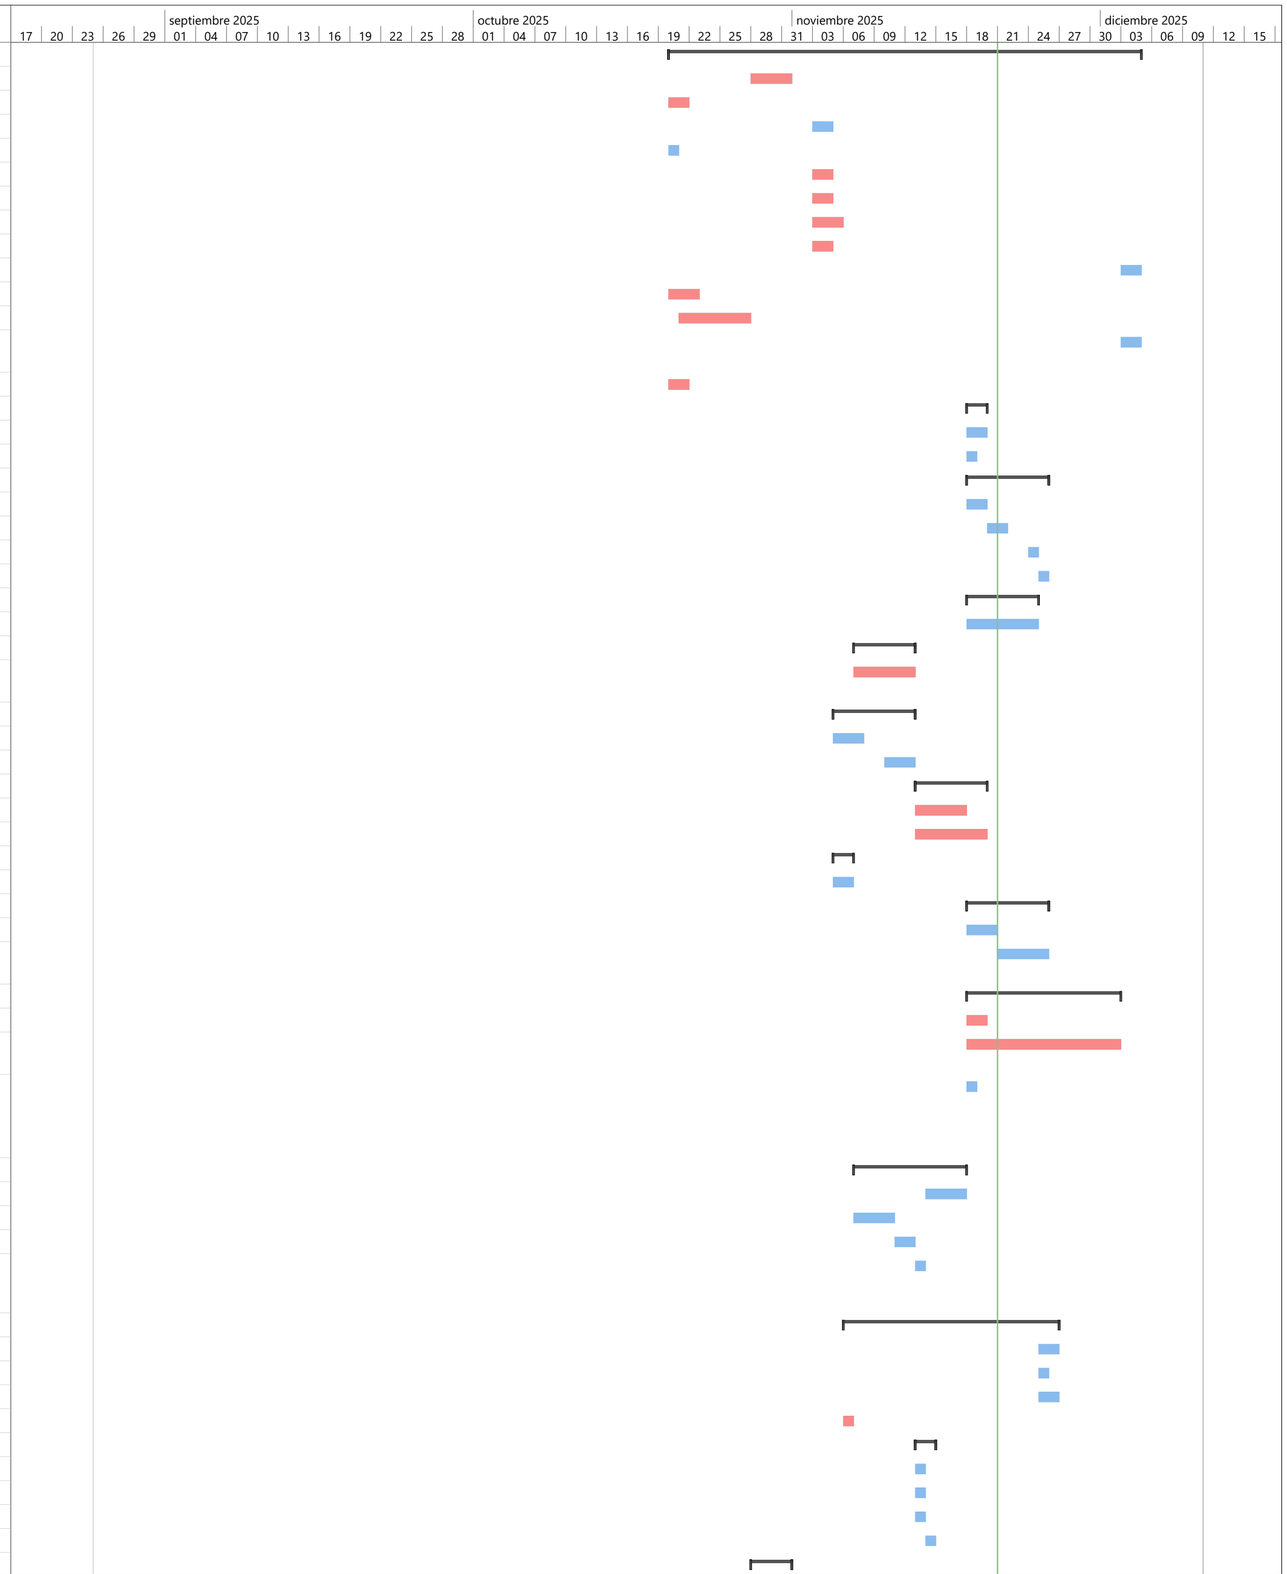

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
740	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$1,209,781.38	694
741	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$2,175,047.20	740
742	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**mié 03/12/25**	**lun 08/12/25**	**$5,453,540.90**	
743	ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$847,546.96	684,685,686,688,689,6
744	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	2 días	vie 05/12/25	lun 08/12/25	$498,626.55	743
745	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$354,152.19	743
746	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$575,973.77	743
747	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$2,188,537.14	743
748	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$988,704.29	743
749	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**3 días**	**mié 03/12/25**	**vie 05/12/25**	**$1,398,454.34**	
750	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	2 días	mié 03/12/25	jue 04/12/25	$559,108.16	743FF
751	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	1 día	jue 04/12/25	jue 04/12/25	$364,690.96	750FF,773FF
752	DESMONSTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS DE SOBREPONER (Extintores, relojes, dispensadores de Gel y papel, equipos de emergencia (Botiquín, Camilla), Buzón de sugerencias)	1 día	jue 04/12/25	jue 04/12/25	$264,399.90	751FF
753	TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$152,438.04	752
754	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$57,817.28	743
755	**NO PREVISTOS**	**77 días**	**mar 26/08/25**	**mié 10/12/25**	**$37,917,014.05**	
756	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$0.00	743
757	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	1 día	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$410,772.43	722
758	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$3,152,729.57	768
759	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$222,841.42	706
760	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$372,593.45	759
761	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$473,414.83	706CC
762	PLATINA DE ANCLAJE DE PEDESTAL 20X20 EN E=3/8" CON PERFOMRACIONES Y PEDESTALES	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$637,125.92	6
763	CIRCUITOS ELECTRICOS RED ILUMINACIÓN 3 No. 12 + 1 No. 10	1 día	mar 26/08/25	mar 26/08/25	$572,608.29	
764	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tubería en cobre hasta 3 ml)	2 días	lun 08/12/25	mar 09/12/25	$16,163,686.48	756
765	REINSTALACION CIELORRASO EXISTENTE	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$1,883,425.23	764
766	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$986,978.21	722CC
767	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1,990,982.65	710
768	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 4"X2" 2MM	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$1,678,360.90	762
769	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	1 día	lun 03/11/25	lun 03/11/25	$169,185.08	688CC
770	DESMANCHE DE PISO DURO PISO	1 día	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$6,773,573.36	771
771	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$1,117,642.66	750
772	TUBERÍA PVCP 3/4"	1 día	lun 03/11/25	lun 03/11/25	$145,021.25	741
773	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$1,166,072.32	685
774	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$0.00	684,685,686,688,689,6
775	**CONCEPCIÓN**	**53 días**	**jue 11/09/25**	**lun 24/11/25**	**$40,659,736.00**	
776	VISITA INICIAL	1 día	jue 11/09/25	jue 11/09/25	$0.00	2FC+13 días
777	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	vie 12/09/25	mar 16/09/25	$0.00	776
778	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mié 17/09/25	vie 19/09/25	$0.00	777
779	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$0.00	778FC+16 días
780	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$0.00	779
781	SUSPENSIÓN DE TERMINOS	5 días	lun 20/10/25	vie 24/10/25	$0.00	798
782	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**lun 20/10/25**	**lun 20/10/25**	**$270,646.42**	
783	REJILLA DE PISO 30CM	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	$270,646.42	781CC
784	**ENCHAPE MUROS**	**3 días**	**vie 07/11/25**	**mar 11/11/25**	**$1,208,659.57**	
785	ESTUCO EXTERIOR	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$694,729.04	787,781
786	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$396,442.41	787,781
787	RESANE	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$117,488.12	789,781
788	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**9 días**	**lun 03/11/25**	**jue 13/11/25**	**$13,303,418.97**	
789	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	4 días	lun 03/11/25	jue 06/11/25	$7,730,431.87	781,813
790	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$1,697,319.72	785,781
791	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$3,875,667.38	785,781

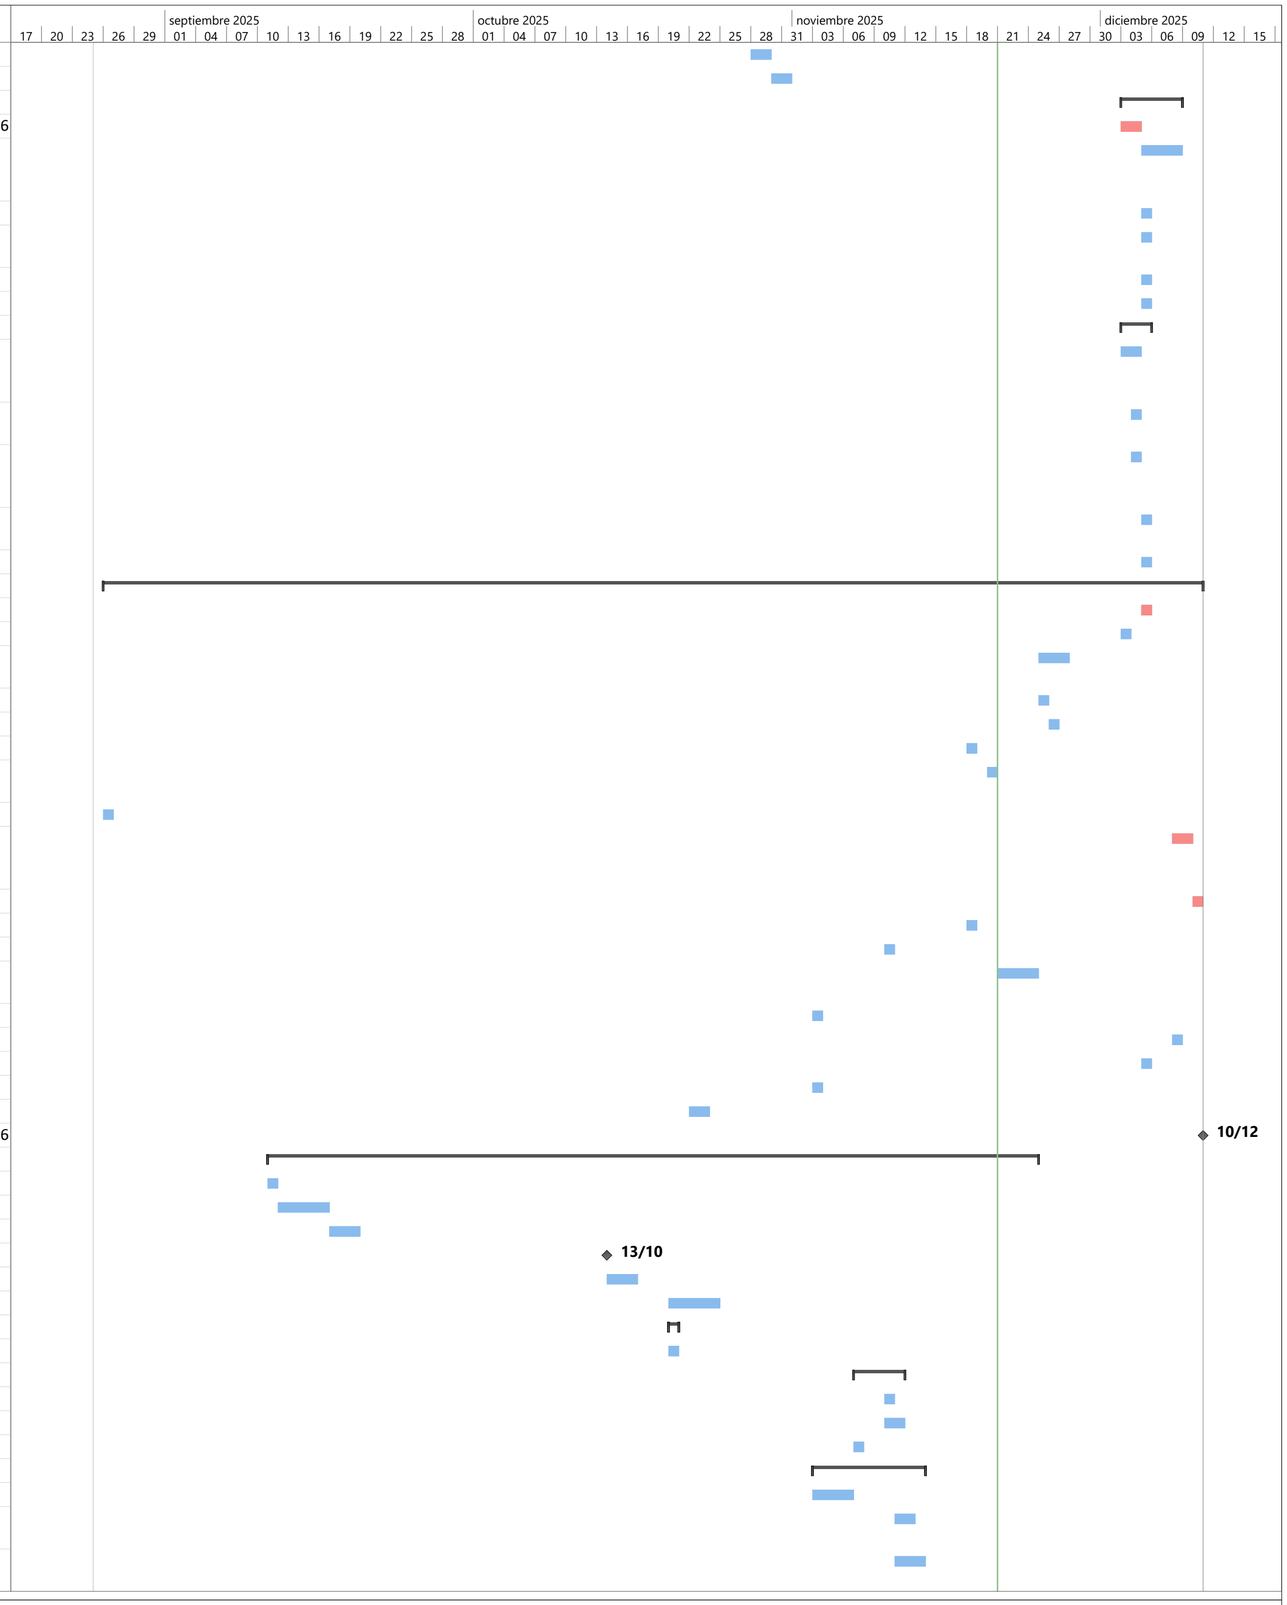

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
792	**PINTURAS**	**6 días**	**mié 12/11/25**	**mié 19/11/25**	**$13,341,753.40**	
793	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	6 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$13,341,753.40	786,781
794	**RED ELÉCTRICA**	**2 días**	**jue 20/11/25**	**vie 21/11/25**	**$4,999,798.78**	
795	LUMINARIA LED 120X30CM PARA TECHO MODULAR	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$4,999,798.78	793,781
796	**RED SANITARIA**	**5 días**	**vie 17/10/25**	**jue 23/10/25**	**$2,858,072.30**	
797	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$294,125.68	798,799
798	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	1 día	vie 17/10/25	vie 17/10/25	$1,516,740.48	5,780
799	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$1,047,206.14	798
800	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**lun 24/11/25**	**lun 24/11/25**	**$2,362,755.14**	
801	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$747,253.35	795,781,809,810,811,8
802	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$118,050.31	801CC,781
803	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$403,182.27	801CC,781
804	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1,094,269.21	801CC,781
805	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**24 días**	**lun 20/10/25**	**jue 20/11/25**	**$677,446.57**	
806	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$593,049.71	781CC,798
807	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$84,396.86	793,781
808	**NO PREVISTOS**	**26 días**	**lun 20/10/25**	**lun 24/11/25**	**$1,637,184.85**	
809	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$405,295.89	798
810	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$66,339.32	781,806
811	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$102,525.79	810
812	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$84,979.44	811
813	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$711,669.85	814
814	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$164,071.86	812
815	GESTION DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$102,302.70	801CC
816	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0.00	783,785,786,787,789,7
817	**PAMPLONA**	**44 días**	**mié 10/09/25**	**mar 11/11/25**	**$41,093,658.00**	
818	VISITA INICIAL	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	$0.00	2FC+11 días,391FC+1 d
819	APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25	$0.00	818
820	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 16/09/25	jue 18/09/25	$0.00	819
821	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	0 días	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$0.00	820FC+18 días
822	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	$0.00	821
823	SUSPENSIÓN DE TERMINOS 1	3 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$0.00	826
824	SUSPENSIÓN DE TERMINOS 2	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$0.00	838CC+4 días,823
825	**PRELIMINARES**	**6 días**	**lun 20/10/25**	**lun 27/10/25**	**$660,487.91**	
826	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$232,495.48	828CC
827	REGATA SOBRE MURO+RESANE	4 días	mié 22/10/25	lun 27/10/25	$300,497.13	826
828	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$127,495.30	5,822
829	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**1 día**	**mié 05/11/25**	**mié 05/11/25**	**$1,647,296.57**	
830	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	1 día	mié 05/11/25	mié 05/11/25	$719,791.60	842CC,823,824
831	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	mié 05/11/25	mié 05/11/25	$927,504.97	830CC,823,824
832	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**2 días**	**jue 23/10/25**	**vie 24/10/25**	**$1,309,140.57**	
833	PAÑETE LISO BAJA PLACA 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$1,309,140.57	827CC+1 día
834	**ENCHAPE MUROS**	**3 días**	**jue 23/10/25**	**lun 27/10/25**	**$1,077,418.90**	
835	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$842,441.39	836CC
836	RESANE	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$234,977.51	833CC
837	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/10/25**	**$3,391,214.06**	
838	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	6 días	jue 23/10/25	jue 30/10/25	$3,391,214.06	840CC
839	**PINTURAS**	**11 días**	**jue 23/10/25**	**jue 06/11/25**	**$23,404,807.17**	
840	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	11 días	jue 23/10/25	jue 06/11/25	$23,404,807.17	835CC,823FC-2 días
841	**RED ELÉCTRICA**	**2 días**	**mié 05/11/25**	**jue 06/11/25**	**$1,772,762.38**	
842	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	mié 05/11/25	jue 06/11/25	$1,619,164.28	845,823,824
843	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	mié 05/11/25	mié 05/11/25	$153,598.10	842CC,823,824
844	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**mar 04/11/25**	**mar 04/11/25**	**$417,117.11**	
845	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	1 día	mar 04/11/25	mar 04/11/25	$417,117.11	823,824,854
846	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**2 días**	**lun 10/11/25**	**mar 11/11/25**	**$2,859,153.33**	
847	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$879,122.48	826,827,828,830,831,8
848	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$424,982.63	847,823,824
849	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$460,779.01	848CC,823,824

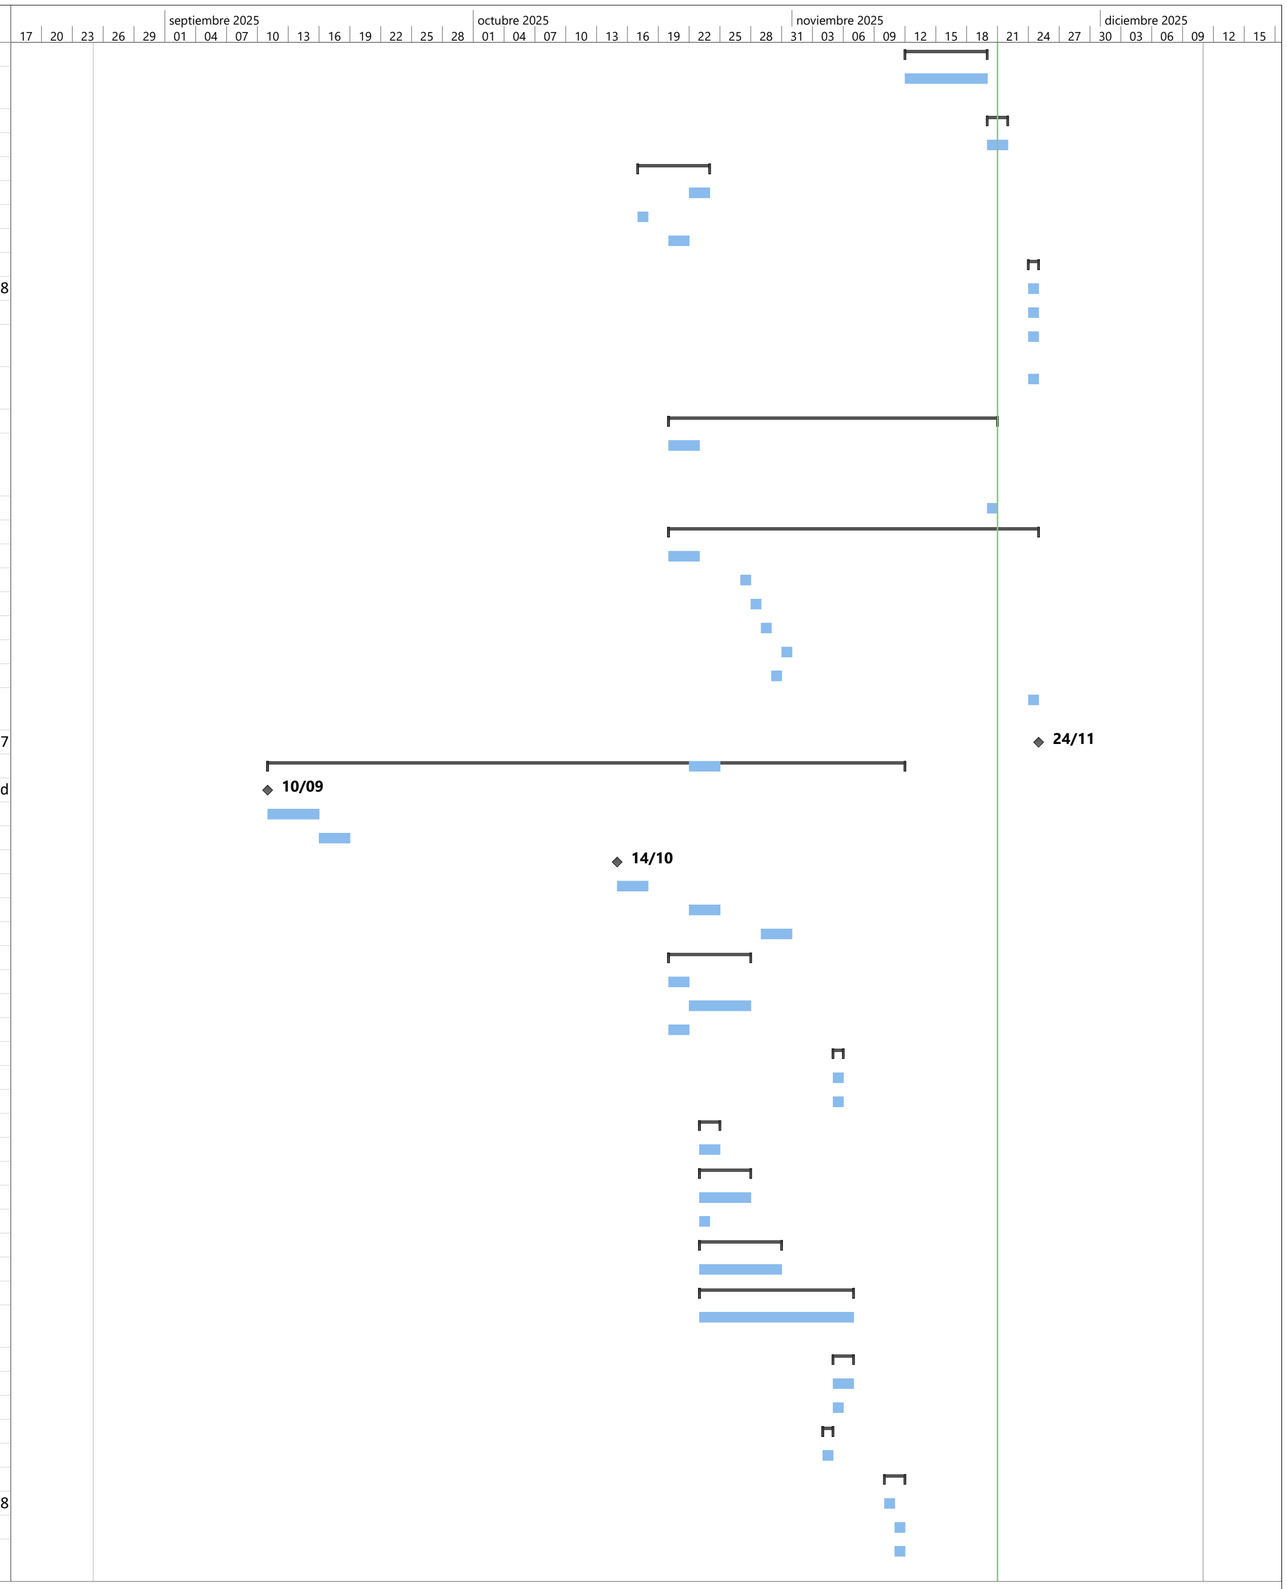

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
850	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$1,094,269.21	849CC,823,824
851	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**1 día**	**mar 11/11/25**	**mar 11/11/25**	**$1,272,875.06**	
852	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$1,272,875.06	850CC,823,824
853	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**13 días**	**mié 22/10/25**	**vie 07/11/25**	**$3,281,384.94**	
854	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	1 día	lun 03/11/25	lun 03/11/25	$1,570,808.57	823,824
855	DESMONTE VENTANA METÁLICA	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$52,981.96	857
856	MANTENIMIENTO VENTANA EN ALUMINIO	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$46,504.70	855
857	DESMONTE DE VIDRIO	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$23,132.52	826
858	RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES. Se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes. 2 manos	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$327,414.54	840
859	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$219,784.45	856
860	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	1 día	vie 07/11/25	vie 07/11/25	$1,040,758.20	858CC
861	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$0.00	826,827,828,830,831,8
862	**TUNJA**	**15 días?**	**jue 20/11/25**	**mié 10/12/25**	**$162,498,783.00**	
863	VISITA INICIAL	1 día?	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$0.00	6
864	APROBACIÓN PERSONAL	1 día?	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$0.00	863
865	APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	1 día?	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$0.00	863
866	SOLICITUD LICENCIA DE MEJORAS	1 día?	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0.00	865
867	TRAMITE Y APROBACIÓN LICENCIA DE MEJORAS	1 día?	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$0.00	866
868	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mié 26/11/25**	**vie 28/11/25**	**$16,522,708.81**	
869	DESMONTE DE VIDRIO	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$43,180.03	867
870	DESCAPOTE MANUAL E=20CM	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$503,138.07	867
871	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	1 día	jue 27/11/25	jue 27/11/25	$2,039,506.00	870
872	LLENO EN ARENA	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25	$3,932,359.01	873CC
873	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25	$3,937,727.00	871
874	RECORRIDO CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO TRAPEZOIDAL	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$6,066,798.70	867
875	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**1 día**	**mié 03/12/25**	**mié 03/12/25**	**$2,245,403.41**	
876	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	1 día	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$2,245,403.41	879
877	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**3 días?**	**lun 01/12/25**	**mié 03/12/25**	**$23,916,336.84**	
878	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBO REDONDO.	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$973,906.41	880
879	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$1,070,696.88	930
880	REJA TIPO BANCO	1 día?	lun 01/12/25	lun 01/12/25	$2,361,711.07	930CC
881	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$6,735,553.72	884
882	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MICROPERFORADA CON LOGOS INSTITUCIONALES. Vinilo blanco microperforado, 40% de area perforada orificios de 1.5 mm de espesor. Tipo adhesivo acrilico removible.	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$4,596,622.88	881
883	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO (minimo 6mm) TIPO COMERCIAL. Incluye elementos de instalacion y chapa de seguridad.	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$4,650,739.41	881CC
884	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE CERRAMIENTO Diseño especial. Incluye pintura y elementos de Instalacion. H=1.40M	1 día?	lun 01/12/25	lun 01/12/25	$3,527,106.47	880CC
885	**CIELORRASOS**	**2 días**	**jue 04/12/25**	**vie 05/12/25**	**$27,456,183.66**	
886	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	2 días	jue 04/12/25	vie 05/12/25	$15,228,712.46	901,902,903
887	CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2. Incluye acabado Pintura Tipo 1	2 días	jue 04/12/25	vie 05/12/25	$3,230,814.90	886CC
888	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar)	1 día	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$8,996,656.30	887FF
889	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**2 días?**	**jue 04/12/25**	**vie 05/12/25**	**$613,333.06**	
890	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	1 día?	jue 04/12/25	jue 04/12/25	$453,824.98	901
891	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO LAVADO	1 día?	vie 05/12/25	vie 05/12/25	$159,508.08	890
892	**ENCHAPE MUROS**	**2 días**	**vie 05/12/25**	**lun 08/12/25**	**$304,768.99**	
893	ESTUCO EXTERIOR	2 días	vie 05/12/25	lun 08/12/25	$163,782.48	894CC
894	RESANE	2 días	vie 05/12/25	lun 08/12/25	$140,986.51	890
895	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**4 días?**	**lun 01/12/25**	**jue 04/12/25**	**$5,703,722.94**	
896	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	1 día?	jue 04/12/25	jue 04/12/25	$2,545,445.44	901
897	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	1 día?	lun 01/12/25	lun 01/12/25	$3,158,277.50	872
898	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**1 día?**	**mar 09/12/25**	**mar 09/12/25**	**$8,015,636.50**	
899	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$8,015,636.50	892,893
900	**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**2 días?**	**mar 02/12/25**	**mié 03/12/25**	**$8,473,675.97**	
901	SUMINISTRO E INSTALACION MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	2 días	mar 02/12/25	mié 03/12/25	$744,648.93	897
902	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$3,338,184.93	901FF

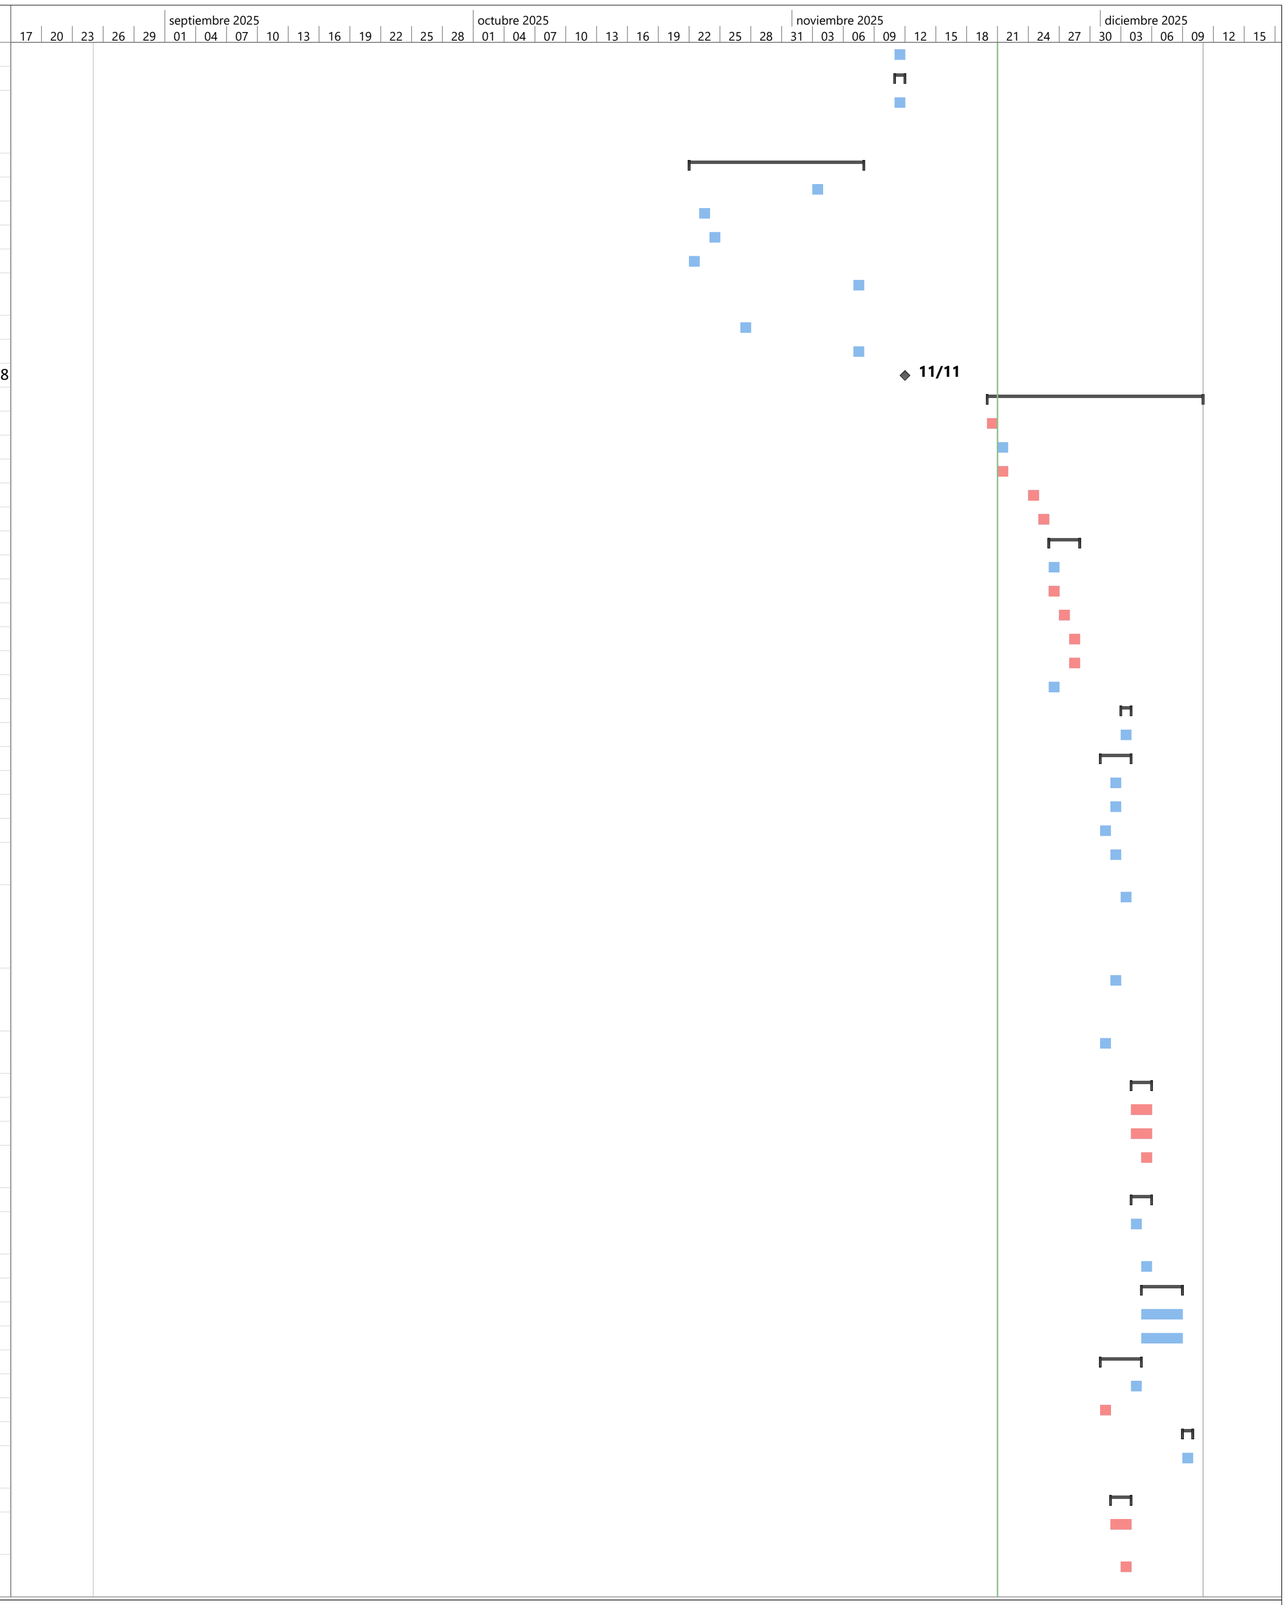

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
903	MURO EN LAMINA PLACA DE YESO 8MM TIPO RF CONTRA INCENDIO E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$4,390,842.11	902CC
904	**PINTURAS**	**1 día?**	**mar 09/12/25**	**mar 09/12/25**	**$3,046,950.49**	
905	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$3,046,950.49	892,893
906	**PISOS**	**1 día?**	**mar 02/12/25**	**mar 02/12/25**	**$3,063,726.86**	
907	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60X60 TIPO VANCOUBER O SIMILAR. TRAFICO COMERCIAL	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$2,666,218.72	897
908	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBAS EN CERAMICA TIPO VANCOUBER I SIMILAR, INCLUYE WIN EN ALUMINIO. H=0,10M	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$397,508.14	907CC
909	**RED ELÉCTRICA**	**3 días?**	**lun 08/12/25**	**mié 10/12/25**	**$56,453,401.66**	
910	TUBERÍA EMT 1" DESCOLGADA	1 día?	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$6,077,071.08	888
911	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$4,163,565.67	912
912	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	1 día?	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$3,934,361.73	910CC
913	CANALETA PLASTICA 100X45MM	1 día?	lun 08/12/25	lun 08/12/25	$6,520,120.17	910CC
914	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$25,621,769.39	916CC
915	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$356,849.67	912
916	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CAT. 6A	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$1,194,451.91	913
917	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 12 AWG	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$3,987,097.65	916CC
918	SUMINISTRO Certificación salidas lógicas6 y/o 6A y/o 7	1 día?	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$549,176.19	914
919	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 8 AWG	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$3,032,435.62	916CC
920	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 100 W 10500 lúmenes. Incluye elementos de instalación, mini sensor fotocelda 1000w 110-220v, sensor de movimiento.	1 día?	mar 09/12/25	mar 09/12/25	$1,016,502.58	912
921	**RED HIDRÁULICA**	**1 día?**	**mié 03/12/25**	**mié 03/12/25**	**$181,477.98**	
922	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA LAVA TRAPEROS PREFABRICADA EN GRANITO PULIDO. Incluye accesorios para su instalacion, desague y sifon.	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$181,477.98	907
923	**RED SANITARIA**	**1 día?**	**mié 03/12/25**	**mié 03/12/25**	**$400,896.56**	
924	SALIDA SANITARIA LAVADERO/TRAPERO 2"	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$132,614.90	907
925	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$105,603.16	924CC
926	TUBERÍA PVCS 4"	1 día?	mié 03/12/25	mié 03/12/25	$162,678.50	924CC
927	**URBANISMO**	**1 día?**	**mar 02/12/25**	**mar 02/12/25**	**$4,069,374.52**	
928	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERA O JARDINERA EN CONCRETO MINIMO 1,00X0,30X,030. Incluye tierra abonada y plantas vivas como Eugenias, papito, buganvilia o similares que permitan privacidad al interior de la oficina, además que cumplan con su función de	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$4,069,374.52	901CC
929	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**2 días?**	**lun 01/12/25**	**mar 02/12/25**	**$1,340,735.22**	
930	ASEO GENERAL DE OBRA	1 día?	lun 01/12/25	lun 01/12/25	$915,752.59	869,870,871,872,873,8
931	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día?	mar 02/12/25	mar 02/12/25	$424,982.63	930
932	**OTROS (Actividades Complementarias)**	**10 días?**	**jue 27/11/25**	**mié 10/12/25**	**$690,449.53**	
933	DESMONTE REFLECTOR EXTERIOR	1 día?	jue 27/11/25	jue 27/11/25	$436,073.39	874
934	REINSTALACION REFLECTOR EXTERIOR	1 día?	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$254,376.14	920
935	RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$0.00	863,864,865,866,867,8
936	FIN ACTIVIDADES	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$0.00	59,241,816,389,774,15
937		1 día?	mar 26/08/25	mar 26/08/25	$0.00	

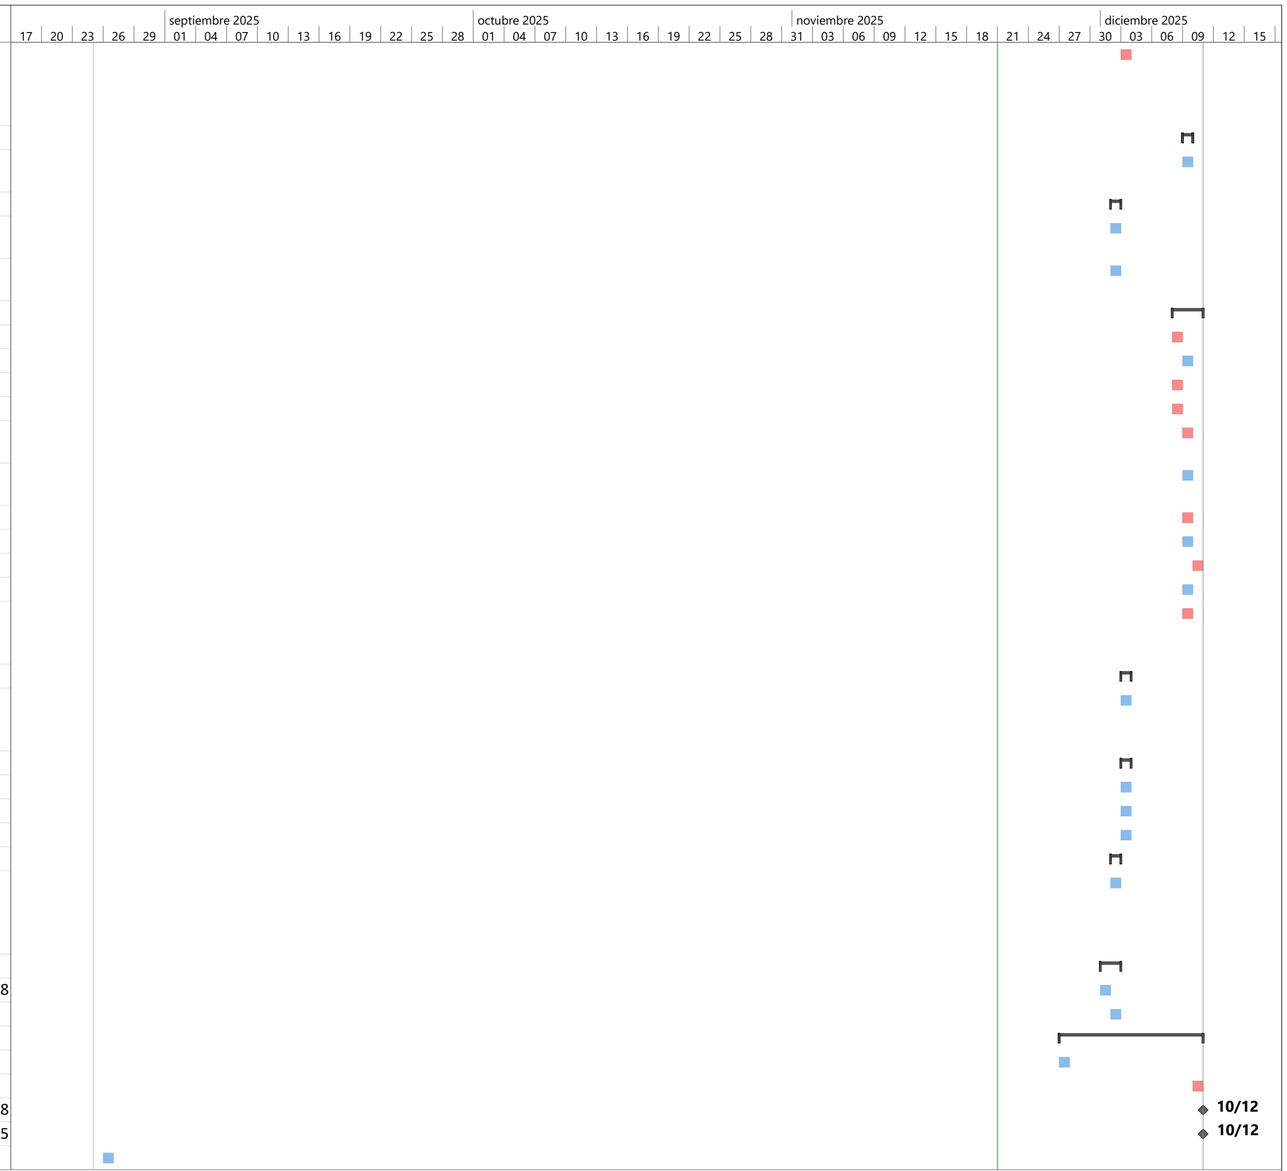

CARLOS ANDRES GUERRA QUIÑONES
CC 1018416174 DE BOGOTA D.C.
R/L CONINCAG SAS
NIT 900.934.461-5

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
R/Legal JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC

Project: PROGRAMACION NOT
Date: vie 21/11/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas
