REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04
NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2018
Versión 1

Carrera 21 No. 100 – 20, Oficina 602 - Telefax: 2183292 - 2564013 – 2581094
E-mail: copebaing@yahoo.com

BOGOTÁ D.C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. 04

MES O PERIODO:
NOVIEMBRE -2018

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas		X		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		
5.5	Información otros programas y aplicativos		X		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		
6.7	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		
7	**Anexos**				
7.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
7.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
7.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				
7.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		
7.4	Libro de Obra		x		

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización
2.2. Inventario y estado inicial de la vía
2.3. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra
4.3. Personal contrato de obra
4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra
4.5. Estado general del tiempo
4.6. Resumen ensayos de laboratorio
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
4.8. Informe avance físico-financiero del contrato de obra
4.9. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo
4.9.2. Seguimiento al programa de obra
4.9.3. Seguimiento al programad e inversiones
4.9.4. Acta de comité de obra
4.9.5. Informes semanales

5. INFORMACION CONTRTATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor
5.3. Informes especialistas

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **6.1.** Equipo contrato de interventoría
- **6.2.** Personal contrato de interventoría
- **6.3.** Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- **6.4.** Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- **6.5.** Seguimiento garantías contrato de interventoría
  - 6.5.1. Seguimiento a la inversión del anticipo contrato de interventoría
  - 6.5.2. Información de gestión socio-ambiental

7. ANEXOS

- **7.1.** Relación de correspondencia
- **7.2.** Registro fotográfico
- **7.3.** Informes especialistas
- **7.4.** Libro de obra

ANEXOS

- **ANEXO 1.** RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3
- **ANEXO 2.** MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4
- **ANEXO 3.** PERSONAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-6
- **ANEXO 4.** INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8
- **ANEXO 5.** ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10
- **ANEXO 6.** RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11
- **ANEXO 7.** CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12
- **ANEXO 8.** INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA– MINFRA-MN-IN-FR-15-14
- **ANEXO 9.** SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15
- **ANEXO 10.** SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1
- **ANEXO 11.** SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA - MINFRA-MN-IN-2-FR-2
- **ANEXO 12.** SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES – MINFRA-MN-IN-6-FR-1

- **ANEXO 13.** ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1
- **ANEXO 14.** INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2
- **ANEXO 15.** EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5
- **ANEXO 16.** PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7
- **ANEXO 17.** INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9
- **ANEXO 18.** CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-13
- **ANEXO 19.** SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-16
- **ANEXO 20.** SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-3-FR-1
- **ANEXO 21.** RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
- **ANEXO 22.** REGISTRO FOTOGRÁFICO
- **ANEXO 23.** INFORMES ESPECIALISTAS
- **ANEXO 24.** LIBRO DE OBRA.

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Reforma Rural Integral, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, desarrolla el "Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial" el cual define criterios para priorizar la intervención en las zonas más necesitadas y urgidas para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este Acuerdo, y son: "i. los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii. El grado de afectación derivado del conflicto; iii. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de capacidad de gestión; iv. Y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS con los recursos disponibles pretende ejecutar el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017., con el resultante del bienestar para los usuarios, que comprenden las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que se garantice una operación segura.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS adjudicó el Contrato de Obra Nº 498 de 2018, de fecha 25 de enero de 2018, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien presentó la propuesta PDS18C00866 de fecha 25 de enero de 2018, la cual fue aprobada por el OCAD PAZ.

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS con el fin de dar acompañamiento técnico al Contrato de obra anteriormente citado, adjudicó el Contrato de Interventoría Nº 825 de 2018, de fecha 30 de mayo de 2018, previo Concurso de Méritos CMA-DO-SRT-032-2018, a la firma COPEBA LTDA, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO

LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Los Contratos de Obra e Interventoría tuvieron orden de inicio el día 08 de agosto de 2018.El contrato de obra tiene un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018 y la interventoría tiene un plazo inicial hasta el 07 de abril de 2019.

El Contrato de Obra consta de dos etapas: una etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, y la otra etapa, que es la correspondiente a la construcción.
La primera etapa se dividió en dos fases. La primera corresponde a los Estudios y Diseños para la cual se definió un mes de plazo al contratista entre el 08 de agosto al 08 de septiembre de 2018 y la segunda la revisión de estos estudios y diseños por parte de la interventoría con un plazo de quince días, desde el 08 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2018.

En el presente Informe Mensual de Interventoría-No. 04 se reportan las actividades más importantes que se han ejecutado durante el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2018, correspondiente al cuarto mes de desarrollo y ejecución de los Contratos de Obra y de Interventoría del Proyecto.

Del Contrato de Interventoría, se incluyen los aspectos generales, las actividades de supervisión y la información financiera. Al final del Informe se incluye algunos comentarios, conclusiones y observaciones de los aspectos más relevantes del desarrollo y ejecución general del Proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

De acuerdo con las últimas evaluaciones efectuadas por el INVIAS, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, algunas vías de red secundaria del Quindío presentan un deterioro que amerita su pronta intervención principalmente en los tramos Pijao – Guacas, Génova – Guacas. En razón a lo anterior, se considera de vital importancia para el desarrollo del país, la configuración de una red de carreteras secundarias

que atienda a su vez las necesidades de movilidad en las vías de acceso de poco tránsito vehicular, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, realizó la asignación de recursos para la atención de las vías secundarias dentro del marco del OCAD PAZ ubicadas en los municipios de PIJAO – GUACAS, GÉNOVA - GUACAS en el Departamento del Quindío.

El Objeto del Proyecto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017

El corredor vial Pijao - Guacas, Génova – Guacas, se encuentra a cargo del Departamento del QUINDÍO, por tratarse de vías secundarias, el proyecto se localiza al Sur-oriente del Departamento, iniciando sobre la carrera 6 del casco urbano del municipio de Pijao, donde termina el pavimento hidráulico e inicia el afirmado de la vía (4°19'50.83"N) / 75°42'24.08"W); atravesando los sitios de Las Guaduas y el Siete de Agosto, siendo estos los puntos intermedios del recorrido; con un tramo de vía de 16.6Km hasta empalmar en el municipio de Génova - Guacas, con las coordenadas (4°13''10.38"N / 75°46'41.80"W) con un tramo de vía de 25.4km.


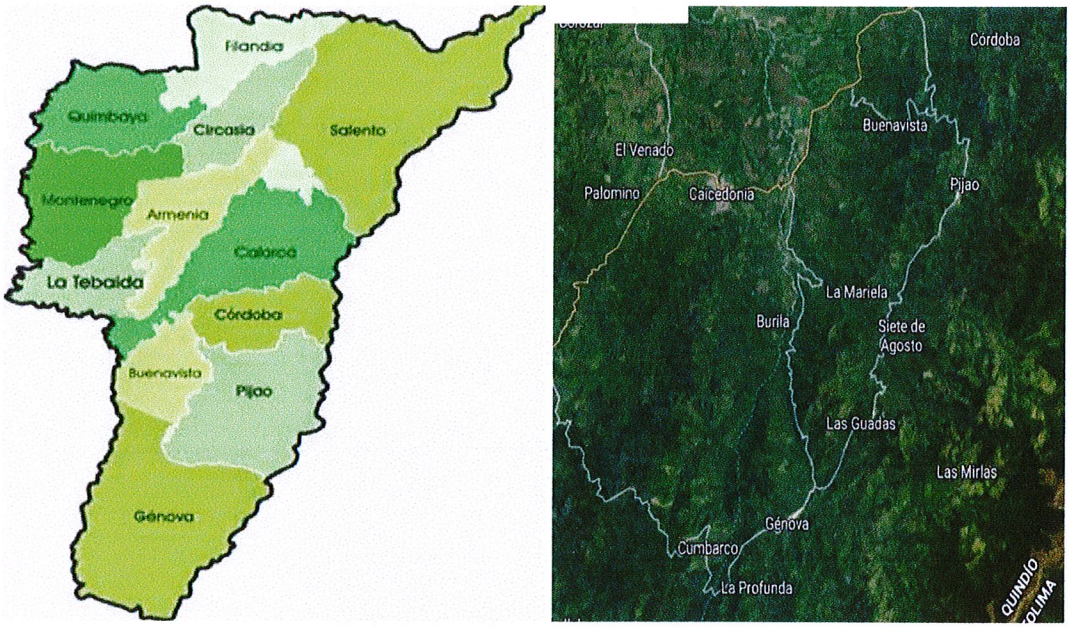


Figura1 - Localización general del Proyecto


2.2. Inventario y estado inicial de la vía

La longitud aproximada de la vía Pijao – Guacas – Génova es de 24.9 Km, subdividida en dos tramos el primero correspondiente al municipio de Pijao que es Pijao – Guacas de longitud 16.7 km y el segundo tramo corresponde al municipio de Génova que es Génova – Guacas con una longitud de 8.2 km. La vía actualmente corresponde a una estructura conformada por una capa de afirmado y materiales granulares de espesores variables. El ancho de la calzada varía entre 4.0 y 5.0 m aproximadamente. La geometría horizontal es bastante irregular, con curvas de radios muy pequeños, algunas inferiores a 20m con deflexiones superiores a 90°; desde el punto de vista vertical el alineamiento presenta dificultades en algunos tramos de gran pendiente, en los cuales se tienen proyectadas las Placa – Huellas.

Existen 4 sitios en el sector de Pijao – Guacas y 5 en el sector Génova - Guacas donde se presenta pérdida de banca, y allí se tiene proyectado la construcción de muros de contención

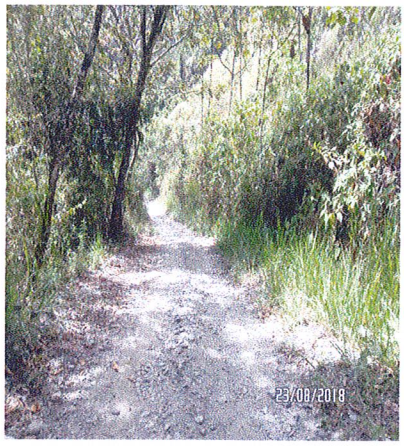

PR 12+839 Aspecto Inicial de la vía

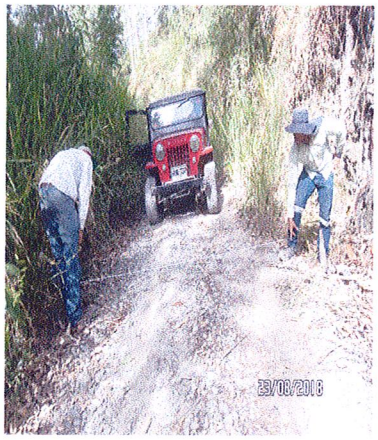


Ancho promedio de la vía 3.7m

Como se observa en el registro anterior, el tramo a intervenir presenta un ancho restringido, lo cual permite una sección inicialmente proyectada de 4.10m que corresponde a dos placas huellas de 0.90 separadas por una franja de piedra pegada 0.90 y dos cunetas de 0.7m y con su respectivo bordillo En visita efectuada por los especialistas de interventoría y contratista (geólogos y geotecnistas), consideran que la rasante existente se podría utilizar como Subrasante y en algunos sectores como sub-base.

2.3 Características técnicas del Proyecto

El proyecto presenta tres características específicas que son, la construcción de placas huella, la construcción de muros de contención y la construcción de alcantarillas u obras transversales; así:

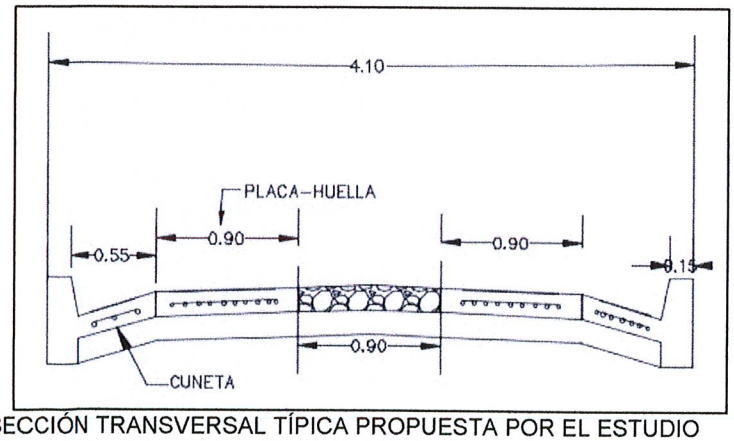

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA PROPUESTA POR EL ESTUDIO

PARA LA VÍA PIJAO – GUACAS – GENOVA

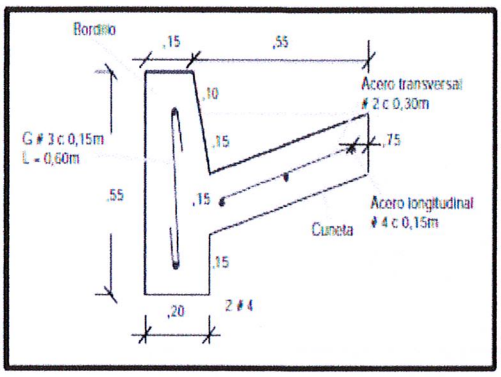


Figura 2.13 Corte Berma-cuneta Sección en la Cuneta

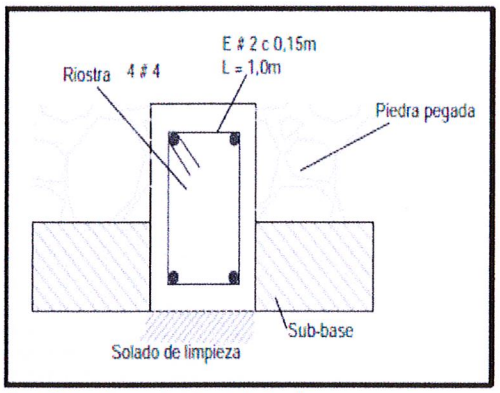


Figura 2.7 Corte Transversal Sección en Piedra Pegada

- Construcción de placas huella entre.

PLACA HUELLA			
PIJAO - GUACAS	Desde	Hasta	Longitud
	3200	3500	300
	5265	5365	100
	7050	7150	100
	7330	7530	200
	10040	10440	400
	12700	12803	103
	14500	14600	100
	16011	16111	100
	Sub - Total		1403

PLACA HUELLA			
GÉNOVA- GUACAS	Desde	Hasta	Longitud
	16808	17108	300
	17857	18157	300
	21200	21380	180
	21430	21530	100
	22930	23115	185
	24400	24590	190
	Sub - Total		1255

Ancho de calzada de 4.10m, con cunetas en concreto de 0.7 m.

- Construcción de muros de contención.

MUROS DE CONTENCIÓN			
PIJAO - GUACAS	Desde	Hasta	Longitud
	2808	0	20
	3550	0	10
	5320	0	16
	8730	0	11,3
	Sub - Total		57

MUROS DE CONTENCIÓN			
PIJAO - GUACAS	Desde	Hasta	Longitud
	22820	0	8
	23360	0	15
	18500	0	7
	18600	0	7
	23120	0	15
	Sub - Total		52

Para los cuales se debe instalar la señalización preventiva previa su inicio de construcción.

- Construcción de alcantarillas

OBRAS DE ARTE			
PIJAO - GUACAS	Desde	Hasta	Cantidad
	11704	0	1
	12010	0	1
	12523	0	1
	12839	0	1
	13259	0	1
	15000	0	1
	15179	0	1
	15947	0	1
	16583	0	1
	7528	0	1
	7565	0	1
	8998	0	1
	9206	0	1
	9324	0	1
	7270	0	1
	14800	0	1
	Sub - Total		16

OBRAS DE ARTE			
GÉNOVA- GUACAS	Desde	Hasta	Cantidad
	17227	0	1
	17355	0	1
	17994	0	1
	19410	0	1
	19860	0	1
	20022	0	1
	20141	0	1
	21680	0	1
	21838	0	1
	21940	0	1
	22019	0	1
	Sub - Total		11

Ajustando los estudios y diseños a la estructura existente de la vía, obras transversales para drenaje en tubería de 36" en reemplazo de algunas existentes de 24".

El abscisado que se presenta en los cuadros anteriores de localización de las obras corresponde a la etapa de formulación del proyecto. El comité departamental de cafeteros del Quindío realizó un nuevo recorrido a la vía durante el presente año, del cual obtuvo una diferencia en las abscisas con respecto a las iniciales.

Por lo anterior expuesto la interventoría solicitó al contratista mediante oficio FNC-825-2018-046 el Comparativo entre la localización de obras del anexo técnico y la de obras determinadas por diseños realizados.

El 19 de noviembre de 2018 el contratista dando respuesta al oficio FNC-825-2018-046 emitido por la interventoría el 14 de noviembre del corriente, hace entrega del comparativo del inventario de obras existentes frente a las obras determinadas por justificación de sus especialistas, el cual relacionó en el siguiente cuadro.

CUADRO CAMBIO EN LA LOCALIZACION DE OBRAS CONTRATO 0498 DE 2018

RESUMEN

TRAMO	# MUNICIPIOS	INICIO	FIN	Placa huella inicial (ml)	Placahuella definitiva (ml)	Alcantarillas iniciales	Alcantarillas definitivas	Muros iniciales	Muros definitivos
1	2	PIJAO - (K0+000)	ALTO DE GUACAS - (K17+050)	1400	1403	16	18	4	4
2		ALTO DE GUACAS - (K17+050)	GENOVA - (K24+400)	1247	1255	11	9	5	4
TOTALES				2647	2658	27	27	9	8

	CONDICIONES INICIALES SEGÚN ANEXO TECNICO					LOCALIZACION DEFINITIVA SEGÚN REVISION DE ESTUDIOS, VISITAS, RELOCALIZACION				
TRAMO	Desde	Hasta	Long.(ML)	Actividades a desarrollar contractuales	OBSERVACIONES	Desde	Hasta	Long.(ML)	Actividades a desarrollar contractuales	OBSERVACIONES
PIJAO - ALTO DE GUACAS	**MUROS**					**MUROS**				
	K2+808		20		Abscisado inicial	K2+770		14,23		1) Longitudes tomadas según Estudios y diseños. 2) Nuevo abscisado
	k3+550		10		Abscisado inicial	K4+280		13,5		1) Longitudes tomadas según Estudios y diseños. 2)Nuevo abscisado
	K5+320		16		Abscisado inicial	K7+380		10		1) Longitudes tomada según Estudios y diseños. 2) Nuevo abscisado.
	k8+730		11,3		Abscisado inicial	K8+670		17		1) Longitudes tomada según Estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	TOTAL MUROS		57			**TOTAL MUROS**		55		
	PLACA HUELLA					**PIACA HUELLA**				
	K3+200	K3+500	300		Abscisado inicial	K3+169	K3+457	288		
	K5+265	K5+365	100		Abscisado inicial	K6+705	K7+005	300		
	K7+050	K7+150	100		Abscisado inicial	K10+165	K10+445	280		
	K7+330	K7+530	200		Abscisado inicial	K11+132	K11+257	125		Punto critico fue cambiado por problemas geologicos de la zona. se aclara que se distribuyo el el tramo siguiente de placa huella.
	K10+040	K10+440	400		Abscisado inicial	K12+275	K12+400	125		
	K12+700	K12+803	103		Abscisado inicial	K12+400	K12+580	180		
	K14+500	K14+600	100		Abscisado inicial	K12+840	K13+070	230		
	K16+011	K16+111	100		Abscisado inicial					
	TOTAL PLACA HUELLA		1403			**TOTAL PLACA HUELLA**		1403		
	OBRAS TRANSVERSALES (OBRAS DE ARTE)					**OBRAS TRANSVERSALES (Obras de Arte)**				
	K7+270			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K4 + 280			Alcantarilla 36"	1) Segun Estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K7+528			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K6 + 670			Alcantarilla 36"	1) Segun Estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K7+565			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K6 + 878			Alcantarilla 36"	1) Segun Estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K8+998			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K6+960			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K9+206			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K7 + 280			Alcantarilla 36"	1) Obra propuesta ya que se encuentra colmatada y deterorada la cula esta afectando la via 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K9+324			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K7 + 380			Alcantarilla 36"	1) Segun estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K11+704			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K8+350			Alcantarilla 36"	1) Obra neceserania por estancamiento de agua 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K12+010			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K8 + 640			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K12+523			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K8+750			Alcantarilla 36"	1) Obra neceserania por afloramiento de agua 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K12+839			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K10+150			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K13+259			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K10 + 350			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K14+800			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K10 + 545			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.
	K15+000			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K10 + 660			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños. 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado.

	K15+179			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K10 + 800			Alcantarilla 36"	1) Obra necesaria estancamiento de agua 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	K15+947			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K11 + 933			Alcantarilla 36"	1) obra necesaria puesto que no existe una obra de inicio de la placa huella existente 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	K16+283			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K12+905			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
						K13+000			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
						K16 + 668			Alcantarilla 36"	1) obra que se encuentra colapsada 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	TOTAL OBRAS TRANSVERS		16			**TOTAL OBRAS TRANSVERS**		18		
			MUROS					**MUROS**		
	K18+500		7		Abscisado inicial	K18+964		7		1) Longitudes tomada según diseños 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	K18+600		7		Abscisado inicial	K19+163		7.25		1) Longitudes tomada segun diseños 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	K22+820		8		Abscisado inicial	K22+321		7		1) Longitudes tomada según diseños 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	K23+120		15		Abscisado inicial	K22+530		8		1) Longitudes tomada según diseños 2) hay que tener en cuenta el cambio del abscisado
	K23+360		15		Este muro se excluyo porque según los especialista la zona presenta inestabilidad geologica.					Este muro se excluyo porque según los especialista la zona presenta inestabilidad geologica.
	TOTAL MUROS		52			**TOTAL MUROS**		29		
			PLACA HUELLA					**PLACA HUELLA**		
	K16+808	K17+158	300		Abscisado inicial	K17+657	K18+002	345		
	K17+857	K18+207	300		Abscisado inicial	K18+002	K18+757	755		
	K21+200	K21+350	180		Abscisado inicial	K22+232	K22+332	100		
	K21+750	K21+850	100		Abscisado inicial	K23+755	K23+810	55		
	K22+930	K23+030	180		Abscisado inicial					
	K24+400	K21+510	187		Abscisado inicial					
ALTO DE GUACAS - GENOVA	**TOTAL PLACA HUELLA**		1247			**TOTAL PLACA HUELLA**		1255		
			OBRAS TRANSVERSALES					**OBRAS TRANSVERSALES**		
	K17+277			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K17 + 675			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K17+355			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K17+814			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K17+994			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K17+846			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K19+410			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K17+921.5			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K19+860			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K18+102			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K20+022			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K18+444.5			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K20+141			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K18 + 757			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K21+680			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K18 + 964			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K21+838			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial	K19 + 413			Alcantarilla 36"	1) Según estudios y diseños 2) Nuevo abscisado
	K21+940			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial					No se incuye por diseño hidráulico
	K22+019			Alcantarilla 36"	Abscisado inicial					No se incuye por diseño hidráulico
	TOTAL OBRAS TRANSVERS		11			**TOTAL OBRAS**		9		

OBSERVACIONES: 1) el abcisado se modifico debido al que el inicial se tenian inconsistencias, por lo cual se opto por realizar un nuevo abcisado el cual corresponde asi : K0 + 000 obra transversal iniciando la via en Pijao - K17 + 050 Alto de guacas - K25 + 400 glorieta entrada al municipio de Genova. El nuevo abscisado ha sido socializado , verificado y aprobado por interventoria, territorial de INVIAS, contratista.

Firma:
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
Representante legal o apoderado del Contratista
Cedula : 89004274
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
COMITE DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO

Firma:
Nombre:
Representante legal del Interventor
Matricula No.

Rdo
Henry Garcia M.
Res. interventoria
nov 9-18

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

El Contrato de Obra N.° 498 de 2018 tiene como objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS N EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017.

Contrato N°	: 498 de 2018
Contratista	: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Valor Inicial	: $5.419.238.921,23 moneda corriente
Plazo	: Treinta y uno (31) de diciembre de 2018
Orden de Inicio	: 08 de agosto de 2018
Fecha de Terminación	: Treinta y uno (31) de diciembre de 2018
Contacto	: JOSE MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS Director Ejecutivo Calle 44B No.57 A-76 Tel: 3 150146

3.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes Noviembre 2018

Durante el presente mes el contratista continúo con la realización de los Estudios y Diseños, entregando finalmente todos los Volúmenes requeridos.

Se comenzó a acopiar material de subbase en el sector de puente tabla el 23 de noviembre pero fue suspendió debido al estado del tiempo con intensas lluvias.
La interventoría revisó documentos presentados por el contratista respecto a los Volúmenes de Estudios y Diseños que presentaban ajustes hechos, debido a las observaciones emitidas por la interventoría.

En el presente mes no se realizaron actividades de ejecución de obras en la vía. Lo demás se consigna en los informes semanales y tiene que ver con requerimientos previos necesarios para comenzar con dichas actividades de obra

Comités Técnicos del Mes de Noviembre 2018: (ver anexos)

- No.15 - del 02 de noviembre de 2018
- No.16 - del 09 de noviembre de 2018
- No.17 - del 16 de noviembre de 2018
- No.18 - del 23 de noviembre de 2018
- No.19 - del 30 de noviembre de 2018

Informes Semanales del Mes de Noviembre 2018: (ver anexos)

- N° 13 del 28 octubre al 03 de noviembre de 2018
- N° 14 del 04 al 10 de noviembre de 2018
- N° 15 del 11 al 17 de noviembre de 2018
- N° 16 del 18 al 24 de noviembre de 2018
- N° 17 del 26 de noviembre al 01 de diciembre de 2018

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto

En el *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3* se hace una descripción del avance del proyecto del período 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*, en este período no se relaciona maquinaria y equipo porque no se realizó actividad de ejecución de obra.

4.3 Personal contrato de obra

En el *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.* En este período se incluye el personal del contratista que participó en el proyecto durante el periodo 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2018.

4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra

En el *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8* Durante el período 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018, del contrato de obra No. 498 de 2018, no presenta facturación porque no se ha dado inicio a ejecución de obras en la vía y no se ha generado cobro por los Estudios y Diseños, recientemente aprobados.

4.5. Estado general del tiempo

En el *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10* se registra el estado del tiempo en el área del proyecto para este período.

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

En el ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11 Para el presente período no se realizaron ensayos de laboratorio en el proyecto porque no se ejecutaron actividades constructivas.

4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12*, presenta el seguimiento de la Interventoría sobre el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social del personal que labora para el Proyecto, en este período.

4.8 Informe avance físico-financiero contrato de obra

El *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14* Para el presente período no se reporta avance físico de la obra porque no se ha dado inicio a la etapa constructiva.

4.9 Seguimiento a garantías y seguros contrato de obra

El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE

OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15. Para el período comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018, no hubo modificaciones a las pólizas de garantía presentas por el contratista.

4.9.1 Seguimiento a la inversión anticipo contrato de obra

El ANEXO 10. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1. En comité técnico celebrado el 14 de agosto de 2018 en las instalaciones del comité departamental de cafeteros, el contratista anunció la renuncia al anticipo del contrato, pues trabajará con recursos propios.

4.9.2 Acta de comité de obra

El ANEXO 13. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1. Se adjuntan copias de las actas de los comités técnicos efectuados durante el periodo 01 de noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

4.9.3 Informes semanales

El ANEXO 14. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Se adjunta copia de los informes semanales que fueron elaborados durante el presente mes de noviembre.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato

El Contrato de Interventoría N.º 825 de 2018, tiene como objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contrato Nº	: 825 de 2018
Contratista	: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

DE COLOMBIA

Valor Inicial	: $ 518.020.310 MONEDA CORRIENTE- IVA
Plazo Inicial	: HASTA EL 07 ABRIL DE 2019
Orden de Inicio	: 08 DE AGOSTO DE 2018.
Fecha de Terminación	: HASTA EL 07 DE ABRIL DE 2019
Contacto	: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
	Carrera 21 No. 100-20 Ofic. 602. Bogotá DC

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes.

Además de las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y en los respectivos contratos, la Interventoría ejecutó las siguientes actividades:

✓ Trámite adecuado de la correspondencia, dando respuestas a las comunicaciones enviadas por el Contratista.

✓ Solicitar al contratista la entrega de manera oportuna de los documentos contractuales del contrato de obra 498 de 2018.

✓ Se realiza visita de la especialista Social de la interventoría el 10 de noviembre de 2018 con el fin de hacer acompañamiento a las reuniones de socialización y hacer seguimiento al proyecto social del contrato.

✓ Reuniones semanales con el contratista para la realización de los comités de seguimiento al contrato 498 de 2018 durante el mes de noviembre de 2018.

✓ Se realizó visita a la escombrera de Machángara localizada en el Km 3

de la vía Armenia - Montenegro, la cual recibirá al contratista los escombros que resulten de la ejecución de la obra.

5.3. Informes Especialistas de Interventoría

Para el presente período, se presentan informes de especialistas de las áreas Social, Estructural, y Ambiental de la interventoría.

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo contrato de interventoría

El ANEXO 15. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Para el presente periodo, se relaciona el equipo disponible con el que cuenta la interventoría para el proyecto.

6.2. Personal contrato de interventoría

El ANEXO 16. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7. En el formato mencionado, se relaciona el personal que participó en el proyecto, para el presente mes de noviembre.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El ANEXO 17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el formato mencionado se detalla este informe.

6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

El ANEXO 18. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Se verificó la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal de interventoría que a la fecha labora en el proyecto.

6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El ANEXO 19. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Se relacionaron las garantías entregadas a la entidad contratante, INVIAS, las cuales a la

fecha actual no han sido modificadas.

6.5.1. Seguimiento a la inversión del anticipo del contrato de interventoría.

El ANEXO 20. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Como se mencionó en el anterior informe mensual, la Interventoría renunció de manera voluntaria al anticipo del 20% del contrato de interventoría. Esta renuncia la realizó mediante comunicación ADM-INV-825-2018-023 de fecha 10 de septiembre de 2018 dirigida al INVIAS, y con radicado 77060 de fecha 10 de septiembre de 2018. Se anexa comunicado.

6.5.2. INFORMACION DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Actividades susceptibles de producir impactos

Se identifican como actividades susceptibles de producir afectaciones ambientales, el transporte, descargue y extendido de materiales para la construcción obras en la vía, el empleo de la maquinaria y equipos por la generación de contaminantes atmosféricos y generación de ruido, la presencia de trabajadores en la vía, así como también las posibles molestias que se lleguen a causar a la comunidad y a los usuarios de la vía.

Recurso Flora

La ejecución del proyecto no contempla la apertura de la vía, ya que se ejecutarán obras de mejoramiento en el corredor existente tales como placa huellas, muros de contención y reposición de obras transversales por colapso o asentamiento.

El contratista para el presente periodo se encuentra haciendo la solicitud de permiso de ocupación de cauce ante la CRQ.

La interventoría revisó el PAGA presentado por el contratista en su tercera versión, la cual fue objeto de observaciones por parte de la interventoría para sus correspondientes correcciones.

Campamento y Áreas Temporales

Campamentos: Para el desarrollo del proyecto no se construirán campamentos teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto se centra en los Municipios de Pijao y Génova, los cuales cuentan con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía. El personal residirá en viviendas alquiladas, aledañas y propias de estos municipios.

Oficina: La oficina del Contratista en el municipio de Pijao funciona en las instalaciones del Comité Municipal de cafeteros de Pijao, localizado en la plaza principal del municipio.

SAU (Servicio de Atención al Usuario): Para las comunidades y la población en general presentes en el área de influencia directa del Proyecto, el Contratista ha establecido un Centro de Servicio de Atención al Usuario (SAU) ubicado en las instalaciones mencionadas del comité municipal de cafeteros, en el cual la comunidad tendrá la posibilidad de encontrar respuesta clara y oportuna para cada una de sus inquietudes relacionadas con el Proyecto. El SAU, permanecerá disponible para el municipio de Pijao los días martes en la tarde, miércoles en la mañana, jueves en la tarde y sábados en la mañana. Para el municipio de Génova está disponible los días martes, jueves y viernes en la tarde y sábados en la mañana.

PERSONAL DEL CONTRATISTA:

Durante el mes de noviembre, el Comité de Cafeteros del Quindío cuenta con todo el personal técnico formulado al inicio del proyecto.

MAQUINARIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Para el presente período, el contratista de obra no utilizó maquinaria debido a que no se han iniciado las actividades de obra y se estaba dando terminación a la etapa de los Estudios y Diseños.

7. ANEXOS

7.1. *Relación de correspondencia.*

El *ANEXO 21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Se entrega* el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el presente período.

7.2 Registro Fotográfico

El *ANEXO 22. REGISTRO FOTOGRÁFICO*. Se entrega el formato implementado por la Interventoría para el registro fotográfico de las actividades realizadas por la interventoría y el contratista a los sitios de obra.

7.3 Informe Especialistas

El *ANEXO 23. INFORME ESPECIALISTAS*, incluye los Informes elaborados por los Especialistas del Proyecto, referente al desarrollo de las actividades del contrato de obra para este período.

7.4 Libro de Obra

El ANEXO 24. LIBRO DE OBRA. Para el presente periodo se comenzó a llevar bitácora de obra porque el contratista ya terminó y se aprobó la etapa de Estudios y Diseños.

ANEXO 1. RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

PERIODO MES: nov-18

CONTRATO DE OBRA No.: 0498-2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACION: 08 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $5,419,238,923
VALOR ACUMULADO: $5,419,238,923
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIONALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIJAO-GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100
PLACA HUELLAS	M	1403
MUROS DE CONTENCION	M	57,3
ALCANTARILLAS	UNIDAD	16

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
ESTUDIO Y DESEÑOS	%	95
PLACA HUELLAS	M	0
MURO DE CONTENCION	M	0
ALCANTARILLAS	UNIDAD	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Interventl (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:		-		-				
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES		
	Año	Valor
118 DP	25/01/2018	5.419.238.921,23
418 RP	26/01/2018	5.419.238.922,23
	Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	EJECUTADO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 49.517.404,42	100,00%
GESTIÓN PREDIAL	$ -	
GESTIÓN SOCIAL	$ 45.073.126,01	
GESTIÓN AMBIENTAL (PAGA)	$ 45.073.126,01	0,00%
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN (RESO 1860/2013)	$ 11.690.000,00	100,00%
VALOR TOTAL	151.353.656,44	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25/01/2018	01/07/2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/01/2018	01/07/2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/01/2018	31/12/2021
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2018	31/12/2023

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/01/2018	31/12/2018
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: DC 40307 (12/09/2018)

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria emitió aprobación a los diseños de muros de contención el día 10 de noviembre de 2018 mediante el oficio FNC-825-2018-044.

La interventoria mediante oficio FNC-825-2018-047 del 14 de noviembre de 2018, da respuesta a inquietud del contratista sobre replanteo y localización de obras, ratificándole que la localización topográfica de las obras transversales y de construcción a ejecutar, es una actividad realizada en el ítem 1P Complementación y ajustes a estudios y diseños base por el contratista de obra, y por tanto no se puede pagar nuevamente como actividad de replanteo.

Mediante oficio ADM-FNC-825-2018-044 del 20 de noviembre de 2018, la Interventoria ratifica la aprobación de presupuestos para el contrato de obra 0498.

Con el oficio ADM-INV-825-2018-055 LA Interventoria dejó radicada ante el INVIAS el acta final de aprobación de Estudios y Diseños del contrato 0498.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El contratista se encuentra presentando atraso en la ejecución de obras para el contrato 0498, toda vez que ya fue culminada la etapa de estudios y diseños y no hay avance en ninguna actividad; a pesar de ser requerido el contratista mediante los oficio ADM-FNC-825-2018-020 del 26 de noviembre de 2018.

Firma

Nombre: Andrea del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoria
Matrícula No. 2520266675 CND

Original Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdireccion Administrativa)
Copias Interventor, Direccion Territorial

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE **CONTRATO No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Durante el presente periodo no hubo maquinaria en la obra debido a que no se adelantaron actividades de construcción.

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER JORDAN
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABLO ALBERTO VALENCIA R.	DIRECTOR OBRA	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
WILKER JORDAN	INGENIERO RESIDENTE 1	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
LIBERTH DAVID GUZMAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE 2	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
FABIAN SIERRA MORALES	INGENIERO AUXILIAR 1	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	INGENIERO AUXILIAR 2	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
MARIA INES VELEZ SANCHES	RES.SOCIAL GÉNOVA	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
GLORIA ELENA PELAEZ	RES.SOCIAL PIJAO	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: WILKER JORDAN
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	418	005-2402-0603-2018-130101-0001	A63000	NACION	498	5.419.238.923
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 5,419,238,923

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: PABLO ALBERTO VALENCIA R
Director de Obra
Matricula No.: QND 031

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual de interventoria Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	1	DE	1

FECHA	30	11	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/11/2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES OCTUBRE																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	15			21	24	19	21	24			20	24	24	17	10		24	24	24	15	9	24		7	9	10	9	6		428
Lluvias moderadas			4			3											8						2			5	1	6		5		34
Lluvias intensas			5					5	3				4			7	6					9	13			12	14	8	15	13		114
Total	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24		576

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILKER JORDAN
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: No se ha dado inicio con la etapa de construcción de obras y por esto no se tienen ensayos de laboratorio.

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: Pablo Alberto Valencia R
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matrícula No.: QNB 031

Firma

Nombre: Andrea del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoria
Matrícula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
PABLO ALBERTO VALENCIA R	DIRECTOR OBRA	NOVIEMBRE	30	7.505.550	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	8486702591	30		8486702591	0	8486702591	30	SERVICOL S.A.S.	
WILKER JORDAN	INGENIERO RESIDENTE 1	NOVIEMBRE	30	1.094.909.620	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	8486702591	30		8486702591	30	8486702591	30	SERVICOL S.A.S.	
LIBERTH DAVID GUZMAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE 2	NOVIEMBRE	30	10.303.451	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	8486702591	30		8486702591	30	8486702591	30	SERVICOL S.A.S.	
FABIAN SIERRA MORALES	INGENIERO AUXILIAR 1	NOVIEMBRE	30	13.993.080	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	8486702591	30		8486702591	30	8486702591	30	SERVICOL S.A.S.	
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	INGENIERO AUXILIAR 2	NOVIEMBRE	30	18.468.702	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	8486702591	30		8486702591	30	8486702591	30	SERVICOL S.A.S.	
MARIA INES VELEZ SANCHEZ	RES.SOCIAL GÉNOVA	NOVIEMBRE	30	41463527	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	8486702591	30		8486702591	30	8486702591	30	SERVICOL S.A.S.	
GLORIA ELENA PELAEZ	RES.SOCIAL PIJAO	NOVIEMBRE	30	30338367	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	8486702591	30		8486702591	0	8486702591	30	SERVICOL S.A.S	
																							x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	8486702591	30		8486702591	30	8486702591	30	SERVICOL S.A.S	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. Mediante oficio FNC-825-2018-069 radicado el 22 de enero de 2019, se solicitó a la Federación de Cafeteros, las resoluciones o documentos de pensión del ingeniero Pablo Alberto Valencia y la Trabajadora social Maria inés Vélez, así mismo el vinculo que tiene con SERVICOL y el cambio del nivel de riesgo de la Trabajadora social del nivel 3 al nivel 5

Firma
Nombre : PABLO ALBERTO VALENCIA R
Director de Obra
Matricula No.: QND 031

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520266675 CND

Original Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	393074494	8486702591	E	2018/12/07	2018/12/07	BANCOLOMBIA	0	$308,966,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: ESPECIALIZADOS ARMENIA (9 Afiliados)																						$17,916,000	$2,907,200			$24,616,000	$984,700			$24,616,000	$984,700			$24,616,000	$1,505,600		$0	$0	$6,382,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$112,200		$0	$0	$848,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$112,200		$0	$0	$848,200
1	CC	30338367	PELAEZ GLORIA																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF43	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0	$608,100
2	CC	41463527	VELEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF43	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0	$240,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (7 Afiliados)																						$15,616,000	$2,539,200			$20,016,000	$800,700			$20,016,000	$800,700			$20,016,000	$1,393,400		$0	$0	$5,534,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (7 Afiliados)																						$15,616,000	$2,539,200			$20,016,000	$800,700			$20,016,000	$800,700			$20,016,000	$1,393,400		$0	$0	$5,534,000
3	CC	1094913698	ALVAREZ CATERIN							X											25-14	30	$4,050,000	$688,600	EPS010	30	$4,050,000	$162,000	CCF43	30	$4,050,000	$162,000		30	$4,050,000	$281,900	30	$0	$0	$1,294,500
4	CC	18468702	GRANADA PABLO																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF43	30	$2,100,000	$84,000		30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	$650,200
5	CC	10303451	GUZMAN LIBERTH																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS010	30	$3,100,000	$124,000	CCF43	30	$3,100,000	$124,000		30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0	$959,800
6	CC	1094909620	JORDAN WILKER							X											230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS044	30	$3,100,000	$124,000	CCF43	30	$3,100,000	$124,000		30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0	$959,800
7	CC	9790751	LOPEZ JOHAN																		230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS037	30	$1,166,000	$46,700	CCF43	30	$1,166,000	$46,700		30	$1,166,000	$81,200	30	$0	$0	$361,200
8	CC	13993080	SIERRA FABIAN																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF43	30	$2,100,000	$84,000		30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	$650,200
9	CC	7505550	VALENCIA PABLO																			0	$0	$0	EPS044	30	$4,400,000	$176,000	CCF43	30	$4,400,000	$176,000		30	$4,400,000	$306,300	30	$0	$0	$658,300
Total			**Afiliados(9)**																				$17,916,000	$2,907,200			$24,616,000	$984,700			$24,616,000	$984,700			$24,616,000	$1,505,600		$0	$0	$6,382,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	393074494	8486702591	E	2018/12/07	2018/12/07	BANCOLOMBIA	0	$308,966,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,907,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,056,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,850,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,505,600
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	9	$1,505,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$984,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	$984,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$984,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$286,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$392,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$222,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$84,000
TOTAL				9	$6,382,200

2018/12/07 05:22 PM

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez DE VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO

12 ENE. 2005

Que laboró un total de : 10156 dias, 1450 semanas.

Que nació el 05 de agosto de 1940 y cuenta con más de 55 años de edad.

Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

Que adquirió el statua jurídico el 05 de agosto de 2003.

Que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario de 9 años 9 meses, conforme a lo establecido en el articulo 36 de la Ley 100/93, , y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2003 , asi:

FACTORES	I.P.C	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO ACTUAL(IPC)	PROPORCION POR AÑO
1994 ASIGNACION BASICA	22.59	$ 487903.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 14230.50		
(Promedio mensual de 270 dias)		$ 502133.50	1680503.40	129269.48
(Aplica: IPC94-IPC95-IPC96-IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1995 ASIGNACION BASICA	19.46	$ 575726.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 16792.01		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 592518.01	1617583.50	165906.00
(Aplica: IPC95-IPC96-IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1996 ASIGNACION BASICA	21.63	$ 1286342.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 37518.31		
Promedio mensual de 360 dias)		$ 1323860.31	3025413.95	310298.87
(Aplica: IPC96-IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1997 ASIGNACION BASICA	17.66	$ 1389250.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 40519.79		
BONIFICACION POR COMPENS		$ 77181.00		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1506950.79	2831398.56	290399.85
(Aplica: IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1998 ASIGNACION BASICA	16.70	$ 1701059.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 49614.25		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1750673.25	2795145.20	286681.56
(Aplica: IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1999 ASIGNACION BASICA	9.23	$ 1905187.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 55567.92		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1960754.92	2682574.14	275135.81
(Aplica: IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				

PENSIONES
CORRESPONDENCIA
24 FEB 2005
RAD. 2305
No. FOLIOS 4
COD SOLIC.

Sin Armenia 22/02/05

930432

21 ENE. 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE

RESOLUCION No. 2813 del 2004

RADICADO Nº 14716/2004

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez.

La Subgerencia de Prestaciones Económicas, en uso de las atribuciones conferidas por la resolución 242 del 22 de enero de 2004, y en cumplimiento de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que el(a) señor(a) VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7505550 de ARMENIA, solicita a esta Entidad el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia por vejez radicada bajo el Nº 14716 de fecha 19 de abril de 2004.

Que el artículo 36 de la ley 100/93 establece:

"REGIMEN DE TRANSICION. : La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o mas años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o mas años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice de Precios al Consumidor según certificación expedida por el DANE."

Que el(a) peticionario(a) aportó para la pensión los siguientes tiempos:

ENTIDAD	DESDE	HASTA	DIAS DEDUC	DIAS LABORAD
CAJA NAL.DE PREV.SOCIAL CONTRATO QUIN	19751015	19780830	0	1036
MINISTERIO DE TRANSPORTE	19780901	19951030	0	6180
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	19951101	20031230	0	2940
			0	10156

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez DE VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

21 ENE 2005

2000 ASIGNACION BASICA	8.75	$ 2069801.00			
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 60696.83			
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2130497.83	2668502.31	273692.54	
(Aplica: IPC00-IPC01-IPC02)					
2001 ASIGNACION BASICA	7.65	$ 2150032.67			
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 63029.50			
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2213062.17	2548888.49	261424.46	
(Aplica: IPC01-IPC02)					
2002 ASIGNACION BASICA	6.99	$ 2264236.00			
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 66040.25			
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2330276.25	2493162.56	255708.98	
(Aplica: IPC02)					
2003 ASIGNACION BASICA	6.49	$ 2368841.75			
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 66040.25			
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2434882.00	2434882.00	249731.49	
(No aplica IPC)					
			T O T A L =	$ 2.498.249.05	

I.P.C. --> 1994:22.59 1995:19.46 1996:21.63 1997:17.68 1998:16.70
1999: 9.23 2000: 8.75 2001: 7.65 2002: 6.99

Pension: ($2.498.249.05X75%) = $1.873.686.79, SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 M/CTE .

DISTRIBUCION A CARGO :	DED.	DIAS
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	0	10156
		10156

PROPORCION A CARGO :	VALOR-CUOTA
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	$ 1.873.686.79
	$ 1.873.686.79

Efectiva a partir del 01 de enero de 2004.

Son disposiciones aplicables: Ley 100/93 art. 36. Dcto 1158/94. Dcto 01/84..

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor del(a) señor(a) VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO ya identificado(a), de una pensión mensual vitalicia por vejez, en cuantia de ($1,873,686.79) UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 M/CTE efectiva a partir del 01 de enero de 2004 . El peticionario debe demostrar retiro definitivo del servicio en los términos previstos por la Ley, para el disfrute de esta pensión.

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez DE VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO

21 ENE. 2005

ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo anterior, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley con observancia del turno respectivo.

ARTICULO TERCERO: Deducir de cada mesada pensional el valor correspondiente para los servicios médico-asistenciales, Ley 100/93. Para tal fin el peticionario debe allegar fotocopia del formulario único de inscripción o certificación de la EPS respectiva. De no aportarse lo anterior al momento de la notificación, la Caja Nacional de Previsión Social EICE, salva cualquier responsabilidad por el destino del citado descuento.

ARTICULO CUARTO : Esta pensión estará a cargo de:

E N T I D A D	DIAS	VALOR-CUOTA
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	10156	$ 1.873.686.79
		$ 1.873.686.79

ARTICULO QUINTO : La presente pensión estará sujeta a todas las incompatibilidades legales.

ARTICULO SEXTO : Notifíquese al INTERESADO haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede interponer por escrito el recurso de Reposición ante la Subgerencia de Prestaciones Económicas. De este recurso podrá hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA ARISTIZABAL BOTERO
SUBGERENTE PRESTACIONES ECONOMICAS

Sustanció: EDGAR RODRIGUEZ ACEVEDO
EDRO - P1 - 12/01/2005

Revisó: LIDA P. MANJARREZ

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
SECCIONAL QUINDIO

PRESTACIONES ECONOMICAS

Armenia Q. 14 FEB. 2005

Notifique personalmente a INTERESADO

La anterior Providencia [illegible] resolución que [illegible]

El notificado

C.C. Nº 7.507.670

El Notificador

equidad
riesgos laborales

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.


CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) GLORIA ELENA PELAEZ identificado(a) con CC número 30338367 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS		
N° Identificación:	900568326		
Centro de trabajo:	Riesgo V - Tarifa - 6.960%	Sueldo básico:	$ 2.300.000
Inicio de cobertura:	10/07/2018	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	Activo

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web https://www.laequidadarl.coop el dia: viernes, 25 de enero de 2019 a las 08:29 AM

Cordialmente,



Maria Isabel Ortiz Quintero

Coordinador Técnico y de Procesos

LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) MARIA INES VELEZ SANCHEZ identificado(a) con CC número 41463527 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS		
N° Identificación:	900568326		
Centro de trabajo:	Riesgo V - Tarifa - 6.960%	Sueldo básico:	$ 2.300.000
Inicio de cobertura:	10/07/2018	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	Activo

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web https://www.laequidadarl.coop el dia: viernes, 25 de enero de 2019 a las 08:29 AM

Cordialmente,

Maria Isabel Ortiz Quintero

Coordinador Técnico y de Procesos

LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA No: _____

PERIODO MES: NOVIEMBRE

VALOR BÁSICO ACTA: $ -

CONTRATO DE OBRA No : 0498 - 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

RUTA:

TRAMO: PIJAO - GÉNOVA

PLAZO INICIAL: 31-dic-18 — 4,83

FECHA DE INICIACIÓN: 8-ago-18

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $5,419,238,923

VALOR ACUMULADO: $ -

ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 31-dic-18

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-18

VALOR ADICIONALES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 498

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0498 - 2018	3,80	31/12/2018	-	-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	5.419.238.921,23
Total	5.419.238.921,23

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN	30	11	2018
	(Dia)	(Mes)	(Año)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 / PR / PR / PR / PR / PR / PR / PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km-mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula No. QND 031

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Bogotá D.C; 30 de enero de 2018

PDS18C01103

Doctor
FROILAN MORALES CANTILLO
Subdirector
Subdirección Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60
Ciudad

Asunto: Pólizas Contratos INVIAS

Respetado Dr: Morales

Para su información y fines pertinentes, adjunto original de las pólizas de los contratos relacionados, con sus respectivos recibos de cancelación:

- Contrato 499-2018 Póliza Cumplimiento No. 2039068-7 de Suramericana - Responsabilidad Civil No. 0533591-9 de Suramericana
- Contrato 498-2018 Póliza Cumplimiento No. 2039272-3 de Suramericana - Responsabilidad Civil No. 0533641-9 de Suramericana
- Contrato 497-2018 Póliza Cumplimiento No. 2039136-1 de Suramericana - Responsabilidad Civil No. 0533601-4 de Suramericana
- Contrato 496-2018 Póliza Cumplimiento No. 2039118-7 de Suramericana - Responsabilidad Civil No. 0533596-5 de Suramericana
- Contrato 495-2018 Póliza Cumplimiento No. 2038848-0 de Suramericana - Responsabilidad Civil No. 0533577-5 de Suramericana

Atentamente,

GERARDO ESTEBAN CHAMORRO S.
Coordinador de Infraestructura

Anexo: 1 original de cada contrato

ANEXO 10. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	11	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018 — CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 — INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: El contratista informó que no hara solicitud de anticipo del contrato
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes ...os de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre) PABLO ALBERTO VALENCIA R
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matrícula No.: QND 031

(Firma)
(Nombre) ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 13. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-F
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	02 (Día) 11 (Mes) 18

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
HENRY GARCIA MORENO	ING. RESID. INTERVENT.	COPEBA LTDA
Maria Inés Vélez Sánchez	Residente Social	Comité de Cafeteros
Fabian Enrique Otero Montes	Ing Auxiliar F. Social	Comite cafe
LIBERTH DAVID GUTIERREZ MOSQUERA	ING RESIDENTE	COMITE DE CAFETEROS.
Gloria Elena Pelaez	Residente Social Pijao	Comité de Cafeteros del Quindío
Pablo Alejandro Granada Valencia	Ing. Aux Frente Pijao	Comité de cafeteros del Quindío
Wilmer A. Jordan	ING. RESIDENTE	COMITE CAFETEROS QUINDIO.
PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	DIRECTOR OBRA	COMITE CAFETEROS
HERNAN BARRETO AGUDELO	SUPERV. INTERVENT	D.T. INVIAS. QUINDIO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: Seguimiento y control a las actividades programadas y ejecutadas por el contratista durante la semana y confirmacion del cumplimiento de compromisos.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se hizo lectura del comité anterior y se aprobó por parte de los presentes en este comité.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1 - Diagnostico de la entrega y aprobacion de estudios y diseños.
2 - Cumplimiento del compromiso adquirido por contratista (presupuesto)
3 - Realizacion de visita pendiente a escombrera.
4 - Actividades a realizar durante la proxima semana
5 - Cumplimiento de programacion actividades socio-ambientales.
6 - otros temas a tratar.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1º Estudio de Tránsito: Aprobado por Interventoría.
Trazado y diseño geométrico: El Ing. Henry García informa que el trazado y diseño geométrico está aprobado por Interventoría. El Contratista se compromete a entregar los planos ploteados el miércoles 7 de Nov-2018, con las características de escala que sean legibles.
geología para Ingeniería y geotecnia: Aprobado por Interventoría.
Estudio de suelos para el Diseño de fundaciones de puentes, obras de drenaje, otras estructuras de contención y placa huella: Aprobado por Interventoría.
Estudio geotécnico para obras de contención, placahuellas y demás Obras: Aprobado por Interventoría, en oficio recibido en el día de hoy 2 de nov-2018.
Estudio de hidrología e hidráulica: Volumen aprobado por Interventoría.
Estudio y diseños de estructuras: Está pendiente de una última revisión por parte de la Interventoría.
Informe final ejecutivo: De acuerdo al oficio ADM-FNC-825-2018-016, se hacen algunas observaciones de forma los cuales y de acuerdo con el compromiso del Comité de Cafeteros serán corregidos para el miércoles 7 de nov-2018 mediante una adenda.
PACA: Aprobada la gestión social planteada en el PACA mediante oficio FNC-825-2018-041

2º Presupuesto: Se entregó en el día de hoy 2 de nov-2018, el Presupuesto y análisis de precio unitarios a la Interventoría con copia al Ingeniero Hernán Barrete. El Ing. Hernán Barrete solicita a la Interventoría elaborar un cuadro comparativo de precios unitarios, con las observaciones respectivas a cada ítem. La Interventoría lo presentará el miércoles 7 de nov-2018.
3º Se realizará visita a la escombrera Machángara el día jueves 8 de noviembre-2018.
4º El Contratista enviará el día de hoy, por correo electrónico, la programación de la próxima semana.
5º Las actividades socioambientales programadas para la próxima semana, se cumplirán para el miércoles 7 de nov-2018. Radicación ante la CRQ de la solicitud de la ocupación de cauce y la selección de la certificación de intervención de la vía ante la aseguradora para el 7 de nov-2018. Enviar el PACA ajustado a la Interventoría el día viernes 9 de nov-2018.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-F
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE
		FECHA	02 (Día) 11 (Mes)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Los establecidos durante el desarrollo del Comité de obra.		

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

1) gestionar ante la gobernacion el certificado de intervencion de la via.
2) Radicar ante la CRQ la solicitud de ocupacion de cauce de las obras transversales identificadas en visita del 31 de octubre de 2018 con los ingenieros ambientales de obra e interventoria (ver acta de comite ambiental). Verificar cumplimiento de compromiso para proxima semana.
3) Las observaciones de la interventoria a los precios unitarios presentados por el contratista deben tenerse en cuenta en el presupuesto definitivo

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 09 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
HENRY GARCIA MORENO	
Pablo Alberto Valencia Rodriguez	
Hernán Barreto Agudelo	
Wilker Jordán	
Pablo Alejandro Granada V.	
gloria Elena Peláez	
David Guzmán Mosquera	
Fabian Enrique Sierra Morales	
María Inés Vélez Sánchez	
Yeiran Barreto A.	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 09 (Día) 11 (Mes) 12 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0496 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
HENRY GARCIA MORENO	ING. RES. INTERVENT.	COPEBA LTDA.
Hernan Barrera A	Supervisor Interv	INVIAS. QUINDIO
PABLO ALBERTO VALENCIA K	DIRECTOR OBRA	COMITE CAFETEROS
Wilmer A. Jordan M.	ING. RESIDENTE	Comite Cafeteros Q.
Fabian E. Sierra Morales	Ing. Aux Frente Ganar	Comite Cafeteros Q.
Rab.o Alejandro Granada Valencia	Inc. Aux Frente Pijao	Comité de Cafeteros Quindío
Maria Inés Vélez Sánchez	Residente Social	Comité de Cafeteros Quindío
LIBERTH DAVID GUZMAN M	ING. RESIDENTE	COMITE QUINDIO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Seguimiento y control a las actividades programadas y ejecutadas por el contratista durante la semana y verificacion del cumplimiento de compromiso.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se hizo lectura del comite anterior y se aprobo el acta por parte de los asistentes a este comité.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1- Estado actual de entrega y aprobacion de Estudios y diseño.
2- Cumplimiento de compromiso de visita a Machángara.
3- Oficio de radicacion de solicitud ante CRQ. y Gobernacion
4- Pago acordado compromiso para viernes 9 de noviembre.
5- Programacion semanal de actividades
6- otros temas

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1º Están aprobados todos los estudios y diseños. Queda pendiente la entrega de planos de diseño geométrico impresos y el documento de aprobación del estudio estructural.

2º La visita a Machángara, se realizará la próxima semana con participación de Interventoría y Contratista.

3º Se solicita por parte de la Interventoría, le sea entregado el documento de trámite que se está realizando ante la CRQ y la Gobernación.

4º El PAGA se entregará el día de hoy 9 de noviembre en horas de la tarde, en la oficina de la Interventoría municipio de Pijao.

5º La programación semanal de actividades ha sido entregada oportunamente.

6º Presupuesto: A través de las mesas de trabajo realizadas y estudiados los argumentos presentados por la Federación Nacional de Cafeteros a través de los funcionarios del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, por la Interventoría, se conciliaron todos los precios unitarios, exceptuando el de recería.

El acuerdo se logró revisando distancias de acarreo, insumos y rendimientos de los diferentes actividades, resumidos algunos en el oficio QDE18CO1502 y consultando además los diferentes insumos necesarios para la ejecución de los diferentes actividades.

El Director de la Interventoría informa que una vez revisadas las justificaciones dadas por el Contratista respecto a los cambios de rendimientos de mano de obra relacionados en los precios unitarios, considera que es viable el cambio siempre y cuando se presenten los soportes de estos rendimientos basados en los precios unitarios de la Gobernación del Quindío. Además se debe contar con el visto bueno del Ingeniero Hernán Barreto Agudelo. (INVIAS)

El Contratista presentó el día de hoy a la Interventoría 4 precios unitarios no previstos para su revisión y aceptación los cuales fueron revisados por el Residente de Interventoría, quien dió el visto bueno. Los precios unitarios no previstos son los siguientes: 610.7 relleno con arena, 201.15 remoción de alcantarillas, 663.1 Tubería de plástico tipo corrugada norma NTC4764 de diámetro 100mm y limpieza de obras transversales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3	DE 14
		FECHA	09 (Día)	11 (Mes) 20 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 16 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Henry Garcia Moreno	
Hernán Barreto Agudelo	
PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	
WILMER A. JURADO M.	
Fabian E. Sierra Morales	
Alejandro Granada Garcia	
María Luisa Valez Sánchez	
LIBERTH DAVID BERMUDEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 16 (Día) 11 (Mes) 20 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
PABLO ALBERTO VALENCIA	Director de obra	Comité Cafeteros
GLORIA ELENA PELÁEZ	Residente Social	Comité Cafeteros
WILKER A. JORDAN M.	Residente de Obra	Comité Cafeteros
PABLO ALEJANDRO GRANADA	Ing Auxiliar (Apoyo)	Comité Cafeteros
EDISSON PALACIOS GUIO	Residente Interventoría	COPEBA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Seguimiento y control a las actividades programadas y ejecutadas por el contratista durante la semana y verificación del cumplimiento a los compromisos

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta # 16 del comité anterior, se verificó compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Cumplimiento de compromisos del acta anterior
B. otros temas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3
		FECHA	16 (Día)	11 (Mes)	201 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A) 1 Se da por terminado el compromiso de la entrega de estudios y diseños con todos sus planos presentados. Se hizo envío por parte del contratista a la interventoria del paquete con los volúmenes de diseño incluida el acta de aprobación de los mismos, el dia 25 de noviembre el cual se envio por encomienda.

2. La visita a Machángara se llevó a cabo el dia miercoles 14 de noviembre en horas de la mañana por los ingenieros Pablo Alberto Valencia (director de obra) y Edisson Palacios (residente de interventoria). con lo cual se dio cumplimiento a tal compromiso

3 El documento PAGA fue entregado según lo expuesto en el acta anterior el dia viernes 09 de noviembre. Hubo necesidad de hacer una nueva entrega del acta de entrega o radicacion del PAGA debido al cambio de director y de residente de la interventoria pero a fecha de hoy se encuentra recibido el PAGA y su correspondiente acta por parte de la interventoria.

4 La programación semanal de actividades ha sido enviada oportunamente por el contratista

5 Respecto al permiso de Ocupación de cauce, el contratista manifiesta que ya tiene recopilada la documentacion solicitada por la CRC y será entregada la proxima semana, de lo cual hará entrega a la interventoría del recibido

B El contratista expone el avance de la gestión Social a la fecha donde manifiesta que ya se encuentran ubicados y en funcionamiento los puntos satélite de información y los correspondientes buzones de sugerencias. También manifiesta respecto a las actas de vecindad que se encuentran levantadas 78 actas que corresponden a los primeros tramos de intervención; la información se encuentra en proceso de organización para ser entregada a la interventoría, en la cual se incluirá video de registro fílmico de la vía.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	16 (Día)	11 (Mes)	2 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Entrega de soporte de gestión ante la CRG	23 nov 2018	Contratista.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

El contratista manifiesta que se requiere unos tiempos mínimos prudentes de respuestas a las solicitudes de entrega de información que solicite la interventoría.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
PABLO ALBERTO VALENCIA	
GLORIA ELENA PELÁEZ	
WILKER A. JORDAN M.	
PABLO ALEJANDRO GRANADA	
EDISSON PALACIOS GUIO	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	23 (Día) 11 (Mes) 20 (A

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
María Ines Velez Sánchez	Residente Social	Comité de Cafeteros
[illegible]	Presidente Obra	Comité Cafeteros
Pablo Alejandro Valencia R.	Director obra	
Pablo Alejandro Granada V.	Aux Frente Viejo	
Fabian E. Sierra Morales	Aux Frente Viejo	
Edisson Palacios	Residente interventoria	
Hernan Barrera Agudelo	Supervisor Interv.	
Gloria Elena Peláez	Presidente Social P.	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Seguimiento y control a las actividades realizadas por el Contratista durante la semana.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se leyó el acta #17, verificando la gestión que se hizo por parte del Contratista para presentar la documentación ante la CRQ.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
A. Cumplimiento del compromiso del acta anterior
B. Varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. No se dio cumplimiento total al compromiso del acta #17, respecto a la entrega de la documentación a la CRQ y el rá- dicado de ello a la Interventoría, debido a que se presentó una solicitud a la gobernación de su competencia y que no impli- ca intervención en predios privados, documento que se dará conocer a la Interventoría en el presente Comité. Se queda en espera de la respuesta de la Gobernación para continuar con la gestión ante la CRQ.

B. Se manifiesta por parte del Contratista que la Gobernación tiene la intención de realizar una visita a la vía el próximo martes con el fin de determinar una solución provisional a los sitios críticos como El Verdal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3
		FECHA	23 (Día) 11 (Mes) 20 (A

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** | **RESPONSABLES**

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Presentar cronograma de actividades semana a semana	Viernes 30-nov.-2018	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
María Inés Vélez Sánchez	
Wilmen A. Jordán M.	
Gloria Elena Peláez	
Pablo Alejandro Granada Valencia	
Pablo S. Valencia R	
Fabian Enrique Sierra Morales	
Edisson Palacios	
Hernán Borrero Agredo	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FF		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 20 (A

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Julieth A. Jordan M.	ING. RESIDENTE PAVIMENTO	COMITE CAFETEROS Q.
Pablo Alejandro Granada Valencia	Ing Aux Pavimento	Comite Cafeteros Q
LIBERTH DAVID GAMAN M.	ING. RESIDENTE	COMITE CAFETEROS Q
Fabian E. Sierra Morales	Ing. Aux. Geotecnia	COMITECAFE Q
PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	DIRECTOR OBRA	COMITE CAFETEROS
Edisson Palacios Soto	Residente Interventoria	COPEBA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Seguimiento y control a las actividades semanales realizadas por el contratista y demás temas relevantes frente a la ejecución del contrato.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se hizo lectura del acta anterior, dando continuidad a los temas de compromisos anteriores por cumplir.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Estado de cumplimiento de compromisos del acta anterior (#18)
B Temas Varios.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 3

FECHA 30 (Día) 11 (Mes) 20 (A

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Respecto a la gestión adelantada por el contratista en cuanto al permiso de ocupacion de cauce ante la CRQ, el contratista manifiesta que mantuvo comunicacion telefonica con la persona encargada en la gobernacion de dar respuesta del oficio radicado y expresaron que dicha respuesta ya se encuentra emitida y proximamente estará llegando para conocimiento del contratista y continuación de la gestion ante la CRQ.
El contratista manifiesta que respecto al levantamiento de actas de vecindad falta una por levantar a fecha de hoy, esta falta por levantar debido a la dificultad para conseguir al propietario y ya se han hecho varias visitas. La información total de actas de vecindad se está consolidando para ser entregada a la interventoria.
Respecto al compromiso de presentar el cronograma de actividades por semana el contratista manifiesta que no lo pudo presentar y dar cumplimiento el día de hoy pero si está adelantando y se entregará el próximo lunes 03 de diciembre

B El contratista manifiesta que tuvo que suspender el transporte de material a los sitios de acopio debido al fuerte invierno de la presente semana y al mal estado de los sitios críticos por los cuales no es posible que transiten las volquetas cargadas, en condiciones de seguridad. La próxima semana se tendrá total actividad en cuanto a ejecución de actividades programadas para dar cumplimiento con la ejecución de obras.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FF		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	20 (A

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Continua como compromiso la entrega de cronograma de actividades semana a semana.	Lunes 03 de diciembre 2018	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Wilker A. Jordan	
Pablo Alejandro Granados Valencia	
Fabian Enrique Sierra Morales	
LIBERTH DAVID [illegible]	
PABLO S. VALENCIA RODRIGUEZ	
Edisson Palacios Bello	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 14. INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 (Día) Noviembre (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS; TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 13 (Numeración consecutiva) del: 29/10/2018 al: 03/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. MONICA BENAVIDES GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 27 obras transversales, 9 muros

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,493 KM
ALCANTARILLAS: 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS: 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA INTEGRANTES: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
CONTRATO No: 0498 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR INTEGRANTES: COPEBA LTDA
CONTRATO No: 0825 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 518.020.310,0

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA
VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.419.238.921,00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA
EJECUTADO ACUMULAL: $ 46.894.759

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	x	

MES FACTURADO: sep-18
VALOR FACTURA: $ 30.585.384 FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (PR0 AL PR 17+050)

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	95%		95%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			

100%
0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050)
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de potencia necesaria	1		1
Compactadores manual vibratorio (rana)	2		2

Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (PR 17+050 AL PR 25+400)

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		95%	95%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			

95%
0
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40)
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de potencia necesaria	1		1
Compactadores manual vibratorio (rana)	2		2

Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

NOTA: LA INTERVENTORIA CONTINUA EN LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES PRESENTADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR EL CONTRATISTA, DE LAS ULTIMAS OBSERVACIONES. EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA VERSION 2 DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES, SIN EMBARGO NO ESTÁN CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. LAS OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMETRICOS NO HAN SIDO ATENDIDAS.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACION:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA DIO APROBACION MEDIANTE OFICIO FNC 825-2018 041 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE2018 A LA GESTION SOCIAL DEL PAGA V2

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A	
EMISIONES	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICARA ANTE LA CRQ LA SOLICITUD DEL OCUPACION DE CAUCE DE LAS OBRAS TRANSVERSALES, IDENTIFICADAS POR LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, EN VISITA REALIZADA A LA VIA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018..

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA SE PRESENTO EN SU VERSION 2, GESTION SOCIAL

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO APLICA, DADO QUE ES UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE UNA RED TERCIARIA.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SIPF SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: comité de cafeteros pijao y genova

OBSERVACION: Durante la presente semana se realizó visita a la vía de los ingenieros ambientales en compañía de las profesionales sociales de interventoría y contratista, con el fin de definir la localización de las obras transversales. Se tiene programada para la próxima semana la socialización del poyecto ante la comunidad.

El contratista hace entrega para su revisión y aprobación del Informe Ejecutivo mediante oficio CDE18C01435 del 31 de octubre de 2018
El contratista hizo entrega a la interventoría mediante oficio CDE18C01434 del 31 de octubre de 2018, para su revisión y aprobación del volumen V. Estudio Geotécnico.
El contratista y la interventoría con su equipo de Especialistas Ambientales realizan los Comites Técnicos Nros. 2 y 3, los días 30 y 31 de octubre de 2018, con el fin de adelantar los permisos ante la CRQ de ocupación de cauce, de la obras transversales definidas También realizan mesa de trabajo para revisión del PAGA
El dia 02 de noviembre de 2018, se realizó el Comité Técnico semanal No 15, en las instalaciones del comité departamental de cafeteros, con la asistencia del supervisor del INVIAS.
La interventoría mediante oficio ADM-FNC-825-2018-010, entrega al contratista las observaciones al Informe Ejecutivo.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-036 y FNC-825-2018-037, envia al contratista las respuestas en sutercera revisión a los Volúmenes V. Estudio Geotécnico y Volumen IV. Estudio de Suelos.
La interventoría mediante oficio ADM-FNC-825-201-013 del 31 de octubre de 2018, manifiesta el incumplimiento Parcial Contrato de obra No 498 de 2018.
La interventoría mediante oficio ADM-FNC-825-2018-014 del 31 de octubre de 2018, notifica al contratista sobre Observaciones Diseños de Muros de Contención, incumplimiento en atención de solicitudes de la interventoria

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuación de las actividades de realización de actas de vecindad, que habrían sido suspendidas durante la presente semana
Visita con los sub-contratistas del comité de cafeteros del Quindio a los diferentes frentes de obra
Presentación de los presupuestos definitivos para los sectores de Pijao - Alto de Guacas y Genova - Alto de Guacas, con su cronograma y programación.
Entrega de volantes y cartas personalizadas y emisión de cuñas radiales para invitación a socialización del proyecto con la comunidad
Revisión final por la interventoría del Diseño Estructural
Entrega de planos del Diseño Geometrico definitivos, teniendo en cuenta las ultimas observaciones hechas por la interventoría

RUTA No. 40QN09 NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

PR 0 + 000 PIJAO — PR 17 050 GUACAS — PR 24 + 800 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Visita a la vía por Especialistas Ambientales


Visita a la vía por Especialistas Ambientales


Visita a la vía por Especialistas Ambientales

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista semanalmente la programación de actividades para la semana siguiente
Control diario a las actividades ejecutadas por el contratista
Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato
Teniendo en cuenta que el contratista entregó la Versión N°2 de los Estudios y Diseños Estructurales los cuales no cumplen normatividad vigente, la interventoría programará reunión virtual entre los especialistas para el 7 de noviembre de 2018, con el fin de aclarar las observaciones y que el contratista las cumpla adecuadamente.
Para el día 7 de noviembre de 2018, se tiene programada reunión entre la interventoría y el Especialista Geométrico del contratista para que atienda las observaciones de los planos de diseño geométrico.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
No. MAT: 2520266675 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MANFRA-MN-81-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) Noviembre (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS; TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — SEMANA No.: 14 (Numeración consecutiva) del 04/11/2018 al 10/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. MONICA ELENA VIDES GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 — FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: 27 obras transversales, 9 muros

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,403 KM
ALCANTARILLAS: 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS: 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0498 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 5.419.239.921,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 5.419.239.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0825 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: 518.020.310,

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.239.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.419.239.921,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 46.694.759


	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	x	

MES FACTURADO: sep-18
VALOR FACTURA: $ 30.585.384 FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (PR0 AL PR 17+050)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	95%		95%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.


MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1		1
Compactadores manual vibratorio (Hanna)	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050) — TRAMO Y/O SECTOR 2: — Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (PR 17+050 AL PR 25+400)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		95%	95%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1		1
Compactadores manual vibratorio (Hanna)	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40) — TRAMO Y/O SECTOR 2: — Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIO Y DISEÑOS, SOLO QUEDO PENDIENTE POR ENTREGAR ALGUNOS AJUSTES AL VOLUMEN 3, TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO Y PRESENTAR EN EL INFORME EJECUTIVO UN COMPARATIVO ENTRE LAS OBRAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE Y LO RESULTANTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____
UBICACION: ____ — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: El contratista hizo entrega de los ajustes pendientes del aspecto social del PAGA.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICO ESTA SEMANA ANTE LA CRQ LA SOLICITUD DEL OCUPACION DE CAUCE DE LAS OBRAS TRANSVERSALES Y LA AUTORIZACION ANTE LA GOBERNACION DEL QUINDIO PARA LAS INTERVENCIONES ESTIPULADAS EN EL PROYECTO EN EL SECTOR PIJAO - ALTO DE GUACAS - GENOVA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA.

OBSERVACIONES: EL CAPITULO DE LA GESTION SOCIAL DEL PAGA V2 FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA, MEDIANTE OFICIO SOC-FNC-825-2018-002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO APLICA, DADO QUE ES UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE UNA RED TERCIARIA.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN/SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: (cómo cumplir con capacitaciones y obras)

OBSERVACION: El día sabado 10 de noviembre de 2018 se realizó la socialización del proyecto ante la comunidad. En la mañana se realizó en el auditorio del Comité de Cafeteros de Génova y en la tarde en el auditorio del Comité de Cafeteros de Pijao.

El contratista hace invitación a la reunión de inicio del proyecto, para el día 10 de noviembre de 2018 que se llevara a cabo en el Auditorio del Comité de Cafeteros de Pijao y Génova.
El contratista hizo entrega a la interventoria de los documentos corregidos de acuerdo a las observaciones de la reunión de inicio de proyecto, mediante oficio ODE18C01495 de fecha 06 de noviembre de 2018.
El contratista mediante oficio ODE18C01502 de fecha 08 de noviembre de 2018, informa a la interventoria sobre la justificación para la aprobación de Precios Unitarios presentados.
El contratista mediante oficio ODE18C01504 del dia 08 de noviembre de 2018, hace entrega de una Lista de Items no previstos.
El contratista hace entrega el dia 08 de noviembre de 2018 del Volumen VII. Estudio y Diseños de Estructuras.
La interventoria mediante oficio FNC-825-2018-042 del dia 08 de noviembre de 2018, hace entrega de la Revisión Diseño Muros de Contención, hecha por el Especialista en Estructuras Carlos Castro Silva.
La interventoria mediante oficio FNC-825-2018-043 del dia 06 de noviembre de 2018, hace devolución de documentos Diseño Geométrico y Estructural.
El dia 09 de noviembre de 2018, se realizó el Comité Técnico semanal No 18, en las instalaciones del comité departamental de cafeteros.
El especialista estructural de la interventoria volvió a revisar los diseños de los muros de contención y mediante comunicación de Interventoria N° FNC-825-2018-044 del dia 10 de noviembre de 2018 se comunicó al contratista la aprobación de los Diseños Estructurales de los muros de contención.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Transporte de materiales de construcción y materiales pétreos de planta a los sitios de acopio definidos por el contratista.
Visita con los sub-contratistas del comité de cafeteros del Quindio a los diferentes frentes de obra, para dar inicio a las actividades de construcción.
Afiliación del personal que laborará en la obra a la seguridad social y dotación de elementos de seguridad industrial.
Realización del comité Técnico semanal el viernes 16 de noviembre de 2018.
Revisar el presupuesto que presentó el 10 de noviembre de 2018 la Federación Nacional de Cafeteros a la interventoría y su incidencia en el Informe Final Ejecutivo , debido a que el contratista en el presupuesto involucró los ítems no previstos, y dichos APUS no se pueden aprobar hasta que se presenten a regalías.
El contratista remitirá por email a la interventoria la programación semanal.
El contratista debe entregar las correcciones a los planos de diseño geométrico solicitadas por la Interventoría mediante comunicación FNC-825-2018-041 del 3 de noviembre de 2018.
El contratista a partir del viernes 16 de noviembre de 2018 iniciará con el acopio de material pétreo.

RUTA No. 40GNO9 — NOTA: GEORREFERENCIACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Revisión del Diseño Geométrico Comité de Cafeteros



Erosión en zona de falla. El verdal K5+402



Oficina Interventoría Pijao

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista semanalmente la programación de actividades para la semana siguiente.
Oficiar al contratista sobre el incumplimiento de actividades programadas o compromisos pactados.
Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato.
Realizar visita a escombrera Machanaza para verificar que la documentación legal está vigente y disponibilidad de la escombrera para recibir materiales sobrantes del contrato.
Se solicitará al contratista que presente un cuadro comparativo entre las obras establecidas contractualmente y las presentadas en el informe ejecutivo, con el fin de tener seguridad en que se están atendiendo las obras que hacen parte del anexo técnico de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
No. MAT: 2520266675 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) Noviembre (Mes) 2.018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | SEMANA No.: 15 (Numeración consecutiva) del 11/11/2018 al 17/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. MONICA BENAVIDES GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 27 obras transversales, 9 muros

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,403 KM
ALCANTARILLAS : 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0498 - 2018 | VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: | VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0825 - 2018 | VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: | VALOR ACUMULADO: 518.020.310,

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2019	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.419.238.921,00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 46.894.759


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	x	

MES FACTURADO: sep-18
VALOR FACTURA: $ 30.566.384 FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (PR0 AL PR 17+050)

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	100%		100%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS


TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1		1
Compactadores manual vibratorio (Rana)	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050)

TRAMO Y/O SECTOR 2: Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (PR 17+050 AL PR 25+400)

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		100%	100%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1		1
Compactadores manual vibratorio (Rana)	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40)

TRAMO Y/O SECTOR 2: Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. YA SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN II TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO y PRESENTACION EL INFORME EJECUTIVO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO
PERMISO MINERO: SI X NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____

UBICACION: ____
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A	
CONCESION DE AGUAS	SI		NO		N/A	
OCUPACION DE CAUCES	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS	SI		NO		N/A	
EMISIONES	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA CRQ RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: EL CAPITULO DE LA GESTION SOCIAL DEL PAGA V2 FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA, MEDIANTE OFICIO SOC-FNC-825-2018-002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Barrio Comité de Cafeteros Buga y Genova

OBSERVACION: SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El contratista hace entrega final planos Volumen II. Trazado y Diseño Geométrico para la placa Huella, Volumen VIII. Estudio y Diseño de Estructuras, Volumen VII. Hidrología - Hidraulica e Informe Ejecutivo.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-044 del día 10 de noviembre de 2018, da aprobación Diseños de Muros de Contención.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-045 del día 13 de noviembre de 2018, informa al contratista sobre el cambio de personal en la interventoría.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-046 del día 14 de noviembre de 2018, hizo solicitud comparativo entre obras de anexo técnico y obras determinadas por diseños realizados.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-047 del día 14 de noviembre de 2018, da respuesta a inquietud sobre ripiaritos y localización de obras.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-048 del día 14 de noviembre de 2018, solicita información si se ha dado modificación al contrato de obra en plazo u otras cláusulas.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-049 del día 15 de noviembre de 2018, solicita al contratista actas de vecindad.
La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-050 del día 15 de noviembre de 2018, solicita actas de socialización y recomendaciones.
El día 15 de noviembre de 2018, se levantó el acta de aprobación de parcial de estudios y diseños. El día 16 de noviembre de 2018 la interventoría da aprobación final a los estudios y diseños presentados por el contratista de obra.
El día 16 de noviembre de 2018, se realizó el Comité Técnico semanal No 17, en las instalaciones del comité departamental de cafeteros.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de transporte de material y compra de materiales para concreto y alcantarillas.
Contratación de mano de obra.
Inicio logística ejecución de obra.
Realización del comité Técnico semanal el viernes 23 de noviembre de 2018.
Definición de equipos de construcción.
El contratista remitirá por email a la interventoría la programación semanal.
Continuación proceso ocupación de cauce.
Continuación actas de vecindad.

RUTA No. 40GNO9 NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA
PR 0 + 000 PIJAO — PR 17.050 GUACAS — PR 24 + 800 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalación de punto satelite de información


Levantamiento de Actas de Vecindad


Visita Conjunta a la Escombrera Machangara

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista semanalmente la programación de actividades para la semana siguiente.
Oficiar al contratista sobre el incumplimiento de actividades programadas o compromisos pactados.
Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato.
Solicitar al contratista el programa de inversiones actualizado con base en el presupuesto ajustados de los estudios y diseños.
Verificar que el contratista haya entregado el comparativo de las obras contractuales establecidas en el anexo técnico y las obras aprobadas producto de la revisión de los diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
No. MAT.: 2520266675 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 (Día) Noviembre (Mes) 2.018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 16 del 18/11/2018 al 24/11/2018
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. MONICA BENAVIDES GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: 27 obras transversales, 9 muros

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.403 KM
ALCANTARILLAS : 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0498 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0825 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: 518.020.310,

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.419.238.921,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 87.720.260,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR	SI	NO
	x	

MES FACTURADO: oct-18
VALOR FACTURA: $ 36.825.520,00 FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (PR0 AL PR 17+050)

TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	100%		100%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17.050)

TRAMO Y/O SECTOR 1: Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1		TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1		1
Compactadores manual vibratorio (rana)	2		2

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (PR 17+050 AL PR 25+400)

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	ACUMULADO PROYECTO 2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		100%	100%
PLACA HUELLAS (KM)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS:			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17.050-k25.40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. YA SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN II, TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO y PRESENTARON EL INFORME EJECUTIVO.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	2	TOTAL
Retroexcavadora	1	1
Motoniveladora	1	1
Vibro compactador	1	1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1	1
Volquetas de 7 m3	8	8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4	4
Vibradores de concreto	4	4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1	1
Compactadores manual vibratorio (rana)	2	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___
UBICACION: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	___	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	___	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	N/A	

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN Y LA CRQ RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA VERSION 2 PRESENTA OBSERVACIONES, ESTA PENDIENTE LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, LA CUAL DEFIENDE DE QUE EL CONTRATISTA ATIENDA LAS OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES: EL CAPITULO DE LA GESTION SOCIAL DEL PAGA V2 FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA, MEDIANTE OFICIO SOC-FNC-825-2018-002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION TERR: SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SIGUE COMITE CAFETEROS QUIN Y GENOVA

OBSERVACION: SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Contratista entrega presupuesto en formato solicitado segun oficio ODE19C01601 19 nov. - Interventoria reporne por firma original (FNC-825-2018-051) - contratista aporta presupuesto con firma original según oficio ODE19C01903, tema cerrado.
Contratista da respuesta al oficio FNC-825-2018-048, mediante oficio ODE18C01802 19 de nov 2018, aportando el comparativo de obras fomuladas Vs Definidas en estudios y diseños, junto con la justificación respectiva.
El contratista da respuesta al oficio FNC-825-2018-051, mediante oficio ODE18C01803 de fecha 20 de noviembre de 2018, con el cual se le había solicitado el presupuesto con firma original
La interventoria mediante oficio FNC-825-2018-052 del dia 20 de noviembre de 2018, solicita Programa de Inversión. El contratista lo aporta via mail el dia 21 de nov 2018 mediante oficio ODE18C01808.
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-018 del dia 22 de noviembre de 2018 solicita al contratista que entregue el Programa de Inversión para cada tramo por separado.
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-019 de fecha 20 de nov 2018, da aprobación al presupuesto contrato de obra 498 de 2018.
Se comenzó a acopiar material de subbase en el sector de puente tabla.
Se ha dado atención a la comunidad en los puntos y horarios establecidos, donde se han recibido hojas de vida.
Se ha llevado a cabo el correspondiente comité de obra semanal.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Transporte de material y compra de materiales para elaboración de concreto
Contratación de mano de obra, maquinaria y equipo
Finalización actas de vecindad.
Realización del comité Técnico semanal el viernes 30 de noviembre de 2018.
Limpieza de alcantarillas
El contratista remitirá por email a la interventoría la programación semanal.
Continuación proceso ocupación de cauce(CRQ y GOBERNACION)
Localización de muros y alcantarillas para ejecución.

RUTA No. 40QN09 — NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

PR 0 + 000 PIJAO — PR 17 050 GUACAS — PR 24 + 800 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Atención al Usuario



Inicio de acopio de material en sitios de obra



Comité de obra, oficina de Interventoría Pijao

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista semanalmente la programación de actividades para la semana siguiente.
Oficiar al contratista sobre requerimientos, compromisos e incumplimientos.
Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato.
Hacer seguimiento a que el contratista entregue el programa de inversiones actualizado con base en el presupuesto ajustados de los estudios y diseños, para cada tramo.
Solicitar al contratista el inicio de la etapa de ejecución de obras, con frentes de trabajo y equipos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
No. MAT: 25202666675 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) Diciembre (Mes) 2.018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS; TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — SEMANA No. 17 (Numeración consecutiva) del 26/11/2018 al 01/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. MONICA BENAVIDES GONZALEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 — FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: 27 obras transversales, 9 muros

PIJAO - GUACAS		GENOVA - GUACAS	
KM PLACA HUELLA:	1,403 KM	KM PLACA HUELLA:	1,255 KM PLACA HUELLA.
ALCANTARILLAS :	16 ALCANTARILLAS	ALCANTARILLAS :	11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	4 MUROS DE CONTENCION	MUROS DE CONTENCION:	5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0498 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0825 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 519.020.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019 — ADICIONES: $
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: 519.020.310,

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.419.238.921,00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 87.720.280,00


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	x	

MES FACTURADO: oct-18
VALOR FACTURA: $ 36.805.520,00 FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (PR 00+000 AL PR 17+050)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	100%		100%
PLACA HUELLAS (P/M)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050) — TRAMO Y/O SECTOR 1:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1		TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Motoniveladora	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	8		8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	4		4
Vibradores de concreto	4		4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión	1		1
Compactadores manual vibratorio (Rana)	2		2

Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (PR 17+050 AL PR 25+400)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		100%	100%
PLACA HUELLAS (P/M)			
MUROS DE CONTENCION (M3)			
ALCANTARILLAS (M)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40) — TRAMO Y/O SECTOR 2:

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. YA SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN 4 TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO y PRESENTACION EL INFORME EJECUTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		1	1
Vibro compactador		1	1
Carrotanque de agua de 10,000 litros		1	1
Volquetas de 7 m3		8	8
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		4	4
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión		1	1
Compactadores manual vibratorio (Rana)		2	2

Este será el equipo mínimo disponible que deberá tener el contratista, una vez se inicie la ejecución de obra

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____
UBICACION: ____ — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN Y LA CRQ RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA VERSION 2 PRESENTA OBSERVACIONES, ESTA PENDIENTE LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, LA CUAL DEPENDE DE QUE EL CONTRATISTA ATIENDA LAS OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: EL CAPITULO DE LA GESTION SOCIAL DEL PAGA V2 FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA, MEDIANTE OFICIO SOC-FNC-825-2018-002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SIF(E-SERVICIO) DE ATENCIÓN AL USUARIO: sirvevial.invias.gov.co/serviciosalusuario/

OBSERVACION: SE CONTINUÓ CON EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Contratista suspende acopio de material que ha sido afectado en su condición de humedad y gradación por la intensidad de las lluvias, ya que pierde contenido de finos.
La interventoría solicitó al contratista dar inicio a la ejecución de obras del contrato en cada uno de los tramos debido a que ya se aprobó lo correspondiente a la etapa de ajustes y diseños, mediante oficio ADM-FNC-825-2018-020 del 26 de nov de 2018.
El contratista realizó visita en compañía de delegado de la gobernación para verificar el estado de los sitios críticos que impiden el paso de de volquetas con material, el día jueves 29 de nov.
El contratista mantiene observación al estado del puente del PR 25 que tampoco permite el paso de vehículos cargados con material para la obra, lo cual es tema urgente y de importancia para la normal ejecución de actividades ya que por ambos accesos a la vía se presenta restricción al paso de vehículos cargados por su riesgo evidente.
Se suspendió acopio material de subbase en el sector de puente tabla debido al estado del tiempo con intensas lluvias en especial los días lunes martes y viernes de la presente semana.
Se ha dado atención a la comunidad en los puntos y horarios establecidos, donde se han recibido hojas de vida.
Se ha llevado a cabo el correspondiente comité de obra semanal.
La interventoría estuvo realizando ajustes de forma al informe mensual de septiembre de acuerdo con lo expuesto en el oficio SRTS2954.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Transporte de material (material Pétreo)
Contratación de mano de obra.
Limpieza de alcantarillas.
Continuación proceso ocupación de cauce(CRQ y GOBERNACION).
Finalización de actas de vecindad.
Compra de materiales para elaboración de concreto (cemento, acero, tubería etc)
Localización y replanteo de muros, alcantarillas y placa huellas para ejecución.

RUTA No. 40GNO9 — NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

PR 0 + 000 PIJAO — PR 17.050 GUACAS — PR 24 + 800 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se suspendió acopio de materia por motivo de lluvias intensas



Observación al avance de deterioro de sitios críticos



Visita Delegado Gobernación y Contratista

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista semanalmente la programación de actividades para la semana siguiente.
Oficiar al contratista sobre requerimientos, compromisos e incumplimientos.
Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato.
Hacer seguimiento a que el contratista entregue el programa de inversiones actualizado con base en el presupuesto ajustados de los estudios y diseños, para cada tramo.
Solicitar al contratista el inicio de la etapa de ejecución de obras, con frentes de trabajo y equipos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
No. MAT: 2520266675 CND

ANEXO 15. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE **CONTRATO No.** 0825 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

INTERVENTORÍA: COPEBA LTDA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTACIÓN ELECTRONICA	TOPCOM - GTS-255 KB 4182	I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
NIVEL DE PRESICIÓN	TOPCOM - AT-B2 SERIES 1985	I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
CAMIONETA NISSAN DIESEL 2011	PLACA RGS 412	A	A	A			A	A	A	A	A			A	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
COMPUTADOR DE MESA Y TORRE	SERIE CNT922 C3TT	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
IMPRESORA	EPSON L 4150	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	LENOVO IDEA 320	I	I	I			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
2 JUEGOS DE MESAS - 4 SILLAS	RIMAX	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
MIRA PARA NIVEL		I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
MIRA PARA ESTACION		I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
2 CONOS DE SEÑALIZACION		I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
8 CAMISAS PARA CONCRETO		I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
CONO METALICO Y VARILLA		I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
BASTON		I	I	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
MONTERO	PLACA CVH 677	I	I	I			I	I	I	I	I			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: 05/11/2017 NIVEL DE PRESICIÓN - 05/11/2017 ESTACIÓN ELECTRONICA

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 16. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

SECTOR: PIJAO -GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA															X	X	X					X	X	X				X	X	X
EDISSON PALACIOS GUIO	RESIDENTE INTERVENTORIA										X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
HENRY GARCIA MORENO	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	SECRETARIA	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
JAIR RAMIRO ARDILA ARIZA	CONDUCTOR	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoria
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoria
Matricula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GÉNOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	418	005-2402-0603-2018-130101-0001	A63000	Nación	Contrato principal 825 de 2018	518.020.310,00
			TOTAL			518.020.310,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 518.020.310,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 518.020.310,00		$ 518.020.310,00		REG N° 1118 de 2018-06-01
1	**08/08/2018 a 31/08/2018**	$ 13.705.358,00	$ 2.604.018,00	$ 16.309.376,00	0		$ 501.710.934,00	$ 16.309.376,00	$ 501.710.934,00		
2	**01/09/2018 a 30/09/2018**	$ 25.702.003,00	$ 4.883.381,00	$ 30.585.384,00	0		$ 471.125.550,00	$ 46.894.760,00	$ 471.125.550,00		
3	**01/10/2018 a 31/10/2018**	$ 30.945.815,00	$ 5.879.705,00	$ 36.825.520,00	0		$ 434.300.030,00	$ 83.720.280,00	$ 434.300.030,00		
4	**01/11/2018 a 30/11/2019**	$ 25.812.624,00	$ 4.904.399,00	$ 30.717.023,00			$ 403.583.007,00	$ 114.437.303,00	$ 403.583.007,00		
TOTALES		**$ 96.165.800,00**	**$ 18.271.503,00**	**$ 114.437.303,00**			**$ 403.583.007,00**	**$ 114.437.303,00**	**$ 403.583.007,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matrícula No.: 2520266675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 63202 - 13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL UAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PEÑA	52.253.696	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 5.900.000,00	$ 5.900.000,00	$ 30.800,00	$ 236.000,00	$ 1.003.000,00			
2	EDISSON PALACIOS GUIO	7.167.367	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 2.494.667,00	$ 2.494.667,00	$ 173.700,00	$ 99.800,00	$ 399.200,00			
3	NURY JAZMIN GARCIA LÓPEZ	52.880.586	PROFESIONAL GESTIÓN SOCIAL	$ 802.500,00	$ 802.500,00	$ 32.100,00	$ 32.100,00	$ 128.400,00			
4	BRIGIDA HEDI MORALES SOLANO	46.454.565	TOPÓGRAFO	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 125.300,00	$ 72.000,00	$ 288.000,00			
5	JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	24.989.802	SECRETARIA	$ 869.500,00	$ 869.500,00	$ 60.600,00	$ 34.800,00	$ 139.200,00			
6	JAIR RAMIRO ARDILA ARIZA	18.435.773	CONDUCTOR	$ 781.242,00	$ 781.242,00	$ 54.400,00	$ 31.300,00	$ 125.000,00			
7	HENRY GARCIA MORENO	7.518.509	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 930.000,00	$ 930.000,00	$ 64.800,00	$ 37.200,00	$			
					$ 13.577.909,00	$ 541.700,00	$ 543.200,00	$ 2.082.800,00	$ -		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 13.577.909,00	TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					$ 3.167.700,00	

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.
3. Se anexo documentos pensionales de Henry Garcia y Eugenio Peña Barrera

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520266675 CND

Firma

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	391175083	8486434488	E	2018/12/07	2018/12/03	BANCOLOMBIA	0	$11,012,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COP BOGOTA (11 Afiliados)																								$18,987,795	$3,129,100			$20,702,484	$828,200			$20,897,795	$836,100			$21,483,726	$112,600		$0	$0		$4,906,000
Centro de Trabajo: COPEBABOG (11 Afiliados)																								**$18,987,795**	**$3,129,100**			**$20,702,484**	**$828,200**			**$20,897,795**	**$836,100**			**$21,483,726**	**$112,600**		**$0**	**$0**		**$4,906,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								**$18,987,795**	**$3,129,100**			**$20,702,484**	**$828,200**			**$20,897,795**	**$836,100**			**$21,483,726**	**$112,600**		**$0**	**$0**		**$4,906,000**
1	CC	1032412944	CORREA SANTANA WIDMER ALEJANDRO																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS008	30	$2,450,000	$98,000	CCF24	30	$2,450,000	$98,000	14-18	30	$2,450,000	$12,800	30	$0	$0	Si	$600,800
2	CC	1014221374	FORERO BOHORQUEZ JORGE ALBERTO																		230201	30	$3,200,000	$544,000	EPS017	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-18	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0	Si	$816,800
3	CC	53015204	GARCIA VALENCIA DIANA MARIA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-18	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
4	CC	1026305571	GRANDE MEJIA DAYANA ALEXANDRA																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF24	30	$781,242	$31,300	14-18	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0	Si	$191,700
5	CC	1105671099	GUTIERREZ GUTIERREZ CHRISTIAN JAVIER																		230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS005	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-18	30	$1,650,000	$8,700	30	$0	$0	Si	$404,700
6	CC	80413735	GUTIERREZ FARFAN RAFAEL																		230201	30	$880,000	$140,800	EPS017	30	$880,000	$35,200	CCF24	30	$880,000	$35,200	14-18	30	$880,000	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,800
7	CC	1014223799	JOVEL CAÑON LUIS FELIPE																		231001	30	$1,650,000	$264,000	EPS008	30	$1,650,000	$66,000	CCF24	30	$1,650,000	$66,000	14-18	30	$1,650,000	$8,700	30	$0	$0	Si	$404,700
8	CC	50884314	JULIO BADEL ARELIS FEDORA																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF24	30	$781,242	$31,300	14-18	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0	Si	$191,700
9	CC	39773960	MENESES GUTIERREZ LUZ MILA																		230301	7	$195,311	$31,300		0	$0	$0	CCF24	7	$195,311	$7,900	14-18	30	$781,242	$4,100	7	$0	$0	No	$43,300
10	CC	52253696	PEÑA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR																		230901	30	$5,900,000	$1,003,000	EPS005	30	$5,900,000	$236,000	CCF24	30	$5,900,000	$236,000	14-18	30	$5,900,000	$30,800	30	$0	$0	Si	$1,505,800
11	CC	17181857	PEÑA BARRERA EUGENIO																			0	$0	$0	EPS001	30	$1,910,000	$76,400	CCF24	30	$1,910,000	$76,400	14-18	30	$1,910,000	$10,000	30	$0	$0	Si	$162,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COPEBA OBRA (6 Afiliados)																								$10,983,742	$1,797,400			$10,983,742	$505,800			$10,983,742	$439,400			$10,983,742	$712,900		$781,242	$39,200		$3,494,700
Centro de Trabajo: COPEBA OBRA (5 Afiliados)																								**$10,181,242**	**$1,669,000**			**$10,181,242**	**$473,700**			**$10,181,242**	**$407,300**			**$10,181,242**	**$708,700**		**$781,242**	**$39,200**		**$3,297,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								**$10,181,242**	**$1,669,000**			**$10,181,242**	**$473,700**			**$10,181,242**	**$407,300**			**$10,181,242**	**$708,700**		**$781,242**	**$39,200**		**$3,297,900**
12	CC	77185564	CARRILLO DAZA JABIB ENRIQUE																		230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-18	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400
13	CC	88235784	HERNANDEZ EUGENIO JESUS YESID																		231001	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$97,700	CCF24	30	$781,242	$31,300	14-18	30	$781,242	$54,400	30	$781,242	$39,200	No	$347,600
14	CC	79100187	JUYO URREGO FERNANDO																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-18	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
15	CC	79105594	JUYO URREGO JOSE MARIA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-18	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
16	CC	46454565	MORALES SOLANO BRIGIDA HEDI																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-18	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Centro de Trabajo: COPEBABOG (1 Afiliados)																								**$802,500**	**$128,400**			**$802,500**	**$32,100**			**$802,500**	**$32,100**			**$802,500**	**$4,200**		**$0**	**$0**		**$196,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								**$802,500**	**$128,400**			**$802,500**	**$32,100**			**$802,500**	**$32,100**			**$802,500**	**$4,200**		**$0**	**$0**		**$196,800**
17	CC	52880586	GARCIA LOPEZ NURY JAZMIN																		230301	30	$802,500	$128,400	EPS008	30	$802,500	$32,100	CCF24	30	$802,500	$32,100	14-18	30	$802,500	$4,200	30	$0	$0	Si	$196,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COPEBA 954 ANTIOQUIA (3 Afiliados)																								$850,400	$136,100			$7,031,642	$281,400			$7,031,642	$489,500			$0	$0					$1,188,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	391175083	8486434488	E	2018/12/07	2018/12/03	BANCOLOMBIA	0	$11,012,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$5,726,000	$0	$0	$5,726,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$389,000	$0	$0	$389,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$664,100	$0	$0	$664,100
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$1,003,000	$0	$0	$1,003,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,321,700	$0	$0	$2,321,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,348,200	$0	$0	$1,348,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,668,500	$0	$0	$1,668,500
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	24	$1,668,500	$0	$0	$1,668,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$1,760,000	$0	$0	$1,760,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$281,400	$0	$0	$281,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$203,100	$0	$0	$203,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$1,275,500	$0	$0	$1,275,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				23	$1,818,500	$0	$0	$1,818,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$76,400	$0	$0	$76,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$196,100	$0	$0	$196,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$37,200	$0	$0	$37,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$364,200	$0	$0	$364,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$34,100	$0	$0	$34,100
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$99,800	$0	$0	$99,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$944,600	$0	$0	$944,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,500	$0	$0	$23,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$23,500	$0	$0	$23,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$15,700	$0	$0	$15,700
TOTAL				24	$11,012,200	$0	$0	$11,012,200

ANEXO 19. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 8-ago-18

PLAZO INICIAL: 31-dic-18

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7-abr-19
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00

VALOR ACUMULADO: $ 518.020.310,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. HERNÁN BARRETO AGUDELO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51.802.031	30	5	2018	30/06/2019		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 87.063.650	30	5	2018	30/06/2019		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103.604.062	30	5	2018	31	12	2021
Calidad del servicio	30%	$ 155.406.093	31	12	2018	31	12	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51.802.031	8	8	2018	8/10/2019		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 87.063.650	8	8	2018	8/10/2019		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103.604.062	8	8	2018	8	4	2022
Calidad del servicio	30%	$ 155.406.093	31	12	2018	31	12	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: DC 40307 (13/09/2018) APROBACIÓN PÓLIZA ACLARACIÓN N°1 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 825 DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma

Nombre: HERNÁN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QND)

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 20. SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COPEBA LTDA.
Nit: 830.011.122-9

Bogotá D. C., 10 de septiembre de 2018

ADM-INV-825-2018-023

SEÑORES:
Instituto Nacional de Vias – INVIAS
Attn. Ing. Mónica Benavides
Gestora Técnica
Subdirección de Red Terciaria
Bogotá

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:
RADICACION 77060 10/09/2018 04:06:29 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

REF. CONTRATO 0825 DE 2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ASUNTO: RENUNICIA AL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar al INVIAS, que por decisión voluntaria renunciamos al anticipo del 20% del valor del contrato que se encuentra estipulado dentro de la cláusula séptima del contrato de interventoría de la referencia.

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal
COPEBA LTDA.

ANEXO 21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Interventor : Copeba Ltda

Contrato de Interventoria : 0825 - 2018

Objeto : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contratista : COMITÉ DE CAFETEROS

Contrato de Obra : 0498 - 2018


ADM-INV-825-2018-038	ANDREA DEL PILAR PEÑA-REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS	30/10/2018	01/11/2018 - 94013	ALCANCE OFICIO ADM-INV-0825-2018-023 - RADICADO NO. 77060 CON FECHA 10/09/2018	COPEBA LTDA
QDE18C01438	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA-DIRECTOR INTERVENTORIA	31/10/2018	02/11/2018	RESPUESTA AL OFICIO ADM-825-2018-014-OBSERVACIONES VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑOS DE SETRUCTURAS	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-039	HENRY GARCIA MORENO-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	31/10/2018	02/11/2018	SOLICITUD DOCUMENTOS PARA INFORME MESUAL DE INTERVENTORIA	COPEBA LTDA
DT-QUI-47962	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-REPRESENTANTE LEGAL	24/10/2018	02/11/2018	RESPUESTA A ENTRADA NO. 89647 CON FECHA 19/10/2018-ACTA DE CODTOS NO. 2	INVIAS
QDE18C01452	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	02/11/2018	02/11/2018	ENTREGA FINAL DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-041	HENRY GARCIA MORENO-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	01/11/2018	02/11/2018	APROBACION GESTION SOCIAL PAGA V2	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-016	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	01/11/2018	02/11/2018 E1805154	REVISION INFORME EJECUTIVO VERSION NO.1 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-040	HENRY GARCIA MORENO-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	01/11/2018	02/11/2018 E1805157	REVISION VOLUMEN V. ESTUDIO GEOTECNICO. CUARTA REVISION	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-016	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	01/11/2018	06/11/2018 E1805231	RESPUESTA A COMUNICADO DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDIO, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, CUYO ASUNTO ES OBSERVACIONES A LA REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE REUNION DE INICIO.	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-041	HENRY GARCIA MORENO-INGENIERO RESIDENTE	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	03/11/2018	FNC-825-2018-041	OBSERVACIONES AL VOLUMEN II. TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO PARA PLACA HUELLA	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-040	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS	03/11/2018	06/11/2018- 95161	RELACIÓN DE OFICIOS RADICADOS ENTRE EL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN EL COMITÉ DE CAFETEROS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-042	HENRY GARCIA MORENO-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	06/11/2018	06/11/2018 -E1805230	REVISIÓN DISEÑO MUROS DE CONTENCIÓN,	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-043	HENRY GARCIA MORENO-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	06/11/2018	07/11/2018 - E1805244	DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL .	COPEBA LTDA
QDE18C01460	JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS-DIRECTOR EJECUTIVO - CARLOS EDUARDO OSORIO - GOBERNADOR DEL QUINDIO	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	06/11/2018	08/11/2018 - QDE18C01460	INVITACIÓN DE REUNIÓN INICIO DEL PROYECTO	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01465	GLORIA ELENA PELAEZ-TRABAJADORA SOCIAL OCAD PAZ	NURY GARCIA LOPEZ-PROFESIONAL SOCIAL COPEBA	06/11/2018	08/11/2018	ENTREGA DOCUMENTOS CORREGIDOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA REUNIÓN DE INICIO DE PROYECTO.	COMITÉ CAFETEROS
	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	08/11/2018	08/11/2018	ENTREGA VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS - SE ANEXAN MEMORIAS DE CALCULO Y PLANOS CORRESPONDIENTES POR CORREO ELECTRONICO.	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01504	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	08/11/2018	08/11/2018	ENTREGA DE ITEMS NO PREVISTOS	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01502	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	08/11/2018	08/11/2018	RESPUESTA OFICIO ADM-FNC-825-2018-015- JUZTIFICACION PARA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS	COMITÉ CAFETEROS
QDE18c01532	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	09/11/2018	QDE18C01532	ACLARACION A OFICIO ICANH-130 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018, ENVIADO POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA A LA INTERVENTORIA COPEBA LTDA.	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01533	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	09/11/2018	09/11/2018	ENTREGA DEL INFORME FINAL EJECUTIVO	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01534	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	09/11/2018	09/11/2018	ENTREGA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO FINAL	COMITÉ CAFETEROS
			09/11/2018	09/11/2018	CERTIFICADOS DE AUTORIZACION DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO	
FNC-825-2018-044	EDISON PALACIOS-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	10/11/2018	13/11/2018 - E1805353	APROBACIÓN DISEÑOS DE MUROS DE CONTENCIÓN	COPEBA LTDA
QDE18C01535	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	09/11/2018	09/11/2018	ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL VERSION 2,	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-044	EUGENIO PEÑA BARRERA-DIRECTOR INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS	10/11/2018	14/11/2018 - 97750	RELACIÓN OFICIOS ENVIADOS AL COMITÉ DE CAFETEROS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-045	ADISSON PALACIOS GUIO-RESIDENTE INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	13/11/2018	14/11/2018 - E1805369	INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE PERSONAL EN LA INTERVENTORIA	COPEBA LTDA
QDE18C01575	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	15/11/2018	15/11/2018	ENTREGA FINAL PLANOS VOLUMEN II. TRAZADO Y DISEÑO GOEMETRICO PARA PLACA HUELLA, VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS, VOLUMEN VII. HIDROLOGIA - HIDRAULICA.	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-045	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS	14/11/2018	15/11/201/ - 98332	RESPUESTA OFICIO SRT 49915 - OBSERVACIONES AL ACTA DE COSTOS No.1	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-046	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ -DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	14/11/2018	16/11/2018 - E1805423	SOLICITUD COMPARATIVO ENTRE OBRAS DE ANEXO TECNICO Y OBRAS DETERMINADAS POR DISEÑOS REALIZADOS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-047	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	14/11/2018	16/11/2018 - E1805424	RESPUESTA A INQUIETUD SOBRE REPLANTEO Y LOCALIZACION DE OBRAS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-048	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	14/11/2018	16/11/2018 - E1805425	INFORMACION SI SE HA DADO MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA EN PLAZO U OTRAS CLAUSULAS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-049	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	15/11/2018	16/11/2018 - E1805426	SOLICITUD ACTAS DE VECINDAD	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-050	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	15/11/2018	16/11/201 - E1805427	SOLICITUD ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y RECOMENDACIONES	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-052	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	201/11/2018	20/11/2018-E1805478	PROGRAMA DE INVERSIÓN	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-051	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	19/11/2018	20/11/2018 - E1805477	RESPUESTA AL OFICIO QDE18C01534 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO FINAL	COPEBA LTDA
QDE18C01603	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	20/11/2018	20/11/2018	RESPUESTA A OFICIO FNC-825-2018-051	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01601	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	19/11/2018	20/11/2018	ENTREGA PRESUPUESTO COMPLETO EN FORMATO SOLICITADO	COMITÉ CAFETEROS
QDE18C01602	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	19/11/2018	20/11/2018	RESPUESTA AL OFICIO FNC-825-2018-046	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-046	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ -DIRECTORA INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO -DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS	14/11/2018	21/11/2018 - 100024	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO.3	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-048	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ -DIRECTORA INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS	17/11/2018	21/11/2018 - 100025	RELACION DE OFICIOS	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-049	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ -DIRECTORA INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS	19/11/2018	21/11/2018 - 100032	CAMBIO DE HOJA AL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 , POR CORRECCIÓN	COPABA LTDA

ADM-INV-825-2018-050	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ -DIRECTORA INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITO. INVIAS	20/11/2018	21/11/2018 - 100029	CAMBIO FORMATOS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.2	COPEBA LTDA
DT-QUI 52906	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	22/11/2018	23/11/2018	RESPUESTA A ENTRADA No.100032 CON FECHA 21/11/2018 ADM-INV-825-2018-049 CAMBIO DE HOJA AL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 POR CORRECCION	INVIAS
DT-QUI 52908	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	22/11/2018	23/11/2018	RESPUESTA A ENTRADA No.100029 CON FECHA 21/11/2018	INVIAS
DT-QUI 52910	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	22/11/2018	23/11/2018	RESPUESTA A ENTRADA No.100024 CON FECHA 21/11/2018 "ADM-INV-825-2018-046 ACTA DE COSTOS E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.3"	INVIAS
ADM-FNC-825-2018-018	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	22/11/2018	26/11/2018 - E1805573	RESPUESTA AL COMUNICADO DEL COMITÉ DE CAFETEROS DE COLOMBIA QDE18C01608, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, CUYO ASUNTO ES "ENTREGA PROGRAMA DE INVERSION"	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-019	ANDREA DEL PILAR PEÑA-REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	20/11/2018	26/11/2018 - E1805574	APROBACIÓN PRESUPUESTOS CONTRATO DE OBRA 498 DE 2018	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-020	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR OBRA	26/11/2018	29/11/2018 - E 1805585	SOLICITUD INICIO ETAPA DE EJECUCIÓN - CONTRATO DE OBRA 498 DE 2018	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-052	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTORA INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS	24/11/2018	26/11/2018 - 101331	RELACIÓN DE OFICIOS, ENVIADA AL COMITÉ DE CAFETEROS	COPEBA LTDA
QDE18C01649	PABLO ALBERTO VALENCIA R-DIRECTOR DE OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DORECTORA INTERVENTORIA	30/11/2018	30/11/2018	ENTREGA DE COPIA FIRMADA PLANOS VOLUMEN II. TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO PARA PLACA HUELLA	COMITÉ CAFETEROS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION VIAS TERCIARIAS–QUINDIO
ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.4



07-11-2018 Rev Diseño Geométrico Comité Cafeteros

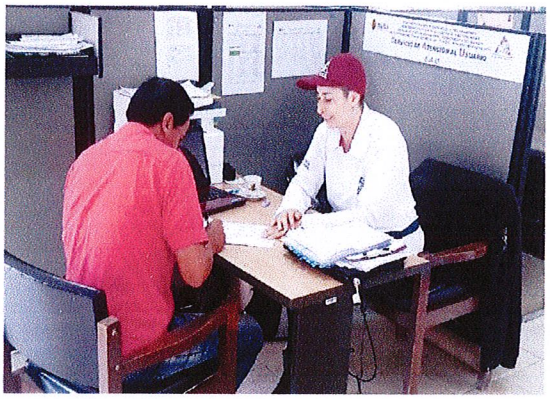

21-11-2018 **Atención al Usuario**



08-11-2018 Observaciones a la vía



10-11-2018 Reunión de Socialización del Proyecto



23-11-2018 Inicio de Acopio de material en sitios de obra



27-11-2018 Visita Delegado Gobernación y Contratista

ANEXO 23. INFORMES ESPECIALISTAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SUDDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

INFORME FASE PRELIMINAR DE LA GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 0825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME DE NOVIEMBRE 2018

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha –Etapa	Elaboró
09 al 10 de noviembre de 2018-preliminar	NURY JAZMÍN GARCÍA LÓPEZ
Versión 0	
Cargo	Profesional Social – Interventoría
Descripción	Elaboración del documento para revisión inicial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ETAPA PRELIMINAR 6
3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 7
3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 11
3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 17
3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 18
3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 21
3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL 22
4 CONCLUSIONES 25

TABLAS

Tabla 1 *Revisión al Documento Paga* 6
Tabla 2 Desarrollo de la Gestión Social en informes 6
Tabla 3 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información* 8
Tabla 4 *Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI* 10
Tabla 5 *Indicadores de Gestión* 10
Tabla 6 *Control y Verificación por la Interventoría* 10
Tabla 7 Trazabilidad de las reuniones de inicio 11
Tabla 8 Distribución de Piezas Comunicativas 12
Tabla 9 Reuniones de Inicio 15
Tabla 10 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación 16
Tabla 11 *Indicadores de Gestión* 16
Tabla 12 *Control y Verificación por la Interventoría* 16
Tabla 13 Relación de Comunicados 17
Tabla 14 Levantamiento de Actas de Vecindad 17
Tabla 15 Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos 18
Tabla 16 *Indicadores de Gestión* ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 17 *Control y Verificación por la Interventoría* 18
Tabla 18 Comités de Participación Comunitaria 19
Tabla 19 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria 19
Tabla 20 *Indicadores de Gestión* 20
Tabla 21 *Control y Verificación por la Interventoría* 20
Tabla 22 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL 21
Tabla 23 *Indicadores de Gestión* 21
Tabla 24 *Control y Verificación por la Interventoría* 21
Tabla 25 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural 22
Tabla 26 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural23
Tabla 27 *Indicadores de Gestión* 24
Tabla 28 *Control y Verificación por la Interventoría* 24

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de vías -INVIAS y COPEBA LTDA, interesados en involucrar la participación ciudadana en su proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Pijao y Génova en el Departamento de Quindío. Y permitiendo interactuar y participar activamente durante sus diferentes fases en el desarrollo del proyecto mejorando las condiciones físicas de los espacios que se encuentran en riesgo para la movilidad.

Así mismo, con la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, se contribuye a complementar el desarrollo rural y urbano, buscando mejorar la relación existente entre las personas y su territorio estimulando la consolidación de una cultura, permitiendo a las comunidades reconocerse como actores de cambio social y gestores de su propio desarrollo, bajo condiciones de dignidad y garantía de sus derechos ciudadanos relacionados con el bienestar colectivo. Es por esto que por medio de este proyecto, se lograra establecer condiciones favorables a futuro y a su vez pueda mejorar la movilidad propiciando mayor accesibilidad, conectividad, alternativas comerciales y económicas para los municipios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las acciones y en brindar la información del seguimiento y acompañamiento social, se realiza el informe de consolidación y verificación de las acciones de efectuadas por el contratista y supervisada por la interventoría social del CONTRATO 0825 DE 2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Dado cumplimiento de las actividades del "Apéndice E Obligaciones de Gestión Social" enmarcada dentro de las disposiciones de los Pliegos de Condiciones y los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, describiendo en forma concisa todos los aspectos relevantes del contrato, evidenciando el estado de evaluación del Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA se realiza este informe.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Acompañamiento y verificación de las actividades desarrolladas, propuestas y ejecutadas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, mediante el Comité de Cafeteros del Quindío, respondiendo a criterios de calidad, eficiencia y oportunidad con resultados, proporcionando la información pertinente en el manejo de los impactos sociales en la ejecución del presente proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la gestión realizada por el cumplimiento del proyecto de atención a la comunidad en el Punto SAU y atenciones ciudadanas, durante el desarrollo del contrato de los municipios de Pijao y Génova.

- Verificar la gestión ejecutada por el contratista frente al cumplimento del proyecto de información y divulgación durante las diferentes fases de ejecución, durante el desarrollo del contrato.

- Verificar el desarrollo del proyecto del manejo de la Infraestructura a predios y servicios públicos en el acompañamiento a las actividades técnicas, durante el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, elaboración de los registros fotográficos, fílmicos de las vías y las actas de compromiso con la comunidad en el desarrollo del contrato.

- Verificar las acciones para el proyecto de recuperación al derecho de vía.

- Verificar la gestión por el contratista frente al desarrollo de proyecto de Cultura vial y la participación ciudadana durante el desarrollo del contrato.

- Verificar la gestión en la recepción y del proyecto de Contratación de la Mano de Obra No Calificada Local y población vulnerable en los municipios de Pijao y Génova

- Acompañar según concepto del ICANH las acciones a efectuar de posibles hallazgos arqueológicos.

3. ETAPA PRELIMINAR

La interventoría para la fase preliminar efectuó observaciones al documento PAGA para su aprobación, una vez se atiendan las observaciones realizadas en mesa de trabajo para viabilizar los proyectos que deben ir en curso en el desarrollo de las actividades sociales.

Tabla 1 *Revisión al Documento Paga*

Fecha	Versión	Observaciones	Aprobación/ revisión
10 de septiembre de 2018	0	SOC.FNC-825-2018-001	Revisión
2 de octubre de 2018	1	QER18C01239	Revisión
11 de octubre de 2018	1	Mesa de trabajo	Revisión y ajustes
24 de octubre de 2018	2	QER18C01397	Revisión
1 de noviembre de 2018	3	SOC-FNC-825-2018-002	Aprobación del Capítulo de Gestión Social Paga V3 (Pendiente ajuste presupuesto)

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 2 *Desarrollo de la Gestión Social en informes*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se han ajustado los formatos correspondientes al presupuesto.	Se atienden las observaciones en la versión 3 del documento PAGA	Los documentos deben ser revisados por Federación Nacional de Cafeteros y el área ambiental continua en ajustes, se sugiere mayor efectividad en

		sus entregas.

Elaborado COPEBA LTDA

3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

- **Punto SAU**




  La interventoría verificó la ubicación de las oficinas de los puntos SAU que se encuentran en los Municipios de Pijao y Génova, estos cuentan con el siguiente equipamiento:

  1. Espacio de recepción de la comunidad
  2. Computador
  3. Impresora
  4. Formato de atención




  El 20 de noviembre de 2018 el contratista remitió el arte del diseño de las vallas y por parte de la interventoría se dio aprobación al diseño de las vallas de los Puntos SAU el 21 de noviembre de 2018, para su impresión para los Puntos SAU de Pijao y Génova.
  El 9 de noviembre de 2018, se instalaron los Puntos Satélites de Información:

  1. Pijao – Fonda los Chorros
  2. Génova - Casa lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova

Tabla 3 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información*
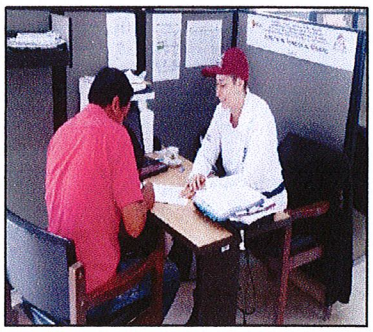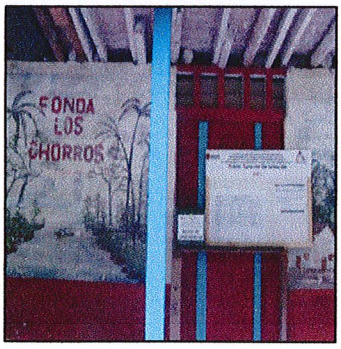
<table>
<tr><th colspan="2">Municipio de Pijao</th></tr>
<tr><th>Punto SAU</th><th>Ubicación</th></tr>
<tr><td>Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros</td><td>Carrera 5 N 11 – 36 Piso 2
Horario de atención
Miércoles: 2:00 pm a 5:00 pm
Jueves: 8:00 a.m a 12 m
Sábados: 8:00 a.m a 12:00 m</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><th colspan="2">Puntos Satélites - Fonda la Chorros</th></tr>
<tr><td colspan="2"> 


</td></tr>
</table>
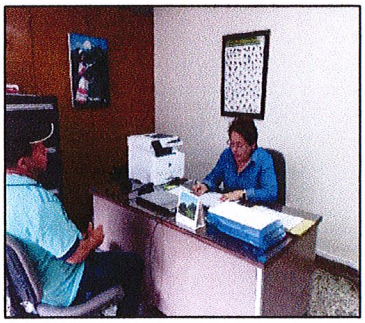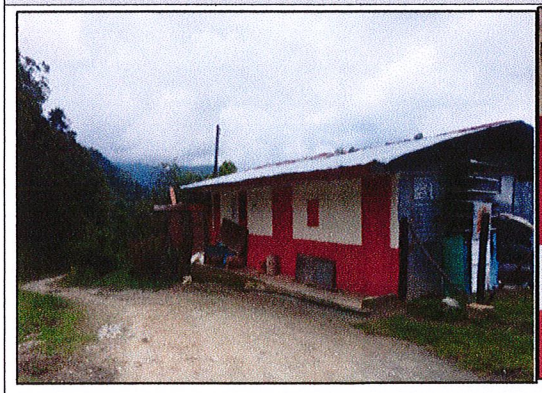
<table>
<tr><th colspan="2">Municipio de Génova</th></tr>
<tr><th>Punto SAU</th><th>Ubicación</th></tr>
<tr><td>Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros</td><td>Calle 26 N 12 – 23 Piso 2
Horario de atención
Miércoles: 2:00 pm a 5:30 pm
Jueves: 2:00 p.m a 5:30 pm
Sábados: 7:00 a.m a 12:00 m</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><th colspan="2">Punto Satélite- Casa Lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova</th></tr>
<tr><td colspan="2">

</td></tr>
</table>

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 4 *Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
Para el periodo no se reporta atrasos	Se realiza la atención en los horarios establecidos para la comunidad en los municipios de Pijao y Génova. Se realizó la aprobación del arte del diseño de la valla de los Puntos SAU Se verificó la instalación de los Puntos Satélites de Información - PSI .	Para el periodo no se reporta eventualidades.

Tabla 5 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones presentadas en el mes = 0 Número de manifestaciones cerradas en el mes = 0	0/0*100% =0%

Tabla 6 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Mesa de trabajo de las observaciones del documento PAGA, verificación de los puntos SAU	Etapa Preliminar	10, 11, 12 y 13 de octubre de 2018
Verificación de documentos e instalación de PSI	Etapa Preliminar	Mes de noviembre de 2018.

3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Para este periodo el 10 de noviembre de 2018 se desarrollaron las reuniones de inicio del proyecto en los municipios de Pijao y Génova, contando con la revisión y aprobación de los siguientes documentos requeridos para su desarrollo:

1. Presentación de inicio
2. Invitación a entidades municipales
3. Invitación a la comunidad de AID
4. Cuña radial de convocatoria

Mediante los siguientes correos electrónicos y comunicaciones:

Tabla 7 *Trazabilidad de las reuniones de inicio*

Fecha	Actividad
24 de octubre de 2018	Correo electrónico de la interventoría de los requerimientos para la reunión de inicio
3 de noviembre de 2018	Respuesta a correo electrónico del 24 de octubre de 2018 – reunión de inicio, adjunto cuña radial, invitación entidades y volante de convocatoria.
4 de noviembre de 2018	Presentación de inicio por parte del contratista.
6 de noviembre de 2018	Comunicado del contratista , respecto a las observaciones emitidas para la reunión de inicio
6 de noviembre de 2018	Respuesta ADM-FNC-825-2018-016 Observaciones a la revisión de actividades de las reuniones de inicio.
6 de noviembre de 2018	Entrega de documentos corregidos, invitación a entidades, cuña radial, volantes de Pijao.

Elaborado COPEBA LTDA

Así mismo, la interventoría revisó la convocatoria realizada por parte del área social de Pijao y Génova para el volante N°2 de invitación a las reuniones de inicio mediante los correos electrónicos:


Tabla 8 *Distribución de Piezas Comunicativas*

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de Octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Pijao	9 de octubre de 2018	40	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
2	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	55	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
3	**Invitación a entidades municipales de Pijao**	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	15	INVIAS, Gobernación del Quindío, Alcaldía Local, Secretaría Gobierno, Secretaría Departamental, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería,

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
					Parroquia,
4	**Invitación a entidades municipales de Génova**	Quindío/ Génova	6 de noviembre de 2018	15	Invitaciones a las entidades: Alcaldía Local, Secretaría Gobierno y desarrollo social, planeación, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, Comando de policía, Instituciones educativas, Parroquia, defensa civil, trasportadores.
5	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Génova	6 y 8 de noviembre de 2018	75	Se distribuyeron en el Área de Influencia Directa

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
6	**Cuña radial**	Quindío/ Génova	6 al 10 de noviembre de 2018	30	Se emitieron 30 cuñas radiales en la emisora manantial 93.1 fm en los siguientes horarios: 8 a.m , hasta las 6 pm cada hora.

Registro de Fotográfico

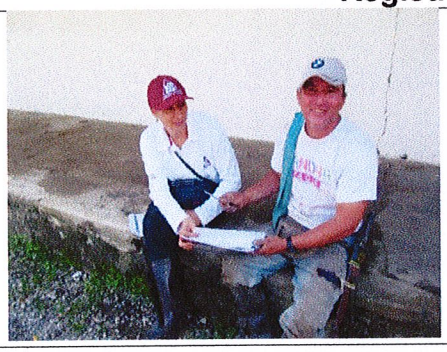



Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 9 Reuniones de Inicio

No	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes	
					Comunidad	funcionarios
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Pijao	10 de noviembre de 2018	106	10
2	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Génova	10 de noviembre de 2018	36	16

Reunión de inicio – Municipio de Pijao



Reunión de inicio – Municipio de Génova

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 10 *Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan atrasos	Se distribuyó la pieza informativa N°2 invitaciones a las reuniones de inicio. Se desarrollaron las reuniones inicio conforme a la programación.	La presentación de inicio, no se ajustó en su totalidad según los requerimientos de la interventoría.

Tabla 11 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes Número de reuniones programadas en el mes =	2/2*100% =100%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo = Total de comunicados propuestos para el periodo	190/190*100%

Tabla 12 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó planillas de distribución en el control de entrega de volantes, Se revisó volante N° 2 Convocatoria a la reunión de inicio Se aprobaron artes para realizar las piezas comunicativas	Etapa Preliminar	3,4,5 y 6 de noviembre de 2018

3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

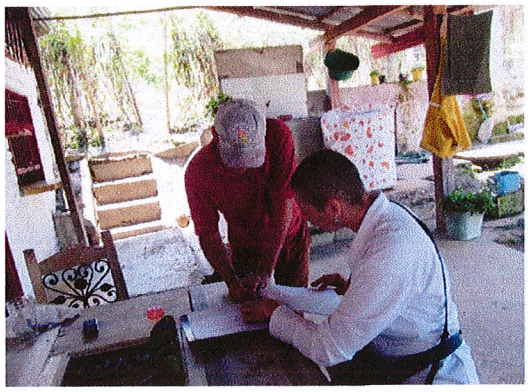
Se dio inicio al levantamiento de las actas de vecindad, a la fecha no se ha radicado para revisión y firma de la interventoría.

Tabla 13 *Relación de Comunicados*

Fecha	Comunicado	Actividad
2 de octubre de 2018	QER18C01248	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2018
9 de octubre de 2018	QDS18C01288	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales a partir del 9 de octubre de 2018 desde el k 0 hasta el k 24.9

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 14 *Levantamiento de Actas de Vecindad*

PIJAO	GÉNOVA
	

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 15 *Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se han presentado las actas de vecindad para revisión de la interventoría. No se ha entregado el registro fílmico detallado con el acta de entorno e inventario predial.	Se dio inicio al levantamiento de las actas de vecindad.	No se presentan eventualidades para el periodo

Tabla 16 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de actas propuestas = Total de actas levantadas y revisadas =	0/0*100% =0%

Tabla 17 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó actas de vecindad levantadas, donde se realizaron observaciones para su diligenciamiento y entrega	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Para el mes de noviembre no se presenta ninguna novedad		

3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El 10 de noviembre se realizó la inscripción al comité de participación comunitaria convocado en las reuniones de inicio y quedo conformado de la siguiente manera para cada uno de los municipios:

Tabla 18 *Comités de Participación Comunitaria*

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
1	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Pijao	10 de noviembre de 2018	5	0	Comunidad y representante de la empresa de trasportes
2	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Génova	10 de noviembre de 2018	1	3	Se contó con la participación del personero, planeación y defensa civil y un integrante de la comunidad.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 19 *Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan atrasos	Se conformó el comité de participación comunitaria.	No presenta eventualidades

Tabla 20 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas = Total de talleres ejecutados =	0/2*100% =0%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados = Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados	0/0*100% =0%

Tabla 21 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la metodología de talleres para las instituciones educativas	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó la conformación del comité de participación comunitaria	Etapa Preliminar	10 de noviembre de 2018

3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La interventoría a la fecha el contratista no ha presentado novedades frente a este aspecto.

Tabla 22 *Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se ha implementado el proyecto.	Se aprobó los porcentajes de contratación 60% MONL y 10% vulnerable.	En caso de contratar ciudadanos extranjeros se debe tener en cuenta el PEP (Permiso especial de Permanencia) y en el RAMV (Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos).

Tabla 23 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL = Número de trabajadores de MONC =	0/0*100% =0%
Productividad	Total de inducciones realizadas Total de inducciones programadas	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas Total de capacitaciones programadas	0/0*100% =0%

Tabla 24 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la recepción de las hojas de vida. Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información referente al proceso de contratación de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018

3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

La interventoría mediante el comunicado ICANH – 130 5445 N ° Recibido 4669 del 29 de octubre de 2018 el ICANH emite el concepto de poner en marcha el Programa de Arqueología Preventiva y Plan de Manejo Arqueológico, el cual se envía al contrasta para su conocimiento e implementación

Tabla 25 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural

Fecha	Solicitud	Consecutivo	Observaciones
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación del estado de patrimonio arqueológico para el proyecto	ADM-INV-825-2018-019	Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación población indígena, minorías y Rom para el proyecto	ADM-INV-825-2018-020	Ministerio del interior
10 de septiembre de 2018	Respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-35688-DAI-2200	En las bases de datos del Ministerio del interior no hay presencia de comunidades indígenas y Kumpañy
17 de septiembre de 2018	Solicitud de pronunciamiento del patrimonio Arqueológico y procedimientos	ICANH 18 de septiembre 499	Comité de Cafeteros del Quindío
25 septiembre de 2018	Ratifican respuesta del	OFI18-38209-DAI-2200	No hay identificación ni

	Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020		registro de comunidades indígenas y Kumpañy (Gitanos)
30 de octubre de 2018	Respuesta del ICANH enviada mediante correo electrónico.	ICANH – 130 5445 N° Recibido 4669	Implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico (aclaración)
27 de noviembre	Respuesta del ICANH, luego de la aclaración del tipo de obra.	ICANH – 130 6001 N° Recibido 4991	Certificación de la No implementación de las investigaciones de campo, sin embargo de encontrar hallazgos se debe informar a la entidad de forma inmediata.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 26 *Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural*

Atrasos	**Adelantos**	**Eventualidades**
No se ha implementado el Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico	Se envió al contratista la respuesta emitida por el ICANH	Se recibió respuesta del ICANH, emitiendo el concepto de la No implementación del Plan de Manejo Arqueológico, para el caso en particular.

Tabla 27 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de Patrimonio Cultural Protegido / Número de Patrimonio identificado	0/0*100% =0%

Tabla 28 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó las comunicaciones conjuntas enviadas para el ICANH La interventoría entrego respuesta al contratista por parte del Ministerio del Interior.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
La interventoría entrego respuesta al contratista del ICANH para la implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico	Etapa Preliminar	30 de octubre de 2018

4 CONCLUSIONES

- La interventoría verifica las actividades adelantas por el contratista ajustando el PAGA, está en revisión la versión N° 3 dando aprobación al documento, sin embargo los formatos y el presupuesto no se le han efectuados los ajustes correspondientes para su aprobación.

- Se desarrollaron las reuniones de inicio conforme a la información y la aprobación de las piezas de divulgación.

- Se envío la información respectiva al contratista del concepto dado por el ICANH, para dar inicio al Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico.

- Se dio inicio a la actividad de levantamiento de actas de vecindad, sin embargo a la fecha de este informe no se ha reportado a la interventoría avances.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
COPEBA LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 825 DE 2018	
INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°03	
Periodo: Noviembre 2018	
Localización proyecto: Municipio de Píjao (Quindío).	Fecha elaboración: 03 de diciembre de 2018.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato 498 de 2018 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.".
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ el manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA:

- La Federación de Cafeteros entrega la versión 3 del PAGA para revisión a la interventoría.
- Se realiza mesa de trabajo en conjunto entre contratista e interventoría para revisar los temas por ajustar dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

- Se envía oficio INVIAS-825-2018 – 005-AM con fecha 20 de noviembre de 2018, donde se hacen observaciones al documento que ya se habían revisado pero que no fueron atendidas en su totalidad por el contratista.
- El contratista da inicio al traslado de material al frente de obra, con el objeto de hacer puntos de acopio y traslado definitivo a los puntos de intervención.
- Se está estableciendo los puntos para dar inicio a la implementación del Programa de "Escuelas Verdes" que hace parte de la Subdirección de Medio ambiente del INVIAS.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO:

Dando cumplimiento al compromiso establecido por la Federación de Cafeteros de entregar los ajustes del PAGA de acuerdo a la revisión realizada entre contratista e interventoría se remite el documento en mención.

La interventoría encuentra que en el documento y formatos que lo componen hace falta información solicitada en la mesa de trabajo, para que se incluyan la totalidad de los ajustes solicitados tanto en el documento como en los formatos para proceder a aprobación e implementación.


Se solicitó por parte del contratista permiso temporal en la escuela que se encuentra en el área de influencia directa del contrato para el almacenamiento de material pétreo que se va a utilizar en los muros y obras transversales a rehabilitar.

Este material va a ser trasladado en los volúmenes necesarios al frente de obra; de tal forma, que no generen interrupción del tráfico vehicular que transita por estas veredas.

	
Foto 1. Material acopiado temporalmente.	Foto 2. Escuela del AID para acopio de material pétreo.

Por otro lado, la Federación está iniciando contacto con las escuelas y revisando los accesos a las mismas para definir el proceso para su implementación con el objeto de dar cumplimiento al programa de "Escuelas verdes" que hace parte del PAGA.

	
Foto 3. Identificación de sitio para implementación del programa de Escuelas Verdes.	Foto 4. Identificación de sitio para implementación del programa de Escuelas Verdes.

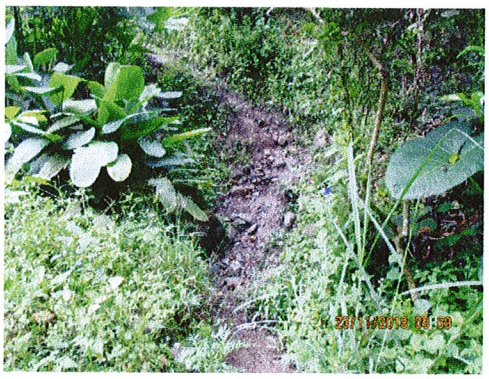	
Foto 5. Identificación de sitio para implementación del programa de Escuelas Verdes.	Foto 6. Estado actual sitio para implementación del programa de Escuelas Verdes.

Una vez, se tengan los adelantos del programa y aceptación por parte de las directivas de los colegios donde se va a implementar el programa, se realizaran los convenios y compromisos pertinentes para su ejecución.

CONCLUSIONES

- ***PAGA***. Se realizó mesa de trabajo con el contratista para realizar aclaración a las observaciones del PAGA realizadas por la interventoría, al documento que la Federación entregó para el 09 de noviembre de 2018.

  La interventoría expide oficio INVIAS-825-2018 – 005-AM con fecha 20 de noviembre de 2018 solicitando la totalidad de los ajustes tanto al documento como a formatos que lo componen, incluyendo todos sus anexos.

- ***Permisos ambientales.*** La interventoría al corte del presente informe tiene conocimiento del inicio del trámite del permiso de Ocupación de Cauce.

  El agua para uso industrial se va a comprar a la Empresa de Servicios Públicos del municipio.

- ***Transporte de Material.*** La Federación dio inicio al traslado de material pétreo el cual se está acopiando en una escuela del área de influencia directa.

- Del mismo modo, se evidencia que la vía de acceso es angosta y en algunos sectores presenta pendientes importantes que van a impedir el paso de volquetas de gran tonelaje. Es de vital importancia realizar el análisis para el transporte del material a los frentes de obra ya que es difícil el acceso de volquetas de seis metros cúbicos por estas vías, sobre todo cuando se encuentran húmedas como consecuencia de las lluvias que se presentan para la época.

- ***ZODMES***. La Federación ya identifico un punto para disposición de material sobrante y/o escombros que se encuentra ubicado en el municipio e Quimbaya (Quindío) el cual cuenta con el permiso de la Autoridad Ambiental para este uso.

RECOMENDACIONES

- ***PAGA***. Adjuntar la información necesaria que soporta el PAGA con el objeto de legalizar su implementación por medio de la aprobación de la interventoría y posterior radicación ante la Subdirección de Medio ambiente del INVIAS.


- ***Permisos ambientales.*** Dar inicio a la solicitud del permiso de ocupación de cauce para una vez la Federación inicie su proceso constructivo, tenga los permisos en regla para iniciar su intervención sin ningún tipo de retraso por falta de trámites ambientales.

  Sin embargo, la interventoría recomienda al área técnica del contrato estar atenta a cualquier cambio que se realice o adición de obras para que se incluyan dentro de la solicitud antes de iniciar su correspondiente tramite.

  Se aclara que las obras que requieren permiso ambiental no podrán ser iniciadas hasta no contar con el permiso expedido por la Autoridad Ambiental.

- ***Transporte de Material.*** La interventoría recomienda analizar puntos de acopio temporal de materiales de construcción debido a las condiciones del terreno y luego realizar trasiego de materiales en vehículos más pequeños que faciliten el acceso a los frentes de obra.

- ***ZODMES***. Verificar posibles puntos de disposición de material de excavación que se puedan legalizar para la ejecución del presente contrato.



Ing. John Oswaldo Cano
Especialista Ambiental
Copeba Ltda.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE QUINDIO
C-03-RI-5003

Bogotá, Noviembre 06 de 2018.

Señores:
COPEBA LTDA.
Atn. Ingeniero EUGENIO PEÑA BARRERA
Director de Interventoría.
Ciudad.

REF. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asunto: Revisión diseño muros de contención.

En atención a los planos y memorias recibidos con el documento QDE18C01438, se tienen las siguientes observaciones:

1. Se deben mostrar claramente las propiedades de los modelos matemáticos utilizados de modo se pueda replicar el modelo utilizado y verificar los resultados que son presentados.
2. De acuerdo con la sección 11.6 (Estribos y muros de contención convencionales), se tiene (11.6.3.3 Límites de excentricidad): "En las cimentaciones sobre suelo, la resultante de las fuerzas de reacción debe estar ubicada dentro de una distancia central igual a dos terceras partes del ancho de la base. En las cimentaciones sobre roca, la resultante de las fuerzas de reacción debe estar ubicada dentro de una distancia central igual a nueve décimas partes del ancho de la base". Teniendo en cuenta lo anterior, la revisión de la estabilidad del muro debe calcularse con la excentricidad de la carga y no con el factor de seguridad como se hacía tradicionalmente.
3. Se recuerda que los muros de contención deben ser revisados en el estado límite de resistencia para los siguientes modos de falla (11.5.3):
   a. Falla por capacidad de carga
   b. Deslizamiento lateral
   c. Pérdida de contacto en la base debido a la excentricidad de la carga.
   d. Falla por arrancamiento de los anclajes
   e. Falla estructural

4. Aun no se muestran las revisiones solicitadas para cumplir con los requerimientos del código Nacional de puentes, se deben mostrar los Ru vs Rr. para deslizamiento, para volcamiento se debe mostrar el eu vs elim, también se deben mostrar los esfuerzos en el suelo calculado por los métodos descritos en el código nacional de puentes.
5. En planos se recomienda usar maximo 3 ganchos como se indica en los muros Guacas-Genova.

Adicionalmente se recomienda recopilar las memorias de los muros en único archivo numerando las páginas, esto con el fin que las respuestas a las observaciones sean referenciadas con número de página.

Cordialmente



CARLOS CASTRO SILVA.
Especialista en estructuras. I.C.
MSc Estructuras.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE QUINDIO
C-04-RI-5003

Bogotá, Noviembre 09 de 2018.

Señores:
COPEBA LTDA.
Atn. Ingeniero EUGENIO PEÑA BARRERA
Director de Interventoría.
Ciudad.

REF. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asunto: Aprobación diseños muros de contención.


Al revisar los documentos de memorias de cálculo y planos recibidos el día 09 de noviembre de 2018, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas en los documentos C-01-RI-5003, C-02-RI-5003 y C-03-RI-5003 razón por la cual se aprueban los siguientes documentos y planos:

NOMBRE DEL ARCHIVO	FECHA ARCHIVO
ISE-MEM-MURO 1-K2+770-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 1-K18+964-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 2-K4+280-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 2-K19+163-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 3-K7+380-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 3-K19+413-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 4-K8+640-08.11.2018	Noviembre 2018
ISE-MEM-MURO 4-K22+321-08.11.2018	Noviembre 2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE QUINDIO
C-04-RI-5003

PLANO	VERSION	FECHA
MURO 1 GUACAS-GENOVA K18+964	4	08/11/2018
MURO 2 GUACAS-GENOVA K19+163	4	08/11/2018
MURO 3 GUACAS-GENOVA K19+413	4	08/11/2018
MURO 4 GUACAS-GENOVA K22+321	4	08/11/2018
MURO 1 PIJAO-GUACAS K2+770	4	08/11/2018
MURO 2 PIJAO-GUACAS K4+280	4	08/11/2018
MURO 3 PIJAO-GUACAS K7+380	4	08/11/2018
MURO 4 PIJAO-GUACAS K8+640	4	08/11/2018

Cordialmente



CARLOS CASTRO SILVA.
Especialista en estructuras. I.C.
MSc Estructuras.

ANEXO 24. LIBRO DE OBRA.

LIBRO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO Nº 00498 - 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MUNICIPIOS DE PIJAO Y GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: A PARTIR DE ORDEN DE INICIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR: PIJAO - GUACAS

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

CONTRATO Nº 00825 - 2078

20-11-2018 No se realizan actividades durante el dia de hoy.
Estado del tiempo: lluvioso

Residente Interventoria

WILMER A. JORDAN.
RESIDENTE OBRA.

21-11-2018. No se realizaron actividades.
Estado del tiempo predominante: seco

Residente Interventoria

WILMER A. JORDAN
RESIDENTE OBRA.

22-11-2018 No se realizaron actividades de obra.
Estado del tiempo: mañana: seco
tarde: lluvias

Residente Interventoria

WILMER A. JORDAN
RESIDENTE OBRA

23-11-2018 No se realizaron actividades de obra pero si de transporte de material de subbase granular; se acopio una cantidad de 3 viajes (volqueta) en sitio conocida come puente tabla (PR 3+280)
Estado del tiempo: seco durante la mayor parte del dia y finalizando la tarde lluvias que parece prolongarse.

Residente Interventoria

W. WILMER A. JORDAN.
RESIDENTE DE OBRA.

24-11-2018 No se realizan actividades de obra.
El material acopiado el dia anterior se observa muy humedo por lluvias de la tarde de ayer y la noche que paso.
Estado del tiempo predominante: seco

Residente Interventoria

WILMER A. JORDAN
RESIDENTE DE OBRA

25-11-2018 Corresponde al dia Domingo. No se realizaron actividades

Residente Interventoria

WILMER A. JORDAN
RESIDENTE DE OBRA

LIBRO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO Nº 00498 - 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MUNICIPIOS DE PIJAO Y GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: A PARTIR DE ORDEN DE INICIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SECTOR: GENOVA - EUACAS

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

CONTRATO Nº 00825 - 2018

0-11-2018 No se realizaron actividades.

Residente Interventoría — RESIDENTE OBRA

21-11-2018 No se realizaron actividades

Estado del tiempo predominante : Seco

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

22-11-2018 No se realizaron actividades de obra

Estado del tiempo - Mañana : seco

tarde : lluvias

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

23-11-2018 No se realizaron actividades de obra.

Estado del tiempo - en la mañana: seco

tarde : lluvias (finalizando la tarde.)

Residente interventoría — RESIDENTE DE OBRA

24-11-2018 No se realizaron actividades

Estado del tiempo predominante : Seco

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

25-11-2018 Correspondiente al día Domingo. No se realizaron actividades

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

26-11-2018 No se realizaron actividades de obra.

La interventoría solicitó al contratista dar inicio a la etapa de ejecución de obras mediante el oficio ADM-FNC-825-2018-020.

Estado general del tiempo / Mañana : seco

Tarde : lluvias intensas

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

27-11-2018 No se realizaron actividades de ejecución de obras.
Estado del tiempo / mañana : seco
Tarde : lluvias intensas

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

28-11-2018 No se realizaron actividades de ejecución de obra.
Estado del tiempo predominante : seco durante jornada laboral.

Residente interventoría — RESIDENTE DE OBRA

29-11-2018 No se realizaron actividades
Estado del tiempo / mañana : seco
tarde : lluvias

Residente Interventoría — RESIDENTE DE OBRA

30-11-2018 No se realizaron obras en la vía
Estado del tiempo / en la mañana : seco
en la Tarde : lluvias intensas

Residente interventoria — RESIDENTE DE OBRA

[illegible] de ejecución de obras.

EN EL PRESENTE INFORME NO SE INCLUYE PROGRAMA DE OBRA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.
