SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**CONTRATO DE SUMINISTRO** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2759 DE 2025** **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 12 Del: 05 de enero de 2026 Al: 10 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 86 Días

Puerto Tejada, Caloto, Sevilla, Quibdo, Amalfi, Abejorral y Dabeiba

Alvaro Lozano Lopera - Cesar Augusto Martinez

ENTIDAD CONTRATANTE Superintendencia de notariado y registro SEDE

OBJETO:

"SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"

	SEMANAL	ACUMULADO EJECUCION
Ejecucion programada (%)	10,00%	93,00%
Valor del Contrato	$ 809.148.524,00	$ 752.508.127,32

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Contrato No.	2759 DE 2025
Valor Inicial:	$ 809.148.524
Valor Actualizado:	$ 809.148.524
Plazo Inicial:	Dos (2) meses
Plazo Actualizado:	Tres (3) meses cinco (5) dias
Fecha de Iniciación:	10 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	15 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

ENTREGA MATERIALES DABEIBA



ENTREGA MATERIALES DABEIBA



ENTREGA MATERIALES DABEIBA



ENTREGA MATERIALES AMALFI



DESMONTES QUIBDO




INSTALACIONES QUIBDO



INSTALACIONES QUIBDO



INSTALACIONES PUERTO TEJADA

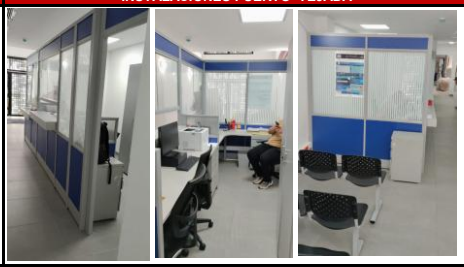

INSTALACIONES PUERTO TEJADA



DESCRIPCION ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA

SE REALIZA DESPACHOS DE MATERILES PENDIENTES PARA DABEIBA AMALFI Y SEVILLA SEDES A LAS CUALES FALTABA ENVIAR MATERIALES

SE PROGRAMAN INSTALACIONES INICIANDO CON PUERTO TEJADA Y QUIBDO

OBSERVACIONES : EN ESTA SEMANA SE CONTEMPLA AVANCE TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZAN DESPACHOS A SEDES PENDIENTES Y SE INCIAN INSTALACIONES EN SEDES DE MAYOR PRESUPEUSTO COMO ES EL CASO DE QUIBDO Y PUERTO TEJADA , PARA ESTA SEMANA SE CONTEMPLA UN AVANCE 10% , LLEGANDO A UN TOTAL ACUMULADO DEL 93%, QUEDANDO UN 7% POR EJECUTAR ,REPRESENTADO BASICAMENTE EN COSTOS DE INSTALACIONES PENDIETES

FIRMA:

IVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
COLCOLDI SAS

LINA NATHALIA DELGADO BARRETO
COORDINADORA DEL CONTRSTO
COLCOLDI SAS
