Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número
190	-		-	05	-		-	91

LA DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

Que en el marco del CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO: 2070-2025, cuyo OBJETO es: **MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ**, y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONTRATO: 2103-2025, cuyo OBJETO es: **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.**

Para la ejecución de la obra descrita, esta Dirección certifica que no se requiere licencia urbanística, conforme a la normativa urbanística vigente, específicamente las siguientes disposiciones legales de obligatorio cumplimiento:

El **Decreto 1077 de 2015** (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), en su artículo 2.2.6.1.1.11, modificado por el artículo 12 del Decreto 1783 de 2021, establece un régimen especial en materia de licencias urbanísticas. En su numeral 1.2 se dispone expresamente lo siguiente:

"1.2 La ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura para la exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia. Tampoco requerirá licencia el desarrollo de edificaciones de carácter transitorio o provisional que sean inherentes a la construcción de este tipo de proyectos."

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la intervención se realiza sobre una vía departamental, la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas se encuentra exenta del trámite de licencia urbanística, al hacer parte de la infraestructura vial mencionada por la norma.

El artículo 192 del Decreto **Ley 019 de 2012** (conocido como Ley Antitrámites), establece un régimen especial en materia de licencias urbanísticas, orientado a simplificar trámites en el sector público. En su numeral 1, literal b), dispone expresamente lo siguiente:

"No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para: [...]
b. La construcción de proyectos de infraestructura de la red vial y férrea nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura para la exploración, explotación y distribución de recursos naturales no renovables, como hidrocarburos y minerales e hidroeléctricas."

En virtud de esta disposición, y dado que el proyecto objeto del contrato se desarrolla sobre una vía departamental, la intervención prevista no requiere licencia urbanística, al encontrarse expresamente exceptuada por la norma.

Asimismo, se precisa que el Contratista cuenta con un plazo de ejecución contractual definido de ocho (8) meses, el cual no se encuentra sujeto a la obtención o vigencia de una licencia urbanística, en virtud de esta exención. En consecuencia, el cumplimiento del cronograma establecido en el Contrato 2070-2025 debe atender exclusivamente a lo dispuesto en sus condiciones técnicas, jurídicas y administrativas.

Se anexa demás relación predial de los terrenos ubicados sobre la Calle 25 para el Proyecto de Mejoramiento de Espacio Público mediante la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas de la vía Calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia en el municipio de Paipa. Se anexa la información detallada en cuanto a los predios, al Perfil Vial – Demarcación, con sus respectivas observaciones obtenidas en visita de campo.

Para constancia se expide la presente en Paipa a solicitud del interesado, a los **diecinueve (19) días del mes de JUNIO del año dos mil veinticinco (2025)**.

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ VARGAS
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	JORGE GUILLERMO TARAZONA CPS MP 042 2025.	
Revisó:	Martha Lucia Rodríguez Vargas./ Director Dpto Adtivo Planeación	

No	Archivado en
1	Se anexa documento PDF relación predial detallada de los terrenos ubicados sobre la Calle 25.

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

RESPUESTA RADICACIÓN PRELIMINAR INFORME 0

1 mensaje

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 11 de septiembre de 2025, 4:57 p.m.
<direccion.infraestructuravial@boyaca.gov.co>
Para: Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>

Cordial saludo,
Por medio de la presente, envío respuesta radicación preliminar informe 0 para su conocimiento y trámites pertinentes.

Atentamente,

Oscar Ivan Pinzón Sánchez
Director de Desarrollo de la Infraestructura Vial.
Secretaria de Infraestructura Pública.

Gobernación de Boyacá

contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
+(57)6087420150
Calle 20 #9-90

www.boyaca.gov.co

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

OFICIO - respuesta informe 0.pdf
372K

Tunja, 11 de septiembre de 2025.

Señores
UNION TEMPORAL LAFER
LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
Representante Legal
Contratista Interventoría

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: Respuesta oficio **CTO. 2103/2025-016**- "Radicado preliminar informe cero.

Reciban un atento y cordial saludo de la dirección de desarrollo de Infraestructura vial de la secretaria de infraestructura pública, deseándole los mejores éxitos en sus labores.

En atención al oficio **CTO. 2103/2025-016**- "Radicado preliminar informe cero, correspondiente al Contrato de Interventoría **No. 2103 de 2025**, y en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, me permito manifestar que, una vez efectuada la revisión del documento en mención, se formulan las siguientes observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el contratista para efectos de continuar con el trámite de revisión y aprobación:

1. **Formato de presentación:**

   El Informe Cero deberá presentarse en estricto cumplimiento del formato institucional **"A-AD-GC-F-046"**, disponible en la plataforma Isolución, a través del enlace:
   http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/PaginaLogin.aspx
   (Usuario: consulta / Contraseña: consulta).


2. **Recurso humano:**

   Los profesionales y/o personal relacionado en el informe deberá ajustarse a lo previsto en los **estudios previos del proceso contractual** y a los perfiles requeridos para la ejecución del presente proyecto, conforme a las obligaciones contractuales asumidas por la firma interventora.

Perfil No.	Can	Cargo	Título Profesional	Título de Posgrado	Experiencia General (años mínimos)	Experiencia Especifica (años mínimos)
1	1	Director de interventoría. **DISPONIBILIDAD 30% MENSUAL**	Ingeniero Civil o Arquitecto O Ingeniero de transporte y vías CATEGORIA I		No menor de DOCE (12) años,contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación.	mínimo CINCO (5) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, como director de interventoría en proyectos viales relacionados con el objeto de la presente contratación.
2	1	Residente de interventoría. **DISPONIBILIDAD 100% MENSUAL**	Ingeniero Civil o Arquitecto O Ingeniero de transporte y vías CATEGORIA 3	N.A	No menor de OCHO (8) años, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de presente proceso de contratación.	Mínimo TRES (3) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, como residente de interventoría en proyectos viales relacionados con el objeto de presente contratación.
3	1	INGENIERO ESPECIALISTA ELECTRICO **DISPONIBILIDAD 10% MENSUAL**	Ingeniero eléctrico o ingeniero especialista eléctrico **CATEGORIA 2**	Aplica si es ingeniero en áreas afines a la ingeniería-debe tener titulo de posgrado en electricidad.	No menor de DIEZ (10) años, contada entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación	Mínimo CUATRO (4) años acumulada, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, como especialista en electricidad en proyectos viales relacionados con el objeto de la presente contratación.

En mérito de lo expuesto, se requiere a la Unión Temporal LAFER efectuar los ajustes pertinentes y proceder a la remisión del Informe Cero debidamente corregido, con el fin de dar continuidad al proceso de revisión y eventual aprobación del mismo.

Atentamente,



OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Proyectó: ING.DAVID LEONARDO HERNANDEZ

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

Respuesta documentación pozos de inspección por parte del ESP

1 mensaje

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 12 de septiembre de 2025, 6:10 p.m.
<direccion.infraestructuravial@boyaca.gov.co>
Para: Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio de la presente envío documentación referente a los pozos de inspección, información emitida por la ESP.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Oscar Ivan Pinzón Sánchez
Director de Desarrollo de la Infraestructura Vial
Secretaria de Infraestructura Pública.

Gobernación de Boyacá

contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
+(57)6087420150
Calle 20 #9-90

www.boyaca.gov.co

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

OFICIO RTA PDA 2.pdf
513K

Tunja, 12 de septiembre de 2025.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 2103 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ASUNTO: Respuesta oficio **CTO. 2103/2025-046** - "NOTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EPB"


Reciban un atento y cordial saludo de la dirección de desarrollo de Infraestructura vial de la secretaria de infraestructura pública, deseándole los mejores éxitos en sus labores.

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se notifica el incumplimiento de compromisos por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá – EPB, me permito informar que la Gobernación de Boyacá ha recibido comunicación oficial de dicha entidad (Oficio **GTS – 1677** del 11 de septiembre de 2025), mediante la cual se remitió la información necesaria para la intervención de pozos existentes construidos en el marco del Contrato de Obra No. 010 de 2019.

Dicha documentación puede ser consultada en el enlace dispuesto por la EPB en el mencionado oficio el cual se anexa al presente al presente documento.

En consecuencia, se da cumplimiento a lo acordado en el Comité de Obra del 15 de agosto de 2025, contando ahora con los insumos técnicos requeridos para que el contratista de obra e interventoría elabore y radique el informe solicitado por la empresa de servicios públicos, requisito previo para la expedición del permiso de intervención correspondiente de los pozos de inspección.

Atentamente,



OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Proyectó: ING.DAVID LEONARDO HERNANDEZ

GTS – 1677

Tunja, 11 de septiembre de 2025

Señor
LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
Representante legal
CONSORCIO RYP
andenespaipa2025@gmail.com

Ciudad

REFERENCIA: COMPROMISOS CONTRATO DE OBRA Nº 010 DE 2019

Asunto: **ADECUACIONES SUPERFICIALES EN POZOS DE ALCANTARILLADO EXISTENTES – CONTRATO DE OBRA NO. 010 DE 2019.**

Conforme a los compromisos adquiridos en comité técnico, relacionado con la intervención de pozos existentes construidos en el marco del Contrato de Obra No. 010 de 2019, cuyo objeto fue la construcción de colectores de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de Paipa, Boyacá, Empresas públicas de Boyacá S.A. E.S.P., como entidad responsable del contrato original, luego de revisar los antecedentes contractuales y técnicos correspondientes, me permito remitir: información y los planos record existentes sobre el diseño de los mencionados pozos, dichos productor podrán ser consultados en el siguiente link: **https://drive.google.com/drive/folders/19buTQi-lLlRvhf8hb74lp4TJYLy8N6PU?usp=drive_**link , la información enviada es insumo técnico indispensable para que el contratista de obra elabore y radique el informe solicitado por la entidad, requisito previo para la expedición del permiso de intervención correspondiente.

Cordialmente,

JORGE ELIECER CORTES CASTRO
Director Técnico y Operativo (E)
Empresas Públicas de Boyacá S.A E.S.P.

Proyecto: Dayanna Camargo Pedraza – Profesional dirección técnica y operativa EPB S.A E.S.P
Edwing Cruz Mora/ Profesional Jurídico dirección técnica y operativa EPB S.A E.S.P

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

Fw: AUDIENCIA PÚBLICA

1 mensaje

ariel salomon rojas bahamon <arielrojasba@yahoo.es> 12 de septiembre de 2025, 10:16 p.m.
Para: Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>

----- Mensaje reenviado -----
De: ariel salomon rojas bahamon <arielrojasba@yahoo.es>
Para: concejo@paipa-boyaca.gov.co <concejo@paipa-boyaca.gov.co>; Omar Enrique Coronado Becerra <omarcoronadobc@hotmail.com>; carlosmario.f@hotmail.com <carlosmario.f@hotmail.com>; Gilberto72180 <gilberto72180@gmail.com>; andenespaipa2025@gmail.com <andenespaipa2025@gmail.com>; interventoria.andenespaipa25j@gmail.com <interventoria.andenespaipa25j@gmail.com>; Jorge Alberto Lee Rodriguez <joalberlee@hotmail.com>; peisgube@yahoo.es <peisgube@yahoo.es>; ajoya1139@gmail.com <ajoya1139@gmail.com>; hectorecheverria84@gmail.com <hectorecheverria84@gmail.com>
Enviado: viernes, 12 de septiembre de 2025, 22:00:59 GMT-5
Asunto: AUDIENCIA PÚBLICA

Atento saludo

2 archivos adjuntos

INVITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA OBRAS CALLE 25 -.docx
65K

RENOVACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA PAIPA (1).pdf
191K

RESOLUCIÓN No. 016 DE 2024
(09 de abril)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA LA INSCRIPCIÓN DE UNA VEEDURÍA CIUDADANA."

El Personero Municipal de Paipa, en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, en especial las contempladas en la Ley 617 de 2000 y en la Ley 850 de 2003.

CONSIDERANDO:

Que mediante las facultades otorgadas por la ley 617 de 2000, en su artículo 24, permite a las Personerías Municipales, la conformación democrática de las Veedurías Ciudadanas como Mecanismo de Participación Ciudadana.

Que el objeto de dicha veeduría es ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato de la prestación de un servicio público.

Que el cumplimiento del objeto se pretende materializar durante el término de duración del contrato de obra pública No.020-2023 "Mejoramiento de la vía calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia en el municipio de Paipa, Boyacá", término que fue prorrogado hasta el año 2026. Así mismo, el objeto de la presente Veeduría Ciudadana, compete no solo el mejoramiento de la vía calle 25, sino toda obra de carácter público dentro del municipio de Paipa, por el término de 2 años, a partir de la fecha de reconocimiento de la Veeduría.

Que es deber de la Personería de Paipa reconocer las veedurías e inscribirlas en el respectivo registro de este Despacho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 850 de 2003.

Que todo lo relacionado con su reglamento y funcionamiento interno es deber y autonomía de los miembros que se han constituido en la misma veeduría.

RESUELVE:

PRIMERO: Aceptar la inscripción de la veeduría denominada Veeduría ciudadana para el seguimiento del "Veeduría Ciudadana de Paipa".

SEGUNDO: Reconocer como integrantes de la Veeduría Ciudadana, según lo expuesto previamente, a las siguientes personas:

CIUDADANO/A	DOCUMENTO IDENTIDAD	CELULAR - CORREO	CARGO
Ariel Rojas Bahamón	6755093	3214946810 arielrojasba@yahoo.es	Presidente
Jorge Alberto Lee Rodríguez	7217488	3106889289 joalberlee@hotmail.com	Integrante
Gilberto Rodríguez Patarroyo	7218004	3041181828 gilberto72180@gmail.com	Integrante

Luz Mireya Vergara	24078724	3212155875 luzmireyavergara@gmail.com	Integrante
Pedro Gutiérrez	4191198	3105548864 peisgube@yahoo.es	Integrante
Carlos Mario Fonseca	4285648	3153164330 carlosmario.f@hotmail.com	Integrante
Armando Joya	17108362	3152063820 ajoya1139@gmail.com	Integrante
Héctor Echeverría	4191034	3134543265 hectorecheverria84@gmail.com	Integrante
Norberto Camargo	74322901	3168488807 norbertocmrg@gmail.com	Integrante
Víctor Ramírez	7212084	3112629561	Integrante

PARÁGRAFO: La Veeduría Ciudadana de Paipa, hará control a todas las obras que se ejecuten en el municipio de Paipa, que involucren recursos económicos públicos de orden municipal, departamental, nacional o de cualquier ente público descentralizado.

TERCERO: El término de la vigencia de la presente veeduría corresponde al término de dos años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2026.

CUARTO: Los integrantes de la Veeduría Ciudadana reconocidos en el numeral segundo de la parte resolutiva**,** ejercerán su labor Ad-Honorem.

QUINTO: La Veeduría Ciudadana en cumplimiento de sus labores, podrá hacer uso de las acciones públicas y mecanismos de participación ciudadana como el derecho de petición, sin perjuicio de las establecidas en la ley.

SEXTO: La Veeduría Ciudadana velará por el estricto funcionamiento de los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, respecto a las peticiones y solicitudes de copias de los documentos legalmente permitidos que se promuevan ante el seguimiento a la gestión.

SÉPTIMO: Contra la presente Resolución no procede recurso de ley alguno.

PARÁGRAFO: Se anexa a la presente Resolución, la solicitud de Renovación de la Inscripción de la Veeduría Ciudadana mencionada, presentada por el Sr. ARIEL ROJAS BAHAMÓN, en su calidad de Presidente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Paipa, a los nueve (09) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

SERGIO ANDRES ACOSTA LIZARAZO
Personero Municipal de Paipa

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

Solicitud Informe ejecución contractual

1 mensaje

ariel salomon rojas bahamon <arielrojasba@yahoo.es> 16 de septiembre de 2025, 7:34 a.m.
Para: Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>, Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com>, "Personeria paipa-boyaca.gov.co" <personeria@paipa-boyaca.gov.co>, "planeacion@paipa-boyaca.gov.co" <planeacion@paipa-boyaca.gov.co>, "infraestructura@paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Atento saludo.

La Veeduría Ciudadana de Paipa insiste en solicitar que se presente , en desarrollo de la Audiencia Pública agendada para el 19 de septiembre de 2025, un informe de ejecución contractual de obra.

Agradecemos su atención al presente mensaje.

Ariel S. Rojas Bahamón
Presidente
Veeduría Ciudadana de Paipa
Res. 016/2024 PMP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIROANTICIPO No 2

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 16 de septiembre de 2025, 8:56 a.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 15 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 050- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la primera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se anexan facturas con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

3 archivos adjuntos

50. CTO 2070-CONS-RYP–050- 2025.pdf
683K

MANEJO DEL ANTICIPO .xlsx
18K

ORDEN DE PAGO 2-SOPORTES.rar
4235K

CONSORCIO RYP	OFICIO	CÓDIGO: GPDI-FR-0525-00
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

Tunja, 15 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 050- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la primera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se anexan facturas con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

RADICACION CORRECCIONES INFORME TECNICO GERENCIAL DE OBRA 002

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 16 de septiembre de 2025, 9:08 a.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 16 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 051- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: RADICACION CORRECCIONES INFORME TECNICO GERENCIAL DE OBRA 002

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito correcciones al informe mensual de obra para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 solicitadas por ustedes así:

“(…) 1. Mejorar el orden y presentación del documento en general. Evitar saltos de página después de títulos y mantener una misma estructura del documento.(…)”

Se realiza ajuste en el informe.

“(…)2. En el ítem 5.19, página 12 del documento, se relaciona la fotografía No.09, sin embargo, no se aprecia el registro fotográfico mencionado. (…)”

RTA: Se elimina el registro fotográfico

“(…)3. En la página 14 del documento, se menciona que la aprobación a la modificatoria No.01 se efectuó el 01 de agosto de 2025; corregir.(…)”

RTA. Se realiza el ajuste a la redacción, ya que se quería dar la idea de que se había solicitado la modificatoria.

“(…) 4.No se presenta Anexo No.01; bitácora de obra.(…)”

RTA. Se anexa la bitácora escaneada

“(…) 5. No se anexan resultados de ensayos de control de calidad efectuados durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el plan de calidad aprobado. (…)”

RTA: se anexan resultados de ensayos
“(…)6.Adjuntar seguimiento al plan de inspección y ensayos (…)”

RTA: El plan de inspección de ensayos es una guía para el desarrollo con calidad de las actividades a ejecutar dentro del contrato, los registros se encuentran en los formatos del seguimiento de plan de calidad y en el anexo 5

“(…)7. Adjuntar seguimiento al control de actividades del contrato.(…)”

RTA: Se anexa este ítem al informe mensual

“(…)8. No se relacionan formatos de seguimiento del plan de calidad presentados en el capítulo 4.2.4 del plan de calidad aprobado. (…)”

RTA: Se relacionan en el anexo No 2 del informe mensual, sin embargo, se anexan únicamente los que aplican y los que se ejecutaron durante el periodo evaluado.

“(…)9. No se relaciona seguimiento al plan de auditorías internas presentado en el plan de calidad aprobado. (…)”

RTA a la fecha del informe no se habían cumplido dos meses de ejecución por lo que las auditorias internas se van a realizar en el siguiente periodo evaluado.

“(…)10.Relacionar balance financiero de actividades ejecutadas. Además, anexar informes semanales de obra como soporte.(…)”

RTA Se crea un nuevo anexo (anexo 9) para adjuntar los informes semanales de obra

“(…) 11. Presentar informe de seguimiento al plan de inversión del anticipo, así como los respectivos soportes en caso de ser necesario.(…)”

RTA: durante el periodo evaluado, la entidad aún no había entregado el anticipo al contratista de obra.

“(…)12. Incluir un apartado de seguimiento al reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos. (…)”

RTA dentro de los próximos informes se incluirá detalladamente los dañ4os ocasionados a los servicios públicos, sin embargo, cuando se dañan acometidas domiciliarias se arreglan con inspección de los trabajadores de Red Vital o inspectores de Gas Natural Vanti

"(…)13. Informe de Plan de Manejo de Tránsito tiene como título "INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA Y PLAN DE CALIDAD".(…)"

RTA: se realiza la corrección

Adjunto link para su revisión

https://www.dropbox.com/scl/fo/3qerja4zzddi6sb8yfpmm/ANzsYMuk6uCyHlA1kz0XoXE?rlkey=kgn5p7umgn7ar9wqbnviih0co&dl=0

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

---

51. CTO 2070-CONS-RYP–051- 2025.pdf
781K

Tunja, 16 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 051- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: RADICACION CORRECCIONES INFORME TECNICO GERENCIAL DE OBRA 002

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito correcciones al informe mensual de obra para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025 solicitadas por ustedes así:

“(…) 1. Mejorar el orden y presentación del documento en general. Evitar saltos de página después de títulos y mantener una misma estructura del documento.(…)”

Se realiza ajuste en el informe.

“(…)2. En el ítem 5.19, página 12 del documento, se relaciona la fotografía No.09, sin embargo, no se aprecia el registro fotográfico mencionado. (…)”

RTA: Se elimina el registro fotográfico

“(…)3. En la página 14 del documento, se menciona que la aprobación a la modificatoria No.01 se efectuó el 01 de agosto de 2025; corregir.(…)”

RTA. Se realiza el ajuste a la redacción, ya que se quería dar la idea de que se había solicitado la modificatoria.

“(…) 4.No se presenta Anexo No.01; bitácora de obra.(…)”

RTA. Se anexa la bitácora escaneada

“(…) 5. No se anexan resultados de ensayos de control de calidad efectuados durante el periodo

comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el plan de calidad aprobado. (…)"

RTA: se anexan resultados de ensayos
"(…)6.Adjuntar seguimiento al plan de inspección y ensayos (…)"

RTA: El plan de inspección de ensayos es una guía para el desarrollo con calidad de las actividades a ejecutar dentro del contrato, los registros se encuentran en los formatos del seguimiento de plan de calidad y en el anexo 5

"(…)7. Adjuntar seguimiento al control de actividades del contrato.(…)"

RTA: Se anexa este ítem al informe mensual

"(…)8. No se relacionan formatos de seguimiento del plan de calidad presentados en el capítulo 4.2.4 del plan de calidad aprobado. (…)"

RTA: Se relacionan en el anexo No 2 del informe mensual, sin embargo, se anexan únicamente los que aplican y los que se ejecutaron durante el periodo evaluado.

"(…)9. No se relaciona seguimiento al plan de auditorías internas presentado en el plan de calidad aprobado. (…)"

RTA a la fecha del informe no se habían cumplido dos meses de ejecución por lo que las auditorias internas se van a realizar en el siguiente periodo evaluado.

"(…)10.Relacionar balance financiero de actividades ejecutadas. Además, anexar informes semanales de obra como soporte.(…)"

RTA Se crea un nuevo anexo (anexo 9) para adjuntar los informes semanales de obra

"(…) 11. Presentar informe de seguimiento al plan de inversión del anticipo, así como los respectivos soportes en caso de ser necesario.(…)"

RTA: durante el periodo evaluado, la entidad aún no había entregado el anticipo al contratista de obra.

"(…)12. Incluir un apartado de seguimiento al reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos.(…)"

RTA dentro de los próximos informes se incluirá detalladamente los dañ4os ocasionados a los

servicios públicos, sin embargo, cuando se dañan acometidas domiciliarias se arreglan con inspección de los trabajadores de Red Vital o inspectores de Gas Natural Vanti

"(…)13. Informe de Plan de Manejo de Tránsito tiene como título "INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA Y PLAN DE CALIDAD".(…)"

RTA: se realiza la corrección

Adjunto link para su revisión

https://www.dropbox.com/scl/fo/3qerja4zzddi6sb8yfpmm/ANzsYMuk6uCyHlA1kz0XoXE?rlkey=kgn5p7umgn7ar9wqbnviih0co&dl=0

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

S-2025-001428-INFDDIV - 16 septiembre 2025

1 mensaje

no-reply@boyaca.gov.co <no-reply@boyaca.gov.co> 16 de septiembre de 2025, 10:40 a.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Señor(a) LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ

Fecha: 16 septiembre 2025

Para verificar la autenticidad del documento, por favor de clic en el siguiente link: https://vuv.boyaca.gov.co/pqrs/tracking, ingrese el número de Radicado: **S-2025-001428-INFDDIV** y la contraseña **2N3HOK6eUB**

Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción:

Gobernación de Boyacá

Gobernación de Boyacá

contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
+(57)6087420150
Calle 20 #9-90

www.boyaca.gov.co

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

S-2025-001428-INFDDIV.zip
286K

S-2025-001428-INFDDIV

TUNJA, 16 de septiembre de 2025

Señor(a)
LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL LAFER
PAIPA - BOYACÁ
interventoria.andenespaipa25@gmail.com
PAIPA BOYACA

Contraseña:2N3HOK6eUB

ASUNTO: Remisión de información – Oficio S-2025-017112-SECCON

En atención al oficio **S-2025-017112-SECCON** del 11 de septiembre de 2025, emitido por la Dirección de Procesos de Selección de la Gobernación de Boyacá, mediante el cual se formulan observaciones respecto a la solicitud de modificatorio al contrato de obra pública No. 2070 de 2025, me permito remitir a ustedes la comunicación mencionada, con el fin de que se adelanten los trámites y las correcciones correspondientes de acuerdo con lo señalado en dicho documento.

Agradecemos dar el trámite respectivo y radicar ante la Secretaría de Contratación las subsanaciones requeridas, en los términos allí expuestos.

Cordialmente,

OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

Anexos: Si

Número de folios: 1

Revisó: OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Elaboró: DAVID LEONARDO HERNANDEZ GUERRERO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- CONTRATISTA

S-2025-017112-SECCON

TUNJA, 11 de septiembre de 2025

Señor(a)
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
jose.alvarez@boyaca.gov.co
TUNJA BOYACA

Contraseña:pCVZCwGC92

Asunto: DEVOLUCIÓN SOLICITUD DE MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2070 DE 2025

Cordial saludo,

Recibidos los documentos para adelantar el proceso del asunto y realizada la revisión, me permito indicar que se presentan las siguientes observaciones:

1. Se deben publicar los informes de avance de ejecución dado que publicados dado que no existe ninguno desde la fecha del acta de inicio, r lo tanto, es imposible poder verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el porcentaje de ejecución del contrato hasta el momento de presentación de la solicitud, teniendo en cuenta, además, que ésta es una obligación contenida en el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento: *8.2.11.Elaborar los informes de seguimiento para poner en conocimiento el estado o avancedelobjeto contractual conforme está estipulado en el contrato o convenio, los cuales deberán ser presentados y radicados mensualmente en la Secretaría de Contratación; en caso de que el plazo del contrato o convenio sea inferior a un mes, los informes serán elaborados enrelación con dicho aplazo. Diligenciar los informes en los formatos que apliquen de acuerdo con la modalidad de contratación.*

2. Asimismo y teniendo en cuenta que el presente modificatorio incluye items no previstos es necesario adelantar el respectivo estudio previo, que es el documento idoneo que demuestra el aval por parte de la sectorial, lo anterior de acuerdo también a las *FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.9.2.13. Emitir concepto técnico y trasladar a la Secretaria deContratación las solicitudes de adición en valor, prórrogas, modificaciones, etc., requeridas por el contratista o la entidad parte del convenio. En el casode convenios o contratos donde se ejecuten recursos del Sistema Generalde Regalías una vez se tenga concepto técnico, antes de trasladarse a la Secretaria de Contratación se debe remitir para la aprobación, registro e información a la instancia que aprobó los Recursos ante el SGR.* (subrayado fuera de texto).

3. Se sugiere ajustar la cotización de la empresa SISMA S.A.S, teniendo en cuenta la validez de la misma esta ya se encuentra vencida

4. Se sugiere verificar las actividades ejecutadas dentro del informe técnico enviado por parte de obra e interventoría.

5. Se sugiere verificar los ítems no previstos y sustentar el por que no son tomados de los precios vigentes de la entidad

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben adelantar las correcciones pertinentes y luego de ello radicarlas al correo procesosdeseleccion@boyaca.gov.co; indicando que se trata de subsanaciones a la solicitud del asunto.

Asimismo, desde la Secretaria de Contratación se esta presto para adelantar mesa técnica en caso de ser requerido por la sectorial que presenta la solicitud de modificatorio.

Cordialmente,



SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
DIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN

Anexos: No

Número de folios: 1

Elaboró: PAULA LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ / SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN- CONTRATISTAS

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

REMISION CORRECCION DOCUMENTOS SOPORTEORDEN GIRO ANTICIPO No 2

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 18 de septiembre de 2025, 9:46 a.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 18 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 052- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION CORRECCION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos corregidos soporte de la segunda orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se elimina orden de KREATO teniendo en cuenta que hay una modificación de las cantidades

Se anexan facturas con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

3 archivos adjuntos

52. CTO 2070-CONS-RYP–052- 2025.pdf
685K

MANEJO DEL ANTICIPO .xlsx
18K

ORDEN DE PAGO 2-SOPORTES.rar
1591K

Tunja, 18 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 052- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION CORRECCION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos corregidos soporte de la segunda orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se elimina orden de KREATO teniendo en cuenta que hay una modificación de las cantidades

Se anexan facturas con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIROANTICIPO No 3

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 18 de septiembre de 2025, 4:09 p.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 18 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 053- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 3

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se anexan facturas con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

5 archivos adjuntos

53. CTO 2070-CONS-RYP–053- 2025.pdf
684K

SOPORTES FIDUCIA 2 MELQUISEDEC.pdf
875K

SOPORTES FIDUCIA 1 KREATO.pdf
577K

pagosMasivosPresupuestoPlantilla (6).xlsm
434K

MANEJO DEL ANTICIPO .xlsx
18K

Kreato
Construimos en balance con la tierra.

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000933 DEL 11 DE FEBRERO DE 2013.
NO EFECTUAR RETEICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A COGUA CUNDINAMARCA.

Bogotá, 18 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO Nro. 01

CONSORCIO RYP
NIT. 901963394-7

DEBE A:

KREATO S.A.S
NIT. 900.151.827-6

La suma de **$ 208,208,047 (DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE M/TE)** por concepto del anticipo por suministro de prefabricados en concreto para el contrato de obra No 2070 de 2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA" celebrado **entre el consorcio RYD y la GOBERNACIÓN DE BOYACA.**

Favor consignar en nuestra cuenta corriente Bancolombia No 03237956901 a nombre de KREATO SOLUCIONES KREATIVAS EN CONCRETO NIT 900.151.827-6.

Cordialmente,

LUZ DIVIA MIRANDA HERRERA
Gerente Financiera y Administrativa

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151152927

(415)7707212489984(8020) **000014115115292 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 1 8 2 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO S. A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	KREATO S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 97 A 13 TO B OF 304

42. Correo electrónico lmiranda@kreato.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 2 1	3 1 2 3 4 0 7 4 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 3 9 5	2 0 0 7 0 5 0 1	4 9 2 3	2 0 1 1 0 4 0 1		4 3 3 0	4 6 6 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2	5	5								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MIRANDA HERRERA LUZ DIVIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Martes, 4 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO identificado(a) con NIT 900151827, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03237956901	2007/11/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.



Factura Electrónica de Venta MP - 895

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095444220 de 10/07/2025 - 10/01/2026 autoriza MP-863 a MP-1000

Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/09/2025 09:27
Fecha de Vencimiento	10/09/2025 09:27
Fecha de Validación	10/09/2025 09:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MELQUESIDEC PINZON PINZON
CC	80541955-0
Obligación	NO APLICA
Email	toletesytransportesmelco@gmail.com
Teléfono	3118959252
Dirección Fiscal	VDA EL PAJARITO FCA EL REGALO, TAUSA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	consorcio ryp .
NIT	901963394-7
Obligación	NO APLICA
Email	andenespaipa2025@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CL 57 9 43
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	SERVICIO DE TRNASPORTE DE COGUA A PAIPA	14.0	cada	$1,715,000.00		$24,010,000.00	$24,010,000.00

1

Subtotal	$24,010,000.00
Total a Pagar	$24,010,000.00

776

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 65e437536d41663101640625a14c940584d7a5d525dd73c30599a0059bebd3e8fd08b8adbd9e9c45b6f4780d0cbf4f6a

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190512165

(415)7707212489984(8020) 000014119051216 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 4 1 9 5 5	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 5 4 1 9 5 5	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PINZON	PINZON	MELQUESIDEC	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tausa 7 9 3

41. Dirección principal: VDA EL PAJARITO FCA EL REGALO

42. Correo electrónico: toletesytransportesmelco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 9 5 9 2 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 3	2 0 0 5 1 1 2 1	0 5 1 0	2 0 1 3 0 3 1 1		2 3 9 2	4 6 6 1

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	6	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON PINZON MELQUESIDEC

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190512165

(415)7707212489984(8020) **000014119051216 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 4 1 9 5 5	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 2 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 8 1 7 1 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Sábado, 7 de junio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MELQUESIDEC PINZON PINZON** identificado(a) con CC. **80541955** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	339-322552-33	2007/03/26	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de Crédito

Tunja, 30 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 056- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 5

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se anexan facturas o cuentas de cobro con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas y cuentas de cobro.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIROANTICIPO No 4

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 24 de septiembre de 2025, 4:16 p.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 24 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 055- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 4

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se anexan facturas o cuentas de cobro con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas y cuentas de cobro.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

2 archivos adjuntos

MANEJO DEL ANTICIPO .xlsx
19K

ORDEN DE PAGO 4 SOPORTES.rar
3172K

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIROANTICIPO No 5

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 30 de septiembre de 2025, 8:22 a.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 30 de septiembre de 2025

CTO 2070- CONS- RYP – 056- 2025

LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL LAFER
INTERVENTORÍA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: REMISIÓN DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN GIRO ANTICIPO No 5

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.

Se anexan facturas o cuentas de cobro con sus RUT y certificación bancaria, formato de giros en Excel en el cual se realizan los trámites por la fiducia, Excel con resumen de facturas y cuentas de cobro.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

3 archivos adjuntos

MANEJO DEL ANTICIPO .xlsx
21K

56. CTO 2070-CONS-RYP–056- 2025.pdf
683K

ORDEN DE PAGO 5 SOPORTES.rar
5601K

ANEXO NO.08
INFORME SST, AMBIENTAL Y SOCIAL

UNION TEMPORAL
LAFER

ANEXO N°8 – INFORME N°3
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 2103 DE 2025

AMBIENTAL – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SOCIAL

INFORME DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

UNION TEMPORAL
LAFER

CORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL LAFER
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2025

INFORME DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Gobernación de Boyacá

UNION TEMPORAL LAFER

CORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTADO POR:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL LAFER
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2025

LISTA DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	04 de octubre de 2025	Generación del documento



UNIÓN TEMPORAL

LAFER

CONTENIDO

1. *LOCALIZACIÓN* 7
2. *RESUMEN GENERAL CONTRATOS* 8
3. *INTRODUCCIÓN* 10
4. *COMPONENTE AMBIENTAL* 11
5. *COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO* 28
6. *COMPONENTE SOCIAL* 37
7. *INFORME ACTIVIDADES INTERVENTORÍA* 43
8. *ANEXOS* 47

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación Proyecto 7

Ilustración 2. Registro de cumplimiento de capacitaciones ambientales 17

Ilustración 3. Soporte de manejo de material 18

Ilustración 4. Soporte de señalización en frentes de obra 19

Ilustración 5. Soporte punto ecológico 21

Ilustración 6. Soporte de baños para el proyecto 22

Ilustración 7. Soporte elementos de atención de emergencias 23

Ilustración 8. Manejo maquinaria / equipos 24

Ilustración 9. Soporte entrega de EPP'S 31

Ilustración 10. Soporte de señalización y demarcación 32

Ilustración 11. Soporte jornadas de aseo 33

Ilustración 12. Soporte capacitaciones SST 34

Ilustración 13. Soporte cumplimiento PMT 35

Ilustración 14. Contratación de personal 38

Ilustración 15. Soporte de buzón de PQRS 39

Ilustración 16. Soporte valla del proyecto 40

Ilustración 17. Punto ecológico interventoría 44

Ilustración 18. Punto disposición RAEE interventoría 45

Ilustración 19. Capacitación por interventoría 46

UNION TEMPORAL LAFER

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Resumen de contratos 8

Tabla 2. Programas y fichas ambientales propuestos por el consorcio 11

Tabla 3. Capacitaciones ambientales del contratista 17

Tabla 4. Profesionales ofertados por el contratista 28

Tabla 5. Personal operativo en obra. 29

Tabla 6. Personal subcontratado 30

Tabla 7. Relación de planillas del contratista 30

Tabla 8. Capacitaciones de SST por el contratista 34

Tabla 9. Profesional de interventoría 43

Tabla 10. Capacitaciones interventoría 45

UNION TEMPORAL
LAFER

1. LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


El proyecto está ubicado en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, específicamente sobre la calle 25. Esta ciudad se sitúa en el valle de Sogamoso, uno de los valles interiores más relevantes de la región andina, al noreste del departamento y en el centro-oriente del país, a una altitud de 2.525 metros sobre el nivel del mar. Paipa se encuentra a aproximadamente 184 kilómetros de Bogotá y a 40 kilómetros de Tunja.

La calle 25 presenta un uso predominante comercial y de servicios turísticos, lo cual es compatible con zonas residenciales tanto unifamiliares como multifamiliares. Esta vía actúa como el principal corredor de acceso al Lago Sochagota, extendiéndose hasta los límites con las veredas La Esperanza y Romita, y atravesando los barrios Villa Panorama y Villa Jardín.

El tramo del proyecto a intervenir se ubica entre el río Chicamocha y el borde del área urbana del municipio, marcando un límite natural con el canal de desagüe del Lago Sochagota, en la vereda La Esperanza.

La intervención propuesta consiste en el mejoramiento del espacio público mediante la construcción de andenes y ciclorrutas a lo largo de la calle 25, desde el puente sobre el río Chicamocha hasta el puente de Marquetalia, dentro del municipio de Paipa, Boyacá. Debido a su función como eje comercial, turístico y de acceso residencial, esta calle es clave para la conexión hacia el Lago Sochagota.

Ilustración 1. Ubicación Proyecto

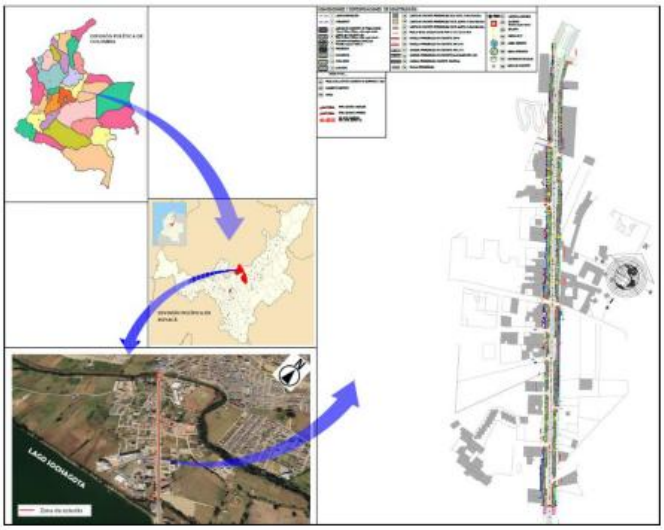

Fuente: Secretaría de infraestructura departamental

2. RESUMEN GENERAL CONTRATOS

Tabla 1: Resumen de contratos

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NUMERO DE CONTRATO:	2103 DE 202
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT: 891.800.498-1
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LAFER R/L LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ NIT: 901.941.593-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($530.566.747,90)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	8 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DE CONTRATO:	2070-2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
	NIT: 891.800.498-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
	LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
	NIT: 901.963.394-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR INICIAL	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($7.166.268.115,93),

PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fuente: El proyecto

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

3. INTRODUCCIÓN

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría realizó actividades de verificación, control y acompañamiento técnico sobre la gestión social del contratista, orientadas a fortalecer la participación ciudadana, fomentar la vinculación de mano de obra local, atender oportunamente a la comunidad del área de influencia y consolidar relaciones basadas en la confianza y la transparencia.

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectuó el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión en SST, mediante visitas técnicas, revisión documental y evaluación de los protocolos de prevención, mitigación y control de riesgos laborales, con el fin de proteger la integridad física y mental de los trabajadores y garantizar condiciones laborales seguras.

Por su parte, el componente ambiental fue objeto de supervisión conforme a lo dispuesto en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y la normativa vigente, verificando la implementación de programas y fichas ambientales relacionados con el manejo de residuos, uso de maquinaria, señalización, control de impactos y cumplimiento de obligaciones legales. La interventoría validó la documentación presentada, realizó observaciones pertinentes y formuló recomendaciones encaminadas a fortalecer la gestión ambiental del contrato.

De esta manera, la interventoría garantiza el cumplimiento de los aspectos técnicos, normativos y sociales del proyecto, promoviendo una ejecución responsable, participativa y sostenible.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

4. COMPONENTE AMBIENTAL

En el marco de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al contrato de obra cuyo objeto es el mejoramiento de espacio público mediante la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas de la vía calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia en el municipio de Paipa, Boyacá, durante el mes de septiembre de 2025 se realizó el seguimiento correspondiente al componente ambiental, con base en la revisión de actividades ejecutadas, documentación aportada por el contratista y visitas de campo desarrolladas por el equipo interventor.

La supervisión ambiental se centró en verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), el cual se compone de 6 programas y 15 fichas ambientales, y los lineamientos establecidos por la normativa ambiental vigente. Dentro de las actividades reportadas se incluyeron capacitaciones ambientales, manejo integral de residuos, señalización, uso de maquinaria, control de descapote, funcionamiento del campamento, atención a aspectos legales, y la gestión documental relacionada con la infraestructura de predios y servicios públicos. Así mismo, se revisó el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos asociados a los recursos suelo, agua y vegetación, así como los mecanismos de control establecidos para el manejo adecuado de materiales y residuos.

La interventoría validó la información técnica y documental entregada por el contratista, realizó observaciones cuando fue pertinente y mediante el presente, se emiten recomendaciones encaminadas a fortalecer el cumplimiento ambiental del contrato, dentro de una gestión responsable, preventiva y conforme a la legislación aplicable.

Tabla 2. Programas y fichas ambientales propuestos por el consorcio

PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO	**FICHA N°1.** CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.	Elaborar el PAGA y el Sistema de Gestión Ambiental según los requisitos legales y contractuales. Gestionar los permisos ambientales necesarios antes de iniciar el proyecto. Cumplir los programas de manejo ambiental definidos en el PAGA. Responder a requerimientos de autoridades ambientales.
	FICHA N°2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL EN OBRA.	Realizar inducciones y capacitaciones para sensibilizar al personal frente al impacto ambiental. Elaborar y entregar un cronograma de capacitaciones como parte inicial del PAGA.
	FICHA N°3.	Verificar el cumplimiento legal ambiental antes del inicio de obra.

	REQUERIMIENTOS LEGALES.	Gestionar permisos, licencias, concesiones o autorizaciones requeridas. Contar con título minero y licencia ambiental para extracción de materiales. Obtener autorización para sitios de disposición de sobrantes.
PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	**FICHA N°4.** MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Almacenar materiales pétreos en zonas confinadas y cubiertas, lejos de cuerpos de agua. Mezclar concreto sobre superficies protegidas, no directamente en el suelo. Prohibir el lavado de mezcladoras en frentes de obra o zonas hídricas. Proteger prefabricados, cemento y hierro contra humedad y pérdida. Disponer correctamente los residuos según el plan PAC-2-4-07(ficha n°6).
	FICHA N°5. SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	Incluir la señalización dentro de las capacitaciones ambientales. Implementar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para mitigar impactos en vías públicas y garantizar seguridad a todos los actores viales y del proyecto. Disponer materiales dentro de áreas acordonadas sin obstruir el tránsito; utilizar cinta de demarcación sobre parales en todo el frente de obra. Instalar avisos preventivos en excavaciones mayores a 50 cm. Cumplir con la normativa vigente para diseño y ubicación de señalización. Realizar mantenimiento permanente de los elementos de señalización. Definir y señalizar las siguientes zonas: • Zona de prevención • Zona de transición • Área de seguridad • Área de obras • Fin de zona de obras
	FICHA N°6. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS.	<u>Recolección y transporte:</u> Cumplir normativas de tránsito, transporte y emisiones. Transportar materiales en vehículos cerrados, con carga asegurada y sin derrames. <u>Acopio temporal:</u> Almacenar en zonas alejadas de cuerpos de agua, áreas protegidas e inestables. Acordonar y cubrir los residuos para evitar escorrentías y dispersión.

UNIÓN TEMPORAL LAFER

		Seleccionar sitios de acopio aprobados, sin interferir con tránsito vehicular o peatonal. Reutilizar RCD en el proyecto si es posible; de lo contrario, disponer en sitio autorizado. <u>Disposición final:</u> Reutilizar el material de excavación en obra, dado que no hay escombrera municipal disponible.
	FICHA N°7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	Clasificar los residuos en el lugar de generación, diferenciando entre aprovechables y no aprovechables. Utilizar recipientes resistentes, rotulados y ubicados en lugares visibles, conforme a la Resolución 2184 de 2019. Recolectar diariamente los residuos en frentes de obra y trasladarlos al sitio designado. Aprovechar residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, madera, latas) mediante entrega a recicladores. Almacenar residuos no aprovechables y orgánicos hasta su recolección por el operador autorizado del municipio, conforme al PGIRS. Almacenar residuos peligrosos por tiempo limitado y entregarlos a gestores autorizados con licencia ambiental. Obtener certificados de entrega, tratamiento y disposición final de todos los residuos. Verificar y mantener actualizados los permisos y licencias de los gestores de residuos peligrosos.
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	**FICHA N°8.** MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.	Adquirir el recurso hídrico mediante contrato con el acueducto municipal, con previa aprobación. Presentar copia del contrato, facturas, volúmenes adquiridos y fechas, para control del consumo. Manejar excavaciones y residuos sólidos y líquidos según los subprogramas ambientales y los que apliquen. Prohibir la disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua. No lavar maquinaria ni equipos en cursos de agua para evitar contaminación con hidrocarburos. Evitar verter residuos industriales (solventes, aceites, pinturas, etc.) en fuentes hídricas, nacimientos o zonas de protección.
	FICHA N°9. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	Realizar mantenimiento de maquinaria en zonas autorizadas, evitando el lavado y reparación en la obra. Utilizar aserrín como absorbente en áreas de mantenimiento. Atender derrames accidentales con kit de manejo de derrames y registrar cada evento con fecha, lugar y medida correctiva.

UNIÓN TEMPORAL LAER

		Prohibir vertimientos de aceites u otros líquidos contaminantes al suelo o cuerpos de agua. Entregar los residuos líquidos a entidades autorizadas. Garantizar que el servicio de baño para trabajadores sea mediante arrendamiento de vivienda cercana, evitando generación de aguas residuales.
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	**FICHA N°10.** MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL.	Limitar el descapote y desmonte únicamente a las zonas necesarias y previamente aprobadas. Incluir en capacitaciones temas de flora, fauna y manejo de residuos vegetales. Transportar el material en volquetas con lona impermeable hasta el sitio autorizado de disposición final.
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	**FICHA N°11.** INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.	Instalación: Habilitar el campamento mediante arrendamiento de una vivienda cercana para almacenamiento de herramientas, equipos y elementos personales. Funcionamiento: Manejar residuos generados según el plan PAC-2.2-08. Señalizar adecuadamente (extintores, salidas, EPP, etc.) y contar con elementos de emergencia (botiquín, camilla, extintores). Garantizar el servicio de baño mediante arrendamiento. Cumplir con el plan PAC-2.1-04 para sitios de acopio de materiales. Desmantelamiento: Cumplir con el proyecto PMIT-5.3-17 para almacenamiento y cierre de zonas con combustibles. Entregar paz y salvo de satisfacción del propietario del predio utilizado.
	FICHA N°12. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.	Entregar documentación de maquinaria, equipos y vehículos antes del inicio de actividades. Garantizar que todos los equipos cuenten con extintor visible y vigente, pito y luces de reversa. Asegurar que los operadores conozcan el área y actividades antes de iniciar labores. Prohibir el acercamiento de trabajadores a zonas de riesgo durante operación de maquinaria. Utilizar los equipos solo para el fin destinado, evitando el transporte de personal o elevación de cargas. Verificar previamente que la zona esté libre de personas. Mantener vigentes certificados de emisiones, SOAT y asegurar el buen estado mecánico de los vehículos. Equipar cada vehículo con los elementos de seguridad reglamentarios.

UNIÓN TEMPORAL LAFER

		Cubrir completamente las volquetas, asegurando la carpa al menos 30 cm por debajo del borde del volco.
PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL	**FICHA N°13.** INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Levantar actas de vecindad al inicio, durante y al finalizar las obras, registrando el estado físico, estructural y arquitectónico de las construcciones e infraestructuras cercanas a las zonas de intervención. Conformar un equipo interdisciplinario para la elaboración de las actas, encabezado por el Ingeniero Residente y con acompañamiento del profesional social e interventoría. Realizar visitas informadas a los propietarios, con registro fotográfico de afectaciones (si las hay). En caso de ausencia o negativa del propietario, dejar constancia escrita e intentar una segunda visita; si no es posible el ingreso, levantar acta de fachada con acompañamiento de autoridad local (por ejemplo, presidente de JAC). Registrar actas de seguimiento ante reclamaciones por presuntos daños durante la obra. Levantar acta de cierre al final del proyecto, registrando el estado final de los predios e infraestructuras y dejando constancia de la ausencia de daños.
	FICHA N°14. A TENCIÓN A LA COMUNIDAD.	Instalar un sistema de atención al usuario mediante buzón de PQRS para recibir, gestionar y dar respuesta a las inquietudes comunitarias. Instalar una valla informativa del proyecto en lugar visible, con los datos del contrato, responsables y canales de atención.
	FICHA N°15. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	Realizar reunión informativa de inicio antes del inicio de actividades constructivas, convocando autoridades locales, JAC, entidades públicas o privadas, propietarios y residentes. Presentar al inicio los detalles del contrato, roles del equipo, sistema de atención al usuario y otros aspectos relevantes. Levantar acta de cada reunión con registro fotográfico, lista de asistencia, temáticas tratadas, respuestas entregadas y compromisos adquiridos.

Fuente: El proyecto

UNIÓN TEMPORAL LAER

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y FICHAS

PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO

1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento correspondiente a las actividades relacionadas con la gestión ambiental del proyecto, dentro de las cuales se destaca la realización de la segunda reunión formal del Grupo de Gestión Ambiental y Social, conformado por el profesional ambiental del contratista, el representante legal, el residente de obra y el director de obra. Esta reunión tuvo como propósito hacer seguimiento a los compromisos establecidos en materia ambiental y social, así como verificar el cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.

En el marco de la verificación realizada por la interventoría, se revisaron los temas tratados en dicha reunión y se constató que estos se centraron en los avances del componente ambiental del proyecto, particularmente en lo relacionado con la gestión de permisos ante la autoridad ambiental competente. Se verificó que, si bien el contratista inició trámites ante CORPOBOYACÁ para la gestión de autorizaciones relacionadas con tala de árboles previamente identificados, dicha Corporación ambiental indicó que el trámite debía ser asumido directamente por la Alcaldía Municipal de Paipa, a través de su Secretaría de Planeación. En ese sentido, la interventoría constató que el contratista permanece a la espera de que la entidad territorial adelante el trámite respectivo ante la autoridad ambiental. Además, para el presente periodo, se revisó el segundo informe de cumplimiento ambiental, donde se evidencia un avance en la gestión ambiental por parte del contratista. El soporte de esta actividad se adjunta bajo los soportes del componente ambiental.

UNIÓN TEMPORAL LAFER

2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL EN OBRA

En cumplimiento de la presente ficha, la interventoría realizó seguimiento a la ejecución del cronograma de capacitaciones ambientales establecido por el contratista en el Informe 0. En este sentido, se verificó la realización de dos sesiones de capacitación ambiental dirigidas al personal operativo y técnico de la obra, las cuales fueron lideradas por el profesional ambiental del proyecto.

La interventoría revisó los contenidos impartidos en dichas sesiones, los cuales estuvieron enfocados en la aplicación de las medidas de manejo ambiental contempladas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), especialmente aquellas relacionadas con la prevención, mitigación y control de impactos ambientales generados durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Se constató además la participación activa del personal de obra, lo cual favorece la apropiación de buenas prácticas ambientales en el frente de trabajo. Estas jornadas se desarrollaron de acuerdo con la programación aprobada previamente por la interventoría, cumpliendo así con los compromisos establecidos para el fortalecimiento de la gestión ambiental del proyecto. El soporte de esta actividad se adjunta bajo los soportes del componente ambiental.

Ilustración 2. Registro de cumplimiento de capacitaciones ambientales



Fuente: El proyecto

Tabla 3. Capacitaciones ambientales del contratista

FECHA	TEMA	PROFESIONAL
02/09/25	Efecto invernadero	Ambiental- Rodrigo Mendivelso
24/09/25	Buenas prácticas ambientales	Ambiental- Rodrigo Mendivelso

Fuente: El proyecto

3. REQUERIMIENTOS LEGALES

Para el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento a la modificación relacionada con la fuente de suministro de material para el proyecto, verificada y formalizada con la designación de la cantera El Tunal como nueva fuente oficial. Esta decisión fue resultado de los ensayos técnicos practicados al material proveniente de la cantera inicialmente prevista, los cuales arrojaron que dicho material no cumplía con los requisitos técnicos establecidos para las obras de mejoramiento.

En cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PAGA), la interventoría llevó a cabo la verificación documental y técnica de la nueva fuente, constatando que la cantera El Tunal cuenta con título minero, licencia ambiental vigente, así como con los permisos, licencias y concesiones exigidos por la normatividad ambiental aplicable. Así mismo, se verificó la existencia de la autorización correspondiente para los sitios de disposición de sobrantes, lo que asegura la gestión integral de los aspectos legales y ambientales relacionados con la extracción y el uso de materiales.

Toda la documentación técnica y ambiental correspondiente a esta fuente fue entregada previamente por el contratista como parte del Informe 0, lo que permitió que la interventoría contara con el respaldo documental necesario desde el inicio del proyecto. La modificación fue debidamente comunicada y aprobada por la interventoría, garantizando que el suministro de material se realice conforme a los lineamientos técnicos, contractuales y ambientales vigentes.

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría llevó a cabo la verificación del manejo de materiales de construcción en el campamento de obra, constatando que no se realizaron actividades de lavado de maquinaria ni de equipos al interior del mismo, lo cual es coherente con las buenas prácticas ambientales que buscan evitar la contaminación del recurso suelo y fuentes hídricas.

En cuanto al almacenamiento, la interventoría evidenció que los materiales ingresados fueron dispuestos en condiciones adecuadas de orden y limpieza, dentro del área de bodega, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normativa ambiental aplicable y las medidas previstas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

Durante las visitas técnicas efectuadas por el equipo de interventoría, se observó un manejo responsable en la disposición temporal de los materiales, lo cual ha permitido minimizar los riesgos de afectación al entorno natural. Se reitera la importancia de mantener estos estándares durante toda la ejecución del proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales contractuales.

Ilustración 3. Soporte de manejo de material



Fuente: El proyecto

5. SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

Durante el seguimiento correspondiente al mes de septiembre de 2025, la interventoría verificó la presencia y mantenimiento de la señalización general de obra en los distintos frentes de intervención. Esta señalización comprende elementos preventivos, informativos y de seguridad, los cuales han sido ubicados estratégicamente en las zonas administrativas, operativas y de intervención vial, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad industrial y ambiental.

La interventoría constató que esta señalización ha sido instalada con el objetivo de orientar adecuadamente al personal, reducir riesgos en las zonas de trabajo, y garantizar condiciones seguras de movilidad y permanencia tanto para los trabajadores como para la comunidad que transita por el área de influencia del proyecto.

En lo referente al Plan de Manejo de Tráfico (PMT), se verificó la implementación progresiva de las medidas establecidas en el documento aprobado. La interventoría continuará realizando el respectivo monitoreo y verificación mensual del cumplimiento del PMT, a través de los informes técnicos y visitas de campo, con el fin de garantizar que las condiciones de tránsito y seguridad vial se mantengan bajo los estándares requeridos por el proyecto.

Ilustración 4. Soporte de señalización en frentes de obra



Fuente: El proyecto

6. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó seguimiento a la gestión de los residuos generados por actividades de excavación, tanto manual como mecánica, en el marco del desarrollo del proyecto. Se verificó que estos materiales fueron gestionados conforme a los lineamientos establecidos para el manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD), cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Los residuos excavados fueron almacenados temporalmente en zonas previamente establecidas dentro del área delimitada para la ejecución del proyecto. Dichas zonas se encuentran alejadas de cuerpos de agua y áreas ambientalmente sensibles, garantizando así una disposición segura y controlada. La interventoría constató que estos acopios no generaron interferencias con el tránsito peatonal ni vehicular, lo cual fue posible gracias a la planificación anticipada del espacio y al bajo volumen de generación de residuos reportado durante el periodo evaluado.

Posteriormente, los materiales acopiados fueron trasladados a la escombrera autorizada para el proyecto, en cumplimiento con lo estipulado en la reglamentación ambiental aplicable. La interventoría recuerda que el certificado de disposición final correspondiente a dicha escombrera, expedido por la Alcaldía Municipal de Paipa, fue entregado por el contratista como parte de los informes 0 y 1, lo cual demuestra el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el marco contractual.

7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

La presente interventoría, durante el mes de septiembre del 2025 realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de residuos sólidos convencionales y especiales, verificando la continuidad en la implementación de puntos ecológicos en las distintas áreas de trabajo del proyecto. Estos puntos están compuestos por tres canecas diferenciadas por color (blanco, negro y verde), las cuales se encuentran debidamente señalizadas y etiquetadas, lo que ha permitido mantener un adecuado proceso de segregación en la fuente, conforme a los lineamientos establecidos para el manejo integral de residuos sólidos.

En lo correspondiente a la disposición de residuos ordinarios, se constató que los residuos sanitarios fueron retirados regularmente los días lunes, mientras que los residuos no aprovechables fueron entregados al servicio de aseo municipal los días miércoles, de acuerdo con las rutas y horarios establecidos para el sector. De igual forma, se verificó que en el frente de obra se están acopiando materiales reciclables tales como cartón, tubos de PVC y plástico. Según información suministrada por el contratista, estos residuos se están almacenando con el objetivo de entregarlos posteriormente a una asociación del sector que se encarga de su aprovechamiento. Se hará seguimiento a la entrega efectiva de estos materiales en los próximos periodos.

Adicionalmente, la interventoría confirmó que durante el periodo evaluado no se generaron residuos de vidrio ni residuos peligrosos, lo cual se encuentra en concordancia con el tipo de actividades desarrolladas en el frente de obra durante el mes. El contratista ha mantenido una gestión adecuada de los residuos, y se continuará realizando el respectivo seguimiento para asegurar que dicha práctica se sostenga en el tiempo.

Ilustración 5. Soporte punto ecológico



Fuente: El proyecto

PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

8. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Para el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó seguimiento a las prácticas adoptadas por el contratista en relación con el manejo de aguas superficiales, verificando que el abastecimiento de agua para actividades del proyecto continuó realizándose desde la vivienda alquilada que actualmente funciona como oficina y bodega. Este suministro cuenta con la autorización previa de la propietaria del inmueble, de la empresa prestadora del servicio (Red Vital), así como de esta interventoría, lo cual garantiza el uso legal y controlado del recurso hídrico.

El consumo del recurso se mantuvo dentro de parámetros racionales y acordes con las buenas prácticas ambientales establecidas, promoviendo un uso eficiente del agua y reduciendo riesgos de afectación a cuerpos hídricos cercanos. La interventoría también verificó que se mantuvieron las medidas de protección en torno a las fuentes hídricas presentes en el área de influencia, entre las cuales se destaca la prohibición del lavado de maquinaria y equipos en las proximidades de zonas de protección hídrica, con el fin de evitar vertimientos de sustancias contaminantes como aceites o combustibles.

Durante el periodo evaluado, no se reportaron vertimientos de residuos industriales ni afectaciones a cuerpos de agua o zonas con valor ambiental. La interventoría continuará realizando control y seguimiento permanente a estas prácticas, con el fin de garantizar la conservación de los recursos naturales presentes en el entorno del proyecto.

9. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES

En cumplimiento de la presente ficha, la UT LAFER realizó seguimiento al manejo de residuos líquidos generados en el marco del proyecto, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). En este periodo, si bien se utilizaron equipos y maquinaria para el desarrollo de las

actividades constructivas, se confirmó que no se generaron residuos líquidos industriales ni se presentaron derrames de sustancias contaminantes derivados de su operación.

En cuanto al manejo de aguas residuales domésticas, la interventoría constató que los trabajadores continuaron haciendo uso del baño ubicado en la vivienda arrendada que funciona como oficina y bodega del proyecto, así como de dos baños adicionales alquilados en locales comerciales cercanos, contratados específicamente para atender las necesidades sanitarias del personal. Los acuerdos de uso estipularon que el personal debía mantener estos espacios en condiciones adecuadas de orden y limpieza, mientras que los responsables del servicio se encargaron de garantizar el suministro de elementos de aseo necesarios para su funcionamiento.

Estas medidas permitieron un manejo adecuado de las aguas residuales domésticas sin requerir la implementación de sistemas de tratamiento especial, y sin que se generaran impactos negativos sobre el entorno. La interventoría continuará verificando que este manejo se mantenga durante las siguientes etapas del proyecto, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las prácticas implementadas.

Ilustración 6. Soporte de baños para el proyecto



Fuente: El proyecto

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

10. MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento a las actividades de descapote ejecutadas por el contratista, verificando que estas se llevaron a cabo únicamente dentro del área del proyecto previamente definida y autorizada para la intervención, en cumplimiento de lo establecido en la ficha técnica ambiental y en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). La actividad se realizó de forma controlada, restringiendo el retiro de cobertura vegetal exclusivamente a las zonas necesarias para el desarrollo de las labores constructivas, evitando intervenciones innecesarias que pudieran afectar el entorno natural.

Como parte de las medidas ambientales implementadas, se confirmó que el material vegetal generado fue recolectado de manera oportuna y transportado en volquetas cubiertas hacia el sitio autorizado para su disposición final, garantizando que no se produjeran residuos dispersos ni afectaciones en el trayecto. Estas acciones permitieron cumplir con los compromisos establecidos en materia de protección ambiental y evidencian una adecuada gestión de la cobertura vegetal removida durante esta fase del proyecto.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

11. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó seguimiento a las condiciones del campamento base utilizado para el desarrollo del proyecto, el cual corresponde a una vivienda arrendada ubicada dentro del área de intervención. Este espacio fue acondicionado por el contratista para funcionar como oficina técnica, bodega de almacenamiento y zona de resguardo para el personal, cumpliendo con su función de apoyo operativo a las actividades de obra.

La interventoría verificó que en este espacio se realizó el almacenamiento organizado de herramientas y equipos, y que se mantuvo habilitada una zona exclusiva para el resguardo de pertenencias del equipo de trabajo, así como el acceso a servicios sanitarios. Asimismo, se constató que la infraestructura permaneció señalizada correctamente y equipada con los elementos básicos de respuesta ante emergencias, incluyendo extintor, camilla y botiquín de primeros auxilios, lo cual se encuentra en concordancia con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

Ilustración 7. Soporte elementos de atención de emergencias



Fuente: El proyecto

Durante las visitas de seguimiento, también se realizó verificación del estado general del campamento, encontrándose que las condiciones de orden, limpieza y salubridad se

mantuvieron dentro de los estándares requeridos, garantizando un entorno seguro para el desarrollo de las labores asociadas al proyecto.

12. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

La UT LAFER durante este periodo realizó seguimiento al uso de la maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proyecto, verificando que estos correspondieran a los recursos ofertados en la propuesta técnica del contratista, en cumplimiento de las exigencias contractuales y las especificaciones señaladas en el anexo técnico. La maquinaria fue empleada para el desarrollo de las actividades constructivas en los frentes activos de intervención, de acuerdo con la programación operativa del periodo evaluado. Es importante recordar que, mediante el informe 0, el contratista había reportado y entregado oportunamente la documentación de la maquinaria mínima requerida para la ejecución del contrato, la cual fue revisada y aprobada por esta interventoría.

Ilustración 8. Manejo maquinaria / equipos



Fuente: El proyecto

Como parte de las medidas de prevención ambiental, se constató que se mantuvo instalado en el área de obra el kit de contención de derrames, elemento fundamental para la atención inmediata de posibles emergencias ocasionadas por fugas o vertimientos de sustancias derivadas del uso de maquinaria, equipos o vehículos. Esta medida hace parte del conjunto de acciones preventivas implementadas para reducir el riesgo de impactos ambientales negativos durante la ejecución del proyecto y fue verificada positivamente en las visitas técnicas realizadas durante el periodo en mención.

PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL

13. INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Para el mes correspondiente al presente informe, la interventoría hizo seguimiento al proceso de obtención de las actas de intervención sobre predios con presencia de infraestructura y redes de servicios públicos. Se verificó que, pese a los esfuerzos adelantados por el contratista durante el periodo, no se logró avanzar en la obtención de nuevas firmas por parte de propietarios previamente identificados como renuentes o con

información de contacto no disponible. Esta situación ya había sido advertida en informes anteriores, y responde a factores ajenos a la gestión operativa del proyecto, asociados principalmente a la falta de localización o negativa expresa de algunos titulares prediales.

Se deja constancia de que las actas firmadas previamente fueron radicadas formalmente en el Informe N°2, correspondiente al mes de agosto. No obstante, para efectos de trazabilidad, respaldo técnico y continuidad documental, en el presente informe (Informe N°3) se anexan las actas correspondientes que, si bien no cuentan con la firma de los propietarios, sí fueron debidamente diligenciadas y registradas en campo, cumpliendo con la actividad técnica de caracterización y socialización en sitio, según lo establecido en el procedimiento.

Estas situaciones continúan siendo presentadas con el fin de recibir acompañamiento institucional de la Personería Municipal, las veedurías ciudadanas, la Junta de Acción Comunal del sector y la supervisión del contrato, garantizando un proceso transparente, participativo y encaminado al cierre responsable de este requerimiento, en el marco de las competencias del contratista y bajo la verificación permanente de esta interventoría.

14. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Para el mes de septiembre de 2025, la interventoría realizó seguimiento al canal de atención dispuesto por el contratista para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), confirmando que el medio digital habilitado (el correo electrónico oficial del consorcio), se mantuvo operativo y en funcionamiento continuo. Este canal fue informado a la comunidad a través de un aviso visible instalado en la entrada principal del área de obra, lo cual garantiza condiciones de accesibilidad, visibilidad y permanencia, conforme a lo establecido en los lineamientos sociales del proyecto.

Durante el periodo evaluado, no se recibieron PQRS por parte de la ciudadanía ni se reportaron novedades asociadas a inconformidades o requerimientos comunitarios, por lo que la interventoría verificó que la bitácora correspondiente al mes de septiembre se encuentra cerrada sin novedades. A pesar de la ausencia de requerimientos formales, se resalta que el canal permaneció habilitado como medida preventiva y como parte de los mecanismos de participación ciudadana y transparencia exigidos contractualmente. La interventoría continuará verificando el funcionamiento efectivo de este canal en los meses siguientes, promoviendo un diálogo abierto con la comunidad y garantizando condiciones adecuadas de interlocución con los actores del entorno.

15. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Durante el mes de septiembre, y en atención a nuevas dudas manifestadas por miembros de la comunidad, se llevaron a cabo reuniones complementarias en coordinación con las veedurías ciudadanas, la interventoría y otros entes de control. Estos espacios tuvieron

como finalidad brindar información clara y oportuna sobre el avance de las obras y mantener activos los canales de comunicación con los actores territoriales. La interventoría acompañó estas jornadas, constatando que se atendieron las inquietudes expresadas y se promovió una relación participativa entre las partes involucradas.

Los registros de asistencia y el material fotográfico correspondiente a la socialización inicial fueron incluidos en el Informe N.º 1. Por su parte, las nuevas intervenciones realizadas en el mes evaluado han sido documentadas en la bitácora y comités del proyecto, soporte que se adjunta bajo los soportes del componente técnico, como parte del proceso de seguimiento continuo que adelanta esta interventoría en materia de gestión social.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONCLUSIONES

- El contratista mantuvo operativas las medidas de manejo ambiental requeridas por el contrato, conforme al PAGA y a la normativa vigente.

- Se verificó el cumplimiento de los protocolos de uso racional del agua, disposición adecuada de residuos, señalización ambiental y operación segura del campamento.

- Las capacitaciones dirigidas al personal de obra se llevaron a cabo según cronograma, fortaleciendo la cultura ambiental en el frente de trabajo.

- Se constató la existencia de medidas de contingencia y prevención, como el kit de contención de derrames, y el correcto uso de maquinaria con soporte técnico aprobado desde el inicio del contrato.

- El cambio de fuente de suministro de material fue validado por la interventoría, con soporte ambiental y legal adecuado.

- Se mantiene pendiente la gestión de autorización para la tala de árboles, trámite que corresponde a la entidad contratante ante la autoridad ambiental.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación de acciones preventivas en las zonas de intervención, especialmente aquellas que involucran retiro de cobertura vegetal y movimientos de tierra, reforzando los controles establecidos para mitigar impactos sobre el recurso suelo.

- Seguir garantizando que los materiales y residuos sean almacenados temporalmente en zonas previamente definidas y ambientalmente seguras, evitando afectaciones a cuerpos de agua o zonas sensibles.

- Continuar con la entrega diferenciada de residuos reciclables a asociaciones locales de recicladores, promoviendo el aprovechamiento de materiales y fortaleciendo la estrategia de economía circular implementada por el contratista.

- Solicitar a la entidad contratante que gestione con prioridad la autorización pendiente para el aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental, a fin de no afectar la ejecución de actividades previstas en zonas con vegetación.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

5. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) constituye un eje fundamental dentro del seguimiento integral que realiza la interventoría al contrato de obra para el mejoramiento del espacio público en la calle 25 del municipio de Paipa, Boyacá. Este componente busca garantizar la implementación efectiva de medidas de prevención, mitigación y control de riesgos laborales, así como la protección de la integridad física y mental del personal vinculado al proyecto.

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría ejerció control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de SST, mediante visitas técnicas, revisión documental y validación de los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este seguimiento permitió evaluar la implementación de acciones orientadas a promover entornos laborales seguros y conformes con la normatividad vigente, contribuyendo así al adecuado desarrollo del proyecto.

A continuación, se presenta la relación del personal profesional vinculado por el contratista de obra durante el periodo evaluado. Cada uno de los profesionales cumple funciones específicas en áreas clave del contrato, según lo estipulado en los documentos contractuales del proceso licitatorio:

Tabla 4. Profesionales ofertados por el contratista

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DEDICACIÓN
Luis Alberto Gordillo Valderrama	6.765.918	Director de obra	40%
Edwin Fernando Echeverria Cuervo	1.049.604.684	Residente de obra	100%
Luis Eduardo Sichacá Gámez	1.049.603.584	Gerente de proyectos	100%
Iván Arturo Vargas Cuellar	79.969.466	Arquitecto especialista en urbanismo	30%
Juan Carlos Camacho Camacho	4.179.386	Ingeniero especialista eléctrico	30%
Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely	7.181.346	Profesional ambiental	60%
Maria Fernanda Romero Castillo	1.015.474.192	Profesional SST	100%
Yenny Paola Medina Bernal	33.366.983	Profesional contable	100%
Emilio Bladimir Panqueva	7.318.490	Profesional SST	90%
Iván Darío Sichacá Gámez	1.049.644.688	Auxiliar de ingeniería	100%

Fuente: El proyecto

De igual manera, se hace referencia al personal operativo designado por el contratista de la obra, quien se encarga de llevar a cabo directamente las labores en el terreno. Este grupo está conformado por trabajadores que participan activamente en las tareas constructivas planificadas, siempre bajo la orientación del personal profesional. Su incorporación al proyecto obedece a las necesidades específicas según el progreso físico de la obra y el tipo de actividades programadas durante el periodo evaluado.

Tabla 5. Personal operativo en obra.

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO
Oscar Mauricio Suarez Avella	4.192.543	Maestro	28/07/25	-
Jorge Eliecer Suarez Avella	1.053.610.948	Oficial	28/07/25	-
Luis Alfonso Avella Ochoa	1.007.305.445	Ayudante	28/07/25	-
Domingo Avella Ramos	74.359.038	Ayudante	28/07/25	-
Jhon Guillermo Diaz Saavedra	1.058.274.476	Ayudante	28/07/25	-
Jorge Luis Benavides Guerrero	1.053.608.931	Oficial	28/07/25	28/09/25
Brayan Alexander Guerrero Suarez	1.053.606.607	Controlador Vial	28/07/25	-
Gilbert Javier Benavides Guerrero	1.053.613.359	Oficial	28/07/25	-
Jeysson Martínez Pinzón	1.053.615.447	Ayudante	28/07/25	-
Yerson Javier Martínez Molano	1.054.146.089	Ayudante	28/07/25	-
Claudia Patricia Castiblanco Santos	1.053.616.291	Controlador Vial	04/09/25	-
Ana Iris Rodríguez Ochoa	1.053.607.984	Controlador Vial	24/09/25	-
Yaneth Ruiz Melo	1.053.611.754	Controlador Vial	24/09/25	-
Moisés Camacho Fonseca	74.324.374	Oficial	24/09/25	-
Omar Orlando Escamilla Silva	1.090.483.658	Ayudante	24/09/25	-

Fuente: El proyecto

Durante la observación permanente en campo para el mes de septiembre, la interventoría evidenció la vinculación de personal al proyecto mediante subcontratación, destinado a la ejecución de actividades puntuales como la operación de vehículos de carga pesada, maquinaria y otros equipos especializados.

Aunque este personal no pertenece directamente al consorcio, se pudo verificar que, como parte del proceso de ingreso, se exigió el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La interventoría constató que dichos requisitos fueron solicitados de acuerdo con la normativa vigente y en concordancia con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en el proyecto, entre las cuales destacamos el pago de seguridad social.

Tabla 6. Personal subcontratado

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	PLANILLA	
			PERIODO	NÚMERO
Carlos Sanabria Buitrago	1.053.608.962	Conductor volqueta	Agosto 2025	9490996849
Nelson Camargo Buitrago	74.359.489	Conductor volqueta	Agosto 2025	1112300905
Italo Sanabria Buitrago	1.053.610.043	Operario maquinaria	Agosto 2025	9490866237
Mauricio Benítez	1.057.574.737	Operario maquinaria	Agosto 2025	9491623374
Nelson Guzmán	1.057.593.443	Operario maquinaria	Agosto 2025	9491623374
Hugo Alarcón	46.387.430	Operario maquinaria	Agosto 2025	9491623374

Fuente: El proyecto

Durante el mes de septiembre, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y pago de seguridad social por parte del contratista. Se verificó la presentación oportuna de las planillas correspondientes al personal vinculado al proyecto tanto del personal directo como del subcontratado, las cuales fueron revisadas y se encontraron alineadas con la dedicación reportada por cada trabajador en obra.

Tabla 7. Relación de planillas del contratista

N° PLANILLA	PERIODO
9491842313	Septiembre 2025
9491474569	Septiembre 2025
9493305677	Septiembre 2025
9493305814	Septiembre 2025
79979322	Septiembre 2025
34539928	Septiembre 2025
90223683	Septiembre 2025
9493272399	Septiembre 2025
9493273242	Septiembre 2025

Fuente: El proyecto

En el periodo evaluado, el contratista informó sobre la ejecución de diversas acciones relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales fueron verificadas en campo por la Unión Temporal LAFER y sus

soportes se adjuntan bajo **ANEXO N°8.3-SOPORTES SST.** A continuación, se describen dichas actividades junto con la respectiva verificación realizada por dicha interventoría.

1. EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

La interventoría verificó la realización de los exámenes médico ocupacionales de ingreso para el personal que se vinculó durante el mes de septiembre. El soporte documental respectivo fue entregado por el contratista, el cual fue revisado por el equipo de interventoría sin observaciones.

En cuanto al retiro de un trabajador durante este periodo, se evidenció que el mismo no asistió a su evaluación de egreso. El contratista, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de SST, procedió con la elaboración del acta de exoneración y su debida notificación, documento que también fue aportado y revisado.

2. SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S

La interventoría realizó seguimiento al proceso de entrega y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) durante el mes de septiembre. Se constató que el contratista suministró la dotación completa al personal de nuevo ingreso, así como la reposición correspondiente a trabajadores con EPP's deteriorados o desgastados.

Ilustración 9. Soporte entrega de EPP'S



Fuente: El proyecto

Además, se verificaron los registros de inspección en campo realizados por el personal del área de SST del contratista. Estas inspecciones permitieron hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores. Así mismo, durante las visitas técnicas realizadas por la interventoría, se evidenció el uso apropiado de los elementos por parte del personal, conforme a los riesgos asociados a cada frente de trabajo.

3. INDUCCIONES

La interventoría realizó verificación documental y presencial del proceso de inducción al personal de nuevo ingreso durante el mes de septiembre. Se constató que las sesiones incluyeron los lineamientos generales del proyecto, asignación de funciones, normativas

internas y aspectos fundamentales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En particular, se revisaron los contenidos de las charlas impartidas, donde se abordaron temas como uso adecuado de EPP, identificación de peligros, rutas de evacuación, respuesta a emergencias y buenas prácticas en orden y aseo en los frentes de trabajo. La interventoría revisó los registros de asistencia y los formatos utilizados, concluyendo que el proceso de inducción se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente y de forma pertinente para el tipo de actividades desarrolladas en obra.

4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Durante las visitas de seguimiento realizadas por la interventoría, se constató la correcta instalación y mantenimiento de la señalización y demarcación tanto en el área de obra como en la oficina del proyecto. Las señales ubicadas incluyeron mensajes preventivos, informativos y de prohibición, ajustados al análisis de riesgos por áreas y al Decreto 1072 de 2015.

La interventoría evidenció que las señales fueron ubicadas en puntos estratégicos, facilitando la identificación de peligros y mejorando las condiciones de seguridad para trabajadores, visitantes y transeúntes. Así mismo, se verificó la presencia de barreras físicas, cintas y demás elementos de contención en zonas críticas, como excavaciones, sectores de tránsito peatonal y zonas en intervención. Se reconoce el cumplimiento del contratista en este aspecto, al mantener medidas que previenen incidentes y promueven el orden operacional en obra.

Ilustración 10. Soporte de señalización y demarcación



Fuente: El proyecto

6. INSPECCIÓN A EQUIPOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Durante el mes de septiembre, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las inspecciones preoperacionales ejecutadas por el contratista sobre herramientas manuales, equipos, maquinaria y el vehículo asignado a labores de obra. Estas actividades fueron documentadas adecuadamente en los formatos establecidos, los

cuales fueron revisados y validados por el equipo de interventoría sin observación alguna.

Se constató que dichas inspecciones se enfocaron en identificar posibles condiciones inseguras, las cuales, en los casos detectados, fueron gestionadas mediante acciones correctivas oportunas.

7. ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Durante el mes de septiembre, la interventoría realizó la verificación física de los elementos destinados para la atención de emergencias, constatando su correcta disposición, estado operativo y ubicación estratégica en obra. Se revisaron equipos como camilla, botiquín de primeros auxilios, extintor y el kit para control de derrames, el cual se mantiene disponible ante posibles incidentes con sustancias peligrosas.

Se evidenció que los elementos están claramente señalizados, accesibles y en condiciones óptimas para su uso inmediato. La interventoría resalta la importancia de estas acciones en la gestión preventiva del riesgo y en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventualidades.

8. ORDEN Y ASEO

La interventoría realizó seguimiento a las actividades orientadas al mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza en los frentes de trabajo. Se verificó que se ejecutaron jornadas de aseo general, y que se promueve activamente la cultura de orden desde las fases de inducción.

Durante las visitas en campo se observaron buenas prácticas como la disposición adecuada de residuos, almacenamiento correcto de herramientas y materiales, y limpieza periódica de las zonas intervenidas. El registro de una de estas jornadas se revisó en el anexo N.º 5.10 del contratista y fue validado sin observaciones. Estas acciones contribuyen directamente a minimizar los riesgos operativos y a fomentar entornos de trabajo más seguros y eficientes.

Ilustración 11. Soporte jornadas de aseo



Fuente: El proyecto

9. ACCIDENTES EN OBRA

Durante el mes de septiembre no se reportaron accidentes de trabajo, incidentes ni eventos que activaran los protocolos de emergencia. La interventoría llevó a cabo un monitoreo constante en campo y revisión documental, concluyendo que se mantuvo un entorno controlado en términos de seguridad.

Este resultado es reflejo del seguimiento preventivo por parte del área de SST del contratista, así como del compromiso evidenciado por los trabajadores frente al cumplimiento de las normas de seguridad. No obstante, la interventoría enfatiza la importancia de mantener esta tendencia a través de la implementación continua de buenas prácticas y actividades formativas.

10. CAPACITACIONES DE SEGURIDAD

La interventoría revisó el desarrollo de las capacitaciones en SST realizadas durante el mes, las cuales se ajustaron al cronograma de formación establecido en la planificación inicial del proyecto. Se llevaron a cabo dos jornadas, cada una de 30 minutos, dirigidas al personal activo en obra.

El contenido de las capacitaciones fue pertinente y alineado con los riesgos presentes en los frentes de trabajo. El soporte de asistencia fue entregado y revisado satisfactoriamente. La interventoría destaca la importancia de estas acciones como estrategia de prevención y cultura de autocuidado.

Tabla 8. Capacitaciones de SST por el contratista

FECHA	TEMA	PROFESIONAL
09/09/25	Principios básicos para la seguridad eléctrica	Fernanda Romero
30/09/25	Posturas inadecuadas	

Fuente: El proyecto

Ilustración 12. Soporte capacitaciones SST



Fuente: El proyecto

11. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

La interventoría supervisó la implementación y mantenimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante el mes de septiembre, confirmando que se ejecutó conforme a los lineamientos técnicos establecidos y a la aprobación otorgada por las autoridades competentes.

Se verificó la correcta instalación de señalización provisional y permanente, la disposición de dispositivos de control de tráfico y la delimitación clara de zonas de intervención. Estas acciones permitieron garantizar la movilidad segura de peatones, trabajadores y vehículos en el área de influencia del proyecto. La interventoría no identificó novedades relevantes en la operación del PMT durante este periodo.

Ilustración 13. Soporte cumplimiento PMT



Fuente: El proyecto

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONCLUSIONES

- Durante el mes de septiembre, el contratista evidenció una gestión estable en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando acciones preventivas y de control en campo.

- La interventoría identificó una mejora progresiva en la documentación de los procedimientos y registros exigidos por el SG-SST, lo cual facilita la trazabilidad de las acciones implementadas y la verificación del cumplimiento normativo.

- Se mantuvo un entorno laboral sin eventos que comprometieran la seguridad de los trabajadores, lo que refleja un adecuado control del riesgo en obra.

- La articulación entre los procesos de inducción, suministro de EPP, señalización, inspecciones y formación al personal demuestra un enfoque preventivo consolidado en la gestión del contratista.

RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo la cultura de prevención en todos los niveles del proyecto, con énfasis en la participación activa de los trabajadores y en la mejora continua de los procesos.

- Mantener actualizados y accesibles todos los registros del SG-SST, garantizando su coherencia con las actividades ejecutadas en campo.

- Reforzar el monitoreo a las condiciones de tránsito y movilidad en los frentes de obra, priorizando la seguridad de peatones y trabajadores en zonas de alta circulación.

- Promover espacios periódicos de retroalimentación entre el equipo de SST del contratista y la interventoría, con el fin de alinear criterios técnicos y operativos.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

6. COMPONENTE SOCIAL

En el marco de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es el mejoramiento de espacio público mediante la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas de la vía Calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia en el municipio de Paipa, Boyacá, el componente social representa un eje clave para garantizar la integración del proyecto con la comunidad, el cumplimiento de la normatividad en materia de participación y el desarrollo armónico del entorno social.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría ha realizado seguimiento continuo a la implementación de estrategias orientadas a fortalecer la relación con los actores sociales, la vinculación de mano de obra local, la atención oportuna a la ciudadanía y la transparencia en la ejecución. La gestión social del proyecto se consolida como un instrumento de construcción de confianza y corresponsabilidad con la comunidad del área de influencia.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista:

1. Licencia de construcción
Durante el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2025, la interventoría verificó que, conforme a la certificación expedida por la Alcaldía Municipal de Paipa en el mes de julio, no se requiere licencia de construcción para la ejecución del presente contrato de obra, dado su alcance y características técnicas. Este documento fue revisado por la interventoría y su radicación fue confirmada en informes anteriores del proyecto.

Por tal motivo, no aplica la reiteración del soporte en el presente informe. La interventoría deja constancia de que este requerimiento ha sido debidamente cerrado y no representa un pendiente dentro de los compromisos contractuales ni técnicos del proyecto en curso.

2. Socialización del proyecto
Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría verificó que no se programaron nuevas jornadas de socialización por parte del contratista, situación que responde a que la actividad principal ya se había llevado a cabo el pasado 28 de mayo del presente año. Esta jornada inicial fue ejecutada con la comunidad del municipio de Paipa y contó con la participación de la interventoría, la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Boyacá y diversos actores comunitarios.

En dicho espacio, se presentaron los lineamientos generales del contrato de obra, incluyendo su alcance técnico, cronograma de ejecución, compromisos contractuales y

sociales, así como los canales de atención para la comunidad. Se atendieron las inquietudes manifestadas por los asistentes y se formalizaron compromisos como la priorización de la mano de obra local, la apertura de canales de comunicación directa y la atención a posibles afectaciones surgidas durante la ejecución. La interventoría confirma que los registros de esta jornada fueron reportados en su momento bajo el Informe Técnico N.º 1, como parte del cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), y que no se presentaron requerimientos adicionales en este aspecto durante el mes reportado.

3. Contratación de personal

En el marco del seguimiento a las obligaciones sociales del contrato, la interventoría revisó y validó el reporte del contratista correspondiente a la contratación de personal durante el mes de septiembre de 2025. De acuerdo con lo verificado en campo, se realizaron nuevas vinculaciones, incluyendo la participación de mujeres en distintos frentes de obra, lo cual está en concordancia con los compromisos asumidos para el proyecto y con los principios de inclusión laboral.

El Consorcio RYP ha mantenido una política de contratación progresiva, priorizando la mano de obra no calificada del área de influencia directa del proyecto, mediante un mecanismo abierto de vinculación. Este permite que los interesados se acerquen directamente a las oficinas del proyecto o a través de referencias internas.

Durante el periodo también se reportó la desvinculación de un trabajador, situación frente a la cual se realizaron los trámites correspondientes para la aplicación de los exámenes de egreso y la liquidación de pagos conforme a lo establecido en la normativa laboral vigente. La interventoría acompañó este proceso desde la revisión documental y confirma que se cumplió con las obligaciones contractuales y legales aplicables.

Ilustración 14. Contratación de personal




Fuente: El proyecto

4. Buzón de PQRS

Durante el mes de septiembre de 2025, la interventoría verificó que el canal oficial para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) permaneció activo y disponible para la ciudadanía, a través del correo electrónico institucional del consorcio. Este canal, informado previamente a la comunidad mediante señalización visible en el frente de obra, forma parte del compromiso del proyecto con la participación ciudadana, la transparencia y la atención oportuna de inquietudes o inconformidades.

De acuerdo con lo reportado por el contratista y confirmado por la interventoría, durante este periodo no se recibió ninguna PQRS, por lo cual no se presentaron novedades en la bitácora respectiva. La interventoría destaca que se mantiene un control sistemático sobre este canal, lo que permite su activación inmediata en caso de requerirse atención a situaciones particulares que puedan surgir en el desarrollo del proyecto.

Ilustración 15. Soporte de buzón de PQRS



Fuente: El proyecto

5. Instalación de valla informativa

La interventoría verificó la instalación de la valla informativa del proyecto, constatando que esta cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente, así como con los requerimientos contractuales relacionados con la publicidad del contrato. La estructura fue ubicada en un lugar visible, facilitando el acceso de la comunidad a la información general del proyecto.

El contenido de la valla incluye datos clave como el número del contrato, las entidades participantes, el objeto de la obra y el plazo de ejecución, lo cual garantiza el principio de transparencia y permite a la ciudadanía conocer los aspectos fundamentales del contrato. La interventoría valida que esta acción contribuye al fortalecimiento de la relación con la comunidad y al cumplimiento de los criterios de divulgación establecidos por los entes de control.

Ilustración 16. Soporte valla del proyecto



Fuente: El proyecto

6. Actas de vecindad

La interventoría realizó el seguimiento al proceso de levantamiento y firma de actas de vecindad durante el mes de septiembre de 2025, confirmando que no se generaron nuevos registros en este periodo, dado que dicha actividad fue realizada principalmente durante las fases iniciales del proyecto. Actualmente, los esfuerzos del consorcio se han concentrado en gestionar la formalización de actas ya diligenciadas, las cuales no han sido firmadas por los propietarios correspondientes, ya sea por dificultades en su localización o por decisiones de no suscribir el documento.

El proceso ha contado con el acompañamiento permanente de la interventoría, quien ha validado los procedimientos implementados para el abordaje de estos casos, así como la solicitud de acompañamiento de entidades como la Personería Municipal, la Junta de Acción Comunal y la veeduría ciudadana. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y trazabilidad del proceso, y facilitar su cierre adecuado.

Las actas que, si bien han sido levantadas en campo, aún no han sido firmadas por los propietarios, han sido adjuntadas como soporte documental del componente social en el presente informe, en aras de mantener un registro actualizado. En caso de lograr nuevas firmas, estas serán incorporadas al informe final junto con su respectiva acta de cierre.

7. Plan de generación de empleo

La interventoría verificó el cumplimiento del Plan de Generación de Empleo durante el mes de septiembre de 2025, confirmando la vinculación de nuevos trabajadores, dentro de los cuales se destaca la contratación de mano de obra local y la participación activa de mujeres en diversas actividades del proyecto. Estas acciones están alineadas con los compromisos sociales asumidos por el contratista, en especial aquellos relacionados con la priorización del personal proveniente del área de influencia directa de la obra.

El equipo humano vinculado en este periodo se encuentra formalmente contratado y afiliado al sistema de seguridad social, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. Desde la interventoría se ha hecho seguimiento a este proceso, confirmando que la estrategia de inclusión laboral y enfoque de género continúa siendo una directriz activa y efectiva dentro del componente social del contrato. La participación creciente de mujeres en la obra representa un avance significativo en la implementación de criterios de equidad y desarrollo comunitario.

8. Disponibilidad de baños y oficina de atención

Durante el mes reportado, la interventoría realizó seguimiento a la operación del punto de atención al ciudadano, verificando que la oficina administrativa del proyecto, ubicada en la Calle 25 #13-50 del barrio Villa Panorama, continúa funcionando como sede operativa y punto de contacto con la comunidad. Esta oficina cumple con funciones administrativas, de almacenamiento de herramientas y equipos, así como de atención directa a los habitantes del área de influencia.

Adicionalmente, se constató el mantenimiento de dos unidades sanitarias instaladas en el área de intervención, las cuales prestan servicio al personal de obra y garantizan condiciones mínimas de higiene, salubridad y bienestar laboral. La interventoría confirma que las condiciones del campamento y del punto de atención son adecuadas y cumplen con los requerimientos establecidos para el correcto desarrollo de las actividades del proyecto.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONCLUSIONES

- La interventoría ha realizado el seguimiento y verificación permanente de las actividades sociales ejecutadas por el contratista, constatando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo Social.

- Se evidenció la continuidad de estrategias de vinculación laboral, con énfasis en la contratación de mano de obra local y la inclusión de mujeres, lo cual representa un avance positivo en la implementación de criterios de equidad y desarrollo social.

- Se mantuvieron operativos los canales de atención y comunicación con la comunidad, tales como el punto de atención presencial y el buzón digital de PQRS, cumpliendo con los principios de participación y transparencia.

- No se presentaron novedades o conflictos sociales relevantes durante el mes de septiembre, lo que refleja una adecuada relación del proyecto con la comunidad y una gestión social oportuna.

- Persisten algunas limitaciones en la formalización de actas de vecindad por razones ajenas al contratista, frente a las cuales se continúan realizando gestiones con el acompañamiento de actores institucionales y comunitarios.

RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo los canales de comunicación con la comunidad, promoviendo espacios informativos adicionales en caso de surgir inquietudes o nuevos frentes de obra.

- Mantener el enfoque de inclusión en la contratación de personal, especialmente de mujeres y población del área de influencia, promoviendo condiciones de equidad y participación activa.

- Sostener el seguimiento a las actas de vecindad pendientes por firmar, articulando acciones con entidades locales para facilitar su formalización sin vulnerar el debido proceso.

- Preservar en condiciones óptimas el punto de atención y las unidades sanitarias habilitadas, garantizando su disponibilidad y funcionalidad durante toda la etapa de obra.

UNIÓN TEMPORAL LAFER

7. INFORME ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

Entre el 1.º y el 30 de septiembre de 2025, la interventoría del proyecto, liderada por la Unión Temporal LAFER, ejecutó un conjunto integral de actividades técnicas, administrativas, ambientales y sociales orientadas a garantizar el adecuado seguimiento, acompañamiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Consorcio RYP. Estas acciones se enmarcaron en los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría, así como en las normativas vigentes y los principios de gestión responsable del proyecto.

Como parte de su compromiso institucional con el desarrollo sostenible, la interventoría incorporó criterios de responsabilidad ambiental y social en todos los niveles de su gestión. Dichos criterios fueron aplicados tanto en los procesos internos del equipo interventor como en la interacción permanente con el contratista, las comunidades locales y demás actores relevantes del entorno del proyecto. Esta visión permitió no solo fortalecer el control técnico y administrativo, sino también fomentar la implementación de buenas prácticas que contribuyen al respeto por el medio ambiente y al bienestar social de las zonas de influencia.

A continuación, se detalla el equipo profesional designado para la interventoría, según lo establecido en el anexo técnico del proceso de licitación.

Tabla 9. Profesional de interventoría

NOMBRE	CÉDULA	DEDICACIÓN	CARGO	PLANILLA SEP 25
Alex Cigifredo Sandoval Pinzón	79.577.759	55%	Director de interventoría	9492700744
		40%	Arquitecto urbanista	
Juan Pablo Castiblanco Pinto	1.052.379.237	100%	Residente de interventoría	9492700744
Diego Fernando Suarez Ocampo	1.053.776.001	50%	Eléctrico	7985388436
				9493273793
Alejandro Hernández	1.192.764.326	100%	Inspector de interventoría	9492700744
Cristian Andrés Corredor Tapias	1.049.658.635	100%	Auxiliar administrativo	9492998965

Fuente: El proyecto

Por lo anterior, se destacan las siguientes acciones desarrolladas por el equipo interventor:

1. Transporte sostenible

Durante el presente periodo de seguimiento, correspondiente al mes de septiembre de 2025, el equipo interventor dio continuidad a las acciones orientadas hacia una movilidad sostenible, manteniendo la optimización en el uso del vehículo asignado al proyecto. Se continuó con la planificación conjunta de desplazamientos para reducir trayectos innecesarios, priorizando el uso compartido del vehículo y disminuyendo los viajes individuales. Asimismo, se siguió promoviendo el desplazamiento a pie o el uso de medios alternativos en distancias cortas, lo que ha permitido conservar una tendencia favorable en la reducción del consumo de combustible y emisiones asociadas al transporte, en coherencia con los principios de sostenibilidad adoptados por la interventoría.


2. Uso responsable del papel

Durante este tercer mes de seguimiento, se mantuvo el enfoque en la digitalización como eje central de la gestión documental. El equipo interventor continuó priorizando el uso de medios digitales para la elaboración, revisión y archivo de documentos, limitando la impresión únicamente a los casos estrictamente necesarios. Las impresiones realizadas conservaron las configuraciones de ahorro predeterminadas (doble cara y blanco y negro), y, cuando fue necesario utilizar papel físico, se empleó material reciclado o con certificación ambiental. Esta práctica ha seguido contribuyendo a una gestión eficiente de los recursos y a la disminución del impacto ambiental del proyecto.

3. Separación en la fuente y reciclaje

Durante el mes de septiembre, el sistema de separación de residuos en la fuente implementado en la oficina del equipo interventor se mantuvo en funcionamiento. El punto ecológico continúa operativo, permitiendo la clasificación adecuada de los residuos en materiales aprovechables y no aprovechables.

Ilustración 17. Punto ecológico interventoría

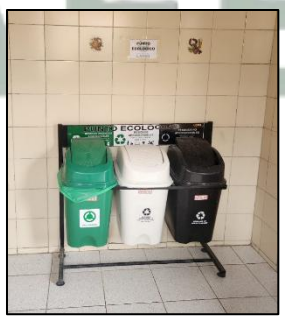

Fuente: El proyecto

Por otra parte, no se reportó generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en este periodo; sin embargo, se mantiene vigente el protocolo de manejo responsable conforme a lo establecido en la Resolución 851 de 2022, como parte de los compromisos ambientales del equipo interventor frente a una gestión responsable de los residuos especiales en futuras etapas del proyecto.

Ilustración 18. Punto disposición RAEE interventoría



Fuente: El proyecto

4. Equipos y herramientas sostenibles

Durante el mes de septiembre, el equipo interventor mantuvo su compromiso con la eficiencia energética, dando continuidad al uso de equipos electrónicos seleccionados bajo criterios de sostenibilidad. Se priorizó nuevamente el uso de computadores portátiles con baterías de alta duración, evitando el empleo de dispositivos de alto consumo o con bajo rendimiento. Estas medidas han permitido optimizar el consumo energético durante el desarrollo de las actividades, alineando el componente tecnológico con los principios de sostenibilidad definidos para el proyecto.

5. Capacitaciones y sensibilización en sostenibilidad

Durante el mes de septiembre, el equipo interventor realizó una jornada de sensibilización dirigida al personal de obra, enfocada en la promoción de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades en campo. Esta capacitación tuvo como propósito fomentar el uso eficiente de los recursos y fortalecer la conciencia ambiental entre los trabajadores, promoviendo comportamientos sostenibles en los frentes de trabajo. Estas acciones hacen parte del compromiso del equipo interventor con la formación continua y se proyecta su continuidad en próximas fases del proyecto, involucrando progresivamente a otros actores clave.

Tabla 10. Capacitaciones interventoría

FECHA	TEMA
27/09/25	Ahorro de energía y recursos en frentes de obra

Fuente: El proyecto

Ilustración 19. Capacitación por interventoría



Fuente: El proyecto

6. Oficina y vehículo

Durante el presente mes, la interventoría continuó operando desde la oficina establecida, ubicada estratégicamente en proximidad al área de obra, lo cual ha facilitado un acompañamiento técnico constante y eficiente. La sede cuenta con condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones asignadas, incluyendo los elementos mínimos requeridos como mobiliario y servicios básicos. El equipo interventor también mantiene la disponibilidad de un vehículo exclusivo para el seguimiento de campo, formalizado mediante la carta de disponibilidad correspondiente, lo cual permite una movilidad oportuna y alineada con las necesidades del proyecto.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

8. ANEXOS

ANEXO No.6.1: Anexos componente ambiental

ANEXO No.6.2: Planillas SS contratista

ANEXO No.6.3: Anexos componente SST

ANEXO No.6.4: Anexos componente social

ANEXO No.6.5: Planillas SS interventoría

ANEXO No.6.6: Anexos interventoría

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

ANEXO NO.08.1.
ANEXOS COMPONENTE AMBIENTAL

UNION TEMPORAL
LAFER

ACTA REUNIÓN GGAS

UNION TEMPORAL

LAFER

RESPONSABLE: RODRIGO MENDIVELSO. **CARGO:** AMBIENTAL.

FECHA: 30-SEPTIEMBRE-25 **CONTRATO:** 2070 DE 2025.

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

CONSORCIO RYP, por medio de la presente acta, da constancia del desarrollo de la SEGUNDA reunión mensual, en la cual se revisó el cumplimiento y desarrollo del PAGA, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025, en donde se cumplieron las medidas y normas ambientales vigentes, teniendo en cuenta buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obra, que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrolla, haciendo énfasis en las fichas ambientales propuestas para el proyecto.

La presente se firma a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE. de 2025 por los interesados que en ella intervinieron siendo los integrantes del grupo de gestión ambiental y social, quienes tienen pleno conocimiento de los roles y responsabilidades dentro del mismo y han participado de la sesión desarrollada:

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
CÉDULA: 1.049.603.584 DE TUNJA
MATRICULA: 15202-195312 BYC

DIRECTOR DE OBRA

LUIS ALBERTO GORDILLO
CÉDULA: 6.765.918 DE TUNJA
MATRICULA: 25202-355119 CND

RESIDENTE DE OBRA

Edwin Echeverria

EDWIN FERNANDO ECHEVERRÍA
CÉDULA: 1.049.604.684 DE TUNJA
MATRICULA: 15202-198048 BYC

PROFESIONAL AMBIENTAL

RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY
CÉDULA: 7.181.346 DE TUNJA
MATRÍCULA: 15202-136023 BYC

CAPACITACIONES AMBIENTALES

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	RODRIGO MENDIESO.				
DOCUMENTO:	7.181.346	**CARGO:**	PROFESIONAL AMBIENTAL.		
SST	( )	**AMBIENTAL:**	(X)	**FECHA:**	02/09/25
TEMA:	EFECTO INVERNADERO.			**DURACIÓN:**	30 MIN

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
Brayan Alexander Gomez Jaimes	1053666607	Brayan Gomez
Yeison Junior Martinez Molano	1054146034	
Jeysson Alexander Martinez Pinzon	1053613797	
Jorge eliecer Suarez avella	1053670906	Jorge Suarez
Gilbert Javier Bermudes	1053673359	Gilbert Bermudes
Jorge Luis Bermudes	1053668937	
Oscar Mauricio Suarez	4192545	
Alfonso Avella - o	1007305845	Alfonso -
John Guillermo Diaz S.	1052721476	
Domingo Avella o	74359038	

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: RODRIGO MENDIESO

Documento: 7.181.346

CONSORCIO RYP	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	RODRIGO MENDIOLA.				
DOCUMENTO:	7.181.346	**CARGO:**	PROFESIONAL AMBIENTAL.		
SST	( )	**AMBIENTAL:**	(x)	**FECHA:**	24/09/25
TEMA:	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.			**DURACIÓN:**	30 MIN

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
Bryan Guerrero Suarez	1.233.666.607	
Yesenia Javier Martinez Molano	1054146084	
Moises CAMACHO F.	74324374	
Ana Iris Rodriguez Ochoa	1053607984	Ana Iris
Yaneth Ruiz Melo	1053611754	Yaneth Ruiz M.
John Guillermo Diaz S.	1057824476	
OMAR ESCAMILLA SILVA	1090483658	OMAR ESCAMILLA S.
Oscar Mauricio Suarez	4192543	
Domingo Avila	74379038	
Dilan steven Rios Aponte	1000212908	Dilan steven Rios
Claudia Patricia Castiblanco Santos	1053616291	Claudia Castiblanco
Gilbert Javier Bmaviez	1053613359	Gilbert Bmaviez
Jorge eliecer suarez avila	7053670948	Jorge Suarez
Alfonso Acuña - o	1007305945	Alfonso

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: RODRIGO MENDIOLA.
Documento: 7181346

ANEXO NO.08.2.
PLANILLAS PERSONAL CONTRATISTA



UNION TEMPORAL
LAFER

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859936881	9493305814	E	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$1,587,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMON PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	33366983	MEDINA YENNY	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANDENES PAIPA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: CENTRO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: SABOYA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
2	CC	1049644688	SICHACA IVAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DISCAPACITADO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMON 1 DISCAP (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
3	CC	6767593	HERNANDEZ JULIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGENIEROS ESPECIALISTAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: ESPECIALISTA OBRA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
4	CC	1049603584	SICHACA LUIS	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(4)**					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$213,200		$0	$0		$1,580,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859936881	9493305814	E	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$1,587,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$4,000	$0	$915,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$3,000	$0	$686,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$213,200	$1,000	$0	$214,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$213,200	$1,000	$0	$214,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$1,000	$0	$229,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$228,000	$1,000	$0	$229,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$228,000	$1,100	$0	$229,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$500	$0	$114,500
TOTAL				**4**	**$1,580,400**	**$7,100**	**$0**	**$1,587,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859923034	9493305677	E	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$6,096,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74359038	AVELLA DOMINGO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1007305445	AVELLA LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1053613359	BENAVIDES GILBERT																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1053608931	BENAVIDES JORGE		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
5	CC	74324374	CAMACHO MOISES	X																	231001	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
6	CC	1053616291	CASTIBLANCO CLAUDIA	X																	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF10	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
7	CC	1058274476	DIAZ JOHN																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1049604684	ECHEVERRIA EDWIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1090483658	ESCAMILLA OMAR	X																	25-14	7	$332,150	$53,200	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
10	CC	1053606607	GUERRERO BRAYAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1053615447	MARTINEZ JEYSSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1054146089	MARTINEZ YERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1053607984	RODRIGUEZ ANA	X																	230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
14	CC	1015474192	ROMERO MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1053611754	RUIZ YANETH	X																	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
16	CC	1053610948	SUAREZ JORGE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	4192543	SUAREZ OSCAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(17)**																						$19,596,850	$3,136,200			$19,596,850	$784,700			$19,596,850	$784,700			$19,596,850	$1,364,600		$0	$0		$6,070,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859923034	9493305677	E	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$6,096,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,136,200	$13,700	$0	$3,149,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$281,000	$1,300	$0	$282,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$106,400	$500	$0	$106,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,293,200	$9,900	$0	$2,303,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$2,000	$0	$457,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,364,600	$5,900	$0	$1,370,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,364,600	$5,900	$0	$1,370,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$784,700	$3,400	$0	$788,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	$784,700	$3,400	$0	$788,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$784,700	$3,700	$0	$788,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$13,300	$100	$0	$13,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$193,800	$900	$0	$194,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$285,000	$1,300	$0	$286,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$64,600	$300	$0	$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000	$800	$0	$171,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				17	$6,070,200	$26,700	$0	$6,096,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859932122	9493272399	E	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$398,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANDENES PAIPA (1 Afiliados)																							$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$51,300			$1,281,150	$51,300			$1,281,150		$89,200		$0	$0		$396,800
Centro de Trabajo: CENTRO (1 Afiliados)																							$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$51,300			$1,281,150	$51,300			$1,281,150		$89,200		$0	$0		$396,800
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$51,300			$1,281,150	$51,300			$1,281,150		$89,200		$0	$0		$396,800
1	CC	7318490 PANQUEVA EMILIO	X	X																	230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF10	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,281,150	$205,000			$1,281,150	$51,300			$1,281,150	$51,300			$1,281,150		$89,200		$0	$0		$396,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859932122	9493272399	E	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$398,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,000	$900	$0	$205,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$205,000	$900	$0	$205,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,200	$400	$0	$89,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$89,200	$400	$0	$89,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,300	$300	$0	$51,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$51,300	$300	$0	$51,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,300	$300	$0	$51,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$51,300	$300	$0	$51,600
TOTAL				**1**	**$396,800**	**$1,900**	**$0**	**$398,700**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765918		GORDILLO VALDERRAMA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 18 33	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1786448984	9491842313	N	2025/10/06	2025/09/18	BANCO DE BOGOTA	0	$418,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$0						$0	
																				$0						$0	
																				$0						$0	
						$6,500,000	No		COLPENSIONES	30	($6,500,000)	16%	SIN RIESGO	($1,040,000)	$0	$0	($32,500)	($32,500)	$0	($1,105,000)		FAMISANAR	30	($6,500,000)	12.5%	($812,500)	
						$6,500,000	No		COLPENSIONES	30	$6,500,000	16%	SIN RIESGO	$1,040,000	$0	$0	$32,500	$32,500	$0	$1,105,000		FAMISANAR	30	$6,500,000	12.5%	$812,500	
																				$0						$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$0						$0						$418,400				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$418,400				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$418,400				$0		$0		$0		$0	
$0	($812,500)			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	($6,500,000)	0.522%	5	($34,000)	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$812,500			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$6,500,000	6.96%	5	$452,400	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$418,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765918		GORDILLO VALDERRAMA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 18 33	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1751707166	9491474569	I	2025/10/06	2025/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,951,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,105,000						$812,500	
																				$1,105,000						$812,500	
																				$1,105,000						$812,500	
						$6,500,000	No		COLPENSIONES	30	$6,500,000	16%	SIN RIESGO	$1,040,000	$0	$0	$32,500	$32,500	$0	$1,105,000		FAMISANAR	30	$6,500,000	12.5%	$812,500	
																				$1,105,000						$812,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$812,500						$0						$34,000				$0		$0		$0		$0	
	$812,500						$0						$34,000				$0		$0		$0		$0	
	$812,500						$0						$34,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$812,500			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$6,500,000	0.522%	1	$34,000	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$812,500						$0						$34,000				$0		$0		$0		$0	

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-29, 07:54:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79979322

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 22/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR		
Documento	CC79969466	**Dirección**	CL 36 SUR #34 C - 24 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3013025483
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79969466	IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.880.000	$ 460.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.880.000	$ 360.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 820.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.880.000	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 460.800	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 820.800	$ 0	$ 820.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4179386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-21
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34539928
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34539928
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.900	$ 247.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300	$ 317.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 10.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.600	$ 575.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1859942380	9493273242	Y	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$119,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4179386	CAMACHO JUAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$427,050	$29,800	0	$0	$0	No	$29,800
2	CC	7181346	MENDIVELSO RODRIGO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	18	$854,100	$59,500	0	$0	$0	No	$59,500
3	CC	79969466	VARGAS IVAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$427,050	$29,800	0	$0	$0	No	$29,800
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,708,200	$119,100		$0	$0		$119,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1859942380	9493273242	Y	2025/10/10	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$119,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$119,100	$600	$0	$119,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$119,100	$600	$0	$119,700
TOTAL				3	$119,100	$600	$0	$119,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	30/09/2025	90223683	$243.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	106.800	0		0		0	0	0	0	106.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	136.700	0	0	0	0	0	0		136.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	106.800	106.800
Pensión	1	136.700	136.700
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	243.500	243.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY		CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TIPACOQUE	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-09	I	30/09/2025	90223683	$243.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	7181346	MENDIVELSO CELY RODRIGO ALBEIRO	3	0			N	X	X															230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS037	854.100	106.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053608962		SANABRIA BUITRAGO CARLOS HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra19#21-86	PAIPA-BOYACA	3337802	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1831314531	9492411840	I	2025/10/15	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$509,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.435.020	No		PORVENIR	30	$ 1.435.020	16%	SIN RIESGO	$ 229.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.700		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.435.020	12,5%	$ 179.400	$
																					$ 229.700						$ 179.400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 179.400			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.435.020	6,96%	5	$ 99.900	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 179.400						$ 0						$ 99.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053608962		SANABRIA BUITRAGO CARLOS HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra19#21-86	PAIPA-BOYACA	3337802	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1831314531	9492411840	I	2025/10/15	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$509,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,700	$0	$0	$229,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$229,700	$0	$0	$229,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,900	$0	$0	$99,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,900	$0	$0	$99,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,400	$0	$0	$179,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$179,400	$0	$0	$179,400
TOTAL				**1**	**$509,000**	**$0**	**$0**	**$509,000**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053610043		SANABRIA BUITRAGO ITALO JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 19 21 86	PAIPA-BOYACA	2070342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1811017507	9492285142	I	2025/10/10	2025/09/29	BANCOLOMBIA	0	$509,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.435.180	No		PORVENIR	30	$ 1.435.180	16%	SIN RIESGO	$ 229.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.700		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.435.180	12,5%	$ 179.400	$
																					$ 229.700						$ 179.400	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 179.400			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.435.180	6,96%	5	$ 99.900	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 179.400						$ 0						$ 99.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053610043		SANABRIA BUITRAGO ITALO JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 19 21 86	PAIPA-BOYACA	2070342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1811017507	9492285142	I	2025/10/10	2025/09/29	BANCOLOMBIA	0	$509,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,700	$0	$0	$229,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$229,700	$0	$0	$229,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,900	$0	$0	$99,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,900	$0	$0	$99,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,400	$0	$0	$179,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$179,400	$0	$0	$179,400
TOTAL				1	$509,000	$0	$0	$509,000

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-09, 01:21:04 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1076342855

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-09 13:10:18.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUDY TATIANA CARDENAS FIGUEREDO				
Documento	CC 1052393264	**Dirección**	CR 42 #14 - 33 PISO 2		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3106493149		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	DUITAMA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 74323523		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	03					VALDERRAMA ROJAS LUIS FRANCISCO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																0	0	30	30	30			F	$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF21	4 %	$ 57.000	$ 2.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74359489
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON CAMARGO BUITRAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 16A 29A-27	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112447019**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2847213227

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 74359489	CAMARGO BUITRAGO NELSON	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	74359489	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901370790	5	SYMAQ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 34 # 23-89	SOGAMOSO-BOYACA	7710335	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1849530790	9493188321	E	2025/10/22	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$2,803,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$9,052,200	$1,448,600			$9,052,200	$362,400			$9,052,200	$362,400			$9,052,200		$630,300		$0	$0		$2,803,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$9,052,200	$1,448,600			$9,052,200	$362,400			$9,052,200	$362,400			$9,052,200		$630,300		$0	$0		$2,803,700
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (7 Afiliados)																							$9,052,200	$1,448,600			$9,052,200	$362,400			$9,052,200	$362,400			$9,052,200		$630,300		$0	$0		$2,803,700
1	CC	74081978	ALARCON HUGO																		25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$66,000	CCF10	30	$1,650,000	$66,000	14-23	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	Si	$510,900
2	CC	46387430	ALARCON JOHANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1057574737	BENITEZ MAURICIO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1057595413	BOLIVAR GUSTAVO	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF10	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
5	CC	1057593443	GUZMAN NELSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1093785461	LOPEZ JOSE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1057590712	MONTAÑEZ RICARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(7)**																						$9,052,200	$1,448,600			$9,052,200	$362,400			$9,052,200	$362,400			$9,052,200		$630,300		$0	$0		$2,803,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901370790	5	SYMAQ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 34 # 23-89	SOGAMOSO-BOYACA	7710335	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1849530790	9493188321	E	2025/10/22	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$2,803,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,448,600	$0	$0	$1,448,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$264,000	$0	$0	$264,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$729,000	$0	$0	$729,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$630,300	$0	$0	$630,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$630,300	$0	$0	$630,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$362,400	$0	$0	$362,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$362,400	$0	$0	$362,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$362,400	$0	$0	$362,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$362,400	$0	$0	$362,400
TOTAL				7	$2,803,700	$0	$0	$2,803,700

ANEXO NO.08.3.
ANEXOS COMPONENTE SST

UNION TEMPORAL
LAFER

EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

UNION TEMPORAL

LAFER


DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO SANTOS			**GÉNERO:** Femenino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1053616291	**FECHA NACIMIENTO:** 06/02/1999	**EDAD:** 26 año(s) 6 mes(es) 28 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSOSRCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: CONTROLADORA VIAL	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 04/09/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES								Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES								Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES							X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS									
X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Condiciones de salud compatibles para el cargo a desempeñar con las siguientes recomendaciones :
Habitos de higiene postural.
Indicaciones pausas activas.
Indicaciones cuidados biomecanicos
Indicaciones nutricionales, control de peso
Indicaciones uso de elementos de proteccion personal

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO SANTOS



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com

DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: MOISES CAMACHO FONSECA			**GÉNERO:** Masculino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 74324374	**FECHA NACIMIENTO:** 10/03/1971	**EDAD:** 54 año(s) 6 mes(es) 14 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSORCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: AYUDANTE DE OBRA	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 24/09/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES							Ninguna
X	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							Ninguna
	2.1. Calificación de origen	X	2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas		2.5. Uso de elementos de protección personal	X	2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS									
X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Condiciones de salud compatibles para el cargo a desempeñas con recomendaciones :
Habitos de higiene postural.
Indicaciones pausas activas.
Indicaciones cuidados biomecanicos
Indicaciones uso de gafas para correccion visual permenentemente.
La formulacon de las gafas actuales corrigen adecuadamente
Indicaciones proteccion auditiva estricta, indicaciones control de audiiometria por eps
Indicaciones uso de elementos de proteccion personal

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

MOISES CAMACHO FONSECA



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com


DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: YANETH RUIZ MELO			**GÉNERO:** Femenino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1053611754	**FECHA NACIMIENTO:** 03/10/1994	**EDAD:** 30 año(s) 11 mes(es) 21 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSORCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: CONTROLADORA VIAL	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 24/09/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES						X	Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS									
X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa	X	Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Condiciones de salud compatibles para el cargo a desempeñar con las siguientes recomendaciones :
Habitos de higiene postural.
Indicaciones pausas activas.
Indicaciones cuidados biomecanicos
Indicaciones uso de medias antiembolicas
Indicaciones uso de elementos de proteccion personal

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

YANETH RUIZ MELO



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com


DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: OMAR ORLANDO ESCAMILLA SILVA			**GÉNERO:** Masculino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1090483658	**FECHA NACIMIENTO:** 14/09/1993	**EDAD:** 32 año(s) 10 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSORCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: AYUDANTE DE OBRA	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 24/09/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES											Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición				
	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras				
2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES											Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar				
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros				
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas								
3. RESTRICCIONES										X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas				
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes				
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros				

4. CONCEPTO MÉDICO							
Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales							
X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS									
X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Condiciones de salud compatibles para el cargo a desempeñar con las siguientes recomendaciones :
Habitos de higiene postural.
Indicaciones pausas activas.
Indicaciones cuidados biomecanicos
Indicaciones nutricionales, control de peso
Indicaciones uso de elementos de proteccion personal

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

OMAR ORLANDO ESCAMILLA SILVA



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com


DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: ANA IRIS RODRIGUEZ OCHOA			**GÉNERO:** Femenino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1053607984	**FECHA NACIMIENTO:** 27/10/1989	**EDAD:** 35 año(s) 10 mes(es) 27 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSORCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: CONTROLADORA VIAL	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 24/09/2025

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES							Ninguna
X	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo	X	1.7. Control de peso y nutrición
X	1.2. Continuar manejo médico	X	1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal	X	2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS									
X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Condiciones de salud compatibles para el cargo a desempeñar con las siguientes recomendaciones :
Habitos de higiene postural.
Indicaciones pausas activas.
Indicaciones cuidados biomecanicos
Indicaciones uso de gafas para correccion visual permenentemente.
Indicaciones valoracion por optometria y continuar tratamiento de paceinte cronico por eps.
Indicaciones nutricionales, control de peso
Indicaciones uso de medias antiembolicas
Indicaciones uso de elementos de proteccion personal

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

ANA IRIS RODRIGUEZ OCHOA



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com

CONSORCIO RYP	NOTIFICACIÓN EXÁMEN DE EGRESO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-25
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

Paipa, Boyacá, 29 de septiembre del 2025

Señor(a):
JORGE LUIS BENAVIDES GUERRERO
C.C. 1.053.608.931 DE PAIPA
OFICIAL DE OBRA

Asunto: Notificación para realización de examen médico ocupacional de egreso y exoneración de responsabilidades

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que, con ocasión de la terminación de su contrato laboral con la empresa CONSORCIO RYP, con fecha de finalización el día 27 de septiembre de 2025, usted tiene derecho a practicarse el examen médico ocupacional de egreso, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Este examen tiene como objetivo verificar su estado de salud al momento de la desvinculación, identificar posibles afectaciones relacionadas con el cargo desempeñado y dejar constancia del estado de salud con el que culmina su relación laboral.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 1843 de 2025, el examen médico de egreso debe practicarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del contrato. Por tanto, se le notifica formalmente que dispone de este plazo, contado a partir de la fecha de retiro, es decir, hasta el día 04 de octubre del 2025, para presentarse a realizarse dicho examen en la IPS, **CONSULTORIO MEDICINA OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES**, ubicada en la **calle 25 # 22-40 consultorio 303 Edificio María Mercedes**. En caso de no presentarse dentro del plazo indicado, se entenderá que ha renunciado voluntariamente a su derecho a practicarse el examen médico de egreso. En consecuencia, la empresa quedará exonerada de cualquier tipo de responsabilidad legal, médica, laboral o de seguridad social derivada de su estado de salud posterior al retiro, o de cualquier situación relacionada con riesgos laborales no diagnosticados o documentados al momento de la desvinculación.

Agradecemos su atención y le solicitamos que, en caso de tener alguna duda o requerir el reagendamiento del examen de egreso, por favor se acerque previamente a la oficina, o se comunique con el residente o la profesional de SST, quienes le colaborarán con la reasignación. Es importante que este proceso se realice con antelación para evitar inconvenientes con la IPS.

Sin otro particular, quedamos atentos a su gestión dentro del tiempo establecido.

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
CÉDULA: 1.049.603.584 DE TUNJA

COLABORADOR
JORGE LUIS BENAVIDES GUERRERO
C.C. 1.053.608.931 DE PAIPA

ENTREGA DE EPP'S

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Romero **MES/AÑO:** Septiembre 2025

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Claudia Castiblanco	04-09-25	Overol	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	
Claudia Castiblanco	04-09-25	Guantes	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	
Claudia Castiblanco	04-09-25	Chaleco	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	
Claudia Castiblanco	04-09-25	Botas	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	
Claudia Castiblanco	04-09-25	Tapabocas	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	
Claudia Castiblanco	04-09-25	Tapaoidos	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Romero **MES/AÑO:** Septiembre 2025

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Suarez	15/09/2025	Guantes.	01	NUEVO	Jorge Suarez	
Gilberto Isaiel Benavides	15/08/2025	Guantes	01	NUEVO	Gilberto Benavides	
Yeison Javier Martinez	15/08/2025	Guantes	01	Nuevo		
Yeison Javier Martinez	15/08/25	Gafas	01	NUEVO		
Jeysson Martinez	15/08/25	gafas	01	Nuevo		
Jeysson Martinez	15/08/25	guantes	01	Nuevo		
Claudia Castiblanco Santos	15-08-25	guantes	01	NUEVO	ClaudiaCastiblanco	
Jorge Luis Benavides	15/09-25	guantes	01	NUEVO		
Jorge Luis Benavides	15/09/25	GAFAS	01	NUEVO		
Jorge Luis Benavides	15/09/25	TAPAOIDOS	01	NUEVO		
John Diaz	15/09/25	guantes	1	nuevo		
Brayan Guerrero	15/09/25	guantes	1	NUEVO	Brayan	
Alfonso A.	15/09/25	guantes	1	nuevo	Alfonso	
Domingo Avella	Domingo	Avila	1	NUEVO	Avella	
Claudia Patricia Castiblanco	16-09-25	Gafas	1	NUEVO	ClaudiaCastiblanco	
Jorge Suarez	17-09-25	Gafas	1	NUEVO	Jorge Suarez	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramos **MES/AÑO:** Septiembre 2025

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Luis Bernardez	22/09/25	Guantes	1	Nuevo		
Jeysson Martinez	22/09/25	Guantes	1	Nuevo		
John G. Diaz	22/09/25	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Suarez	22/09/25	Guantes	1	Nuevo	Jorge Suarez	
Domingo Abello	22/09/25	Guantes	1	Nuevo		
Oscar Suarez	22/09/25	Guantes	1	Nuevo		
Gilbert David Miranda	24/09/25	Guantes	1	Nuevo	Gilbert Miranda	
Claudia Patricia Castellanos	24/09/25	Guantes	1	Nuevo	ClaudiaCastellanos	
John Diaz	25/9/25	Guantes N	1	nuevos		
John Diaz	25/9/25	Guantes G.	1	nuevos		
Domingo Abello	25/09/25	Guantes N	1	Nuevo		
Domingo Abello	25/09/25	Guantes C.	1	Nuevo	Domingo	
Brayan Guerrero	25/9/25	Guantes N	1	nuevos	Brayan	
Brayan Guerrero	25/9/25	Guantes	1	nuevos	Brayan	
Alfonso	25/9/25	Guantes	1	Nuevos	Alfonso	
Alfonso	25/9/25	Guantes	1	nuevo	Alfonso	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernando Ramon **MES/AÑO:** Septiembre 2025

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	Guantes	1 par.	Nuevo	Yaneth Ruiz	
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	1 Gafas.	1	Nuevo	Yaneth Ruiz	
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	Botas	1 par	Nuevo	Yaneth Ruiz M	
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	overol	1	Nuevo	Yaneth Ruiz M.	
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	chaleco R.	1	Nuevo	Yaneth Ruiz M.	
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	Tapaidos	1	Nuevo	Yaneth Ruiz M	
Yaneth Ruiz M.	24/09/25	Tapabocas	1	Nuevo	Yaneth Ruiz M	
Yaneth Ruiz M.	24/09/24	casco	1	Nuevo	Yaneth Ruiz M.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	Guante Q	1 par.	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	Casco	1	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	overol	1	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	Botas	1 par	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	Gafas	1	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	Tapaodos	1	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	24/09/25	Tapabocas	1	Nuevo	OMAR E.S.	
OMAR ESCAMILLA	25/09/25	Guantes N	1	Nuevo	OMAR E.S.	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Lemos **MES/AÑO:** Septiembre 2025

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Bernardes	25/09/25	Guantes N	1	Nuevo		—
Jorge Bernardes	25/09/25	Guantes C	1	Nuevo		—
Jeysson Martinez	25/09/25	Guantes N	1	Nuevo		—
Jeysson Martinez	25/09/25	Guantes C	1	Nuevo		—
Alfonso A.	25/09/25	Tapabidos	2	Nuevo		—
Jorge Bernardes	25/09/25	Tapabidos	1	Nuevo		—
Jorge Suarez	25/09/2025	Guantes N	1	Nuevo	Jorge Suarez	—
Jorge Suarez	25/09/2025	Guantes C	1	Nuevo	Jorge Suarez	—
Yerson Javier M.	25/09/2025	Guantes N	1	Nuevos		—
Yerson Javier Martinez	25/09/2025	Guantes C	1	Nuevos		—
Oscar Suarez	25/09/25	Guantes N	1	Nuevo		—
Oscar Suarez	25/09/25	Guantes C	1	Nuevo		—
Brayan Guerrero	29/09/25	Guantes	1	Nuevo	Brayan	—

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

INDUCCIONES

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-09
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA: Yaneth Ruiz Melo

DOCUMENTO: 1053611754 **CARGO A DESEMPEÑAR:** Contratadora Vial

INDUCCIÓN: (X) **REINDUCCIÓN:** ( ) **FECHA:** 24/09/25

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA COLABORADOR

Yaneth Ruiz Melo

Nombre: Yaneth Ruiz Melo
Documento: 1053611754.

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernanda Romero
Documento: 1015471491

CONSORCIO RYP	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-09 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA: OMAR O. ESCAMILLA S.

DOCUMENTO: 1090483658 **CARGO A DESEMPEÑAR:** AYUDANTE

INDUCCIÓN: (X) **REINDUCCIÓN:** ( ) **FECHA:** 24/09/2025

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA COLABORADOR

Nombre: OMAR ESCAMILLA
Documento: 1090483658

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernando Roman
Documento: 1015477497.

CONSORCIO RYP	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-09 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA: Ana Iris Rodriguez ochoa		
DOCUMENTO: 1053607984	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	
INDUCCIÓN: (X)	**REINDUCCIÓN:** ( )	**FECHA:** 24/09/2024

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA COLABORADOR

Ana Iris R. O.

Nombre: Ana Iris R. O

Documento: 1053607984

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Reinaldo Ramon

Documento: 1015[illegible]

Calle 57 N°9-43 Santa Rita **312 3568416** **andenespaipa2025@gmail.com**

CONSORCIO RYP	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-09
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA:	Moises Camacho Fonseca	
DOCUMENTO: CC 7432 4374	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	OFICIAL - CONSTRUCCION
INDUCCIÓN: (X)	**REINDUCCIÓN:** ( )	**FECHA:** 24-9-25

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA COLABORADOR

Nombre: MOISES CAMACHO
Documento: CC 74324374

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernanda Roman.
Documento: 1015474491

CONSORCIO RYP	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-09
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA: Claudia Patricia Castiblanco Santos		
DOCUMENTO: 1053616241	**CARGO A DESEMPEÑAR:** Controladora vial	
INDUCCIÓN: (X)	**REINDUCCIÓN:** ( )	**FECHA:** 04-sep-25.

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	
OBSERVACIONES:		

FIRMA COLABORADOR

Claudia Patricia Castiblanco

Nombre: Claudia Patricia Castiblanco
Documento: 1053616241 Paipa.

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernanda Romero.
Documento: 1015474192.

INSPECCIONES PREOPERACIONALES

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Contrato 2010 de 2025		
Inspeccionado por:	Fernanda Romero.	Cargo:	Profesional SST.
Fecha: (desde-hasta)	01-sep al 06-sep del 2025		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE FRENADO	X			X			X			X			X			X		
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X			X		
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X			X		
	PITO	X			X			X			X			X			X		
	EXTINTOR	X			X			X			X			X			X		
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X			X		
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			X			X			X			X		
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			X			X			X			X		
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			X			X			X			X		
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			X			X			X			X		
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			X			X			X			X			X		
	EL SUELO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			

OBSERVACIONES:

Operador: Mauricio Benitez

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Contrato 2090 de 2025		
Inspeccionado por:	Fernanda Romero	Cargo:	Profesional SST
Fecha: (desde-hasta)	Del 08/09 al 13/09 del 2025		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE FRENADO	X			X			X			X			X			X		
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X			X		
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X			X		
	PITO	X			X			X			X			X			X		
	EXTINTOR	X			X			X			X			X			X		
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X			X		
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			X			X			X			X		
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			X			X			X			X		
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			X			X			X			X		
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			X			X			X			X		
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			X			X			X			X			X		
	EL SUELO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			

OBSERVACIONES:

Operador: Marco Benitez

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Contrato 2070 de 2025		
Inspeccionado por:	Del 15-sep al 20-sep del 2025	Cargo:	Profesional SST
Fecha: (desde-hasta)	Fernanda Romero		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE FRENADO	X			X			X			X			X			X		
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X			X		
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X			X		
	PITO	X			X			X			X			X			X		
	EXTINTOR	X			X			X			X			X			X		
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X			X		
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			X			X			X			X		
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			X			X			X			X		
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			X			X			X			X		
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			X			X			X			X		
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			X			X			X			X			X		
	EL SUELO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			

OBSERVACIONES:

Operario: Mauricio Benitez

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Contrato 2020 de 2025		
Inspeccionado por:	Fernanda Romero	Cargo:	Profesional SST.
Fecha: (desde-hasta)	Del 22-sep al 27-sep del 2025		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE FRENADO	X			X			X			X			X			X		
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X			X		
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X			X		
	PITO	X			X			X			X			X			X		
	EXTINTOR	X			X			X			X			Y			X		
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X			X		
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			Y			X			X			Y		
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			Y			Y			X			X		
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			Y			X			X			X		
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			Y			X			X			X		
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			Y			X			X			X		
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			Y			Y			X			Y		
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			Y			X			X			X		
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			O			Y			O			X			Y		
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			Y			X			X			X		
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			O			Y			X			Y			X		
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			Y			Y			X			Y			X		
	EL SUELO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			O			O			O			Y			Y		
FIRMA DEL OPERARIO		9/9			9/9			9/9			9/9			9/9			9/9		
FIRMA DEL SST																			

OBSERVACIONES:

Operador: Mauricio Benitez

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Contrato 2070 de 2025		
Inspeccionado por:	Fernanda Romero	Cargo:	Profesional SST.
Fecha: (desde-hasta)	Del 29 - sep al 04 oct. del 2025		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
	DE FRENADO	X			X			X			X			X			X		
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X			X		
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X			X		
	PITO	X			X			X			X			X			X		
	EXTINTOR	X			X			X			X			X			X		
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X			X		
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			X			X			X			X		
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			X			X			X			X		
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			X			X			X			X		
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			X			X			X			X		
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			X			X			X			X		
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			X			X			X			X			X		
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			X			X			X			X		
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			X			X			X			X			X		
	EL SUELO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			

OBSERVACIONES:

Operador: Mauricio Bonilla

CONSORCIO RYP

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA/ CANGURO

Fecha	Versión	Código	Pagina
2/02/2024	1	CRM-FM-22	1 de 1

PROYECTO: Contrato 2070-2025 — Marca
FRENTE: Calle 25 — **FECHA** 01 al 06/09/2025 — **No Serie o identificacion interna**

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	X		X		X		X		X		X		X			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	X		X		X		X		X		X		X			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	X		X		X		X		X		X		X			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	X		X		X		X		X		X		X			
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	X		X		X		X		X		X		X			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	X		X		X		X		X		X		X			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	X		X		X		X		X		X		X			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	X		X		X		X		X		X		X			
FIRMA SUPERVISOR HSE																		
FIRMA OPERADOR																		



Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CUMPLE — C — Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
NO CUMPLE — NC — Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.

CONSORCIO RYP

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RANA/ CANGURO

Fecha	Versión	Código	Pagina
2/02/2024	1	CRM-FM-22	1 de 1

PROYECTO: Contrato 2070 - 2025 Marca

FRENTE: Calle 25 **FECHA** 08 al 13/09/2025 No Serie o identificacion interna

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	X		X		X		X		X		X		X			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	X		X		X		X		X		X		X			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	X		X		X		X		X		X		X			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	X		X		X		X		X		X		X			
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	X		X		X		X		X		X		X			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	X		X		X		X		X		X		X			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	X		X		X		X		X		X		X			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	X		X		X		X		X		X		X			
FIRMA SUPERVISOR HSE																		
FIRMA OPERADOR																		



Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CUMPLE C Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.

NO CUMPLE NC Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.

CONSORCIO RYP

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA/ CANGURO

Fecha	Versión	Código	Pagina
2/02/2024	1	CRM-FM-22	1 de 1

PROYECTO: Contrato 2070-2025 Marca
FRENTE: Calle 25 **FECHA** 15 al 20/09/2025 No Serie o identificacion interna

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	X		X		X		X		X		X		X			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	X		X		X		X		X		X		X			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	X		X		X		X		X		X		X			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	X		X		X		X		X		X		X			
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	X		X		X		X		X		X		X			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	X		X		X		X		X		X		X			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	X		X		X		X		X		X		X			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	X		X		X		X		X		X		X			
FIRMA SUPERVISOR HSE																		
FIRMA OPERADOR																		



Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CUMPLE C Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
NO CUMPLE NC Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.

CONSORCIO RYP

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA/ CANGURO

Fecha	Versión	Código	Pagina
2/02/2024	1	CRM-FM-22	1 de 1

PROYECTO: Contrato 2070 -2025 — Marca
FRENTE: calle 25 — **FECHA** 22 al 27/09/2025 — No Serie o identificacion interna

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	X		X		X		X		X		X		X			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	X		X		X		X		X		X		X			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	X		X		X		X		X		X		X			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	X		X		X		X		X		X		X			
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	X		X		X		X		X		X		X			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	X		X		X		X		X		X		X			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	X		X		X		X		X		X		X			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	X		X		X		X		X		X		X			
FIRMA SUPERVISOR HSE																		
FIRMA OPERADOR																		



Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CUMPLE — C — Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
NO CUMPLE — NC — Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.

CONSORCIO RYP

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR - RANA/ CANGURO

Fecha	Versión	Código	Pagina
2/02/2024	1	CRM-FM-22	1 de 1

PROYECTO: Contrato 2070-2025 Marca
FRENTE: Calle 25 FECHA 29/09 al 04/10/2025 No Serie o identificacion interna

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	X		X		X		X		X		X		X			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
3	BASE DE LA RANA	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	X		X		X		X		X		X		X			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	X		X		X		X		X		X		X			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	X		X		X		X		X		X		X			
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	X		X		X		X		X		X		X			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	X		X		X		X		X		X		X			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	X		X		X		X		X		X		X			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	X		X		X		X		X		X		X			
FIRMA SUPERVISOR HSE																		
FIRMA OPERADOR																		



CUMPLE C
NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.
Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-27 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 01 **AL** 06 **DE** 09/2025 | **EQUIPO N°:** 1 | **LUGAR:** Contrato 2070-2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Revisión visual de la estructura general del equipo	X		X		X		X		X		X		
Nivel de gasolina suficiente para operación	X		X		X		X		X		X		
Nivel de aceite del motor adecuado	X		X		X		X		X		X		
Estado del filtro de aire limpio	X		X		X		X		X		X		
Ausencia de fugas de gasolina o aceite	X		X		X		X		X		X		
Poleas y correas en buen estado (sin desgaste, sin fisuras)	X		X		X		X		X		X		
Protector de faja instalado y funcional	X		X		X		X		X		X		
Sistema de arranque manual funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		
No presenta ruidos ni vibraciones inusuales al operar	X		X		X		X		X		X		
Tolva y tambor limpios, sin restos de concreto adherido	X		X		X		X		X		X		
Ruedas o base en condiciones seguras para operación	X		X		X		X		X		X		
Botón o sistema de parada de emergencia (si aplica)	X		X		X		X		X		X		
Uso de EPP completo por parte del operador	X		X		X		X		X		X		

ANOTACIONES: ✓

Firma responsable							**Nombre:** Oscar Suarez **Cargo:** Maestro **Documento:** 4192543
Firma profesional SST							**Nombre:** Lourdes Herrera **Cargo:** Profesional SST **Documento:** 1015474792









CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-27 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 08 **AL** 13 **DE** 09/2025 | **EQUIPO N°:** 1 | **LUGAR:** Contrato 2070-2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Revisión visual de la estructura general del equipo	X		X		X		X		X		X		
Nivel de gasolina suficiente para operación	X		X		X		X		X		X		
Nivel de aceite del motor adecuado	X		X		X		X		X		X		
Estado del filtro de aire limpio	X		X		X		X		X		X		
Ausencia de fugas de gasolina o aceite	X		X		X		X		X		X		
Poleas y correas en buen estado (sin desgaste, sin fisuras)	X		X		X		X		X		X		
Protector de faja instalado y funcional	X		X		X		X		X		X		
Sistema de arranque manual funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		
No presenta ruidos ni vibraciones inusuales al operar	X		X		X		X		X		X		
Tolva y tambor limpios, sin restos de concreto adherido	X		X		X		X		X		X		
Ruedas o base en condiciones seguras para operación	X		X		X		X		X		X		
Botón o sistema de parada de emergencia (si aplica)	X		X		X		X		X		X		
Uso de EPP completo por parte del operador	X		X		X		X		X		X		

ANOTACIONES: ✓

Firma responsable							**Nombre:** Oscar Suarez **Cargo:** Maestro **Documento:** 4192543
Firma profesional SST							**Nombre:** Ana Fernanda Lanao **Cargo:** Profesional SST. **Documento:** 1015474196







CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-27 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 15 **AL** 20 **DE** 09/2025 | **EQUIPO N°:** 1 | **LUGAR:** Contrato 2070-2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Revisión visual de la estructura general del equipo	X		X		X		X		X		X		
Nivel de gasolina suficiente para operación	X		X		X		X		X		X		
Nivel de aceite del motor adecuado	X		X		X		X		X		X		
Estado del filtro de aire limpio	X		X		X		X		X		X		
Ausencia de fugas de gasolina o aceite	X		X		X		X		X		X		
Poleas y correas en buen estado (sin desgaste, sin fisuras)	X		X		X		X		X		X		
Protector de faja instalado y funcional	X		X		X		X		X		X		
Sistema de arranque manual funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		
No presenta ruidos ni vibraciones inusuales al operar	X		X		X		X		X		X		
Tolva y tambor limpios, sin restos de concreto adherido	X		X		X		X		X		X		
Ruedas o base en condiciones seguras para operación	X		X		X		X		X		X		
Botón o sistema de parada de emergencia (si aplica)	X		X		X		X		X		X		
Uso de EPP completo por parte del operador	X		X		X		X		X		X		

ANOTACIONES: 7

Firma responsable							**Nombre:** Oscar Suarez **Cargo:** Maestro **Documento:** 4192543
Firma profesional SST							**Nombre:** Yeimenda Romero **Cargo:** Profesional SSE **Documento:** 1015421491

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-27 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 22 **AL** 27 **DE** 09/2025 | **EQUIPO N°:** 1 | **LUGAR:** Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Revisión visual de la estructura general del equipo	X		X		X		X		X		X		
Nivel de gasolina suficiente para operación	X		X		X		X		X		X		
Nivel de aceite del motor adecuado	X		X		X		X		X		X		
Estado del filtro de aire limpio	X		X		X		X		X		X		
Ausencia de fugas de gasolina o aceite	X		X		X		X		X		X		
Poleas y correas en buen estado (sin desgaste, sin fisuras)	X		X		X		X		X		X		
Protector de faja instalado y funcional	X		X		X		X		X		X		
Sistema de arranque manual funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		
No presenta ruidos ni vibraciones inusuales al operar	X		X		X		X		X		X		
Tolva y tambor limpios, sin restos de concreto adherido	X		X		X		X		X		X		
Ruedas o base en condiciones seguras para operación	X		X		X		X		X		X		
Botón o sistema de parada de emergencia (si aplica)	X		X		X		X		X		X		
Uso de EPP completo por parte del operador	X		X		X		X		X		X		

ANOTACIONES: 7

Firma responsable							**Nombre:** Oscar Suarez **Cargo:** Maestro **Documento:** 4192543
Firma profesional SST							**Nombre:** Fernando Lemus **Cargo:** Profesional SST **Documento:** 1015471192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-27 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 29/09 **AL** 04/10 **DE** 2025 | **EQUIPO N°:** 1 | **LUGAR:** Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Revisión visual de la estructura general del equipo	X		X		X		X		X		X		
Nivel de gasolina suficiente para operación	X		X		X		X		X		X		
Nivel de aceite del motor adecuado	X		X		X		X		X		X		
Estado del filtro de aire limpio	X		X		X		X		X		X		
Ausencia de fugas de gasolina o aceite	X		X		X		X		X		X		
Poleas y correas en buen estado (sin desgaste, sin fisuras)	X		X		X		X		X		X		
Protector de faja instalado y funcional	X		X		X		X		X		X		
Sistema de arranque manual funciona correctamente	X		X		X		X		X		X		
No presenta ruidos ni vibraciones inusuales al operar	X		X		X		X		X		X		
Tolva y tambor limpios, sin restos de concreto adherido	X		X		X		X		X		X		
Ruedas o base en condiciones seguras para operación	X		X		X		X		X		X		
Botón o sistema de parada de emergencia (si aplica)	X		X		X		X		X		X		
Uso de EPP completo por parte del operador	X		X		X		X		X		X		

ANOTACIONES: Y

Firma responsable							**Nombre:** Oscar Suarez **Cargo:** Maestro **Documento:** 4192543
Firma profesional SST							**Nombre:** Fernanda Ramos **Cargo:** Profesional SST. **Documento:** 1015474191

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 29 / 09 / 2025 al 04 / 10 / 2025 **Placa del Vehículo:** DTS 833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable

Nombre: Manuel Fernando Lareo
Cargo: Pedagogo JSE
Documento: 1015474192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 22 / 09 / 2025 al 27 / 09 / 2025 **Placa del Vehículo:** DTS833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable							**Nombre:** Maria Fernanda **Cargo:** Profesional SST **Documento:** 1015444412

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 01 / 09 / 2025 al 06/09/2025 **Placa del Vehículo:** DTS 833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable

Nombre: Mara Fernanda Romero
Cargo: Profesional SSE
Documento: 1017477192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 15 / 09 / 20__ al 20 / 09 / 2025 **Placa del Vehículo:** DTS833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable							Nombre: Maria Fernanda Romero Cargo: Profesional SST Documento: 1015444492.

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 8 / 9 / 2025 al 13 / 9 / 2025 **Placa del Vehículo:** OTS833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	X	X	X	X	X	X	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	X	X	X	X	X	X	
Espejos y parabrisas sin grietas	X	X	X	X	X	X	
Placas visibles y sin obstrucciones	X	X	X	X	X	X	
Limpiabrisas funcionando correctamente	X	X	X	X	X	X	
Llantas (presión y estado general)	X	X	X	X	X	X	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	X	X	X	X	X	X	
Líquido de frenos	X	X	X	X	X	X	
Refrigerante	X	X	X	X	X	X	
Líquido de dirección hidráulica	X	X	X	X	X	X	
Agua para limpiaparabrisas	X	X	X	X	X	X	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	X	X	X	X	X	X	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	X	X	X	X	X	X	
Tablero sin luces de advertencia activas	X	X	X	X	X	X	
Funcionamiento del freno de mano	X	X	X	X	X	X	
Cinturones de seguridad	X	X	X	X	X	X	
Aire acondicionado / calefacción	X	X	X	X	X	X	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	X	X	X	X	X	X	
Botiquín, extintor y triángulos	X	X	X	X	X	X	

ANOTACIONES:

Firma responsable							**Nombre:** Maria Fernanda Romero **Cargo:** Profesional SST. **Documento:** 1015474492

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 01 **AL** 06 **DE** 09/25 | **EQUIPO N°:** 2 | **PLACA VEHÍCULO:** THZ 021 | **LUGAR:** Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras					X		X		X		X		
	Limpieza general del vehículo					X		X		X		X		
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)					X		X		X		X		
	Retrovisores y parabrisas sin daños					X		X		X		X		
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)					X		X		X		X		
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas					X		X		X		X		
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)					X		X		X		X		
	Bocina					X		X		X		X		
	Freno de servicio y de parqueo					X		X		X		X		
	Cinturón de seguridad					X		X		X		X		
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)					X		X		X		X		
	Espejos ajustados y limpios					X		X		X		X		
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor					X		X		X		X		
	Refrigerante					X		X		X		X		
	Líquido de frenos					X		X		X		X		
	Hidráulico (si aplica)					X		X		X		X		
	Combustible suficiente					X		X		X		X		
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas					X		X		X		X		
	Movimiento de la tolva/volco					X		X		X		X		
	Estado del piso/caja de carga					X		X		X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado					X		X		X		X		
	Botiquín de primeros auxilios					X		X		X		X		
	Triángulos de seguridad					X		X		X		X		
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)					X		X		X		X		

ANOTACIONES: /

Firma responsable			[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	Nombre: Oscar Sarabia Cargo: Operario Documento: 1053808982
Firma profesional SST			[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	Nombre: Mar a Fernanda Ramirez Cargo: Profesional SST Documento: 1054274192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 01 AL 06 DE 09/25	EQUIPO N°: 1	PLACA VEHÍCULO: SOO 022	LUGAR: Contrato 2020 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras					X				X		X		
	Limpieza general del vehículo					X				X		X		
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)					X				X		X		
	Retrovisores y parabrisas sin daños					X				X		X		
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)					X				X		X		
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas					X				X		X		
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)					X				X		X		
	Bocina					X				X		X		
	Freno de servicio y de parqueo					X				X		X		
	Cinturón de seguridad					X				X		X		
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)					X				X		X		
	Espejos ajustados y limpios					X				X		X		
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor					X				X		X		
	Refrigerante					X				X		X		
	Líquido de frenos					X				X		X		
	Hidráulico (si aplica)					X				X		X		
	Combustible suficiente					X				X		X		
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas					X				X		X		
	Movimiento de la tolva/volco					X				X		X		
	Estado del piso/caja de carga					X				X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado					X				X		X		
	Botiquín de primeros auxilios					X				X		X		
	Triángulos de seguridad					X				X		X		
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)					X				X		X		

ANOTACIONES:

Firma responsable								Nombre: Nelson Camargo Cargo: Operario Documento: 74359489
Firma profesional SST								Nombre: Yeyvada Nayer Cargo: Profesional SST Documento: 1015424792

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 08 AL 13 DE 09/2025	EQUIPO N°: 2	PLACA VEHÍCULO: TH2021	LUGAR: Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras	X		X		X				X				
	Limpieza general del vehículo	X		X		X				X				
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)	X		X		X				X				
	Retrovisores y parabrisas sin daños	X		X		X				X				
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)	X		X		X				X				
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas	X		X		X				X				
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)	X		X		X				X				
	Bocina	X		X		X				X				
	Freno de servicio y de parqueo	X		X		X				X				
	Cinturón de seguridad	X		X		X				X				
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)	X		X		X				X				
	Espejos ajustados y limpios	X		X		X				X				
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor	X		X		X				X				
	Refrigerante	X		X		X				X				
	Líquido de frenos	X		X		X				X				
	Hidráulico (si aplica)	X		X		X				X				
	Combustible suficiente	X		X		X				X				
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas	X		X		X				X				
	Movimiento de la tolva/volco	X		X		X				X				
	Estado del piso/caja de carga	X		X		X				X				
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado	X		X		X				X				
	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X				X				
	Triángulos de seguridad	X		X		X				X				
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)	X		X		X				X				

ANOTACIONES:

Firma responsable	Carlos Rueda	Carlos Rueda	Carlos Rueda		Carlos Rueda		Nombre: Carlos Sanabria Cargo: operario Documento: 1053608962
Firma profesional SST							Nombre: Maria Fernanda Arias Cargo: Profesional SST Documento: 1054441912

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 15 AL 20 DE 09/2025	EQUIPO N°: 1	PLACA VEHÍCULO: SOO 022	LUGAR: Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras					X		X		X				
	Limpieza general del vehículo					X		X		X				
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)					X		X		X				
	Retrovisores y parabrisas sin daños					X		X		X				
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)					X		X		X				
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas					X		X		X				
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)					X		X		X				
	Bocina					X		X		X				
	Freno de servicio y de parqueo					X		X		X				
	Cinturón de seguridad					X		X		X				
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)					X		X		X				
	Espejos ajustados y limpios					X		X		X				
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor					X		X		X				
	Refrigerante					X		X		X				
	Líquido de frenos					X		X		X				
	Hidráulico (si aplica)					X		X		X				
	Combustible suficiente					X		X		X				
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas					X		X		X				
	Movimiento de la tolva/volco					X		X		X				
	Estado del piso/caja de carga					X		X		X				
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado					X		X		X				
	Botiquín de primeros auxilios					X		X		X				
	Triángulos de seguridad					X		X		X				
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)					X		X		X				

ANOTACIONES: ✓

Firma responsable							Nombre: Nelson Camargo Cargo: Operario Documento: 74359489
Firma profesional SST							Nombre: Fernanda Lemos Cargo: Profesional SST Documento: 1057474192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 15 AL 20 DE 09/2025	EQUIPO N°: 2	PLACA VEHÍCULO: THZ 021	LUGAR: Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras					X		X		X		X		
	Limpieza general del vehículo					X		X		X		X		
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)					X		X		X		X		
	Retrovisores y parabrisas sin daños					X		X		X		X		
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)					X		X		X		X		
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas					X		X		X		X		
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)					X		X		X		X		
	Bocina					X		X		X		X		
	Freno de servicio y de parqueo					X		X		X		X		
	Cinturón de seguridad					X		X		X		X		
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)					X		X		X		X		
	Espejos ajustados y limpios					X		X		X		X		
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor					X		X		X		X		
	Refrigerante					X		X		X		X		
	Líquido de frenos					X		X		X		X		
	Hidráulico (si aplica)					X		X		X		X		
	Combustible suficiente					X		X		X		X		
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas					X		X		X		X		
	Movimiento de la tolva/volco					X		X		X		X		
	Estado del piso/caja de carga					X		X		X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado					X		X		X		X		
	Botiquín de primeros auxilios					X		X		X		X		
	Triángulos de seguridad					X		X		X		X		
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)					X		X		X		X		

ANOTACIONES:

Firma responsable							Nombre: Carlos Sanabria Cargo: operario Documento: 1053668962
Firma profesional SST							Nombre: Hugo Fernando Roman Cargo: profesional SST Documento: 1053471492.

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 22 AL 27 DE 09/2025	EQUIPO N°: 1	PLACA VEHÍCULO: SQO 022	LUGAR: Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras	X								X		X		
	Limpieza general del vehículo	X								X		X		
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)	X								X		X		
	Retrovisores y parabrisas sin daños	X								X		X		
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)	X								X		X		
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas	X								X		X		
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)	X								X		X		
	Bocina	X								X		X		
	Freno de servicio y de parqueo	X								X		X		
	Cinturón de seguridad	X								X		X		
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)	X								X		X		
	Espejos ajustados y limpios	X								X		X		
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor	X								X		X		
	Refrigerante	X								X		X		
	Líquido de frenos	X								X		X		
	Hidráulico (si aplica)	X								X		X		
	Combustible suficiente	X								X		X		
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas	X								X		X		
	Movimiento de la tolva/volco	X								X		X		
	Estado del piso/caja de carga	X								X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado	X								X		X		
	Botiquín de primeros auxilios	X								X		X		
	Triángulos de seguridad	X								X		X		
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)	X								X		X		

ANOTACIONES:

Firma responsable								Nombre: Nelson Camargo. Cargo: [illegible] Documento: 74355469
Firma profesional SST								Nombre: Yara Fernanda Romero Cargo: Profesional SST Documento: 1074741492

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 22 AL 27 DE 09/2025	EQUIPO N°: 2	PLACA VEHÍCULO: THZ 021	LUGAR: Contrato 2070 - 2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras	X		X		X		X		X		X		
	Limpieza general del vehículo	X		X		X		X		X		X		
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)	X		X		X		X		X		X		
	Retrovisores y parabrisas sin daños	X		X		X		X		X		X		
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)	X		X		X		X		X		X		
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas	X		X		X		X		X		X		
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)	X		X		X		X		X		X		
	Bocina	X		X		X		X		X		X		
	Freno de servicio y de parqueo	X		X		X		X		X		X		
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)	X		X		X		X		X		X		
	Espejos ajustados y limpios	X		X		X		X		X		X		
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor	X		X		X		X		X		X		
	Refrigerante	X		X		X		X		X		X		
	Líquido de frenos	X		X		X		X		X		X		
	Hidráulico (si aplica)	X		X		X		X		X		X		
	Combustible suficiente	X		X		X		X		X		X		
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas	X		X		X		X		X		X		
	Movimiento de la tolva/volco	X		X		X		X		X		X		
	Estado del piso/caja de carga	X		X		X		X		X		X		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado	X		X		X		X		X		X		
	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X		
	Triángulos de seguridad	X		X		X		X		X		X		
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)	X		X		X		X		X		X		

ANOTACIONES:

Firma responsable	Carlos Alberto Sanchez	Carlos Alberto	Carlos Alberto	Carlos Alberto	Carlos Alberto	Carlos Alberto	Nombre: Carlos Sanchez. Cargo: Operario. Documento: 1053608962
Firma profesional SST							Nombre: Yuna Lemuda Lareo Cargo: Profesional SST Documento: 1015474192.

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 29/09 AL 04/10 DE 2025	EQUIPO N°: 1	PLACA VEHÍCULO: SOO 022	LUGAR: Contrato 2070-2025

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras	X		X		X		X		X				
	Limpieza general del vehículo	X		X		X		X		X				
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)	X		X		X		X		X				
	Retrovisores y parabrisas sin daños	X		X		X		X		X				
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)	X		X		X		X		X				
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas	X		X		X		X		X				
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)	X		X		X		X		X				
	Bocina	X		X		X		X		X				
	Freno de servicio y de parqueo	X		X		X		X		X				
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X				
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)	X		X		X		X		X				
	Espejos ajustados y limpios	X		X		X		X		X				
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor	X		X		X		X		X				
	Refrigerante	X		X		X		X		X				
	Líquido de frenos	X		X		X		X		X				
	Hidráulico (si aplica)	X		X		X		X		X				
	Combustible suficiente	X		X		X		X		X				
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas	X		X		X		X		X				
	Movimiento de la tolva/volco	X		X		X		X		X				
	Estado del piso/caja de carga	X		X		X		X		X				
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado	X		X		X		X		X				
	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X		X		X				
	Triángulos de seguridad	X		X		X		X		X				
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)	X		X		X		X		X				

ANOTACIONES: 7

Firma responsable						Nombre: Nelson Camargo Cargo: Coordinador Documento: 74351489
Firma profesional SST						Nombre: Yara Lizeth Moreno Cargo: Profesional SST Documento: 1057474592

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Profesional SST

Fecha de la inspección: 01/09/2025 al 06/09/2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Ignacio Romero

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Profesional SST

Fecha de la inspección: 08 al 13 de 09/2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Profesional SST

Fecha de la inspección: 22 al 27 de Septiembre del 2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Profesional SST

Fecha de la inspección: 15 al 20 de Septiembre del 2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:



CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Profesional SST


Fecha de la inspección: 29/09 al 04/10 del 2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:




CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-20 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°:	Inspección del: 01/09 al 06/09 de 2025	Placa vehículo: 420 D	Lugar: Calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de fluidos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de mangueras y conexiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Correas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Batería (terminales y fijación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llantas u orugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Sistema hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos y parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces (delanteras y traseras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpiabrisas (si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Documentación vigente del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Elementos de emergencia (extintor, kit)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Prueba de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Funcionamiento de controles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		



Anotaciones:

Firma responsable							Nombre: Italo Saravia Documento:
Firma profesional SST							Nombre: Yuna Fernanda Ramos Documento: 1015474497

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-20 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°: 1 **Inspección del:** 08/09 **al** 13/09 **de** 2025 **Placa vehículo:** 420D **Lugar:** Calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Fugas de fluidos	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Estado de mangueras y conexiones	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Correas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Batería (terminales y fijación)	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Llantas u orugas	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Sistema hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Espejos y parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Luces (delanteras y traseras)	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Bocina	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Limpiabrisas (si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Documentación vigente del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Elementos de emergencia (extintor, kit)	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Prueba de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		-		
Funcionamiento de controles	✓		✓		✓		✓		✓		-		

Anotaciones:

Firma responsable						**Nombre:** Italo Sanabria **Documento:** 1053610043
Firma profesional SST						**Nombre:** Maria Fernanda Romero **Documento:** 1015424497

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0526-20
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°: 1 **Inspección del:** 15/09 **al** 20/09 **de** 2025 **Placa vehículo:** 420 D **Lugar:** calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓				✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante					✓		✓		✓		✓		
Nivel de combustible					✓		✓		✓		✓		
Fugas de fluidos					✓		✓		✓		✓		
Estado de mangueras y conexiones					✓		✓		✓		✓		
Correas del motor					✓		✓		✓		✓		
Batería (terminales y fijación)					✓		✓		✓		✓		
Llantas u orugas					✓		✓		✓		✓		
Freno de parqueo					✓		✓		✓		✓		
Sistema hidráulico					✓		✓		✓		✓		
Espejos y parabrisas					✓		✓		✓		✓		
Luces (delanteras y traseras)					✓		✓		✓		✓		
Bocina					✓		✓		✓		✓		
Limpiabrisas (si aplica)					✓		✓		✓		✓		
Documentación vigente del equipo					✓		✓		✓		✓		
Elementos de emergencia (extintor, kit)					✓		✓		✓		✓		
Prueba de encendido					✓		✓		✓		✓		
Funcionamiento de controles					✓		✓		✓		✓		

Anotaciones:

Firma responsable							Nombre: Italo Somoza Ríos Documento: 1053610045
Firma profesional SST							Nombre: Mana Fernando Romero Documento: 1015474192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-20 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°: 1 **Inspección del:** 22/09 **al** 27/09 **de** 2025 **Placa vehículo:** 420D **Lugar:** Calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de fluidos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de mangueras y conexiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Correas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Batería (terminales y fijación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llantas u orugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Sistema hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos y parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces (delanteras y traseras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpiabrisas (si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Documentación vigente del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Elementos de emergencia (extintor, kit)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Prueba de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Funcionamiento de controles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Anotaciones:

Firma responsable							**Nombre:** Todos somos 10 **Documento:** 1053810043
Firma profesional SST							**Nombre:** Maria Fernanda Lemus. **Documento:** 1015474191

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-20 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°: 1 **Inspección del:** 29/09 **al** 04/10 **de** 2025 **Placa vehículo:** 420 D **Lugar:** Calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓						
Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓						
Fugas de fluidos	✓				✓		✓						
Estado de mangueras y conexiones	✓		✓		✓		✓						
Correas del motor	✓		✓		✓		✓						
Batería (terminales y fijación)	✓		✓		✓		✓						
Llantas u orugas	✓		✓		✓		✓						
Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓						
Sistema hidráulico	✓		✓		✓		✓						
Espejos y parabrisas	✓		✓		✓		✓						
Luces (delanteras y traseras)	✓		✓		✓		✓						
Bocina	✓		✓		✓		✓						
Limpiabrisas (si aplica)	✓		✓		✓		✓						
Documentación vigente del equipo	✓		✓		✓		✓						
Elementos de emergencia (extintor, kit)	✓		✓		✓		✓						
Prueba de encendido	✓		✓		✓		✓						
Funcionamiento de controles	✓		✓		✓		✓						

Anotaciones:

Firma responsable							**Nombre:** Italo Sandoval **Documento:** 1083610243
Firma profesional SST							**Nombre:** Maria Fernanda Roman **Documento:** 1015474192

INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	FORMATO ORDEN Y ASEO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-17
		VERSIÓN: V-00
		Página: 1 de 1

Proyecto: (Indique con X según corresponda)	SI (X)	NO ( )	Lugar / Proyecto:	Contrato 2070 de 2025.
Área a inspeccionar:	Frente de obra.		Fecha de inspección:	19-09-25
Responsable:	Fernanda Romero.		Cargo:	Profesional SST

INDICADOR A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La oficina / contenedor se encuentra aseado y ordenado.	X			
Las herramienta y equipos se encuentran almacenados en el sitio demarcado y señalizado para ello.	X			
El sitio donde se ejecutan labores / área de trabajo se encuentran aseadas y ordenadas.	X			
Los baños se encuentran aseados, limpios, libres de olores desagradables y con los accesorios y utencilios necesarios para su uso.	X			
Los elementos de protección personal asignados a cada uno de los empleados se encuentran limpios.	X			
Los cajones se encuentran ordenados y aseados.	X			
Los materiales se encuentran almacenados de forma correcta (Menos de 1,60 mts de altura si está apilado), ubicado en estantes, sitio de almacenamiento limpio, ordenado, señalizado, demarcado.	X			
Se evidencia señalización y demarcación de **áreas, senderos peatonales, espacios** de trabajo, peligros, riesgos.	X			
Las rutas de evacuación se encuentran limpias **y libres de obstáculos.**	X			
Los pisos se encuentran aseados, secos y **libres de objetos.**	X			
No se evidencia comida en las áreas de trabajo.		X		
Las ventanas están limpias, libres de polvo **o suciedad y permiten la entrada de luz** natural	X			
Las paredes están limpias, su pintura en buen estado y sin desgastes de ninnguna clase.	X			
Se evidencia desprendimiento o cualquier daño o deterioro en los techos.		X		
Los cables y enchufes se encuentran organizados, en buen estado, y no representan un peligro de caída, incendio o cualquier otro accidente.	X			
La oficina se encuentra libre de cinta peligro en el piso, garantizando áreas organizadas.	X			
El personal cuenta con vestimenta limpia, adecuada, buen aseo personal y buenas prácticas de aseo.	X			
Las áreas de disposición de residuos se encuentran en puntos específicos y estratégicos, con los residuos dispuestos de manera correcta. Además son entregados al vehículo recolector de acuerdo al día, horario y ruta establecida para el sector.	X			
Existe un archivo para organizar la documentación de la empresa y este, se encuentra totalmente ordenado.	X			

PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL SST
	Fernanda Romero

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	Fernanda Romero.				
DOCUMENTO:	1015474192 de Bogotá	**CARGO:**	Profesional SST.		
SST	(X)	**AMBIENTAL:**	( )	**FECHA:**	09-SEP-25
TEMA:	Riesgos básicos para la seguridad eléctrica.			**DURACIÓN:**	1/2 hora.

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
John Guillermo Diaz S.	1058274476	
Domingo Avello	7435 1038	
Alfonso Avella .O	1007305445	Alfonso
Oscar Mauricio Suarez	1192543	
Jorge Luis Benavides	1053 608 937	
Gilbert Javier Benavides	1053615359	Gilbert Benavides
Jorge eliecer suarez avella	1053670946	Jorge Suarez
Jeyson Alexander Martinez Pinzon	1023615447	
Yeison Javier Martinez Moreno	1054146089	
Brayan Guerrero Suarez	1053606607	Brayan

OBSERVACIONES: ———

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernanda Romero.
Documento: 1015474192 de Bogotá.

CONSORCIO RYP	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	Fernanda Romero.				
DOCUMENTO:	1015474192 de Bogotá	**CARGO:**	Profesional ambiental.		
SST	(x)	**AMBIENTAL:**	( )	**FECHA:**	30-Sept-25
TEMA:	Posturas inadecuadas.			**DURACIÓN:**	1/2 hora.

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
Alfonso Avella. O	1007305445	Alfonso
Gilbar Javier Bonavides	1053613359	Gilbar Bonavides
Dilan steven Rios APonte	1000212908	Dilan steven Rios
Jorge eliecer suarez	7253670648	Jorge Suarez
Yorsen Sneyder Martinez Molano	1054146084	
Brayan Guerrero suarez	1053606607	Brayan
Moises CAMACHO FONSECA	74324374	
Ana Iris Rodriguez Ochoa	1053607984	Ana Iris
Yaneth Ruiz Melo	1053611754	Yaneth Ruiz M.
John Guillermo Diaz S.	1018244476	
OMAR ORLANDO ESCAMILLA SILVA	1090483658	OMAR ESCAMILLA.
Oscar Mauricio Suarez	1192543	
DOMINIA VELLO	74324374	
Claudia Patricia Castiblanco Santos	1053 616291	Claudia Castiblanco

OBSERVACIONES: —

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernanda Romero.
Documento: 1015474192 de Bogotá

ANEXO NO.08.4.
ANEXOS COMPONENTE SOCIAL

UNION TEMPORAL
LAFER

BITÁCORA DE PQR'S

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	FORMATO DE PQRS (PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA)	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-00
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A quien corresponda,

Yo, _____, identificado/a con cédula de ciudadanía No. _____, de _____, con teléfono N° _____, y correo electrónico _____, en calidad de _____, me permito presentar la siguiente novedad a CONSORCIO RYP:

- **Tipo de PQRS: (marque una X en la casilla según corresponda su novedad)**

PETICIÓN		QUEJA		RECLAMO		SUGERENCIA	

- **Motivo o asunto: (Descripción breve de lo que trata la PQRS)**

_____

_____

Descripción detallada:

MEDIANTE LA PRESENTE, SE REPORTA QUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 NO SE PRESENTARON PQRS POR PARTE DE LA COMUNIDAD O ALGUNA DE LAS PARTES INTERESADAS. POR LO QUE SE DA CIERRE DE LA BITACORA PARA ESE PERIODO.

Solución o respuesta esperada:

_____

_____

Sin más en particular, quedo atento/a, a una pronta respuesta y/o solución.

Atentamente,

RODRIGO MENDIVELSO
PROFESIONAL AMBIENTAL.

NOTA: Se informa que el plazo para proporcionar una respuesta a cualquier es de quince (15) días hábiles. En caso de ser necesario un plazo adicional, este podrá ser prorrogado por un período de quince (15) días hábiles adicionales, notificándose dicha ampliación antes del vencimiento del plazo inicial. Esta extensión será otorgada exclusivamente cuando sea necesario recabar pruebas adicionales o completar información relevante para la correcta resolución de la solicitud.

ACTAS DE VECINDAD

UNION TEMPORAL

LAFER

COSTADO DERECHO 124000 80

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 3

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario (de (CAIS)

Dirección N° De pisos:

Teléfono Estrato:

long. Del frente (m)

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua			NO se evidencia
alcantarillado			NO se evidencia
energia			NO se evidencia
telefono			NO se evidencia
gas			no se evidencia
otros			

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bioque		ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas			otra
puertas		numero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos							

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	FECHA: 24/Jul/2019

Lote con cerramiento en poste de madera y alambre de pues, en estado regular, con presencia de arbonzación y presencia de ganado.

Se desconoce si el lote cuenta con conexiones a servicios públicos.


PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°__3__

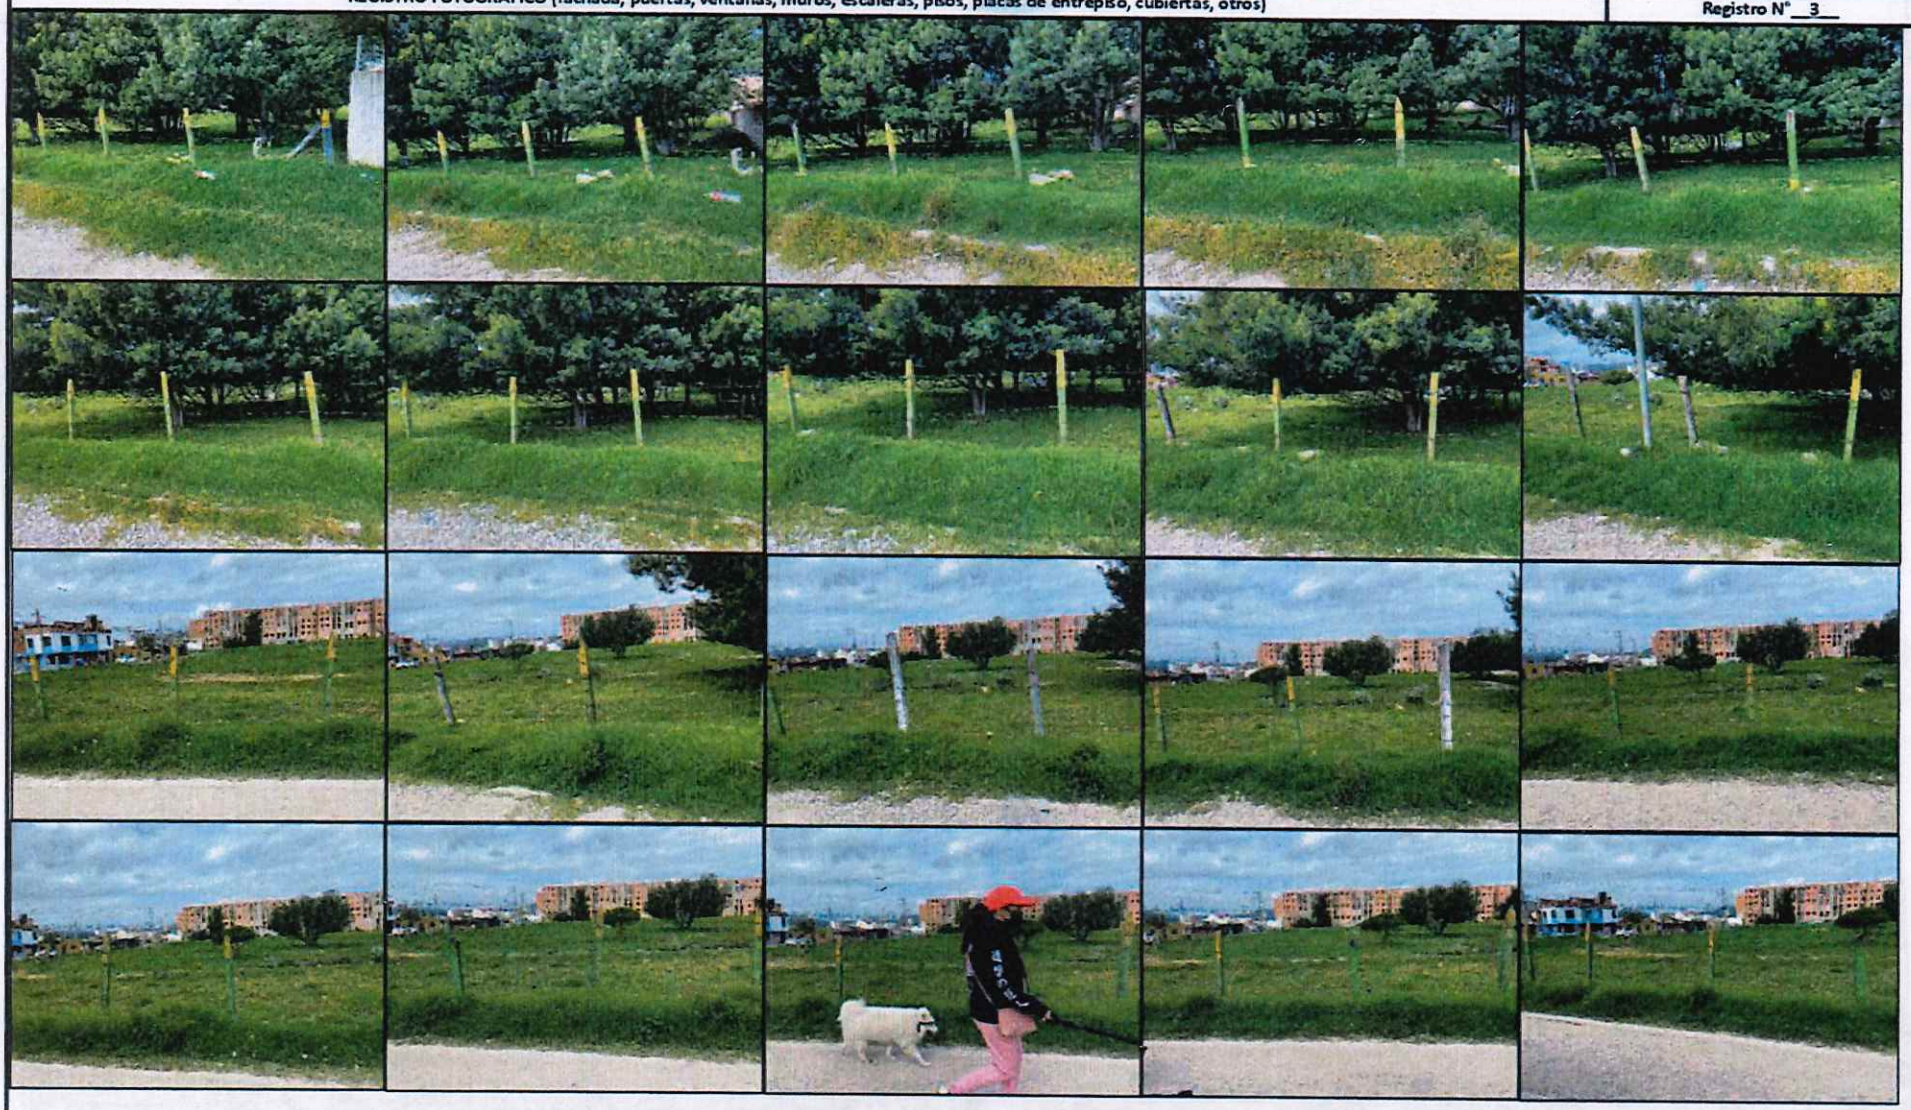

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°__3__



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 4

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Fernando Collado
Dirección: Calle 25
Teléfono: 3112624933
long. Del frente (m):
N° De pisos: 1
Estrato: 3

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua	X		
alcantarillado	X		
energia	X		
telefono		X	
gas	X		
otros			

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial	X	Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto	X	mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bloque	X	ladrillo			otra
puertas	1	madera	X	metalicas			otra
~~puertas~~ Ventanas	5	numero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	FECHA: 24/Jul/2019

Se adelanta predio con local comercial (Restaurante "La Cuesta Prado") el cual cuenta con un ingreso peatonal, dos ventanales en vidrio, un ventanal dividido en 3 con vidrios. El restaurante es de un piso. El frente cuenta con baldosa la cual se encuentra en buen estado, también presenta pintura con desgaste.
La entrada cuenta con una entrada en rampa y dos ventanas.
El piso se encuentra en ladrillo el cual se encuentra en mal estado (Desgastado)
El techo de la entrada se encuentra en teja y madera, con bombillas como decoración.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


Registro N° 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)



Registro N°__4__









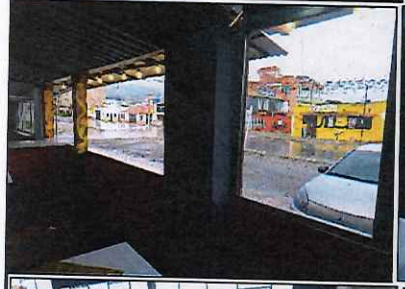








REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N°__4__



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°__4__









GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 5

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Sandra Convelor Niño

Dirección: Calle 25 # 12-47

Teléfono: 3105581558 N° De pisos: 2

long. Del frente (m): Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua	X		
alcantarillado	X		
energia	X		
telefono	X		
gas	X		
otros	X		internet

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial	X	Baldio			
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.			
Sin edificar		Institucional					
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	X	concreto	X	mamposteria		prefabricado		otra	
paredes		bloque	X	ladrillo				otra	
puertas	X	madera	X	metalicas				otra	
puertas		numero	3	calle	2	internas	1	garaje	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	X
N° de pisos	2								

(5)

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

1 local: local comercial correspondiente a restaurante de comidas rápidas - muros en mampostería, estucados, blanco, puertas y ventanas en vidrio, sin acceso vehicular, con presencia de polvaduras en el estuco, letrero, cubierta metálica con ampliación en madera teja en eternit -

2 local: Con muros en mampostería, estucado blanco, con puerta en madera sin afectaciones, ventana con vidrio en buenas condiciones, cubierta metálica con teja en eternit y balcón con carpa, con presencia de huecos y deterioro, letrero en madera en buenas condiciones. En la zona frontal el piso exterior en baldosa, presenta grietas y afectación por interperismo. Fachada con grietas verticales en general.

3 local: local comercial con muros en mampostería, sin grietas, piso en tableta sin presencia de afectación, puerta en vidrio en buenas condiciones, en la fachada se evidencia desprendimiento de estuco en la parte inferior del escalón.

4 local: Local comercial con muros en enchape, sin grietas, pisos en tableta con regatas para punto de gas, mesón enchapado sin grietas, techo en drywall, con terraza a nivel en concreto para disposición de mesas, con 2 contadores y ventanas sin vidrio, con protección en lámina metálica.

General -> Estructura de 2 pisos en el primero cuenta con 4 locales comerciales descritos anteriormente y en el segundo piso se observa ventanal el cual se encuentra con daño evidente, según la dueña, este fue generado por la obra de la vía ejecutada anteriormente. Por lo anterior, la señora Sandra manifiesta no firmar el acta y solicita generar una póliza de responsabilidad civil extra contractual para dicho elemento afectado.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°__5__



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°__5__



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°__5__





















GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 14

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario
Dirección Calle 25 # 11-35
Teléfono
long. Del frente (m)
N° De pisos:
Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bloque		ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas			otra
puertas		numero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos							

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con cerramiento en muros en ladrillo y enchape en Piedra, con Presencia de grietas en el mismo, se evidencia cubierta en madera y teja de barro con Presencia de zonas de caida de tejas

Portan en madera, Presenta afectación por intemperismo y el mismo se encuentra desajustado.

Acceso en Piedra pegada con Presencia de grietas.

se desconocen las condiciones a los puntos de servicios públicos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA


REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 11



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 11

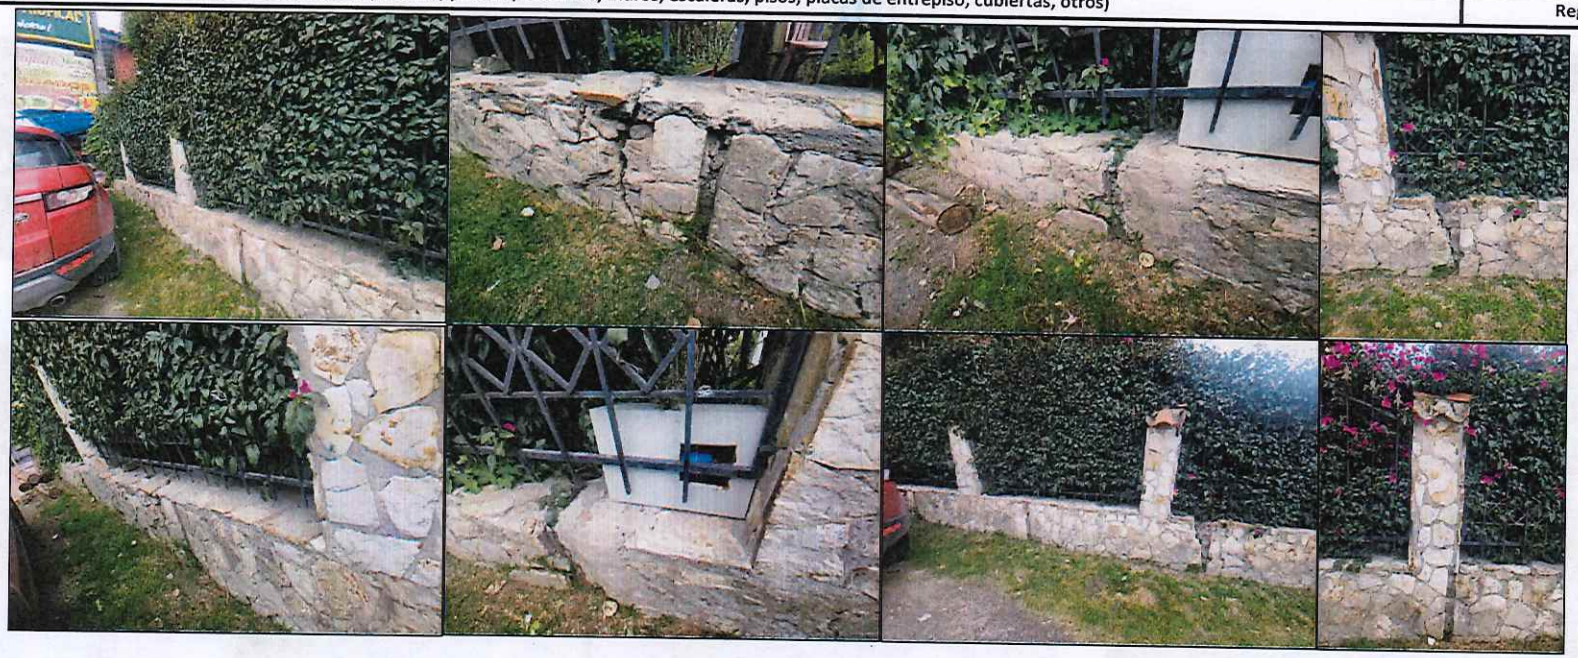

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 23

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 #8-03

Teléfono N° De pisos: 1

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		—	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	X
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bloque		ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas			otra
puertas		ñumero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos							

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda en aparente estado de abandono, presenta daños en fachada debido a intemperismo y vandalismo

Con piso exterior en baldosa de gres con presencia de daños considerables

Puertas metálicas con vidrios y ventanas afectadas

En estado de abandono

Se encuentra elemento en concreto con forma de estanque y/o matera con presencia de aguas lluvias estancadas y basura alrededor de la misma.

No se constata puntos de servicios públicos activos.

PROPIETARIO | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 28



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 28



Rustico.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 3637

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección C25 6A 21 Br Villa Bracamo

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato: 3

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial		Baldio			
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.			
Sin edificar	X	Institucional					
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metalicas				otra	
puertas		numero		calle		internas		garaje	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	
N° de pisos									

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote con cerramiento en varas de madera y alambre de pua, con presencia de estructura para instalación de vallas, sin presencia de pastos uniformes. con presencia de material granular.

Se desconoce si el predio cuenta con conexiones a servicios públicos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 36 - 37















126 00 240

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 43

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 # 5-90

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		—	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	
paredes		bloque		ladrillo			
puertas		madera		metalicas			
puertas		numero		calle		internas	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	
N° de pisos							

otra		otra	
otra		otra	
otra		garaje	
otra		otra	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote con cerramiento en cerca con postes en concreto y alambre de puas, en buenas condiciones, con portón metálica torcido y con afectación es por intemperismo sin manejo de pastos, y con presencia de material granular

se desconoce si el lote cuenta con conexión de servicios públicos

PROPIETARIO


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 43



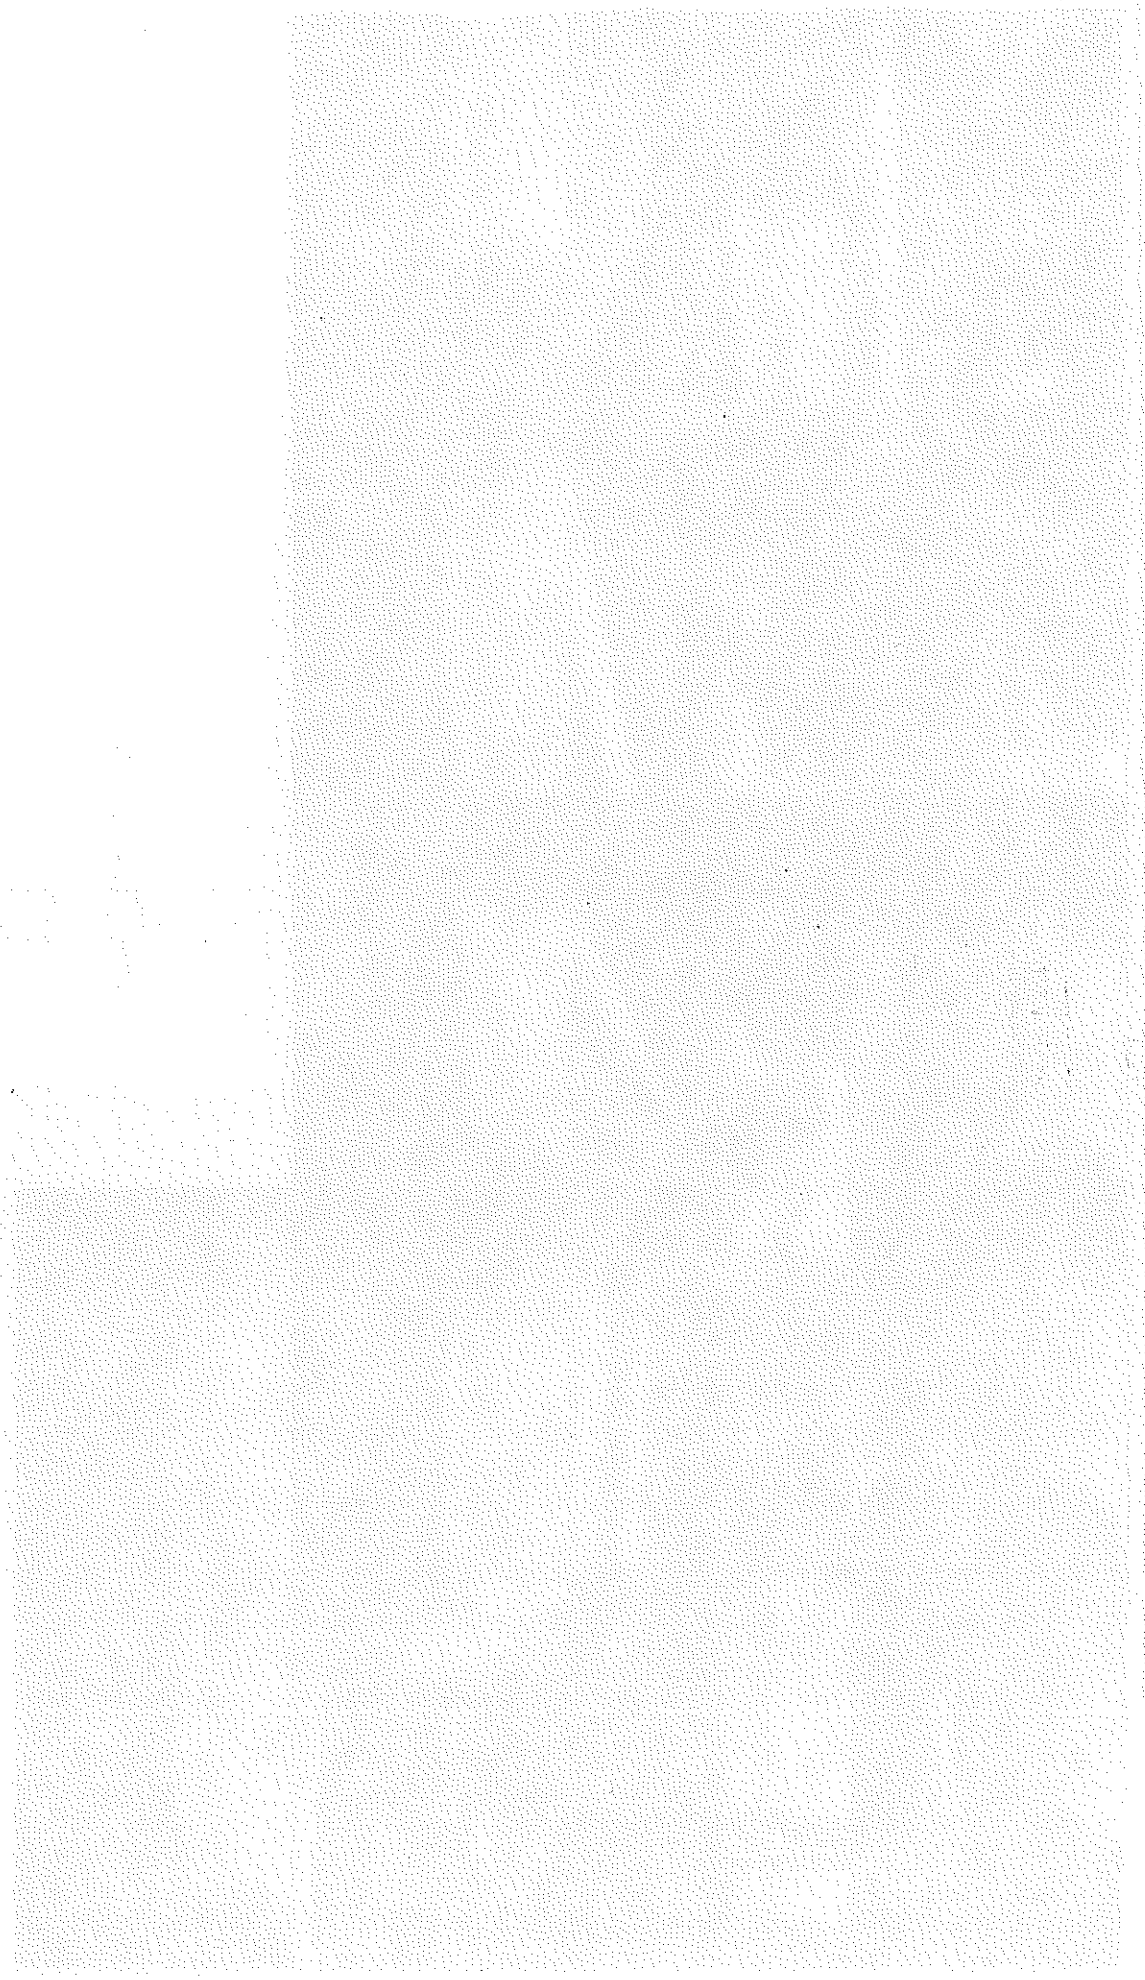

1260070

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 51

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Lote Barno Vila Panorama

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial		Baldio			
Valor intermedio		Oficinas		inst. educacion Sup.			
Sin edificar	X	Institucional					
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metalicas				otra	
puertas		numero		calle		internas		garaje	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	
N° de pisos									

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote con cerramiento en cerca con postes en madera y alambre de puas, en condiciones regulares, sin manejo de pastos.

Se desconoce si el lote cuenta con conexión de servicios públicos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 51











126 0080

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	CTO N°2070/2025	FECHA	22/04/2025
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
ELABORÓ		REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 52

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 #5-80

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bloque		ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas			otra
puertas		numero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos							

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote sin edificar con cerramiento en cerca con postes en madera y alambre de pua, puerta metálica en malas condiciones, con presencia de arborización, sin manejo de pastos.

Se desconoce si el lote cuenta con conexiones a servicios públicos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 52










GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 55

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Cadiyan catalina 01000000126001000000000000

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial		Baldio			
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.			
Sin edificar	X	Institucional					
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metalicas				otra	
puertas		numero		calle		internas		garaje	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	
N° de pisos									

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote con cerramiento en tapia blanca, en estado regular.
Se descaroca y el lote cuenta con conexiones a servicios publicos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 55







1260074

GOBERNACION DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 58

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 #6-56 Lote 17

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	
paredes		bloque		ladrillo			
puertas		madera		metalicas			
puertas		numero		calle		internas	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	
N° de pisos							

otra		otra	
		otra	
		otra	
		garaje	
		otra	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote sin edificar con cerramiento en cercas con poste de madera y alambre de pucas, en buenas condiciones, sin manejo de pastos.


Se desconoce si el lote cuenta con conexiones a servicios públicos

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 58

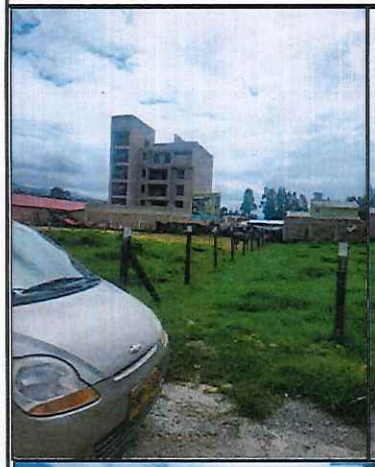










1260078

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	CTO N°2070/2025	FECHA	22/04/2025
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
ELABORÓ		REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 63

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 # 6A-32 Lote 22

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	concreto		mamposteria		prefabricado	otra	
paredes	bloque		ladrillo			otra	
puertas	madera		metalicas			otra	
puertas	numero		calle		internas	garaje	
cubierta	concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra	
N° de pisos							

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote con cerramiento en cerca con postes en madera y alambre de puas, actualmente utilizado como parqueadero

Se desconoce si el predio cuenta con conexión a servicios públicos

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 63














1260079

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 64

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 #6A-46 lote 23

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bloque		ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas			otra
puertas		numero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos							

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote sin edificar con cercamiento en cerca con postes en madera y alambre de pucs en mal estado, sin manejo de pastos

Se desconoce si el predio cuenta con conexión a servicios públicos

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 64







1270020

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 71

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario

Dirección Calle 25 # 10-38

Teléfono N° De pisos:

long. Del frente (m) Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar	X	Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metalicas				otra	
puertas		numero		calle		internas		garaje	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	
N° de pisos									

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote sin edificar con cerramiento en cerca con postes de madera en mal estado, alambre de puas oxidado

El nivel del lote se encuentra muy por debajo del nivel de la vía.
Con existencia de especimenes arbóreos y pastos sin mantenimiento

Se desconoce existencia de conexiones a servicios públicos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 71



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N°__71___



















Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 72

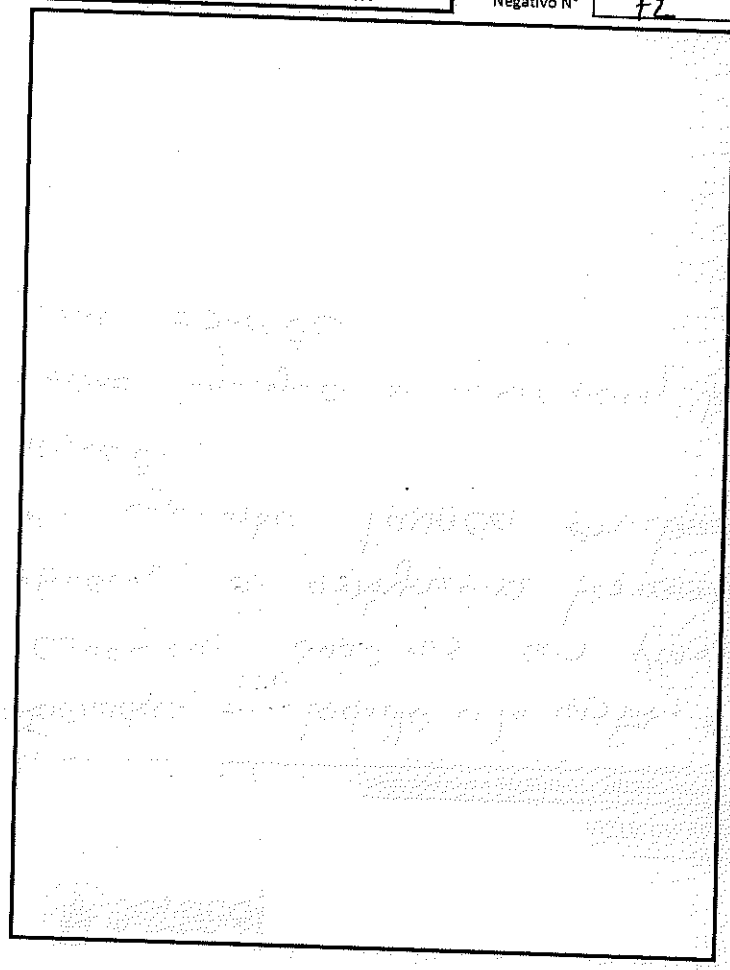

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Policarpo Molano Granados
Dirección: Calle 25 No 12-46
Teléfono: 312 479 8978
long. Del frente (m):
N° De pisos: 1
Estrato: 3

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua	X		
alcantarillado	X		
energia	X		
telefono		X	
gas	X		
otros			

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria	X	prefabricado		otra	
paredes	X	bloque		ladrillo	X			otra	
puertas	X	madera		metalicas	X			otra	
puertas	X	numero		calle		internas	X	garaje	
cubierta	X	concreto		teja acrilica	X	asbesto cem.	X	otra	
N° de pisos									

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


- Fachadas en ladrillo a la vista, antejardin en ladrillo a la vista con reja en barras cuadradas, jardines con plantas ornamentales.
- Andenes de antejardin terminados en concreto y tableta de gres con divisiones en gravilla lavada en buen estado. Bodillos en concreto en mal estado.
- Lote contiguo a vivienda, terminado de cercas en alambre de púas en mal estado.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N° 72

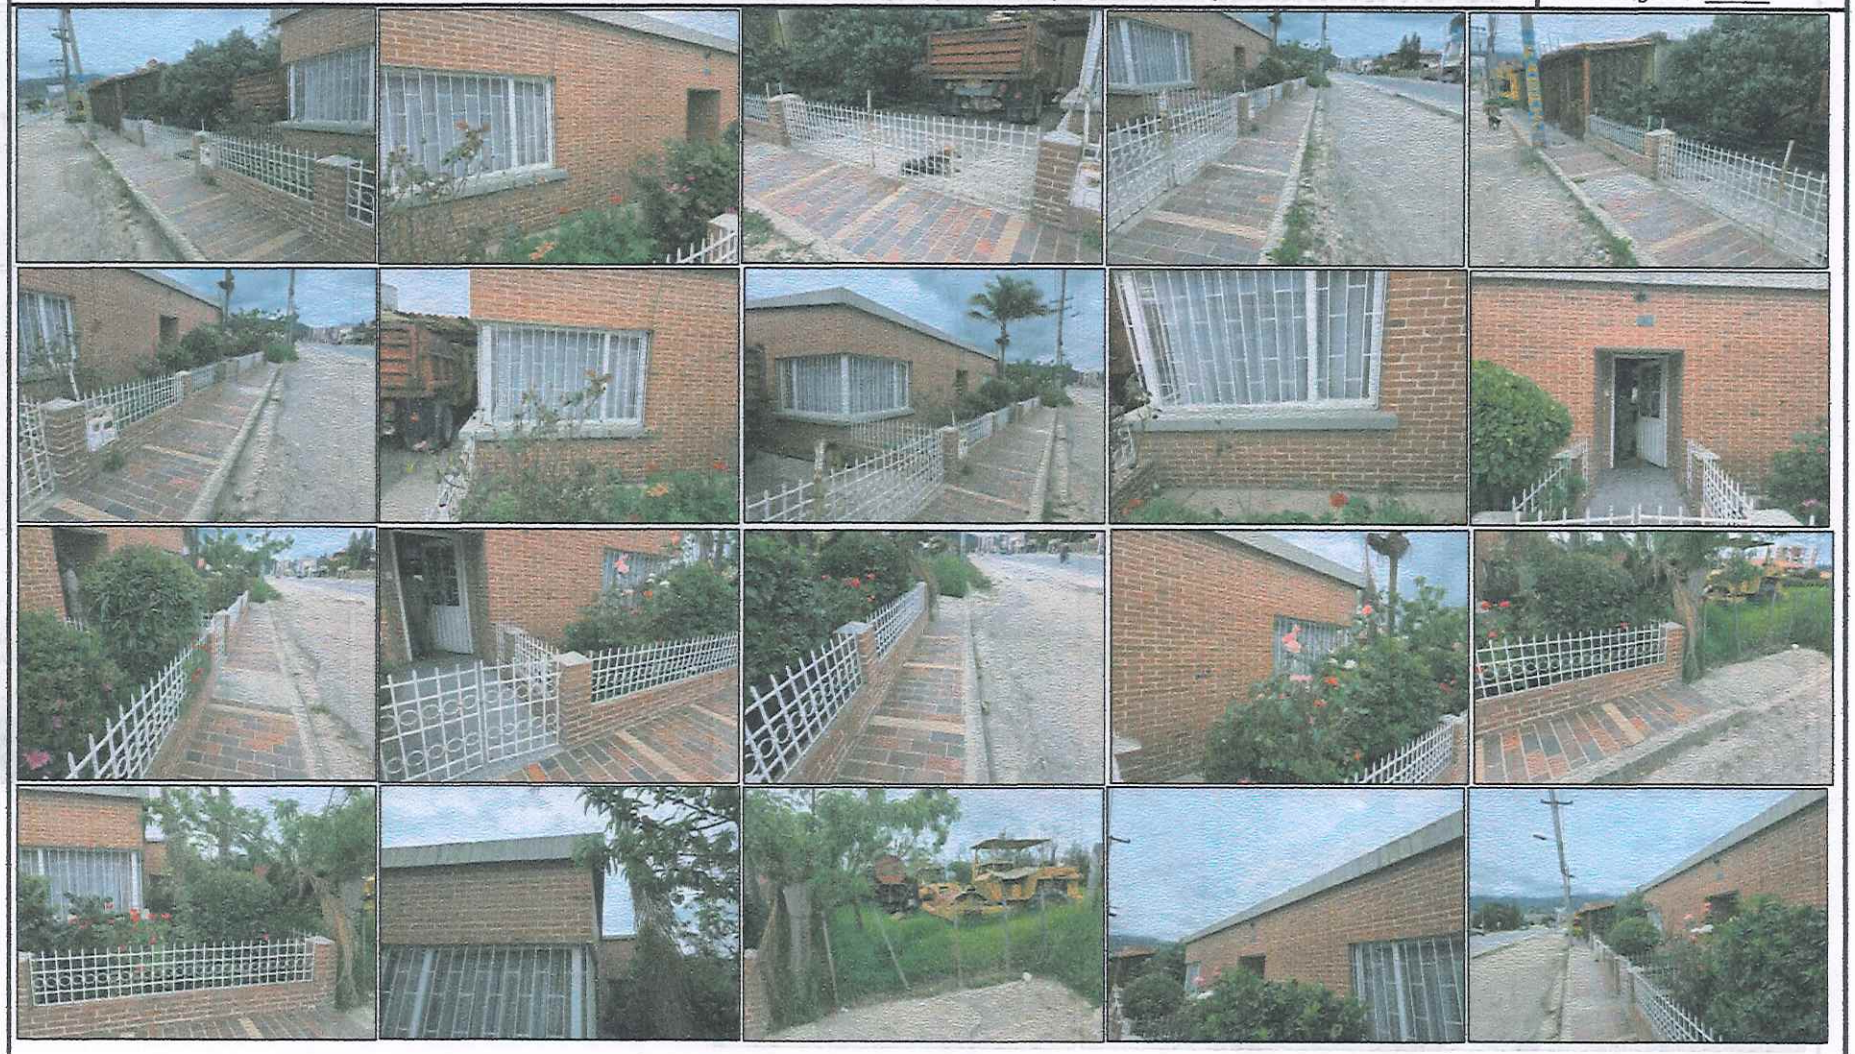

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)	Registro N°__72___



21500130 #102

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	22/04/2025
CONTRATO	CTO N°2070/2025	INTERVENTOR	Unión Temporal LAFER
CONTRATISTA	Consorcio R Y P	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N° 102

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario _____

Dirección _____

Teléfono _____ N° De pisos: _____

long. Del frente (m) _____ Estrato: _____

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia		X	
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional			
Valor constructivo		Comercial		Baldio			
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.			
Sin edificar	X	Institucional					
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado		otra	
paredes		bloque		ladrillo				otra	
puertas		madera		metalicas				otra	
puertas		numero		calle		internas		garaje	
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	
N° de pisos									

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote con cerramiento en malla eslabonada con presencia de oxido, acceso al lote con muros en ladrillo y portada, con puerta metálica, sin manejo de pastos, con presencia de residuos sólidos.

Se desconoce si el predio cuenta con conexión al servicio público.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N° 102



REGISTRO FOTOGRÁFICO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Registro N°___102___



ANEXO NO.08.5
PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053776001
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO SUAREZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 11 43	TELÉFONO:	2639861
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985388436**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1823967062

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 406.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 406.200	$ 300	$ 406.500
SUBTOTALES:										**$ 406.200**	**$ 300**	**$ 406.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 317.300	$ 200	$ 0	$ 317.500
SUBTOTALES:													**$ 317.300**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 317.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.300	$ 13.300	$ 100	$ 0	$ 13.400
SUBTOTALES:									**$ 13.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 13.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053776001	SUAREZ OCAMPO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.538.400				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.538.400	$ 406.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 406.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.538.400	$ 317.300	$ 0	$ 317.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.538.400	105377600	$ 13.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 737.400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900602469	9	LAINSCO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CR 9 18 90	TUNJA-BOYACA	7403623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832910393	9492998965	E	2025/10/16	2025/10/06	BANCO DE BOGOTA		$1,231,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049658635	CORREDOR TAPIAS CRISTIAN ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				**1**	**$349,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1838436225	9492700744	E	2025/10/22	2025/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,322,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1052379237	CASTIBLANCO JUAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1192764326	HERNANDEZ ALEJANDRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	79577759	SANDOVAL ALEX																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(3)**																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$1,322,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1838436225	9492700744	E	2025/10/22	2025/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,322,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$0	$297,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**3**	**$1,322,700**	**$0**	**$0**	**$1,322,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856834329	9493273793	Y	2025/10/22	2025/10/16	BANCO DE BOGOTA	0	$49,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053776001	SUAREZ DIEGO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0	No	$49,600
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$711,750	$49,600		$0	$0		$49,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856834329	9493273793	Y	2025/10/22	2025/10/16	BANCO DE BOGOTA	0	$49,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,600	$0	$0	$49,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$49,600	$0	$0	$49,600
TOTAL				1	$49,600	$0	$0	$49,600

ANEXO NO.08.6.
ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER

PREOPERACIONAL VEHÍCULO

UNION TEMPORAL

LAFER

UNIÓN TEMPORAL LAFER

UNION TEMPORAL LAFER

CHEK LIST PREOPERACIONAL MAQUINARIA

TIPO MAQUINARIA Vehiculo **MES** Septiembre - 2025

ITEM	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ENCENDIDO DE VEÍICULO	X		X		X		X	
LUCES BAJAS - ALTAS	X		X		X		X	
DIRECCIONALES DELANTERAS	X		X		X		X	
DIRRECIONALES TRASERAS	X		X		X		X	
ESTACIONARIAS DE PARQUEO	X		X		X		X	
PITO Y LUZ DE REVERSA	X		X		X		X	
ESPEJOS LATERALES	X		X		X		X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X	
LIMPIA BRISAS	X		X		X		X	
FRENOS	X		X		X		X	
RUEDA REPUESTO	X		X		X		X	
CAJA DE HERRAMIENTA PERSONAL	X		X		X		X	
EXTINTOR	X		X		X		X	
BOTIQUIN	X		X		X		X	
VIGENCIA SOAT	X		X		X		X	
VIGENCIA PASE	X		X		X		X	
VIGENCIA TENICO MECANICA Y DE GASES	X		X		X		X	

OBSERVACIONES: Vehiculo Renault Kwid - modelo 2020 - placa GPO644

FIRMA RESPONSABLE

CAPACITACIONES PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

UNION TEMPORAL
LAFER

UNIÓN TEMPORAL LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 017
	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

FECHA: 27 de septiembre del 2025	HORA INICIO: 8:30 am	HORA FÍN: 9:00 am
TEMA: Ahorro de energía y recursos en frentes de obra.		TIEMPO: 30 minutos.
DIRIGIDO POR: Inspector de interventoría.	FIRMA:	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	DOC. IDENTIDAD	FIRMA
1	Oscar Mauricio Suarez	Maestro	4192343	
2	Domingo Avella		74359038	
3	Claudia Patricia Castiblanco Santos	Controladora vial	1053616291	Claudia Castiblanco
4	Dilan steven Rios Aponte	auxiliar	1000212908	Dilan steven Rios
5	Domingo Avella		74359038	
6	OMAR O. ESCAMILLA S.	AYUDANTE	1090483658	OMAR O.E.S.
7	John Guillermo Diaz S.	oficial	1058244476	
8	Yaneth Ruiz Melo.	Controladora vial.	1053611754.	Yaneth Ruiz M.
9	Ana Yris Rodriguez ochoa	Controladora vial	1053607984	Ana Yris R.O.
10	Moises CAYACHO FONSECA	OFICIAL	74324374	
11	Yeison Daniel Martinez Gil	Ayudante	1054146084	
12	Brayan Guerrero Suarez	ayudante	1053606607	Brayan
13	Alfonso Avella	Auxiliar	1007305845	Alfonso
14	Jorge eliecer suarez	oficial	1053670848	Jorge Suarez
15	Gilbar Javier Bermudez	oficial	1053613359	Gilbar Bermudez
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de maquinaria en obra **Lugar:** FRENTE DE OBRA.
Fecha: 27/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** MAESTRO DE OBRA.
Nombre de quien diligencia: Oscar Mauricio Suárez **Identificación:** 1117545743

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de maquinaria en obra **Lugar:** Frente de obra
Fecha: 27/09/25 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** OFICINA
Nombre de quien diligencia: MOISES CAMACHO FONSECA **Identificación:** 74324374

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☐ Sí ☒ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de ruido y residuos en obra **Lugar:** Frente de obra
Fecha: 27/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** Auxiliar de obra.
Nombre de quien diligencia: Brayan Guevara Suarez **Identificación:** 1053666607

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☐ Sí ☑ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☐ Sí, totalmente ☑ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☐ Sí ☐ No ☑ Tal vez

Firma de quien diligencia Brayan Guevara **Firma responsable**



LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de ruido y residuos en obra **Lugar:** Frente de obra.
Fecha: 27/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** AYUDANTE
Nombre de quien diligencia: OMAR O. ESCAMILLA **Identificación:** 1090483658

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia OMAR O. ESC **Firma responsable**



LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Tema de la capacitación: Charla de energías y pausas en obra **Lugar:** frente de obra
Fecha: 27/ 09/ 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** Contratista Vial
Nombre de quien diligencia: Ana Yris Rodriguez **Identificación:** 1053607964

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Ana Yris R.O. **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Tema de la capacitación: Charla de energías y pausas en obra **Lugar:** frente de obra
Fecha: 27 / 09/ 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** Contratista Vial
Nombre de quien diligencia: Yaneth Ruiz Melo **Identificación:** 1053611754

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Yaneth Ruiz M. **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de arcilla y recubrimiento con geo **Lugar:** FRENTE DE OBRA.
Fecha: 27 / 08 / 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** AYUDANTE DE OBRA.
Nombre de quien diligencia: Jeison Alexander Martinez **Identificación:** 1053615447

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de arcilla y recubrimiento con geo **Lugar:** FRENTE DE OBRA
Fecha: 27 / 08 / 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** OFICIAL DE OBRA
Nombre de quien diligencia: JORGE LUIS BERMUDEZ **Identificación:** 1053608931

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Uso de eslinga y nudos en obra **Lugar:** FRENTE DE OBRA.
Fecha: 29/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** AUXILIAR DE OBRA
Nombre de quien diligencia: Yeison Julio Martínez Molano **Identificación:** CC 1054166894

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Uso de eslinga y nudos en obra **Lugar:** FRENTE DE OBRA
Fecha: 29/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** AUXILIAR DE OBRA.
Nombre de quien diligencia: ALFONSO AVELLA **Identificación:** 1007306445

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia ALFONSO **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de arcilla y pruebas en obra **Lugar:** Frente de obra
Fecha: 27 / 09 / 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** contratista vial
Nombre de quien diligencia: Claudia Patricia Castblanco **Identificación:** 1053616291

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☐ Sí ☒ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☐ Sí, totalmente ☒ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Claudia Castblanco. **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Manejo de arcilla y pruebas en obra **Lugar:** FRENTE DE OBRA.
Fecha: 27 / 09 / 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** AYUDANTE DE OBRA.
Nombre de quien diligencia: John Guillermo Diaz S. **Identificación:** 1058274424FG

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Charla de orden y aseo - ambiental **Lugar:** Frente de obra.
Fecha: 27 / 09 / 2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** Auxiliar de obra
Nombre de quien diligencia: Domingo Ruella Ramos **Identificación:** 74.359.038

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   X Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   X Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   X Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   X Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☐ Sí ☐ No X Tal vez

Firma de quien diligencia Domingo Ruella **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Charla de orden y aseo en obra **Lugar:** Frente de obra
Fecha: 27/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** Oficial de obra.
Nombre de quien diligencia: Jorge suarez ruella **Identificación:** 1053670948 de Paipa

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   X Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   X Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   X Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   X Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   X Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Jorge suarez **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Ahorro de energía y residuos en el hogar **Lugar:** FRENTE DE OBRA

Fecha: 27/09/2025 **Duración:** 30 minutos **Cargo en el proyecto:** OFICIAL DE OBRA.

Nombre de quien diligencia: Gilbert Duarte Benavides **Identificación:** 1053613359

☑ **Evaluación de comprensión** *(Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique)*

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**

   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí

2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**

   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No

3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**

   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol

4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**

   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema

5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**

   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Gilbert Duarte **Firma responsable**

CERTIFICACIONES

UNION TEMPORAL

LAFER

Paipa, octubre de 2025

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL

A QUIEN INTERESE

El suscrito representante legal de **UNIÓN TEMPORAL LAFER,** como interventor externo según contrato de interventoría N°2103 de 2025, suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

CERTIFICA

Que, la firma contratista **CONSORCIO RYP**, identificada con **NIT 901.963.394-7**, cumplió con los requisitos establecidos en el Plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA), para el contrato de obra N°2070 de 2025, cuyo objetivo es el **"MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ",** durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre del 2025, cumpliendo específicamente con los programas establecidos en el PAGA, tales como el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, las actividades constructivas, la gestión del recurso hídrico, y el manejo de instalaciones temporales y maquinaria.

A lo largo del periodo anteriormente mencionado, la interventoría supervisó, controló y validó el desarrollo de las actividades del componente ejecutadas en el proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas legales ambientales durante la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L: UNIÓN TEMPORAL LAFER

Paipa, octubre de 2025

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SST

A QUIEN INTERESE

El suscrito representante legal de **UNIÓN TEMPORAL LAFER,** como interventor externo según contrato de interventoría N°2103 de 2025, suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

CERTIFICA

Que, la firma contratista **CONSORCIO RYP**, identificada con **NIT 901.963.394-7**, cumplió con los requisitos establecidos en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el contrato de obra N°2070 de 2025, cuyo objetivo es el **"MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ'',** durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre del 2025, incluyendo la entrega de los equipos de protección personal (EPP's) al personal, la realización de las inducciones de seguridad correspondientes, el pago de la seguridad social del personal en obra, la realización de los exámenes médicos ocupacionales, la señalización y demarcación adecuada de la obra y su alrededor, la realización de las inspecciones de seguridad necesarias durante el periodo de ejecución, y la capacitación continua al personal en obra en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Durante el periodo anteriormente mencionado, la interventoría realizó la verificación, control y validación del desarrollo de las actividades del componente ejecutadas en el proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L: UNIÓN TEMPORAL LAFER

Paipa, octubre de 2025.

CERTIFICACION PARAFISCALES CONTRATO N°2070 DE 2025

A QUIEN INTERESE

El suscrito representante legal de **UNIÓN TEMPORAL LAFER,** como interventor externo según contrato de interventoría N°2103 de 2025, suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

CERTIFICA

Que la firma contratista **CONSORCIO RYP**, identificada con **NIT 901.963.394-7,** se encuentra a paz y salvo con el sistema general de seguridad por concepto de aporte a los empleados a los sistemas de salud, riegos laborales, pensiones y aporte a caja de compensación. Además, cumple con las obligaciones laborales del personal que realiza las actividades del contrato de obra N°2070 de 2025, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ'',** para el periodo de septiembre de 2025. Esta situación se enmarca dentro de las disposiciones legales establecidas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Decreto 862 de 2018 y la Ley 1807 de 2018, y se respalda con las planillas de pago adjuntas al presente informe.

Se expide la siguiente certificación como soporte del INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2.

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L: UNIÓN TEMPORAL LAFER

ANEXO NO.09

INFORME CONTRATISTA DE OBRA

UNION TEMPORAL

LAFER
