CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	97	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	3.28	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa	UNID.	kilogramo	ubicación	




DESCRIP.		DIMENSIONES			No BARRAS	No ELEMENTOS	Medida Total
		Diametro (ø)	Largo (m)	Peso (Kg/m)			
UBICACIÓN	TIPO						
PR + 0,00 m	Acero para muro box descole tuberia	1/2"	2,80	0,994	3,00	1,00	8,35
PR + 0,00 m	Acero para muro box descole tuberia	1/2"	0,60	0,994	9,00	1,00	5,37
	Acero para placa Pozo 12	1/2"	1,50	0,994	18,00	1,00	26,84

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	98	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	NP 7	Transporte de material suelto.	UNID.	Metro cúbico - Km	ubicación	

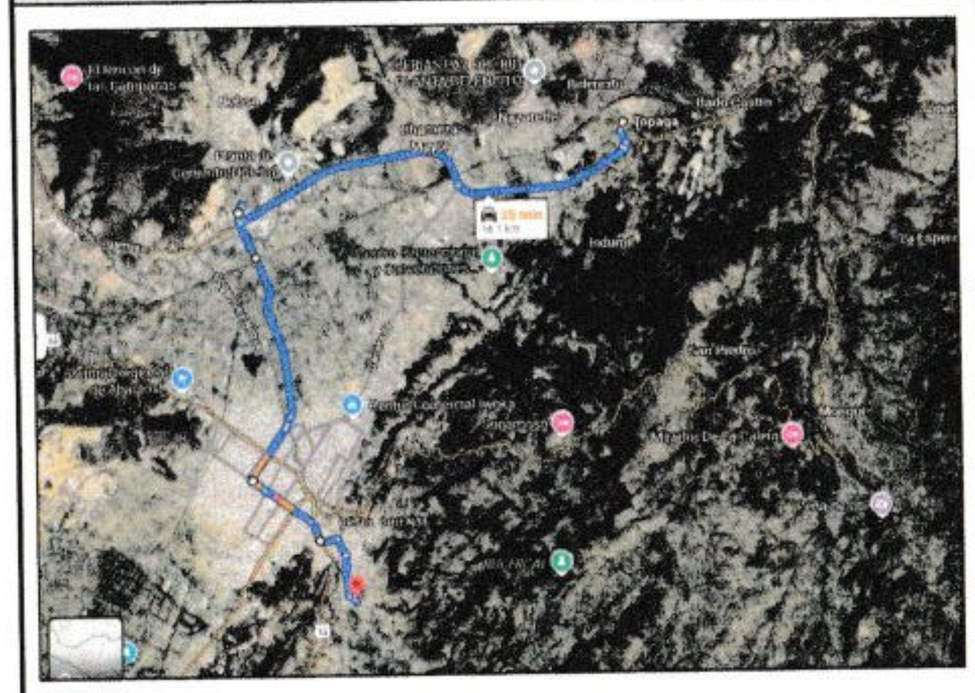


DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Volumen (m³)	Longitud (Km) Despues de 5 km	EXPANSIÓN 30%			
UBICACIÓN	TIPO						
	Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	365,63	11,10	109,69		1,00	5275,97
	Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	56,24	15,10	16,87		1,00	1103,99
	Excavación manual en material conglomerado conexión sumidero	11,78	15,10	3,53		1,00	231,24
	Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	5,08	15,10	1,52		1,00	99,63

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	99	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	NP 8	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 8"	UNID.	Unidad	ubicación	

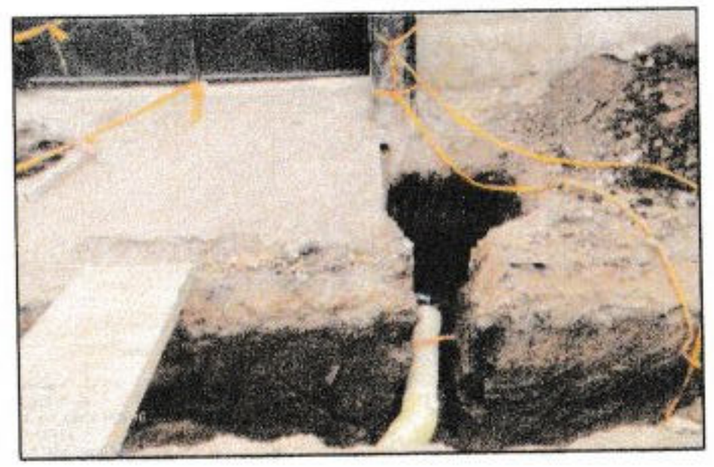

DESCRIP.		DIMENSIONES			Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	profundidad (m)		
UBICACIÓN	TIPO					
TRANSV 1 C-64SUR CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS	Instalación semicodo				1	1,00
TRANSV 1 C-64SUR CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS					1	1,00
TRANSV. 1 # 1C-18					1	1,00

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	100	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	NP 9	Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)	UNID.	Metro cuadrado	ubicación	




DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	Área (m²)			
UBICACIÓN	TIPO						
	Pozos de Inspección			2,27		10,00	22,70

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	101	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	NP 10	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"	UNID.	Metro lineal	ubicación	

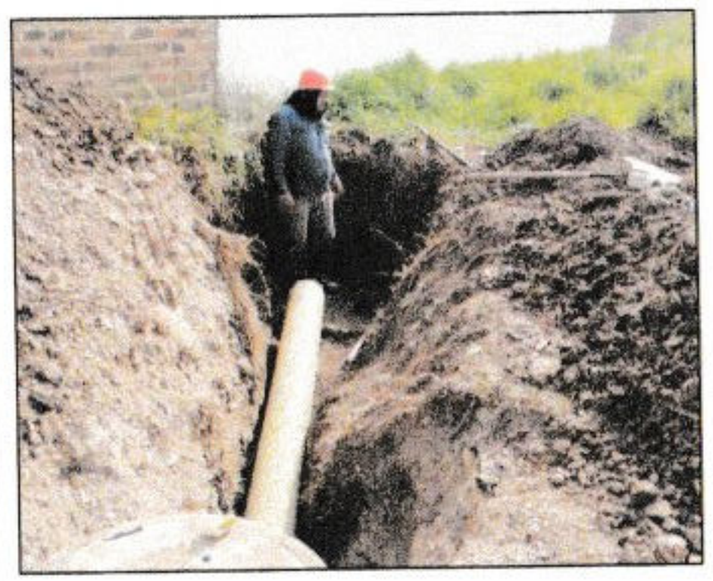


DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	Área (m²)			
UBICACIÓN	TIPO						
TRANSVERSAL 1 -CALLE 2SUR	CONEXIÓN A POZO		2,30			1	2,30
SUMIDERO LATERAL SL100	CONEXIÓN A POZO MH 09		4,00			1	4,00
SUMIDERO TRANSVERSAL TSV 1-2A SUR	CONEXIÓN A POZO MH 08		5,00			1	5,00
SUMIDERO TRANSVERSAL TSV 1-3A SUR	CONEXIÓN A POZO MH 07		4,00			1	4,00

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	102	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	NP 11	Construcción cajas ladrillo t.c. (1,00 x 1,00) m pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	UNID.	Unidad	ubicación	

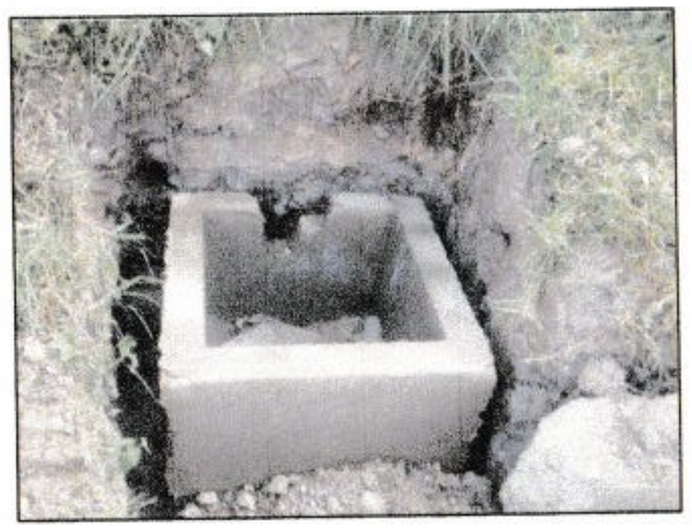


DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	Área (m²)			
UBICACIÓN	TIPO						
	Condominio					1	1
						1,00	1,00

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	103	DE	110

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	ITEM	NP 12	Suministro e instalación de rejilla plastica	UNID.	Unidad	ubicación	

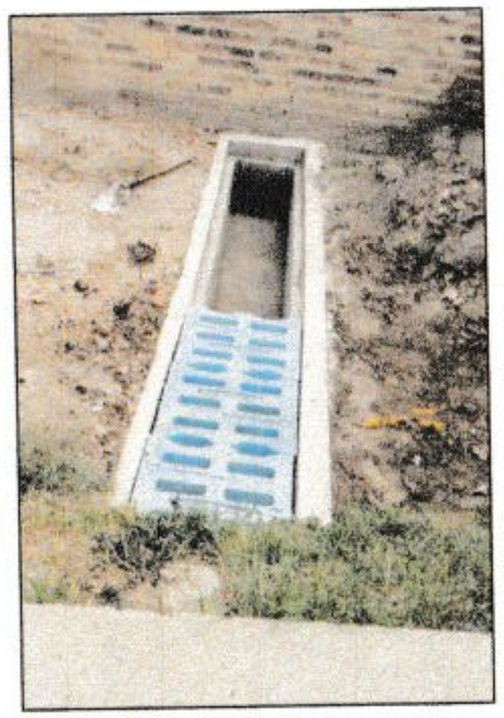

DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	Área (m²)			
UBICACIÓN	TIPO						
TRANSVERSAL 1- AGUA BLANCA	REGILLAS PLASTICAS					11	11
TRANSVERSAL 1- CALLE 2A	REGILLAS PLASTICAS					8,00	8,00

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	108	DE	109

CAPÍTULO	REPARACION DE ANDENES	ITEM	NP 13	Demolición de pisos de concreto <=10 cms	UNID.	Metro cuadrado	ubicación	







DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
UBICACIÓN	TIPO	Ancho (m)	largo (m)	profundidad (m)			
TRANSV 1CALLE 1D SUR		0,80	3,00			1	2,40
TRANSV 1CALLE 1D SUR		0,50	2,00			1	1,00
TRANSV #1C -42 SUR ACOMETIDA AGUA		0,50	6,50			1	3,25
TRANSV #1C 10 SUR		0,50	1,00			1	0,50
TRANSV #1C -10 SUR CAJA		0,90	1,00			1	0,90
DESCOLE A POZO 12 P		0,90	34,50			1	31,05
POZO 12		1,80	1,80			1	3,24
DESCOLE PARA TUBERIA 16" BOX`PLACA SUPERIOR		1,10	2,85			1	3,14
DESCOLE PARA TUBERIA 16" BOX MURO		0,75	2,85			1	2,14
MURO CARCAMO PARA TUBERIA 16"		0,70	10,20			1	7,14
MURO CARCAMO PLACA INFERIOR PARA TUBERIA 16"		0,60	10,20			1	6,12
APIQUE PARALOCLIZACION LINEA DE GAS		0,90	0,90			1	0,81
APIQUE PARALOCLIZACION LINEA DE GAS EN EL BOX		1,20	1,50			1	1,80
CONEXIÓN ALCANTARILLADO CONDOMINIO TV# 1C-64 SUR		0,80	1,50			1	1,20
TRANSV 1 C-64SUR CAJA DE PASO		1,30	1,20			1	1,56
TRANSV 1 C-64SUR CAJA DE AGUAS LLUVIAS		0,90	1,10			1	0,99
TRANSV 1 C-64SUR CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS		0,50	2,80			1	1,40
TRANSV 1 C-64SUR CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS		0,45	1,00			1	0,45
TRANSV 1 C-64SUR CAJA DE AGUAS LLUVIAS 2		0,95	1,00			1	0,95
				Subtotal			70,03
				Vienen			
				TOTAL			70,03

OBSERVACIONES:

Realizo: John Emerson Rosas Mesa
Contratista
Director de obra

Revisó: Arturo Bernal Suarez
Residente de interventoría
Ingeniar Constructora y Consultora s.a.s


CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	109	DE	109

CAPÍTULO	REPARACION DE ANDENES	ITEM	NP 13	Demolición de pisos de concreto <=10 cms	UNID.	Metro cuadrado	ubicación	



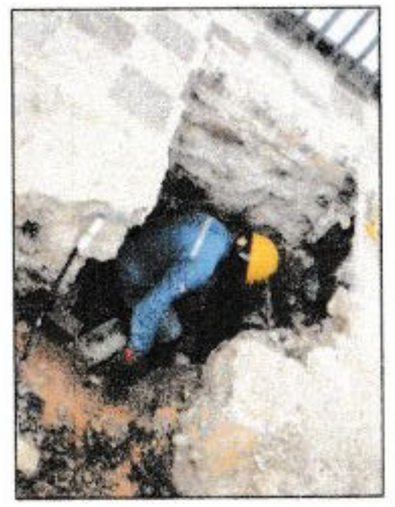

DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	profundidad (m)			
UBICACIÓN	TIPO						
TRANSV 1 C SUR 1-22 LINEA TUBERIA ACOMETIDA		0,45	0,45			1	0,20
TRANSV 1 C SUR 1-28 LINEA TUBERIA ACOMETIDA		0,55	0,55			1	0,30
POZO S 11		2,20	2,20			1	4,84
EMPALME TUBERIA CONDOMINIO		0,65	0,65			1	0,42
TRANSV 1C SUR 1-28 ACOMETIDA AGUA		0,50	0,50			1	0,25
TRANSV 1 # 1C-130	Caja Sanitaria	1,10	1,20			1	1,32
TRANSV 1 # 2 S-16 CAJA		1,00	1,00			1	1,00
APIQUE PARA TUBERIA DE GAS		0,50	0,80			1	0,40
TRANSV 1 # 2 S-20 CAJA		1,10	1,10			1	1,21
TRANSV 1 # 2 S-26 CAJA		1,00	1,00			1	1,00
MANEJO DEAGUAS RESIDUALES TV 1CON CALLE 2		0,90	7,20			1	6,48
TRANSV 1 # 2 S-16 ACOMETIDA		0,55	6,10			1	3,36
TRANSV 1 # 2 S-16 ACOMETIDA AGUA		0,40	4,00			1	1,60
TRANSV 1 # 2 S-20 ACOMETIDA		0,65	5,00			1	3,25
TRANSV 1 # 2 S-20 ACOMETIDA AGUA		0,55	6,00			1	3,30
TRANSV 1 # 2A-33 S		1,5	1,50			1	2,25
TRANSV 1 # 2A-55 S	CAJA	1	1,20			1	1,20
TRANSV 1 # 1C-96 ACOMETIDA DOMICILIARIA		0,6	4,50			1	2,70
TRANSV 1 # 2A-39 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	ACOMETIDA	0,6	2,80			1	1,68
TRANSV 1 # 2A-39 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	APIQUE	0,8	1,65			1	1,32
TRANSV 1 # 2A-39 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	CAJA	1,1	1,10			1	1,21
TRANSV 1 # 2A-49 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA		0,6	1,20			1	0,72
TRANSV 1 # 2A-49 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	CAJA	1,2	1,10			1	1,32
TRANSV 1 # 2A-63 S	CAJA	1	1,00			1	1,00
TRANSV 1 # 2A-20 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	CAJA	0,9	0,90			1	0,81
TRANSV 1 # 2A-20 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	ACOMETIDA	0,4	1,40			1	0,56
TRANSV 1 # 2A-58 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	CAJA	1,00	1,00			1	1,00
TRANSV 1 # 2A-58 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	ACOMETIDA	0,60	1,50			1	0,90
TRANSV 1 # 2A-66 SUR ACOMETIDA DOMICILIARIA	CAJA	1,00	1,00			1	1,00
TRANSV 1 # 3-18 SUR	CAJA	0,90	1,10			1	0,99
TRANSV 1 # 3-18 SUR	APIQUE	0,50	2,10			1	1,05
						Subtotal	48,64
						Vienen	70,03
						TOTAL	118,67

OBSERVACIONES:

Realizo: John Emerson Rosas Mesa
Contratista
Director de obra

Reviso: Arturo Bernal Suarez
Residente de interventoría
Ingeniar Constructora y Consultora s.a.s

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

FECHA					
DD	3	MM	11	AA	2025

HOJA	110	DE	110

CAPÍTULO	REPARACION DE ANDENES	ITEM	NP 13	Demolición de pisos de concreto <=10 cms	UNID.	Metro cuadrado	ubicación	





DESCRIP.		DIMENSIONES			Espesor	Cantidad	Medida Total
		Ancho (m)	largo (m)	profundidad (m)			
UBICACIÓN	TIPO						
TRANSV 1 # 2 -20 SUR	CAJA	0,9	0,90			1	0,81
TRANSV 1 # 3-80 SUR	APIQUE	0,8	0,90			1	0,72
TRANSV 1 # 3-68 SUR	APIQUE	1	1,20			1	1,20
TRANSV 1 # 3-56 SUR	CAJA	1,10	1,20			1	1,32
TRANSV 1 # 3-66 SUR	CAJA	1,10	1,20			1	1,32
TRANSV 1 # 3-68 SUR	ACOMETIDA	0,60	3,40			1	2,04

INFORME OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA		
INTERVENTOR:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S.		
% AVANCE:		FECHA INICIO: 4/07/2025	FECHA DE CORTE 3/08/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.



Foto No:	2
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.



Foto No:	4
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	5
Observaciones Particulares:	Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km



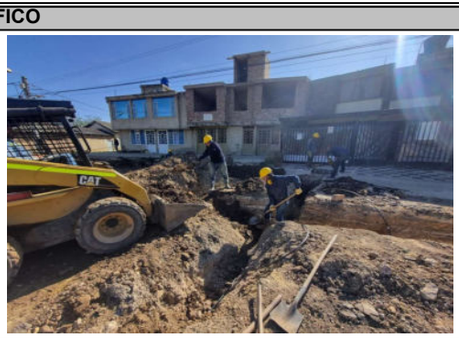
Foto No:	6
Observaciones Particulares:	relleno con arena de peña



Foto No:	7
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado para acometidas



Foto No:	8
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	11	Foto No:	12
Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)		Observaciones Particulares: Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	13	Foto No:	14
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	15	Foto No:	16
Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	17	Foto No:	18
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	19	Foto No:	20
Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)		Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	21	Foto No:	22
Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)		Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	23

Observaciones Particulares:

Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)



Foto No:	24

Observaciones Particulares:

Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	25

Observaciones Particulares:

Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)



Foto No:	26

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	27

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces

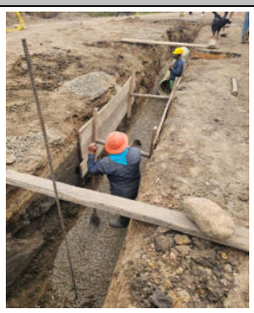


Foto No:	28

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	29

Observaciones Particulares:




Excavación manual ,apique redes existentes



Foto No:	30


Observaciones Particulares:


Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica




REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	31	Foto No:	32
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	33	Foto No:	34
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	35	Foto No:	36
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	37	Foto No:	38
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	39	Foto No:	40
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	41	Foto No:	42
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	43	Foto No:	44
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	45	Foto No:	46
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	47	Foto No:	48
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	49	Foto No:	50
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	51	Foto No:	52
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	53	Foto No:	54
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	




REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	55	Foto No:	56
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	57	Foto No:	58
Observaciones Particulares: #¿NOMBRE?		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	59	Foto No:	60
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	61	Foto No:	62
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	63	Foto No:	64
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	65	Foto No:	66
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	67	Foto No:	68
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	69	Foto No:	70
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	71	Foto No:	72
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	73	Foto No:	74
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	75	Foto No:	76
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	77	Foto No:	78
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	

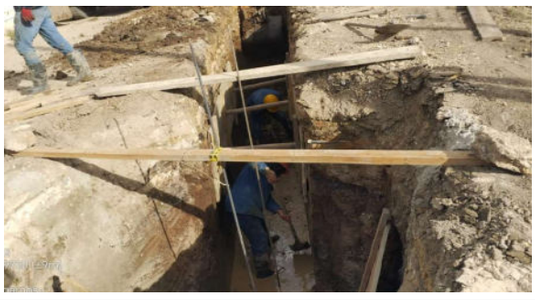REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	79	Foto No:	80
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	81	Foto No:	82
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	83	Foto No:	84
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	85	Foto No:	86
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	

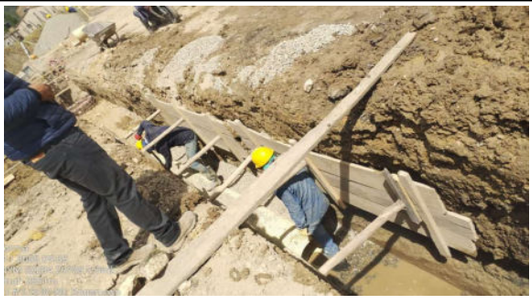REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	87	Foto No:	88
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	89	Foto No:	90
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	91	Foto No:	92
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	93	Foto No:	94
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

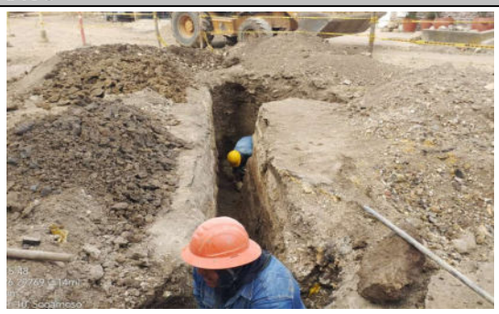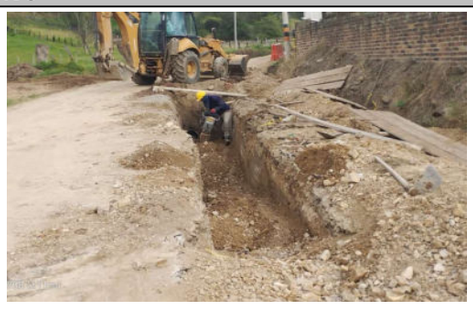REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	95	Foto No:	96
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	97	Foto No:	98
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	99	Foto No:	100
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	101	Foto No:	102
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	103

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"



Foto No:	104

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	105

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"



Foto No:	106

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto No:	107

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	108

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	109

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	110

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	111

Observaciones Particulares:

Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)



Foto No:	112

Observaciones Particulares:

Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	113

Observaciones Particulares:

Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.



Foto No:	114

Observaciones Particulares:

Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	115

Observaciones Particulares:

Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	116

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	117

Observaciones Particulares:

Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)



Foto No:	118

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	119	Foto No:	120
Observaciones Particulares: Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	121	Foto No:	122
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	123	Foto No:	124
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	125	Foto No:	126
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	Fecha:	01/10/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	Hora de culminación:	11:30 AM

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas

Desarrollo de la Reunión:

El día 1 de octubre de 2025 se llevó a cabo el octavo comité de obra en las instalaciones de Ingeniar, con la participación de representantes de la Empresa de Renovación e Infraestructura (ERI), la Secretaría de Hábitat, el contratista John Rosas y el equipo de interventoría.

Durante la reunión se reportó un avance total del 70% en la ejecución de la obra, lo que refleja un progreso significativo considerando las eventualidades presentadas en fases anteriores. La Secretaría de Hábitat, en su rol de supervisión, informó la aprobación oficial de la Adición y Prórroga a los contratos 2025-24 y 2025-25, tanto en tiempo como en recursos, estableciendo como nueva fecha de terminación el 3 de diciembre de 2025.

Se emitieron recomendaciones específicas al contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), enfatizando la necesidad de mantener y reforzar los protocolos existentes durante el periodo extendido de ejecución. Asimismo, se solicitó la renovación y actualización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para alinearlo con la nueva programación de obra.

En aspectos técnicos, se informó al contratista que el tamaño máximo del material de afirmado utilizado en obra no debe exceder las 2 pulgadas de grosor, garantizando así la calidad y estabilidad de las capas de base.

Por otro lado, se discutió una solicitud de la comunidad respecto a la apertura del paso vehicular entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m., y a partir de las 7:00 p.m. en adelante. El contratista explicó que, debido a

Powered by CamScanner

compromisos adquiridos en el PMT y a las restricciones establecidas por Intrasog (Instituto de Tránsito de Sogamoso), no es posible autorizar el tránsito en estos horarios, ya que el PMT actual contempla una restricción total de movilidad vehicular durante la ejecución de los trabajos, y permitir el paso expondría al proyecto a sanciones por parte de dicha entidad.

Se acordó informar formalmente a la comunidad sobre esta situación, destacando que la medida responde a disposiciones de seguridad y normativas de tránsito.

PARTICIPANTES				
NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
DIUBADO GONTDIEZ STOM.	INTERVENTORIA.	9519890.	3105680031.	
John E. Rosas Hern	Contratista Obra	74081029	3103120770	
Julian D. Vergara N.	Sec. Habitat	1055313349	312 464 4430	
Lina Fabiola Lancheros	Sec. Habitat	46381.750	3143758543	
Camilo Castro	alcal. SOGAMOSO	74186857	3128574579	
Andy Francisco F.	Interventoria.	1.057.580.742	304.661.6081	
Paula Ordoñez Forero	Interventoria SIS	1057586004	3152197744	
Arturo Bonilla	Interventoria ING Res	74165734 54	3142660389	
Felipe Pedraza	E.R.I	1057590867	3124296761	

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 15-oct-25
Norma: NTC-5055

Consecutivo 7.993
Referencia: TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m
Lote de Fabricación: 30000079660

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO INTERNO π	mm	NTC-3358	594,70 - 599,88	595,77
ESPESOR INTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 1,78	2,15
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA π	mm	NTC-3358	643,40 - 646,00	645,39
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 160,00	174,00
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6500 - 6580	6551,80
RIGIDEZ DEL TUBO	psi	NTC-3254	>= 28,000	266,96

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	299	CUMPLE
INMERSION EN ACETONA	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE DELAMINACIÓN O DESMORONAMIENTO EN NINGÚN ÁREA DEL TUBO	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL TUBO	%	NTC-3254	NO DEBE HABER EVIDENCIA DE DIVISIÓN, AGRIETAMIENTO O ROTURA DE LAS CORRUGACIONES	CUMPLE
RESISTENCIA AL CALOR	°C	NTC-6042	NO DEBE MOSTRAR DELAMINACIÓN, GRIETA O BURBUJAS	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2534	10,8 PSI DURANTE 10 MINUTOS	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2534	22 InHg DURANTE 10 MINUTOS	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-5055	GERFOR IND. COL. PVC TUBOS PARA ALCANTARILLADO 24" PS 0.193Mpa (28psi) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 5055 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 15-oct-25
Norma: NTC 3722-3

Consecutivo 8.032
Referencia: TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 400mm
Lote de Fabricación: 30000079446

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR π	mm	NTC-3358	397,60 - 401,20	399,90
DIAMETRO INTERNO π	mm	NTC-3358	340,00 - 362,50	361,35
ESPESOR VALLE MINIMO	mm	NTC-3358	>= 2,30	3,65
ESPESOR INTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 2,00	2,71
ESPESOR EXTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 1,00	1,83
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA π	mm	NTC-3358	402,20 - 405,80	405,00
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO	mm	NTC-3358	>= 70,00	99,58
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6050	6023,33
RIGIDEZ DEL ANILLO	kN/m²	NTC-4215	>= 8,000	9,62

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	MINUTOS	NTC-4218	NO MOSTRAR NINGUN SIGNO DE ATAQUE EN NINGUNA PARTE	CUMPLE
ENSAYO DE HORNO	°C	NTC-6042	EL TUBO NO DEBE MOSTRAR DELAMINACIÓN GRIETAS O BURBUJAS	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-5213	MINIMO 25 GOLPES SIN PRESENTA FALLA	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	%	UNE-EN 1446	NO EVIDENCIA DE AGRIETAMIENTO, FISURA DE LA PIEL INTERNA O ROTURA	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	Bar	UNE-EN 1277	0,05 Bar / 0,5 Bar / -0,3 Bar	CUMPLE
			GERFOR IND. COL. PVC-U ALCANTARILLADO	

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 15-oct-25
Norma: NTC 3722-3

Consecutivo 8.032
Referencia: TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 400mm
Lote de Fabricación: 30000079446

ROTULADO	N/A	NTC 3722-3	DN/OD 400mm (16") RS 8kN/m² (PS 60psi) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 14-oct-25
Norma: NTC 3722-3

Consecutivo 7.894
Referencia: TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm
Lote de Fabricación: 30000080178

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	159,04 - 160,48	160,34
DIAMETRO INTERNO	mm	NTC-3358	135,00 - 145,00	144,34
ESPESOR VALLE MINIMO	mm	NTC-3358	>= 1,20	1,54
ESPESOR INTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 1,00	1,09
ESPESOR EXTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 0,40	0,87
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	160,90 - 162,50	162,09
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO	mm	NTC-3358	>= 42,00	74,35
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6050	6024,09
RIGIDEZ DEL ANILLO	kN/m²	NTC-4215	>= 8,000	12,25

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	MINUTOS	NTC-4218	NO MOSTRAR NINGUN SIGNO DE ATAQUE EN NINGUNA PARTE	CUMPLE
ENSAYO DE HORNO	°C	NTC-6042	EL TUBO NO DEBE MOSTRAR DELAMINACIÓN GRIETAS O BURBUJAS	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-5213	MINIMO 25 GOLPES SIN PRESENTA FALLA	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	%	UNE-EN 1446	NO EVIDENCIA DE AGRIETAMIENTO, FISURA DE LA PIEL INTERNA O ROTURA	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	Bar	UNE-EN 1277	0,05 Bar / 0,5 Bar / -0,3 Bar	CUMPLE
			GERFOR IND. COL. PVC-U ALCANTARILLADO	

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Consecutivo 7.894
Fecha: 14-oct-25
Referencia: TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm
Norma: NTC 3722-3
Lote de Fabricación: 30000080178

ROTULADO	N/A	NTC 3722-3	DN/OD 160mm (6") RS 8kN/m² (PS 60psi) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CONTRATO DE OBRA No. 2025-024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"

CONTRATISTA DE OBRA:
JOHN EMERSON ROSAS MESA

PERIDO N° 5
DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	MANUELA JIMENEZ	JOHN EMERSON ROSAS

INTRODUCCION

En la malla vial de la ciudad de Sogamoso, es muy frecuente observar que la construcción de obras civiles y en particular para este tipo de intervenciones (CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO) emplazados en zonas urbanas genera ocupación parcial de las vías, disminuyendo su capacidad vehicular y ocasionando dificultades al flujo vehicular y peatonal adyacente a la zona directa de obra, convirtiendo dichos sitios en fotos potenciales de accidentalidad, pues es evidente la probabilidad de confusión e inseguridad a que se ven enfrentados los usuarios.

Dentro del presente documento, se evidencia la implementación del Plan de Manejo de Trafico, que se presentó desde el inicio del proyecto. Para JOHN EMERSON ROSAS MESA, es importante implementar medidas preventivas para así mitigar el impacto generado con el cierre de la calzada por etapas para la ejecución de los trabajos, respecto al tránsito directo de la obra.

OBJETIVOS

General


Mitigar el impacto generado por las intervenciones sobre los flujos peatonales y vehiculares, brindando seguridad a los peatones, a los trabajadores de la obra y a los usuarios de la vía.

Objetivos Específicos

- Evitar la restricción y obstrucción del flujo vehicular que se presenta continuamente en el tramo a intervenir.
- Ofrecer a los continuos usuarios de la vía, una ruta alterna para su destino.
- Brindar seguridad a los continuos usuarios de la vía al realizar el cerramiento parcial o total de la vía a intervenir, de manera que para su movilización tomen rutas alternas o se abstengan de hacer uso del tramo en el cual se están desarrollando los trabajos de construcción del alcantarillado.
- Mejoramiento del tránsito continúo tanto del flujo vehicular como del peatonal de la zona.

LOCALIZACIÓN

El desarrollo de las actividades se encuentra en la transversal en la vereda Monquira sector la reforma.

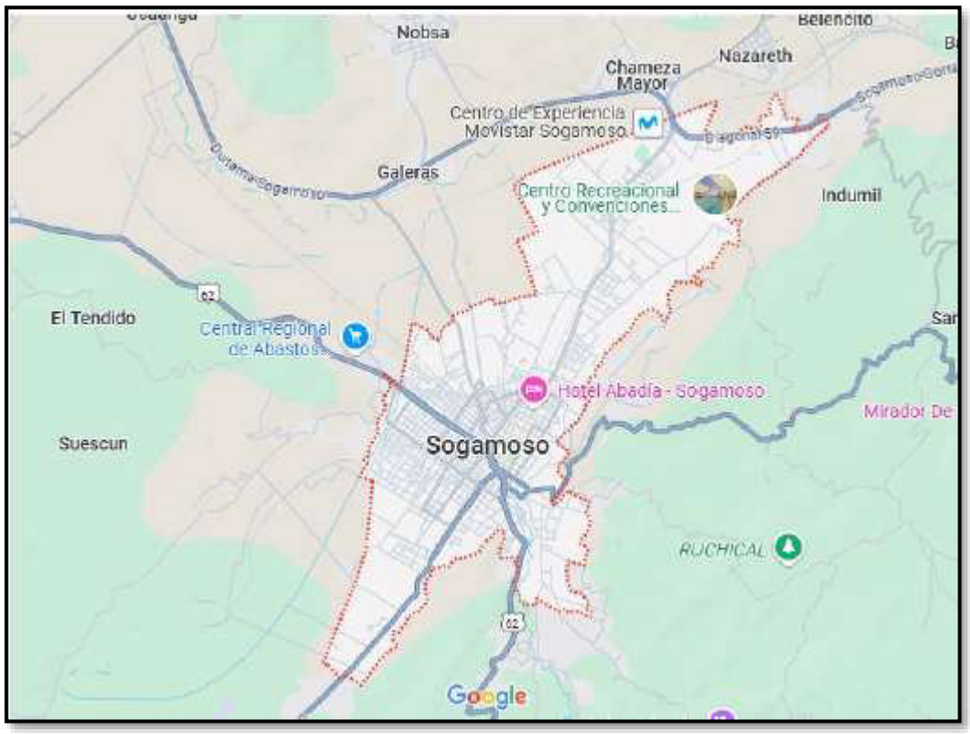

Fuente: Elaboración propia a través de Google Maps.

Localización general del proyecto



Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth

Localización especifica del proyecto

DURACION Y HORARIO DE TRABAJO

El presente plan de manejo será puesto en marcha desde el inicio del proyecto y se llevará a cabo de manera continua a lo largo de toda su duración. La implementación del plan será monitoreada y evaluada regularmente para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos y se logre una ejecución eficiente, respetuosa con el entorno y acorde con las normativas vigentes

Los cierres serán implementados de manera continua, operando durante las horas del día, con el fin de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto. Los trabajos se llevarán a cabo de manera estructurada dentro de un horario especifico, comprendido entre las 06:00 y las 18:00 horas

MAQUINARIA PARA UTILIZAR

- RETROEXCAVADORA
- MINICARGADOR.
- VOLQUETA.
- VOLQUETAS DOBLE TROQUE
- CAMIONETA DE ESTACAS

METODOLOGÍA

La metodología para darle cumplimiento al PMT es el cierre total y continuo de la vía, permitiendo solo el flujo peatonal; garantizando las rutas de acceso y las áreas colindantes puedan seguir operando con normalidad; implementamos las medidas requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señalización informativa y preventiva reglamentaria correspondiente, de tal manera que así mitigamos el riesgo de la ocurrencia de un posible incidente y garantizamos la seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones.

FORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE

Las personas designadas para la implementación del plan de manejo de Tránsito corresponden a:

- Residente de Obra.
- Residente sst.
- Controladoras de tráfico.

RUTAS ESTABLECIDAS

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	DESCRIPCION	EVIDENCIA
MANEJO DEL TRANSITO PARTICULAR Y TRANSPORTE PUBLICO	**RUTA 1:** Se ha establecido una ruta de desvío que inicia en la Calle 3A y se extiende hasta el salón de eventos La Ceibita. Esta vía ha sido seleccionada debido a su disponibilidad y capacidad para recibir temporalmente el flujo vehicular. Sin embargo, es importante destacar que, debido a la falta de una conexión vial directa desde este punto, el recorrido no puede finalizar allí. Por tal motivo, el tránsito deberá continuar hasta alcanzar la Transversal, donde se podrá retomar la ruta principal o dirigirse hacia otras vías alternas según la planificación establecida.	
	RUTA N° 2: Se establece que la carrera 4 que también será habilitada para conectividad de transito que circula de norte a sur y viceversa ya que por la falta de conexión de la vías se segira el camino establecido para la continuidad en la transversal 1.	
VEHICULOS DE CARGA	Este desplazamiento se llevará a cabo en estricto cumplimiento de las normativas y restricciones vigentes, específicamente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 034 de 2009, el cual regula la circulación de vehículos de carga.	
MANEJO PEATONAL Y CICLOUSUARIOS	Se mantendrán en óptimo estado los andenes existentes, o se implementarán soluciones temporales adecuadas en caso de ser necesario. Esto con el fin de asegurar condiciones seguras y accesibles para el tránsito peatonal, evitando cualquier tipo de obstrucción, riesgo o afectación durante la ejecución de las obras. Los peatones serán inducidos a transitar por el andén de la ejecución de la obra, mediante señalización informativa además se delimitara el perímetro de la obra mediante delineadores tubulares tipo colombina, con el fin de evitar que el tránsito peatonal interfiera con al ejecución de los trabajos.	

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN

El contratista será responsable de suministrar información continua y actualizada a los residentes y usuarios de las vías afectadas por el proyecto, respecto al Plan de Manejo de Tráfico, la señalización implementada y los desvíos necesarios para el correcto desarrollo de la obra. Esta información es esencial para garantizar la seguridad y el flujo adecuado del tráfico en la zona, minimizando cualquier inconveniente que pueda surgir debido a las obras en curso.

Se realiza la entrega de un volante informativo de los tiempos de ejecución de obra y algunas recomendaciones generales; así mismo el día 05 de julio se realizó la socialización del Plan de Manejo de Transito aprobado por Instituto de tránsito y

transporte de Sogamoso INTRASOG. Se instalaron barricadas junto con señales de advertencia para reducir la velocidad del tráfico en una zona de control temporal.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fuente: Cumplimiento de PMT

CONCLUSIONES

- Se ha impartido los controles del Plan de Seguridad Vial con la sensibilización de control y cuidado por parte del tránsito confluyente por la zona para el cuidado de la obra, de manera que tanto los peatones como eventuales transeúntes en bicicleta, respeten las señales de peligro y obra en la vía que se han instalado.
- Se han instalado vallas para controlar el tráfico y desviarlo de tal manera que el flujo vehicular tenga vías alternas para dirigirse a su destino.
- Se han realizado las respectivas capacitaciones para informar a la comunidad que hace uso constante de la vía, para que tome sus rutas alternas y no se presenten problemas de tráfico en el sector y que ocasione problemas no solo al transeúnte, sino también retrase o se tenga inconveniente con los trabajos ejecutados.
- Debido a la falta de conciencia y cultura de los transeúntes de las vías en mención se ha tomado la decisión de retirar a las controladoras de tráfico, esto con el fin de salvaguardar la integridad física de las mismas.
- Dado que se da por terminada la ejecución de las actividades, se retira la señalización instalada para habilitar la vía.

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 2025-024

OBJETO:

“CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

CONTRATISTA DE OBRA:

JOHN EMERSON ROSAS MESA

PERIODO N° 5

DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	MANUELA JIMENEZ	JOHN EMERSON ROSAS

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
   2.1. Objetivo general
   2.2. Objetivos específicos
3. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A OBRA.
4. AFILIACIONES Y PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL.
5. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.
6. MATRIZ DE PELIGROS.
7. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES.
8. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.
9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
   9.1. Indicador de cumplimiento.
   9.2. Indicador de cobertura.
   9.3. Indicador de eficacia.
   9.4. Indicador de inducción.
   9.5. Charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo
10. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION
11. MAQUINARIA AMARILLA, EQUIPOS Y VEHICULOS
12. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES(AT) Y ENFERMEDADES LABORALES (EL)
13. INDICADORES MINIMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0312 DE 2017
   13.1. Indicador de severidad de los accidentes laborales
   13.2. Indicador de frecuencia de los accidentes laborales
   13.3. Indicador de mortalidad de los accidentes laborales
   13.4. Indicador de prevalencia de la enfermedad laboral
   13.5. Indicador de incidencia de la enfermedad laboral
   13.6. Indicador de ausentismo laboral
14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
   14.1. Inspecciones de elementos de proteccion personal y dotación
   14.2. Inspecciones locativas y frente de obra
      14.2.1. Inspección punto ecológico
      14.2.2. Inspección de instalaciones locativas administrativas
      14.2.3. Inspección Gestión de Residuos
      14.2.4. Inspección orden y aseo
   14.3. Inspecciones a elementos de atención de emergencias
      14.3.1. Inspección a camilla de emergencias
      14.3.2. Inspección botiquín de primeros auxilios
      14.3.3. Inspección a extintores
   14.4. Inspección preoperacional a maquinas, equipos, herramientas y vehículos.
   14.5. Inspección a excavación.
15. REGISTRO FOTOGRAFICO

1. INTRODUCION

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer la gestión realizada durante el desarrollo de las actividades realizadas con respecto al contrato **" CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**" correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello, que JOHN EMERSON ROSAS MESA, tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, dentro del desarrollo del contrato. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019 cumpliendo las funciones como contratista. La prevención en SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General

Tener CERO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, para lo cual propiciamos y motivamos que cada trabajador tenga una actitud y un compromiso permanente con la seguridad, la salud y con el medio ambiente.

2.2. Objetivos Específicos.

- Prevenir y/o controlar los riesgos en las diferentes áreas y lugares donde se desarrollarán los trabajos.
- Fortalecer la cultura preventiva en todos nuestros colaboradores.
- Prevenir y/o mitigar cualquier impacto en la salud que se genere en la ejecución de los trabajos.
- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.

- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.
- Implementar planes, procedimientos, guías de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los AT y EL.
- Dar cumplimento a los criterios establecidos en el contrato.
- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.

3. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A OBRA

El siguiente listado corresponde a las personas vinculadas en el contrato para el periodo en ejecución.

RELACION DE PERSONAL							
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	PENSION	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
JOHN EMERSON ROSAS MESA	74081029	DIRECCTOR DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	4/06/2025	
KAREN LISETH CELY	1057590407	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	4/06/2025	30/07/2025
JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA	1057611444	RESIDENTE DE OBRA	SAUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	4/08/2025	
JOHANA CAROLINA PATIÑO	1020752084	RESIDENTE SST	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4/06/2025	
JAIRO ALONSO ROSAS	1051589941	APOYO A RESIDENTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	4/06/2025	
JAIME BARRERA	9533851	OPERADOR RETROEXCAVADORA	NEPS		SURA	4/06/2025	
FABIO DEL JESUS LEMUS	74372715	OFICIAL	NEPS	COLPENSIONES	POSITIVA	4/06/2025	
BRAHIAN ESTIBEN LOPEZ CARDENAS	1057570202	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	4/06/2025	21/06/2025
JUAN FELIPE GURRERO ARAQUE	1010054640	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	11/06/2025	12/07/2025
JULIAN ANDREY PEREZ DELGADO	1122121604	AYUDANTE	NEPS	PROTECCION	POSIITVA	11/06/2025	21/06/2025
CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	1118549653	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	18/06/2025	
ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ	74185842	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	24/06/2025	
SHAMPIER STIVENT LEMUS PINEDA	1057580427	AYUDANTE	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	24/06/2025	5/07/2025
JOHAN ANDRES LOPEZ	1007413791	OPERADOR MINI	NEPS	COLPENSIONES	SURA	15/07/2025	
WILSON JHOVANI LOPEZ	1058051592	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	SURA	14/07/2025	27/09/2025
BAUDILIO SANCHEZ CARDENAS	9530903	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	POSITIVA	14/07/2025	
DIANA CAROLINA MONTAÑA	1057574918	CONTROLADORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	15/07/2025	22/07/2025
KAROL JUANITA GONZALEZ	1057577478	CONTROLADORA	NEPS	COLPENSIONES	SURA	15/07/2025	30/08/2025
ANA YANIN CORREDOR	46376054	CONTROLADORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	23/07/2025	30/08/2025
FERNEY DARIO GARCIA	1054283864	AYUDANTE	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	24/07/2025	
JESUS ALEXANDER PEREZ	1057598366	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	24/07/2025	
LUIS ALFREDO ALVAREZ MARTINEZ	9518924	OFICIAL	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	27/07/2025	30/08/2025
PASCUAL SIERRA GUTIERREZ	9396749	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	POSITIVA	19/08/2025	
CESAR LEONARDO PEREZ	1116664606	OFICIAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	21/08/2025	
CARLOS ALVEIRO RIVEROS	1057570638	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	SURA	29/09/2025	18/10/2025
GERARDO AVELLA GUTIERREZ	1007343156	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	20/10/2025	

4. AFILIACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizo la afiliación de los colaboradores que ingresaron; al igual se realizó el pago de la seguridad social del personal en el periodo a ejecutar**. Ver Anexo 1. Soporte de afiliación y pago de planillas de seguridad social.**

5. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Los exámenes de ingreso son clave para proteger la salud del trabajador, garantizar que se ubique en un puesto adecuado y salvaguardar al empleador frente a responsabilidades legales. Se programan las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso para cada uno de los colaboradores que ingresaron al proyecto. **Ver Anexo 2. Exámenes médicos ocupacionales.**

6. MATRIZ DE PELIGROS

El Panorama de Factores de Riesgo se elaboró a partir de la Guía Técnica Colombiana GTC 45; para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud de los trabajadores, que establece las directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional; esta identificación, se hace a partir del Panorama de Factores de Riesgo, donde se debe hacer un reconocimiento de los riesgos, a los que están expuestos los trabajadores de John Emerson Rosas, determinando los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa, facilita la adopción de decisiones ya que permite priorizar las situaciones en función de su criticidad.

La matriz de peligros no se le han realizado modificaciones ya que no se han presentado riesgos diferentes a los expuestos, no se han presentado accidentes ni enfermedades laborales por las cuales debamos revalorizar la matriz de peligros. Dando prioridad a los riesgos con mayor probabilidad de causar accidentes, lesiones e incidentes de alto impacto se tomaron las siguientes medidas preventivas:

- Instalación de entibado de madera proporcionando seguridad y estabilidad en la excavación protegiendo a los trabajadores y el entorno laboral de posibles derrumbes.
- Instalación de barreras físicas y señalización visible para delimitar la zona de trabajo. Así mismo se realizó la instalación de señalización informativa.
- Verificación continua de las condiciones ambientales ya que si se presenta lluvia o movimientos sísmicos hay que suspender las labores.

- El material o residuos producto de la excavación se ubica de 0.80 a 1.00 metros del borde de la excavación y en lo posible se realiza la disposición final el mismo día.
- El área para intervenir debe permanecer en orden y aseo.
- Los trabajadores deben estar lejos del radio de riesgos de cualquier vehículo que sea cargado o descargado, maquinaria amarilla en movimiento para evitar posibles accidentes.
- Durante la operación de la maquinaria está prohibido la permanencia de personal dentro de la excavación.
- Habilitamos un sendero peatonal facilitando el desplazamiento seguro de la comunidad.
- Charlas de seguridad y uso de elementos de protección personal.
- Verificación del estado de la maquinaria (retroexcavadora y Minicargador) mediante la lista de inspección preoperacional ejecutado por cada uno de los operadores.
- Adecuación punto para la atención de emergencias (botiquín, camilla y extintor).

7. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES

En la matriz de requisitos legales se realizó la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividad propias e inherentes de nuestra actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Decreto 1072 de 2015). La cual se mantiene actualizada.

8. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

Es una herramienta preventiva clave para identificar, evaluar y controlar los riesgos antes de que el trabajador ejecute una tarea, permitiendo anticiparse a incidentes y garantizar un entorno laboral seguro. Ya que permite reconocer los riesgos potenciales antes de realizar cada actividad facilitando la implementación de medidas preventivas adecuadas. Es por esto por lo que se realiza la implementación del Análisis de Trabajo Seguro detectando peligros antes que se materialicen y disminuyendo la probabilidad de lesiones, enfermedades laborales y daños materiales. **Ver Anexo 3. Formato Análisis de Trabajo Seguro.**

9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las capacitaciones y las charlas en seguridad y salud en el trabajo tienen el objetivo de brindar conocimientos, sensibilizar al trabajador y fortalecer la cultura preventiva en la empresa reduciendo la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales.

Por lo tanto, se busca capacitar para analizar problemas, identificar sus causas, proponer soluciones, planear y adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales.

Además del conocimiento y habilidades que desarrollará el trabajador con las capacitaciones, esta permite que la empresa cumpla con el deber de prevención establecido en las normas sobre seguridad y salud laboral.

Para este periodo de ejecución se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Inducción al personal que ingreso.
- La importancia de la Señalización en excavaciones y señalización vial.
- Responsabilidad civil y penal.
- Gestión ambienta: definición, áreas de interés y bases legales.

En base al cronograma de capacitaciones para este periodo, el cumplimiento de ejecución es del 83% en el tercer trimestre, el cual se relaciona a continuación:

		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	VI TRIMESTRE
PROGRAMADA	Actividades Programadas	0	1	6	6
EJECUTADA	Actividades Ejecutadas	0	1	5	5
	% de Ejecución	#DIV/0!	100%	83%	83%

Ver Anexo 4. Registro de asistencia a capacitaciones y a charlas de seguridad.


9.1. Indicadores de cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento de Actividades	META	PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas	90%	Actividades ejecutadas	0	1	5	5
			Actividades programadas	0	1	6	6
			Cumplimiento de actividades	#¡DIV/0!	100%	83%	83%
			Acumulado o Promedio	0%	50%	61%	69%




9.2. Indicador de cobertura.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	Cobertura	META	PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	No de trabajadores que recibieron capacitación *100 /No. Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación según matriz de capacitación por cargo en el periodo	80%	No de trabajadores que recibieron capacitación en el periodo	0	8	15	0
			Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación según matriz de capacitación por cargo en el periodo	0	8	15	0
			COBERTURA	#¡DIV/0!	100%	100%	#¡DIV/0!
			Cobertura promedio acumulada	0%	50%	67%	#¡DIV/0!




9.3. Indicador de eficacia.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	EFICACIA	META	PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	No de evaluaciones aprobadas en el periodo*100 /No. De evaluaciones realizadas en el periodo	80%	No de evaluaciones aprobadas en el periodo	0	8	15	8
			No. De evaluaciones realizadas en el periodo	0	8	15	8
			EFICACIA	#¡DIV/0!	100%	100%	100%
			promedio de eficacia acumulado	0%	50%	67%	75%

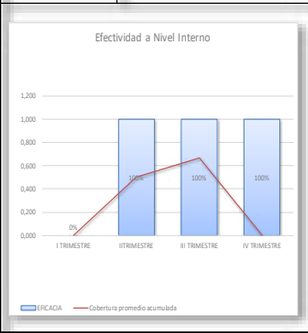

9.4. Indicador cobertura de la inducción

NOMBRE DEL INDICADOR	Cobertura de la inducción	META	MEDICIÓN PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	No de trabajadores que recibieron la inducción *100 /No. De Trabajadores que ingresaron en el trimestre	100%	No de trabajadores que recibieron inducción o re-inducción en el periodo	0	8	12	8
			Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación inducción o re-inducción	0	8	12	8
			COBERTURA	#¡DIV/0!	100%	100%	100%
			Cobertura promedio acumulada	0%	50%	67%	75%



9.5. Charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo.

Para este mes se realizaron charlas de seguridad abarcado diferentes temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y emergencias. **Ver Anexo 5. Registro de asistencia a charlas diarias.**

10. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION.

Se realizo entrega de dotación y elementos de proteccion personal requeridos para la labor, al igual se realizó el cambio de los epps en mal estado cada vez que el trabajador lo solicite. **Ver Anexo 6. Registro de entrega de elementos de proteccion personal.**







11. MAQUINARIA AMARILLA, EQUIPOS Y VEHICULOS UTILIZADOS EN LA OBRA

A continuación, se relacionan las maquinas los equipos y los vehículos usados en obra.

RELACION MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA	
MAQUINARIA	**MODELO**
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	420E
MINICARGADOR CATERPILLAR	262B
EQUIPOS	**MODELO**
APISONADOR MASALTA MOTOR GASOLINA	ROBIN SUBARU EH-12 3, 5HP
CORTADORA DE PAVIMENTO MASALTA MOTOR GASOLINA	Honda 13HP MF16-4
PULIDORA DEWALT	900W 12000Rpm
MARTILLO DEMOLEDOR	1700W JOULES
VEHICULOS	**MODELO**
CAMIONETA KIA K2700	2011
VOLQUETA DODGE D 600-157	1979

12. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES (AT) Y ENFERMEDADES LABORALES (EL).


Con el seguimiento realizado aseguramos que las acciones correctivas y preventivas se estén implementando de manera efectiva, disminuyendo la severidad de las lesiones o el impacto en la salud con el fin de reducir la probabilidad de que los eventos se repitan a futuro, disminuimos el ausentismo laboral y los costos asociados a incapacidades, reemplazos de personal y gastos médicos, logrando mejorar la confianza de los trabajadores en la ejecución de sus labores. A la fecha no se han presentado accidentes de origen laboral ni se han diagnosticado enfermedades laborales, a continuación, se adjunta el formato de seguimiento. **Ver Anexo 7. Formato de seguimiento de accidentes y enfermedades laborales.**

13. INDICADORES MINIMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0312 DE 2017

Los indicadores del SG-SST son una herramienta que nos permite evaluar los resultados de la gestión realizada, identificando las falencias e implementando

un plan de acción buscando la mejora. En base al seguimiento de los accidentes y las enfermedades laborales reportadas en el periodo se calculan los indicadores mínimos.

a. Indicador de severidad de los accidentes laborales.

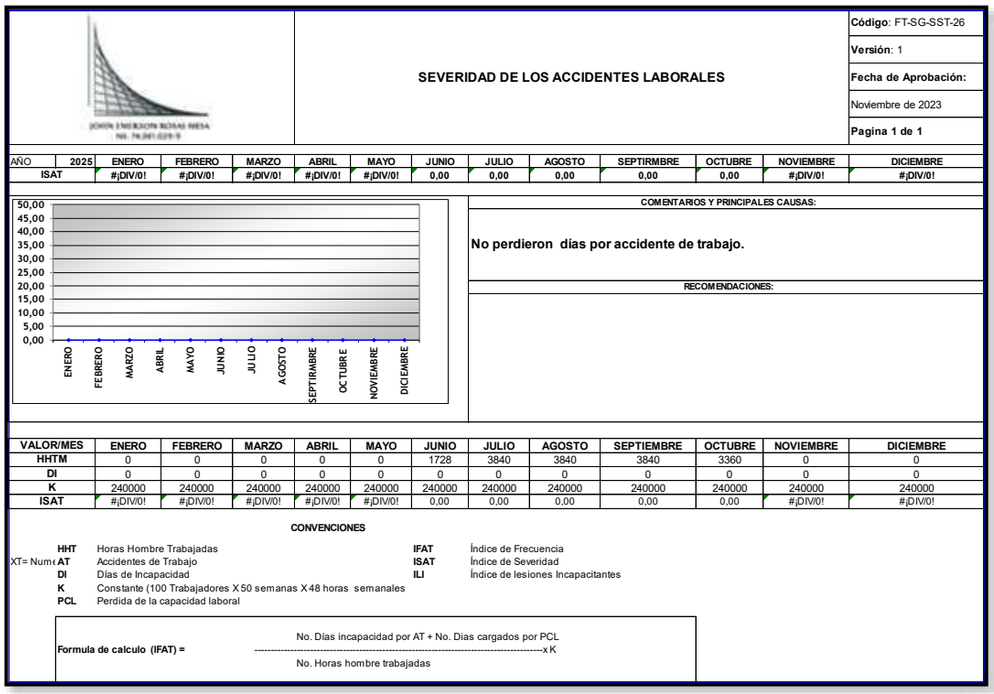

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Código: FT-SG-SST-26
Versión: 1
Fecha de Aprobación: Noviembre de 2023
Pagina 1 de 1

AÑO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIRMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No perdieron días por accidente de trabajo.

RECOMENDACIONES:

VALOR/MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HHTM	0	0	0	0	0	1728	3840	3840	3840	3360	0	0
DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
ISAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!


CONVENCIONES

XT= Numero promedio de trabajadores

HHT	Horas Hombre Trabajadas	**IFAT**	Índice de Frecuencia
AT	Accidentes de Trabajo	**ISAT**	Índice de Severidad
DI	Días de Incapacidad	**ILI**	Índice de lesiones Incapacitantes
K	Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales		
PCL	Perdida de la capacidad laboral		

Formula de calculo (IFAT) = (No. Días incapacidad por AT + No. Dias cargados por PCL) / (No. Horas hombre trabajadas) x K

b. Indicador de frecuencia de los accidentes laborales.

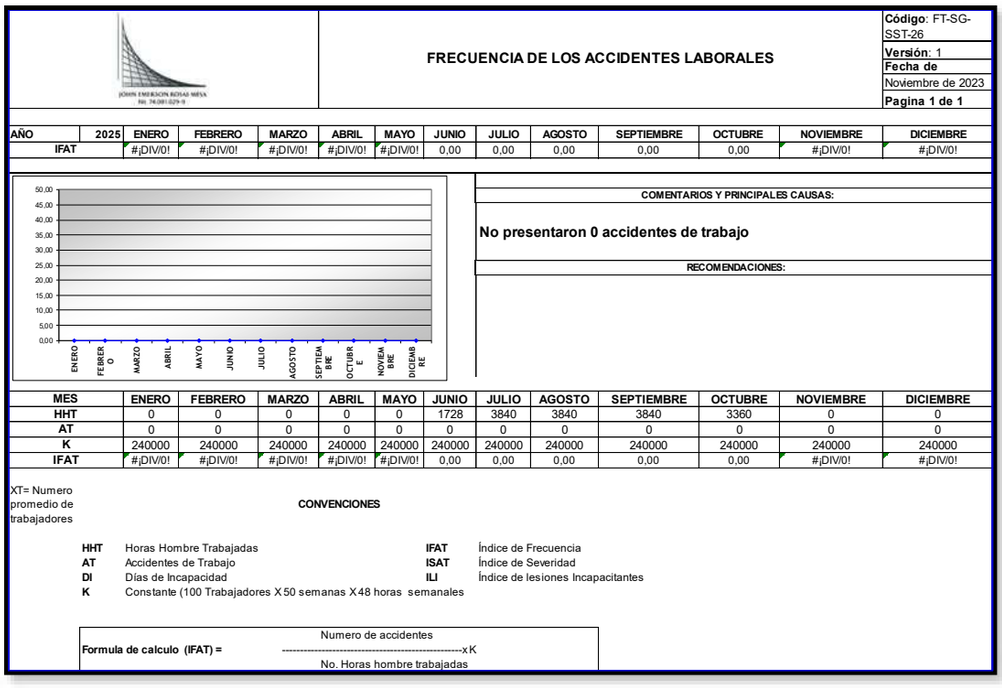

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Código: FT-SG-SST-26
Versión: 1
Fecha de Noviembre de 2023
Pagina 1 de 1

AÑO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IFAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No presentaron 0 accidentes de trabajo

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HHT	0	0	0	0	0	1728	3840	3840	3840	3360	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
IFAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Numero promedio de trabajadores

CONVENCIONES


HHT	Horas Hombre Trabajadas	**IFAT**	Índice de Frecuencia
AT	Accidentes de Trabajo	**ISAT**	Índice de Severidad
DI	Días de Incapacidad	**ILI**	Índice de lesiones Incapacitantes
K	Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales		

Formula de calculo (IFAT) = (Numero de accidentes) / (No. Horas hombre trabajadas) x K

c. Indicador de mortalidad de accidentes de trabajo.

	MORTALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO	**Código**: FT-SG-SST-26 **Versión**: 1 **Aprobación:** 2023 **Pagina 1 de 1**

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MAT		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron accidentes mortales

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. ATM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Numero promedio de trabajadores

CONVENCIONES


No. ATM Numero de accidentes de trabajo mortales
TAT Total de accidentes de trabajo
K 100 para obtener un procentaje
MAT Mortalidad de los accidentes de trabajo

Mortalidad de los accidentes de trabajo = (Numero de accidentes de trabajo mortales / Total de accidentes de trabajo) x 100

d. Indicador de prevalencia de la enfermedad laboral.

	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	**Código**: FT-SG-SST-26 **Versión**: 1 **Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PEL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron casos de enfermedad laboral en el periodo mencionado

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. CN y AEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PTTP	0	0	0	0	0	8	16	16	16	14	0	0
10 ^{n}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PEL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume

CONVENCIONES


No. CNyAEL No de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
PTTP Promedio total de trabajadores en el periodo
10^{n} 10 por el exponencial n
PEL Prevalencia de la enfermedad laboral

Formula de calculo (PEL) = (Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral / Promedio total de trabajadores en el periodo) x 10^{n}

e. Indicador de incidencia de la enfermedad laboral.

JOHN EMERSON ROSAS MEVA Nit. 74.081.029-9	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	**Código**: FT-SG-SST-26	
		Versión: 1	
		Aprobación:	Noviembre de 2023
		Pagina 1 de 1	

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IEL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron casos de enfermedad laboral en el periodo

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. CN y AEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PTTP	0	0	0	0	0	8	16	16	16	14	0	0
10 ^{n}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
IEL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume **CONVENCIONES**


No. CNEL	Numero de casos nuevos de enfermedad laboral
PTTP	Promedio total de trabajadores en el periodo
10^{n}	10 por el exponencial n
IEL	Incidencia de la enfermedad laboral

Formula de calculo (PEL) = $\dfrac{\text{Numero de casos nuevos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^{n}$

f. Indicador de ausentismo laboral.

JOHN EMERSON ROSAS MEVA Nit. 74.081.029-9	AUSENTISMO LABORAL	**Código**: FT-SG-SST-26	
		Versión: 1	
		Fecha de Aprobación:	Noviembre de 2018
		Pagina 1 de 1	

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ausentismo		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presento ausentismo laboral

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. DA X IL y C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. DTP	0	0	0	0	0	27	30	30	30	30	0	0
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ausentismo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume **CONVENCIONES**

No. DA X IL y C	Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral y comun
No. DTP	Numero de dias de trabajo programados
K	100 para obtener un porcentaje

Ausentismo = $\dfrac{\text{Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral y comun}}{\text{Numero de dias de trabajo programados}} \times 100$

14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad identifican los peligros mediante el estudio de las condiciones en el lugar de trabajo o en las fuentes de peligro; son fundamentales ya que ayudan a prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones o por los accidentes de trabajo.

En el desarrollo de las actividades propias del contrato se realizan las siguientes inspecciones:

a. Inspecciones de Elementos de Proteccion Personal.

Se realiza verificación a cada uno de los colaboradores del estado y tenencia de los elementos de proteccion personal, se realiza el cambio del Epps y dotación que se encuentren en mal estado. **Ver Anexo 9. Registro de inspección de elementos de proteccion personal.**

b. Inspecciones locativas frente de obra.

i. ***Inspección punto ecológico:*** Se ejecuto la inspección al punto ecológico, se evidencia canecas señalizadas se encuentran en buenas condiciones generales se encentran rotuladas y tapadas. **Ver Anexo 10. Registro de inspección de punto ecológico.**



ii. ***Inspección de instalaciones locativas administrativas*****:** Se evidencia buen estado del área administrativa, no contamos con unidades sanitarias portátiles, se realiza uso de unidad sanitaria de la vivienda de la señora Marlen. Se cubren con plástico negro calibre 16 los materiales pétreos. **Ver Anexo 10. Registro de inspección de instalaciones locativas y administrativas.**

iii. ***Inspección gestión de residuos:*** Se cuenta con punto ecológico, no se evidencia generación de residuos peligrosos, la separación en la fuente de los residuos ordinarios y reciclables se está realizando conforme al código de colores establecido por la Resolución 2184 de 2019. **Ver Anexo 10. Registro de inspección Gestión de Residuos.**

iv. ***Inspección orden y aseo:*** Se cumple con los ítems relacionados en el formato FT-SG-SST-13, se cuenta con extintor de 20 libras y un botiquín tipo A en el área administrativa, se evidencia en el área de almacenamiento de herramientas falta de orden y aseo, se programa orden y aseo. **Ver Anexo 10. Registro de inspección orden y aseo.**

c. Inspecciones a los elementos de emergencia

i. ***Inspección a camilla de emergencia:*** Se realizo inspección de la camilla de emergencias evidenciando el buen estado en el que se encuentra, las correas al igual que los inmovilizadores se encuentran en buen estado. Se encuentra señalizada. **Ver Anexo 11. Registro de inspección camilla para la atención de emergencias.**



ii. ***Inspección a botiquín de primeros auxilios:*** Se realizo la inspección a los botiquines de la retroexcavadora y camioneta kia, se dotan cada uno de ellos con los insumos que tiene un botiquín tipo A. Se encuentran limpios y señalizados. **Ver Anexo 11. Registro de inspección de botiquín de 1primeros auxilios.**



Campamento



Retroexcavadora



Minicargador



Camioneta de estacas



Oficina

iii. ***Inspección a extintores:*** En el área administrativa se verifica el estado del extintor de 20 libras el cual se encuentra en buenas condiciones generales, señalizado y demarcado**;** extintor de 5 libras en la cabina de la retroexcavadora, minicargador y camioneta kia en buenas condiciones generales. **Ver Anexo 11. Registro de inspección extintores.**

 Minicargador	 Retroexcavadora	 Oficina

ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	MANUELA JIMENEZ	JOHN EMERSON ROSAS

		
Camioneta de estacas	Campamento	

d. **Inspección preoperacional a equipos, máquinas y herramientas:** Se diligencian los pre- operacionales de las herramientas los equipos y maquinas a usar en la ejecución de la obra. **Ver Anexo 12. Registro de inspección Preoperacional de máquinas, equipos y herramientas.**

15. REGISTRO FOTOGRAFICO.



JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**JOHN EMERSON ROSAS** **INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	MANUELA JIMENEZ	JOHN EMERSON ROSAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919419804	9494602703	E	2025/11/07	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA		$354,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74750111	RAMIREZ JOHN		X																25-14	3	$22,800	EPS037	3	$5,700	CCF10	3	$5,700	14-11	3	6.96	$10,000	3	$0	Si	$44,200
2	CC	1116545920	RAMIREZ MAURICIO		X																231001	3	$22,800	EPS037	3	$5,700	CCF10	3	$5,700	14-11	3	6.96	$10,000	3	$0	Si	$44,200
3	CC	1057570638	RIVEROS CARLOS		X																25-14	18	$136,700	EPS037	18	$34,200	CCF10	18	$34,200	14-11	18	6.96	$59,500	18	$0	Si	$264,600
Total	**Afiliados(3)**																						$182,300			$45,600			$45,600				$79,500		$0		$353,000

2025/11/11 11:54 AM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919419804	9494602703	E	2025/11/07	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA		$354,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$182,300	$0	$182,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$22,800	$0	$22,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$159,500	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$79,500	$0	$79,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$79,500	$0	$79,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$45,600	$0	$45,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$45,600	$0	$45,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$45,600	$0	$45,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$45,600	$0	$45,800
TOTAL				3	$353,000	$0	$354,200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74372715
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO LEMUS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS 1D 45	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7994197562**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918908609	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 500**	**$ 228.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 178.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 200	$ 0	$ 99.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 99.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 28.500	$ 100	$ 28.600
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 100**	**$ 28.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 74372715	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	74372715	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 534.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9533851
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME BARRERA OJEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 6 22 PISO 3	TELÉFONO:	7710139
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7992944182**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1918841022

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																													PENSIÓN									SALUD							ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9533851	BARRERA OJEDA JAIME	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	9533851	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 277.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007413791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN ANDRES LOPEZ MOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 1C SUR 1E 06	TELÉFONO:	7710239
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7994198216**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918946090	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD					ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007413791	LOPEZ MOLANO JOHAN ANDRES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100741379	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-11, 11:58:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81099824

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 10/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	10	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007343156	GERARDO AVELLA GUTIERREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1020752084	JOHANA CAROLINA PATIÑO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1051589941	JAIRO ALONSO ROSAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1054283864	FERNEY DARIO GARCIA GUTIERREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057598366	JESUS ALEXANDER PEREZ SIERRA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1116664606	CESAR LEONARDO PEREZ TREJOS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1118549653	CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 74185842	ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 9396749	PASCUAL SIERRA GUTIERREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 9530903	BAUDILIO SANCHEZ CARDENAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 2.278.000	$ 570.000	$ 991.000	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.409.000	$ 0	$ 4.409.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057611444	JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA	CL 28 sur 13A 30	7777777777	jmanuela214@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	90729682	$504.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	504.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057611444	JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA		CL 28 sur 13A 30	7777777777	jmanuela214@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	90729682	$504.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057611444	JIMENEZ FONSECA JULIETH MANUELA	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 02:22:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81097880

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 14/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74081029	JOHN EMERSON ROSAS MESA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.100.000	$ 656.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.100.000	$ 512.500	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 0	$ 656.000	$ 512.500	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900	$ 0	$ 1.453.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MEDICINA Y SEGURIDAD DE BOYACÁ
NIT. 900430902

Cel 310 212 0795
Calle 34 No. 15 - 24 - Tunja - Boyaca
Email. centrointegral'deboyaca@gmail.com

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

APELLIDOS		NOMBRES	FECHA
Avella Gutierrez		Gerardo	20/10/25
NO IDENTIFICACIÓN	EDAD	CARGO / EMPRESA	
1.007.343.156		Ayud. Construcción - John ROSOS	

TIPO DE EXAMEN	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	REINTENTEGRO	REUBICACIÓN	EXAMEN DE ALTURAS
	✓					

EXÁMENES PRACTICADOS

EXAMEN		EXAMEN		EXAMEN	
EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL	✓	ESPIROMETRÍA		LABORATORIO.	
OPTOMETRÍA/VISIOMETRÍA		AUDIOMETRÍA		OTROS	

RESULTADO VALORACIÓN MÉDICA
EXAMEN DE INGRESO

AL EXAMEN MÉDICO NO PRESENTA DEFECTOS NI PATOLOGÍAS	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL	
NO APTO	
APTO CON RESTRICCIONES — CUALES:	

EXAMEN PERIÓDICO

EXAMEN MÉDICO SATISFACTORIO PUEDE SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS LABORES	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES PERO QUE NO LIMITAN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REMISIÓN A LA EPS/ARL	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REUBICACIÓN LABORAL	

EXAMEN DE RETIRO

SATISFACTORIO		
NO SATISFACTORIO		MOTIVO:

TRABAJO EN ALTURAS

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

MÉDICAS		OCUPACIONALES		ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	
Remisión a EPS		Uso de EPP	✓	Inicio de actividad Física	
Continuar manejo médico		Ingreso al SVE		Dejar de Fumar	
Remisión a ARL		Ruido		Reducir consumo de alcohol	
Seguimiento del caso por ARL		Visual		Control de peso	
		Psicolaboral		Cual	

RECOMENDACIONES GENERALES - Ejercicio Diario
- Alimentación Saludable

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN DE MI ESTADO DE SALUD. TODO PUEDE SER VERIFICADO Y CONFIRMADO

MEDICINA Y SEGURIDAD DE BOYACÁ NIT. 900 430902 CESAR AUGUSTO RIOS MEDICINA ESPECIALIZADA REGISTRO PROFESIONAL 1058/2019

CESAR AUGUSTO RIOS
MEDICINA ESPECIALIZADA
REGISTRO PROFESIONAL 1058/2019

FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Código:	FT-SG-SST- 68
		Versión:	1
		Fecha:	nov-23

Proyecto : Construccion red de alcantarillado Sanitario, pluvial y de acueducto		Ubicación donde se realiza el trabajo: vereda la Reforma	
Fecha de realización del Trabajo: 06 de octubre al 03 de noviembre 2025		Lugar de Trabajo: Vereda Guacaira Sector la reforma	
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07 AM		Hora de Finalización (a.m./p.m.): 05 :00 pm	

Descripción de la tarea a realizar: Instalación de tubería sanitaria, pluvial y de acueducto

El trabajo a realizar incluye: excavaciones — Trabajos en altura ☐ — Trabajo en caliente ☐ — Trabajos en lineas de alta tension ☐ — Trabajos en espacios confinados ☐ — Otro; cual ☒

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL				EQUIPOS A USAR	HERRAMIENTAS A USAR
Casco	☒	Orejeras	☐	Apisonador	picas, palas, azadon, barras
Gafas de seguridad	☒	Guantes	☒	pulidora	carretillas, pantero, maceta.
Protector respiratorio	☒	Botas de seguridad	☒	Mezcladora	
Protector auditivo	☒				
Otro epps	☐	Cual?			

Nº	PASOS DE LA TAREA	PELIGRO (Fuente o situacion)	CONSECUENCIA	CONTROLES	RESPONSABLE
1	ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTA	**Biologico:** Mordeduras De Animales, Picaduras De Insectos	Mordeduras De Perros, Picaduras De Insectos, Sancudos, Avejas, Avispas	Uso de los elemetos de proteccion personal.	Residente siso, residente de obra y trabajadores
		Locativo: Caidas al mismo nivel - piso resbaloso	Golpes, Heridas, Torceduras	Charlas de seguridad, orden y aseo y uso de epp	Residente siso, residente de obra y trabajadores
		Mecanico: maquinaria en mal estado	Daño a la propiedad, contaminacion del aire y suelo	Inspeccion preoperacional, y mantenimiento preventivo de la maquina y uso de epp	Residente de obra y operador
		Diversas Condiciones Climaticas -	Insolacion,Resfriados,Dolor De Cabeza, deshidratacion	Uso de epp, bloqueador solar, punto de hidratacion , suspender actividades en caso de lluvia y uso de ropa de invierno.	Residente siso, residente de obra y trabajadores
2	INGRESO A LA OBRA	**Biologico:** Mordeduras De Animales, Picaduras De Insectos	Mordeduras De Perros, Picaduras De Insectos, Sancudos, Avejas, Avispas	Uso de los elementos de proteccion personal	Residente siso, residente de obra y trabajadores
		Locativo: Caidas al mismo nivel - piso resbaloso	Golpes, Heridas, Torceduras	Inspeccion previa de la zona de trabajo Charlas de seguridad, orden y aseo y uso de epp	Residente siso, residente de obra y trabajadores
3	CORTE , REMOCION DE LA SECCION DE PAVIMENTO Y EXCAVACION	**Locativo:** Caidas al mismo nivel - piso resbaloso	Golpes, Heridas, Torceduras	Charlas de seguridad, orden y aseo	Residente siso, residente de obra y trabajadores
		Mecanico: Mal posicionamiento de la maquina	Volcamiento , Heridas Atrapamientos	Realizar una buena ubicación de la maquina, selaizacion y demarcacion de las areas y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Mecanico: Transito de personas dentro del radio de giro o de accion de la maquina	Atropellamientos, golpes, heridas y contusiones	Señalizacion y demarcacion de las areas , sendero peatonal, Distanciamiento en el area de operación y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Psicosocial: Estado animico del operador	Estrés Por Monotonia O Por Presion De Cumplimiento De Tareas	Pausas activas, charlas de seguridad y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Locativo: Desprendiemientos de material - tierras	Sepultamientos, asfixia, heridas y fracturas.	Instalacion de entivado, señalizacion y demarcacion de las areas a intervenir, uso de elementos de proteccion personal.	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Locativo: Terreno inestable	Volcamiento de la maquina, desprendiemiento de material, sepultamientos	Instalacion de entibado , Ubicación de material de excavacion de 60cm a 1 m del borde de la excavacion y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Locativo: Caidas al mismo nivel - piso resbaloso	Caidas Del Mismo Y Diferente Nivel, Golpes, Heridas, Torceduras	Charlas de seguridad, orden y aseo y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Locativo: Caidas de personal al interior de la excavacion	Caidas Del Mismo Y Diferente Nivel, Golpes, Heridas, Torceduras	Señalizacion y demarcacion de las areas , charla de seguridad y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Diversas Condiciones Climaticas -	Insolacion,Resfriados,Dolor De Cabeza, deshidratacion	Uso de epp, montera, y dotacion de invierno punto de hidratacion , suspender actividades en caso de lluvia	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Fenomenos Naturales: Inundaciones	Desestabilizacion del terreno, caidas, torceduras	Extraccion del agua manualmente, uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
4	TRANSPORTE DEL MATERIAL DE EXCAVACION	**Fisico:** Exposicion a ruido	Estrés , Dificultad para dormir, Hipoacusia, tinitus	Uso de epps, pausas activas, no exceder el tiempo de exposicion	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Psicosocial: Estado animico del conductor	Acoso laboral derivado de la mala organización del trabajo, estrés derivado de los altos ritmos de trabajo y de exceso de jornada, fatiga mental	Pausas Activas, organizar las tareas, charlas de concientizacion y uso de epps	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Biomecanico: Posturas (Prolongada, Mantenida, Forzada, Antigravitacional).	Alteraciones Osteomusculares De Espalda Y Extremidades.	Pausas activas, charlas de seguridad y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Locativo: Caidas a mismo y diferente nivel	Caidas Del Mismo Y Diferente Nivel, Golpes, Heridas, Torceduras	charla sobre tecnica de autocuidado, orden y aseo y uso de epps.	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Condiciones de seguridad: Accidente de transito	Golpes, Heridas, fracturas y Lesiones traumaticas graves	Usar el cinturón de seguridad, No usar el telefono cuando el vehiculo este en movimiento, reduccion de la velocidad capacitacion en seguridad vial	Conductor
5	ATRAQUE EN MATERIAL TRITURADO, INSTALACION DE TUBERIA Y RELLENO EN MATERIAL TRITURADO	**Biologico:** Exposicion a virus	Infecciones gastrointestinales y respiratorias	Uso de tapabocas, lavado de manos, charlas de seguridad e autocuidado y uso de epps	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Fisico: Ruido	Estrés , Dificultad para dormir, Hipoacusia, tinitus	Uso de epps, pausas activas, no exceder el tiempo de exposicion y rotacion de puesto de trabajo.	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Fisico: Temperaturas extremas (frio y calor)	Insolacion,Resfriados,Dolor De Cabeza, deshidratacion	Uso de epp, montera, y dotacion de invierno punto de hidratacion , suspender actividades en caso de lluvia	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Quimico: exposicion a material particulado	sintomas respiratorios aumentados, como irritación en las vias respiratorias, tos o dificultad para respirar.	Uso de epp, charlas de seguridad,	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Psicosocial: Gestion organizacional - estilo de mando	Estrés, conductas agresivas, comportamiento hostiles , alto nivel de rotacion del personal	Capacitacion en comuinicacion asertiva, toma de desiciones democraticamente	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Biomecanico: Manipulacion manual de cargas	Lumbalgias, hernias, daños en columna vertebral	No exceder los limites d epeso a levantar, trabajo en equipo para repartir el peso a levantar , tecnicas de levantamiento manual de cargas, uso epps y charlas de seguridad	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Condiciones de seguridad: Maquinaria en movimiento y Transito de personas dentro del radio de giro o de accion de la maquina	Atropellamientos, golpes, heridas y contusiones	Señalizacion y demarcacion de las areas , sendero peatonal Distanciamiento en el area de operación y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Condiciones de seguridad: locativo caidas a mismo y diferente nivel	Golpes, torceduras, laceraciones, luxaciones, contusiones, esguinces y fracturas.	Inspeccion visual del area a intervenir, señalizacion del area, orden y aseo, charlas de seguridad y uso epps	Residente de obra, residente siso y trabajadores
6	RELLENO EN MATERIAL AFIRMADO Y COMPACTACION EN CAPAS	**Biologico:** Exposicion a virus	Infecciones gastrointestinales y respiratorias	Uso de tapabocas, lavado de manos, charlas de seguridad e autocuidado y uso de epps	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Fisico: Ruido	Estrés , Dificultad para dormir, Hipoacusia, tinitus	Uso de epps, pausas activas, no exceder el tiempo de exposicion y rotacion de puesto de trabajo.	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Fisico: Temperaturas extremas (frio y calor)	Insolacion,Resfriados,Dolor De Cabeza, deshidratacion	Uso de epp, montera, y dotacion de invierno punto de hidratacion , suspender actividades en caso de lluvia	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Quimico: exposicion a material particulado	Síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vias respiratorias, tos o dificultad para respirar.	Uso de epp, charlas de seguridad,	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Psicosocial: Gestion organizacional - estilo de mando	Estrés, conductas agresivas, comportamiento hostiles , alto nivel de rotacion del personal	Capacitacion en comuinicacion asertiva, toma de desiciones democraticamente	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Biomecanico: Manipulacion manual de cargas	Lumbalgias, hernias, daños en columna vertebral	No exceder los limites d epeso a levantar, trabajo en equipo para repartir el peso a levantar , tecnicas de levantamiento manual de cargas, uso epps y charlas de seguridad	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Condiciones de seguridad: Maquinaria en movimiento y Transito de personas dentro del radio de giro o de accion de la maquina	Atropellamientos, golpes, heridas y contusiones	Señalizacion y demarcacion de las areas , sendero peatonal Distanciamiento en el area de operación y uso de epp	Residente de obra, residente siso y trabajadores
		Condiciones de seguridad: locativo caidas a mismo y diferente nivel	Golpes, torceduras, laceraciones, luxaciones, contusiones, esguinces y fracturas.	Inspeccion visual del area a intervenir, señalizacion del area, orden y aseo, charlas de seguridad y uso epps	Residente de obra, residente siso y trabajadores

Preguntas para considerar antes del inicar el trabajo

Este trabajo esta autorizado ?	SI	NO	NA	Hay orden y aseo en el area de trabajo?	SI	NO	NA
He sido entrenado para este trabajo	SI	NO	NA	La iluminacion permite hacer un trabajo seguro?	SI	NO	NA
Estoy calificado para realizar este trabajo?	SI	NO	NA	El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	NO	
Conozco los riesgos de este trabajo?	SI	NO	NA	Identifico y conozco los insumos quimicos?	SI	NO	NA
Tengo los EPP requeridos?	SI	NO	NA	Este trabajo se a comunicado a quien pueda afectar ?	SI	NO	NA
Tengo los equipos y herramientas mecesarias?	SI	NO	NA	Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	NO	NA
He revisado el area de trabajo?	SI	NO	NA	Estoy libre del efecto de alguna sustancia psicoactiva?	SI	NO	NA
Cuenta con la señalizacion necesaria?	SI	NO	NA	Fue identificado el peligro mas critico de la actividad?	SI	NO	NA
Conozco el procedimiento en caso de emergencia?	SI	NO	NA	Se aseguro dar respuesta a todas las preguntas del ATS?	SI	NO	NA

VALIDACION Y APROBACION			
NOMBRE Y APELLIDOS	**N° DE CEDULA**	**CARGO**	**FIRMA**
Manuela Jimenez	1057611444	Residente de obra	Manuela Jimenez
Johana Carolina Patiño	1020752084	Residente siso	Carolina Patiño

SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD **SI** [X] **NO** [ ]

TRABAJDORES EJECUTORES

FECHA : 01 al 04 de Octubre 2025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA N°	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Fabio Lemus	74372715	Maestro			Fabio Lemus	Fabio Lemus	Fabio Lemus	Fabio Lemus
2	Johan Lopez	1007413791	Ayudante			Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez
3	Jaime Barrera	9533851	Ayudante			Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera
4	Cesar Mendoza	1118549653	Ayudante			Cesar Mendoza	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza
5	Roberto Lopez Cardenas	74185842	Ayudante			Roberto	Roberto	Roberto	Roberto
6	Baudilo Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante			Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez
7	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante			Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia
8	Alexander Perez Sierra	1057598366	Ayudante			Alexander Perez	Alexander Perez	Alexander Perez	Alexander Perez
9	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante			Pascual Sierra	Pascual S	Pascual S	Pascual S
	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial			Cesar	Cesar	Cesar	Cesar
10	Carlos Alveiro Riveros	1057570638	Ayudante			Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
Fecha: 06 al 11 de octubre de 2025				**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
1	Fabio Lemus	74372715	Maestro	Fabio Lemus	Fabio Lemus	Fabio Lemus	Fabio Lemus	Fabio Lemus	Fabio Lemus
2	Johan Lopez	1007413791	Ayudante	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez	Johan Andrés Lopez
3	Jaime Barrera	9533851	Ayudante	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera
4	Cesar Mendoza	1118549653	Ayudante	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza	Cesar Mendoza
5	Roberto Lopez Cardenas	74185842	Ayudante	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto
6	Baudilo Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez	Baudilo Sanchez
7	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia
8	Alexander Perez Sierra	1057598366	Ayudante	Alexander Perez	Alexander Perez	Alexander Perez	Alexander Perez	Alexander Perez	Alexander Perez
9	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante	Pascual S	Pascual S	Pascual S	Pascual S	Pascual S	Pascual S
10	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar
11	Carlos Alveiro Riveros	1057570638	Ayudante	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos

Fecha: 13 al 18 de Octubre de 2025				LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Fabio Lemus	74372715	Maestro						
2	Johan Lopez	1007413791	Ayudante						
3	Jaime Barrera	9533851	Ayudante						
4	Cesar Mendoza	1118549653	Ayudante						
5	Roberto Lopez Cardenas	74185842	Ayudante						
6	Baudilo Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante						
7	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante						
8	Alexander Perez Sierra	1057598366	Ayudante						
9	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante						
10	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial						
11	Carlos Alveiro Riveros	1057570638	Ayudante						
Fecha: 20 al 25 de Octubre de 2025				**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
1	Fabio Lemus	74372715	Maestro						
2	Cesar Mendoza	1118549653	Ayudante						
3	Roberto Lopez Cardenas	74185842	Ayudante						
4	Baudilo Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante						
5	Johan Lopez	1007413791	Operador						
6	Jaime Barrera	9533851	Operador						
7	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante						
8	Alexander Perez Sierra	1057598366	Ayudante						
9	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante						
10	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial						
11	Gerardo Avella	1007343156	Ayudante						
Fecha: 27 de octubre al 01 de noviembre de 2025				**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
1	Fabio Lemus	74372715	Maestro						
2	Cesar Mendoza	1118549653	Ayudante						
3	Roberto Lopez Cardenas	74185842	Ayudante						
4	Baudilo Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante						
5	Johan Lopez	1007413791	Operador						
6	Jaime Barrera	9533851	Operador						
7	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante						
8	Alexander Perez Sierra	1057598366	Ayudante						

9	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante	Pascual S	Pascual S	Pascual S	Pascual S	Pascual S	Pascual S
10	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial						
11	Gerardo Avella	1007343156	Ayudante	Gerardo Avella	Gerardo Avella	Gerardo Avella	Gerardo Avella	Gerardo Avella	Gerardo Avella

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FT-SG-SST-31

version 2

FECHA	21-10-2025.	**FRENTE / CONTRATISTA**	**REALIZADA POR**	**NOMBRE**	Carolinca Patiño
PROYECTO	Construccion red de alcantarillado sanitario, pluvial y de acueducto de la vereda monquira sector la reforma de sogamoso	JOHN EMERSON ROSAS MESA		**CÉDULA**	1020785084
TEMA	Induccion SST			**EMPRESA**	John Emerson Rosas.
				FIRMA	

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Gerardo Avella Gutierrez	1007343156	Ayudante	Gerardo Avella.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES: Actividad sin ninguna novedad.

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FT-SG-SST-31

version 2

FECHA	04-10-2025	**FRENTE / CONTRATISTA**	**REALIZADA POR**	**NOMBRE**	Johana C Patiño
PROYECTO	Construccion red de alcantarillado sanitario, pluvial y de acueducto de la vereda monquira sector la reforma de sogamoso	JOHN EMERSON ROSAS MESA		**CÉDULA**	1020752084
TEMA	Importancia de la señalización en excavaciones y señalizacion vial			**EMPRESA**	John Emerson Rosas.
				FIRMA	

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	John Emerson Rosas Mesa	74081029	Director de obra	
2	Julieth Manuela Jiménez Fonseca	1057611444	Residente	
3	Johana Carolina Patiño	1057611444	Sst	
4	Jairo Alonso Rosas	1020752084	Conductor	
5	Jaime Barrera	1051589941	Operador retro	
6	Johan Andres Lopez	9533851	Operador minicargador	
7	Fabio Del Jesus Lemus	74372715	Maestro general	
8	Roberto De Los Angeles Lopez	74185842	Ayudante	
9	Baudilio Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante	
10	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante	
11	Jesus Alexander Perez	1057598366	Ayudante	
12	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante	
13	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial	
14	Cesar Augusto Mendoza	1118549653	Ayudante	
15				

OBSERVACIONES:

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FT-SG-SST-31

version 2

FECHA	18-10-2025	**FRENTE / CONTRATISTA**	**REALIZADA POR**	**NOMBRE**	Johana Carolina Patiño
PROYECTO	Construccion red de alcantarillado sanitario, pluvial y de acueducto de la vereda monquira sector la reforma de sogamoso	JOHN EMERSON ROSAS MESA		**CÉDULA**	1020752084
TEMA	Responsabilidad Civil y Penal			**EMPRESA**	John Emerson Rosas
				FIRMA	

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	John Emerson Rosas Mesa	74081029	Director de obra	
2	Julieth Manuela Jiménez Fonseca	1057611444	Residente	
3	Johana Carolina Patiño	1057611444	Sst	
4	Jairo Alonso Rosas	1020752084	Conductor	
5	Jaime Barrera	1051589941	Operador retro	
6	Johan Andres Lopez	9533851	Operador minicargador	
7	Fabio Del Jesus Lemus	74372715	Maestro general	
8	Roberto De Los Angeles Lopez	74185842	Ayudante	
9	Baudilio Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante	
10	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante	
11	Jesus Alexander Perez	1057598366	Ayudante	
12	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante	
13	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial	
14	Cesar Augusto Mendoza	1118549653	Ayudante	
15				

OBSERVACIONES:

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: FT-SG-SST-31

version 2

FECHA	25-10-2025	**FRENTE / CONTRATISTA**	**REALIZADA POR**	**NOMBRE**	Johana Carolina Patiño
PROYECTO	Construccion red de alcantarillado sanitario, pluvial y de acueducto de la vereda monquira sector la reforma de sogamoso	JOHN EMERSON ROSAS MESA		**CÉDULA**	1020752084
TEMA	Gestion Ambiental: Definición areas de interes y bases legales			**EMPRESA**	John Emerson Rosas
				FIRMA	

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	John Emerson Rosas Mesa	74081029	Director de obra	
2	Julieth Manuela Jiménez Fonseca	1057611444	Residente	
3	Johana Carolina Patiño	1057611444	Sst	
4	Jairo Alonso Rosas	1020752084	Conductor	
5	Jaime Barrera	1051589941	Operador retro	
6	Johan Andres Lopez	9533851	Operador minicargador	
7	Fabio Del Jesus Lemus	74372715	Maestro general	
8	Roberto De Los Angeles Lopez	74185842	Ayudante	
9	Baudilio Sanchez Cardenas	9530903	Ayudante	
10	Ferney Dario Garcia	1054283864	Ayudante	
11	Jesus Alexander Perez	1057598366	Ayudante	
12	Pascual Sierra Gutierrez	9396749	Ayudante	
13	Cesar Leonardo Perez	1116664606	Oficial	
14	Cesar Augusto Mendoza	1118549653	Ayudante	
15	Gerardo Avella Gutierrez	1007343156	Ayudante	

OBSERVACIONES:

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: FT-SG-SST-74 Version: 01 Fecha de aprovacion: Enero 2023

Proyecto
Construcción de alcantarillado sanitario Rural y de acueducto
Responsable
Johana Carolina Patiño Fonseca
FECHA Del 06 al 11 de octubre 2025

Nº	Temas	Nº	Temas
1	Peligro, Riesgo y tipo de Peligros	4	Todo es cuestion de actitud
2	Socializacion Politica en SST	5	Socializacion Politica del no consumo alcohol tabaco y sustancias Psicoactivas
3	Socializacion Matriz de Peligros	6	La importancia del Cuidado de las manos

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº	1		Tema Nº	2		Tema Nº	3		Tema Nº	4		Tema Nº	5		Tema Nº	6	
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		06	10	2025	07	10	2025	08	10	2025	09	10	2025	10	10	2025	11	10	2025
1	Fabio del Jesus Tellis.	Fabiolens			Fabiolens			Fabiolens			Fabiolens			Fabiolens			Fabiolens		
2	Cesar Augusto Mendoza	Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza		
3	Roberto Lopez																		
4	Baudilio Sanchez	Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez		
5	Johan Andres Lopez	Johan A Lopez			Johan A Lopez			Johan A Lopez			Johan A Lopez			Johan A Lopez			Johan A Lopez		
6	Jaime Barrera	Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr		
7	Ferney Dario Garcia																		
8	Jairo Alexander Perez	Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez		
9	Pascual Sierra	pascual/sierra			pascual/sierra			pascual/sierra			pascual/sierra			pascual/sierra			pascual/sierra		
10	Cesar Leonardo Trejos																		
11	Carlos Alvelro Riveros																		
12																			
13																			
14																			
15																			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: FT-SG-SST-74 Version: 01 Fecha de aprovacion: Enero 2023

Proyecto
Construccion de alcantarillado Sanitario Pluvial y de acueducto
Responsable
Johana Carolina Patiño Fonseca.
FECHA Del 14 al 18 de octubre 2025

Nº	Temas	Nº	Temas
1	identificacion de Riesgos en el area	4	la importancia de las pausas activas
2	Socializacion Procedimiento de trabajo Seguro retroexcavadora	5	Causas de las lesiones musculoesqueleticas en el sitio de trabajo
3	Socializacion PON para incendios	6	

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº 1			Tema Nº 2			Tema Nº 3			Tema Nº 4			Tema Nº 5			Tema Nº 6		
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		14	10	2025	15	10	2025	16	10	2025	17	10	2025	18	10	2025			
1	Fabio del Jesus Lemos	Fabulemos			Fabulemos			Fabulemos			Fabulemos			Fabulemos					
2	Cesar Augusto Mendoza	Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza					
3	Roberto lopez																		
4	Bacilio Sanchez	Bacilio Sanchez			Bacilio Sanchez			Bacilio Sanchez			Bacilio Sanchez			Bacilio Sanchez					
5	Johan Andres lopez	Johan lopez			Johan lopez			Johan lopez			Johan lopez			Johan lopez					
6	Jaime Barrera	Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr			Jaime Barr					
7	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia					
8	Jesus Alexander Perez	Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez					
9	Pascual Siera	pascual siera			pascual siera			pascual siera			pascual siera			pascual siera					
10	Cesar Leonardo Perez.																		
11	Caibo Alvero Rivero S.	Caibo Rivero			Caibo Rivero			Caibo Rivero			Caibo Rivero			Caibo Rivero					
12																			
13																			
14																			
15																			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: FT-SG-SST-74 Version: 01 Fecha de aprovacion: Enero 2023

Proyecto
Construcción de alcantarillado sanitario pluvial y de acueducto
Responsable
Johana Carolina Patiño Fonseca
FECHA Del 20 al 25 de octubre 2025

Nº	Temas	Nº	Temas
1	Mareados en la manipulación manual de cargas	4	Prevencion de lesiones osteomuscula-res
2	Socialización plan operativo normalizado Para explosición.	5	Socialización plan operativo normalizado Para Sismos
3	Higiene Postural	6	Manejo de estres laboral

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº	1		Tema Nº	2		Tema Nº	3		Tema Nº	4		Tema Nº	5		Tema Nº	6	
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		20	10	2025	21	10	2025	22	10	2025	23	10	2025	24	10	2025	25	10	2025
1	Fabio del Jesus Ieeus	Fabulers			Fabulers			Fabulers			Fabulers			Fabulers			Fabulers		
2	Cesa Augusto Mendoza	Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza		
3	Roberto lopez																		
4	Bacedilio Sanchez	Bacedilo Sanchez			Bacedilo Sanchez			Bacedilo Sanchez			Bacedilo Sanchez			Bacedilo Sanchez			Bacedilo Sanchez		
5	Johan. Andres lopez.	Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez		
6	Jaime Barrera	Jaime Barre			Jaime Barre			Jaime Barre			Jaime Barre			Jaime Barre			Jaime Barre		
7	Fernel Dario Garaa																		
8	Jesus Alexander Perez	Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez		
9	Pascual Sierra	pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra		
10	Cesar Eduardo Perez T																		
11	Gerardo Avella G.	Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella		
12																			
13																			
14																			
15																			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: FT-SG-SST-74 Version: 01 Fecha de aprovacion: Enero 2023

Proyecto
Responsable
FECHA

Nº	Temas	Nº	Temas
1	Uso correcto de tapabocas y proteccion respiratoria.	4	Prevencion de lesiones de columna
2	Hidratacion adecuada durante la Jornada	5	Prevencion de lesiones de columna
3	Puntos ciegos en la operacion de vehiculos y maquinaria amarilla	6	Peligros en excavaciones

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº		1	Tema Nº		2	Tema Nº		3	Tema Nº		4	Tema Nº		5	Tema Nº		6
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		27	10	2025	28	10	2025	29	10	2025	30	10	2025	31	10	2025	01	11	2025
1	Fabio de Jesus Lewis	Fabulus			Fabulewis			Fabulles			Fabulles			Fabulles			Fabulles.		
2	Cesar Augusto Mendoza	Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			Cesarmendoza			cesarmendoza		
3	Roberto Lopez	Profesional			Profesional			Profesional			Profesional			Profesional			Profesional		
4	Baudilio Sanchez	Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez			Baudilio Sanchez		
5	Johan Andres Lopez	Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez			Johan A lopez		
6	Jaime Barrera	Jaime Barr.			Jaime Barr.			Jaime Barr.			Jaime Barr.			Jaime Barr.			Jaime Barr.		
7	Ferney Dario Garcia	Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia			Ferney Dario Garcia		
8	Jesus Alexander Perez	Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez			Alexander Perez		
9	Pascual. Sierra.	pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra			pascual sierra		
10	Cesar Leonardo Perez																		
11	Gerardo Avella G	Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella			Gerardo Avella		
12																			

OBSERVACIONES:

	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	John Emerson Rosero Mesa	CEDULA No.	74.081.029
CARGO	Director de obra	AREA	Administrativa - Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1	7/06/2025	
2	Protector respiratorio desechable	1	7/06/2025	
3	Guante de nitrilo reforzado	1	7/06/2025	
4	Gafas de seguridad lente oscuro	1	7/06/2025	
5	Protector auditivo de insercion	1	7/06/2025	
6	Camisa manga larga	1	7/06/2025	
7	Pantalon en Jean	1	7/06/2025	
8	Botas de seguridad dielectricas	1	7/06/2025	
9	Protector Respiratorio desechable	1	08-06-25	
10	Guantes de nitrilo Reforzado	1	10-06-25	
11	Protecto Respiratorio Desechable	1	10-06-25	
12	Guantes de nitrilo reforzado	1	12-06-25	
13	Casco de Seguridad 2Safari	1	30-10-25	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA: Johana Carolina Patiño	FIRMA QUIEN RECIBE:
CEDULA: 1020752084	CEDULA: 74081029

	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Joheth Manuela Jimenez	CEDULA No.	1.057.611.444
CARGO	Residente de obra	AREA	Administrativo - Operativo

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco Dieléctrico de Seguridad	1	03-08-25	Manuela Jimenez
2	Protector Respiratorio Desechable	1	03-08-25	Manuela Jimenez
3	Protector Auditivo Inserción	1	03-08-25	Manuela Jimenez
4	Guantes de cuero Reforzado	1	03-08-25	Manuela Jimenez.
5	Camisa manga larga	1	08-08-25	Manuela Jimenez
6	Pantalon en jean.	1	03-08-25	Manuela Jimenez.
7	Botas de Seguridad con puntera.	1	03-08-25	Manuela Jimenez.
8	Botas de Caucho con puntera	1	03-08-25	Manuela Jimenez.
9	Protector Respiratorio Desechable	3	09-09-25	Manuela Jimenez
10	Protector Respiratorio Desechable	3	18-09-25	Manuela Jimenez
11	Protector Respiratorio Desechable	3	24-09-25	Manuela Jimenez
12	Protector Respiratorio Desechable	3	01-10-25	Manuela Jimenez.
13	Protector Respiratorio Desechable	3	07-10-25	Manuela Jimenez.
14	Protector Respiratorio Desechable	3	11-10-25	Manuela Jimenez.
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Manuela Jimenez.
CEDULA: 1020750084 Bogota.	CEDULA: 1057611.444.

	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Johana Carolina Patiño F	CEDULA No.	1.020.752.084
CARGO	SST	AREA	Administrativa - Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1	7/06/2025	Carolina Patiño
2	Protector respiratorio desechable	1	7/06/2025	Carolina Patiño
3	Guante de nitrilo reforzado	1	7/06/2025	Carolina Patiño
4	Gafas de seguridad lente oscuro	1	7/06/2025	Carolina Patiño
5	Protector auditivo de insercion	1	7/06/2025	Carolina Patiño
6	sombrero zafari en dril	1	7/06/2025	Carolina Patiño
7	Camisa manga larga	1	7/06/2025	Carolina Patiño
8	Pantalon en Jean	1	7/06/2025	Carolina Patiño
9	Botas de seguridad dielectricas	1	7/06/2025	Carolina Patiño
10	Botas dielectricas	1	20/08/25	Carolina Patiño
11	Casco dielectrico Safari	1	30/10/25	Carolina Patiño
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:
CEDULA: 1020752084	CEDULA: 1020752084

JOHN EMERSON ROSAS NIT. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Jairo Alonso Rosas Mesa	CEDULA No.	1.051.589.941
CARGO	Conductor - Apoyo a Residente	AREA	operativa - Administrativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1	9/06/2025	
2	Protector respiratorio desechable	1	9/06/2025	
3	Camisa manga larga oxford	1	9/06/2025	
4	pantalosn en jean	1	9/06/2025	
5	Guante de nitrilo reforzado	1	9/06/2025	
6	Botas de seguridad	1	9/06/2025	
7	Ropa de Invierno	1	24/06/25	
8	Guantes de nitrilo reforzado	1	02/07/25	
9	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	02/07/25	
10	Protector Respiratorio desechable	1	02/07/25	
11	Protector Auditivo de Insercion	1	02/07/25	
12	Nomtera en dril	1	02/07/25	
13	Guantes de nitrilo Reforzado	1	15/07/25	
14	Protector Respiratorio Desechable	1	15/07/25	
15	Guantes de nitrilo Reforzado	1	28/07/25	
16	Sombrero safari en drill	1	05/08/25	
17	Protector Respiratorio Desechable.	1	13/08/25	
18	Guantes de vaqueta	1	05-09/25	
19	Camisa offord tipo ingeniero	1	16/09/25	
20	Guantes de nitrilo reforzado	1	18-09-25	
21	Protector Respiratorio Desechable	3	22-09-25	
22	Guantes de nitrilo reforzado	1	30-09-25	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:
CEDULA: 1020752084 BOG	CEDULA: 1051589941

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Jaime Barrera	CEDULA No.	9.533 851
CARGO	Operada Retro	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1	09/06/25	Jaime Barrera
2	Protector respiratorio desechable	1	09/06/25	Jaime Barrera
3	Guante tejido recubierto de hule	1	09/06/25	Jaime Barrera
4	Camisa manga larga oxford	1	09/06/25	Jaime Barrera
5	pantalon en jean	1	09/06/25	Jaime Barrera
6	Botas de seguridad	1	09/06/25	Jaime Barrera
7	Ropa de invierno	1	24/06/25	Jaime Barrera
8	Goggles de nitrilo Reforzado	1	02/07/25	Jaime Barrera
9	Protector Respiratorio Desechable	1	02/07/25	Jaime Barrera
10	Gafas de Seguridad leute oxoro	1	02/07/25	Jaime Barrera
11	Protector Auditivo de insercion	1	02/07/25	Jaime Barrera
12	Protector Respiratorio Desechable	2	07/07/25	Jaime Barrera
13	Protector Respiratorio Desechable.	2	11/07/25	Jaime Barrera
14	Protector Respiratorio Desechable	2	14/07/25	Jaime Barrera
15	Protector Respiratorio Desechable	2	16/07/25	Jaime Barrera
16	Guantes de nitrilo Reforzado	1	16/07/25	Jaime Barrera
17	Protecta Respiratorio Desechable	2	21/07/25	Jaime Barrera
18	Protecta Respiratorio Desechable	2	24/07/25	Jaime Barrera
19	Protector Respiratorio Desechable	2	28/07/25	Jaime Barrera
20	Protector Auditivo de insercion	1	28/07/25	Jaime Barrera
21	Protector Respiratorio Desechable	2	31/07/25	Jaime Barrera
22	Protector Respiratorio Desechable	2	08/08/25	Jaime Barrera
23	Camisa Tipo ingeniero	2	11/08/25	Jaime Barrera
24	Pantalon en Jean	2	11/08/25	Jaime Barrera
25	Protector Respiratorio Desechable	2	16/08/25	Jaime Barrera
26	Guantes de nitrilo Reforzado	1	19/08/25	Jaime Barrera
27	Protector Respiratorio Desechable	1	22/08/25	Jaime Barrera
28	Protector Respiratorio Desechable	1	26/08/25	Jaime Barrera
29	Goggles de nitrilo reforzado	1	27/08/25	Jaime Barrera
30	Protector Respiratorio Desechable	1	30/08/25	Jaime Barrera
31	Casco de Seguridad Dielectrico	1	02/09/25	Jaime Barrera
26	Protecta Respiratorio Desechable	1	08/09/25	Jaime Barrera
27	Guantes de nitrilo reforzado	1	08/09/25	Jaime Barrera
28	Protector Respiratorio Desechable	1	15/09/25	Jaime Barrera
29	Protector Respiratorio Desechable	1	14/09/25	Jaime Barrera
30	Protector Respiratorio Desechable-	1	27/09/25.	Jaime Barrera
31	Goggles de nitrilo reforzado	1	02-10/25	Jaime Barrera
32	Protector Respiratorio reforzado	3	02-10-25	Jaime Barrera
33	Protecta Respiratorio Desechable	3	10-10-25	Jaime Barrera
34	Goggles de nitrilo reforzado		20-10-25	Jaime Barrera
35	Protector Respiratorio Desechable	3	29-10-25	Jaime Barrera
36	Pantalon en Jean	2	29-10-25	Jaime Barrera
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:
CEDULA: 1026252084	CEDULA: 9 531 855

CO.BO
MAYO
1XL

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Johan Andres Lopez Molano	CEDULA No.	1.007.413.791
CARGO	operador Rargador.	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	11-07-25	Johan Andres Lopez
2	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	11-07-25	Johan Andres Lopez.
3	Protector Auditivo de insercion.	1	11-07-25	Johan Andres Lopez
4	Protector Respiratorio Desechable	3	11-07-25	Johan Andres Lopez
5	Guantes de nitrilo Reforzado	1	11-07-25	Johan Andres Lopez.
6	Protector Auditivo de copa	1	11-07-25	Johan Andres Lopez
7	Camisa manga larga en Jean	1	11-07-25	Johan Andres Lopez
8	Pantalon en Jean	1	11-07-25	Johan Andres Lopez
9	Protector Respiratorio Desechable	3	16-07-25	Johan Andres Lopez
10	Protector Respiratorio Desechable	3	24-07-25	Johan Andres Lopez
11	Protector Respiratorio Desechable	1	29-07-25	Johan Andres Lopez
12	Protector Respiratorio Desechable	2	05-08-25	Johan Andres Lopez
13	Protector Respiratorio Desechable	2	12-08-25	Johan Andres Lopez
14	Guantes de vaqueta Reforzado	1	18-08-25	Johan Andres Lopez
15	Protector Respiratorio Desechable	1	22-08-25	Johan Andres Lopez
16	Protector Respiratorio Desechable	1	25-08-25	Johan Andres Lopez
17	Goggles de nitrilo Reforzado	1	29-08-25	Johan Andres Lopez
18	Goggles de vaqueta Reforzado	1	16/09/25	Johan Andres Lopez.
19	Protector Respiratorio Desechable	3	20/09/25	Johan Andres Lopez
20	Gafas de seguridad lente oscuro	1	22/09/25	Johan Andres Lopez.
21	Protector respiratorio desechable	3	26/09/25	Johan Andres Lopez
22	Protector Respiratorio Desechable.	3	03/10/25	Johan Andres Lopez.
23	Protecto Respiratorio Desechable	3	10/10/25	Johan Andres Lopez
24	Goggles de nitrilo Reforzado	1	10/10/25	Johan Andres Lopez
25	Protector Respiratorio Desechable	3	20-10-25	Johan Andres Lopez
26	Protector Respiratorio Desechable	3	27-10-25	Johan Andres Lopez
27	Camisa en Jean	1	29-10-25	Johan Andres Lopez
28	Pantalon en Jean	1	29-10-25	Johan Andres Lopez
29	Protector Auditivo Diadema	1	29-10-25	Johan Andres Lopez
30	Protecto Respiratorio Desechable.	3	01-11-25	Johan Andres Lopez
31				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Johan Andrés Lopez Molano
CEDULA: 1070757084 BOG.	CEDULA: 1007413791

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Fabio del Jesus Lemus	CEDULA No.	74 372 715
CARGO	Maestro	AREA	Operativo

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1	09/06/2025	Fabulens.
2	Protector respiratorio desechable	1	09/06/2025	Fabulens.
3	Guante tejido recubierto de hule	1	09/06/2025	Fabulens.
4	Camisa manga larga oxford	1	09/06/2025	Fabulens
5	pantalon en jean	1	09/06/2025	Fabulens.
6	Botas de seguridad	1	09/06/2025	Fabulens.
7	Ropa de invierno	1	24/06/2025	Fabulens.
8	Protector Respiratorio desechable	1	02/07/25	Fabulens.
9	Protector Auditivo de insercion	1	02/07/25	Fabulens.
10	Gafas de Seguridad lente Negro	1	02/07/25	Fabulens.
11	Guantes de nitrilo reforzado	1	02/07/25	Fabulens.
12	Tapabocas Desechable Negro	1	18/07/25	Fabulens.
13	Guantes de nitrilo reforzado	1	18/07/25	Fabulens.
14	Guantes de nitrilo Reforzado	1	23/07/25	Fabulens.
15	Protector respiratorio Desechable	1	26/07/25	Fabulens
16	Guante de nitrilo Reforzado	1	26/07/25	Fabulens.
17	Protector Respiratorio Desechable	1	28/07/25	Fabulens
18	Guante de nitrilo Reforzado	1	28/07/25	Fabulens.
19	Protector Auditivo de insercion.	1	28/07/25	Fabulens.
20	Guantes de Cuero calibre 35	1	29/07/25	Fabulens
21	Protector Respiratorio Desechable	2	29/07/25	Fabulens.
22	Guantes de nitrilo reforzado	1	05/08/25	Fabulens
23	Protector Respiratorio Desechable	2	05/08/25	Fabulens
24	Guantes de nitrilo reforzado	1	12/08/25	Fabulens
25	Guante de Vaqueta Reforzado	1	14/08/25	Fabulens
26	Protector Respiratorio Desechable	2	14/08/25	Fabulens
27	Protecta Respiratorio Desechable	2	20/08/25	Fabulens
28	Protector Respiratorio Desechable	2	25/08/25	Fabulens.
29	Guantes de vaqueta Reforzado	1	28/08/25	Fabulens.
30	Protecta Respiratorio Desechable	3	03/09/25	Fabulens
31	Protector Respiratorio Desechable.	3	08/09/25	Fabulens
26	Guantes de nitrilo Reforzado	1	08/09/25	Fabulens.
27	Protector Respiratorio Desechable	3	15/09/25	Fabulens.
28	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	17/09/25	Fabulens.
29	Protector Respiratorio Desechable	3	19-09-25	Fabulens.
30	Guantes de vaqueta reforzado	1	24-09-25	Fabulens.
31	Protecta respiratorio desechable	3	25-09-25	Fabulens.
32	Protector respiratorio desechable.	3	06-10-25	Fabulens
33	Guantes de nitrilo reforzado	1	15-10-25	Fabulens.
34	Protector Respiratorio Desechable	3	17-10-25	Fabulens
35	Protecta Respiratorio Desechable	3	21-10-25	Fabulens
36	Guantes de nitrilo reforzado	1	27-10-25	Fabulens
37	Protector Respiratorio Desechable	3	29-10-25	Fabulens
38	Guantes de nitrilo reforzado	1	30-10-25	Fabulens
39	Protector respiratorio Desechable	3	03-11-25	Fabulens.
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Fabulens
CEDULA: 1020752084 Bog	CEDULA: 74.372.715

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Cesar Augusto Mendoza	CEDULA No.	1.058.549.653
CARGO	Ayudante	AREA	operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1	18/06/25	Cesar mendoza
2	Protector respiratorio desechable	1	18/06/25	Cesar mendoza
3	Guante tejido recubierto de hule	1	18/06/25	Cesar mendoza
4	Botas de caucho worman	1	18/06/25	Cesar mendoza
5	Ropa de invierno	1	24/06/25	Cesar mendoza
6	Protector Respiratorio desechable	1	02/07/25	Cesar mendoza
7	Protector Aoditivo de inserción.	1	02/07/25	Cesar mendoza
8	Goggles de nitrilo reforzado	1	02/07/25	Cesar mendoza
9	Gafas de seguridad lente oscuro	1	02/07/25	Cesar mendoza
10	Camisa en Jean manga larga	1	11/07/25	Cesar mendoza
11	Pantalon en Jean	1	11/07/25	Cesar mendoza
12	Protector Respiratorio Desechable	1	18/07/25	Cesar mendoza
13	Guantes de nitrilo Reforzado	1	18/07/25	Cesar mendoza
14	Guantes de nitrilo Reforzado	1	23/07/25	Cesar mendoza
15	Protector Respiratorio Desechable	1	23/07/25	Cesar mendoza
16	Protector Respiratorio Desechable.	1	26/07/25	Cesar mendoza
17	Goggles de nitrilo Reforzado	1	26/07/25	Cesar mendoza
18	Protector Respiratorio Desechable	3	28/07/25	Cesar mendoza
19	Goggles de Caucho Cal 35	1	29/07/25	Cesar mendoza
20	Goggles de nitrilo Reforzado	1	05/08/25	Cesar mendoza
21	Guantes de vaqueta reforzado	1	08/08/25	Cesar mendoza
22	Protector Desechable Respiratorio	3	11/08/25	Cesar mendoza
23	Goggles de nitrilo reforzado	1	11/08/25	Cesar mendoza
24	Protector Respiratorio Desechable	3	19/08/25	Cesar mendoza
25	Protector Respiratorio Desechable	3	25/08/25	Cesar mendoza
26	Goggles de vaqueta Reforzado	1	27/08/25	Cesar mendoza
27	Protector Respiratorio Desechable.	1	03/09/25	Cesar mendoza
28	Botas de Caucho worman	1	03/09/25	Cesar mendoza
29	Gafas de Seguridad lente oxoro	1	06-09-25	Cesar mendoza
30	Protector Aoditivo de inserción	1	06-09-25	Cesar mendoza
31	Protector Respiratorio Desechable	3	06-09-25	Cesar mendoza
26	Goggles de vaqueta Reforzado	1	09-09-25	Cesar mendoza
27	Guantes de nitrilo reforzado	1	12-09-25	Cesar mendoza
28	Protector Respiratorio Desechable	3	12-09-25	Cesar mendoza
29	Protector Respiratorio Desechable	3	18-09-25	Cesar mendoza
30	Guantes de vaqueta reforzado	1	22-09-25	Cesar mendoza
31	protector respiratorio Desechable	3	28-09-25	Cesar mendoza
32	Guantes de nitrilo reforzado	1	30-09-25	Cesar mendoza
33	Goggles vaqueta	1	06-10-25	Cesar mendoza
34	Protector Respiratorio Desechable	3	06-10-25	Cesar mendoza
35	Protector Respiratorio Desechable	3	15-10-25	Cesar mendoza
36	Goggles de vaqueta Reforzado	1	17-10-25	Cesar mendoza
37	Protector Respiratorio Desechable	3	21-10-25	Cesar mendoza
38	Protector Respiratorio Desechable	3	27-10-25	Cesar mendoza
39	Camisa en Jean	1	29-10-25	Cesar mendoza
40	Pantalon en Jean	1	29-10-25	Cesar mendoza
41	Goggles de nitrilo Reforzado.	1	30-10-25	Cesar mendoza
42	Botas de Caucho worman	1	03-11-25	Cesar mendoza
43	Protector Respiratorio Desechable	3	03-11-25	Cesar mendoza
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Cesar mendoza
CEDULA: 1020-152084	CEDULA: 1118 549 653

HUELLA INDICE

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Roberto de bot lopez	CEDULA No.	74 185. 842
CARGO	Ayudante.	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad dielectrico	1		24/06/25
2	Protector respiratorio desechable	1		24/06/25
3	Guante tejido recubierto de hule	1		24/06/25
4	Botas de caucho worman	1		24/06/25
5	Ropa de invierno	1		24/06/25
6	Guantes de nitrilo Reforzado	1	02/07/24	
7	Protector Auditivo de insercion	1	02/07/24	
8	Gafas de seguridad lente oscuro	1	02/07/24	
9	Protector Respiratorio Desechable	1	02/07/24	
10	Tapabocas Desechable Negro	1	18/07/25	
11	Guantes de nitrilo Reforzado	1	18/07/25	
12	Guantes de nitrilo Reforzado	1	23/07/25	
13	Protector Auditivo insercion	1	23/07/25	
14	Protector Respiratorio Desechable	1	23/07/25.	
15	Protector Respiratorio Desechable	1	26/07/25	
16	Guantes de Nitrilo Reforzado	1	26/07/25	
17	Protector Respiratorio Desechable	1	28/07/25	
18	Guantes de Caucho Calibre 35	1	29/07/25	
19	Protector Respiratorio Desechable	1	31/07/25.	
20	Guantes de nitrilo reforzado	1	04/08/25	
21	Guantes de vaqueta Reforzado	1	08/08/25	
22	Protector Auditivo de insercion	1	11/08/25	
23	Protecta Respiratorio Desechable.	3	11/08/25	
24	Protecta Respiratorio Desechable.	3	11/08/25	
25	Protecta Respiratorio Desechable	3	19/08/25	
26	Protector Respiratorio Desechable	3	25/08/25	
27	Guantes vaqueta Reforzado	1	27/08/25	
28	Protector Respiratorio Desechable.	3	03/08/25	
29	Botas de Caucho worman	1	03/08/25	
30	Guantes de vaqueta reforzado	1	08-09-25	
31	Protector Respiratorio Desechable	3	08-09-25	
26	Gafas de seguridad lente oscuro	1	10-09-25	
27	Protector Respiratorio Desechable	3	15-09-25	
28	Guantes de vaqueta Reforzado	1	19-09-25	
29	Guantes de nitrilo reforzado	1	20-09-25.	
30	Protector Respiratorio Desechable	3	23-09-25	
31	Protector Respiratorio Desechable	3	30-09-25	
32	Guantes de vaqueta Reforzado	1	03-10-25	
33	Protector Respiratorio Desechable	3	06-10-25	
34	Guantes de vaqueta reforzado	1	06-10-25	
35	Protector Respiratorio Desechable	3	15-10-25	
36	Guantes de vaqueta reforzado	1	17-10-25	
37	Protector Respiratorio Desechable	3	21-10-25	
38	Guantes de vaqueta Reforzado.	1	27-10-25	
39	Botas de Caucho worman	1	29-10-25	
40	Guantes de nitrilo reforzado	1	29-10-25	
41	Protector Respiratorio Desechable.	3	29-10-25	
42	Guantes de nitrilo reforzado.	1	30-10-25	
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:
CEDULA: 1020752084	CEDULA: 74.185842

VOBO
Yaqira
INT.

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Baudilio Sanchez Cardenas	CEDULA No.	9.530.903
CARGO	Ayudante construcción.	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Botas de Caucho worcian	1	15/07/25	Baudilio Sanchez
2	Gafas de seguridad lente oscuro	1	15/07/25	Baudilio Sanchez
3	Casco dielectrico	1	15/07/25	Baudilio Sanchez
4	Protector Auditivo de insercion	1	15/07/25	Baudilio Sanchez
5	Protector Respiratorio Desechable	1	15/07/25	Baudilio Sanchez
6	Guantes de nitrilo Reforzado	1	15/07/25	Baudilio Sanchez
7	Camisa manga larga jean	1	21/07/25	Baudilio Sanchez
8	Pantalon en Jean	1	21/07/25	Baudilio Sanchez
9	Guantes de nitrilo Reforzado	1	23/07/25	Baudilio Sanchez
10	Protector Respiratorio Desechable	2	26/07/25	Baudilio Sanchez
11	Protector Respiratorio Desechable	2	28/07/25	Baudilio Sanchez
12	Guantes de nitrilo Reforzado	2	28/07/25	Baudilio Sanchez
13	Guantes de Caucho calibre 35	1	29/07/25	Baudilio Sanchez
14	Protector respiratorio Desechable	2	31/07/25	Baudilio Sanchez
15	Protector Respiratorio Desechable	3	04/08/25	Baudilio Sanchez
16	Guantes de nitrilo reforzado	1	08/08/25	Baudilio Sanchez
17	Guantes de vaqueta Reforzado	1	11/08/25	Baudilio Sanchez
18	Protector Auditivo de Insercion	1	11/08/25	Baudilio Sanchez
19	Protector Respiratorio Desechable	3	11/08/25	Baudilio Sanchez
20	Protector Respiratorio Desechable	3	19/08/25	Baudilio Sanchez
21	Protecta Respiratorio Desechable	3	25/08/25	Baudilio Sanchez
22	Guantes de vaqueta reforzado	1	27/08/25	Baudilio Sanchez
23	Protector Respiratorio	3	02-09-25	Baudilio Sanchez
24	Protector Respiratorio.	3	08-09-25	Baudilio Sanchez
25	Protector Auditivo de insercion	1	10-09-25	Baudilio Sanchez
26	Guantes de vaqueta reforzado	1	11-09-25	Baudilio Sanchez
27	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	12-09-25	Baudilio Sanchez
28	protecta respiratorio Desechable.	3	16-09-25	Baudilio Sanchez
29	protector Respiratorio Desechable	3	22-09-25	Baudilio Sanchez
30	Guantes de nitrilo reforzado	1	27-09-25	Baudilio Sanchez
31	Guantes de vaqueta reforzado.	1	03-10-25	Baudilio Sanchez
26	Protecta Respiratorio Desechable.	3	06-10-25	Baudilio Sanchez
27	Guantes de nitrilo reforzado	1	06-10-25	Baudilio Sanchez
28	Protector Respiratorio Desechable	3	15-10-25	Baudilio Sanchez
29	Guantes de vaqueta Reforzado	1	17-10-25	Baudilio Sanchez
30	Protector Respiratorio Desechable	3	21-10-25	Baudilio Sanchez
31	Guantes de vaqueta reforzado	1	27-10-25	Baudilio Sanchez
32	Botas de Caucho	1	29-10-25	Baudilio Sanchez.
33	Protector Respiratorio Desechable	3	30-10-25	Baudilio Sanchez
34	Protector Respiratorio Desechable	1	08-11-25	Baudilio Sanchez
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Baudilio Sanchez C.
CEDULA: 1020752084 Bog.	CEDULA: 9.530.903

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Jesus Alexander Perez Sierra	CEDULA No.	1.057.598.366
CARGO	Ayudante	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	24/07/25	Alexander Perez
2	Protector Auditivo de insercion	1	24/07/25	Alexander Perez
3	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	24/07/25	Alexander Perez
4	Guantes de nitrilo Reforzado	1	24/07/25	Alexander Perez
5	Protector Respiratorio Desechable	3	24/07/25	Alexander Perez
6	Guantes de nitrilo Reforzado	1	29/07/25	Alexander Perez
7	Guantes de Caucho Calibe 35	1	29/07/25	Alexander Perez
8	Protector Respiratorio Desechable	3	29/07/25	Alexander Perez
9	Guantes de nitrilo reforzado	1	01/08/25	Alexander Perez
10	Guantes de vaqueta Reforzado	1	01/08/23	Alexander Perez
11	Protector respiratorio Desechable	3	02/08/25	Alexander Perez
12	Protector respiratorio Desechable	3	02/08/25.	Alexander Perez
13	Protector auditivo de insercion.	1	13/08/25	Alexander Perez
14	Gafas de seguridad lente oscuro	1	13/08/25	Alexander Perez
15	Guantes de Caucho Cal 35	1	13/08/25	Alexander Perez
16	Guantes de vaqueta reforzado	1	19/08/25	Alexander Perez
17	Protector Respiratorio Desechable	3	19/08/25	Alexander Perez
18	Guantes de nitrilo reforzado	1	28/08/25	Alexander Perez
19	Protector Respiratorio Desechable	3	25/08/25	Alexander Perez
20	Guantes de vaqueta reforzado	1	02/09/25	Alexander Perez
21	Camisa manga larga en Jean	1	04/09/25	Alexander Perez
22	Botas de Caucho cuarman.	1	02/09/25	Alexander Perez.
23	Pantalon en Jean.	1	02/09/25	Alexander Perez
24	Protector Respiratorio Desechable.	3	08/09/25	Alexander Perez
25	Guantes de nitrilo reforzado	1	11/09/25.	Alexander Perez
26	Protector Respiratorio Desechable	3	16/09/25	Alexander Perez
27	Guantes de vaqueta reforzado	1	18/09/25	Alexander Perez
28	Protector Respiratorio Desechable	3	22/09/25	Alexander Perez
29	Protector Respiratorio Desechable	3	29-09-25	Alexander Perez
30	Guantes de vaqueta reforzado	1	06-10-25	Alexander Perez
31	Protector Respiratorio Desechable.	3	15-10-25	Alexander Perez
26	Guantes de vaqueta reforzado	1	17-10-25	Alexander Perez
27	Protector Respiratorio Desechable	3	21-10-25	Alexander Perez
28	Guantes de nitrilo reforzado	1	27-10-25	Alexander Perez
29	Botas de Caucho cuarman	1	29-10-25	Alexander Perez
30	Protector Respiratorio Desechable.	3	30-10-25	Alexander Perez
31	Protector Respiratorio Desechable.	3	03-11-25	Alexander Perez
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Alexander Perez
CEDULA: 1020752084 BOG	CEDULA: 1057 598 366

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Ferney Dario Garcia Gutierrez	CEDULA No.	1.054.283.864
CARGO	Ayudante	AREA	Operativa.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	24/07/25	
2	Protector Auditivo de insercion	1	24/07/25	
3	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	24/07/25	
4	Guantes de nitrilo Reforzado	1	24/07/25	
5	Protector Respiratorio Desechable	1	24/07/25	
6	Guantes de nitrilo Reforzado	1	29/07/25	
7	Guantes de Cuero calibre 35	1	29/07/25	
8	Protector Respiratorio Desechable	3	29/07/25	
9	Guantes de vaqueta Reforzado	1	01/08/25	
10	Protector Respiratorio Desechable	3	06/08/25	
11	Guantes de nitrilo Reforzado	1	08/08/25	
12	Protector Respiratório Desechable	3	12/08/25	
13	Guantes de vaqueta reforzado	1	14/08/25	
14	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	14/08/25	
15	Protector Respiratorio Desechable	3	19/08/25	
16	Protector Auditivo de Insercion	1	19/08/25	
17	Protector Respiratorio Desechable	3	26/08/25	
18	Guantes de vaqueta Reforzado	1	29/08/25	
19	Protector Respiratorio Desechable.	3	02-09-25	
20	Camisa manga larga en Jean.	1	02-09-25	
21	Pantalon en Jean.	1	02-09-25	
22	Botas de Cuero woman	1	02-09-25	
23	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	03-09-25.	
24	Guantes de nitrilo reforzado	1	05-09-25	
25	Protector Respiratorio Desechable	3	08-09-25	
26	Protector respiratorio Desechable	3	15-09-25	
27	Guantes de vaqueta reforzado	1	17-09-25	
28	Protector respiratorio Desechable	3	22-09-25	
29	Protector Respiratorio Desechable	3	27-09-25	
30	Guantes de nitrilo reforzado	1	06-10-25	
31	Guantes de vaqueta reforzado	1	06-10-25	
26	Protector Respiratorio Desechable	3	15-10-25	
27	Protector Respiratorio Desechable	3	18-10-25	
28	Guantes de vaqueta reforzado	1	20-10-25	
29	Protector Respiratorio Desechable	3	27-10-25	
30	Botas de Cuero woman	1	29-10-25	
31	Protector Respiratorio Desechable	3	30-10-25	
32	Protecta Respiratorio Desechable.	3	03-11-25	
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:
CEDULA: 1010251084 Bog.	CEDULA: 1054283864

	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Pascual Sierra	CEDULA No.	9.396.749.
CARGO	Ayudante de construcción	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad Dieléctrico	1	19/08/25	Pascual S
2	Protector Respiratorio Desechable	3	19/08/25	Pascual S
3	Gafas de Seguridad lente oscuro	1	19/08/25	Pascual S
4	Protector Aditivo de Insercion	1	19/08/25	Pascual S
5	Guante de nitrilo Reforzado	1	19/08/25	Pascual S
6	Camisa manga larga en Jeans	1	19/08/25	Pascual S
7	Pantalon en Jeans	1	19/08/25	Pascual S
8	Bota de Caucho wolman	1	19/08/25	Pascual S
9	Guantes de vaqueta reforzado	1	21/08/25	Pascual S
10	Guantes de Caucho cal 35	1	21/08/25	Pascual S
11	Protector Respiratorio Desechable	3	21/08/25	Pascual S
12	Protecta Respiratorio Desechable	3	25/08/25	Pascual S
13	Protecta Respiratorio Retonedo	3	01/09/25	Pascual S
14	Guantes de vaqueta Reforzado	1	01/09/25	Pascual S
15	Gafas de seguridad lente oscuro	1	05/09/25	pascual S
16	Protector Respiratorio Desechable	3	05/09/25	pascual S
17	Guantes de nitrilo reforzado	1	08/09/25.	pascual S
18	Protector Respiratorio Desechable.	3	11/09/25	pascual S
19	Protector Respiratorio Desechable	3	17/09/25	pascual S
20	Guantes de vaqueta Reforzado	1	17/09/25	pascual S
21	Protector Respiratorio Desechable	3	23/09/25	pascual S
22	Guantes de vaqueta Reforzado	1	30/09/25	pascual S
23	Protector Respiratorio Desechable	3	30/09/25	pascual S
24	Protecta Respiratorio Desechable	3	06-10-25	pascual S
25	Guantes de vaqueta Reforzado	1	15-10-25	pascual S
26	Protector respiratorio Desechable.	3	17-10-25	pascual S
27	Protecta Respiratorio Desechable	3	21-10-25	pascual S
28	Guantes de vaqueta reforzado	1	27-10-25	pascual S
29	Protecta Respiratorio Desechable	3	29-10-25	pascual S
30	Bota de Caucho wolman	1	30-10-25	pascual S
31	Protector Respiratorio Desechable.	3	03-11-25	pascual S
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Pascual S
CEDULA: 1020-3120 84 Bogota.	CEDULA: 9 396 749

	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	CÓDIGO	FT-SG-SST-45
		VERSIÓN	2
		FECHA	23/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA			
NOMBRE	Cesar Leonardo Perez Trejos	CEDULA No.	1.116.664.608
CARGO	Oficial de construcción	AREA	Operativa

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Cinco de seguridad Dielectrico	1	22/08/25	Cesar Perez
2	Protector Respiratorio Desechable	3	22/08/25	Cesar Perez
3	Gafas de Seguridad lente oxuro	1	22/08/25	Cesar Perez
4	Protector Auditivo de insercion	1	22/08/25	Cesar Perez
5	Guante de nitrilo reforzado	1	22/08/25	Cesar Perez
6	Camisa manga larga en jeans	1	22/08/25	Cesar Perez
7	Pantalon en jeans	1	22/08/25	Cesar Perez
8	Bota de Caucho worman	1	22/08/25	Cesar Perez
9	Guanteo de vaqueta reforzado	1	22/08/25	Cesar Perez
10	Guanteo de Caucho cal. 35	1	22/08/25	Cesar Perez
11	Protector Respiratorio Desechable	3	25/08/25	Cesar Perez
12	Protector Desechable Respiratorio	3	01/09/25	Cesar Perez
13	Protector Respiratorio Desechable	3	01/09/25	Cesar Perez
14	Guanteo de vaqueta Reforzado	1	03/09/25	Cesar perez
15	Protector Respiratorio Desechable	3	08/09/25	Cesar perez
16	Protector respiratorio Desechable	3	15-09-25	Cesar perez
17	Guantes de Caucho cal 35	1	17-09-25	Cesar perez.
18	Protector Respiratorio Desechable	3	22-09-25	Cesar perez
19	Gafas de Seguridad lente oxuro	1	25-09-25.	Cesar perez
20	Protector Respiratorio Desechable	3	30-09-25	Cesar perez.
21	Guantes de vaqueta reforzado	1	06-10-25	Cesar Perez
22	Protector Respiratorio Desechable.	3	15-10-25	Cesar Perez
23	Guanteo de nitrilo reforzado	1	17-10-25	Cesar Perez
24	Guantes de vaqueta reforzado	1	21-10-25	Cesar Perez
25	Protector Respiratorio Desechable	3	27-10-25	Cesar Perez
26	Guantes de vaqueta. reforzado	1	29-10-25	Cesar Perez
27	Protector Respiratorio Desechable	3	30-10-25	Cesar Perez
28	Protector Respiratorio Desechable	3	03-10-25	Cesar Perez
29				
30				
31				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE: Cesar Perez
CEDULA: 1020754084	CEDULA: 1116664606

JOHN EMERSON ROSAS MESA
NIL 74.081.029-9

RELACION DETALLADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

Código: FT-SG-SST-25	
Versión: 1	
Fecha de Aprobación:	
Noviembre de 2018	
Pagina 1 de 1	

AÑO: 2025 **DILIGENCIADO POR:** JOHANA CAROLINA PATIÑO **FECHA DE ACTUALIZACION:** 1/11/2025

DATOS BASICOS					ACCIDENTE DE TRABAJO										ENFERMEDAD LABORAL						INFORMACION DE ATEL					
Nº	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DEL ACCIDENTE	LUGAR DONDE OCURRIÓ	JORNADA EN LA QUE SUCEDE	TIPO DE ACCIDENTE	SITIO	TIPO DE LESIÓN	PARTE DEL CUERPO APARENTE/ AFECTADA	AGENTE DEL ACCIDENTE	MECANISMO DEL ACCIDENTE	¿GENERÓ MUERTE?	DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO	FECHA DIAGNÓSTICO	FECHA EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO	¿ASOCIA PATOLOGÍA RELACIONADA?	FECHA ÚLTIMO EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO	¿ASOCIA PATOLOGÍA RELACIONADA?	¿GENERÓ DÍAS DE INCAPACIDAD?	DÍAS TOTALES INCAPACIDAD	DESCRIPCIÓN INCAPACIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	ORIGEN	OBSERVACIONES
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										

15																									
17																									
18																									
19																									
20																									

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23 de octubre 2025
Nombre del Trabajador: John Emerson Rosas Mesa
Documento de Identidad: 74.081.029
Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño

Obra/proyecto: Construccion alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto de la vereda Retorcija.
Cargo del Trabajador: Director de obra.
Teléfono: 3103120270
Cargo: Residente SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		07-06-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		07-06-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable			10-6-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	—	—	—												
5	Guantes de Nitrilo	X		12-06-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga			07-06-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans			07-06-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera			07-06-25			X			X			X			X
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho	—	—	—												
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección: **Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion**	**Observaciones:**

Firma del Trabajador

Carolina Patiño
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23/10/2025

Nombre del Trabajador: Julieth Manuela Jimenez

Documento de Identidad: 1.057.611.444

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño

Obra/proyecto: Construccion alcantarillado sanitario y pluvial de acceso a la vereda Mocapira.

Cargo del Trabajador: Residente de Obra.

Teléfono: 3152705073

Cargo: Residente SST

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		03-08-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	—	—	—												
3	Protector respiratorio desechable	X		18-09-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		03-08-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		03-08-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga		X	03-08-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	03-08-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	—												X
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho		X	03-08-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion realizada sin novedad.

Manuela Jimenez

Firma del Trabajador

Carolina Patiño

Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROJAS MESA No. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23 de octubre-2025

Nombre del Trabajador: Johana Carolina Patiño

Documento de Identidad: 1020752084

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño

Obra/proyecto: Construccion alcantarillado, sanitario y pluvial de acuerdo de la vereda Mongoira

Cargo del Trabajador: Residente SST.

Teléfono: 3105646777.

Cargo: Residente SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		07-06-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	—	—	—												
3	Protector respiratorio desechable	X		07-06-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	—	—	—												
5	Guantes de Nitrilo	X		07-06-25			X			X			X			X
6	Montera - Sombrero zafari	X		07-06-25												
7	Camisa Manga larga		X	07-06-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	07-06-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera		X	20-08-25			X			X			X			X
10	Ropa de Invierno															
11	Botas de caucho															
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin novedad

Firma del Trabajador

Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23 de octubre 2023

Nombre del Trabajador: Jairo Alonso Rosas Md.

Documento de Identidad: 1051 589 941

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño

Obra/proyecto: Construccion red de alcantarillado Sanitario y Pluvial y de acueducto vereda reforma.

Cargo del Trabajador: Conductor.

Teléfono: 321 278 1473

Cargo: Residente SST

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		09-06-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		02-07-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		22-09-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		02-07-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		18-09-25			X			X			X			X
6	Montera	X		02-07-25			X			X			X			X
7	Camisa Manga larga		X	16-09-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	09-06-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera		X	09-06-25			X			X			X			X
10	Ropa de Invierno															
11	Botas de caucho															
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion Sin ninguna novedad

Firma del Trabajador

Carolina Patiño F.

Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23/10/25

Nombre del Trabajador: Jaime Barrera

Documento de Identidad: 9.533.851

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda reforma.

Cargo del Trabajador: operador Retroexcavadora.

Teléfono: 313-7155800

Cargo: Residente SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		02-09-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		02-07-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		28-07-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		17-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga		X	11-08-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	11-08-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera		X	09-06-25			X			X			X			X
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho	—	—	—												
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la Inspección:

Motivo de la Inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin ninguna novedad.

Jaime Barrera
Firma del Trabajador

Carolina Patiño F.
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23/10/25

Nombre del Trabajador: Johan Andres Lopez

Documento de Identidad: 1.007.413.791

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: Construccion red de alcantarillado Sanitario y Pluvial y de acueducto vereda la reforma

Cargo del Trabajador: operador - Minicargador.

Teléfono: 3103698378

Cargo: Resicleche SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		11-07-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		22-10-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		20-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion - copa	X		11-07-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		10-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga			11-07-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans			11-07-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera			11-07-25			X			X			X			X
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho	—	—	—												
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin novedad.

Johan Andres Lopez
Firma del Trabajador

Carolina Patiño F
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Nit. 74.081.029-9

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN

Código: FT-SG-SST-15	
Versión: 1	
Fecha de Aprobación:	Noviembre de 2023
Pagina 1 de 1	

Fecha Inspección: 23/10/25

Nombre del Trabajador: Fabio del Jesus Jemes

Documento de Identidad: 74.372.715

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño

Obra/proyecto: Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda la reforma

Cargo del Trabajador: Maestro General.

Teléfono: 311 277 3630

Cargo: Residente SST

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		09-06-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		17-07-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		28-07-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		15-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												X
7	Camisa Manga larga		X	09-06-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	09-06-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera		X	09-06-25			X			X			X			X
10	Ropa de Invierno		X	24-06-25			X			X			X			X
11	Botas de caucho		X	24-06-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección: **Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion**	**Observaciones:** Inspeccion sin ninguna novedad.

Fabio del Jesus Jemes
Firma del Trabajador

Carolina Patiño F
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON BOSAS MESA No. 74.081.029 9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23/10/2025
Nombre del Trabajador: Cesar Augusto Mendoza
Documento de Identidad: 1.118 549 653
Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: Construcción de alcantarillado pluvial y de acueducto vereda la Reforma
Cargo del Trabajador: Ayudante de construccion.
Teléfono: 324 509 4402.
Cargo: RESIDENTE SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		18-06-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		06-07-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		06-07-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		17-10-25			X			X						
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga		X	11-07-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	11-07-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	—												
10	Ropa de Invierno		X	24-06-25			X			X			X			X
11	Botas de caucho		X	03-09-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin novedad.

Cesar mendoza
Firma del Trabajador

Carolina Patiño F
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROJAS MESA Tel. 74.081.029.9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 03 Octubre 2025
Nombre del Trabajador: Roberto de los Angeles Lopez
Documento de Identidad: 74. 185. 842.
Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: Sustitucion de alcantarillado pluvial y de. acueducto vereda la Reforma.
Cargo del Trabajador: Ayudante de obra.
Teléfono: 324 5094402.
Cargo: Residente SST

Nº	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		24-06-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		02-07-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		11-08-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo y/o vaqueta	X		17-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	———												
7	Camisa Manga larga		X	24-06-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	24-06-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	———												
10	Ropa de Invierno	—	—	———												
11	Botas de caucho		X	03-08-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin ninguna novedad.

Firma del Trabajador

Carolina Patiño Fonseca
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nº. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23/10/2025

Nombre del Trabajador: Basdilio Sanchez Cardenas

Documento de Identidad: 9.530.903

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño Fonseca

Obra/proyecto Construccion de alcantarillado Pluvial y de acueducto Vereda la reforma

Cargo del Trabajador: Ayudante de obra.

Teléfono: 3222602897.

Cargo: Residente SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		15-07-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		12-09-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		10-09-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo y/o vaqueta	X		17-10-25			X			X			X			X
6	Montera															
7	Camisa Manga larga		X	4-07-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	21-07-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera															
10	Ropa de Invierno															
11	Botas de caucho		X	15-07-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin ninguna novedad.

Basdilio Sanchez
Firma del Trabajador

Carolina Patiño Fonseca.
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23 octubre 2025

Nombre del Trabajador: Jesus Alexander Peret

Documento de Identidad: 1057 598 986

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda la reforma.

Cargo del Trabajador: Ayudante de obra

Teléfono: 323 281 77 31

Cargo: Residente SST

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		24-07-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		13-08-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		13-08-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		17-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga		X	02-09-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	02-09-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	—												
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho		X	02-09-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin ninguna novedad.

Alexander Peret
Firma del Trabajador

Carolina Patiño Fonseca
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROJAS MESA No. 74.081.029	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23 octubre 2025

Nombre del Trabajador: Ferney Dario García.

Documento de Identidad: 1054283864

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda la Reforma.

Cargo del Trabajador: Ayudante.

Teléfono: 3104768828

Cargo: Residente SST

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo			24-07-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro			N-08-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable			18-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion			19-08-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo y/o vaqueta			20-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga			02-09-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans			02-09-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	—												
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho			02-09-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspeccion sin ninguna novedad.

Firma del Trabajador

Carolina Patiño Fonseca.

Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROJAS MESA No. 74.081.029.9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23 octubre 2025
Nombre del Trabajador: Pascual Sierra
Documento de Identidad: 9.396.749.
Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño F

Obra/proyecto: construccion de alcantarillado pluvial y de. acueducto vereda la reforma.
Cargo del Trabajador: Ayudante de obra.
Teléfono: 312 511 70 59
Cargo: Residente SST.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		19-08-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		05-09-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable	X		21-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion	X		19-08-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo	X		15-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga		X	19-08-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans		X	19-08-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	—												
10	Ropa de Invierno	—														
11	Botas de caucho		X	19-08-25			X			X			X			X
12																
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspección sin ninguna novedad.

pascual sierra S
Firma del Trabajador

Carolina Patiño Fonseca
Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN**	**Código: FT-SG-SST-15** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha Inspección: 23-10-2025

Nombre del Trabajador: Cesar Leonardo Perez T

Documento de Identidad: 1.116.664.606

Responsable de la Inspección: Johana Carolina Patiño Fonseca.

Obra/proyecto: Construccion de alcantarillado sanitario Planta y de acueducto vereda la reforma.

Cargo del Trabajador: Oficial

Teléfono: 3132005413

Cargo: Residente de obra.

N°	ELEMENTO	TIPO		FECHA DE ENTREGA	CONOCIMIENTO			ESTADO			USO			TIEMPO DE USO		
		EPP	Dotación		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Casco de seguridad con barbuquejo	X		22-08-25			X			X			X			X
2	Gafas de proteccion lente oscuro	X		22-08-25			X			X			X			X
3	Protector respiratorio desechable			15-10-25			X			X			X			X
4	Protector auditivo de insercion			22-08-25			X			X			X			X
5	Guantes de Nitrilo y/o vaqueta			21-10-25			X			X			X			X
6	Montera	—	—	—												
7	Camisa Manga larga			22-08-25			X			X			X			X
8	Pantalon Jeans			22-08-25			X			X			X			X
9	Botas de seguridad con Puntera	—	—	—												
10	Ropa de Invierno	—	—	—												
11	Botas de caucho			22-08-25			X			X			X			X
12	Guante de Caucho #35			17-09-25			X			X			X			X
13																
14																
15																
16																
17																

CONOCIMIENTO
1= No conoce el EPP / Dotación
2= Conoce el EPP / Dotación, pero no la importancia de su uso.
3= Conoce el EPP / Dotación, lo limpia y almacena adecuadamente

ESTADO
1= No cuenta con el EPP / Dotación
2= Requiere reemplazo u otro EPP / Dotación
3= Cuenta con el EPP / Dotación

USO
1= No usa el EPP / Dotación
2= Usa de forma inadecuada el EPP / Dotación
3= Usa adecuadamente el EPP / Dotación

TIEMPO DE USO
1= No usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido de la actividad
2= El trabajador refiere que algunas veces usa el EPP / Dotación
3= Usa el EPP / Dotación durante el tiempo requerido para la actividad

Actividad ejecutada durante la inspección:

Motivo de la inspección: Uso y mantenimiento de los epps y dotacion

Observaciones: Inspección sin ninguna novedad

Cuervo Cuervo

Firma ~~del~~ Trabajador

Carolina Patiño Fonseca.

Firma del Responsable de la Inspección

Bo.Vo. Ingeniero Residente

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCION PUNTOS ECOLOGICOS**	**Código**: FT-SG-SST-18 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 29-10-25 **Responsable:** Johana C Patiño F **Obra / Proyecto:** Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial de acueducto vereda Reforma

	ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO			OBSERVACIONES
		Bien	Regular	Mal	
1	La selección en la fuente es adecuada	X			
2	Cuenta con señalizacion y rotulados	X			
3	Las canecas se encuentran en buenas condiciones	X			
4	Su ubicación no genera molestias a la comunidad y contratistas	X			
5	Se encuentran en condiciones que evita l acceso a presencia de vectores(insectos, roedores, de los residuos generados)	X			
6	El espacio permite su facil limpieza.	X			
7	El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposicion de los residuos generados.	X			
8	El material almacenado cumple con las condiciones de entrega al gestor externo	X			
9	Se tienen contenedores para la separacion de residuos aprovechables	X			
10	Cuenta con punto de agua cercano	X			
11	Cuenta con elementos contra incendios	X			
12	El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	X			

La inspeccion se debe realizar de forma mensual, establecer las acciones a seguir en caso de que no cumpla algunos de los items mencionados anteriormente

Responsable de la inspeccion

JOHN EMERSON ROSAS MESA No. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS**	**Código**: FT-SG-SST-14 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 23-10-25 **Responsable:** Carolina Patiño F **Obra / Proyecto:** Construcción red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda Ketepa.

ASPECTO A EVALUAR	ESTADO			OBSERVACIONES
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
LOCATIVOS				
El piso se encuentra limpio, seco y sin desperdicios.	✓			
Están los estantes en buenas condiciones y sin sobrecarga	✓			
Están limpias y ordenadas todas las áreas de trabajo	✓			
Estado de muros (Grietas, humedad, goteras)	✓			
Escaleras (barandas seguras antideslizante, estabilidad)	✓			
Pisos (estado, baldosa)	✓			
Ventanas, puertas (manijas, chapas)	✓			
Techos	✓			
Columnas (Si son visibles)	✓			
Pasillos	✓			
Estado de luminarias y número suficiente para la iluminación	✓			
Ventilación	✓			
Ruido	✓			
Temperatura	✓			
Otros	✓			
El estado de las sillas es optimo. Indique cuales no	✓			
Persianas o telones para el sol en buen estado. Especifique si hay algún puesto con reflejos	✓			
UNIDADES SANITARIAS				
Dispone de baños (1 por cada 15 trabajadores y diferente para hombres y mujeres)	✓			
Servicios higiénicos en buen estado y limpieza	✓			
Estado de iluminacion de los baños	✓			
El (los) inodoro (s) y (los) lavamanos presentan buen funcionamiento	✓			
Disponibilidad de elementos de aseo (papel higiénico, jabón, cesto de la basura, etc.)	✓			
No hay escapes de agua	✓			
Desagües en buen estado	✓			
ELÉCTRICOS				
Cables sueltos en el piso	✓			
Empalmes defectuosos	✓			
Cajas sobrecargadas	✓			
Cables en buen estado	✓			
Tomas e interruptores buenos, cubiertas	✓			
Circuitos identificados	✓			
Tableros sin obstruir	✓			
Otros	✓			
AREAS GENERALES DE LA OBRA O PROYECTO				
Se cuenta con un espacio adecuado para almacenar los materiales de la obra	✓			
Todos los materiales de la obra se encuentran estibados para evitar deterioro	✓			
Los equipos utilizados cuentan con sistema puesta a tierra	✓			
Todos los materiales estan protegidos o cubiertos para evitar su deterioro	✓			
Los materiales petreos son cubiertos o tapados para evitar escorrentia y emisiones de material particulado	✓			

Carolina Patiño F.

Firma Responsable

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS**	**Código**: FT-SG-SST-16 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 15/10/2025 **Responsable** Carolina Patiño **Obra / Proyecto:** Construcción red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda. Reforma.

ITEMS	ESTADO			OBSERVACIONES
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se cuenta con punto(s) ecológico(s) como lugar de almacenamiento temporal de los residuos generados en el sitio	X			Punto ecologico en buenas condiciones y limpios
El número de recipientes disponibles para realizar la separación de residuos es suficiente	X			
Se conoce y aplica criterios claros para el manejo, almacenamiento y tratamiento de residuos	X			
Se han generado actividades de capacitación e informativas relativas a la Gestión de Residuos	X			
Residuos Ordinarios				
El proceso de separación en la fuente de residuos ordinarios está conforme al código de colores establecido por la GTC 24	X			Se realiza conforme lo dicta la Resolucion 2184/2019.
Los recipientes que contienen residuos ordinarios se encuentran señalizados	X			
Residuos Reciclables				
El proceso de separación en la fuente de residuos reciclables está conforme al código de colores establecido por la GTC 24	X			
Los recipientes que contienen residuos reciclables se encuentran señalizados	X			
Se lleva un registro de los residuos reciclables aprovechados	X			
Residuos Peligrosos				
El proceso de separación en la fuente de residuos peligrosos está conforme al código de colores establecido por la GTC 24.			X	No hay generacion de residuos peligrosos
Los recipientes que contienen residuos peligrosos se encuentran rotulados			X	
Se lleva un registro de los residuos peligrosos generados en sitio y que se le han dado disposición final			X	

Carolina Patiño

Firma Responsable

JOHN EMERSON ROJAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	**Código:** FT-SG-SST-13 **Pagina 1 de 1** **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 29-10-25 **Responsable:** Johana Carolina Patiño **Obra / Proyecto:** Construcción red de alcantarillado sanitaria y Pluvial y de acueducto vereda Reforma

ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO			OBSERVACIONES
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
ÁREAS ADMINISTRATIVAS				
Piso, paredes y techo limpios y en buen estado	✓			
Posee buena iluminación	✓			
Posee recipientes para los diferentes tipos de residuos y su tamaño es adecuado	✓			
Se encuentran señalizadas las área	✓			
El cableado eléctrico se encuentra en buenas condiciones	✓			
Los enchufes, interruptores, tomas se encuentra en buen estado	✓			
Disponibilidad de extintores de contraincendios	✓			ABC- 20 libras
Botiquín en un lugar adecuado	✓			Tipo A.
Los puestos de trabajo se encuentran organizados y limpios	✓			
Los corredores y pasillos se encuentran libres de obstáculos	✓			
Funcionamiento de equipos de comunicación (telefónica)	✓			
ÁREA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS				
Están plenamente identificada el áreas de residuos sólidos	✓			Tapadas señalizadas y demarcadas
Poseen recipientes para los diferentes tipos de residuos sólidos	✓			
Los residuos se encuentran debidamente almacenados y separados	✓			
Están en condiciones seguras para su disposición final	✓			
Se lleva registro de la disposición de los residuos	✓			
Especificaciones de código de colores	✓			Según Res. 2184/19
AREAS DE ALMACENAMIENTO				
El piso se encuentra limpio, seco y sin desperdicios.	✓			
Corredores libres de obstáculos		✓		
Los elementos almacenados se encuentran organizados	✓			
Posee buena iluminación	✓			
Los elementos de aseo se encuentran marcados	✓			
Posee buena ventilación	✓			
BAÑOS UNIDADES SANITARIAS PORTATILES				
No se usa para almacenamiento de diferentes materiales			✓	se hace uso de la.
El piso se encuentra limpio, seco y sin desperdicios.			✓	Unidad Sanitaria de.
El (los) inodoro (s) y (los) lavamanos presentan buen funcionamiento			✓	la vivienda la Sra
Las zonas aledañas se encuentran limpias y libre de materiales innecesarios			✓	Mailen.
Posee buena iluminación			✓	
Disponibilidad de elementos de aseo (papel higiénico, jabón, cesto de la basura, etc.)			✓	
No se evidencian escapes de agua.			✓	
Corredores libres de obstáculos			✓	

Carolina Patiño Fonseca.

Firma Responsable

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**Código**: FT-SG-SST-17 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 10/10/2025 **Responsable:** Carolina Patiño F **Obra / Proyecto:** Construccion red de alcantarillado Sanitario y Pluvial y de acuerdo vereda Reforma

CAMILLA N°: 1

	ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO			OBSERVACIONES
		Bien	Regular	Mal	
1	Se mantienen libres las vías de acceso a la camilla	✓			
2	La camilla se encuentra en un lugar visible y libre de obstáculos	✓			
3	La camilla se encuentra señalizada y demarcada de forma adecuada	✓			
4	El estado del arnés / correas de seguridad se encuentran en buenas condiciones	✓			
5	El estado del soporte de instalación es adecuado	N/A			No cuenta con soporte de instalación ya que se traslada segun el tramo a intervenir
6	La limpieza general de la camilla es adecuada	✓			
7	La camilla cuenta con inmovilizador cervical o de cuello	✓			
8	La camilla cuenta con inmovilizadores de extremidades superiores	✓			
9	La camilla cuenta con inmovilizadores de extremidades inferiores	✓			
10	El estado del soporte de descanso se encuentra en buen estado	✓			

Carolina Patiño F

Responsable de la inspeccion

	INSPECCIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	**Código**: FT-SG-SST-12 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 09-10-2025	**Responsable:** Carolina Patiño F	**Obra / Proyecto:** construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda la Retorma

BOTIQUÍN N° 5

ELEMENTO	¿EXIST Si	¿EXIST No	Cantidad Recomendada	Presentación Recomendada	CANTIDAD EXISTENTE	ESTADO Bien	ESTADO Regular	ESTADO Mal	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Alcohol al 120ml	✓		1	Frasco	1				03-2027	Frasco x 300 ml
Baja Lenguas	✓		10	Unidad	10					Paq x 0.20.
Curas	✓		10	Unidad	20				10-2029	
Esparadrapo de Tela en Rollo	✓		1	Unidad	1				10-2029	
Gasas Pre cortadas	✓		5	unidades	120				09-2029	
Guantes Desechables de Látex	✓		10	Pares	10				09-2026	
Yodo-povidona	✓		1	Frasco	1				03-2028	
Jeringas	✓		2	Unidad	2				04-2029	
Linterna			1	Unidad						
Micropore en rollo ancho	✓		1	Unidad	1				10-2029	
Pito o silbato	✓		2	Unidad	1					
Solucion salina 250 ml	✓		2	Frasco	1				06-2027	De 500 ml
Protector facial desechable	✓		5	Unidad	5					
Termómetro	✓		1	Unidad	1					Mercurio
Tijeras	✓		1	Unidad	1					
Apósito Desechable (Toallas Higiénicas)	✓		3	Unidad	4					Toalla higienica
Vendaje Elástico	✓		1	5" x 5"	1				05-2028	
Vendaje Elástico	✓		1	2" x 5"	1				12-2029	
Inmovilizador de cuello	✓		1	Unidad	1				10-2029	
Otro:										

ASPECTO DEL BOTIQUÍN A EVALUAR	REVISIÓN DE Bien	REVISIÓN DE Regular	REVISIÓN DE Mal	OBSERVACIONES
Ubicación en lugar visible y libre de obstáculos	X			
Señalización	X			
Limpieza	X			

OBSERVACIONES GENERALES

Botiquin tipo A, Ubicado en la cabina de la Retroexcavadora.

Carolina Patiño F

Firma Responsable

	INSPECCIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	**Código**: FT-SG-SST-12 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 09-10-2025	**Responsable:** Carolina Patiño	**Obra / Proyecto:** Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto vereda Guacupay

BOTIQUÍN N° 4

ELEMENTO	¿EXIST Si	¿EXIST No	Cantidad Recomendada	Presentación Recomendada	CANTIDAD EXISTENTE	ESTADO Bien	ESTADO Regular	ESTADO Mal	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Alcohol al 120ml	✓		1	Frasco	1	✓			03-2027	Frasco x 300 ml
Baja Lenguas	✓		10	Unidad	10	✓				Paquete x 200.
Curas	✓		10	Unidad	20	✓			10-2029	
Esparadrapo de Tela en Rollo	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Gasas Pre cortadas	✓		5	unidades	120	✓			09-2029	
Guantes Desechables de Látex	✓		10	Pares	10	✓			09-2026	
Yodo-povidona	✓		1	Frasco	1	✓			03-2028	
Jeringas	✓		2	Unidad	2	✓			04-2029	
Linterna	✓		1	Unidad		✓				
Micropore en rollo ancho	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Pito o silbato	✓		2	Unidad	1	✓				
Solucion salina 250 ml	✓		2	Frasco	1	✓			06-2027	de 500 cm
Protector facial desechable	✓		5	Unidad	5	✓				
Termómetro	✓		1	Unidad	1	✓				de Mercurio
Tijeras	✓		1	Unidad	1	✓				
Apósito Desechable (Toallas Higiénicas)	✓		3	Unidad	4	✓				Toallas higienicas
Vendaje Elástico	✓		1	5" x 5"	1	✓			05-2028	
Vendaje Elástico	✓		1	2" x 5"	1	✓			12-2029	
Inmovilizador de cuello	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Otro:										

ASPECTO DEL BOTIQUÍN A EVALUAR	REVISIÓN DE Bien	REVISIÓN DE Regular	REVISIÓN DE Mal	OBSERVACIONES
Ubicación en lugar visible y libre de obstáculos	✓			
Señalización	✓			
Limpieza	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Botiquin tipo A, ubicado en la cabina del minicargador.

Carolina Patiño F.

Firma Responsable

	INSPECCIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	**Código**: FT-SG-SST-12 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 11-10-2025	**Responsable:** Carolua Patiño Fonseca.	**Obra / Proyecto:** Construcción red de alcantarillado Sanitario, pluvial y de acueducto vereda Mongüira

BOTIQUÍN N° 3

ELEMENTO	¿EXIST Si	¿EXIST No	Cantidad Recomendada	Presentación Recomendada	CANTIDAD EXISTENTE	ESTADO Bien	ESTADO Regular	ESTADO Mal	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Alcohol al 120ml	✓		1	Frasco	1	✓			03-2027	Frasco x 300 ml
Baja Lenguas	✓		10	Unidad	10	✓				Paquete x 20U
Curas	✓		10	Unidad	20	✓			10-2029	
Esparadrapo de Tela en Rollo	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Gasas Pre cortadas	✓		5	unidades	120	✓			09-2029	
Guantes Desechables de Látex	✓		10	Pares	10	✓			09-2026	
Yodo-povidona	✓		1	Frasco	1	✓			03-2028	
Jeringas	✓		2	Unidad	2	✓			04-2029	
Linterna		✓	1	Unidad						
Micropore en rollo ancho	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Pito o silbato	✓		2	Unidad	1	✓				
Solucion salina 250 ml	✓		2	Frasco	1	✓			06-2027	x 500 ml.
Protector facial desechable	✓		5	Unidad	5	✓				
Termómetro	✓		1	Unidad	1	✓				de Mercurio
Tijeras	✓		1	Unidad	1	✓				
Apósito Desechable (Toallas Higiénicas)	✓		3	Unidad	4	✓				Toallas higiénicas
Vendaje Elástico	✓		1	5" x 5"	1	✓			05-2028	
Vendaje Elástico	✓		1	2" x 5"	1	✓			12-2029	
Inmovilizador de cuello	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Otro:										

ASPECTO DEL BOTIQUÍN A EVALUAR	REVISIÓN DE Bien	REVISIÓN DE Regular	REVISIÓN DE Mal	OBSERVACIONES
Ubicación en lugar visible y libre de obstáculos	✓			
Señalización	✓			
Limpieza	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Botiquin tipo A, Ubicado en la cabina de la Camioneta de estacas.

Carolua Patiño F.

Firma Responsable

	INSPECCIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	**Código**: FT-SG-SST-12 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 09-10-2025	**Responsable:** Johana Carolina Patiño	**Obra / Proyecto:** Construcción red de alcantarillado Sanitario Pluvial y de acueducto vereda monquira.

BOTIQUÍN N° 2

ELEMENTO	¿EXIST Si	¿EXIST No	Cantidad Recomendada	Presentación Recomendada	CANTIDAD EXISTENTE	ESTADO Bien	ESTADO Regular	ESTADO Mal	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Alcohol al 120ml	✓		1	Frasco	1	✓			03-2027	Frasco x 300 ml
Baja Lenguas	✓		10	Unidad	10	✓				Paq. de 200.
Curas	✓		10	Unidad	20	✓			10-2029	
Esparadrapo de Tela en Rollo	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Gasas Pre cortadas	✓		5	unidades	100	✓			09-2029	
Guantes Desechables de Látex	✓		10	Pares	10	✓			09-2026	
Yodo-povidona	✓		1	Frasco	1	✓			03-2028	
Jeringas	✓		2	Unidad	2	✓			04-2029	
Linterna	✓		1	Unidad		✓				
Micropore en rollo ancho	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Pito o silbato	✓		2	Unidad	1	✓				
Solucion salina 250 ml	✓		2	Frasco	1	✓			06-2027	x 500 ml
Protector facial desechable	✓		5	Unidad	5	✓				
Termómetro	✓		1	Unidad	1	✓				Mercurio
Tijeras	✓		1	Unidad	1	✓				
Apósito Desechable (Toallas Higiénicas)	✓		3	Unidad	3	✓				Toalla higienica.
Vendaje Elástico	✓		1	5" x 5"	1	✓			05-2028	
Vendaje Elástico	✓		1	2" x 5"	1	✓			12-2029	
Inmovilizador de cuello	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Otro:										

ASPECTO DEL BOTIQUÍN A EVALUAR	REVISIÓN DE Bien	REVISIÓN DE Regular	REVISIÓN DE Mal	OBSERVACIONES
Ubicación en lugar visible y libre de obstáculos	X			
Señalización	X			
Limpieza	X			

OBSERVACIONES GENERALES

Botiquin tipo A, ubicado en el costado del tramo a intervenir.

Carolina Patiño F.

Firma Responsable

	INSPECCIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	**Código**: FT-SG-SST-12 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 09-10-2025	**Responsable:** Carolina Patiño Fonseca	**Obra / Proyecto:** Construcción red de alcantarillado Sanitario pluvial y de acueducto vereda monquira

BOTIQUÍN N° 1

ELEMENTO	¿EXIST Si	¿EXIST No	Cantidad Recomendada	Presentación Recomendada	CANTIDAD EXISTENTE	ESTADO Bien	ESTADO Regular	ESTADO Mal	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Alcohol al 120ml	✓		1	Frasco	1	✓			03-2027	Frasco x 300 ml
Baja Lenguas	✓		10	Unidad	10	✓				Paque x 200.
Curas	✓		10	Unidad	20	✓			10-2029	
Esparadrapo de Tela en Rollo	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Gasas Pre cortadas	✓		5	unidades	120	✓			09-2029	
Guantes Desechables de Látex	✓		10	Pares	10	✓			09-2026	
Yodo-povidona	✓		1	Frasco	1	✓			03-2028	
Jeringas	✓		2	Unidad	2	✓			04-2029	
Linterna		✓	1	Unidad						
Micropore en rollo ancho	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Pito o silbato	✓		2	Unidad	1	✓				
Solucion salina 250 ml	✓		2	Frasco	1	✓			06-2027	x 500 ml
Protector facial desechable	✓		5	Unidad	5	✓				
Termómetro	✓		1	Unidad	1	✓				Mercurio.
Tijeras	✓		1	Unidad	1	✓				
Apósito Desechable (Toallas Higiénicas)	✓		3	Unidad	4	✓				Toallahigienica
Vendaje Elástico	✓		1	5" x 5"	1	✓			05-2028	
Vendaje Elástico	✓		1	2" x 5"	1	✓			12-2029	
Inmovilizador de cuello	✓		1	Unidad	1	✓			10-2029	
Otro:										

ASPECTO DEL BOTIQUÍN A EVALUAR	REVISIÓN DE Bien	REVISIÓN DE Regular	REVISIÓN DE Mal	OBSERVACIONES
Ubicación en lugar visible y libre de obstáculos	✓			
Señalización	✓			
Limpieza	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Botiquin tipo A ubicado en la oficina area administrativa

Carolina Patiño.

Firma Responsable

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	**Código**: FT-SG-SST-11 **Versión**: 1 **Fecha de Aprobación:** Noviembre 2023 **Pagina 1 de 1**

Fecha: 24-10-25 **Responsable:** Johana Catalina Patiño F **Obra / Proyecto:** Construccion red de alcantarillado sanitario y pluvial y de acueducto fase 1 de la vereda. Mocuguira sector. Reforma.

INFORMACIÓN GENERAL							ESTADO DEL EXTINTOR (B = Bueno; M = Malo y NA = No Aplica)								CONDICIONES DE LA UBICACIÓN (B = Bueno; M = Malo y NA = No Aplica)				
N°	Tipo	Ubicación	Capacidad (Lb)	Fecha de Última Recarga	Soporte		Lámina	Pintura	Válvula	Manguera	Sello de Seguridad	Pasador	Manómetro	Limpieza	Altura Anclado (min 80-120 cm) Sobre Base (min 10 cm)	Acceso sin Obstáculos	Demarcación en el Piso	Señalización	
					Anclado	Sobre Base												Extintor (min 180 cm)	Agente Extintor
1	ABC	Oficina	20	08-2025	NO	SI	B	B	B	N/A	B	B	B	B	SI	SI	N/A	SI	Polvo Químico Seco
2	ABC	Almacenamiento	20	08-2025	NO	—	B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	SI	N/A	SI	Polvo Químico Seco
3	ABC	Camioneta de estacas	5	11-2024	NO	—	B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	SI	N/A	N/A	P.Q.S
4	ABC	Cabina mini-cargador	10	05-2025	SI	—	B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	SI	N/A	N/A	Polvo Químico Seco
5	ABC	Cabina retro-excavadora	5	08-2025	NO	—	B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	SI	N/A	N/A	Polvo Químico Seco

OBSERVACIONES: Inspeccion sin ninguna novedad.

Catalina Patiño F.

Firma del Responsable

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Ref. 74.081.029.9

INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

Código:	FT-SG-SST-19
Versión:	2
Fecha de Aprobación:	Marzo del 2024
Paginas:	1 de 2

AREA /PROYECTO	Construcción red de alcantarillado pluvial de acueducto de la vereda Mayupira sector la reforma del municipio de Socaire.	**MES/ AÑO**	octubre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
2	NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
3	NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
4	NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
5	LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
6	COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
7	LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
8	FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad,extintor,indicadores de tablero de control maquina, controles completos y funcionando, ASEO, pitos.	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
10	CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
11	HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
12	ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
13	REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
Operador			Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera			Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera			Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera		Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera		Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera	Jaime Barrera

FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES:
Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use.
operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo.
utilice siempre los epp para utilizar el equipo

Observaciones: Inspeccion realizada por Jaime Barrera - operador.
Recibido: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS MESA
No. 74.081.029.9

INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

Código: FT-SG-SST-19	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación:	
Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 2	

AREA /PROYECTO	Obstrucción red de alcantarillado Pluvial de acueducto de la vereda acuaguira Sector la reforma del municipio de Sogamoso	**MES/ AÑO**	Noviembre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora	B																														
2	NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	B																														
3	NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	B																														
4	NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	B																														
5	LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	B																														
6	COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	B																														
7	LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos	B																														
8	FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	B																														

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad,extintor,indicadores de tablero de control maquina, controles completos y funcionando, ASEO, pitos.	B																														
10	CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	B																														
11	HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	B																														
12	ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	B																														
13	REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.	B																														

FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES:
Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use.
operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo.
utilice siempre los epp para utilizar el equipo

Operador Jaime Bueno

Observaciones:

JOHN EMERSON ROJAS MESA
Ing. 74.081.029-9

INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Código: FT-SG-SST-35

Versión: 1

Fecha de Aprobación: ENERO 22

AREA /PROYECTO Rehabilitacion red de alcantarillado pluvial de acueducto de la vereda chaguira sector la reforma del municipio de Sogamoso

MES/ AÑO Octubre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	De trabajo delanteras	B	B	B	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	de trabajo traseras	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓													
	Direccionales	N/A	N/A	N/A.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	De parqueo	N/A	N/A	N/A.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CABINA	Proteccion antivuelco	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Extintor de incendios 10 libras	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Indicadores de (hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite - motor)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Asiento en buen estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la Malla lateral	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de retroceso y pito	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos laterales y central	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Palancas de mando en buen estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	pedales en buen estado	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Frenos de emergencia	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ITEM	VERIFICAR	DIAS																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas y de aceite	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Direccion (sin juego, vibracion, ruidos raros)	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estado del balde (- pasadores, dientes, operación)	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estado de los gatos de estabilizacion	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mandos de levante del brazo	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Brazoos del cucharon (pasadores,cilindros)	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Operación del cucharon						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Freno del brazo y del cucharon	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LLANTAS	Estado (sin abultamientos, cortadas, lisas)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Huellas en buen estado > 5mm	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA DE OPERARIO RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo		Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez			Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez			Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez		Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez		Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez	Johan A lopez

OBSERVACIONES: Preoperacional Realizado por Johan lopez -operador
Recibido: Carolina Patiño - SST

	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Código:** FT-SG-SST-35	
		Versión: 1	
		Fecha de Aprobación: ENERO 22	
AREA /PROYECTO	Construccion red de alcantarillado pluvial de acueducto de la vereda Moquira Sector la reforma del municipio de Iza	**MES/ AÑO**	Noviembre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	DIAS																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	De trabajo delanteras	✓																													
	de trabajo traseras	✓																													
	Direccionales	NA																													
	De parqueo	NA																													
CABINA	Proteccion antivuelco	✓																													
	Cinturon de seguridad	✓																													
	Extintor de incendios 10 libras	✓																													
	Indicadores de (hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite - motor)	✓																													
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓																													
	Asiento en buen estado	✓																													
	Estado de la Malla lateral	✓																													
	Alarma de retroceso y pito	✓																													
	Apoyos de acceso	✓																													
	Espejos laterales y central	✓																													
	Palancas de mando en buen estado	✓																													
	pedales en buen estado	✓																													
	Frenos de emergencia	N/A																													

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas y de aceite	✓																														
	Direccion (sin juego, vibracion, ruidos raros)	N/A																														
	Estado del balde (- pasadores, dientes, operación)	N/A																														
	Estado de los gatos de estabilizacion	N/A																														
	Frenos (balde, brazo, compactador, taladro)	N/A																														
	Mandos de levante del brazo	✓																														
	Estado (balde, brazo, compactador, taladro)	✓																														
	Brazoos del cucharon (pasadores,cilindros)	N/A																														
	Operación del cucharon	N/A																														
	Freno del brazo y del cucharon	✓																														
LLANTAS	Estado (sin abultamientos, cortadas, lisas)	✓																														
	Huellas en buen estado > 5mm	✓																														
FIRMA DE OPERARIO RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	Johan A lopez																															
OBSERVACIONES:																																

JOHN EMERSON ROSAS MESA
NIt. 74.081.029-9

INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL

paginas: 1 de 2	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación:	
Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 2	

AREA /PROYECTO Construcción red de alcantarillado Pluvial de acueducto de la vereda Mocigura Sector la reforma del municipio de Sogamoso.

MES/ AÑO Noviembre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Flexometros	Carcaza, seguro, cinta en buen estado	B																														
2	Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	B																														
3	Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	B																														
4	Barras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	B																														
5	Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas	B																														
7	Macetas o martillos	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado	B																														
8	Porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado	B																														
10	Serruchos	Marco, hoja	B																														
11	Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	B																														
12	Plaustres	Cabo y hoja sueltos, rotos o fisurados	B																														
13	Seguetas	Marco, hoja	B																														
14	Machetes	Cabo hoja (fisuras, grietas, remiendos)	B																														
15	Niveles	Libre de fisuras, grietas o remiendos	B																														

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16	Llanas	Mango y hoja ajustados (fisuras, grietas, remiendos).	B																														
17	Plomadas	Elementos ajustados y en buen estado.	B																														
18	Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado.	B																														
19	Llaves Expansivas	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).	B																														
20	Llaves de tubo	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).	B																														
21	Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón).	B																														
22	Hombresolos	Mordazas, tornillo de ajuste, cortacables, muelle, azas y palanca en buen estado.	B																														
23	Punteros	Cuerpo en buen estado	B																														

FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES:

Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use.
operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo.
utilice siempre los epp para utilizar el equipo

Operario 1

Observaciones:

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Ref. 74.081.029-9

INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL

paginas: 1 de 2	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación:	
Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 2	

AREA /PROYECTO	Construcción red de alcantarillado pluvial de acueducto de la vereda Manchuria sector El Reformo del Municipio de Socorro.	**MES/ AÑO**	Octubre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Flexometros	Carcaza, seguro, cinta en buen estado	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
2	Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
3	Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
4	Barras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	B	B		B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
5	Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
7	Macetas o martillos	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
8	Porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes en buen estado	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
10	Serruchos	Marco, hoja	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
11	Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
12	Plaustres	Cabo y hoja sueltos, rotos o fisurados	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
13	Seguetas	Marco, hoja	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
14	Machetes	Cabo hoja (fisuras, grietas, remiendos)	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
15	Niveles	Libre de fisuras, grietas o remiendos	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B

ITEM	HERRAMIENTA	ASPECTO A INSPECCIONAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16	Llanas	Mango y hoja ajustados (fisuras, grietas, remiendos).	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
17	Plomadas	Elementos ajustados y en buen estado.	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
18	Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado.	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
19	Llaves Expansivas	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
20	Llaves de tubo	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados).	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
21	Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón).	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
22	Hombresolos	Mordazas, tornillo de ajuste, cortacables, muelle, azas y palanca en buen estado.	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
23	Punteros	Cuerpo en buen estado	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B

FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES:
Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use.
operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo.
utilice siempre los epp para utilizar el equipo

Operario 1

Inspeccion Preoperacional realizada Por Fernel Dario Garcia - Aprendiz
Recibido: Carolina Patiño - SST.

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Nit. 74.081.029-9

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: FT-SG-SST-36	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación: Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 1	
MES/ AÑO	octubre 2025

AREA /PROYECTO construccion red de alcantarillado Pluvial de acueducto de la vereda monquira sector la reforma del municipio de Sogamoso

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Puntos de fijacion de la empuñadura auxiliar; Roscas de la empuñadura y del equipo sin desgastes, asegurando la empuñadura.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
2	Perno de traba; de facil accionamiento y disco para soltarlo.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
3	Interruptor de encendido y apagado; Funcionamiento correcto, accionamiento suave y en optimo estado.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
4	Empuñadura auxiliar; Buen ajuste y buen agarre, no rota.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
5	Disco de desbaste/ corte; Sin grietas, con diametros apropiados para realizar el trabajo y giro del disco sin vaiven.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
6	Tuerca de fijacion / tuerca de fijacion rapida sds; Agujeros de fijacion completos y sin desgaste y que permitan empalme facil con los pines de la llave de fijacion o espiga.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
7	Guarda de seguridad; Cubrimiento minimo la mitad del disco, sin golpes ni gietas, debidamente instalada y fija a la pulidora.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		
8	Abrazadera de la guarda de seguridad; Debidamente instalada y que asegure correctamente la guarda.							B	B		B						B	B				B		B		B				B		

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	Llave de espiga; Original con sus pines completos, sin desgaste y de facil ubicación (a la mano).							B	B		B						B	B				B				B				B		
10	Carcasa general; Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas.							B	B		B						B	B				B				B				B		
11	Cable electrico y enchufe (o clavija); sim empalmes, en optimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.							B	B		B						B	B				B				B				B		
	FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo							Fabiolens.	Fabiolens.		Fabiolens.						Fabiolens.	Fabiolens.				Fabiolens.				Fabiolens.				Fabiolens.		

Observaciones: Inspeccion realizada Por Fabio Tecus. - Oficial.
Recibido: Carolina Patiño F. - SST.

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Nit. 74.081.029-9

INSPECCION PREOPERACIONAL CANGURO DE COMPACTACIÓN

Código:	FT-SG-SST-31
Versión:	2
Fecha de Aprobación:	Marzo del 2024
Paginas:	1 de 1

AREA /PROYECTO Construcción red de alcantarillado pluvial de acueducto de la vereda Mocquira sector la reforma del municipio de Sogamoso

MES/ AÑO Octubre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Estado del nivel de aceptacion del motor	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
2	Estado del nivel del combustible	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
3	Estado del nivel de la caja de cambios	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
4	Estado de las correas	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
5	Estado de los comandos en direccion	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
6	Revision general del pasqador	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
7	Estado de las ruedas	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
8	Estado de la manivela	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
9	Estado de las guayas	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
10	Estado de los balnearios	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
11	Estado de los guardias de seguridad	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
	FIRMA DE OPERADOR RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez		Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez			Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez		Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez		Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez	Alex Perez

Observaciones: Inspección realizada por Alex Perez - Ayudante
Recibido: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Nit: 74.081.029-9

INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS

Código: FT-SG-SST-29	
Versión: 2	
Fecha de Aprobación: Marzo del 2024	
Paginas: 1 de 1	

AREA /PROYECTO	Construccion red de alcantarillado Pluvial de acueducto de la vereda Maluriva Sector la reforma del municipio de Soguamoso.	**MES/ AÑO**	Octubre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Frontales	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
2	traseras de trabajo (reflector)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
3	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
4	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
5	De Stop y señal trasera	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
6	Espejos laterales	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
7	Alarma de retroceso	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
8	Pito	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
9	Freno de servicio	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
10	Freno de emergencia	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
11	Dirección/suspensión (Terminales)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
12	Cinturón de seguridad	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
13	Vidrio frontal (en buen estado)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
14	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
15	Asiento en buena condición	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
16	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
17	Limpia brisas	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
18	Motor-refrigerante-orometro, aire)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
19	Bateria y cables	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B

ITEM	VERIFICAR	DIAS																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
21	Control de fugas hidráulicas	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
22	Pasadores, suspensión	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
23	Control fugas de aire	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
24	Grapas y anclaje de chasis	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
25	Cadena del cardam	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
26	Acoples rapidos	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
27	Mangueras	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
28	Estado general del volco	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
29	Gato de levante del volco	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
30	Estado de la compuerta	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
31	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
32	Motor de bomba	B	B	B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B
FIRMA DE OPERARIO RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo																																

Observaciones: Inspección realizada por Jairo Rosas - Conductor.
Recibido: Carolina Patiño - SST

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit: 74.081.029-9	**INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS**	**Código:** FT-SG-SST-29 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** Marzo del 2024 **Paginas:** 1 de 1

AREA /PROYECTO	Construcción red de alcantarillado pluvial de acueducto de la vereda mongura sector la reforma del municipio de sogamoso	**MES/ AÑO**	Noviembre 2025

VERIFIQUE Y MARQUE: B : BUENO M: MALA N/A: NO APLICA

Si constata alguna anormalidad o alguna condición no conforme, detallarla en el formato FT-SG-SST 20 Informe de inspeccion, para realizar la acción y seguimineto de la corrección.

ITEM	VERIFICAR	DIAS																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Frontales	B																													
2	traseras de trabajo (reflector)	B																													
3	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	B																													
4	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	B																													
5	De Stop y señal trasera	B																													
6	Espejos laterales	B																													
7	Alarma de retroceso	B																													
8	Pito	B																													
9	Freno de servicio	B																													
10	Freno de emergencia	B																													
11	Dirección/suspensión (Terminales)	B																													
12	Cinturón de seguridad	B																													
13	Vidrio frontal (en buen estado)	B																													
14	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	B																													
15	Asiento en buena condición	B																													
16	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	B																													
17	Limpia brisas	B																													
18	Motor-refrigerante-orometro, aire)	B																													
19	Bateria y cables	B																													

ITEM	VERIFICAR	DIAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	B																														
21	Control de fugas hidráulicas	B																														
22	Pasadores, suspensión	B																														
23	Control fugas de aire	B																														
24	Grapas y anclaje de chasis	B																														
25	Cadena del cardam	B																														
26	Acoples rapidos	B																														
27	Mangueras	B																														
28	Estado general del volco	B																														
29	Gato de levante del volco	B																														
30	Estado de la compuerta	B																														
31	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	B																														
32	Motor de bomba	B																														
FIRMA DE OPERARIO RECOMENDACIONES: Ejecutar la inspección con la frecuencia o para equipos de uso esporádico cuando se use. operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso informe al supervisor de la sección cualquier condición de riesgo en el equipo. utilice siempre los epp para utilizar el equipo																																
Observaciones:																																
