NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 1
CONTRATO No. 2025-024 QUE TIENE POR OBJETO: **“**CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
ERI S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA:

JOHN EMERSON ROSAS MESA

INTERVENTORIA:

INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S

R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS

SUPERVISOR DE CONTRATO:

JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA
COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: 04 DE JUNIO DE 2025 AL 13 DE AGOSTO DEL 2025

SOGAMOSO – BOYACÁ

2025

INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 1

VERSIÓN	CONTENIDO	ELABORÓ
1	INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 1	John Emerson Rosas Mesa Director de Obra

Reviso y aprobó:

Julián Ramiro Urrutia Paragua
Coordinador de Operaciones

Ingeniar Constructora y Consultora s.a.s
R/L Mónica María Juliana González Vargas

John Emerson Rosas Mesa
Contratista

(CONTRATO DE OBRA)

CONTRATO No.:	2025-024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR:	MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($1.616.410.236,15) MCTE
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA C.C 74.081.029 expedida en Sogamoso
SUPERVISOR:	JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS
INTERVENTORIA:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS
FECHA DE INICIO:	04 DE JUNIO DE 2025

CONTRACTUALES CONTRATO No. 2025-025
(CONTRATO INTERVENTORIA)

CONTRATO No.:	2025-025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL PROYECTO DE A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR:	CIENTO DOCE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($112.123.126,00)
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR:	JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS
INTERVENTORIA:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Ejecutivo de Obra Parcial No. 1, en el cual se presenta el estado actual del proyecto y un resumen consolidado de las actividades ejecutadas en el marco del **CONTRATO DE OBRA NO. 2025-024**, suscrito entre la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S.**, identificada con NIT **901.583.989-8,** y el señor **JOHN EMERSON ROSAS MESA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.081.029** de Sogamoso, Boyacá, quien actúa en calidad de **Contratista**.

El objeto contractual corresponde a la **"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, ASÍ COMO DE LA RED DE ACUEDUCTO, FASE I, EN LA VEREDA MONQUIRÁ – SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"**.

El presente documento corresponde al Informe de Obra, en el cual se registran y consolidan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 04 de julio de 2025 y el 13 de agosto de 2025.

1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el área rural del municipio de Sogamoso, específicamente en la vereda Monquirá, sector La Reforma. Esta zona presenta un entorno predominantemente rural con uso residencial disperso. La intervención contempla la construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial, así como de la red de acueducto correspondiente a la Fase 1 del sector mencionado. La localización geográfica del proyecto es estratégica, ya que permitirá optimizar el manejo integral del recurso hídrico en la zona, contribuyendo significativamente al control de sedimentos y a la mitigación del riesgo de inundaciones, mejorando así las condiciones sanitarias y ambientales del área de influencia.



Imagen 1: Localización del proyecto, VEREDA MONQUIRA, SECTOR LA REFORMA Fuente: Google Earth



Imagen 2: Localización del proyecto VEREDA MONQUIRA, SECTOR LA REFORMA Fuente: director de Obra

2. COMPONENTE TECNICO

2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE DE OBRA: ACTA DE CORTE 1

Ítem	Item gobernacion	Descripción	Unidad	CONDICIONES INICIALES			ITEM NUEVOS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				Cantidad	VR Unitario	VR Total	VR Unitario	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RED SANITARIA						**$ 572.888.642,27**			**$ 244.588.184,07**
1.1	2.01.05	localización y replanteo para red de acueducto (incluye carteras y planos)	Metro lineal	544,73	$ 1.062,32	$ 578.677,57		468,80	$ 498.015,62
1.2	Cotización	Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	Metro lineal	544,73	$ 2.804,00	$ 1.527.422,92		285,80	$ 801.383,20
1.3	1.02.15	Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	Metro cúbico	1.094,26	$ 25.449,98	$ 27.848.895,11		669,18	$ 17.030.617,62
1.4	2.01.02	Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	Metro cuadrado	1.444,71	$ 42.040,83	$ 60.736.807,51		801,85	$ 33.710.439,54
1.5	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	Metro cúbico	47,36	$ 91.714,13	$ 4.343.581,20		5,77	$ 529.190,53
1.6	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado para acometidas.	Metro cúbico	269,36	$ 91.714,13	$ 24.704.118,06		44,53	$ 4.084.030,21
1.7	2.07.08	Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	Metro cúbico	65,07	$ 286.965,46	$ 18.672.842,48		1,08	$ 309.922,70
1.8	2.05.56	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"	Metro lineal	544,73	$ 288.572,86	$ 157.194.294,03		251,90	$ 72.691.503,43
1,90	2.05.54	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=12"	Metro lineal	21,15	$ 202.745,55	$ 4.288.068,38		0,00	$ 0,00
1.10	2.05.52	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"	Metro lineal	518,00	$ 62.608,90	$ 32.431.410,20		35,95	$ 2.250.789,96
1.11	Cotización	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 6"	Unidad	74,00	$ 374.899,98	$ 27.742.598,52		8,00	$ 2.999.199,84
1.12	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	Metro cúbico	298,04	$ 138.070,17	$ 41.150.433,47		95,79	$ 13.225.741,58
1.13	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	Metro cúbico	83,38	$ 138.070,17	$ 11.512.290,77		4,64	$ 640.645,59
1.14	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	Metro cúbico	744,80	$ 90.646,13	$ 67.513.237,62		501,25	$ 45.436.372,66
1.15	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	Metro cúbico	29,60	$ 90.646,13	$ 2.683.125,45		24,92	$ 2.258.901,56
1.16	Cotización	Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	Unidad	10,00	$ 2.761.982,96	$ 27.619.829,60		0,00	$ 0,00
1.17	2.06.09	Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m	Unidad	10,00	$ 882.461,36	$ 8.824.613,60		4,00	$ 3.529.845,44
1.18	Cotización	Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	Unidad	74,00	$ 511.558,00	$ 37.855.292,00		8,00	$ 4.092.464,00
1.19	3.12.01	Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	Metro cúbico	458,15	$ 5.013,50	$ 2.296.935,03		66,79	$ 334.851,67
1.20	3.12.03	Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	Metro cúbico - Km	5.779,10	$ 2.312,50	$ 13.364.168,75		5.655,55	$ 13.078.459,38
NP 1	5.01.10	Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	Unidad				$ 3.809.579,91	4,00	$ 15.238.319,64
3.13*	Cotizacion	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 8"	Unidad				$ 375.500,00	1,00	$ 375.500,00
3.12*	2.05.59	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=8"	Metro lineal				$ 85.764,02	3,50	$ 300.174,07
NP 2	3.12.02	Transporte de material suelto.	Metro cúbico - Km				$ 1.850,00	5.343,03	$ 9.884.605,50
NP 3	Cotizacion	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 6"	Unidad				$ 89.358,81	8,00	$ 714.870,48
NP 4	Cotizacion	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 8"	Unidad				$ 243.370,81	1,00	$ 243.370,81
NP 5	1.02.01	Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)	Metro cuadrado				$ 36.230,07	9,08	$ 328.969,04

RED ACUEDUCTO						**$ 117.109.809,13**			**$ 52.131.803,59**
2.1	Cotizacion	Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito	Metro lineal	544,73	$ 2.804,00	$ 1.527.422,92		246,50	$ 691.186,00
2.2	1.02.15	Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)	Metro cúbico	217,89	$ 25.449,98	$ 5.545.296,14		116,54	$ 2.965.940,67
2.4	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado para acometidas	Metro cúbico	168,00	$ 91.714,13	$ 15.407.973,84		60,44	$ 5.543.202,02
2.5	2.07.08	Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	Metro cúbico	2,40	$ 286.965,46	$ 688.717,10		0,44	$ 126.264,80
2.6	2.01.29	Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica	Metro lineal	544,73	$ 69.652,82	$ 37.941.980,64		246,50	$ 17.169.420,13
2.7	2.04.20	Codo PVC gran radio 45º RDE 21 D=3"	Unidad	7,00	$ 99.625,82	$ 697.380,74		0,00	$ 0,00
2.8	Cotizacion	Suministro e instalación Uniones rápidas de 3" Uz Pavco	Unidad	11,00	$ 55.546,00	$ 611.006,00		6,00	$ 333.276,00
2.9	Cotizacion	Suministro e instalación Uniones Tee de 3"X3" Uz Pavco	Unidad	4,00	$ 140.813,00	$ 563.252,00		2,00	$ 281.626,00
2.10	1.06.34	Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios para su conexión	Unidad	60,00	$ 124.499,94	$ 7.469.996,40		15,00	$ 1.867.499,10
2.11	3.13.36	Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) red principal	Metro cúbico	57,70	$ 115.320,06	$ 6.653.967,46		35,85	$ 4.134.224,15
2.12	3.13.36	Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) acometidas	Metro cúbico	35,73	$ 115.320,06	$ 4.120.385,74		4,49	$ 517.787,07
2.13	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	Metro cúbico	157,71	$ 90.646,13	$ 14.295.801,16		93,20	$ 8.448.219,32
2.14	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado para acometidas	Metro cúbico	134,40	$ 90.646,13	$ 12.182.839,87		33,35	$ 3.023.048,44
2.15	3.12.01	Cargue y transporte de materiales sueltos producto de sobrantes y/o derrames (incluye acarreo libre)	Metro cúbico	465,95	$ 5.013,50	$ 2.336.040,33		79,14	$ 396.768,39
2.16	2.08.07	Suministro e instalación válvula compuerta h.f. de 3" extremo liso sello elastó, 250 psi	Unidad	3,00	$ 812.560,51	$ 2.437.681,53		0,00	$ 0,00
2.17	2.04.58	Suministro e instalación cajas para válvulas tipo brocal en h.f.	Unidad	3,00	$ 187.683,46	$ 563.050,38		0,00	$ 0,00
2.18	3.12.03	Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	Metro cúbico - Km	1.758,71	$ 2.312,50	$ 4.067.016,88		1.714,32	$ 3.964.365,00
NP 6	3.12.02	Transporte de material suelto.	Metro cúbico - Km				$ 1.850,00	1.442,69	$ 2.668.976,50

RED PLUVIAL						**$ 527.129.924,16**			**$ 218.473.900,41**
3.1	2.01.05	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	Metro lineal	544,73	$ 1.062,32	$ 578.677,57		456,60	$ 485.055,31
3.2	Cotizacion	Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito	Metro lineal	544,73	$ 2.804,00	$ 1.527.422,92		290,60	$ 814.842,40
3.3	1.02.15	Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	Metro cúbico	1.006,49	$ 25.449,98	$ 25.615.150,37		469,09	$ 11.938.331,12
3.4	2.01.02	Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	Metro cuadrado	1.241,48	$ 42.040,83	$ 52.192.849,63		538,30	$ 22.630.578,79
3.5	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	Metro cúbico	48,72	$ 91.714,13	$ 4.468.312,41		82,70	$ 7.584.758,55
3.6	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado conexión sumidero	Metro cúbico	39,36	$ 91.714,13	$ 3.609.868,16		0,00	$ 0,00
3.7	2.07.08	Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	Metro cúbico	18,25	$ 286.965,46	$ 5.237.119,65		5,08	$ 1.456.407,10
3.9	2.05.56	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 16"	Metro lineal	300,00	$ 288.572,86	$ 86.571.858,00		290,60	$ 83.859.273,12
3.11	2.05.60	Suministro e instalación tubería 24" PVC alcantarillado red principal	Metro lineal	244,73	$ 527.993,04	$ 129.215.736,68		0,00	$ 0,00
3.12	2.05.59	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=8"	Metro lineal	68,00	$ 85.764,02	$ 5.831.953,36		4,00	$ 343.056,08
3.13	Cotizacion	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 8"	Unidad	7,00	$ 375.500,00	$ 2.628.500,00		2,00	$ 751.000,00
3.14	Cotizacion	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 24" a 8"	Unidad	5,00	$ 565.821,00	$ 2.829.105,00		0,00	$ 0,00
3.16	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	Metro cúbico	296,95	$ 138.070,17	$ 40.999.936,98		111,10	$ 15.339.595,89
3.17	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para conexiones.	Metro cúbico	10,12	$ 138.070,17	$ 1.397.270,12		1,62	$ 223.673,68
3.18	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	Metro cúbico	600,20	$ 90.646,13	$ 54.405.807,23		372,66	$ 33.780.186,81
3.19	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para acometidas.	Metro cúbico	29,92	$ 90.646,13	$ 2.712.132,21		3,48	$ 315.448,53
3.20	Cotizacion	Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	Unidad	11,00	$ 2.761.982,96	$ 30.381.812,56		5,00	$ 13.809.914,80
3.21	2.06.09	Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m	Unidad	11,00	$ 882.461,36	$ 9.707.074,96		5,00	$ 4.412.306,80
3.22	3.12.01	Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	Metro cúbico	1.335,38	$ 5.013,50	$ 6.694.927,63		114,11	$ 572.090,49
3.23	3.12.03	Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección diseño)	Metro cúbico	4.674,94	$ 2.312,50	$ 10.810.798,75		4.632,29	$ 10.712.170,63
3.24	Cotizacion	Sumidero transversal rejillas plastica	Unidad	4,00	$ 8.985.333,60	$ 35.941.334,40		0,00	$ 0,00
3.25	2.07.04	Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para muros	Metro cúbico	4,21	$ 1.102.801,80	$ 4.642.795,58		0,21	$ 231.588,38
3.26	2.07.06	Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para tapas	Metro cúbico	3,61	$ 937.939,18	$ 3.385.960,44		0,09	$ 84.414,53
3.27	2.07.05	Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para pisos	Metro cúbico	3,61	$ 1.060.141,09	$ 3.827.109,33		0,00	$ 0,00
3.28	3.10.12	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa	Kilogramo	273,69	$ 7.002,12	$ 1.916.410,22		40,56	$ 284.005,99
NP 7	3.12.02	Transporte de material suelto.	Metro cúbico - Km				$ 1.850,00	4.295,81	$ 7.947.248,50
NP 8	Cotizacion	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 8"	Unidad				$ 243.370,81	2,00	$ 486.741,62
NP 9	1.02.01	Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)	Metro cuadrado				$ 36.230,07	11,35	$ 411.211,29
NP 10	1.02.01	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"	Metro lineal				$ 137.109,86	0,00	$ 0,00
NP 11	Cotización	Construcción cajas ladrillo t.c. (1,00 x 1,00) m pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	Unidad				$ 815.098,76	0,00	$ 0,00
NP 12	Cotizacion	Suministro e instalación de rejilla plastica	Unidad				$ 385.726,59	0,00	$ 0,00

REPARACION DE ANDENES						**$ 14.678.164,46**			**$ 3.103.486,00**
4.1	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado	Metro cúbico	36,00	$ 91.714,13	$ 3.301.708,68		0,00	$ 0,00
4.2	3.03.12	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre de 5 KM.	Metro cúbico	26,00	$ 100.304,20	$ 2.607.909,20		0,00	$ 0,00
4.3	3.08.11	Construcción de andenes en concreto de 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro cúbico	13,00	$ 595.000,00	$ 7.735.000,00		0,00	$ 0,00
4.4	3.13.29	Malla electrosoldada 0.20X0.20 M D04 MM (incluye suministro, fijación e instalación)	Kilogramo	135,50	$ 7.627,65	$ 1.033.546,58		0,00	$ 0,00
NP 13	2.01.14	Demolición de pisos de concreto <=10 cms	Metro cuadrado				$ 32.896,82	94,34	$ 3.103.486,00
TOTAL COSTOS DIRECTO						**$ 1.231.806.540,02**			**$ 518.297.374,07**

COSTOS INDIRECTOS		$ 369.541.962,00	**COSTOS INDIRECTOS**	$ 155.489.212,22	
23,00%	$ 283.315.504,20	AIU $ 369541962	23,00%	AIU $ 155489212,22	
2,00%	$ 24.636.130,80		2,00%		
5,00%	$ 61.590.327,00		5,00%		
COSTO DIRECTO + INDIRECTO		$ 1.601.348.502,02	**COSTO DIRECTO + INDIRECTO**	$ 673.786.586,29	
Presupuesto PMT		$ 15.061.734,13	**Presupuesto PMT**	$ 7.530.867,07	
				$ 66.300.000,00	
				$ 12.597.000,00	
Costo Total		**$ 1.616.410.236,15**	**Costo Total**	$ 760.214.453,36	

PORCENTAJE DE EJECUCION A ESTE INFORME: 47,031%

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1 PERSONAL EN OBRA

Nº	NOMBRE	CARGO
1	John Emerson Rosas Mesa	Director de Obra
2	Karen Liseth Cely	Residente de Obra
3	Johana Carolina Patiño	Residente SST
4	Jairo Alonso Rosas	Apoyo a residente de obra
5	Jaime Barrera	Operador Maquinaria
5	Fabio Del Jesus Lemus	Oficial
6	Brahian Estiben Lopez Cardenas	Ayudante
7	Juan Felipe Guerrero Araque	Ayudante
8	Julian Andrey Perez Delgado	Ayudante
9	Cesar Augusto Mendoza Alarcon	Ayudante
10	Roberto De Los Angeles Lopez	Ayudante
11	Shampier Stivent Lemus Pineda	Ayudante
12	Johan Andres Lopez	Operador Maquinaria
13	Wilson Jhovani Lopez	Ayudante
14	Baudilio Sanchez Cardenas	Ayudante
15	Diana Carolina Montaña	Controladora
16	Karol Juanita Gonzalez	Controladora
17	Ana Yanin Corredor	Controladora
18	Ferney Dario Garcia	Ayudante
19	Jesus Alexander Perez	Ayudante
20	Luis Alfredo Alvarez Martinez	Oficial

• Las afiliaciones se reflejarán en el anexo

3.3. PÓLIZAS AJUSTADAS AL CONTRATO

3.3.1POLIZAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	NÚMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	91011	$161.641.023,62	19/05/2025-19/01/2026	Berkley International Seguros Colombia S.A
Salarios y prestaciones sociales	91011	$161.641.023,62	19/05/2025-19/09/2028	Berkley International Seguros Colombia S.A
Estabilidad de la obra	91011	$161.641.023,62	19/05/2025-19/09/2030	Berkley International Seguros Colombia S.A
Buen manejo del anticipo	91011	$808.205.118,08	19/05/2025-19/01/2026	Berkley International Seguros Colombia S.A
Predios labores y operaciones	26224	$ 284.700.000.00	19/05/2025-19/09/2025	Berkley International Seguros Colombia S.A

NOTA: La copia de pólizas del contratista se adjunta al presente informe mediante el ANEXO

3.4 ACTAS PARCIALES DE OBRA

ACTA	PERIODO	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM

3.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.5.1 Modificaciones de cantidades

Las modificaciones realizadas al contrato se llevaron a cabo con el objetivo de mejorar las condiciones y resultados del proyecto, sin que ello representara un incremento en el valor contractual inicial. Dichas modificaciones fueron acordadas de manera conjunta entre la supervisión/interventoría y el contratista, con base en las necesidades técnicas y operativas detectadas durante la ejecución de las obras.

Se determinó que algunas actividades podrían superar las cantidades originalmente estipuladas en el contrato, mientras que otras no alcanzarían el 100 % de ejecución previsto. Esta redistribución de cantidades se efectuó sin generar costos adicionales, respetando el presupuesto asignado y asegurando el cumplimiento de los objetivos contractuales. Asimismo, se incorporaron actividades no contempladas inicialmente, con el fin de garantizar la integralidad y funcionalidad del proyecto.

El acuerdo entre las partes se formalizó considerando:

1. La optimización de recursos disponibles.

2. El cumplimiento de los plazos establecidos.

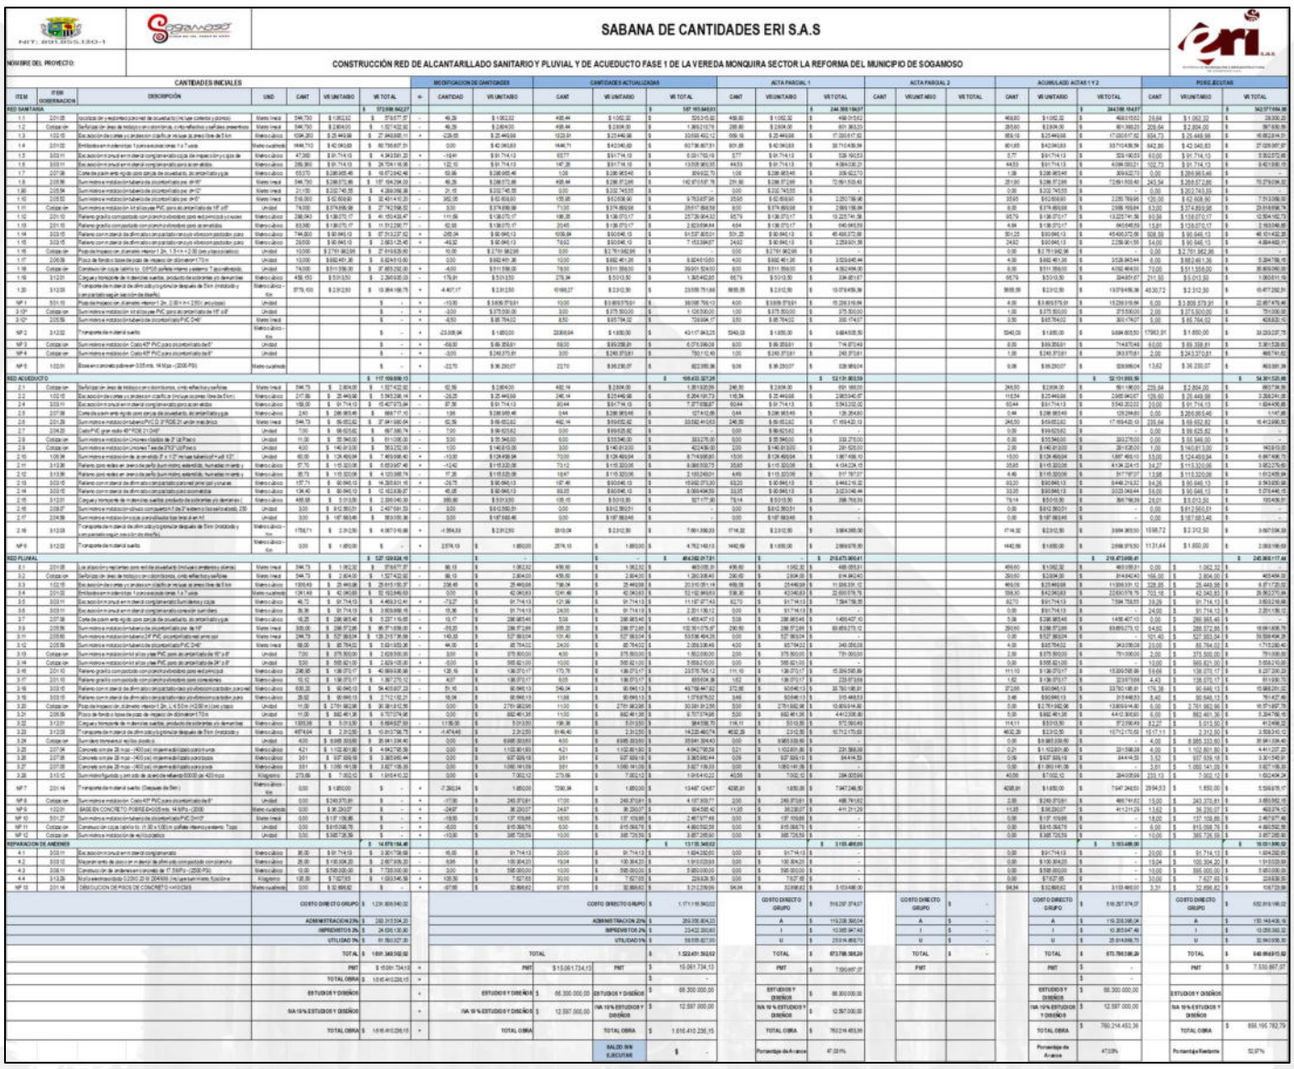
3. La mejora en la calidad de los resultados finales del proyecto.

El ajuste se llevó a cabo sin generar costos adicionales, en estricto cumplimiento de las disposiciones contractuales, preservando las condiciones presupuestarias y asegurando la calidad de la obra. Dichas modificaciones se fundamentaron en criterios técnicos, orientados a la optimización de los recursos disponibles y al cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.

Se anexan comités de obra al presente informe

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1 PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL



SABANA DE CANTIDADES ERI S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

ITEM	ITEM OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
RED SANITARIA						$ 372.696.942,27
1.1	2201.05	Localización y replanteo con red de acueducto (incluye cimientos y pozos)	Metro lineal	546,730	$ 1.052,52	$ 575.677,77
1.2	Cotaje cor	Excavación de zanjas de tedio con cimientos, cinta reflectiva y señales preventivas	Metro cúbico	546,730	$ 2.804,03	$ 1.527.422,92
1.3	1021.03	Excavación de zanjas y pozos en roca de hasta de profundidad de 3 hm	Metro cúbico	1044,200	$ 25.446,68	$ 27.246.895,31
1.4	2201.02	Emboquillado en ladrillos 1 cara expuesta cinco 1 a 7 veces	Metro cuadrado	1646,710	$ 42.040,69	$ 69.756.607,31
1.5	3203.01	Excavación manual en tierra de cualquier clase de material y cargue de	Metro cúbico	47,360	$ 91.714,13	$ 4.343.591,31
1.6	3203.01	Excavación manual en tierra de cualquier clase de material y cargue de	Metro cúbico	286,360	$ 91.714,13	$ 26.724.118,68
1.7	2207.06	Corte de pavimento rígido para zanja de acueducto, de cualquier espe	Metro cúbico	653,70	$ 208.985,46	$ 16.872.242,46
1.8	2205.06	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 6"	Metro lineal	546,730	$ 288.072,86	$ 157.154.354,37
1.9	2205.04	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 12"	Metro lineal	21,10	$ 432.746,55	$ 9.129.650,21
1.10	2205.02	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 8"	Metro lineal	516,000	$ 62.608,90	$ 32.311.412,20
1.11	Cotaje cor	Suministro e instalación sistema PVC para descargas de 15" a 18"	Metro lineal	74,00	$ 574.696,36	$ 42.527.530,64
1.12	2201.02	Relleno grafico compactado con plancha vibratoria para recomposición	Metro cúbico	286,043	$ 136.073,17	$ 41.153.420,31
1.13	2201.02	Relleno grafico compactado con plancha vibratoria para de arreglos	Metro cúbico	83,560	$ 136.073,17	$ 11.312.282,77
1.14	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para videocomposición	Metro cúbico	746,600	$ 87.313,27	$ 65.183.772,82
1.15	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para videocomposición	Metro cúbico	29,000	$ 90.940,13	$ 2.637.323,40
1.16	Cotaje cor	Pozo de inspección, diámetro interior 1.2m, 1.51m < 2.00 (en ciclopeo/ladrillo)	Unidad	10,000	$ 2.791.962,96	$ 27.919.629,60
1.17	2206.06	Pozo de fondo cóncavo de caída de material m 710 m	Unidad	10,000	$ 682.401,36	$ 6.824.013,60
1.18	Cotaje cor	Construcción de cajas tipo lo cc. CCP05 sobre relleno y sistema T (pavimentado	Unidad	74,000	$ 511.556,00	$ 37.853.252,00
1.19	3122.01	Cargue y transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico	476,153	$ 3.510,50	$ 2.365.628,03
1.20	3122.02	Transporte de material de afirmado (distancia de descarga de 31km (incluido y cargue/descargue en sitio de disposición)	Metro cúbico - Kilometro	3776,100	$ 2.312,50	$ 10.864.186,75
NP 1	3201.10	Pozo de inspección, diámetro interior 1.2m, 2.50 < h < 2.90 (en ciclopeo)	Unidad		$ -	$ 3.606.779,91
2.10*	Cotaje cor	Suministro e instalación sistema PVC para descargas de 15" a 18"	Unidad		$ -	$ 275.500,00
2.12*	2205.06	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC 24"	Unidad		$ -	$ 68.764,02
NP 2	3122.02	Transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico - Kilometro		$ -	$ 1.485,00
NP 3	Cotaje cor	Suministro e instalación Codo 45° PVC para descargas de 6"	Unidad		$ -	$ 69.355,61
NP 4	Cotaje cor	Suministro e instalación Codo 45° PVC para descargas de 8"	Unidad		$ -	$ 240.373,61
NP 5	1020.01	Bloque en concreto para pozo 0.05 mts. f'c 14 kg/cm - (2000 PSI)	Metro cuadrado		$ -	$ 22.700,38
RED ALCANTARILLADO						$ 117.109.836,13
2.1	Cotaje cor	Excavación de zanjas de tedio con cimientos, cinta reflectiva y señales	Metro cúbico	546,730	$ 2.804,03	$ 1.527.422,92
2.2	1021.03	Excavación de zanjas y pozos en roca de hasta de profundidad de 3 hm	Metro cúbico	217,89	$ 25.446,68	$ 5.545.246,14
2.4	3203.01	Excavación manual en tierra de cualquier clase de material y cargue de	Metro cúbico	108,00	$ 91.714,13	$ 10.427.313,84
2.5	2207.06	Corte de pavimento rígido para zanja de acueducto, de cualquier espe	Metro cúbico	1,89	$ 208.985,46	$ 393.717,10
2.6	2201.05	Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica	Metro lineal	546,73	$ 69.653,62	$ 37.991.080,04
2.7	2104.03	Codo PVC pega sobre 45° RDE 21 DN6"	Unidad	1,00	$ 69.653,62	$ 69.653,62
2.8	Cotaje cor	Suministro e instalación Unones roscados de 2" (2 Pieza)	Unidad	11,00	$ 33.940,00	$ 611.056,00
2.9	Cotaje cor	Suministro e instalación Unones 1 sede 2"X2" (2 Pieza)	Unidad	4,00	$ 140.913,00	$ 563.252,00
2.10	1105.04	Suministro e instalación de anclaje (f'c = 21 mpa) sobre perfil H x 8 1/2"	Unidad	40,00	$ 134.460,64	$ 7.463.956,40
2.11	3113.01	Relleno para redes en zanja de tedio (sum mejo, extensión, humedec m extra)	Metro cúbico	57,70	$ 115.320,06	$ 4.659.967,40
2.12	3113.01	Relleno para redes en zanja de tedio (sum mejo, extensión, humedec m extra)	Metro cúbico	35,70	$ 115.320,06	$ 4.120.988,74
2.13	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para red primaria (incluye	Metro cúbico	187,70	$ 90.940,13	$ 14.363.611,10
2.14	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para videocomposición	Metro cúbico	134,40	$ 90.940,13	$ 12.163.938,67
2.15	3122.01	Cargue y transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico	448,00	$ 3.510,50	$ 2.260.945,68
2.16	2208.07	Suministro e instalación sifonado compuesto h 24 2" externo (tapa de sifonado, 2	Unidad	3,00	$ 812.350,01	$ 2.437.591,53
2.17	2104.58	Suministro e instalación sola para tubería de tres 4 de h1	Unidad	3,00	$ 187.863,46	$ 563.590,38
2.18	3122.02	Transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico - Kilometro	1758,71	$ 2.312,50	$ 4.067.149,88
NP 6	3122.02	Transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico - Kilometro	0,00	$ 1.650,00	$ -
RED PLUVIAL						$ 327.129.024,10
3.1	2201.05	Localización y replanteo con red de acueducto (incluye cimientos y pozos)	Metro lineal	546,73	$ 1.052,52	$ 575.677,77
3.2	Cotaje cor	Excavación de zanjas de tedio con cimientos, cinta reflectiva y señales	Metro lineal	546,73	$ 2.804,03	$ 1.527.422,92
3.3	1021.03	Excavación de zanjas y pozos en roca de hasta de profundidad de 3 hm	Metro cúbico	1044,49	$ 25.446,68	$ 26.575.057,37
3.4	2201.02	Emboquillado en ladrillos 1 cara expuesta cinco 1 a 7 veces	Metro cuadrado	1241,48	$ 42.040,69	$ 52.182.669,63
3.5	3203.01	Excavación manual en tierra de cualquier clase de material y cargue de	Metro cúbico	46,72	$ 91.714,13	$ 4.283.212,40
3.6	3203.01	Excavación manual en tierra de cualquier clase de material y cargue de	Metro cúbico	36,36	$ 91.714,13	$ 3.333.999,16
3.7	2207.06	Corte de pavimento rígido para zanja de acueducto, de cualquier espe	Metro cúbico	16,25	$ 208.985,46	$ 3.397.167,43
3.9	2205.06	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 15"	Metro lineal	349,00	$ 288.072,86	$ 100.553.419,14
3.10	2205.06	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC de 24"	Metro lineal	244,70	$ 527.863,04	$ 129.179.736,88
3.12	2205.06	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC 12"	Metro lineal	68,00	$ 85.754,02	$ 5.831.553,36
3.13	Cotaje cor	Suministro e instalación Codo pega PVC para descargas de 18" a 24"	Unidad	7,00	$ 678.800,00	$ 4.751.600,00
3.14	Cotaje cor	Suministro e instalación sola pega PVC para descargas de 24" a 30"	Unidad	3,00	$ 585.621,00	$ 1.756.863,00
3.15	2201.02	Relleno grafico compactado con plancha vibratoria para recomposición	Metro cúbico	246,95	$ 136.073,17	$ 40.969.638,36
3.16	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para videocomposición para red	Metro cúbico	16,00	$ 136.073,17	$ 2.177.170,72
3.17	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para videocomposición para red	Metro cúbico	630,20	$ 90.940,13	$ 57.312.777,63
3.18	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado para videocomposición para red	Metro cúbico	35,10	$ 90.940,13	$ 3.191.883,51
3.19	3122.01	Cargue y transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico	36,00	$ 3.510,50	$ 126.378,00
3.20	Cotaje cor	Pozo de inspección, diámetro interior 1.2m, 1.51m < h < 2.00 (en ciclopeo)	Unidad	11,00	$ 2.791.962,96	$ 30.711.592,56
3.21	2206.06	Pozo de fondo cóncavo de caída de material m 710 m	Unidad	11,00	$ 682.401,36	$ 9.707.219,48
3.22	3122.01	Cargue y transporte de material sobrante, producto de excavaciones y demoliciones	Metro cúbico	1305,06	$ 3.510,50	$ 4.649.627,55
3.23	3122.02	Transporte de material de afirmado (distancia de descarga de 31km (incluido y	Metro cúbico - Kilometro	4479,64	$ 2.312,50	$ 10.357.756,75
3.24	Cotaje cor	Suministro e instalación Codo 45° PVC para descargas de 8"	Unidad	4,00	$ 69.355,61	$ 277.422,44
3.25	2207.04	Concreto simple 21 mpa - (400 psi) impermeabilizado para cuneta	Metro cúbico	4,21	$ 1.152.801,60	$ 4.852.752,33
3.26	2207.06	Concreto simple 21 mpa - (400 psi) impermeabilizado para box	Metro cúbico	3,61	$ 937.609,18	$ 3.383.663,44
3.27	2207.06	Concreto simple 21 mpa - (400 psi) impermeabilizado para pozo	Metro cúbico	3,61	$ 1.080.141,06	$ 3.827.138,30
3.28	3113.01	Suministro y puesta en obra de piedra relleno 0,0030 de 400 mpa	Kilogramo	273,66	$ 7.602,12	$ 1.915.412,02
NP 7	2201.14	Transporte de material sueltos (Después de 5km)	Metro cúbico - Kilometro	0,00	$ 1.650,00	$ -
NP 8	Cotaje cor	Suministro e instalación Codo 45° PVC para descargas de 8"	Unidad	0,00	$ 240.373,61	$ -
NP 9	1020.01	BASE EN CONCRETO PARED ENCIDA mts. 14 MPa - (2000	Metro cuadrado	0,00	$ 38.200,07	$ -
NP 10	3201.07	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=12"	Metro lineal	0,00	$ 137.109,66	$ -
NP 11	Cotaje cor	Construcción de cajas tipo lo cc. 01 (50 x 100 cm pollas internos y externo. Tapa	Unidad	0,00	$ 615.068,76	$ -
NP 12	Cotaje cor	Suministro e instalación de rejilla (0.60x0.4	Unidad	0,00	$ 387.729,59	$ -
REPARACION DE ANDENES						$ 14.670.154,40
4.1	3203.01	Relleno con material de afirmado compactado	Metro cúbico	30,00	$ 91.714,13	$ 2.751.423,90
4.2	2208.01	Reparación de zapata en concreto de alfiler cada compactado con plancha	Metro cuadrado	10,00	$ 1.167.109,36	$ 11.671.093,60
4.3	2208.01	Construcción de andenes en concreto de 17.5MPa - (2500 PSI)	Metro cuadrado	10,00	$ 248.000,00	$ 2.480.000,00
4.4	3113.01	Suministro material 0,0262 (0,25 GRAVA) (no agrietamiento, fluidoma	Kilogramo	126,00	$ 7.527,00	$ 948.402,00
NP 13	2201.14	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO e=10 CMS	Metro cuadrado	0,00	$ 67,00	$ 30.868,62

		COSTO DIRECTO GRUPO	$	1.239.806.040,02	
		ADMINISTRACION 22%	$	280.315.504,20	
		IMPREVISTOS 3%	$	34.056.130,80	
		UTILIDAD 5%	$	81.869.527,09	
		TOTAL	$	1.591.349.592,02	
		IVA	$	15.061.734,10	
		TOTAL OBRA	$	1.616.411.226,15	
		ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	66.300.000,00	
		IVA 19 % ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	12.597.000,00	
		TOTAL OBRA	$	1.616.411.226,15	

		COSTO DIRECTO GRUPO	$	1.171.116.540,02	
		ADMINISTRACION 22%	$	264.556.834,20	
		IMPREVISTOS 3%	$	33.422.300,80	
		UTILIDAD 5%	$	80.339.527,09	
		TOTAL	$	1.522.435.202,02	
		IVA	$	15.061.734,10	
		TOTAL OBRA	$	1.537.496.936,12	
		ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	66.300.000,00	
		IVA 19 % ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	12.597.000,00	
		TOTAL OBRA	$	1.616.411.226,15	
		SALDO SIN EJECUTAR	$	-	

		COSTO DIRECTO GRUPO	$	1.171.116.540,02	
		ADMINISTRACION 22%	A	264.556.834,20	
		IMPREVISTOS 3%	I	33.422.300,80	
		UTILIDAD 5%	U	80.339.527,09	
		TOTAL	TOTAL	1.522.435.202,02	
		IVA	IVA	15.061.734,10	
		TOTAL OBRA		1.537.496.936,12	
		ESTUDIOS Y DISEÑOS		66.300.000,00	
		IVA 19 % ESTUDIOS Y DISEÑOS		12.597.000,00	
		TOTAL OBRA		1.616.411.226,15	
		Porcentaje de Avance		47,03%	

		COSTO DIRECTO GRUPO	$	316.297.374,07	
		ADMINISTRACION 22%	A	119.238.366,04	
		IMPREVISTOS 3%	I	10.365.047,40	
		UTILIDAD 5%	U	25.914.868,70	
		TOTAL	TOTAL	671.815.656,20	
		IVA	IVA		
		TOTAL OBRA			
		ESTUDIOS Y DISEÑOS		66.300.000,00	
		IVA 19 % ESTUDIOS Y DISEÑOS		12.597.000,00	
		TOTAL OBRA		760.214.453,36	
		Porcentaje de Avance		47,03%	

		COSTO DIRECTO GRUPO	$	-	
		ADMINISTRACION 22%	A	-	
		IMPREVISTOS 3%	I	-	
		UTILIDAD 5%	U	-	
		TOTAL	TOTAL	-	
		IVA	IVA	-	
		TOTAL OBRA		-	
		ESTUDIOS Y DISEÑOS		-	
		IVA 19 % ESTUDIOS Y DISEÑOS		-	
		TOTAL OBRA		-	
		Porcentaje de Avance		-	

		COSTO DIRECTO GRUPO	$	552.918.196,02	
		ADMINISTRACION 22%	A	121.642.003,04	
		IMPREVISTOS 3%	I	13.055.360,31	
		UTILIDAD 5%	U	32.644.008,79	
		TOTAL	TOTAL	719.259.568,16	
		IVA	IVA	7.533.867,37	
		TOTAL OBRA		-	
		ESTUDIOS Y DISEÑOS		-	
		IVA 19 % ESTUDIOS Y DISEÑOS		-	
		TOTAL OBRA		856.195.782,79	
		Porcentaje de Avance		52,97%	

A la fecha se genera un avance de **47,031%** en la ejecución total del proyecto, que corresponde a un total de ($ 760.214.453,36) setecientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos m/cte.., este monto acumulado hasta la fecha es consistente con las actividades ejecutadas y las programadas, diferencias son aclaradas en el componente 3.5 actividades administrativas.

EJECUCION CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR COSTO TOTAL	% DE EJECUCION
VALOR TOTAL CONTRATO	$1`616.410.236,15	100
ANTICIPO	$808.205.118,08	50
AVANCE FISICO DE OBRA	$ 760.214.453,36	47,031

4.2 ANTICIPO DEL CONTRATISTA

Con base en lo establecido en el esquema de pagos del contrato de obra, se efectuó el desembolso del anticipo, equivalente al 50% del valor total del contrato, por un total de OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 808.205.118,08),** correspondiente a 50% del valor total del contrato de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR					% *
		MES 1	MES 2	MES 3	MES XX	TOTAL	
1	PAGO DE SALARIOS, DOTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	40.410.255,90	40.410.255,90			80.820.511,81	10,0%
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS**	16.164.102,36				16.164.102,36	2,0%
3	TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA	202.051.279,52	202.051.279,52			404.102.559,04	50,0%
4	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	274.789.740,15				274.789.740,15	34,0%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.164.102,36	16.164.102,36			32.328.204,72	4,0%
TOTAL		**549.579.480,29**	**258.625.637,78**	**0,00**	**0,00**	**808.205.118,08**	**100,0%**

TABLA PLAN INVERSIÓN ANTICIPO

5. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este capítulo se complementa en el informe presentado anexo a este INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Este capítulo se complementa en el anexo a este informe

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cuenta con un avance en obra de aproximadamente del 47,031%

- Como parte del control técnico de los procesos ejecutados en la obra, se llevó a cabo una supervisión exhaustiva de las cantidades trabajadas, empleando diversos procedimientos adaptados a las particularidades de cada una de las labores realizadas en el marco del contrato de obra. Estos procedimientos abarcaron, entre otros, la toma de espesores y mediciones lineales.

- Antes de dar inicio al proyecto a ejecutar se realiza visita técnica al sitio de la obra en conjunto con la supervisión con el fin de verificar detalladamente que el alcance corresponda a las necesidades del proyecto.

- Cada uno de los aspectos técnico-administrativos y financieros inherentes al contrato de obra ha sido desarrollado con un enfoque riguroso hacia las buenas prácticas. Se ha garantizado la optimización de recursos, la eficiencia y eficacia en la gestión del tiempo, los fondos y demás recursos asignados.

- Todas las actividades ejecutadas han seguido las buenas prácticas y han cumplido con los procesos constructivos pertinentes.

Proyectó: John Emerson Rosas Mesa
Director de Obra

ANEXOS

INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 1

VERSIÓN	CONTENIDO	ELABORÓ
1	INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 1	John Emerson Rosas Mesa Director de Obra

Reviso y aprobó:

Julián Ramiro Urrutia Paragua
Coordinador de Operaciones

Ingeniar Constructora y Consultora s.a.s
R/L Mónica María Juliana González Vargas

John Emerson Rosas Mesa
Contratista

NIT: 891.855.130-1		**ALCALDIA DE SOGAMOSO** **EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO**	FECHA: 2025/04/JUNIO	VERSIÓN 001

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	**Fecha:**	04/06/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	**Hora de culminación:**	11:00 AM

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas
Desarrollo de la Reunión:	

El día 4 de junio de 2025 se llevó a cabo el primer comité de obra posterior al acta de inicio, donde se establecieron los lineamientos técnicos y administrativos para la ejecución del proyecto. El contratista presentó el plan de trabajo inicial y los avances en la movilización de personal y equipos requeridos para el desarrollo de las actividades.

Durante la reunión se solicitó formalmente al contratista la presentación de los siguientes documentos dentro de los próximos días: pólizas de cumplimiento y garantía vigentes, certificados actualizados de afiliaciones a seguridad social, liquidación de aportes parafiscales al día, así como la programación de obra con el cronograma de actividades y además incluir las actas de vecindad.

La interventoría por su parte se comprometió a revisar los documentos posteriores a su recepción, con el fin de emitir los conceptos técnicos correspondientes y hacer el control técnico, administrativo, fiscal y ambiental. Se destacó la importancia de mantener esta coordinación entre las partes para garantizar que los ajustes al proyecto se realicen conforme a las normas técnicas y los requerimientos contractuales.

Finalmente, se acordó realizar un nuevo comité el día 14 de junio para evaluar lo presentado y dar seguimiento al cronograma de obra. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de mantener esta periodicidad en las reuniones para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.

PARTICIPANTES				
NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
John F. Rosas Mesa	Contratista Obra	74081029	3103120770	
Arturo Baron S.	Interventoria	74.185.734	3142660384	
Eduardo Gonzalez F.	INTERVENTORIA	9514890.	3105630031	
Andy Mauricio Ibañez	Interventoria	1.057.580.742	304.661.6081	
Mayra Ortiz	Interventoria	1057588607	3521977744	
Felipe Pedraza	E.R.I	1057590867	3124796761	
Julian Vergara N.	Sec. Habitat	1055 313 349	312464 4430	
Lina Maria Lanziano	Sec Habitat	46381-750	3143758543	
Camilo Castro	Alc. Sogamoso	74188857	3112857459	

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	**Fecha:**	14/06/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	**Hora de culminación:**	11:00 AM

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas
Desarrollo de la Reunión:	

El 14 de junio de 2025 se realizó el segundo comité de obra en seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión anterior. La interventoría verificó y aprobó los documentos presentados por el contratista, encontrando completo el paquete de pólizas vigentes, certificaciones laborales al día, las actas de vecindad y programación de obra conforme a lo requerido.

Durante la reunión, la interventoría solicitó formalmente al constructor la presentación del Plan de Movilidad de Tránsito (PMT) aprobado por el ente de control.

Durante la reunión se presentó un detallado análisis técnico donde se identificaron falencias significativas en los diseños originales, particularmente en los componentes hidráulicos y estructurales, que presentaban vacíos técnicos incompatibles con las condiciones reales del terreno.

Ante esta situación, se solicitó formalmente al contratista John Rosas presentar una cotización económica y técnica para la actualización integral de los diseños, la cual deberá incluir: los cálculos estructurales, hidráulicos, hidrológicos, diseños y planos ajustados, teniendo en cuenta a la topografía real y estructuras existentes de entrega de aguas servidas y pluviales, según los ajustes técnicosdel diseño.

Se estableció como plazo para la presentación de esta propuesta técnico-económica, el día 17 de junio, fecha en la que deberá ser radicada ante la interventoría para su revisión y concepto técnico. Todos los

participantes coincidieron en la urgencia de estos ajustes para garantizar la viabilidad técnica del proyecto y su correcta ejecución.

PARTICIPANTES				
NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
John E. Rubas Mesa	Contratista Obra	74081029	3103120770	
ARTURO BERNAL S	INTERVENTORIA	74165734	3142660389	
ALVARO A GONZALEZ	INTERVENTORIA	9519840	3105680031	
Andy Mauricio Ibáñez	Interventoría	1.057.580.742	304.661.6081	
Mayra Ordoz	Interventoria	1057580009	3152997744	
Felipe Pedraza	E.R.I.	1057540867	3124296761	
Julian Vergara N.	Sec. Habitat	1055 313 349	312 464 4430	
Lina Tatiana Lanzano	Sec Habitat	46 381 750	3143758543	
Camilo Castro	Alcal. Sogamoso	74156 857	3128574159	

NIT: 891.855.130-1		ALCALDIA DE SOGAMOSO EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO	FECHA: 2025/17 /JUNIO	VERSIÓN 003

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	**Fecha:**	17/06/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	**Hora de culminación:**	11:30 AM

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas
Desarrollo de la Reunión:	

El día 17 de junio de 2025 se llevó a cabo el tercer comité de obra en las instalaciones de Ingeniar, con la participación de los representantes de la Empresa de Renovación e Infraestructura (ERI), la Secretaría de Hábitat, el contratista encargado de la ejecución de la obra y el equipo de interventoría. En este comité se revisaron las cotizaciones de los rediseños presentadas, incluida la del contratista John Rosas, la cual expresa el contratista; tuvo en cuenta el oficio recibido por interventoría, donde se mencionan los soportes que debe de tener los estudios técnicos para la ejecución de la obra, donde se realiza el análisis económico y técnico, y se ajusta a las necesidades del proyecto.

Durante la reunión, el equipo de Ingeniar presentó su concepto favorable a las cotizaciones de los rediseños, destacando que los mismos solventan las falencias técnicas inicialmente identificadas y se ajustan a los requerimientos del proyecto. Los representantes de la ERI y Secretaría de Hábitat validaron los cambios realizados.

En paralelo, se socializó las observaciones al PMT realizados por Intrasog, que contempla las nuevas disposiciones para la gestión del tránsito durante la fase de ejecución de obras. El contratista explicó los cambios implementados en cuanto a señalización temporal, rutas alternas, horarios de trabajo y medidas de seguridad para peatones, haciendo especial énfasis en las estrategias para minimizar el impacto en la movilidad del sector durante las horas de mayor flujo vehicular.

Tras un detallado análisis del presupuesto presentado, todas las partes llegaron a un acuerdo sobre los costos asociados a los rediseños y sus implicaciones en el cronograma general del proyecto. Como

resultado, se aprobó formalmente la versión actualizada de los diseños y se concedió al contratista un plazo de 18 días calendario, contados a partir de esta fecha, para la elaboración definitiva de todos los planos y documentos técnicos ajustados.

Conclusiones:

- Aprobación unánime de la cotización de los rediseños
- Plazo de 18 días para entrega de documentos finales (hasta el 10 de julio)
- La interventoría supervisará el cumplimiento de los nuevos estándares técnicos
- Se mantendrá el cronograma general del proyecto con ajustes menores

Todos los participantes reiteraron su compromiso con el desarrollo adecuado de las obras y la calidad técnica de las soluciones implementadas.

PARTICIPANTES				
NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
John Emerson Rojas M.	Contratista obra	74081029	3103120770	
Mara Dayanny Ord	Interventoria	1057586007.	3152197724	
Jhon Bautista	Interventoria	74.185.134	3142660384	
Felipe Pedraza	E.R.I	1057590867	312A296761	
Eduardo Gonzalez	Interventoria.	9519890.	3105680031.	
Julian Vergara N.	Sec. Habitat	1055313349	3124644430	
Laura Lanzano	Sec habitat	46381750.	3193758543	
Camilo Ortiz	Alca. Sogamoso	74186257	3112857459	

NIT: 891.855.130-1		ALCALDIA DE SOGAMOSO EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO	FECHA: 2025/11 /JULIO	VERSIÓN 004

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	**Fecha:**	11/07/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	**Hora de culminación:**	12:00 M

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas
Desarrollo de la Reunión:	

El día 11 de julio de 2025 se llevó a cabo el cuarto comité de obra en las instalaciones de Ingeniar, con la participación de los representantes de la Empresa de Renovación e Infraestructura (ERI), la Secretaría de Hábitat, el contratista John Rosas y el equipo de interventoría. Este comité se realizó en cumplimiento del plazo establecido en el tercer comité del 17 de junio, cuyo acuerdo principal fue la entrega de los estudios y diseños definitivos por parte del contratista en un plazo de 18 días.

Durante la reunión, el contratista John Rosas hizo entrega formal de la totalidad de los estudios y diseños ajustados, los cuales incorporan las observaciones técnicas señaladas por la interventoría. La documentación presentada incluyó los planos definitivos, memorias de cálculo actualizadas, especificaciones técnicas y Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la entidad de tránsito del municipio Intrasog.

El equipo de interventoría realizó una revisión preliminar de los documentos, verificando que se hubieran incorporado todos los requerimientos técnicos y normativos establecidos en los comités anteriores. Los representantes de la ERI y la Secretaría de Hábitat participaron activamente en la revisión, confirmando que los estudios cumplen con los estándares de calidad y seguridad requeridos para la ejecución de la obra.

Tras un análisis y considerando que los documentos presentados solucionan las falencias técnicas iniciales, se llegó a una aprobación unánime de los estudios y diseños por parte de todas las entidades

presentes. Esta aprobación permite al contratista iniciar la fase de ejecución de las obras con base en los documentos técnicos definitivos.

Como acuerdos y compromisos derivados de este comité, se estableció que el contratista procederá con la socialización de los diseños aprobados con el equipo de trabajo y garantizará su estricto cumplimiento durante la ejecución. La interventoría supervisará la implementación de los diseños en campo y verificará el apego a las especificaciones técnicas. Además, se programó el próximo comité para el 28 de julio de 2025, donde se evaluarán los avances de la obra y la efectividad de las medidas implementadas.

PARTICIPANTES				
NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
John Emerson Rosas M.	Contratista obra	74081029	3103120770	
ARTURO BERNAL	INTERVENTORIA	74.165.734	3142660369	
Andy Mauricio Ibáñez P	Interventoria	1.057.580.742	304.661.6081	
Mayra Ordoz.	Interventoria	1057586007	3152977724	
Felipe Pedraza	E.R.I.	1057590867	3124296761	
ALVARO A. GONZALEZ	INTERVENTORIA.	9519840.	3105680031.	
Julian Vergara N.	Sec. Habitat	1055313349	3124644430	
Jimi Oyuela	A/C. SOGAMOSO	7418CBJ-7	3128574459	Jimi O C.
Lira M Lanzaro	Sec Habitat	46381750	3143758543	

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	**Fecha:**	28/07/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	**Hora de culminación:**	11:00 AM

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas
Desarrollo de la Reunión:	

El día 28 de julio de 2025 se llevó a cabo el quinto comité de obra en las instalaciones de Ingeniar, con la participación de los representantes de la Empresa de Renovación e Infraestructura (ERI), la Secretaría de Hábitat, el contratista John Rosas y el equipo de interventoría. Este comité tuvo como objetivo principal revisar los avances físicos y financieros del proyecto tras la aprobación de los diseños definitivos en el comité anterior del 11 de julio.

Durante la reunión, el contratista John Rosas presentó un informe detallado de los avances físicos alcanzados desde la última reunión, destacando las actividades de construcción en los tramos intervenidos, así como el cumplimiento del 30% de la ejecución física global del proyecto. En cuanto a los avances financieros, se expuso el reporte de inversión ejecutada, el cual evidencia un adecuado manejo de los recursos conforme al cronograma de desembolsos y las proyecciones establecidas.

El equipo de interventoría validó los avances reportados mediante la presentación de su informe de supervisión, el cual incluyó evidencias fotográficas, mediciones in situ y la verificación del cumplimiento de los diseños aprobados. Se destacó que las actividades se han desarrollado sin contratiempos mayores y en cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

Los representantes de la ERI y la Secretaría de Hábitat reconocieron el progreso alcanzado y reiteraron la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para garantizar el éxito del proyecto. Además, se solicitó al contratista reforzar las medidas de seguridad en los tramos críticos, priorizando la protección de los transeúntes y el personal de obra.

Como acuerdos y compromisos, se estableció que el contratista continuará con la ejecución de las actividades según el cronograma ajustado, mientras que la interventoría intensificará las supervisiones para verificar el apego a los diseños y especificaciones técnicas. Se programó el próximo comité para el 20 de agosto de 2025, donde se evaluarán los avances en la ejecución de los tramos restantes y el cumplimiento de las metas físicas y financieras.

PARTICIPANTES				
NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
John F. Rosas Mesa	Contratista obra	74081029	3103120770	
Andy Mauricio Ibáñez	Interventoría	1.057.580.742	304.661.6085	
Mayra Dayanny Ch.	Interventoria	1057586[illegible]	3152977744	
Arturo Bernal Sua	Interventoría	74.185.734	3142660389	
Felipe Pedraza	E.R.I	1057590867	3124296761	
Alvaro D. Gonzalez	Interventoria	9519890.	3105680031.	
Julian Vergara N.	Sec. Habitat	1055313 349	3124644430	
Lina M Lanzzaro	Sec. Habitat	46381750	3143758543	
Camilo Castro	Geol. Sogamoso	74186857	3128577459	Camilo C.

Tema Central:	COMITÉ DE OBRA
CONTRATO/CONVENIO: No. 2025-025	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRÁ SECTOR REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Municipio / Departamento	SOGAMOSO (Boyacá)		
Lugar:	Oficina Ingeniar, la Reforma. transversal 1 # 4 sur 30 (Sogamoso Boyacá)	**Fecha:**	20/08/2025
Hora de Inicio:	9:30 AM	**Hora de culminación:**	11:30 AM

Moderador:	Dirección de operaciones de la empresa de renovación e infraestructura de Sogamoso

Agenda Para Tratar en la Reunión:	
1	Notificación de los asistentes
2	Ilustración del proyecto y desarrollo
3	Conclusiones y tareas

Desarrollo de la Reunión:

El día 20 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sexto comité de obra, con la representación de interventoría, el contratista John Rosas, así como delegados de la ERI y la Secretaría de Hábitat. Durante la sesión, el ingeniero Álvaro González presentó el reporte de avance reportando un 52% de ejecución física de la obra, el cual se encuentra alineado con el cronograma establecido y los recursos financieros ejecutados.

Dentro de los temas tratados, se planteó la posibilidad de incorporar un nuevo frente de trabajo para optimizar los tiempos de ejecución. Para ello, se estableció un plazo de 8 días hábiles para que el contratista evalúe la alternativa técnica y financiera que determine la posibilidad de esta implementación y que sirva para no afectar el tiempo contractual del contrato.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, la SISO Mayra Orduz reportó el cumplimiento de los protocolos establecidos, destacando el uso adecuado de los elementos de protección personal, la correcta implementación de la señalización en zonas críticas y las capacitaciones realizadas al personal. Se enfatizó la necesidad de mantener estas medidas, especialmente si se aprueba el nuevo frente de obra.

Todos los participantes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación para garantizar el éxito del proyecto. Se programó la próxima reunión para el 29 de agosto de 2025, donde se evaluará la viabilidad del nuevo frente de trabajo y los avances generales de la obra.

NIT: 891.855.130-1		ALCALDIA DE SOGAMOSO EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUTURA DE SOGAMOSO	FECHA: 2024/11	VERSIÓN 6

20 AGOSTO - 2025

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE INDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
John F. Rosas Mesa	74081029	3103120770	
Felipe A Redriguez A	1057540867	3124296761	
Julian D. Vergara	1055313349	3124644430	
Oliver D. Gamboa.	9519890.	3105680031.	
Monica Gonzalez	1057598934	3118912816	
Gustavo Jaramillo	1007074077	— —	
Maria Dayany Ardila	1057586004.	3152997744	
Arturo Bernal Sanchez	MA-185-774	3142660369	
Felipe Redriguez			
Lina Fernanda Lanziano	46301750	3143785413	
Emilio Cuervo.	74186857	3112857459	Emilio C.

INFORME OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA
INTERVENTOR:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S.
% AVANCE:	FECHA INICIO: 4/06/2025 — FECHA DE CORTE 3/07/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)



Foto No:	2
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

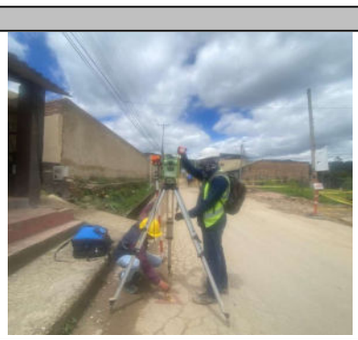


Foto No:	3
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)



Foto No:	4
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	5
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)



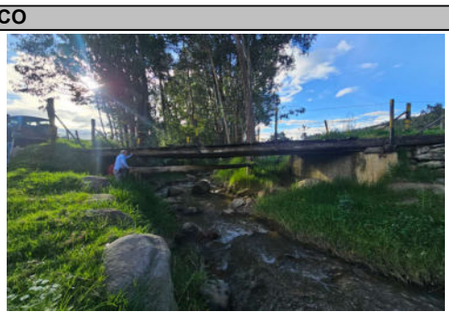
Foto No:	6
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)




Foto No:	7
Observaciones Particulares:	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)






Foto No:	8
Observaciones Particulares:	Reunión socialización PMT empresas de transporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: registro fotografico de estado del punte		Observaciones Particulares: registro fotografico de estado del punte	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Limpieza de box culvert, empalme de alcantarillado pluvial		Observaciones Particulares: Limpieza de box culvert, empalme de alcantarillado pluvial	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	11	Foto No:	12
Observaciones Particulares: Limpieza de box culvert, empalme de alcantarillado pluvial		Observaciones Particulares: Limpieza de box culvert, empalme de alcantarillado pluvial	

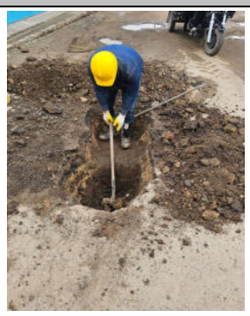
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	13	Foto No:	14
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	15	Foto No:	16
Observaciones Particulares: Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas		Observaciones Particulares: Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	17	Foto No:	18
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	19	Foto No:	20
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	21	Foto No:	22
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	23	Foto No:	24
Observaciones Particulares: instalación de valvulvula provicional de 3"		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	25	Foto No:	26
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	27	Foto No:	28
Observaciones Particulares: Limpieza de box culvert, empalme de alcantarillado pluvial		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)	

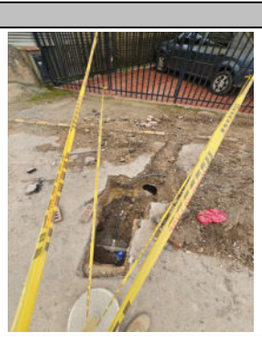
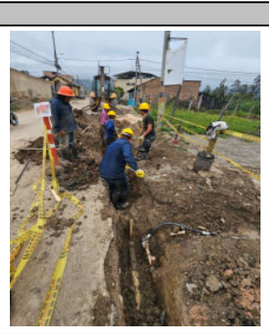
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	29	Foto No:	30
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica	

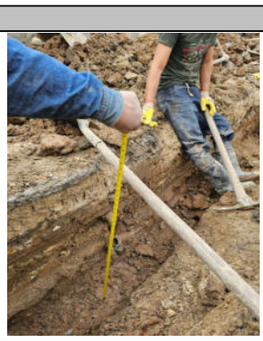
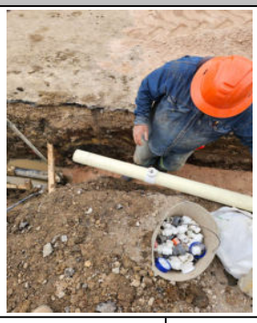
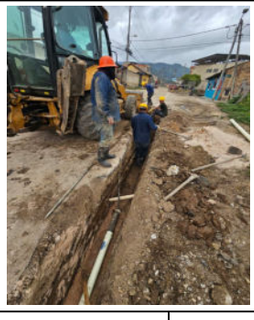
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	31	Foto No:	32
Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios		Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	33	Foto No:	34
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	35	Foto No:	36
Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	37	Foto No:	38
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	39	Foto No:	40
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	

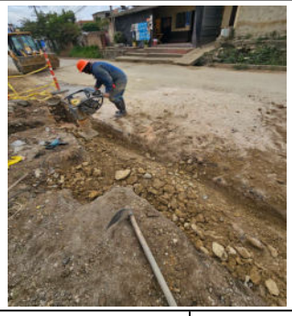
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	41	Foto No:	42
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	43	Foto No:	44
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes	

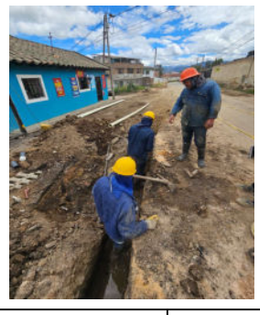
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	45	Foto No:	46
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas	

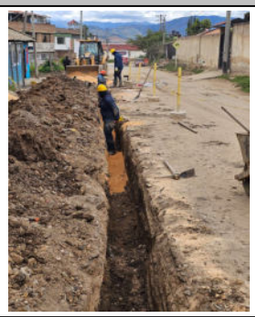
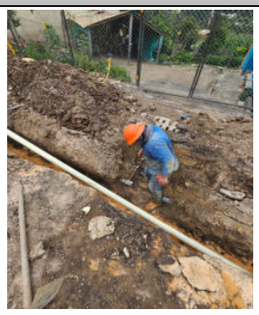
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	47	Foto No:	48
Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas		Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	49	Foto No:	50
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	51	Foto No:	52
Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios		Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	53	Foto No:	54
Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	

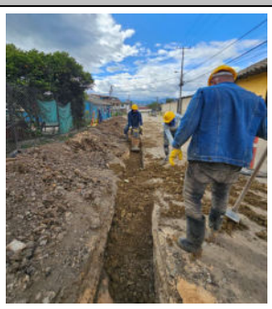
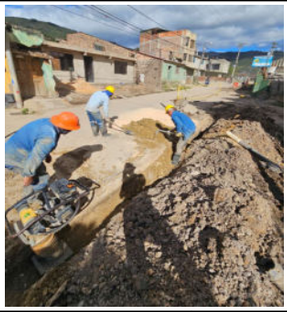
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	55	Foto No:	56
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	57	Foto No:	58
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	59	Foto No:	60
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)	

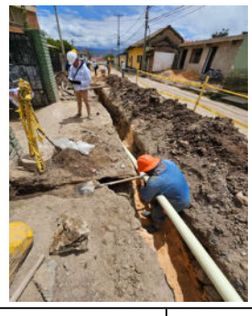
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	61	Foto No:	62
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)		Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas	

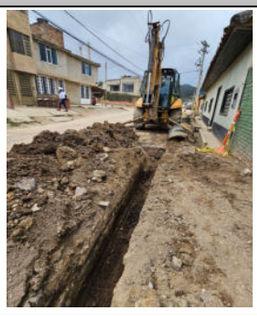
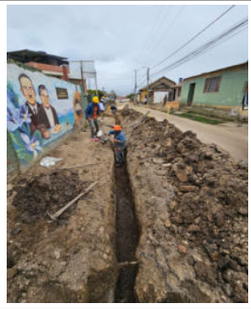
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	63	Foto No:	64
Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	65	Foto No:	66
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	67	Foto No:	68
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	69	Foto No:	70
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	

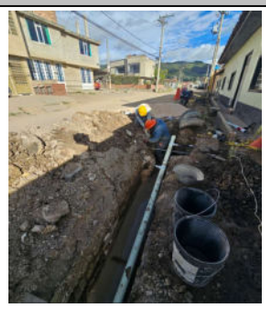
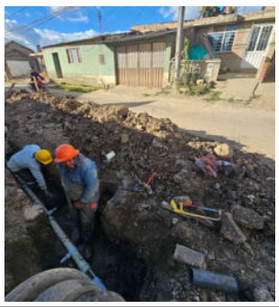

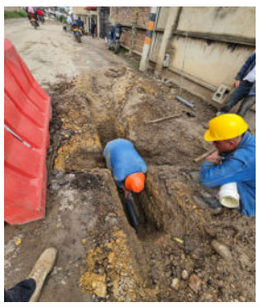
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	71	Foto No:	72
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	73	Foto No:	74
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	75	Foto No:	76
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	77	Foto No:	78
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	79	Foto No:	80
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	

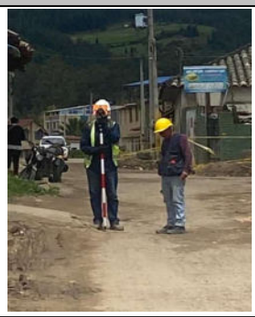
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	81	Foto No:	82
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	83	Foto No:	84
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	85	Foto No:	86
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	87	Foto No:	88
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	89	Foto No:	90
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	91	Foto No:	92
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos producto de sobrantes y/o derrames (incluye acarreo libre)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	93	Foto No:	94
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos producto de sobrantes y/o derrames (incluye acarreo libre)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	95	Foto No:	96
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	97	Foto No:	98
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	99	Foto No:	100
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	101	Foto No:	102
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica e instalación de arena		Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	103	Foto No:	104
Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)		Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	

INFORME OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA
INTERVENTOR:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S.
% AVANCE:	FECHA INICIO: 4/07/2025 — FECHA DE CORTE 3/08/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1
Observaciones Particulares:	Demolición de pisos de concreto <=10 cms



Foto No:	2
Observaciones Particulares:	Demolición de pisos de concreto <=10 cms

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3
Observaciones Particulares:	Demolición de pisos de concreto <=10 cms



Foto No:	4
Observaciones Particulares:	Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	5
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.



Foto No:	6
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.



Foto No:	7
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado para acometidas



Foto No:	8
Observaciones Particulares:	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	11	Foto No:	12
Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)		Observaciones Particulares: Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	13	Foto No:	14
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	15	Foto No:	16
Observaciones Particulares: EXCAVACION MANUAL POR PRESENCIA DE TUBERIA DE GAS		Observaciones Particulares: EXCAVACION MANUAL POR PRESENCIA DE TUBERIA DE GAS	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	17	Foto No:	18
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	19	Foto No:	20
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	21	Foto No:	22
Observaciones Particulares: Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas		Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	23	Foto No:	24
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito		Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	25	Foto No:	26
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito		Observaciones Particulares: Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	27	Foto No:	28
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"		Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	29	Foto No:	30
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	31	Foto No:	32
Observaciones Particulares: SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	33	Foto No:	34
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"		Observaciones Particulares: Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) acometidas	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	35	Foto No:	36
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	37	Foto No:	38
Observaciones Particulares: Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	39	Foto No:	40
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. (1,00 x 1,00) m pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	41	Foto No:	42
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"		Observaciones Particulares: Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para muros	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	43	Foto No:	44
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	45	Foto No:	46
Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)		Observaciones Particulares: Excavación manual por precencia de tuberia existente de gas	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	47	Foto No:	48
Observaciones Particulares: Socializacion		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 16"	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	49	Foto No:	50
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 16"		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	51	Foto No:	52
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal		Observaciones Particulares: Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección diseño)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	53	Foto No:	54
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	55	Foto No:	56
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	57	Foto No:	58
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	59	Foto No:	60
Observaciones Particulares: Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	61	Foto No:	62
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	63	Foto No:	64
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	65	Foto No:	66
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	67	Foto No:	68
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	69	Foto No:	70
Observaciones Particulares: Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	71

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal



Foto No:	72

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	73

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces



Foto No:	74

Observaciones Particulares:

Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	75

Observaciones Particulares:

Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)



Foto No:	76

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	77

Observaciones Particulares:

Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 16"



Foto No:	78

Observaciones Particulares:

Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	79	Foto No:	80
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	81	Foto No:	82
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	83	Foto No:	84
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 16"		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	85	Foto No:	86
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	87	Foto No:	88
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	89	Foto No:	90
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 8"	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	91	Foto No:	92
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	93	Foto No:	94
Observaciones Particulares: Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas		Observaciones Particulares: Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) acometidas	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	95	Foto No:	96
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	97	Foto No:	98
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	99	Foto No:	100
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	101	Foto No:	102
Observaciones Particulares: Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	103	Foto No:	104
Observaciones Particulares: Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m		Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	105	Foto No:	106
Observaciones Particulares: Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	107	Foto No:	108
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	109	Foto No:	110
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	111	Foto No:	112
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	113	Foto No:	114
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	115	Foto No:	116
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	117	Foto No:	118
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	119	Foto No:	120
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	121	Foto No:	122
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	123	Foto No:	124
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	125	Foto No:	126
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	127

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	128

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

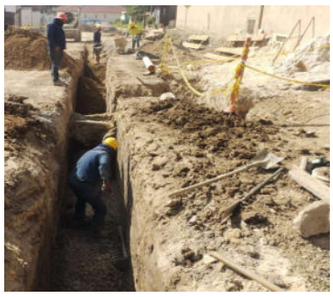


Foto No:	129

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"



Foto No:	130

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 6"

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	131

Observaciones Particulares:
Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.



Foto No:	132

Observaciones Particulares:
localización y replanteo para red de acueducto (incluye carteras y planos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	133

Observaciones Particulares:
Demolición de pisos de concreto <=10 cms






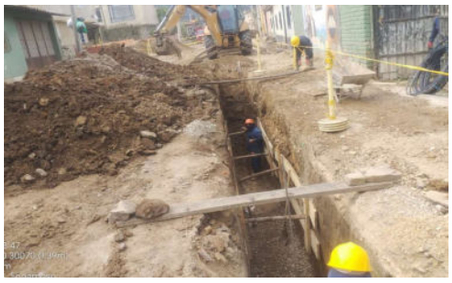





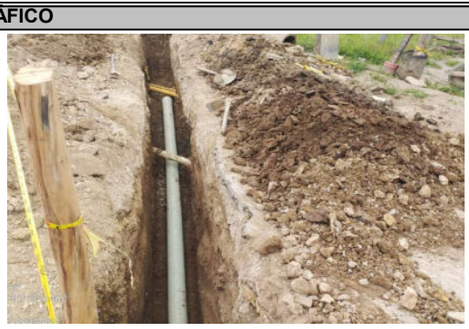
Foto No:	134


Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	135	Foto No:	136
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	137	Foto No:	138
Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)		Observaciones Particulares: Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) acometidas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	139	Foto No:	140
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	141	Foto No:	142
Observaciones Particulares: Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 6"		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	143	Foto No:	144
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	145	Foto No:	146
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	147	Foto No:	148
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	149	Foto No:	150
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	151	Foto No:	152
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	153	Foto No:	154
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	155	Foto No:	156
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	157	Foto No:	158
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	159	Foto No:	160
Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	161	Foto No:	162
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	163	Foto No:	164
Observaciones Particulares: Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) acometidas		Observaciones Particulares: Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	165	Foto No:	166
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	167	Foto No:	168
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	169	Foto No:	170
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	171	Foto No:	172
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	173	Foto No:	174
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 175	Foto No: 176
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 177	Foto No: 178
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	Observaciones Particulares: Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 6"
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 179	Foto No: 180
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 181	Foto No: 182
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	Observaciones Particulares: Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	183

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	184

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	185

Observaciones Particulares:
localización y replanteo para red de acueducto (incluye carteras y planos)




Foto No:	186

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	187

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"



Foto No:	188

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	189

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	190

Observaciones Particulares:
Demolición de pisos de concreto <=10 cms

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	191	Foto No:	192
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	193	Foto No:	194
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	195	Foto No:	196
Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado conexión sumidero	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	197	Foto No:	198
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	199

Observaciones Particulares:

Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para tapas



Foto No:	200

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	201

Observaciones Particulares:

Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)



Foto No:	202

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	203

Observaciones Particulares:

Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"



Foto No:	204

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	205

Observaciones Particulares:


Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)



Foto No:	206

Observaciones Particulares:

Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	207	Foto No:	208
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares:	
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	209	Foto No:	210
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	211	Foto No:	212
Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	213	Foto No:	214
Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	215

Observaciones Particulares:

Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"



Foto No:	216

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

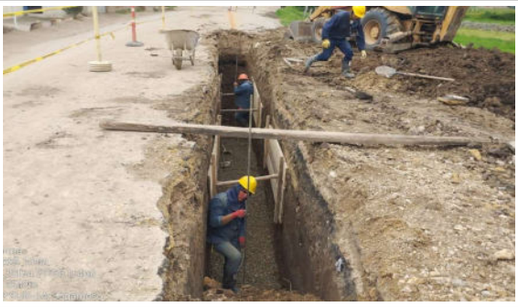


Foto No:	217

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces



Foto No:	218

Observaciones Particulares:

Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	219

Observaciones Particulares:

Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.




Foto No:	220

Observaciones Particulares:

Limpieza sumidero trasnversal existente

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 2025-024

OBJETO:

“CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

CONTRATISTA DE OBRA:

JOHN EMERSON ROSAS MESA

PERIDO N° 2

DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025

ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	KAREN LISETH CELY	JOHN EMERSON ROSAS

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
   2.1. Objetivo general
   2.2. Objetivos específicos
3. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A OBRA.
4. AFILIACIONES Y PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL.
5. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.
6. MATRIZ DE PELIGROS.
7. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES.
8. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.
9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
   9.1. Indicador de cumplimiento.
   9.2. Indicador de cobertura.
   9.3. Indicador de eficacia.
   9.4. Indicador de inducción.
   9.5. Charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo
10. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION
11. MAQUINARIA AMARILLA, EQUIPOS Y VEHICULOS
12. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES(AT) Y ENFERMEDADES LABORALES (EL)
13. INDICADORES MINIMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0312 DE 2017
   13.1. Indicador de severidad de los accidentes laborales
   13.2. Indicador de frecuencia de los accidentes laborales
   13.3. Indicador de mortalidad de los accidentes laborales
   13.4. Indicador de prevalencia de la enfermedad laboral
   13.5. Indicador de incidencia de la enfermedad laboral
   13.6. Indicador de ausentismo laboral
14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
   14.1. Inspecciones de elementos de proteccion personal y dotación
   14.2. Inspecciones locativas y frente de obra
      14.2.1. Inspección punto ecológico
      14.2.2. Inspección de instalaciones locativas administrativas
      14.2.3. Inspección Gestión de Residuos
      14.2.4. Inspección orden y aseo
   14.3. Inspecciones a elementos de atención de emergencias
      14.3.1. Inspección a camilla de emergencias
      14.3.2. Inspección botiquín de primeros auxilios
      14.3.3. Inspección a extintores
   14.4. Inspección preoperacional a maquinas, equipos, herramientas y vehículos.
   14.5. Inspección a excavación.
15. REGISTRO FOTOGRAFICO

1. INTRODUCION

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer la gestión realizada durante el desarrollo de las actividades realizadas con respecto al contrato **" CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**" correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello, que JOHN EMERSON ROSAS MESA, tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, dentro del desarrollo del contrato. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019 cumpliendo las funciones como contratista. La prevención en SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General

Tener CERO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, para lo cual propiciamos y motivamos que cada trabajador tenga una actitud y un compromiso permanente con la seguridad, la salud y con el medio ambiente.

2.2. Objetivos Específicos.

- Prevenir y/o controlar los riesgos en las diferentes áreas y lugares donde se desarrollarán los trabajos.
- Fortalecer la cultura preventiva en todos nuestros colaboradores.
- Prevenir y/o mitigar cualquier impacto en la salud que se genere en la ejecución de los trabajos.
- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.

- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.
- Implementar planes, procedimientos, guías de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los AT y EL.
- Dar cumplimento a los criterios establecidos en el contrato.
- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.

3. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A OBRA

El siguiente listado corresponde a las personas vinculadas en el contrato para el periodo en ejecución.

RELACION DE PERSONAL EN OBRA							
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	ARL
JOHN EMERSON ROSAS MESA	74081029	DIRECCTOR DE OBRA	4/06/2025		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA
KAREN LISETH CELY	1057590407	RESIDENTE DE OBRA	4/06/2025		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA
JOHANA CAROLINA PATIÑO	1020752084	RESIDENTE SST	4/06/2025		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
JAIRO ALONSO ROSAS	1051589941	APOYO A RESIDENTE	4/06/2025		NEPS	PORVENIR	POSITIVA
JAIME BARRERA	9533851	OPERADOR RETROEXCAVADORA	11/06/2025		NEPS		SURA
FABIO DEL JESUS LEMUS	74372715	OFICIAL	4/06/2024		NEPS	COLPENSIONES	POSITIVA
BRAHIAN ESTIBEN LOPEZ CARDENAS	1057570202	AYUDANTE	11/06/2025	21/06/2025	NEPS	PORVENIR	POSITIVA
JUAN FELIPE GURRERO ARAQUE	1010054640	AYUDANTE	11/06/2025	12/07/2025	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
JULIAN ANDREY PEREZ DELGADO	1122121604	AYUDANTE	11/06/2025	21/06/2025	NEPS	PROTECCION	POSIITVA
CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	1118549653	AYUDANTE	18/06/2025		NEPS	PORVENIR	POSITIVA
ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ	74185842	AYUDANTE	24/06/2025		NEPS	PORVENIR	POSITIVA
SHAMPIER STIVENT LEMUS PINEDA	1057580427	AYUDANTE	27/06/2025	5/07/2025	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
JOHAN ANDRES LOPEZ	1007413791	OPERADOR MINI	14/07/2025		NEPS	COLPENSIONES	SURA
WILSON JHOVANI LOPEZ	1058051592	AYUDANTE	14/07/2025		NEPS	COLPENSIONES	SURA
BAUDILIO SANCHEZ CARDENAS	9530903	AYUDANTE	14/07/2025		NEPS	COLPENSIONES	SURA
DIANA CAROLINA MONTAÑA	1057574918	CONTROLADORA	15/07/2025	19/07/2025	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
KAROL JUANITA GONZALEZ	1057577478	CONTROLADORA	15/07/2025		NEPS	COLPENSIONES	SURA
ANA YANIN CORREDOR	46376054	CONTROLADORA	23/07/2025		FAMISANAR	PORVENIR	SURA
FERNEY DARIO GARCIA	1054283864	AYUDANTE	24/07/2025		SANITAS	COLPENSIONES	SURA
JESUS ALEXANDER PEREZ	1057598366	AYUDANTE	24/07/2025		NEPS	PORVENIR	SURA
LUIS ALFREDO ALVAREZ MARTINEZ	9518924	OFICIAL	27/07/2025		NEPS	PORVENIR	SURA

4. AFILIACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizo la afiliación de los colaboradores que ingresaron; al igual se realizó el pago de la seguridad social del personal en el periodo a ejecutar**. Ver Anexo 1. Soporte de afiliación y pago de planillas de seguridad social.**

5. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Los exámenes de ingreso son clave para proteger la salud del trabajador, garantizar que se ubique en un puesto adecuado y salvaguardar al empleador frente a responsabilidades legales. Se programan las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso para cada uno de los colaboradores que ingresaron al proyecto. **Ver Anexo 2. Exámenes médicos ocupacionales.**

6. MATRIZ DE PELIGROS

El Panorama de Factores de Riesgo se elaboró a partir de la Guía Técnica Colombiana GTC 45; para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud de los trabajadores, que establece las directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional; esta identificación, se hace a partir del Panorama de Factores de Riesgo, donde se debe hacer un reconocimiento de los riesgos, a los que están expuestos los trabajadores de John Emerson Rosas, determinando los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa, facilita la adopción de decisiones ya que permite priorizar las situaciones en función de su criticidad.

La matriz de peligros no se le han realizado modificaciones ya que no se han presentado riesgos diferentes a los expuestos, no se han presentado accidentes ni enfermedades laborales por las cuales debamos revalorizar la matriz de peligros. Dando prioridad a los riesgos con mayor probabilidad de causar accidentes, lesiones e incidentes de alto impacto se tomaron las siguientes medidas preventivas:

- Instalación de entibado de madera proporcionando seguridad y estabilidad en la excavación protegiendo a los trabajadores y el entorno laboral de posibles derrumbes.
- Instalación de barreras físicas y señalización visible para delimitar la zona de trabajo. Así mismo se realizó la instalación de señalización informativa.
- Verificación continua de las condiciones ambientales ya que si se presenta lluvia o movimientos sísmicos hay que suspender las labores.
- El material o residuos producto de la excavación se ubica de 0.80 a 1.00 metros del borde de la excavación y en lo posible se realiza la disposición final el mismo día.
- El área para intervenir debe permanecer en orden y aseo.

- Los trabajadores deben estar lejos del radio de riesgos de cualquier vehículo que sea cargado o descargad, maquinaria amarilla en movimiento para evitar posibles accidentes.
- Durante la operación de la maquinaria está prohibido la permanencia de personal dentro de la excavación.
- Habilitamos un sendero peatonal facilitando el desplazamiento seguro de la comunidad.
- Charlas de seguridad y uso de elementos de protección personal.
- Verificación del estado de la maquinaria (retroexcavadora y Vibrocopactador) mediante la lista de inspección preoperacional ejecutado por cada uno de los operadores.
- Adecuación punto para la atención de emergencias (botiquín, camilla y extintor).

7. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES

En la matriz de requisitos legales se realizó la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividad propias e inherentes de nuestra actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Decreto 1072 de 2015). La cual se mantiene actualizada.

8. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

Es una herramienta preventiva clave para **identificar, evaluar y controlar los riesgos** antes de que el trabajador ejecute una tarea, permitiendo anticiparse a incidentes y garantizar un entorno laboral seguro. Ya que permite reconocer los riesgos potenciales antes de realizar cada actividad facilitando la implementación de medidas preventivas adecuadas. Es por esto que se realiza la implementación del Análisis de Trabajo Seguro detectando peligros antes que se materialicen y disminuyendo la probabilidad de lesiones, enfermedades laborales y daños materiales. **Ver Anexo 3. Formato Análisis de Trabajo Seguro.**

9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las capacitaciones y las charlas en seguridad y salud en el trabajo tienen el objetivo de brindar conocimientos, sensibilizar al trabajador y fortalecer la cultura

preventiva en la empresa reduciendo la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales.

Por lo tanto, se busca capacitar para analizar problemas, identificar sus causas, proponer soluciones, planear y adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales.

Además del conocimiento y habilidades que desarrollará el trabajador con las capacitaciones, esta permite que la empresa cumpla con el deber de prevención establecido en las normas sobre seguridad y salud laboral.

Para este periodo de ejecución se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Inducción al personal que ingreso.
- Manejo de estrés y comunicación asertiva.
- Peligros en obras de construcción.

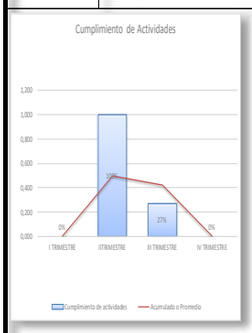
En base al cronograma de capacitaciones para este periodo, el cumplimiento de ejecución es del 27% en el tercer trimestre, el cual se relaciona a continuación:

PROGRAMADA	Actividades Programadas	0	2	11	0
EJECUTADA	Actividades Ejecutadas	0	2	3	0
	% de Ejecución	#¡DIV/0!	100%	27%	#¡DIV/0!

Ver Anexo 4. Registro de asistencia a capacitaciones y a charlas de seguridad.


9.1. Indicadores de cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento de Actividades	META	PERIODO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas	90%	Actividades ejecutadas	0	2	3	0
			Actividades programadas	0	2	11	0
			Cumplimiento de actividades	#¡DIV/0!	100%	27%	#¡DIV/0!
			Acumulado o Promedio	0%	50%	42%	



9.2. Indicador de cobertura.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	Cobertura	META	PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	No de trabajadores que recibieron capacitación *100 /No. Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación según matriz de capacitación por cargo en el periodo	80%	No de trabajadores que recibieron capacitación en el periodo	0	10	15	0
			Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación según matriz de capacitación por cargo en el periodo	6	10	17	0
			COBERTURA	0%	100%	88%	#¡DIV/0!
			Cobertura promedio acumulada	0%	50%	63%	#¡DIV/0!




9.3. Indicador de eficacia.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	EFICACIA	META	PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	No de evaluaciones aprobadas en el periodo*100 /No. De evaluaciones realizadas en el periodo	80%	No de evaluaciones aprobadas en el periodo	0	10	15	0
			No. De evaluaciones realizadas en el periodo	0	10	15	0
			EFICACIA	#¡DIV/0!	100%	100%	#¡DIV/0!
			promedio de eficacia acumulado	0%	50%	67%	#¡DIV/0!



9.4. Indicador cobertura de la inducción

			MEDICIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	Cobertura de la inducción	META	PERIODO	I TRIMESTRE	IITRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMULA	No de trabajadores que recibieron la inducción *100 /No. De Trabajadores que ingresaron en el trimestre	100%	No de trabajadores que recibieron inducción o re-inducción en el periodo	0	10	9	0
			Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación inducción o re-inducción	0	10	9	0
			COBERTURA	#¡DIV/0!	100%	100%	#¡DIV/0!
			Cobertura promedio acumulada	0%	50%	67%	#¡DIV/0!



9.5. Charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo.

Para este mes se realizaron charlas de seguridad abarcado diferentes temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y emergencias. **Ver Anexo 5. Registro de asistencia a charlas diarias.**

10. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION.

Se realizo entrega de dotación y elementos de proteccion personal requeridos para la labor, al igual se realizó el cambio de los epps en mal estado cada vez que el trabajador lo solicite. **Ver Anexo 6. Registro de entrega de elementos de proteccion personal.**

11. MAQUINARIA AMARILLA, EQUIPOS Y VEHICULOS UTILIZADOS EN LA OBRA

A continuación, se relacionan las maquinas los equipos y los vehículos usados en obra.

RELACION MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA	
MAQUINARIA	**MODELO**
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	420E
MINICARGADOR CATERPILLAR	262B
EQUIPOS	**MODELO**
APISONADOR MASALTA MOTOR GASOLINA	ROBIN SUBARU EH-12 3, 5HP
CORTADORA DE PAVIMENTO MASALTA MOTOR GASOLINA	Honda 13HP MF16-4
PULIDORA DEWALT	900W 12000Rpm
MARTILLO DEMOLEDOR	1700W JOULES
VEHICULOS	**MODELO**
CAMIONETA KIA K2700	2011
VOLQUETA DODGE D 600-157	1979

Ver Anexo 7. Registro documental de maquinaria, equipos y vehículos.

12. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES (AT) Y ENFERMEDADES LABORALES (EL).

Con el seguimiento realizado aseguramos que las acciones correctivas y preventivas se estén implementando de manera efectiva, disminuyendo la severidad de las lesiones o el impacto en la salud con el fin de reducir la probabilidad de que los eventos se repitan a futuro, disminuimos el ausentismo laboral y los costos asociados a incapacidades, reemplazos de personal y gastos médicos, logrando mejorar la confianza de los trabajadores en la ejecución de sus labores. A la fecha no se han presentado accidentes de origen laboral ni se han diagnosticado enfermedades laborales, a continuación, se adjunta el formato de seguimiento. **Ver Anexo 8. Formato de seguimiento de accidentes y enfermedades laborales.**

13. INDICADORES MINIMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0312 DE 2017

Los indicadores del SG-SST son una herramienta que nos permite evaluar los resultados de la gestión realizada, identificando las falencias e implementando un plan de acción buscando la mejora. En base al seguimiento de los accidentes y las enfermedades laborales reportadas en el periodo se calculan los indicadores mínimos.


13.1. Indicador de severidad de los accidentes laborales.

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Nit. 74.081.029-9

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Código: FT-SG-SST-26
Versión: 1
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2023
Pagina 1 de 1

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIRMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISAT		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No perdieron días por accidente de trabajo.

RECOMENDACIONES:

VALOR/MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HHTM	0	0	0	0	0	1728	3840	384	0	0	0	864
DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
ISAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00

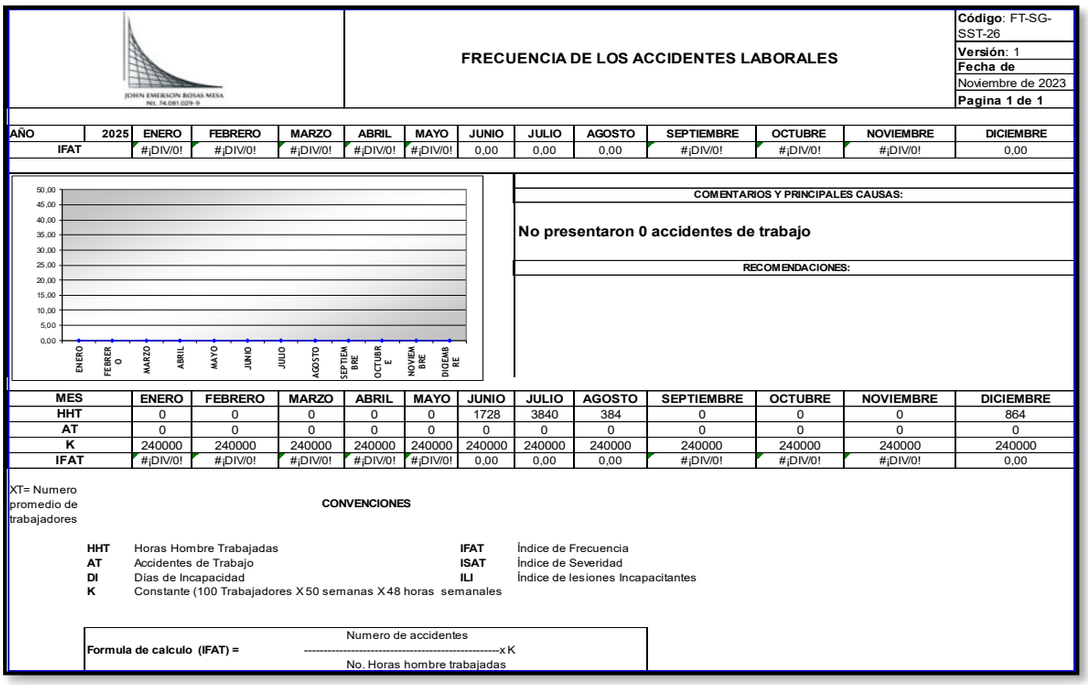
CONVENCIONES

XT= Numé

HHT	Horas Hombre Trabajadas	**IFAT**	Índice de Frecuencia
AT	Accidentes de Trabajo	**ISAT**	Índice de Severidad
DI	Días de Incapacidad	**ILI**	Índice de lesiones Incapacitantes
K	Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales		
PCL	Perdida de la capacidad laboral		

Formula de calculo (IFAT) = $\frac{\text{No. Días incapacidad por AT + No. Dias cargados por PCL}}{\text{No. Horas hombre trabajadas}} \times K$


13.2. Indicador de frecuencia de los accidentes laborales.



13.4. Indicador de prevalencia de la enfermedad laboral.

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL**	**Código**: FT-SG-SST-26 **Versión**: 1 **Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PEL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron casos de enfermedad laboral en el periodo mencionado

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. CN y AEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PTTP	0	0	0	0	0	8	16	16	0	0	0	9
10 ^{n}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PEL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume **CONVENCIONES**


No. CNyAEL	No de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
PTTP	Promedio total de trabajadores en el periodo
10^{n}	10 por el exponencial n
PEL	Prevalencia de la enfermedad laboral

Formula de calculo (PEL) = $\frac{\text{Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^{n}$

13.5. Indicador de incidencia de la enfermedad laboral.

JOHN EMERSON ROSAS MESA Nit. 74.081.029-9	**INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL**	**Código**: FT-SG-SST-26 **Versión**: 1 **Aprobación:** Noviembre de 2023 **Pagina 1 de 1**

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IEL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron casos de enfermedad laboral en el periodo

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. CN y AEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PTTP	0	0	0	0	0	8	16	16	0	0	0	9
10 ^{n}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
IEL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume **CONVENCIONES**

No. CNEL	Numero de casos nuevos de enfermedad laboral
PTTP	Promedio total de trabajadores en el periodo
10^{n}	10 por el exponencial n
IEL	Incidencia de la enfermedad laboral


Formula de calculo (PEL) = $\frac{\text{Numero de casos nuevos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^{n}$

13.6. Indicador de ausentismo laboral.

AUSENTISMO LABORAL

Código: FT-SG-SST-26
Versión: 1
Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018
Pagina 1 de 1

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ausentismo		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presento ausentismo laboral

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. DA X IL y C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. DTP	0	0	0	0	0	27	30	3	0	0	0	12
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ausentismo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00

XT= Nume

CONVENCIONES

No. DA X IL y C Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral y comun
No. DTP Numero de dias de trabajo programados
K 100 para obtener un porcentaje

Ausentismo = (Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral y comun / Numero de dias de trabajo programados) x 100

14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad identifican los peligros mediante el estudio de las condiciones en el lugar de trabajo o en las fuentes de peligro; son fundamentales ya que ayudan a prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones o por los accidentes de trabajo.

En el desarrollo de las actividades propias del contrato se realizan las siguientes inspecciones:

14.1. Inspecciones de Elementos de Proteccion Personal.

Se realiza verificación a cada uno de los colaboradores del estado y tenencia de los elementos de proteccion personal, se realiza el cambio del Epps que este en mal estado. **Ver Anexo 9. Registro de inspección de elementos de proteccion personal.**

14.2. Inspecciones locativas frente de obra.

14.2.1. ***Inspección punto ecológico:*** Se ejecuto la inspección al punto ecológico, se evidencia canecas señalizadas se encuentran en buenas condiciones

generales se encentran rotuladas y tapadas. **Ver Anexo 10. Registro de inspección de punto ecológico.**



14.2.2. ***Inspección de instalaciones locativas administrativas*:** Se evidencia buen estado del área administrativa, no contamos con unidades sanitarias portátiles, se realiza uso de unidad sanitaria de una vivienda cercana al proyecto. Se cubren con plástico negro calibre 16 los materiales pétreos. **Ver Anexo 10. Registro de inspección de instalaciones locativas y administrativas.**

14.2.3. ***Inspección gestión de residuos:*** Se cuenta con punto ecológico, no se evidencia generación de residuos peligrosos, la separación en la fuente de los residuos ordinarios y reciclables se está realizando conforme al código de colores establecido por la Resolución 2184 de 2019. **Ver Anexo 10. Registro de inspección Gestión de Residuos.**

14.2.4. ***Inspección orden y aseo:*** Se cumple con los ítems relacionados en el formato FT-SG-SST-13, se cuenta con extintor de 20 libras y un botiquín tipo A en el área administrativa, se evidencia en el área de almacenamiento de herramientas falta de orden y aseo, se programa orden y aseo. **Ver Anexo 10. Registro de inspección orden y aseo**

14.3. Inspecciones a los elementos de emergencia

14.3.1. ***Inspección a camilla de emergencia:*** Se realizo inspección de la camilla de emergencias evidenciando el buen estado en el que se encuentra, las correas al igual que los inmovilizadores se encuentran en buen estado. Se encuentra señalizada. **Ver Anexo 11. Registro de inspección camilla para la atención de emergencias.**



14.3.2. ***Inspección a botiquín de primeros auxilios:*** Se realizo la inspección a los botiquines de la retroexcavadora y camioneta kia, se dotan cada uno de ellos con los insumos que tiene un botiquín tipo A. Se encuentran limpios y señalizados. **Ver Anexo 11. Registro de inspección de botiquín de 1primeros auxilios.**





14.3.3. ***Inspección a extintores:*** En el área administrativa se verifica el estado del extintor de 20 libras el cual se encuentra en buenas condiciones generales, señalizado y demarcado**;** extintor de 5 libras en la cabina de la retroexcavadora, minicargador y camioneta kia en buenas condiciones generales. **Ver Anexo 11. Registro de inspección extintores.**







14.4. **Inspección preoperacional a equipos, máquinas y herramientas:** se diligencian los pre- operacionales de las herramientas los equipos y maquinas a usar en la ejecución de la obra. **Ver Anexo 12. Registro de inspección Preoperacional de máquinas, equipos y herramientas.**

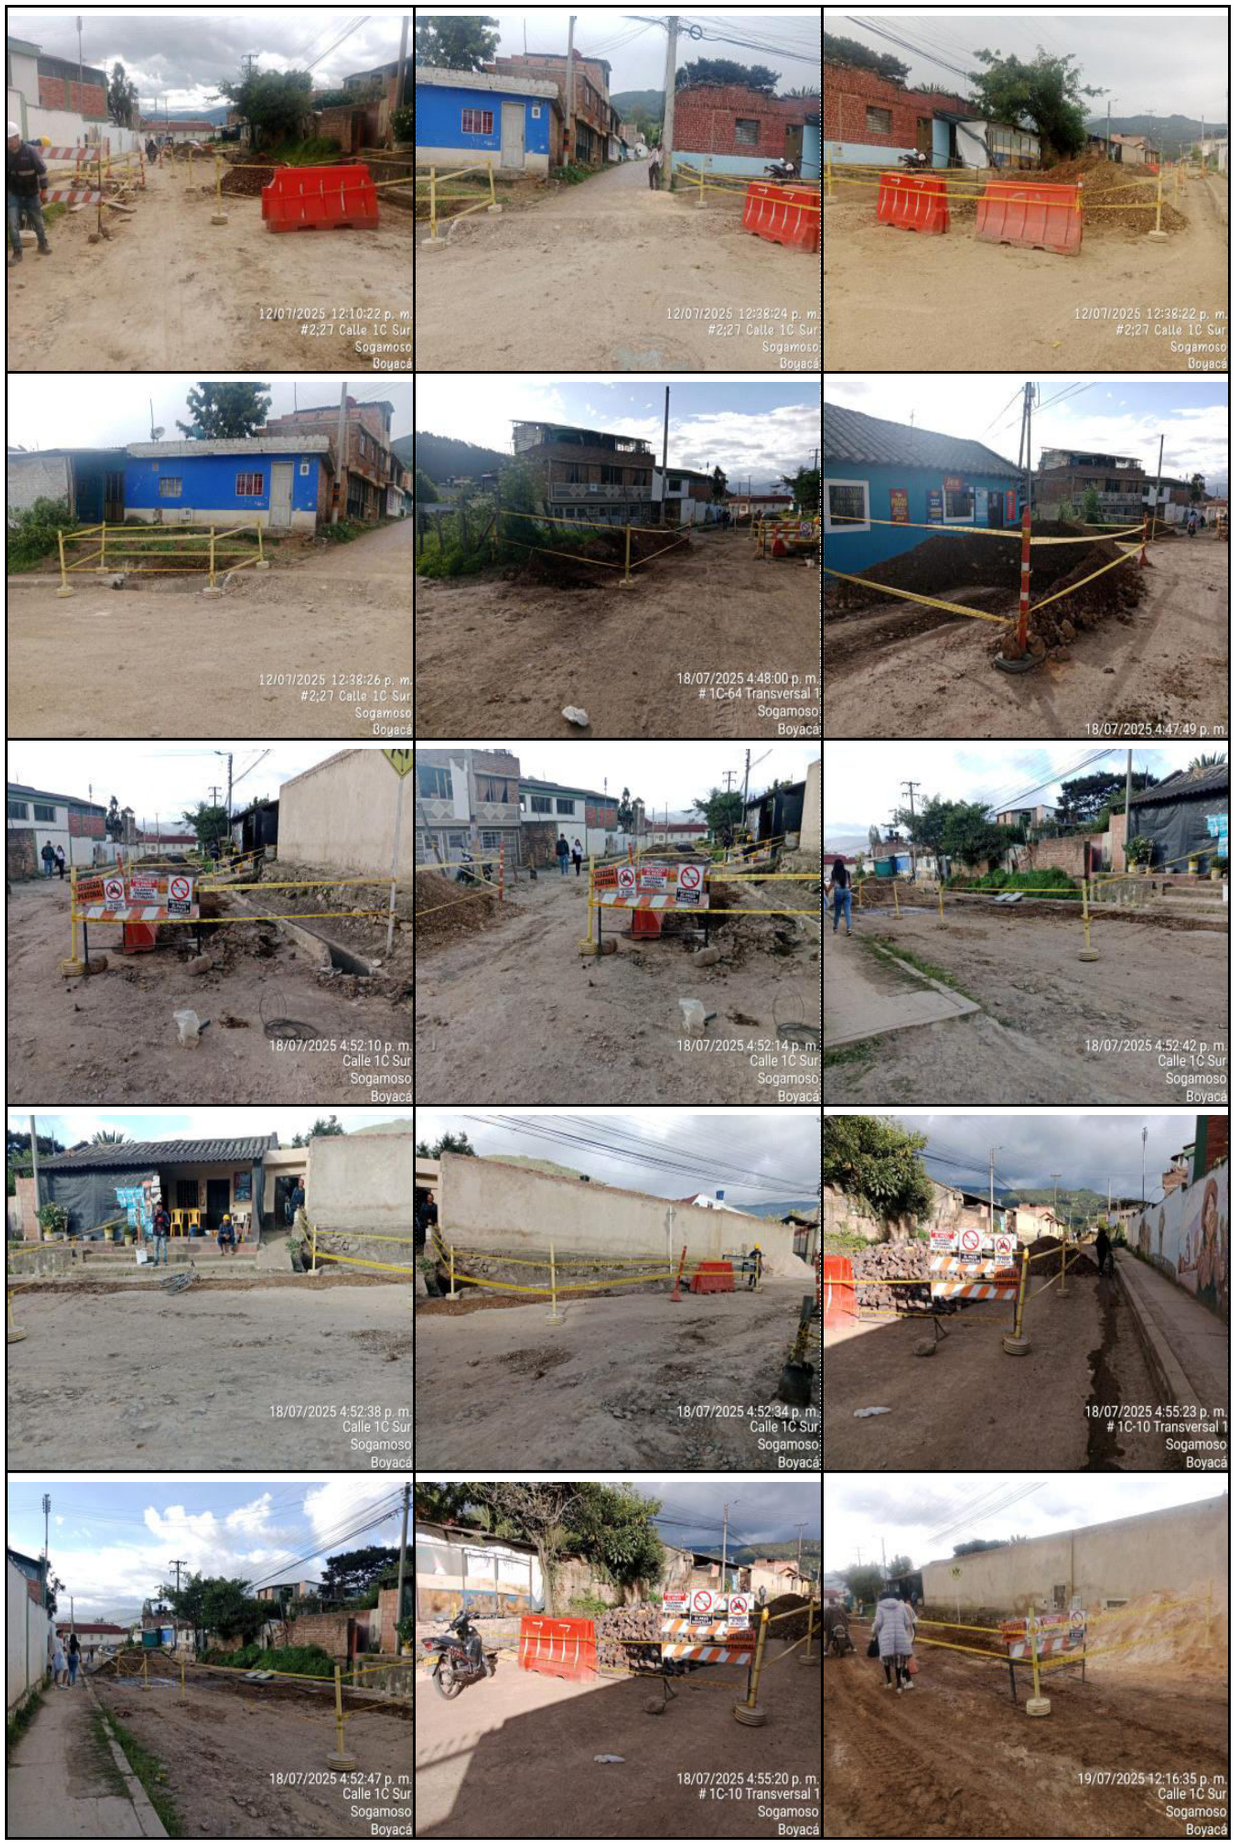
15. REGISTRO FOTOGRAFICO.





ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	KAREN LISETH CELY	JOHN EMERSON ROSAS

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	JOHN EMERSON ROSAS
	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	KAREN LISETH CELY	JOHN EMERSON ROSAS































ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	KAREN LISETH CELY	JOHN EMERSON ROSAS

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**JOHN EMERSON ROSAS** **INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**































ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	KAREN LISETH CELY	JOHN EMERSON ROSAS














ELABORO	REVISO	APROBO
JOHANA CAROLINA PATIÑO	KAREN LISETH CELY	JOHN EMERSON ROSAS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-11, 03:53:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77772152

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 11/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74081029	JOHN EMERSON ROSAS MESA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.100.000	$ 656.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.100.000	$ 512.500	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 0	$ 656.000	$ 512.500	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900	$ 0	$ 1.453.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057590407
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN LISSETH CELY PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 9B 2A 26	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7974916759**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1632989910

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 227.800	$ 2.000	$ 229.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.000**	**$ 229.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 178.000	$ 1.600	$ 0	$ 179.600
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 179.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 900	$ 0	$ 100.000
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 100.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1057590407	CELY PEÑA KAREN LISSETH	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	105759040	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 509.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9533851
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME BARRERA OJEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 6 22 PISO 3	TELÉFONO:	7710139
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7974910475**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1632959250

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 178.000	$ 600	$ 0	$ 178.600
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 178.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 400	$ 0	$ 99.500
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 99.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-17, 04:23:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78515155

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	15	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010054640	JUAN FELIPE GUERRERO ARAQUE	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF10) COMFABOY	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1020752084	JOHANA CAROLINA PATIÑO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1031641811	LAURA LOPEZ CHAPARRO	01	00	X	X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1051589941	JAIRO ALONSO ROSAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1053538054	ANGELA MARGARITA TRUJILLO LERMA	01	00	X	X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1053538391	HEYVER ALEXANDER USECHE PARADA	01	00	X	X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1055504560	EDWIN FERNANDO PIRABAN GOYENECHE	01	00	X	X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1057570202	BRAHIAN ESTIBEN LOPEZ CARDENAS	01	00	X	X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF10) COMFABOY	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 1057575986	MARIA DEL PILAR SIERRA CHAPARRO	01	00	X	X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 1057580427	SHAMPIER STIVENT LEMUS PINEDA	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 332.150	$ 53.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF10) COMFABOY	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 1118549653	CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 616.850	$ 98.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 616.850	$ 24.700	6,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF10) COMFABOY	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 1122121604	JULIAN ANDREY PEREZ DELGADO	01	00	X	X															0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 521.950	$ 83.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF10) COMFABOY	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 4136533	IDELFONSO ALVARADO FUQUEN	01	00	X	X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF10) COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 4136742	PEDRO NOLASCO VARGAS TORRES	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 74185842	ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ CARDENAS	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF10) COMFABOY	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.778.250	$ 8.778.250	$ 8.778.250	$ 8.778.250	$ 1.405.400	$ 351.500	$ 612.000	$ 351.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.720.400	$ 14.000	$ 2.734.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74372715
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO LEMUS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS 1D 45	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7974917641**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1633018806

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 227.800	$ 1.800	$ 229.600
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.800**	**$ 229.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 178.000	$ 1.400	$ 0	$ 179.400
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 179.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 800	$ 0	$ 99.900
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 99.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 28.500	$ 300	$ 28.800
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 300**	**$ 28.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-17, 04:23:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79243411

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74081029	JOHN EMERSON ROSAS MESA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.100.000	$ 656.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.100.000	$ 512.500	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 0	$ 656.000	$ 512.500	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900	$ 0	$ 1.453.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-20, 10:46:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79245479

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 15/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	10	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010054640	JUAN FELIPE GUERRERO ARAQUE	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF10) COMFABOY	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 1020752084	JOHANA CAROLINA PATIÑO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1051589941	JAIRO ALONSO ROSAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1057580427	SHAMPIER STIVENT LEMUS PINEDA	01	00		X															0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF10) COMFABOY	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 1058051592	WILSON JHOVANI LOPEZ CARDENAS	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 142.350	$ 22.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 142.350	$ 5.700	6,960	$ 142.350	$ 10.000	(CCF10) COMFABOY	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200
CC 1118549653	CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 74185842	ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79758384	EDUIN AMED CANIZALES BELTRAN	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79768987	NEYLER CUBILLOS BARRIOS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 80065375	WILLIAM AMID CANIZALES BELTRAN	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.913.500	$ 10.913.500	$ 10.913.500	$ 10.913.500	$ 1.746.600	$ 437.000	$ 760.000	$ 437.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.380.600	$ 17.600	$ 3.398.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057590407
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN LISSETH CELY PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 9B 2A 26	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7979686891**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		17			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1717907747

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 227.800	$ 2.500	$ 230.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.500**	**$ 230.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 178.000	$ 2.000	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 180.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.100	$ 0	$ 100.200
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 100.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1057590407	CELY PEÑA KAREN LISSETH	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO		30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	105759040	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 510.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9533851
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME BARRERA OJEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 6 22 PISO 3	TELÉFONO:	7710139
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7979685100**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1717898380

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 178.000	$ 800	$ 0	$ 178.800
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 178.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 500	$ 0	$ 99.600
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 99.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES													
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																							
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9533851	BARRERA OJEDA JAIME	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	NO OBLIG COT PENSIÓN	$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	9533851	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 278.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74372715
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO LEMUS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS 1D 45	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7979689432**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1717917938

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 227.800	$ 2.200	$ 230.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.200**	**$ 230.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 178.000	$ 1.700	$ 0	$ 179.700
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 179.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.000	$ 0	$ 100.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 100.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 28.500	$ 300	$ 28.800
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 300**	**$ 28.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 74372715	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	74372715	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 538.600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1730566721	9490968584	E	2025/08/06	2025/08/27	BANCO DE BOGOTA	21	$1,370,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	9518924	ALVAREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	X																		0	EPS041	4	CCF10	4	14-11	4	4	Si
2	CC	46376054	CORREDOR PEREZ ANA YANIN	X																	230301	8	EPS017	8	CCF10	8	14-11	8	8	Si
3	CC	1054283864	GARCIA GUTIERREZ FERNEY DARIO	X																	25-14	17	EPS005	17	CCF10	17	14-11	17	17	Si
4	CC	1057577478	GONZALEZ FONSECA KAROL JUANITA	X																	25-14	16	EPS037	16	CCF10	16	14-11	16	16	Si
5	CC	1058051592	LOPEZ CARDENAS WILSON JHOVANI	X																	25-14	17	EPS037	17	CCF10	17	14-11	17	17	Si
6	CC	1057574918	MONTAÑA DUARTE DIANA CAROLINA	X	X																230301	8	EPS017	8	CCF10	8	14-11	8	8	Si
7	CC	1057598366	PEREZ SIERRA JESUS ALEXANDER	X																	230301	7	EPS037	7	CCF10	7	14-11	7	7	Si
8	CC	9530903	SANCHEZ CARDENAS BAUDILIO	X																	25-14	17	EPS037	17	CCF10	17	14-11	17	17	Si
Total	**Afiliados(8)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1730566721	9490968584	E	2025/08/06	2025/08/27	BANCO DE BOGOTA	21	$1,370,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$683,600	$9,200	$0	$692,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$508,800	$6,800	$0	$515,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$174,800	$2,400	$0	$177,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$311,000	$4,200	$0	$315,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$311,000	$4,200	$0	$315,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$178,600	$2,400	$0	$181,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$178,600	$2,400	$0	$181,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$178,600	$2,700	$0	$181,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$30,400	$500	$0	$30,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$108,300	$1,500	$0	$109,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,600	$200	$0	$7,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,300	$500	$0	$32,800
TOTAL				**8**	**$1,351,800**	**$18,500**	**$0**	**$1,370,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007413791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN ANDRES LOPEZ MOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 1C SUR 1E 06	TELÉFONO:	7710239
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7984049670**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1720162279

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300	$ 0	$ 182.300
SUBTOTALES:										**$ 182.300**	**$ 0**	**$ 182.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 142.400
SUBTOTALES:													**$ 142.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 142.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 79.300	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 79.300
SUBTOTALES:									**$ 79.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 79.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007413791	LOPEZ MOLANO JOHAN ANDRES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	07																25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 142.400	$ 0	$ 142.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.138.800	100741379	$ 79.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 404.000

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900237408	4	ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	A - 200 O MAS COTIZANTES	SOGAMOSO 502	TRANSVERSAL 11 N 23 80	TUNJA-BOYACA	7401077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1627076868	9488917018	Y	2025/08/05	2025/07/14	BANCOLOMBIA	0	$1,328,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4282048	BARRERA MEDINA JOSE FERNANDO																		25-14	30	$2,998,000	$479,700	EPS037	30	$2,998,000	$374,800		0	$0	$0	14-7	30	$2,998,000	6.960%	$208,700	0	$0	$0	No	$1,063,200
2	CC	74082261	RODRIGUEZ BONILLA JOSE GREGORIO	X																	25-14	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$100,900		0	$0	$0	14-7	17	$806,650	4.350%	$35,100	0	$0	$0	No	$265,100
Total	**Afiliados(2)**																						$3,804,650	$608,800			$3,804,650	$475,700			$0	$0			$3,804,650		$243,800		$0	$0		$1,328,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$608,800	$0	$0	$608,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$608,800	$0	$0	$608,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$0	$0	$243,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$243,800	$0	$0	$243,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$475,700	$0	$0	$475,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$374,800	$0	$0	$374,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,900	$0	$0	$100,900
TOTAL				**2**	**$1,328,300**	**$0**	**$0**	**$1,328,300**
