INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 2
CONTRATO No. 2025-024 QUE TIENE POR OBJETO: **“**CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
ERI S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA:

JOHN EMERSON ROSAS MESA

INTERVENTORIA:

INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S

R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS

SUPERVISOR DE CONTRATO:

JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA
COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: 19 DE SEPTEMBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SOGAMOSO – BOYACÁ

2025

NIT: 891.855.130-1	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S	FECHA: 2024/11	Sogamoso CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO VERSIÓN 0

COPIA CONTROLADA

INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 2

VERSIÓN	CONTENIDO	ELABORÓ
1	INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA PARCIAL 2	John Emerson Rosas Mesa Director de Obra

Reviso y aprobó:

Julián Ramiro Urrutia Paragua
Coordinador de Operaciones

Ingeniar Constructora y Consultora s.a.s
R/L Mónica María Juliana González Vargas

John Emerson Rosas Mesa
Contratista

CONTRACTUALES CONTRATO No. 2025-024
(CONTRATO DE OBRA)

CONTRATO No.:	2025-024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR INICIAL:	MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($1.616.410.236,15) MCTE
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA C.C 74.081.029 expedida en Sogamoso
SUPERVISOR:	JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS
INTERVENTORIA:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS
FECHA DE INICIO:	04 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN No 001	14 DE JULIO DE 2025
OTROSI No. 1 ADICIÓN Y PRÓRROGA	03 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	SEIS (06) MESES
VALOR ADICIONAL:	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($407.664.424,70) MCTE
VALOR TOTAL:	DOS MIL VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.024.074.660,85) MCTE

CONTRACTUALES CONTRATO No. 2025-025
(CONTRATO INTERVENTORIA)

CONTRATO No.:	2025-025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL PROYECTO DE A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR:	CIENTO DOCE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($112.123.126,00)
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS
INTERVENTORIA:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Ejecutivo de Obra Parcial No. 2, en el cual se presenta el estado actual del proyecto y un resumen consolidado de las actividades ejecutadas en el marco del **CONTRATO DE OBRA NO. 2025-024**, suscrito entre la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S.**, identificada con NIT **901.583.989-8,** y el señor **JOHN EMERSON ROSAS MESA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.081.029** de Sogamoso, Boyacá, quien actúa en calidad de **Contratista**.

El objeto contractual corresponde a la **"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, ASÍ COMO DE LA RED DE ACUEDUCTO, FASE I, EN LA VEREDA MONQUIRÁ – SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"**.

El presente documento corresponde al Informe de Obra, en el cual se registran y consolidan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 19 de septiembre de 2025 y el 19 de noviembre de 2025.

1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el área rural del municipio de Sogamoso, específicamente en la vereda Monquirá, sector La Reforma. Esta zona presenta un entorno predominantemente rural con uso residencial disperso. La intervención contempla la construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial, así como de la red de acueducto correspondiente a la Fase 1 del sector mencionado. La localización geográfica del proyecto es estratégica, ya que permitirá optimizar el manejo integral del recurso hídrico en la zona, contribuyendo significativamente al control de sedimentos y a la mitigación del riesgo de inundaciones, mejorando así las condiciones sanitarias y ambientales del área de influencia.

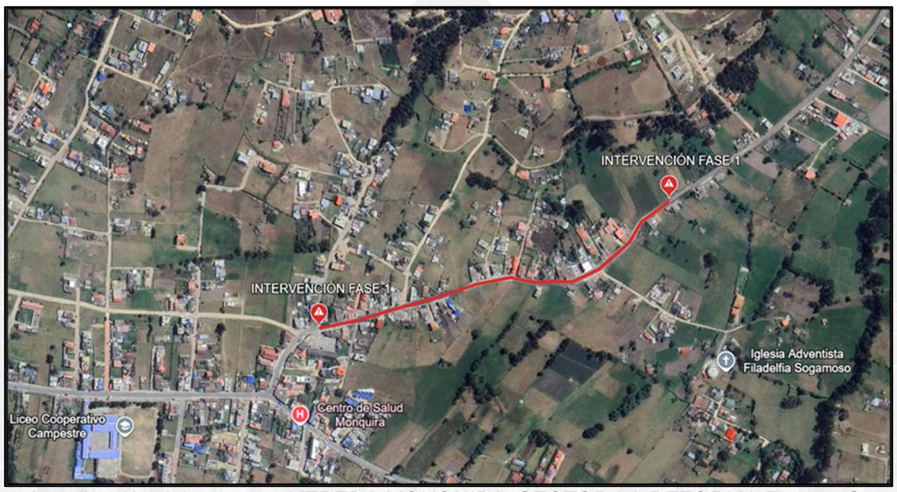


Imagen 1: Localización del proyecto, VEREDA MONQUIRA, SECTOR LA REFORMA Fuente: Google Earth



Imagen 2: Localización del proyecto VEREDA MONQUIRA, SECTOR LA REFORMA Fuente: director de Obra

2. COMPONENTE TECNICO

2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE DE OBRA: ACTA DE CORTE 2

Ítem	Item gobernacion	Descripción	Unidad	ADICIONAL 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				Cantidad	VR Unitario	VR Total	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RED SANITARIA						**$ 764.654.847,69**		**$ 675.794.434,69**
1.1	2.01.05	localización y replanteo para red de acueducto (incluye carteras y planos)	Metro lineal	562,61	$ 1.062,32	$ 597.671,86	545,70	$ 579.708,03
1.2	Cotización	Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	Metro lineal	562,61	$ 2.804,00	$ 1.577.558,44	545,70	$ 1.530.142,80
1.3	1.02.15	Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	Metro cúbico	1559,38	$ 25.449,98	$ 39.686.108,37	1.473,81	$ 37.508.435,03
1.4	2.01.02	Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	Metro cuadrado	1444,71	$ 42.040,83	$ 60.736.807,51	1.444,71	$ 60.736.807,51
1.5	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	Metro cúbico	58,51	$ 91.714,13	$ 5.365.735,18	37,65	$ 3.453.036,99
1.6	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado para acometidas.	Metro cúbico	612,06	$ 91.714,13	$ 56.134.486,21	471,52	$ 43.245.046,58
1.7	2.07.08	Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	Metro cúbico	1,08	$ 286.965,46	$ 309.922,70	1,08	$ 309.922,70
1.8	2.05.56	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=16"	Metro lineal	572,11	$ 288.572,86	$ 165.095.418,93	555,20	$ 160.215.651,87
1,90	2.05.54	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=12"	Metro lineal	5,00	$ 202.745,55	$ 1.013.727,75	5,80	$ 1.175.924,19
1.10	2.05.52	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"	Metro lineal	524,60	$ 62.608,90	$ 32.844.628,94	380,70	$ 23.835.208,24
1.11	Cotización	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 6"	Unidad	72,00	$ 374.899,98	$ 26.992.798,56	51,00	$ 19.119.898,98
1.12	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	Metro cúbico	219,25	$ 138.070,17	$ 30.271.720,77	167,86	$ 23.176.458,73
1.13	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	Metro cúbico	71,03	$ 138.070,17	$ 9.807.600,76	40,66	$ 5.613.933,11
1.14	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	Metro cúbico	1192,78	$ 90.646,13	$ 108.120.887,90	1.189,40	$ 107.814.507,02
1.15	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	Metro cúbico	478,51	$ 90.646,13	$ 43.374.853,05	358,64	$ 32.509.328,06
1.16	Cotización	Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	Unidad	3,00	$ 2.761.982,96	$ 8.285.948,88	2,00	$ 5.523.965,92
1.17	2.06.09	Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m	Unidad	15,00	$ 882.461,36	$ 13.236.920,40	15,00	$ 13.236.920,40
1.18	Cotización	Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	Unidad	55,00	$ 511.558,00	$ 28.135.690,00	34,00	$ 17.392.972,00
1.19	3.12.01	Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	Metro cúbico	873,14	$ 5.013,50	$ 4.377.475,31	663,33	$ 3.325.604,96
1.20	3.12.03	Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	Metro cúbico - Km	17550,36	$ 2.312,50	$ 40.585.217,52	15.387,01	$ 35.582.460,63
NP 1	5.01.10	Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	Unidad	12,00	$ 3.809.579,91	$ 45.714.958,92	12,00	$ 45.714.958,92
3.13*	Cotizacion	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 8"	Unidad	3,00	$ 375.500,00	$ 1.126.500,00	3,00	$ 1.126.500,00
3.12*	2.05.59	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=8"	Metro lineal	8,50	$ 85.764,02	$ 728.994,17	7,70	$ 660.382,95
NP 2	3.12.02	Transporte de material suelto.	Metro cúbico - Km	17853,69	$ 1.850,00	$ 33.029.331,34	15.652,24	$ 28.956.644,00
NP 3	Cotizacion	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 6"	Unidad	62,00	$ 89.358,81	$ 5.540.246,22	23,00	$ 2.055.252,63
NP 4	Cotizacion	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 8"	Unidad	3,00	$ 243.370,81	$ 730.112,43	1,00	$ 243.370,81
NP 5	1.02.01	Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)	Metro cuadrado	34,05	$ 36.230,07	$ 1.233.525,57	31,78	$ 1.151.391,63

RED ACUEDUCTO						**$ 135.973.135,42**		**$ 69.476.059,47**
2.1	Cotizacion	Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito	Metro lineal	545,00	$ 2.804,00	$ 1.528.180,00	270,50	$ 758.482,00
2.2	1.02.15	Excavación de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 km)	Metro cúbico	280,71	$ 25.449,98	$ 7.144.063,89	135,54	$ 3.449.490,29
2.4	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado para acometidas	Metro cúbico	179,73	$ 91.714,13	$ 16.484.184,13	111,95	$ 10.267.396,86
2.5	2.07.08	Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	Metro cúbico	0,44	$ 286.965,46	$ 127.412,66	0,44	$ 126.264,80
2.6	2.01.29	Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica	Metro lineal	545,00	$ 69.652,82	$ 37.960.786,90	270,50	$ 18.841.087,81
2.7	2.04.20	Codo PVC gran radio 45° RDE 21 D=3"	Unidad	3,00	$ 99.625,82	$ 298.877,46	0,00	$ 0,00
2.8	Cotizacion	Suministro e instalación Uniones rápidas de 3" Uz Pavco	Unidad	14,00	$ 55.546,00	$ 777.644,00	6,00	$ 333.276,00
2.9	Cotizacion	Suministro e instalación Uniones Tee de 3"X3" Uz Pavco	Unidad	5,00	$ 140.813,00	$ 704.065,00	2,00	$ 281.626,00
2.10	1.06.34	Suministro e instalación de acometida 3" x 1/2" incluye tubería pf + udl 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios para su conexión	Unidad	55,00	$ 124.499,94	$ 6.847.496,70	28,00	$ 3.485.998,32
2.11	3.13.36	Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) red principal	Metro cúbico	79,26	$ 115.320,06	$ 9.140.798,41	41,41	$ 4.775.403,68
2.12	3.13.36	Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) acometidas	Metro cúbico	38,36	$ 115.320,06	$ 4.423.897,05	11,97	$ 1.380.381,12
2.13	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado para red principal y cruces	Metro cúbico	220,60	$ 90.646,13	$ 19.996.445,63	106,50	$ 9.653.812,85
2.14	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado para acometidas	Metro cúbico	123,91	$ 90.646,13	$ 11.231.998,23	67,93	$ 6.157.591,62
2.15	3.12.01	Cargue y transporte de materiales sueltos producto de sobrantes y/o derrames (incluye acarreo libre)	Metro cúbico	234,23	$ 5.013,50	$ 1.174.321,73	146,11	$ 732.522,49
2.16	2.08.07	Suministro e instalación válvula compuerta h.f. de 3" extremo liso sello elastó, 250 psi	Unidad	0,00	$ 812.560,51	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.17	2.04.58	Suministro e instalación cajas para válvulas tipo brocal en h.f.	Unidad	0,00	$ 187.683,46	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.18	3.12.03	Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	Metro cúbico - Km	4.802,78	$ 2.312,50	$ 11.106.420,34	2.324,25	$ 5.374.828,13
NP 6	3.12.02	Transporte de material suelto.	Metro cúbico - Km	3.798,13	$ 1.850,00	$ 7.026.543,29	2.085,35	$ 3.857.897,50

RED PLUVIAL						**$ 576.496.109,23**		**$ 443.852.218,96**
3.1	2.01.05	Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	Metro lineal	579,40	$ 1.062,32	$ 615.508,21	490,70	$ 521.280,42
3.2	Cotizacion	Señalización área de trabajo con colombianas, cinta reflectiva y señales preventivas de tránsito	Metro lineal	579,40	$ 2.804,00	$ 1.624.637,60	490,70	$ 1.375.922,80
3.3	1.02.15	Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	Metro cúbico	1057,78	$ 25.449,98	$ 26.920.530,74	853,36	$ 21.717.994,93
3.4	2.01.02	Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	Metro cuadrado	1241,48	$ 42.040,83	$ 52.192.849,63	1.011,18	$ 42.510.846,48
3.5	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado Sumideros y cajas	Metro cúbico	115,55	$ 91.714,13	$ 10.597.888,72	114,28	$ 10.481.090,78
3.6	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado conexión sumidero	Metro cúbico	59,70	$ 91.714,13	$ 5.475.333,56	23,56	$ 2.160.784,90
3.7	2.07.08	Corte de pavimento rígido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	Metro cúbico	6,23	$ 286.965,46	$ 1.786.646,95	5,08	$ 1.456.407,10
3.9	2.05.56	Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc de 16"	Metro lineal	358,30	$ 288.572,86	$ 103.395.655,74	352,70	$ 101.779.647,73
3.11	2.05.60	Suministro e instalación tubería 24" PVC alcantarillado red principal	Metro lineal	221,10	$ 527.993,04	$ 116.739.261,14	138,00	$ 72.863.039,52
3.12	2.05.59	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=8"	Metro lineal	21,30	$ 85.764,02	$ 1.826.773,63	20,90	$ 1.792.468,02
3.13	Cotizacion	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 8"	Unidad	5,00	$ 375.500,00	$ 1.877.500,00	5,00	$ 1.877.500,00
3.14	Cotizacion	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 24" a 8"	Unidad	3,00	$ 565.821,00	$ 1.697.463,00	0,00	$ 0,00
3.16	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	Metro cúbico	228,62	$ 138.070,17	$ 31.565.924,83	171,81	$ 23.721.835,91
3.17	2.01.10	Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para conexiones.	Metro cúbico	7,40	$ 138.070,17	$ 1.022.313,08	5,48	$ 756.624,54
3.18	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	Metro cúbico	741,17	$ 90.646,13	$ 67.184.005,70	697,50	$ 63.225.675,68
3.19	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para acometidas.	Metro cúbico	22,59	$ 90.646,13	$ 2.047.469,46	13,09	$ 1.186.557,84
3.20	Cotizacion	Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	Unidad	15,00	$ 2.761.982,96	$ 41.429.744,40	11,00	$ 30.381.812,56
3.21	2.06.09	Placa de fondo o base de pozo de inspección diámetro=1.70 m	Unidad	15,00	$ 882.461,36	$ 13.236.920,40	11,00	$ 9.707.074,96
3.22	3.12.01	Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	Metro cúbico	235,92	$ 5.013,50	$ 1.182.801,72	185,79	$ 931.458,17
3.23	3.12.03	Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección diseño)	Metro cúbico	9508,83	$ 2.312,50	$ 21.989.162,71	8.237,70	$ 19.049.681,26
3.24	Cotizacion	Sumidero transversal rejillas plastica	Unidad	3,00	$ 8.985.333,60	$ 26.956.000,80	1,00	$ 8.985.333,60
3.25	2.07.04	Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para muros	Metro cúbico	6,34	$ 1.102.801,80	$ 6.989.557,81	0,21	$ 231.588,38
3.26	2.07.06	Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para tapas	Metro cúbico	0,86	$ 937.939,18	$ 810.379,45	0,09	$ 84.414,53
3.27	2.07.05	Concreto simple 28 mpa - (400 psi) impermeabilizado para pisos	Metro cúbico	1,56	$ 1.060.141,09	$ 1.658.060,66	0,00	$ 0,00
3.28	3.10.12	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa	Kilogramo	172,60	$ 7.002,12	$ 1.208.558,91	40,56	$ 284.005,99
NP 7	3.12.02	Transporte de material suelto.	Metro cúbico - Km	9474,23	$ 1.850,00	$ 17.527.319,23	7.609,52	$ 14.077.612,00
NP 8	Cotizacion	Suministro e instalación Codo 45° PVC para alcantarillado de 8"	Unidad	3,00	$ 243.370,81	$ 730.112,43	3,00	$ 730.112,43
NP 9	1.02.01	Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)	Metro cuadrado	34,05	$ 36.230,07	$ 1.233.525,57	24,97	$ 904.664,84
NP 10	1.02.01	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"	Metro lineal	32,30	$ 137.109,86	$ 4.428.648,48	15,30	$ 2.097.780,86
NP 11	Cotización	Construcción cajas ladrillo t.c. (1,00 x 1,00) m pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	Unidad	3,00	$ 815.098,76	$ 2.445.296,28	2,00	$ 1.630.197,52
NP 12	Cotizacion	Suministro e instalación de rejilla plastica	Unidad	21,00	$ 385.726,59	$ 8.100.258,39	19,00	$ 7.328.805,21

REPARACION DE ANDENES						**$ 7.580.466,68**		**$ 4.147.631,07**
4.1	3.03.11	Excavación manual en material conglomerado	Metro cúbico	0,00	$ 91.714,13	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	3.03.12	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre de 5 KM.	Metro cúbico	6,00	$ 100.304,20	$ 601.825,20	0,00	$ 0,00
4.3	3.08.11	Construcción de andenes en concreto de 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro cúbico	3,00	$ 595.000,00	$ 1.785.000,00	0,00	$ 0,00
4.4	3.13.29	Malla electrosoldada 0.20X0.20 M D04 MM (incluye suministro, fijación e instalación)	Kilogramo	135,00	$ 7.627,65	$ 1.029.732,75	0,00	$ 0,00
NP 13	2.01.14	Demolición de pisos de concreto <=10 cms	Metro cuadrado	126,57	$ 32.896,82	$ 4.163.908,73	126,08	$ 4.147.631,07
TOTAL COSTOS DIRECTO						**$ 1.484.704.559,02**		**$ 1.193.270.344,19**

COSTOS INDIRECTOS		$ 445.411.367,70	$ 357.981.103,25
23,00%	$ 341.482.048,57		
2,00%	$ 29.694.091,18	AIU $ 445411367,7	AIU $ 357981103,25
5,00%	$ 74.235.227,95		
COSTO DIRECTO + INDIRECTO		$ 1.930.115.926,72	$ 1.551.251.447,44
Presupuesto PMT		$ 15.061.734,13	$ 15.061.734,13
REDISEÑOS		$ 66.300.000,00	$ 66.300.000,00
IVA REDISEÑOS		$ 12.597.000,00	$ 12.597.000,00
Costo Total		$ 2.024.074.660,85	$ 1.645.210.181,57

PORCENTAJE DE EJECUCION A ESTE INFORME: 81,282%

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1 PERSONAL EN OBRA

Nº	NOMBRE	CARGO
1	John Emerson Rosas Mesa	Director de Obra
2	Julieth Manuela Jimenez Fonceca	Residente de Obra
3	Johana Carolina Patiño	Residente SST
4	Jairo Alonso Rosas	Apoyo a residente de obra
5	Jaime Barrera	Operador Maquinaria
6	Fabio Del Jesus Lemus	Oficial
7	Cesar Augusto Mendoza Alarcon	Ayudante
8	Roberto De Los Angeles Lopez	Ayudante
9	Johan Andres Lopez	Operador Maquinaria
10	Baudilio Sanchez Cardenas	Ayudante
11	Ferney Dario Garcia	Ayudante
12	Jesus Alexander Perez	Ayudante
13	Pascual sierra Gutierres	Ayudante
14	Cesar Leonardo Perez	Oficial
15	Carlos Alveiro Riveros	Ayudante
16	Gerardo Avella Gutierrez	Ayudante

• Las afiliaciones se reflejarán en el anexo

3.3. PÓLIZAS AJUSTADAS AL CONTRATO

3.3.1POLIZAS CONTRATO DE OBRA

ENDOSO 1

AMPARO	NÚMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	91011	$202.407.466,09	19/05/2025-19/03/2026	Berkley International Seguros Colombia S.A
Salarios y prestaciones sociales	91011	$202.407.466,09	19/05/2025-19/11/2028	Berkley International Seguros Colombia S.A
Estabilidad de la obra	91011	$202.407.466,09	19/05/2025-19/11/2030	Berkley International Seguros Colombia S.A
Buen manejo del anticipo	91011	$1.012.037.330,43	19/05/2025-19/03/2026	Berkley International Seguros Colombia S.A
Predios labores y operaciones	26224	$ 284.700.000.00	19/09/2025-19/11/2025	Berkley International Seguros Colombia S.A

ENDOSO 2

AMPARO	NÚMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	91011	$202.407.466,09	19/05/2025-03/04/2026	Berkley International Seguros Colombia S.A
Salarios y prestaciones sociales	91011	$202.407.466,09	19/05/2025-03/12/2028	Berkley International Seguros Colombia S.A
Estabilidad de la obra	91011	$202.407.466,09	19/05/2025-03/12/2030	Berkley International Seguros Colombia S.A
Buen manejo del anticipo	91011	$1.012.037.330,43	19/05/2025-03/04/2026	Berkley International

				Seguros Colombia S.A
Predios labores y operaciones	26224	$ 284.700.000.00	19/11/2025-03/12/2025	Berkley International Seguros Colombia S.A

NOTA: La copia de pólizas del contratista se adjunta al presente informe mediante el ANEXO

3.4 ACTAS PARCIALES DE OBRA

ACTA	PERIODO	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM
001	DEL 19/09/2025 AL 14/11/2025	$ 380.107.226,68	37,559 %	$ 380.107.226,68	37,559 %

3.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.5.1 Modificaciones de cantidades

La adición y prórroga se ajusta a lo establecido en la solicitud presentada y debidamente justificada por el contratista de obra, conforme a las siguientes consideraciones:

Las modificaciones introducidas al contrato tuvieron como finalidad optimizar las condiciones técnicas y los resultados del proyecto. Dichos ajustes fueron concertados entre la supervisión/interventoría y el contratista, con base en las necesidades técnicas, operativas y administrativas identificadas durante la ejecución de las actividades contractuales.

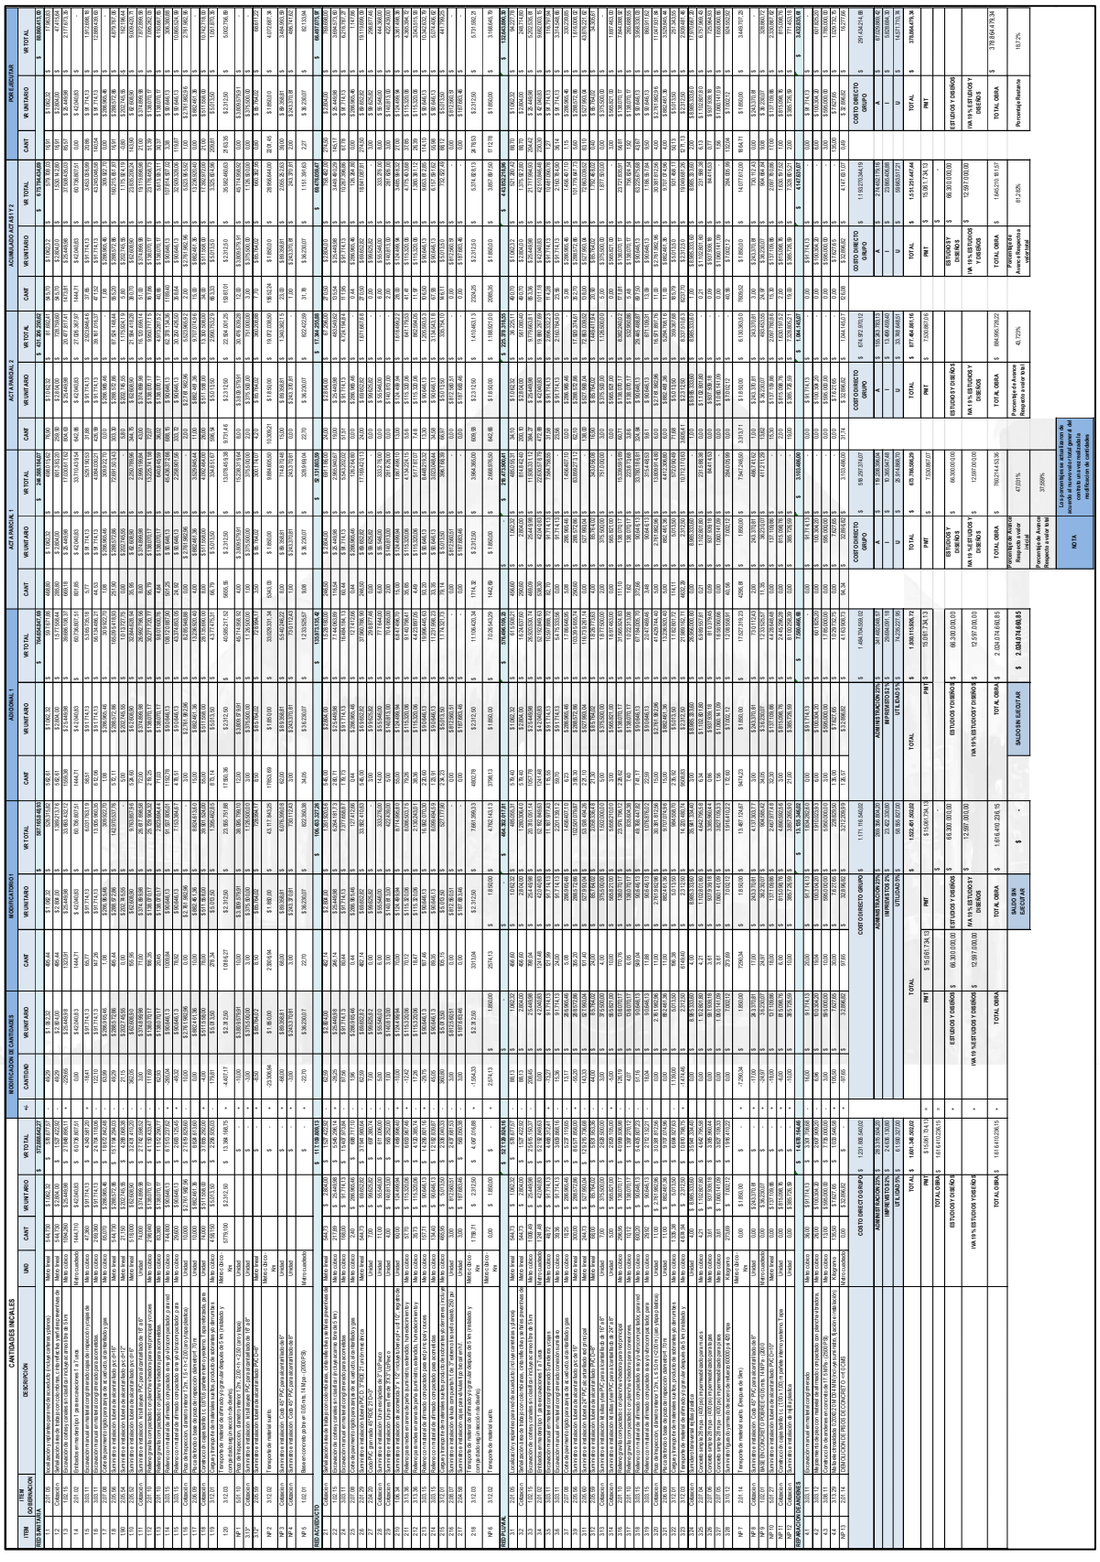
Durante el desarrollo del proyecto, se formuló un ajuste técnico, financiero y administrativo respecto al planteamiento inicial, el cual tuvo una duración aproximada de un mes contado a partir de la fecha de inicio del contrato. Este periodo incidió en la programación inicial presentada por el contratista, generando la necesidad de efectuar una reprogramación acorde con los resultados del ajuste técnico definitivo.

Los cambios técnicos mencionados derivaron principalmente de la proyección y definición de la obra de arte tipo Box Culvert, estructura fundamental para la funcionalidad del sistema de alcantarillado pluvial, ubicada en la abscisa K0+325 del diseño. Como consecuencia de la modificación descrita en el numeral anterior, se incrementó la profundidad requerida para la instalación del colector sanitario principal y sus acometidas, con el fin de garantizar la eficiencia hidráulica de las estructuras contempladas en los ajustes al diseño. Lo anterior implicó un aumento significativo en el tiempo necesario para ejecutar las excavaciones, considerando que las acometidas deben realizarse de manera manual.

Adicionalmente, durante las excavaciones asociadas a las diferentes estructuras se identificaron interferencias no previstas tales como redes de gas sin señalización, vestigios de alcantarillados antiguos (incluyendo bóvedas), redes eléctricas y sistemas de riego por canales. Al tratarse de una vía rural de tercer orden, la ausencia de un catastro de redes obligó a la realización de apiques sucesivos, lo cual impactó la programación inicial del proyecto y generó retrasos en los tiempos establecidos.

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1 PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL



A la fecha se genera un avance de **81,282%** en la ejecución total del proyecto, que corresponde a un total de ($ 1.645.210.181,57) mil seiscientos cuarenta y cinco millones doscientos diez mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta y siete centavos. m/cte., este monto acumulado hasta la fecha es consistente con las actividades ejecutadas y las programadas, diferencias son aclaradas en el componente 3.5 actividades administrativas.

EJECUCION CONTRATO DE OBRA		
DESCRIPCION	VALOR COSTO TOTAL	% DE EJECUCION
VALOR INICIAL CONTRATO	$1`616.410.236,15	
VALOR ADICIONAL	$407.664.424,70	
VALOR TOTAL CONTRATO	$2`024.074.660,85	100
ANTICIPO	$808.205.118,08	50
AVANCE FISICO DE OBRA	$1.645.210.181,57	81,282

4.2 ANTICIPO DEL CONTRATISTA

Con base en lo establecido en el esquema de pagos del contrato de obra, se efectuó el desembolso del anticipo, equivalente al 50% del valor total del contrato, por un total de OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 808.205.118,08),** correspondiente a 50% del valor total del contrato de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR					% *
		MES 1	MES 2	MES 3	MES XX	TOTAL	
1	PAGO DE SALARIOS, DOTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	40.410.255,90	40.410.255,90			80.820.511,81	10,0%
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS**	16.164.102,36				16.164.102,36	2,0%
3	TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA	202.051.279,52	202.051.279,52			404.102.559,04	50,0%
4	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	274.789.740,15				274.789.740,15	34,0%
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.164.102,36	16.164.102,36			32.328.204,72	4,0%
TOTAL		**549.579.480,29**	**258.625.637,78**	**0,00**	**0,00**	**808.205.118,08**	**100,0%**

TABLA PLAN INVERSIÓN ANTICIPO

5. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este capítulo se complementa en el informe presentado anexo a este INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Este capítulo se complementa en el anexo a este informe

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cuenta con un avance en obra de aproximadamente del 81,282%

- Como parte del control técnico de los procesos ejecutados en la obra, se llevó a cabo una supervisión exhaustiva de las cantidades trabajadas, empleando diversos procedimientos adaptados a las particularidades de cada una de las labores realizadas en el marco del contrato de obra. Estos procedimientos abarcaron, entre otros, la toma de espesores y mediciones lineales.

- Antes de dar inicio al proyecto a ejecutar se realiza visita técnica al sitio de la obra en conjunto con la supervisión con el fin de verificar detalladamente que el alcance corresponda a las necesidades del proyecto.

- Cada uno de los aspectos técnico-administrativos y financieros inherentes al contrato de obra ha sido desarrollado con un enfoque riguroso hacia las buenas prácticas. Se ha garantizado la optimización de recursos, la eficiencia y eficacia en la gestión del tiempo, los fondos y demás recursos asignados.

- Todas las actividades ejecutadas han seguido las buenas prácticas y han cumplido con los procesos constructivos pertinentes.

Proyectó: John Emerson Rosas Mesa
Director de Obra

ANEXOS

INFORME OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: JOHN EMERSON ROSAS MESA

INTERVENTOR: INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S.

% AVANCE: _____ FECHA INICIO: _____ FECHA DE CORTE _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	1

Observaciones Particulares:
Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.



Foto No:	2

Observaciones Particulares:
Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3

Observaciones Particulares:
Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.



Foto No:	4

Observaciones Particulares:
Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	5

Observaciones Particulares:
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km



Foto No:	6

Observaciones Particulares:
relleno con arena de peña



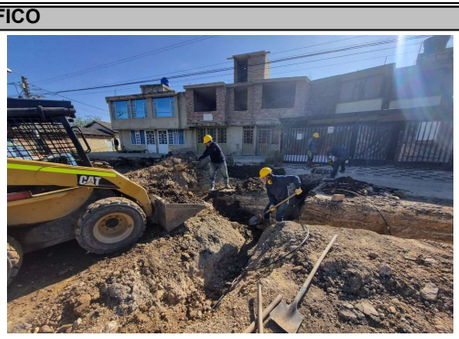
Foto No:	7

Observaciones Particulares:
Excavación manual en material conglomerado para acometidas



Foto No:	8

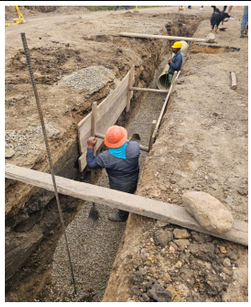
Observaciones Particulares:
Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	9	Foto No:	10
Observaciones Particulares: Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	11	Foto No:	12
Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)		Observaciones Particulares: Corte de pavimento rigido para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	13	Foto No:	14
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	




REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	15	Foto No:	16
Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	17	Foto No:	18
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	19	Foto No:	20
Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)		Observaciones Particulares: Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	21	Foto No:	22
Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)		Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	23	Foto No:	24
Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)		Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	25	Foto No:	26
Observaciones Particulares: Localización y replanteo para red de acueducto (incluye carreteras y planos)		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	27	Foto No:	28
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	29	Foto No:	30
Observaciones Particulares: Excavación manual ,apique redes existentes		Observaciones Particulares: Suministro e instalación tubería PVC D. 3" RDE 21 unión mecánica	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	31	Foto No:	32
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	33	Foto No:	34
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Demolición de pisos de concreto <=10 cms	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	35	Foto No:	36
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	37	Foto No:	38
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	39	Foto No:	40
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	41	Foto No:	42
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	43	Foto No:	44
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	45	Foto No:	46
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

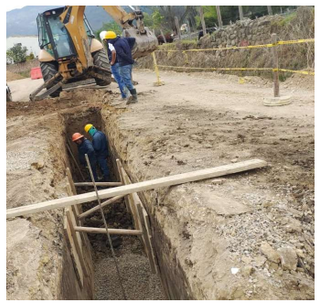
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	47	Foto No:	48
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	49	Foto No:	50
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para red principal	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	51	Foto No:	52
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	53	Foto No:	54
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	55	Foto No:	56
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	57	Foto No:	58
Observaciones Particulares: #¿NOMBRE?		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	59	Foto No:	60
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado raso y/o vibrocompactador, para red principal y cruces	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	61	Foto No:	62
Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	63	Foto No:	64
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	65	Foto No:	66
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	67	Foto No:	68
Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno gravilla compactado con plancha vibradora para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	69	Foto No:	70
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	71

Observaciones Particulares:

Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	72

Observaciones Particulares:

Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	73

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.



Foto No:	74

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	75

Observaciones Particulares:

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.



Foto No:	76

Observaciones Particulares:

Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	77

Observaciones Particulares:

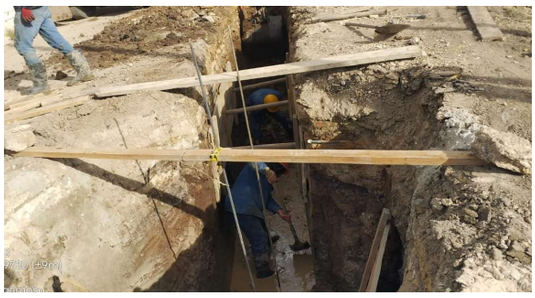
Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.



Foto No:	78

Observaciones Particulares:

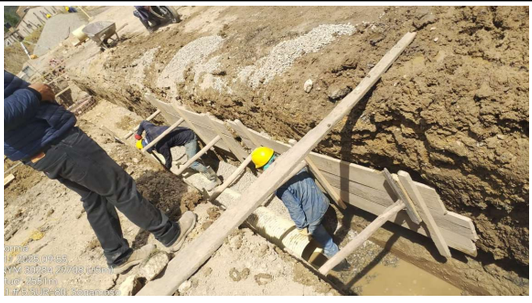
Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.

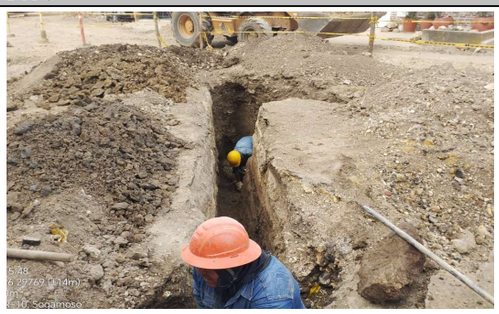

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	79	Foto No:	80
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	81	Foto No:	82
Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para acometidas.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	83	Foto No:	84
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	85	Foto No:	86
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	87	Foto No:	88
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	89	Foto No:	90
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	91	Foto No:	92
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	93	Foto No:	94
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	95	Foto No:	96
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	97	Foto No:	98
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.		Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado cajas de inspección y cajas de empalme.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	99	Foto No:	100
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 2.00 < h < 2.50 (aro y tapa)		Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	101	Foto No:	102
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	103

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"



Foto No:	104

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	105

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"



Foto No:	106

Observaciones Particulares:
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto No:	107

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	108

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	109

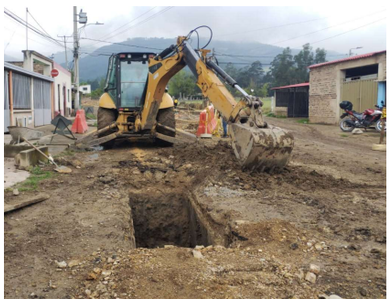
Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos



Foto No:	110

Observaciones Particulares:
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	111	Foto No:	112
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)		Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	113	Foto No:	114
Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.		Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	115	Foto No:	116
Observaciones Particulares: Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	117	Foto No:	118
Observaciones Particulares: Pozo de Inspeccion, diametro interior 1.2m, 1.5 < h < 2.00 (aro y tapa plastica)		Observaciones Particulares: Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador, para red principal y cruces.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 119	Foto No: 120
Observaciones Particulares: Base en concreto pobre e= 0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI)	Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 121	Foto No: 122
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 123	Foto No: 124
Observaciones Particulares: Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	Observaciones Particulares: Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No: 125	Foto No: 126
Observaciones Particulares: Excavación manual en material conglomerado para acometidas.	Observaciones Particulares: Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, para acometidas y empalmes.

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME PARCIAL

“CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**JOHN EMERSON ROSAS**
	INFORME PARCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. **INTRODUCCION**
2. **OBJETIVOS**
   - 2.1. Objetivo General
   - 2.2. Objetivos específicos
3. **RELACION DE TRABAJADORES EN OBRA**
4. **PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL**
5. **MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES**
6. **MATRIZ DE PELIGROS**
7. **CAPACITACIONES**
   - 7.1. Indicador de Cumplimiento de Actividades
   - 7.2. Indicador de cobertura.
   - 7.3. Indicador de eficacia.
   - 7.4. Cobertura de la inducción
8. **ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**
9. I**NDICADORES MINIMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0312 DE 2017**
10. **INSPECCIONES DE SEGURIDAD**
11. **REGISTRO FOTOGRAFICO**

1. INTRODUCION

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer la gestión realizada durante el desarrollo de las actividades realizadas con respecto al contrato "**CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**", correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello, que JOHN EMERSON ROSAS MESA, tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, dentro del desarrollo del contrato. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019 cumpliendo las funciones como contratista de la alcaldía del municipio de Sogamoso. La prevención en SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General

Es tener CERO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, para lo cual propiciamos y motivamos que cada trabajador tenga una actitud y un compromiso permanente con la seguridad, la salud y con el medio ambiente.

2.2. Objetivos Específicos.

- Prevenir y/o controlar los riesgos en las diferentes áreas y lugares donde se desarrollarán los trabajos.
- Fortalecer la cultura preventiva en todos nuestros colaboradores.

- Prevenir y/o mitigar cualquier impacto en la salud que se genere en la ejecución de los trabajos.
- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.
- Implementar planes, procedimientos, guías de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los AT y EL.

3. RELACION DE PERSONAL EN OBRA

A continuación, se relaciona el personal de obra.

RELACION DE PERSONAL							
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	PENSION	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
JOHN EMERSON ROSAS MESA	74081029	DIRECCTOR DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	4/06/2025	
KAREN LISETH CELY	1057590407	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	4/06/2025	30/07/2025
JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA	1057611444	RESIDENTE DE OBRA	SAUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	4/08/2025	
JOHANA CAROLINA PATIÑO	1020752084	RESIDENTE SST	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4/06/2025	
JAIRO ALONSO ROSAS	1051589941	APOYO A RESIDENTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	4/06/2025	
JAIME BARRERA	9533851	OPERADOR RETROEXCAVADORA	NEPS		SURA	4/06/2025	
FABIO DEL JESUS LEMUS	74372715	OFICIAL	NEPS	COLPENSIONES	POSITIVA	4/06/2025	
BRAHIAN ESTIBEN LOPEZ CARDENAS	1057570202	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	4/06/2025	21/06/2025
JUAN FELIPE GURRERO ARAQUE	1010054640	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	11/06/2025	12/07/2025
JULIAN ANDREY PEREZ DELGADO	1122121604	AYUDANTE	NEPS	PROTECCION	POSIITVA	11/06/2025	21/06/2025
CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	1118549653	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	18/06/2025	
ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ	74185842	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	POSITIVA	24/06/2025	
SHAMPIER STIVENT LEMUS PINEDA	1057580427	AYUDANTE	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	24/06/2025	5/07/2025
JOHAN ANDRES LOPEZ	1007413791	OPERADOR MINI	NEPS	COLPENSIONES	SURA	15/07/2025	
WILSON JHOVANI LOPEZ	1058051592	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	SURA	14/07/2025	27/09/2025
BAUDILIO SANCHEZ CARDENAS	9530903	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	SURA	14/07/2025	
DIANA CAROLINA MONTAÑA	1057574918	CONTROLADORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	15/07/2025	22/07/2025
KAROL JUANITA GONZALEZ	1057577478	CONTROLADORA	NEPS	COLPENSIONES	SURA	15/07/2025	30/08/2025
ANA YANIN CORREDOR	46376054	CONTROLADORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	23/07/2025	30/08/2025
FERNEY DARIO GARCIA	1054283864	AYUDANTE	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	24/07/2025	
JESUS ALEXANDER PEREZ	1057598366	AYUDANTE	NEPS	PORVENIR	SURA	24/07/2025	
LUIS ALFREDO ALVAREZ MARTINEZ	9518924	OFICIAL	NEPS	PORVENIR	SURA	27/07/2025	30/08/2025
PASCUAL SIERRA GUTIERREZ	9396749	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	SURA	19/08/2025	
CESAR LEONARDO PEREZ	1116664606	OFICIAL	SANITAS	PORVENIR	SURA	21/08/2025	
CARLOS ALVEIRO RIVEROS	1057570638	AYUDANTE	NEPS	COLPENSIONES	SURA	29/09/2025	18/10/2025

4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó las afiliaciones de cada uno de los colaboradores que ingresaron, así mismo se efectuó el pago de seguridad social de los trabajadores, dando cumplimiento a los requerimientos exigidos.

5. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

En la matriz de requisitos legales se realizó la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividad propias e inherentes de nuestra actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Decreto 1072 de 2015). La cual se mantiene actualizada.

6. MATRIZ DE PELIGROS

El Panorama de Factores de Riesgo se elaboró a partir de la Guía Técnica Colombiana GTC 45; para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud de los trabajadores, que establece las directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional; esta identificación, se hace a partir del Panorama de Factores de Riesgo, donde se debe hacer un reconocimiento de los riesgos, a los que están expuestos los trabajadores de John Emerson Rosas, determinando los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa, facilita la adopción de decisiones ya que permite priorizar las situaciones en función de su criticidad.

La matriz de peligros no se le han realizado modificaciones ya que no se han presentado riesgos diferentes a los expuestos, no se han presentado accidentes ni enfermedades laborales por las cuales debamos revalorizar la matriz de peligros.

7. CAPACITACIONES

Las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo tienen el objetivo de brindar conocimientos que ayuden al trabajador a evitar accidentes en la empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva en todos

los integrantes de la organización. Por lo tanto, se busca capacitar para analizar problemas, identificar sus causas, proponer soluciones, planear y adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Además del conocimiento y habilidades que desarrollará el trabajador con las capacitaciones, esta permite que la empresa cumpla con el deber de prevención establecido en las normas sobre seguridad y salud laboral.

En el desarrollo de las actividades que se realizaron en los periodos en mención se ejecutaron las siguientes capacitaciones:

- Inducción en sst al personal que ingreso.
- Elementos de proteccion personal.
- Conceptos y actividades de minimización, segregación y código de colores, recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición final.
- Prevención de incendios, uso y manejo de extintores portátiles.
- Seguridad vial y señalización.
- Responsabilidad civil y penal.
- Gestión ambiental: definición, áreas de interés y bases legales.

En base al cronograma de capacitaciones para este periodo, el cumplimiento de ejecución es del 83%, del porcentaje de cumplimiento.

		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	VI TRIMESTRE
PROGRAMADA	Actividades Programadas	0	1	6	6
EJECUTADA	Actividades Ejecutadas	0	1	5	5
	% de Ejecución	#¡DIV/0!	100%	83%	83%

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**JOHN EMERSON ROSAS**
	INFORME PARCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

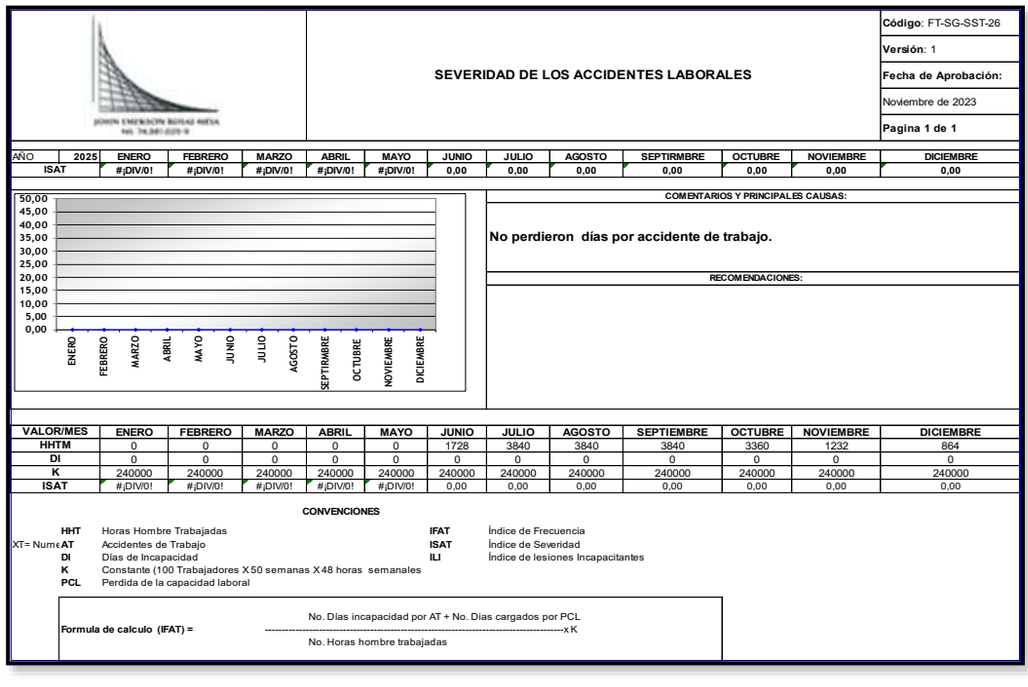
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo proteger a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales busca que se reduzcan los riesgos a los cuales se encuentran expuestos durante el desarrollo de actividades que requieren el uso de elementos de protección personal (Epps). Por lo tanto, es obligación de JOHN EMERSON ROSAS MESA, proporcionar los elementos de protección personal EPP a cada uno de los colaboradores. De esta forma, se reduce cualquier tipo de amenaza o riesgo al que se encuentre expuesto a diario.

Se realizo entrega de la dotación y de los elementos de proteccion personal requeridos por cada trabajador; así mismo se realizaba el cambio del epp en mal estado por uno nuevo.

9. INDICADORES MINIMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0312 DE 2017

En base al seguimiento de los accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL), se calculan los indicadores mínimos, realizar el cálculo y reportar los resultados presentados a continuación.

9.1. Severidad De Los At



SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Código:	FT-SG-SST-26
Versión:	1
Fecha de Aprobación:	
	Noviembre de 2023
Pagina 1 de 1	

AÑO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIRMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No perdieron días por accidente de trabajo.

RECOMENDACIONES:

VALOR/MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HHTM	0	0	0	0	0	1728	3840	3840	3840	3360	1232	864
DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
ISAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENCIONES

HHT	Horas Hombre Trabajadas	**IFAT**	Índice de Frecuencia
XT= Num **AT**	Accidentes de Trabajo	**ISAT**	Índice de Severidad
DI	Días de Incapacidad	**ILI**	Índice de lesiones Incapacitantes
K	Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales		
PCL	Perdida de la capacidad laboral		


Formula de calculo (IFAT) = (No. Días incapacidad por AT + No. Días cargados por PCL) / (No. Horas hombre trabajadas) x K

9.2. Frecuencia De Los Accidentes Laborales

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Código: FT-SG-SST-26
Versión: 1
Fecha de Noviembre de 2023
Pagina 1 de 1

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IFAT		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No presentaron 0 accidentes de trabajo

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HHT	0	0	0	0	0	1728	3840	3840	3840	3360	1232	864
AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
IFAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XT= Numero promedio de trabajadores

CONVENCIONES

HHT	Horas Hombre Trabajadas	**IFAT**	Índice de Frecuencia
AT	Accidentes de Trabajo	**ISAT**	Índice de Severidad
DI	Días de Incapacidad	**ILI**	Índice de lesiones Incapacitantes
K	Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales		


Formula de calculo (IFAT) = Numero de accidentes / No. Horas hombre trabajadas x K

9.3. Mortalidad De Accidentes De Trabajo

MORTALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Código: FT-SG-SST-26
Versión: 1
Aprobación: 2023
Pagina 1 de 1

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MAT		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron accidentes mortales

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. ATM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MAT	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Numero promedio de trabajadores

CONVENCIONES


No. ATM	Numero de accidentes de trabajo mortales
TAT	Total de accidentes de trabajo
K	100 para obtener un procentaje
MAT	Mortalidad de los accidentes de trabajo

Mortalidad de los accidentes de trabajo = Numero de accidentes de trabajo mortales / Total de accidentes de trabajo x 100

9.4. Prevalencia De La Enfermedad Laboral

	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	**Código**: FT-SG-SST-26	
		Versión: 1	
		Aprobación:	
		Noviembre de 2023	
		Pagina 1 de 1	

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PEL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron casos de enfermedad laboral en el periodo mencionado

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. CN y AEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PTTP	0	0	0	0	0	8	16	16	16	14	14	9
10 ^{n}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PEL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume

CONVENCIONES


No. CNyAEL No de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
PTTP Promedio total de trabajadores en el periodo
10^{n} 10 por el exponencial n
PEL Prevalencia de la enfermedad laboral

Formula de calculo (PEL) = $\frac{\text{Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^{n}$

9.5. Incidencia De La Enfermedad Laboral

	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	**Código**: FT-SG-SST-26	
		Versión: 1	
		Aprobación:	
		Noviembre de 2023	
		Pagina 1 de 1	

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IEL		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presentaron casos de enfermedad laboral en el periodo

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. CN y AEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PTTP	0	0	0	0	0	8	16	16	16	14	14	9
10 ^{n}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
IEL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

XT= Nume

CONVENCIONES


No. CNEL Numero de casos nuevos de enfermedad laboral
PTTP Promedio total de trabajadores en el periodo
10^{n} 10 por el exponencial n
IEL Incidencia de la enfermedad laboral

Formula de calculo (PEL) = $\frac{\text{Numero de casos nuevos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^{n}$

9.6. Ausentismo Laboral

	AUSENTISMO LABORAL	Código: FT-SG-SST-26
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018
		Pagina 1 de 1

AÑO	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ausentismo		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

No se presento ausentismo laboral

RECOMENDACIONES:

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. DA X IL y C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No. DTP	0	0	0	0	0	27	30	30	30	30	11	12
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ausentismo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XT= Nume

CONVENCIONES

No. DA X IL y C	Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral y comun
No. DTP	Numero de dias de trabajo programados
K	100 para obtener un porcentaje

$$\text{Ausentismo} = \frac{\text{Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral y comun}}{\text{Numero de dias de trabajo programados}} \times 100$$

JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**JOHN EMERSON ROSAS**
	INFORME PARCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad identifican los peligros mediante el estudio de las condiciones en el lugar de trabajo o en las fuentes de peligro. Las inspecciones en el lugar de trabajo son fundamentales para ayudar a prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones o por los accidentes de trabajo.

10.1. Inspecciones locativas frente de obra

- **Inspección punto ecológico**

Se ejecuto las inspecciones al punto ecológico ubicado en las áreas de trabajo, se encuentran en buenas condiciones generales se encentran rotuladas y tapadas.



- **Inspección gestión de residuos**

Se indago con el residente de obra y maestro encargado, si en el desarrollo del proceso productivo del proyecto se genera residuos peligrosos en donde la respuesta fue positiva; se realiza entrega de los sacos del cemento al productor quien es el encargado de darle disposición final se evidencia que la separación en la fuente de los residuos ordinarios, reciclables se está realizando conforme al código de colores establecido por la Resolución 2184 de 2019.

- **Inspección instalaciones locativas y administrativas**

Se evidencia buen estado del área administrativa; en la ubicación de la obra se cuenta con una unidad sanitaria que está ubicada en una de las viviendas cercana al proyecto.

- **Inspecciones orden y aseo**

Se cumple con los ítems relacionados en el formato FT-SG-SST-13, se cuenta con extintor de 10 libras en el área administrativa y con 3 extintores multipropósito ABC de 5 libras, no se cuenta con unidades sanitarias portátiles.








Inspecciones a los elementos de emergencia

- **Inspección a camilla de emergencia**

Se realizo inspecciones de la camilla de emergencias evidenciando el buen estado en el que se encuentra, las correas al igual que los inmovilizadores se encuentran en buen estado. Se encuentran señalizadas**.**



- **Inspección a botiquín de primeros auxilios**

Se realizo las inspecciones al botiquín de primeros auxilios. Se verifican fechas de vencimiento, cantidades existentes. Se evidencia la falta de compromiso por parte de los trabajadores en cuanto al manejo que se le está dando ya que se han perdido insumos, por tal razón se decide entregarle el botiquín al residente de obra.



Campamento



Retroexcavadora



Minicargador



Camioneta de estacas



Oficina

- **Inspección a extintores contra incendios**

Se evidencia en buen estado ubicados en la retroexcavadora, camioneta kia y área administrativa todos con fecha de recarga octubre de 2024.



Minicargador



Retroexcavadora



Oficina



Camioneta de estacas



Campamento

9.2. Inspección preoperacional de maquinaria

Cada operador de cada máquina y equipo debe realizar el preoperacional antes de iniciar labores en donde se verifica el estado del equipo o máquina, esto con el fin de evitar posibles accidentes labores y/o daños en los mismos, continuación se presenta las preoperacionales realizadas para el proyecto.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

























JOHN EMERSON ROSAS Nit. 74.081.029-9	**JOHN EMERSON ROSAS**
	INFORME PARCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-08, 11:59:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79866665

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 08/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74081029	JOHN EMERSON ROSAS MESA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.100.000	$ 656.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.100.000	$ 512.500	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 0	$ 656.000	$ 512.500	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900	$ 0	$ 1.453.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057611444	JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA	CL 28 sur 13A 30	7777777777	jmanuela214@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	11/11/2025	90728226	$515.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	32	3.600	0	181.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	32	4.500	0	232.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	32	2.000	101.100			991	101.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	32	0	0	0
ICBF				
0	32	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	181.600
Pensión	1	227.800	232.300
Riesgos Laborales	1	99.100	101.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	515.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1057611444	JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA		CL 28 sur 13A 30	7777777777	jmanuela214@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	11/11/2025	90728226	$515.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057611444	JIMENEZ FONSECA JULIETH MANUELA	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007413791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN ANDRES LOPEZ MOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 1C SUR 1E 06	TELÉFONO:	7710239
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988484088**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1918928758

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 227.800	$ 2.700	$ 230.500
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.700**	**$ 230.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 178.000	$ 2.100	$ 0	$ 180.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 180.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.200	$ 0	$ 100.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 100.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007413791	LOPEZ MOLANO JOHAN ANDRES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100741379	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 510.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9533851
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME BARRERA OJEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 6 22 PISO 3	TELÉFONO:	7710139
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7988481402**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1890203408

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 178.000	$ 1.900	$ 0	$ 179.900
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 179.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.100	$ 0	$ 100.200
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 100.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES													
																													PENSIÓN										SALUD							ARP																																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9533851	BARRERA OJEDA JAIME	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	9533851	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 280.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74372715
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO LEMUS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS 1D 45	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988482174**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		35			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918899207

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 227.800	$ 5.000	$ 232.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 5.000**	**$ 232.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 178.000	$ 3.900	$ 0	$ 181.900
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 3.900**	**$ 0**	**$ 181.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 2.200	$ 0	$ 101.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 101.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 28.500	$ 700	$ 29.200
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 700**	**$ 29.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74372715	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	74372715	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 545.200

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 02:22:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80333515

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 14/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020752084	JOHANA CAROLINA PATIÑO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1051589941	JAIRO ALONSO ROSAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1118549653	CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 74185842	ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 396.400	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.763.600	$ 7.700	$ 1.771.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1919412739	9494602620	E	2025/10/06	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA		$2,900,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1054283864	GARCIA FERNEY		X																25-14	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
2	CC	1058051592	LOPEZ WILSON		X																25-14	27	$205,000	EPS037	27	$51,300	CCF10	27	$51,300	14-11	27	6.96	$89,200	27	$0	Si	$396,800
3	CC	1116664606	PEREZ CESAR		X																230301	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
4	CC	1057598366	PEREZ JESUS		X																230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
5	CC	74750111	RAMIREZ JOHN	X																	25-14	7	$53,200	EPS037	7	$13,300	CCF10	7	$13,300	14-11	7	6.96	$23,200	7	$0	Si	$103,000
6	CC	1116545920	RAMIREZ MAURICIO	X																	231001	7	$53,200	EPS037	7	$13,300	CCF10	7	$13,300	14-11	7	6.96	$23,200	7	$0	Si	$103,000
7	CC	1057570638	RIVEROS CARLOS	X																	25-14	2	$15,200	EPS037	2	$3,800	CCF10	2	$3,800	14-11	2	6.96	$6,700	2	$0	Si	$29,500
8	CC	9530903	SANCHEZ BAUDILIO		X																25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
9	CC	9396749	SIERRA PASCUAL		X																25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(9)**																						$1,465,600			$366,700			$366,700				$637,800		$0		$2,836,800

2025/11/11 11:53 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1919412739	9494602620	E	2025/10/06	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA		$2,900,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,465,600	$0	$1,498,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$53,200	$0	$54,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$956,800	$0	$978,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$465,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$637,800	$0	$652,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$637,800	$0	$652,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$366,700	$0	$374,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$366,700	$0	$374,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$366,700	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$252,700	$0	$258,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$116,600
TOTAL				**9**	**$2,836,800**	**$0**	**$2,900,200**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-08, 11:59:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79866665

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 08/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74081029	JOHN EMERSON ROSAS MESA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.100.000	$ 656.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.100.000	$ 512.500	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 4.100.000	$ 0	$ 656.000	$ 512.500	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.453.900	$ 0	$ 1.453.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057611444	JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA	CL 28 sur 13A 30	7777777777	jmanuela214@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	11/11/2025	90728226	$515.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	32	3.600	0	181.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	32	4.500	0	232.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	32	2.000	101.100			991	101.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	32	0	0	0
ICBF				
0	32	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	181.600
Pensión	1	227.800	232.300
Riesgos Laborales	1	99.100	101.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	515.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1057611444	JULIETH MANUELA JIMENEZ FONSECA		CL 28 sur 13A 30	7777777777	jmanuela214@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	11/11/2025	90728226	$515.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057611444	JIMENEZ FONSECA JULIETH MANUELA	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007413791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN ANDRES LOPEZ MOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 1C SUR 1E 06	TELÉFONO:	7710239
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988484088**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1918928758

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 227.800	$ 2.700	$ 230.500
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.700**	**$ 230.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 178.000	$ 2.100	$ 0	$ 180.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 180.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.200	$ 0	$ 100.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 100.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007413791	LOPEZ MOLANO JOHAN ANDRES	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100741379	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 510.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9533851
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME BARRERA OJEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 6 22 PISO 3	TELÉFONO:	7710139
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7988481402**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1890203408

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 178.000	$ 1.900	$ 0	$ 179.900
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 179.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.100	$ 0	$ 100.200
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 100.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES													
																													PENSIÓN										SALUD							ARP																																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9533851	BARRERA OJEDA JAIME	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	9533851	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 280.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74372715
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO LEMUS
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 17 BIS 1D 45	TELÉFONO:	7700944
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988482174**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		35			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918899207

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 227.800	$ 5.000	$ 232.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 5.000**	**$ 232.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 178.000	$ 3.900	$ 0	$ 181.900
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 3.900**	**$ 0**	**$ 181.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 2.200	$ 0	$ 101.300
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 101.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 28.500	$ 700	$ 29.200
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 700**	**$ 29.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74372715	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	74372715	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 545.200

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 02:22:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80333515

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 14/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN EMERSON ROSAS		
Documento	CC74081029	**Dirección**	CR 12 NORTE #6 - 22 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7724190
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020752084	JOHANA CAROLINA PATIÑO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1051589941	JAIRO ALONSO ROSAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1118549653	CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 74185842	ROBERTO DE LOS ANGELES LOPEZ CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 396.400	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.763.600	$ 7.700	$ 1.771.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1919412739	9494602620	E	2025/10/06	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA		$2,900,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1054283864	GARCIA FERNEY		X																25-14	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
2	CC	1058051592	LOPEZ WILSON		X																25-14	27	$205,000	EPS037	27	$51,300	CCF10	27	$51,300	14-11	27	6.96	$89,200	27	$0	Si	$396,800
3	CC	1116664606	PEREZ CESAR		X																230301	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
4	CC	1057598366	PEREZ JESUS		X																230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
5	CC	74750111	RAMIREZ JOHN	X																	25-14	7	$53,200	EPS037	7	$13,300	CCF10	7	$13,300	14-11	7	6.96	$23,200	7	$0	Si	$103,000
6	CC	1116545920	RAMIREZ MAURICIO	X																	231001	7	$53,200	EPS037	7	$13,300	CCF10	7	$13,300	14-11	7	6.96	$23,200	7	$0	Si	$103,000
7	CC	1057570638	RIVEROS CARLOS	X																	25-14	2	$15,200	EPS037	2	$3,800	CCF10	2	$3,800	14-11	2	6.96	$6,700	2	$0	Si	$29,500
8	CC	9530903	SANCHEZ BAUDILIO		X																25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
9	CC	9396749	SIERRA PASCUAL		X																25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF10	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(9)**																						$1,465,600			$366,700			$366,700				$637,800		$0		$2,836,800

2025/11/11 11:53 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74372715	0	LEMUS SUAREZ FABIO DE JESUS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO	CL 17 BIS 1D 45	DUITAMA-BOYACA	7700944	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1919412739	9494602620	E	2025/10/06	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA		$2,900,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,465,600	$0	$1,498,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$53,200	$0	$54,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$956,800	$0	$978,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$465,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$637,800	$0	$652,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$637,800	$0	$652,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$366,700	$0	$374,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$366,700	$0	$374,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$366,700	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$252,700	$0	$258,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$116,600
TOTAL				**9**	**$2,836,800**	**$0**	**$2,900,200**

MEDICINA Y SEGURIDAD DE BOYACÁ
NIT. 900430902

Cel. 310 212 0795
Calle 34 No. 15 - 24 - Tunja - Boyaca
Email. centrointegraldeboyaca@gmail.com

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

APELLIDOS		NOMBRES	FECHA
Sierra Gutierrez		Pascual	18 08 25
NO IDENTIFICACIÓN	EDAD	CARGO	EMPRESA
9.396.749		Ayud. Construcción -	JHON ROSAS

TIPO DE EXAMEN	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	REINTENTEGRO	REUBICACIÓN	EXAMEN DE ALTURAS
	✓					

EXÁMENES PRACTICADOS

EXAMEN		EXAMEN		EXAMEN	
EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL	✓	ESPIROMETRÍA		LABORATORIO.	
OPTOMETRÍA/VISIOMETRÍA		AUDIOMETRÍA		OTROS	

RESULTADO VALORACIÓN MÉDICA EXAMEN DE INGRESO

AL EXAMEN MÉDICO NO PRESENTA DEFECTOS NI PATOLOGÍAS	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL	
NO APTO	
APTO CON RESTRICCIONES — CUALES:	

EXAMEN PERIÓDICO

EXAMEN MÉDICO SATISFACTORIO PUEDE SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS LABORES	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES PERO QUE NO LIMITAN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REMISIÓN A LA EPS/ARL	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REUBICACIÓN LABORAL	

EXAMEN DE RETIRO

SATISFACTORIO	✓	
NO SATISFACTORIO		MOTIVO:

TRABAJO EN ALTURAS

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

MÉDICAS		OCUPACIONALES		ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	
Remisión a EPS		Uso de EPP	✓	Inicio de actividad Física	
Continuar manejo médico		Ingreso al SVE		Dejar de Fumar	
Remisión a ARL		Ruido		Reducir consumo de alcohol	
Seguimiento del caso por ARL		Visual		Control de peso	
		Psicolaboral		Cual:	

RECOMENDACIONES GENERALES – Ejercicio Diario
- Alimentación Balanceada

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN DE MI ESTADO DE SALUD. TODO PUEDE SER VERIFICADO Y CONFIRMADO

MEDICINA Y SEGURIDAD DE BOYACÁ NIT. 900.430902 CESAR AUGUSTO RIOS MEDICINA ESPECIALIZADA REGISTRO PROFESIONAL 1059 2019

CÉSAR AUGUSTO RÍOS
MEDICINA ESPECIALIZADA
REGISTRO PROFESIONAL 1059/2019

FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR

MEDICINA Y SEGURIDAD DE BOYACÁ
NIT. 900430902

Cel. 310 212 0795
Calle 34 No. 15 - 24 - Tunja - Boyaca
Email. centrointegraldeboyaca@gmail.com

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

APELLIDOS		NOMBRES		FECHA
Perez Trejos		Cesar Leonardo		20 08 25
NO IDENTIFICACION	EDAD	CARGO	EMPRESA	
1.116.664.606		Oficial-Construcción	John Rosas	

TIPO DE EXAMEN	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	REINTENTEGRO	REUBICACIÓN	EXAMEN DE ALTURAS
	✓					

EXÁMENES PRACTICADOS

EXAMEN		EXAMEN		EXAMEN	
EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL	✓	ESPIROMETRÍA		LABORATORIO	
OPTOMETRÍA/VISIOMETRÍA		AUDIOMETRÍA		OTROS	

RESULTADO VALORACIÓN MÉDICA
EXAMEN DE INGRESO

AL EXAMEN MÉDICO NO PRESENTA DEFECTOS NI PATOLOGÍAS	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL	
NO APTO	
APTO CON RESTRICCIONES — CUALES:	

EXAMEN PERIÓDICO

EXAMEN MÉDICO SATISFACTORIO PUEDE SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS LABORES	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES PERO QUE NO LIMITAN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REMISIÓN A LA EPS/ARL	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REUBICACIÓN LABORAL	

EXAMEN DE RETIRO

SATISFACTORIO		
NO SATISFACTORIO	✓	MOTIVO:

TRABAJO EN ALTURAS

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

MÉDICAS		OCUPACIONALES		ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	
Remisión a EPS		Uso de EPP	✓	Inicio de actividad Física	
Continuar manejo médico		Ingreso al SVE		Dejar de Fumar	
Remisión a ARL		Ruido		Reducir consumo de alcohol	
Seguimiento del caso por ARL		Visual		Control de peso	
		Psicolaboral		Cual	

RECOMENDACIONES GENERALES - Ejercicio Diario
- Alimentación Saludable.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN DE MI ESTADO DE SALUD. TODO PUEDE SER VERIFICADO Y CONFIRMADO

CÉSAR AUGUSTO RÍOS
MEDICINA ESPECIALIZADA
REGISTRO PROFESIONAL 1058/2019

FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR

MEDICINA Y SEGURIDAD DE BOYACÁ
NIT. 900430902

Cel 310 212 0795
Calle 34 No. 15 - 24 - Tunja - Boyaca
Email. centrointegral'deboyaca@gmail.com

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

APELLIDOS		NOMBRES		FECHA
Riveros Aguilar		Carlos Albeiro		28/09/25
NO IDENTIFICACIÓN	EDAD	CARGO	EMPRESA	
1.057.570.638		Ayud. Construcción -	John Rosas	

TIPO DE EXAMEN	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	REINTENTEGRO	REUBICACIÓN	EXAMEN DE ALTURAS
	✓					

EXÁMENES PRACTICADOS

EXAMEN		EXAMEN		EXAMEN	
EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL	✓	ESPIROMETRÍA		LABORATORIO	
OPTOMETRÍA/VISIOMETRÍA		AUDIOMETRÍA		OTROS	

RESULTADO VALORACIÓN MÉDICA
EXAMEN DE INGRESO

AL EXAMEN MÉDICO NO PRESENTA DEFECTOS NI PATOLOGÍAS	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL	
NO APTO	
APTO CON RESTRICCIONES	CUALES:

EXAMEN PERIÓDICO

EXAMEN MÉDICO SATISFACTORIO PUEDE SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS LABORES	✓
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES PERO QUE NO LIMITAN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REMISIÓN A LA EPS/ARL	
AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA ALTERACIONES QUE REQUIEREN REUBICACIÓN LABORAL	

EXAMEN DE RETIRO

SATISFACTORIO	✓	
NO SATISFACTORIO		MOTIVO:

TRABAJO EN ALTURAS

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS		APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

MÉDICAS		OCUPACIONALES		ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	
Remisión a EPS		Uso de EPP	✓	Inicio de actividad Física	
Continuar manejo médico		Ingreso al SVE		Dejar de Fumar	
Remisión a ARL		Ruido		Reducir consumo de alcohol	
Seguimiento del caso por ARL		Visual		Control de peso	
		Psicolaboral		Cual	

RECOMENDACIONES GENERALES - Ejercicio Diario
- Alimentación Saludable

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN DE MI ESTADO DE SALUD. TODO PUEDE SER VERIFICADO Y CONFIRMADO

CÉSAR AUGUSTO RÍOS
MEDICINA ESPECIALIZADA
REGISTRO PROFESIONAL 1058/2019

FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR
