ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	248 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	248 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- SE FINALIZÓ LA ENTREGA DE LOS PORDUCTOS DE LA FASE EL 12-12-25

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO - ENGAÑO)

REVISION DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)

- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLAS

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATÉ (VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	12-dic-25	247	0	-157
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	13-dic-25	248	7	-115
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	13-dic-25	104	-54	18

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	22,58%	12,48%	-10,10%
Durante el periodo	4,80%	0,43%	-4,38%
Acumulado Actual	28,58%	12,90%	-15,68%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DIAS)	DIAS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	248,00	19	-41,87

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

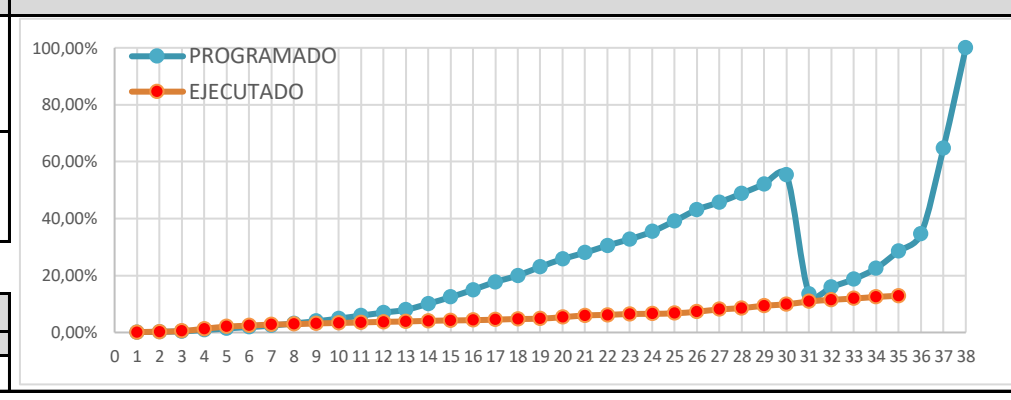

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023


PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	13-dic-25	SEMANA No.	35	DEL	6-dic-25	AL	12-dic-25

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 7.981.714.239	$ 4.410.327.325	55%
Durante el periodo	$ 1.698.505.283	$ 150.331.648	9%
Acumulado Actual	$ 10.104.596.685	$ 4.560.658.974	45%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

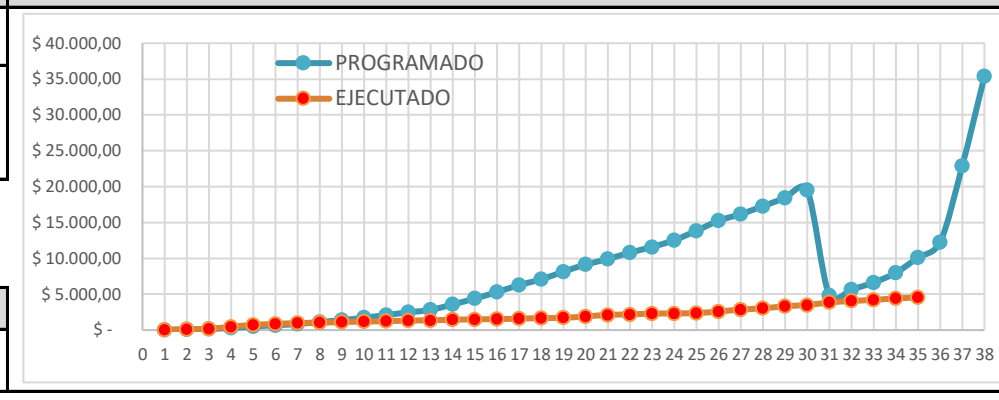


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 5.543.937.711

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

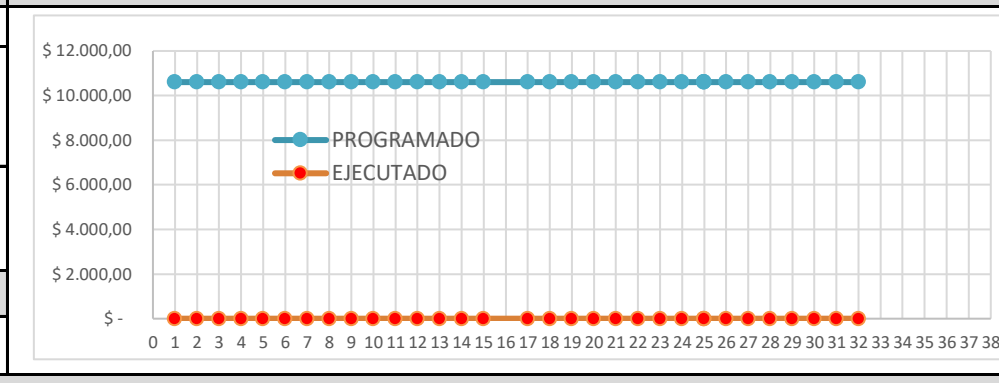

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-15,68%

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Se realizó el comité de seguimiento al contrato de obra ICCU-138-2025 el día 10 de diciembre del 2025. La interventoría expreso su preocupación por la no entrega de los productos topográficos de los municipios de Medina y Paratebueno, y conminó al contratista a realizar esta entrega para el 11 y 12 de diciembre del 2025. Se solicitó al contratista la remisión de la segunda alternativa para la intervención de las cunetas, teniendo en cuenta el anclaje de la geomembrana al talud, y una segunda opción con mantos cementicos. La interventoría tomo nota sobre la manifestación del contratistas de probables retrasos por presencia de rocas y sobtretamaños sobre la rasante existente el municipio de Junín.

Se realizó la reunión dentro del comité, de los especialistas de pavimento de la Interventoría y contratista de obra con el fin de aclarar los requerimientos pendientes por subsanar de los informes de caracterización geotécnica. El contratista se acordó a ajustar el termino de estabilidad de la intervención a dos años dentro de los informes; aclaración y alcance al documento para el recubrimiento superficial con sello de arena-asfalto; aclaración de la recomendación de los subdrenajes y filtros; corrección del origen del material de afirmado para las secciones sin aporte del material remanente. Adicionalmente, el contratista debe remitir memorando técnico para la justificación de los resultados de RCI en condiciones sumergidas y explicación de la especificación de puntos exactos de obras de subdrenaje y filtros francés.

Mediante oficio 766-477 con asunto RESPUESTA A REMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-479. Del 9 de diciembre del 2025, Se realizo solicitud formal de actualización de certificados de los equipos utilizados en cada uno de los frentes de obra.

Mediante oficio 766-478 con asunto Solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría ICCU-219-2025, en concordancia con la ampliación del plazo del contrato de obra ICCU-138-2025 Oficio 766-458, del 9 de diciembre del 2025, la interventoría envió una serie de fundamentos para ser tenidos en cuenta por el contratista en cuento a la solicitud de prórroga a fin de que se de aprobación.

Mediante oficio 766-479 Aprobación informe No. 1 y No. 3 del buen manejo de anticipo de obra contrato ICCU-138-2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-398 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-466 del 9 de diciembre la interventoría dio aprobación del informe de buen manejo del anticipo correspondiente a los meses de julio y septiembre.

Mediante oficio Respuesta al comunicado FOR-CO-03-ICCU031-463 – Revisión y ajuste del Plan de Inversión del Anticipo – Versión 3, del 9 de diciembre 2025, la interventoría no aprueba la versión 3 del plan de manejo al anticipo hasta no cumplir con la constancia técnica y financiera.

Mediante oficio 766-481 RESPUESTA A RADICACIÓN CERTIFICACIONES DE CALIBRACIÓN – NIVELES SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-483 del día 9 de diciembre del 2025, se realizó solicitud por parte de interventoría para la actualización de los certificados de calibración de los niveles de todos los frentes de obra.

Mediante oficio 766-482 con asunto atención inmediata a observaciones generales de diseños (ICCU-I-2025-0016450) y Subsanación de Requerimientos en Informes de Caracterización Geotécnica del 9 de diciembre del 2025, se solicita por parte de interventoría una radicación de los diseños con todos los ajustes solicitados.

Mediante oficio 766-483 con asunto REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 34 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025 del 9 de diciembre del 2025, la interventoría realizo la presentación del informe semanal al ICCU.

Mediante oficio 766-485 con asunto observaciones informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-470 Respuesta al Oficio 766-407 Observaciones informe mensual No 7, la interventoría solicitud segundas observaciones al informe del mes de octubre.

Mediante oficio 766-487 con asunto Alcance oficios 766-310; 766-415; 766-418; 766-431; 766-446; 766-437 Presupuestos definitivos-Requerimientos ICCU-I-2025-001953-Observaciones a oficios de notificación de viabilidad de presupuestos de los municipios de Junín, Choachí, Gama, Ubalá, y Sibaté.

Mediante oficio 766-491 con asunto Respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-459, observaciones acta de cobro N°1, se realiza envió de observaciones de las hojas de cantidades presentadas por el contratista de las obras que se llevan a la fecha.

Mediante oficio 766-492 con asunto Aprobación de Informe mensual N° 6-septiembre 2025 y Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-455- Atención a observaciones Informe mensual Ambiental N°6 septiembre 2025 Provincia Guavio- oficio 766-417, se da aprobación por parte de interventoría del informe mensual N°6 del contrato de obra.

Mediante oficio 766-493 con asunto LLAMADO DE ATENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PMT EN LOS TRAMOS DE INTERVENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL LOTE 1., se realiza solicitud de atención a las observaciones realizadas en cada uno de los tramos que se encuentran en intervención.

Mediante oficio 766-494 con asunto Revisión SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-465- Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2792-CM467-2025, se realizo solicitud de atención al numeral 6.

Mediante oficio 766-495 con asunto Revisión y aprobación Modificación Plan de Inversión Anticipo V3-RTA comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-488 Respuesta al Oficio 766-480 Revisión y ajuste del Plan de Inversión del Anticipo V3 del 12 de diciembre del 2025, se da aprobación por parte de la interventoría de el plan de inversión versión 3.

Mediante oficio 766-496 con asunto Notificación de aprobación de la Versión 3 del Ajuste del Plan de Inversión del Anticipo de Obra CTO-138-2025– Validación técnica y financiera de la Interventoría, del 12 de diciembre del 2025 se realizo envió de la documentación a la supervisión ICCU.

PROVINCIA GUAVIO

Mediante oficio 766-484 con asunto Respuesta oficio ICCU-I-2025-0016566-Observaciones al comunicado 766-356 Notificación Aprobación informe de caracterización V4 municipio de Junín-Respuesta oficio SOFANFOR-CO-03 ICCU031-362; ICCU-I-2025-0017417; ICCU-I-2025-0018047 y ICCU-I-2025-0018049 del 10 de diciembre del 2025, la interventoría dio aprobación del informe de caracterización del municipio de Junín al contratista de obra.

Mediante oficio 766-489 con asunto Revisión observación Patología de falla estructural en el corredor Sueva – San Francisco-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-471 del 11 de diciembre del 2025, la interventoría realizo observaciones en relación a los trabajos realizados de mejoramiento de restante en el municipio de Junín.

Mediante oficio 766-490 Con asunto Respuesta a oficio FOR-CO-03-478 remisión de resultados de laboratorio municipio de Junín tramo Sueva - Junín DENSIDADES, Se realizo solicitud de aclaración de entrega de resultados de densidades entregadas por el contratista ya que no considera con los PRs intervenidos.

Mediante oficio 766-497 con asunto Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-474 Concepto actas de vecindad séptima entrega. - municipio de Gama. Se realizo entrega de actas de vecindad a la supervisión relacionada con las alcantarillas a realizar en el municipio de gama.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**

PROVINCIA ORIENTE

Para esta semana comprendida del sábado 06 al viernes 12 de diciembre se continúa la estabilización del afirmado de la vía correspondiente al tercer tramo de Choachí desde la abscisa K4+860 hasta la abscisa K4+970 y desde la abscisa K5+050 hasta la abscisa K5+250 para un total de 310,00m.

PROVINCIA MEDINA

Mediante oficio 766-498 con asunto APROBACIÓN Y RESPUESTA A TOPOGRAFÍA Y CAPAS GEOGRÁFICAS PARATEBUENO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-495 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-496 MEDINA del 12 de diciembre de 2025, se da aprobación a la fase 1 del municipio de Paratebueno.

PROVINCIA SOACHA

Para esta semana comprendida del sábado 06 al viernes 12 de diciembre se inicia la estabilización del afirmado de la vía correspondiente al tramo de Sibaté desde la abscisa K4+100 hasta la abscisa K4+550 para un total de 450,00m intervenidos.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 6 al 12 de diciembre del 2025

1.El día 12 de diciembre del 2025, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2.Se asiste a comité integral el día 10 de diciembre del 2025. Allí se describe la gestión ambiental y ejecución de los PAGA de la provincias de Guavio y Oriente.
3.El día 9 de diciembre del 2025, el contratista remite el informe semanal vía correo electrónico.
4.Durante la semana se realiza acompañamiento a la supervisión en las diferentes actividades constructivas.
5.Durante la semana, se realizó verificación del cumplimiento del PAGA de las provincias del Guavio y Oriente donde se realizan las siguientes actividades:
•Verificación de delimitación y señalización.
•Inspección de campamento.
•Supervisión y acompañamiento en obra.
•Inspección baterías sanitarias campamento.
•Capacitación ambiental.
•Alistamiento de bolsas de cemento para la recolección y disposición final.
•Alistamiento para inicio de actividades provincia de Sibaté. Inicio de actividades.
6.Durante la semana, se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra habilitados, como lo es en el municipio de Junín, Choachí y Sibaté.
7.Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en los frentes habilitados.
8.Se realizan las siguientes capacitaciones en los frentes de obra habilitados:
•Capacitación Manejo Integral de Residuos Sólidos – MUNICIPIO DE CHOACHÍ 10 de diciembre del 2025.
•Capacitación Manejo de Campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio. MUNICIPIO DE JUNÍN. 11 de diciembre del 2025.

9.Comunicados de la semana:
Comunicados remitidos por Interventoría:
•Mesa de trabajo No. 6. Acta N° 6 ICCU-0138-2025 LOTE 1 (09 dic 2025).
• 766-492, Aprobación de Informe mensual N° 6-septiembre 2025 y Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-455- Atención a observaciones Informe mensual Ambiental N°6 septiembre 2025 Provincia Guavio- oficio 766-417. 11 de Diciembre del 2025.

Comunicados remitidos por el contratista:
•SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-484, Radicación Informe Técnico Mensual No. 8 – noviembre de 2025. 6 de diciembre.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Provincia del Guavio

El 6 de diciembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-439 como respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-444-Aclaración y solicitud de definición técnica definitiva – Tramo en intervención Municipio de Ubalá y alcance mediante oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-481 según lo señalado por la Supervisión del ICCU en el oficio ICCU-I-2025-0019076.

El 6 de diciembre, el Contratista realizó la instalación provisional de la valla informativa de Gama, en el tramo de obra, con un día de atraso teniendo en cuenta que el compromiso estaba estipulado para el 5 de diciembre, justificando lo anterior, en el tiempo de fraguado que requiere la base de la estructura para la instalación de la valla.

El 9 de diciembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el volante No. 21, a través del cuál se invita a la alcaldía, secretaría de planeación y presidentes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Ubalá a la reunión extraordinaria No. 3.

El 9 de diciembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta de la reunión de inicio No. 2 realizada en el municipio de Junín a la administración municipal y a los asistentes que brindaron sus datos y solicitó que se copie a la interventoría en los correos que se envían a la comunidad.

El 9 de diciembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta de la reunión de inicio No. 3 realizada en el municipio de Gama a la administración municipal y a los asistentes que brindaron sus datos y solicitó que se copie a la interventoría en los correos que se envían a la comunidad.

El 10 de diciembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-489 mediante el cual dieron respuesta al comunicado 766-439, frente a la definición técnica del corredor vial del municipio de Ubalá.

El 10 de diciembre, se remitieron al Contratista a través de correo electrónico las observaciones realizadas al volante No. 21. Invitación a la reunión extraordinaria No. 3. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la pieza ajustada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el volante mencionado con Visto Bueno para revisión de la Entidad.

El 11 de diciembre, la Entidad indicó a través de correo electrónico que no tenía observaciones frente al volante No. 21. Invitación a la reunión extraordinaria No. 3. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió al contratista la pieza en mención con aval para su distribución teniendo en cuenta que la Entidad no refirió observaciones, quedando atentos a los soportes de distribución.

El 11 de diciembre, desde la Interventoría a través de correo electrónico se remitieron las observaciones de las actas de la reunión de inicio No. 5. Municipio de Ubalá, realizada en dos momentos: el 12 de noviembre y el 19 de noviembre. En ese sentido, y teniendo en cuenta que, fue una misma reunión con dos fechas diferentes se solicita hacer una sola acta con las 2 fechas.

El 11 de diciembre, a través del grupo de WhatsApp de Gama el señor Felipe Acosta solicita información de los canales de atención a través de los cuales puede radicar una comunicación, por lo tanto, el Contratista le indica que las puede remitir mediante correo electrónico: social138@sofaningenieria.com o a WhatsApp al número 3202451798, por lo que, tanto el Contratista como la Interventoría quedan atentos a la radicación de la solicitud ciudadana.

El 11 de diciembre, el Contratista realizó la recolección del recibo público del predio del acta GJA-04 (municipio de Junín) como evidencia de que quien autoriza el descole/encole en el predio es el propietario.

El 11 de diciembre, se realizó la instalación definitiva de la valla del municipio de Gama, en cumplimiento a lo estipulado en la minuta del Contrato.

El 12 de diciembre, desde la Interventoría se radicó el comunicado 766-497-ICCU como respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-474 con el concepto de las actas de vecindad séptima entrega. - municipio de Gama.

El 12 de diciembre, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU de la provincia del Guavio ubicado en el municipio de Gachetá, en el horario aprobado de 8:00 am a 5:00 pm.

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**

Provincia de Oriente
El 6 de diciembre, el Contratista radicó el acta de socialización de traslado de longitud de tramos en la vereda La Caja – Choachí, a través del comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-485, para revisión de la Interventoría.
El 10 de diciembre, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU de la provincia de Oriente ubicado en el municipio de Choachí, en el horario aprobado de 8:00 am a 5:00 pm.
El 12 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta del comité de participación No 1 – municipio de Choachí, con observaciones para atención del Contratista.
Provincia de Medina
No se reportaron actividades en los municipio de Paratebueno y Medina
Provincia de Soacha
El 9 de diciembre, la Interventoría remitió acuso enterado del envío del diseño de la valla del municipio de Sibaté por parte de la Entidad. asimismo, recordó que, de acuerdo con lo conversado en el comité de seguimiento No. 29 realizado el 3 de diciembre, la Interventoría queda atenta a la instalación de la misma al 12 de diciembre, con el fin de realizar la verificación en campo.
El 9 de diciembre, el Contratista remitió mediante el grupo de WhatsApp del municipio de Sibaté el volante No. 20, invitando a los integrantes a participar en el comité de participación No. 3, el cual se llevará acabo el 22 de diciembre de manera virtual.
El 10 de diciembre, se realizó la segunda visita de verificación del Punto SAU del municipio de Sibaté, a esta asistieron los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría. Allí se diligenció el formato de verificación y se realizó el levantamiento del registro fotográfico correspondiente. En la misma fecha, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-491como respuesta al comunicado 766-472-ICCU – Alcance al comunicado 766-459-ICCU. Apremio por incumplimiento en la instalación del Punto SAU – Provincia de Soacha, Municipio de Sibaté.
El 12 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el visto bueno del acta de la reunión de inicio No. 4. Municipio de Sibaté con el aval para realizar el envío de la copia a los asistentes.
Generales - componente social.
El 9 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el requerimiento urgente del informe semanal No. 24 al Contratista, teniendo en cuenta que, este es un insumo principal para estructurar el informe semanal de la Interventoría el cual debe ser radicado a la Entidad en la misma fecha (9 de diciembre). A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió mediante correo electrónico el informe semanal No. 24 mediante el cual reportó las actividades realizadas entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre; este fue enviado fuera de la hora establecida por la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió un correo electrónico indicando que prioriza actividades contractuales sobre el informe semanal.
El 9 de diciembre, desde la Interventoría se remitió el acta de la mesa de trabajo No. 33, realizada el 24 de noviembre, para conocimiento y fines pertinentes del Contratista.
El 9 de diciembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el Visto Bueno del informe semanal No. 23.
El 10 de diciembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-492 como respuesta a oficio 766-459-ICCU respecto al llamado de atención por el incumplimiento al Plan de Gestión Social y a los compromisos sociales, así mismo, en el mismo oficio se remitió el cronograma para revisión de la Interventoría.
El 10 de diciembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 34 a la Supervisión Social del ICCU y a los profesionales sociales del Contratista para su revisión y firma.
El 10 de diciembre, se realizó el comité de seguimiento semanal No. 30 en el cual participaron la supervisión social del ICCU y los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.
El 11 de diciembre, desde la Interventoría se radicó el Comunicado 766-492 con la aprobación del informe mensual N° 6-septiembre 2025 como respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-455- Atención a observaciones Informe mensual Ambiental No. 6 septiembre 2025 Provincia Guavio- oficio 766-417.
El 12 de diciembre, se realizó la mesa de trabajo No. 36, para realizar seguimiento a las actividades realizadas y programadas para el componente social, en esta participaron los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 1.Comités: Interno el día 11 de diciembre 2025, con la participación de todos los componentes de la interventoría, Consorcio Sofán y ICCU. Actividades desarrolladas en los municipios de: Choachí, Sibaté y Junín-Gama: Punto de Choachí: Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra. Supervisión y acompañamiento en obra. Inspección de maquinaria. Instalación de PMT. Jornada de orden y aseo. Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos. Inspección de Kit de emergencia. Se brinda charla de 5 minutos. Charlas de seguridad en el punto de Choachí: 09/12/2025: Pausas Activas. 10/12/2025: Calentamiento Global. 11/12/2025: Riesgos y Peligros. 12/12/2025: Material Particulado. 13/12/2025: Tropezones, resbalones. 1.Gestión y apoyo administrativo de punto Choachí: Recepción de carpetas personal del punto en mención. Inducción de personal de ingreso. Informe semanal. Implementación formatos SST y Ambiental. Punto de Sueva- Junín-Gama: Verificación e instalación de señalización en sitio de obra. Supervisión y acompañamiento en obra. Verificación de puntos ecológicos y kit de emergencia en obra. Inspección con interventoría en campo.	Aseguramiento documental en campo (ATS- Preoperacionales- Charlas-Inspecciones). Se brinda charla de 5 minutos. Cargue y descargue de material. Charlas de seguridad en el punto de Sueva- Junín-Gama: 09/12/2025: ¿Qué son las enfermedades osteomusculares? 10/12/2025: Estrés laboral – Riesgo Psicosocial. 11/12/2025: Inspección preoperacional de vehículos y herramientas importancia. 12/12/2025: Riesgo mecánico (Atrapamiento). 13/12/2025: Riesgo biológico. 1.Gestión y apoyo administrativo de punto Junín-Gama: Ejecución de informe semanal (escáner, impresiones, etc.) Implementación formatos SST y ambiental. Punto de Sibaté: Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra. Supervisión y acompañamiento en obra. Inspección de maquinaria. Instalación de PMT. Jornada de orden y aseo. Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos. Inspección de Kit de emergencia. Se brinda charla de 5 minutos. Charlas de seguridad en el punto de Sibaté: 09/12/2025: Pausas Activas. 10/12/2025: Calentamiento Global. 11/12/2025: Riesgos y Peligros. 12/12/2025: Material Particulado 13/12/2025: Tropezones, resbalones. 2.Gestión y apoyo administrativo de punto Sibaté: Recepción de carpetas de personal. Inducción de personal de ingreso. Informe semanal. Implementación formatos SST y Ambiental.

ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023	
PERIODO DE INFORME SEMANAL										
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**	

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

La interventoría se encuentra a la espera de la remisión de los certificados de calibración de los equipos topográficos solicitados mediante oficio 766-455 SOLICITUD CERTIFICADOS CALIBRACIÓN EQUIPOS GUAVIO Y ORIENTE, y reiterados en el pasado comité de seguimiento del 03 de diciembre del 2025. Se realizó nuevamente la reiteración de la entrega del certificado de los niveles utilizados en Junín y Sibaté, mediante el oficio *766-477 respuesta a SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-479 Remisión de certificados de calibración de equipos topográficos*

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó la solicitud de prorroga para el contrato de Interventoría ICCU-210 del 2025 una vez se realizó la revisión y aprobación de la solicitud de ampliación del contrato de obra ICCU-138 del 2025 hasta el 31 de agosto del 2026, mediante el comunicado *766-478 Solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría ICCU-219-2025 en concordancia con la ampliación del plazo del contrato de obra ICCU-138-2025 (1)* . Se emitió la aprobación de los informes de buen manejo del anticipo de obra a través del oficio *766-479 Aprobación informe No. 1 y No. 3 del buen manejo de anticipo de obra contrato ICCU-138-2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-398 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-46* . Por otro lado, se reitero nuevamente al contratista la necesidad de subsanar los informes de caracterización según ICCU, esto con el comunicado *766-482 Reiteración de ajustes y correcciones a los estudios y diseños aprobados – Según ICCU-I-2025-0016450*

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -15,68%, ya que de acuerdo con la nueva programación aprobada el avance programado era del 28,58% y solo se ha ejecutado el 12,90%. Se reitera que el retraso en el cronograma de actividades según la redistribución recientemente viabilizada por la interventoría, es atribuible al contratista toda vez que este es el responsable de garantizar la disponibilidad del kit de maquinaria en optimas condiciones y planificar adecuadamente el plan de trabajo para garantizar los 250 ml de intervención diaria por municipio. Actualmente, se ejecutan actividades de obra en los municipios de Choachí, Junín, Gama y Sibaté. Se encuentra en revisión la respuesta del contratista para la evaluación técnica de las alcantarillas por ejecutar en el municipio de Ubalá

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó la aprobación del ajuste del plan de inversión del anticipo solicitado por el contratista de obra, de acuerdo con los rubros que se realmente se han afectado en los 6 giros tramitados hasta la fecha, esto con el fin de garantizar la trazabilidad y correspondencia entre los consumos reales, los giros legalizados y las actividades desarrolladas en campo, mediante el comunicado *766-480 Respuesta al comunicado FOR-CO-03-ICCU031-463 – Revisión y ajuste del Plan de Inversión del Anticipo – Versión 3.* Actualmente se encuentra observado el acta de cobro del mes de octubre de la fase de intervención mediante el oficio 766-491 Respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-459, observaciones acta de cobro N°1

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Así las cosas, a corte del 12 de diciembre del 2025, esta interventoría ha tramitado y aprobado la solicitud de pago del 75% de fase de caracterización, resultando en un acumulado de $ 2.084.166.072,00. Por otro lado, en relación, al desembolso del anticipo de obra, se ha tramitado y viabilizado por parte de la Interventoría hasta la solicitud N° 6 de este, presentándose a la fecha un valor acumulado aprobado de $6.067.082.281,0

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se encuentra bajo observación el tramo con fisuración temprana tipo Piel de Cocodrilo en el municipio de Junín.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista realizó visitas a los municipios de Junín y Choachí con el fin de solicitar suministro de agua en bloque para utilizar en los frentes de obra de los municipios mencionados anteriormente. Adicionalmente, el día 26 de septiembre se realizo mesa de trabajo para revisión del cálculo de la sensibilidad ambiental y nivel de complejidad del

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

El subcontratista no presenta las planillas de seguridad social a tiempo.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante la semana se evidenciaron varias situaciones problemáticas, entre ellas el incumplimiento reiterado del Contratista a los compromisos del Plan de Gestión Social, como el envío tardío de piezas comunicacionales, la socialización extemporánea del inicio de actividades técnicas —que en uno de los municipios se realizó el mismo día de inicio y no con los 5 días hábiles requeridos—, la falta de organización adecuada de soportes y registros fotográficos, así como la entrega incompleta o tardía de insumos (presentaciones, actas y volantes). También se identificó la no adecuación del Punto SAU en Sibaté. Por lo que se concluye que, estas situaciones se originan principalmente en fallas en la planificación y gestión interna del Contratista, débil control sobre los tiempos de producción y envío de insumos y recursos insuficientes para la ejecución de actividades sociales

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ajuste de informes de caracterización viabilizados Choachí, Junín, Gama, Sibaté, Ubalá	Consorcio Sofán C-031	12/12/2025
Subsanación informes de topografía de la provincia Medina	Consorcio Sofán C-031	12--12-25
Entrega de certificados de calibración de equipos topográficos del municipio de Junín	Consorcio Sofán C-031	Inmediato
Evaluación segunda alternativa de intervención de cunetas según recomendaciones Fabricante PAVCO	Consorcio Sofán C-031	12/12/2025
Ensayos de control municipio de Choachí	Consorcio Sofán C-031	Pendiente

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se detuvieron actividades por parte del contratista de obra en relación a las intervenciones de la rasante de la vía en el tramo, el ultimo sector trabajado fue el tramo del K3+580 AL K4+050 del municipio de Junín en la provincia del Guavio, y se realizo continuación al tramo 5 de intervención iniciando en el PR 4+400 y hasta la fecha se lleva un avance de 200 ml; y se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K4+869 a la K4+979 y el K5+050 a la K5+250 en el municipio de Choachí en la provincia de Oriente y se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K4+100 a la K4+550 en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha.

A corte del 12 de diciembre de 2025, se reporta un atraso del -15,68% en el avance físico y financiero del contrato ICCU-138-2025, debido al incumplimiento de entregables de las Fases I y II y problemas en la disponibilidad y funcionamiento del kit de maquinaria.

Durante el comité de seguimiento del 10 de diciembre de 2025, la Interventoría reiteró requerimientos técnicos críticos pendientes por parte del contratista, especialmente la entrega de productos topográficos, certificados de calibración y la subsanación integral de los informes de caracterización geotécnica, estableciendo compromisos y plazos concretos. Se avanzó en la clarificación técnica de las alternativas de intervención y en el ajuste de los estudios, así como en la aprobación del ajuste del plan de inversión del anticipo y de los informes de buen manejo del mismo, garantizando la trazabilidad financiera del contrato. No obstante, persisten observaciones técnicas y administrativas que condicionan la continuidad fluida del proyecto, por lo cual la Interventoría mantiene seguimiento estricto hasta el cumplimiento total de los requerimientos establecidos.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE GEOPOSICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:


- TERMINADOS LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN LOS APIQUES

9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:


SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN EN EL TRAMO: SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN

SUPERVISIÓN DE PMT



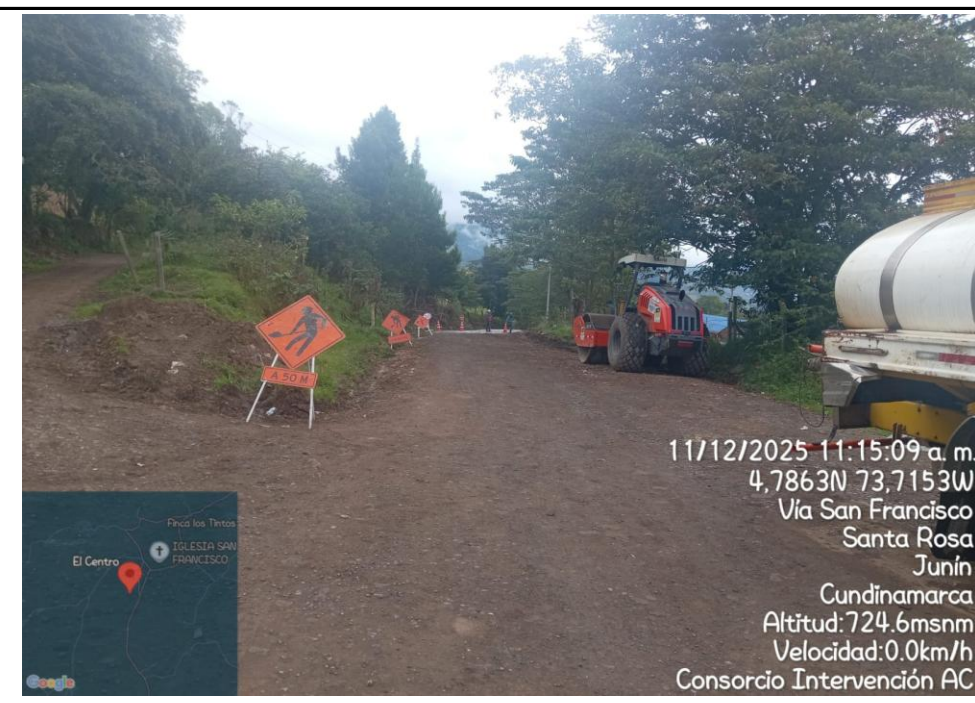

SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

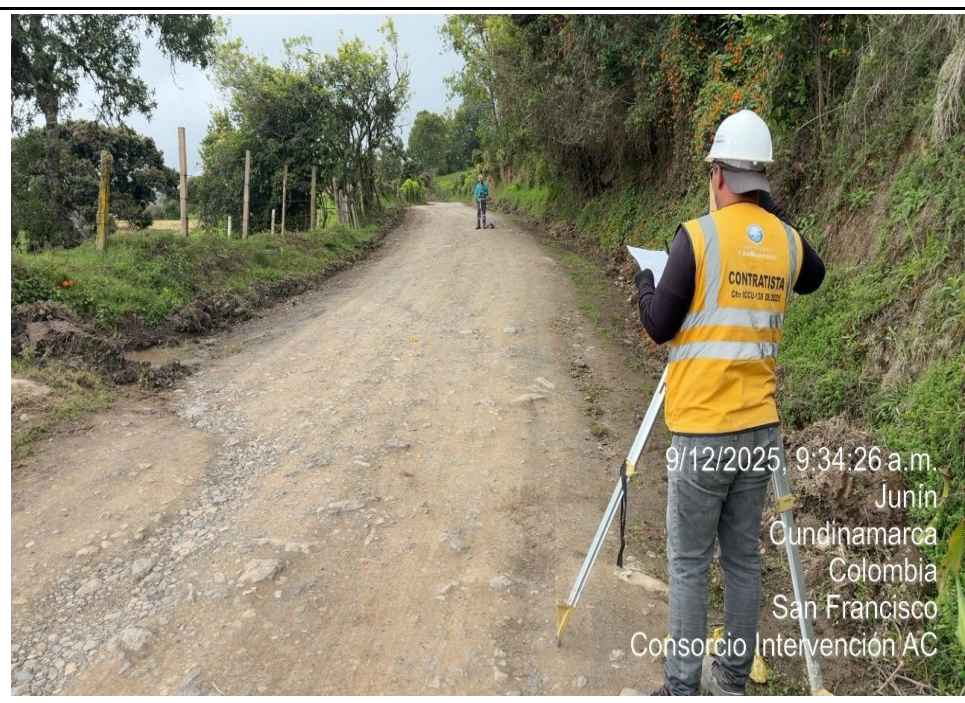



ESCARIFICADO Y RETIRO DE ROCAS CON RETROCARGADOR





EXTENDIDO DE CEMENTO Y HOMOGENIZACIÓN CON FAE





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	13-dic-25	SEMANA No.	35	DEL	6-dic-25	AL	12-dic-25





TOMA DE HUMEDADES Y RECOMPACTACIÓN DE LA VÍA







DOSIFICACIÓN DE ADITIVO Y ACOPIO DE BOLSAS DE CEMENTO





CEREO Y COMPACTACIÓN





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GAMA TRAMO: CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLA Y ACOPIO PROVISIONAL DE MATERIAL EXCAVADO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**





VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE EXCAVACIÓN





PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO

SUPERVISIÓN DE PMT





SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA





ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**





LIMPIEZA DE CUNETAS Y EXTENDIDO DE CEMENTO





ESCARIFICADO Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS






RECICLADO DE AFIRMADO CON CEMENTO Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS





ACANALADO Y DOSIFICACIÓN DE ADITIVO CON AGUA





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**





RIEGO DE ADITIVO





MEZCLADO CON RECICLADORA DE AFIRMADO, CEMENTO Y ADITIVO Y VERIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD DE INTERVENCIÓN





CEREO





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**

COMPACTACIÓN





RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO





PROVINCIA DE SOACHA:


SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ TRAMO: VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN


ACOPIO DE CEMENTO Y ADITIVO





SUPERVISIÓN DE PMT



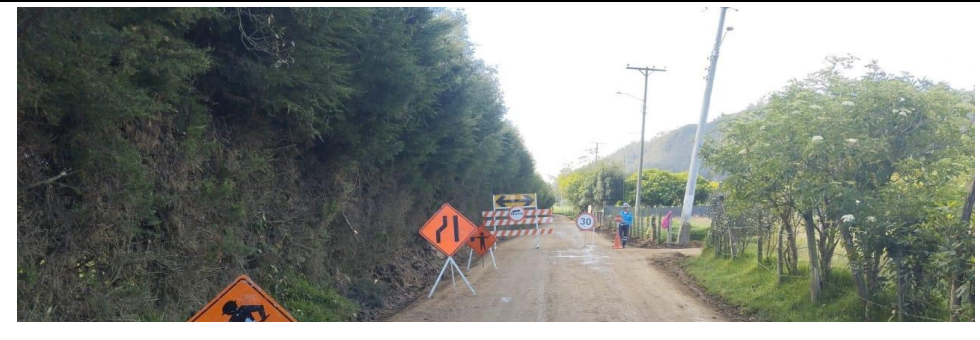

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**





SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA





LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL






EXTENDIDO DE CEMENTO





RECICLADO DE AFIRMADO CON CEMENTO





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**





TOMA DE HUMEDADES DESPUÉS DE RECICLADO Y VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN





RIEGO DE ADITIVO PROES CON AGUA Y HOMOGENIZACIÓN CON RECICLADORA





CEREO, COMPACTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO










COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 30. 10 DE DICIEMBRE

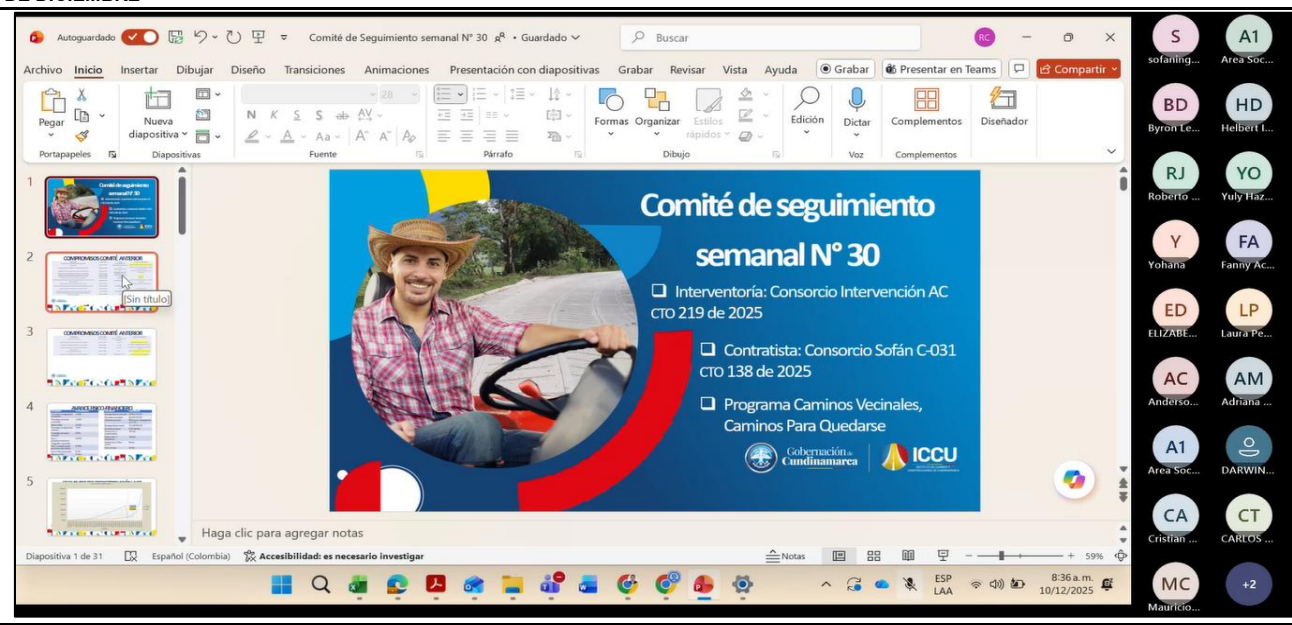

INSPECCIÓN PUNTOS SAU - PROVINCIA DE SOACHA - MUNICIPIO DE SIBATÉ




ATENCIÓN PUNTOS SAU PROVINCIAS DEL GUAVIO Y ORIENTE





INSTALACIÓN PROVICIONAL Y DEFINITIVA - VALLA MUNICIPIO DE GAMA




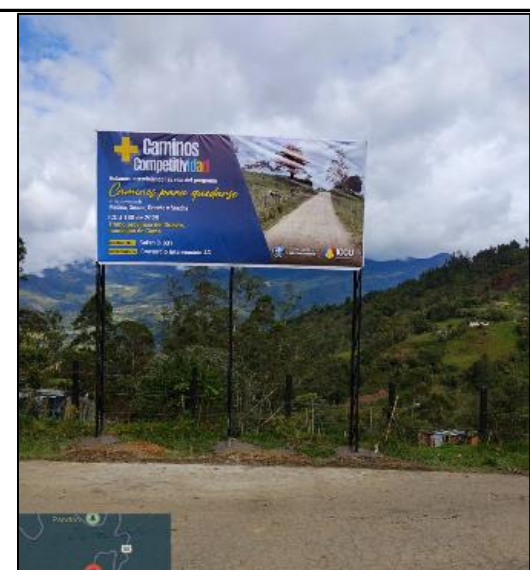


PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-dic-25**	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**6-dic-25**	AL	**12-dic-25**





MESA DE TRABAJO No. 36 - 12 DE DICIEMBRE

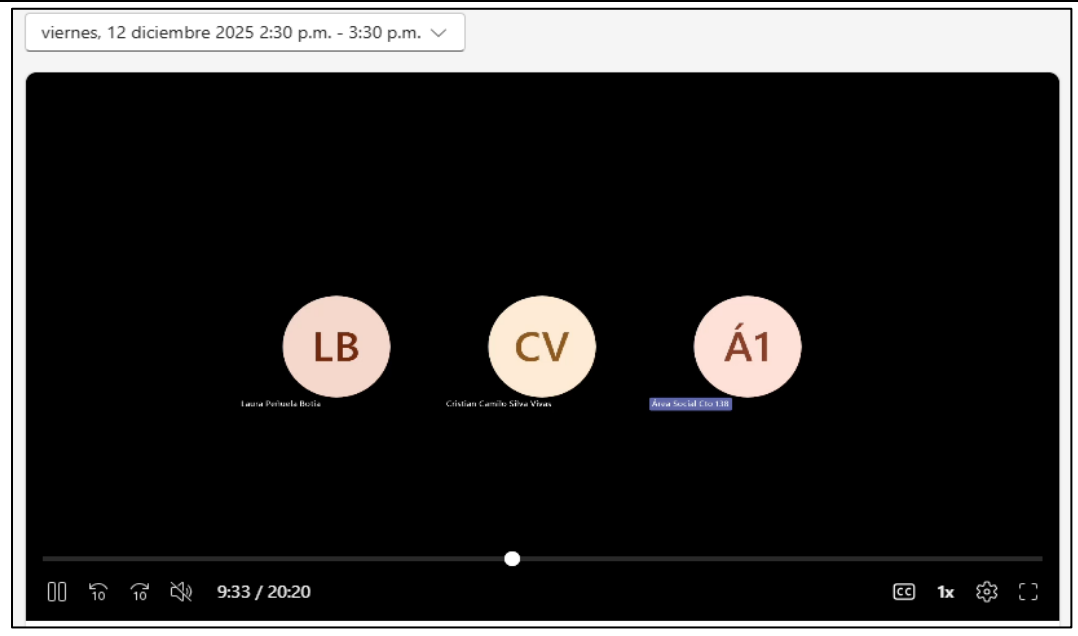

Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.12.15 21:32:04 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio
