ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/08/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	510
PLAZO TRANSCURRIDO:	276 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	276 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- SE FINALIZÓ LA ENTREGA DE LOS PORDUCTOS DE LA FASE EL 12-12-25

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO - ENGAÑO)

SUBSANACIÓN DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA POR CONTRATISTA

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

FINALIZADO- PENDIENTE APROBACIÓN ENTIDAD

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- VISITA DE REINICIO Viernes, 16/01/2026

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA
- LIMPIEZA DE CUNETAS

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)

- EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE SOLADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLAS

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA POR DAÑO DE MOTONIVELADORA
- LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN LA ENTRADA A ALCANTARILLAS
- TOMA DE DENSIDADES EN CAPA DE AFIRMADO ESTABILIZADA POR PARTE DE INTERVENTORÍA

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATÉ (VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN)

- FINALIZACIÓN INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA
- LIMPIEZA DE CUNETAS

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	12-dic-25	247	0	-157
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	10-ene-26	276	7	-143
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-ago-26	419	1-sep-25	10-ene-26	132	-54	233

Plazo del proyecto: 509 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	16,27%	15,11%	-1,16%
Durante el periodo	1,40%	0,29%	-1,10%
Acumulado Actual	17,67%	15,41%	-2,26%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DIAS)	DIAS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
510	276,00	234	-11,52

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

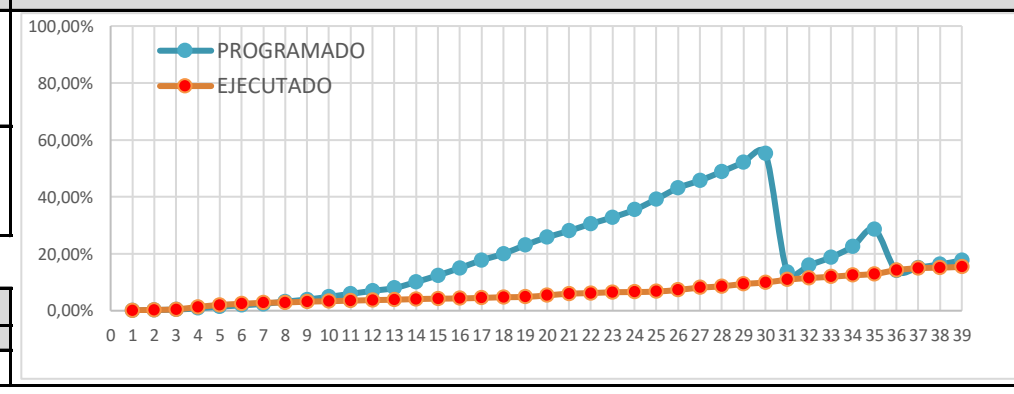

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	10-ene-26	SEMANA No.	39	DEL	3-ene-26	AL	9-ene-26

	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 5.751.278.603	$ 5.342.362.459	93%
Durante el periodo	$ 493.943.588	$ 104.098.298	21%
Acumulado Actual	$ 6.245.222.191	$ 5.446.460.757	87%

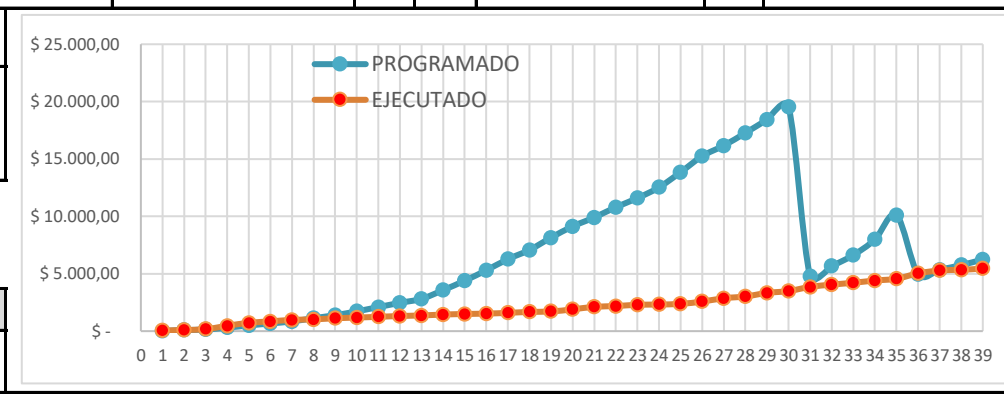

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	798.761.434


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ 301.208.595	2,84%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ 301.208.595	2,84%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-2,26%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Mediante oficio 766-556 con asunto Entrega del Informe mensual N° 8 de Interventoría-Ajustado-octubre de 2025 Contrato ICCU-219-2025 del 8 de enero del 2025, la interventoría realizo entrega del informe del mes de octubre teniendo en cuenta que la versión anterior no correspondía al documento completo.

mediante oficio 766-554 con asunto Observaciones versión N°2 del informe mensual correspondiente al mes de noviembre del 2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-523- Radicación Informe Técnico Mensual No. 8 – noviembre de 2025 versión 2 del 7 de diciembre del 2025, la interventoría envía al contratista nuevas observaciones con respecto al informe mensual de noviembre ya que no todas las solicitudes fueron subsanadas.

Mediante oficio 766-552 con asunto REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 38 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025 del 6 de enero del 2025, la interventoría remite informe semanal 38 para revisión por parte de la supervisión.

Mediante el oficio 766-551 con asunto Aprobación informe No.4 del buen manejo de anticipo de obra contrato ICCU-138-2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-480-Radicación Informe de Seguimiento del Anticipo No. 4 – octubre de 2025 del 5 de enero del 2025 la interventoría realizo revisión del informe de anticipo dando concepto valido a la in formación presentada.

Se realizó comité de seguimiento N° 34 el día 07 de enero del 2026, en el cual se revisó el estado de compromisos adquiridos en el comité anterior, y se evidenció la no entrega de los informes de caracterización subsanados de los municipios de Chipaque, Quetame, Fosca y municipios de la Provincia Medina. Ante el llamado de intención y necesidad de cierre de la Fase II el contratista se compromete a realizar la entrega el 09-01-2026. En cuanto al avance físico, se debe cumplir la ejecución simultanea de actividades de la fase III en cinco municipios, por lo tanto, se encuentra pendiente el inicio de actividades de un municipio para dar cumplimiento al anexo técnico. Se espera se inicien las actividades de obra en el municipio de Fomeque a mas tardar el 19-01-2026.

Por otro lado, se requiere se remitan los presupuestos de intervención ajustados a los requerimientos ICCU, para las provincias de Medina y Soacha, para el tramite administrativo ante la entidad.

PROVINCIA GUAVIO

Mediante oficio 766-557 Condición actual punto de control topográfico GPS 7 clemente tramo Gama-Provincia del Guavio del 9 de enero del 2025, la interventoría realizo solicitud de instalación de GPS que fue removido en el municipio de Gama para que se realice la respectiva reinstalación.

PROVINCIA ORIENTE

Para esta semana comprendida del sábado 03 al viernes 09 de enero se suspende la actividad de estabilización del afirmado de la vía correspondiente al tercer tramo de Choachí en la Vereda Chatasuga por daño presentado en la motoniveladora.

PROVINCIA MEDINA

Para esta semana comprendida del sábado 03 al viernes 09 de enero no se presentaron oficios ni de carácter administrativo ni de carácter técnico en esta provincia

PROVINCIA SOACHA

Mediante oficio 766-553 se aprueba la maquinaria del frente de Sibaté RTA FOR-CO-03-528-Respuesta a oficio 766-466-Maquinaria Sibaté luego del proceso de revisión realizado.

Para esta semana comprendida del sábado 03 al viernes 09 de enero se termina la estabilización del afirmado de la vía correspondiente al tramo de Sibaté desde la abscisa K7+130 hasta la abscisa K7+330 para un total de 200,00m intervenidos.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL

DEL 3 de enero del 2026 al 9 de enero del 2026.

1.El día 5 de enero del 2026, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2.Se asiste a comité integral el día 7 de enero del 2026. Allí se describe la gestión ambiental y ejecución de los PAGA de la provincias de Guavio, Oriente Y Soacha.
3.Durante el periodo no se remite informe semanal por parte del contratista.
4.Durante la semana se realiza acompañamiento a la supervisión en las diferentes actividades constructivas.
5.Durante la semana, se realizó verificación del cumplimiento del PAGA de las provincias del Guavio, Oriente y Soacha donde se realizan las siguientes actividades:
•Verificación de delimitación y señalización.
•Inspección de campamento.
•Supervisión y acompañamiento en obra.
•Inspección baterías sanitarias campamento.
•Alistamiento de bolsas de cemento para la recolección y disposición final.
6.Durante la semana, en el frente de obra Choachí no se realizaron actividades debido a un fallo en la maquinaria utilizada para la estabilización vial.
7.En el municipio de Sibaté, se realiza actividades de limpieza y recolección de material de excavación, ya que las actividades de obra fueron terminadas en el mes de diciembre del 2025.
8.Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en los frentes habilitados.
9.Se realiza capacitación ambiental en el municipio de Junín sobre Prevención y Control de emergencias el día 9 de enero del 2026.
10.Comunicados de la semana:
a.Comunicados remitidos por Interventoría:
i. 766-554, Observaciones versión N°2 del informe mensual correspondiente al mes de noviembre del 2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-523- Radicación Informe Técnico Mensual No. – noviembre de 2025 versión 2. 7 de Enero del 2026.
b.Comunicados enviados por el contratista:
i. SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-530, Radicación Informe Mensual No. 9 – Diciembre de 2025. 6 de enero del 2026.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Provincia del Guavio

El 5 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el Visto Bueno y aval para envío de la respuesta proyectada para dar atención a la PQRS 001 – municipio de Gama.

El 6 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta del comité de participación No. 2, realizado el 5 de diciembre, a los integrantes del comité de Junín.

El 6 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la proyección de respuesta a la PQRS 002 de la JAC de San Francisco en el municipio de Junín ajustada de acuerdo con lo explicado por el residente técnico de la Interventoría el 5 de enero en la mesa de trabajo No. 39. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remite observaciones a la respuesta ya que se evidenció que no se incluyó el registro fotográfico requerido. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la respuesta ajustada incluyendo el Registro Fotográfico requerido.

El 6 de enero, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Gama que se brindaría atención presencial en el tramo de obra el 9 de enero del 2026 de 8:00 am a 12:00m.

El 6 de enero, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Junín que se brindaría atención presencial en el tramo de obra el 9 de enero del 2026 de 2:00 pm a 4:00 pm.

El 6 de enero, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Ubalá que se brindaría atención presencial en el tramo de obra el 8 de enero del 2026 de 8:00 am a 12:00m.

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la radicación de la carta personalizada No. 37, a través de la cual se solicitaba apoyo a la alcaldía del municipio de Junín para gestionar un acta de vecindad, teniendo en cuenta que la supervisión social emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acuso enterado del envío de la respuesta a la PQRS 001 del señor Felipe Acosta, dando cierre a la misma.

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acuso enterado del envío del acta del comité de participación No. 2 del municipio de Junín a los integrantes del comité.

El 8 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico respuesta a la PQRS 002 del presidente de la JAC de la vereda San Francisco del municipio de Junín, a través de la cual se comparte la evidencia de la intervención de la zona requerida por el peticionario, dando cumplimiento a lo acordado con la comunidad durante el recorrido No. 2 del 10 de octubre.

El 8 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el volante No. 26, mediante el cual se proyectó invitar a la comunidad del municipio de Junín al Comité de Participación No. 5, el cual se realizaría de manera virtual el 23 de enero. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el volante mencionado con Visto Bueno para revisión de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el val para distribución del volante No. 26, a través del cual se invita a la comunidad del municipio de Junín a asistir en el comité de participación No. 5, teniendo en cuenta que la Entidad emitió la aprobación de la pieza a través de comunicación interna (WhatsApp).

El 8 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la presentación elaborada para el comité de participación No. 5 dirigido al municipio de Junín, para revisión de la Interventoría.

El 8 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el Visto Bueno de la respuesta proyectada para dar atención a la PQRS 002 – municipio de Junín, validando que se dio atención a la observación realizada.

El 8 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico respuesta a la PQRS 001 del señor Luis Ignacio Acosta, presidente de la JAC de la vereda San Francisco del municipio de Junín , a través de la cual el Contratista indicó de manera detallada el trámite dado a su requerimiento, las acciones previstas por parte del proyecto y las evidencias de la atención de la petición. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió acuso enterado del envío de la respuesta a la PQRS No. 002, no obstante, solicitó al Contratista dar estricto cumplimiento a lo establecido contractualmente en cuanto a los tiempos de respuesta, ya que esta debió ser remitida el 7 de enero y no el 8.

El 8 de enero, el Contratista realizó un recorrido en el tramo de intervención del municipio de Ubalá con el fin de realizar la revisión de los buzones satelitales y brindar atención en campo, sin que se presentaran novedades.

El 9 de enero, el Contratista realizó un recorrido en el tramo de intervención del municipio de Gama con el fin de realizar la revisión de los buzones satelitales y brindar atención en campo, sin que se presentaran novedades.

El 9 de enero, el Contratista realizó un recorrido en el tramo de intervención del municipio de Junín con el fin de realizar la revisión de los buzones satelitales y brindar atención en campo, sin que se presentaran novedades.

El 9 de enero, el Contratista radicó de manera presencial la carta No. 37, a través de la cual solicita apoyo de la alcaldía municipal de Junín para la gestión de un acta de vecindad necesaria para proceder con la construcción de una alcantarilla.

Provincia de Oriente

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la carta personalizada No. 38, a través de la cual se proyecta invitar a la Alcaldía del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6.

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la carta personalizada No. 39, a través de la cual se proyecta invitar a la Secretaría de Planeación del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista realizó un alcance con el archivo adjunto.

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el volante No. 24 a través del cual se divulgan las vacantes disponibles para personal de Mano de Obra No Calificada en el municipio de Fomeque.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el volante No. 25 (mal numerado en el asunto y cuerpo del correo como No. 18), a través del cual se proyecta invitar a la comunidad del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6.

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 6 del municipio de Fomeque, para revisión de la Interventoría.

El 6 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico dio un alcance al correo del 5 de enero adjuntando el archivo que contiene el volante No. 24 a través del cual se divulgan las vacantes disponibles para personal de Mano de Obra No Calificada en el municipio de Fomeque, para revisión de la Interventoría.

El 6 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 6 del municipio de Fomeque con observaciones para atención del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la presentación mencionada ajustada. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remitió la presentación con visto bueno para revisión de la Entidad.

El 6 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la carta personalizada No. 38, a través de la cual se proyecta invitar a la Alcaldía del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6 con observaciones para atención del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta mencionada ajustada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría envió la carta No. 38 con Visto Bueno para revisión de la Supervisión Social del ICCU.

El 6 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el volante No. 25 (mal numerado en el asunto y cuerpo del correo como No. 18), a través del cual se proyecta invitar a la comunidad del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6, con observaciones para ajuste del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el volante mencionado ajustado. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el volante mencionada a la Supervisión Social del ICCU, para su revisión.

El 6 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta del comité de participación No. 1, realizado el 28 de noviembre, a los integrantes del comité de Choachí.

El 6 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la carta personalizada No. 39 a través de la cual se proyecta invitar a la Secretaría de Planeación del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6 con observaciones. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta en mención ajustada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la carta No. 39 con visto bueno a la Supervisión Social de la Entidad, para su revisión.

El 6 de enero, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Choachí que se reanudaría atención presencial en el Punto SAU el 7 de enero del 2026 de 8:00 am a 4:00 pm.

El 7 de enero, la Supervisión Social de la Entidad a través de comunicación interna (WhatsApp) emitió observaciones sobre la carta personalizada No. 39. Invitación reunión de inicio No. 6 – Secretaría de Planeación del municipio de Fomeque, las cuales fueron remitidas al Contratista para su atención. En la misma fecha, a través de correo electrónico el Contratista remitió la carta ajustada.

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la distribución del volante No. 22. Levantamiento de actas de vecindad – municipio de Fómeque, teniendo en cuenta que la supervisión social emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la distribución del volante No. 23. Comité de Participación No. 4 – municipio de Choachí, teniendo en cuenta que la supervisión social emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la distribución del volante No. 24. Contratación de Mano de Obra No Calificada - Fomeque, teniendo en cuenta que la supervisión social emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la proyección de la presentación elaborada para el comité de participación No. 4 – municipio de Choachí, teniendo en cuenta que la supervisión social emitió su aprobación a través de comunicación interna (WhatsApp).

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acuso enterado del envío del acta del comité de participación No. 1 del municipio de Choachí a los integrantes del comité.

El 7 de enero, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU de la Provincia de Oriente, de acuerdo a lo acordado entre las partes.

El 8 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la radicación de la carta No. 38, a través de la cual se invita a la alcaldía del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6 que se proyecta para el 14 de enero, sin embargo, se aclaró que se encontraba pendiente la confirmación de acompañamiento por parte de la Entidad para definir la fecha, por lo tanto, se sugirió esperar hasta el 9 de enero para proceder con la radicación del documento.

El 8 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la radicación de la carta No. 39, a través de la cual se invitaba a la Secretaría de Planeación del municipio de Fomeque a la reunión de inicio No. 6 que se proyecta para el 14 de enero, sin embargo, se aclaró que se encontraba pendiente la confirmación de acompañamiento por parte de la Entidad para definir la fecha, por lo tanto, se sugirió esperar hasta el 9 de enero para proceder con la radicación del documento.

El 9 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la presentación elaborada para el comité de participación No. 4 del municipio de Choachí con mínimas observaciones para su atención.

El 9 de enero, el Contratista realizó la radicación presencial de la carta No. 38. Invitación a la reunión de inicio No. 6 en la alcaldía del municipio de Fomeque.

El 9 de enero, el Contratista realizó la radicación presencial de la carta No. 39. Invitación a la reunión de inicio No. 6 en la Secretaría de Planeación del municipio de Fomeque.

El 9 de enero, el Contratista realizó la publicación y distribución del volante No. 22, mediante el cual se notifica el inicio del levantamiento de las actas de vecindad en el municipio de Fomeque.

El 9 de enero, el Contratista realizó la publicación y distribución del volante No. 24, mediante el cual se informa a la comunidad acerca de las vacantes de Mano de Obra No Calificada en el municipio de Fomeque.

Provincia de Medina

En el periodo reportado en el presente informe no se realizaron actividades y/o gestiones relacionadas con la provincia de Medina.

Provincia de Soacha

El 5 de enero, el Contratista se brindó atención presencial en el Punto SAU de la Provincia de Soacha, con novedades en la apertura por cuestiones logísticas lo que provocó que se abriera a las 9:00 am, en ese sentido, la Interventoría requirió al consorcio constructor dar estricto cumplimiento a los horarios de atención, en esta jornada la Interventoría realizó acompañamiento en campo.

El 5 de enero, se realizó la entrega de 66 m3 y el levantamiento del acta de compromiso con la señora Mónica Ostos del predio ubicado en el tramo de obra de Sibaté en el PR 2+700, en esta actividad participaron los componentes técnico y social de Contratista e Interventoría.

El 5 de enero, el Contratista recibió mediante correo electrónico una solicitud de la JAC de la vereda de Alto Charco, en el municipio de Sibaté relacionada con la instalación de reductores de velocidad en el tramo de intervención; por lo tanto, en la misma fecha y a través del mismo medio, el Contratista indicó al peticionario que la solicitud se abriría como una PQR con el consecutivo 003 y sería respondida en los tiempos determinados por ley (26 de enero).

El 6 de enero, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-530 con el informe mensual No. 9 correspondiente al mes de diciembre para revisión de la Interventoría.

El 6 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta del comité de participación No. 3, realizado el 22 de diciembre a los asistentes que brindaron sus datos y a los integrantes del comité de Sibaté.

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acuso enterado del envío del acta del comité de participación No. 3 del municipio de Sibaté a los integrantes del comité y a los participantes que brindaron sus datos.

El 8 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 35, debidamente firmada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 35, debidamente firmada.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**

El 8 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 39, debidamente firmada y realizó dos aclaraciones: los informes mensuales no se harán por municipio sino por provincia y adicional, indicaron que están definiendo si se entrega un informe para el proyecto o si se entregará un informe por provincia. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 39, debidamente firmada y aclaró que, se requiere desde la Interventoría la entrega de un (1) sólo informe que puede estar dividido por provincias.

Generales - componente social.

El 4 de enero, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 38 debidamente firmada.

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el informe semanal No. 28, a través del cual reportaba las actividades realizadas por el componente social entre el 27 de diciembre del 2025 y el 2 de enero del 2026, para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el informe semanal mencionado con mínimas observaciones, para atención del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el informe ajustado.

El 5 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 37, con sus respectivas firmas.

El 5 de enero, se llevó a cabo la mesa de trabajo No. 39, en la cual participaron los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.

El 6 de enero, la Interventoría reiteró a través de correo electrónico la observación hecha al informe semanal No. 28, debido a que no fue atendida en su totalidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el informe mencionado ajustado. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remite el Visto Bueno del informe semanal No. 28, teniendo en cuenta que la observación fue atendida.

El 6 de enero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la respuesta a la PQRS 001 del señor Felipe Acosta, presidente de la JAC de la vereda Palenque I del municipio de Gama, a través de la cual notificaron al peticionario que el área técnica del Contratista y la Interventoría, realizarían una visita en campo para validar la viabilidad de la construcción de la alcantarilla solicitada y de está emitiría el concepto el 13 de enero.

El 7 de enero, la Interventoría radico al contratista el comunicado 766- 554 con las observaciones de la versión 2 del informe mensual correspondiente al mes de noviembre del 2025 (RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-523).

El 7 de enero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 39 realizada el 05 de enero, para revisión y firma del Contratista.

El 9 de enero, llevó a cabo la mesa de trabajo No. 40, con la participación de los profesionales sociales, del contratista y la Interventoría.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026

1.Comités: Interno el día 07 de enero 2026, con la participación de todos los componentes de la interventoría, Consorcio Sofán y ICCU.

Actividades desarrolladas en los municipios de: Choachí y Junín-Gama:

Punto de Choachí:

- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Inspección de maquinaria.
- Jornada de orden y aseo.
- Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos.
- Inspección de Kit de emergencia.
- Se brinda charla de 5 minutos.

Charlas de seguridad en el punto de Choachí:

- 05/01/2026: Riesgos presentes en las actividades.
- 06/12/2026: Ergonomía laboral.
- 07/12/2026: Manejo Manual de cargas.
- 08/12/2026: Orden y aseo.
- 09/01/2026: Cuidado de sol (Radiación UV).
- 10/01/2026: Manejo de sustancias químicas.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Choachí:

- Recepción de carpetas personal del punto en mención.
- Inducción de personal de ingreso.
- Informe semanal.
- Implementación formatos SST y Ambiental.

Punto de Sueva- Junín-Gama:

- Verificación he instalación de señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Verificación de puntos ecológicos y kit de emergencia en obra.
- Inspección con interventoría en campo.
- Aseguramiento documental en campo (ATS- Preoperacionales- Charlas-Inspecciones).
- Se brinda charla de 5 minutos.

Charlas de seguridad en el punto de Sueva- Junín-Gama:

- 05/01/2026: Uso adecuado de herramientas.
- 06/01/2026: ¿Cómo usar un extintor 5 pasos básicos?
- 07/01/2026: Precaución durante el izaje de materiales y elementos de trabajo.
- 08/01/2026: ¿Qué es la seguridad vial?
- 09/01/2026: Tormentas eléctricas – Riesgo natural.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Junín:

- Novedades: Ingresos: 0
- Incapacidades: 0.
- Retiros: 0.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

La interventoría se encuentra a la espera de la respuesta del contratista al comunicado 766-547 Revisión observación Patología de falla estructural en el corredor Sueva – San Francisco-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-521 por parte de los especialistas de pavimento de Interventoría con respecto a la patología identificada en una sección del tramo del municipio de Junín Con base en el Memorando Técnico MT-2934-CM467-2025. Por otro lado, se espera la entrega de los resultados de densidad y LWD tomados en los municipios de Choachí, Junín y Sibaté correspondientes a los tramos intervenidos en diciembre del 2025.

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó la aprobación del informe del buen manejo del anticipo de obra N° 4 correspondiente al mes de octubre del 2025 mediante el comunicado 766-551 Aprobación informe No.4 del buen manejo de anticipo de obra contrato ICCU-138-2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-480. Se espera la remisión del informe de buen manejo del anticipo del mes de noviembre del 2026, que debe ser remitido con el informe mensual de obra del mes de diciembre.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -2,26%, ya que de acuerdo con la nueva programación aprobada de la prorroga el avance programado era del 17,67% y se ha ejecutado el 15,41% debido a fallas mecánicas presentadas en la motoniveladora del municipio de Choachí. Como plan de contingencia a los retrasos presentados, el contratista manifiesta la inclusión de un cuarto frente de estabilización de la rasante, que se implementará en el municipio de Fómeque, con la implementación del equipo FAE que el contratista espera recibir el 17-01-2026.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó la aprobación del ajuste del acta de obra 1 por requerimiento ICCU y conforme a los ajustes realizados a los presupuestos de las provincias de Oriente y del Guavio, mediante comunicado 766-536 Aprobación Ajuste Acta de Obra N° 1-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-524 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-526. La interventoría manifestó la necesidad de completar los entregables de la fase II de caracterización geotécnica para continuar la aprobación de los informes pendientes y que la entidad continue el tramite del acta de obra N° 1, esto en relación con los informes pendiente de la provincia de Oriente.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Así las cosas, a corte del 09 de enero del 2026, esta interventoría ha tramitado y aprobado la solicitud de pago del 75% de fase de caracterización, resultando en un acumulado de $ 2.084.166.072,00. Por otro lado, en relación, al desembolso del anticipo de obra, se ha tramitado y viabilizado por parte de la Interventoría hasta la solicitud N° 7 de este, presentándose a la fecha un valor acumulado aprobado de $7.771.702.614. Se tramitó y aprobó el acta de obra N° 1 correspondiente al mes de octubre por un valor de $ 1.004.028.649,22, o sea 2,84% del total del

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se encuentra bajo observación el tramo con fisuración temprana tipo Piel de Cocodrilo en el municipio de Junín conforme a lo comunicado en el oficio 766-547 Revisión observación Patología de falla estructural en el corredor Sueva – San Francisco-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-521

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante la semana se evidenciaron situaciones problemáticas asociadas principalmente a reprocesos administrativos, inconsistencias documentales y retrasos en el cumplimiento de plazos contractuales, reflejados en observaciones reiteradas por parte de la Interventoría a informes, volantes, cartas personalizadas y respuestas a PQRS, así como en errores de numeración y omisión de soportes requeridos (registro fotográfico). Estas situaciones tienen como causa principal debilidades en la revisión interna previa al envío de documentos, lo cual generó mayores tiempos de gestión y riesgo de incumplimiento en los cronogramas establecidos.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ajuste de informes de caracterización Quetame, Chipaque, Fosca y Provincia Medina	Consorcio Sofán C-031	9/01/2026
Resultados ensayos de densidad y LWD	Consorcio Sofán C-031	Inmediato
Presupuestos ajustados a los requerimientos del ICCU en los municipios de las provincias de Soacha y Medina	Consorcio Sofán C-031	9/01/2026
Inicio de quinto frente de obra(Fómeque)	Consorcio Sofán C-031	19/01/2026

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra finalizando la fase de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se reiniciaron actividades por parte del contratista de obra en relación a las intervenciones de la rasante de la vía en el tramo del municipio de Junín teniendo en cuenta que la maquinaria teniendo en cuenta que la maquinaria que presentaba daños ya fue reparada, se vienen realizando actividades en el tramo del K4+800 AL K5+000 del municipio de Junín vereda san francisco, y en el municipio de GAMA se reiniciaron las actividades también el día 7 de enero con la excavación e instalación de tubería de una cuarta alcantarilla en este municipio, esta esta ubicada en el PR 2+900 se continuara con la ejecución de actividades de instalación y amarre da acero de los muros y pocetas de cada una de las alcantarillas del municipio de Gama.

Continúa suspendida la actividad de intervención de la rasante de la vía en el municipio de Choachí en la provincia de Oriente debido al daño mecánico de la motoniveladora y se termina la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K7+130 a la K7+330 en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha.

A corte del 09 de enero de 2026, se reporta un atraso del -2,26% en el avance físico y financiero del contrato ICCU-138-2025 debido a daño mecánico de la motoniveladora del municipio de Choachí sumados al incumplimiento de entregables de las Fase II.

Con base en el seguimiento realizado, la Interventoría concluye que, si bien se mantienen avances administrativos relevantes —tales como la aprobación del informe de buen manejo del anticipo N° 4 y el ajuste del Acta de Obra N° 1 conforme a requerimientos del ICCU—, persisten incumplimientos críticos en la entrega oportuna de los informes de caracterización geotécnica de la Fase II, condición indispensable para el cierre de dicha fase y la continuidad del trámite contractual. En el componente físico, se evidencia un atraso del –2,26 % frente a la programación vigente, atribuible a fallas mecánicas, para lo cual el contratista plantea un plan de contingencia que deberá materializarse en los plazos anunciados y verificarse en campo. La Interventoría reitera la necesidad de dar inicio inmediato a las actividades pendientes de la Fase III en los municipios faltantes, atender los requerimientos técnicos en curso y cumplir estrictamente los compromisos asumidos, a fin de mitigar riesgos de mayores retrasos y garantizar el cumplimiento integral del contrato.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN EN EL TRAMO: SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN

SUPERVISIÓN DE PMT

LIMPIEZA DE CUNETAS





SUPERVISIÓN DE PMT





ICCU	FORMATO							CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							FECHA	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	10-ene-26	SEMANA No.	39	DEL	3-ene-26	AL	9-ene-26





ESCARIFICACIÓN CON RETROCARGADOR Y MOTONIVELADORA





EXTENDIDO DE CEMENTO





TOMA DE HUMEDADES





VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN Y RIEGO DEL ADITIVO CON AGUA





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**





HOMOGENIZACIÓN CON FAE Y VERIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD DE CAPA ESTABILIZADA





CEREO Y COMPACTACIÓN





RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GAMA TRAMO: CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO

EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLA





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**





VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE EXCAVACIÓN Y SOLADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLA





PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN LA ENTRADA DE LAS ALCANTARILLAS Y SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA





TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DE INTERVENTORÍA





PROVINCIA DE SOACHA:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ TRAMO: VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN

LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL





ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**





EXTENDIDO DE CEMENTO





MEZCLADO DE AFIRMADO CON CEMENTO Y DOSIFICACIÓN DE ADITIVO EN EL AGUA







RIEGO DE ADITIVO CON AGUA, HOMOGENIZACIÓN Y CEREO





COMPACTACIÓN






PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**






COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 34. 7 DE ENERO

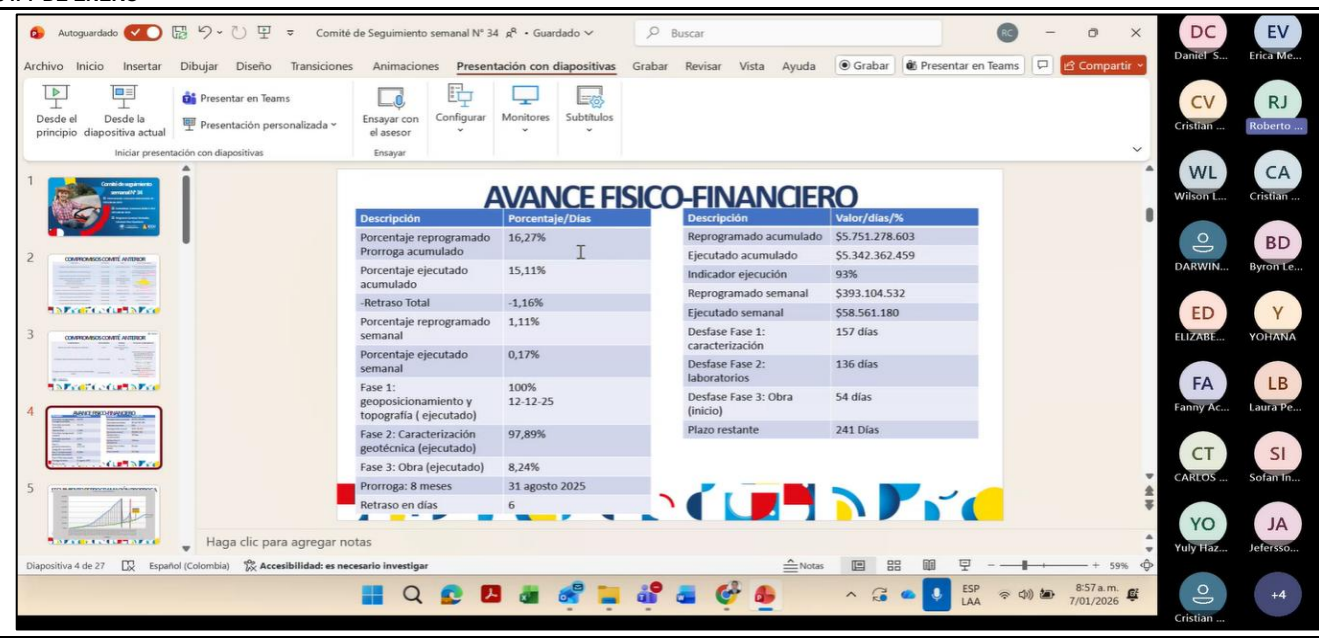


ATENCIONES PUNTO SAU - SOACHA Y ORIENTE



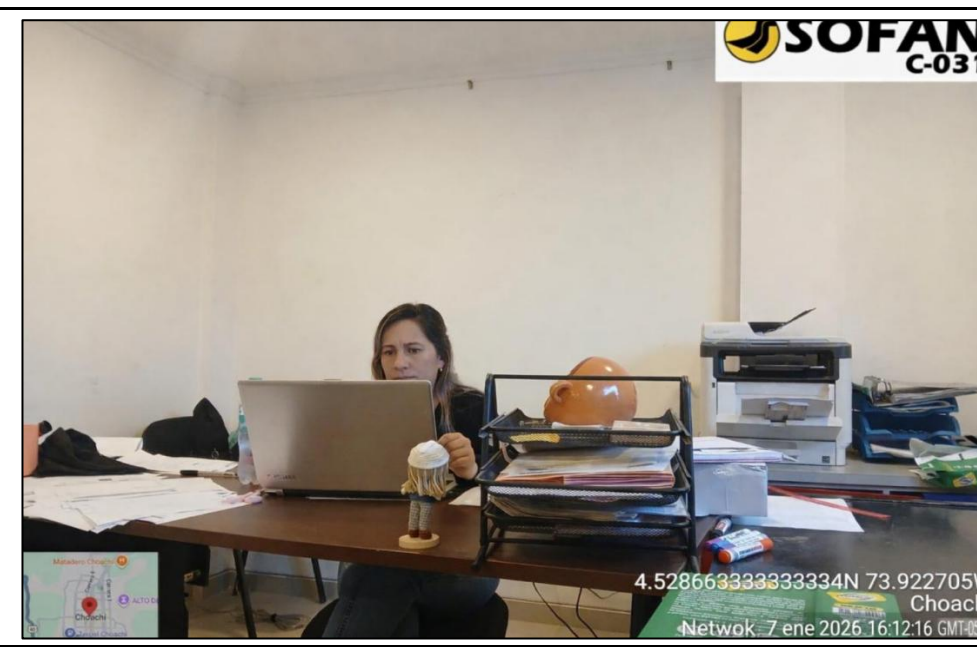


RECORRIDOS SOCIALES: UBALÁ, GAMA Y JUNÍN (ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y REVISIÓN DE BUZONES SATELITALES)

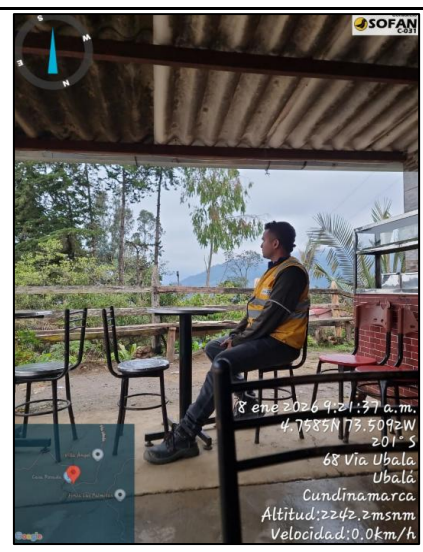






RADICACIÓN DE CARTA No. 38 Y 39. INVITACIONES A REUNIÓN DE INICIO No. 6 - ALCALDÍA Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE FOMEQUE







PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**10-ene-26**	**SEMANA No.**	**39**	DEL	**3-ene-26**	AL	**9-ene-26**

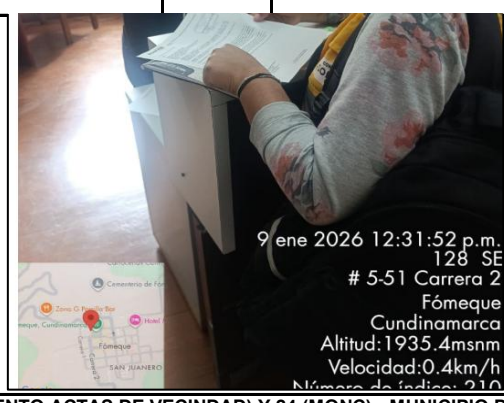

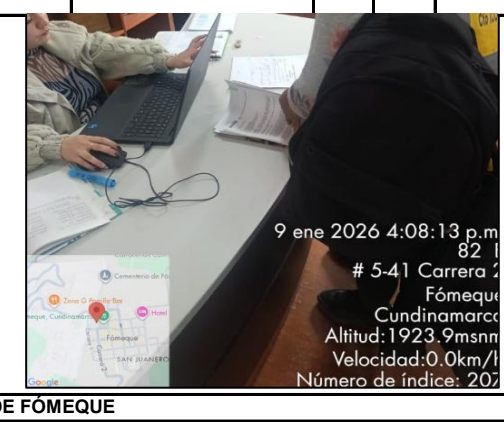



PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VOLANTE 22 (LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD) Y 24 (MONC) - MUNICIPIO DE FÓMEQUE

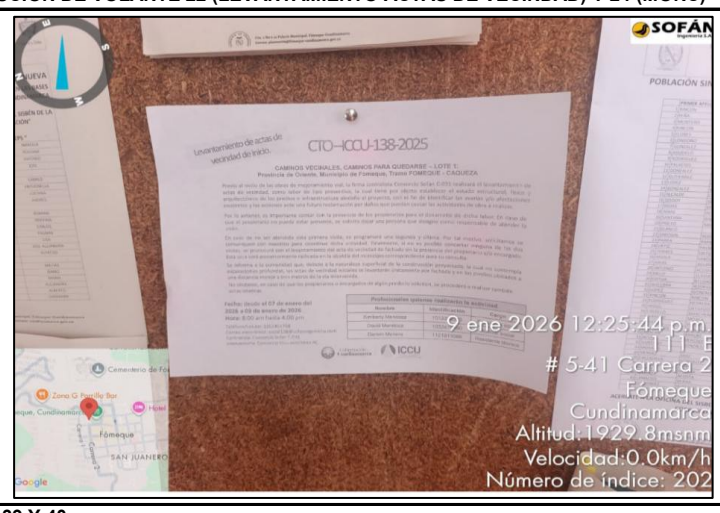

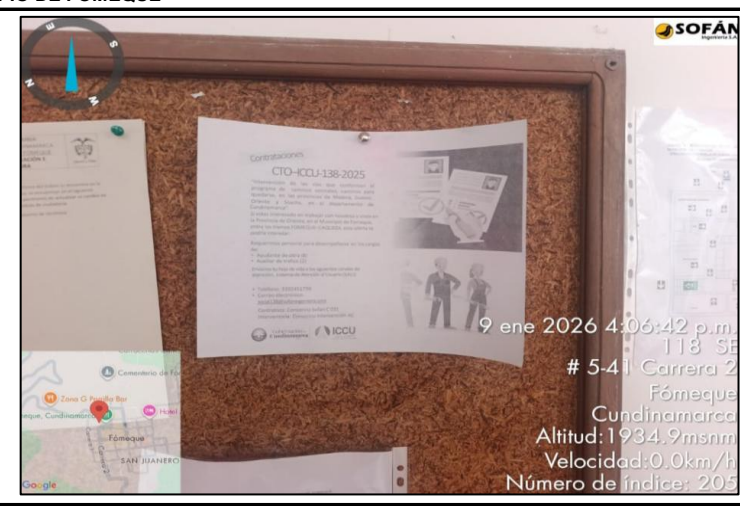

MESAS DE TRABAJO No. 39 Y 40

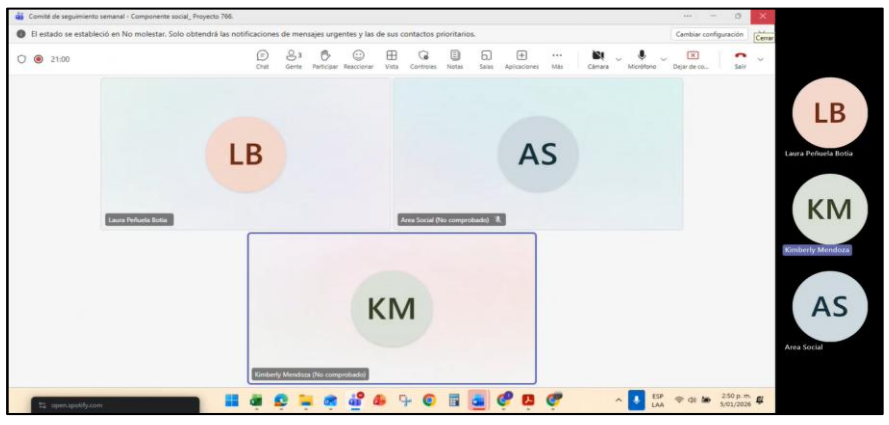

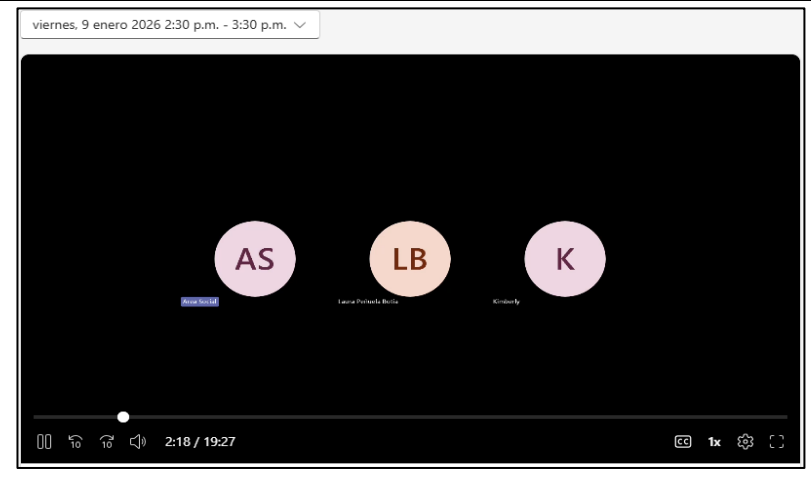

Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2026.01.14 09:54:49 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio
