Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**CONTRATO 1838**	**73 días**	**mié 29/10/25**	**lun 2/03/26**		**$ 333.134.789,00**
2		INICIO DE OBRA	0 días	mié 29/10/25	mié 29/10/25		$ 0,00
3		ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA	10 días	mié 29/10/25	mar 11/11/25	2	$ 0,00
4		**PRELIMINARES**	**35 días**	**lun 8/12/25**	**lun 16/02/26**		**$ 5.276.246,00**
5		DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25	6CC+2 días	$ 88.691,00
6		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO	25 días	lun 8/12/25	lun 2/02/26	26CC-20 días	$ 1.250.246,00
7		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	30 días	mié 10/12/25	mié 11/02/26	5CC	$ 2.305.610,00
8		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE	30 días	lun 15/12/25	lun 16/02/26	7CC+3 días	$ 1.631.699,00
9		**SARDINELES Y ANDENES**	**35 días**	**mié 17/12/25**	**mié 25/02/26**		**$ 15.971.772,00**
10		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO	35 días	mié 17/12/25	mié 25/02/26	8CC+2 días	$ 8.797.601,00
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO	12 días	lun 26/01/26	mar 10/02/26	10CC+12 días	$ 938.098,00
12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA	10 días	lun 26/01/26	vie 6/02/26	11CC	$ 2.458.961,00
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA	10 días	jue 29/01/26	mié 11/02/26	12CC+3 días	$ 3.777.112,00
14		**MOBILIARIO URBANO**	**55 días**	**mié 12/11/25**	**mié 18/02/26**		**$ 225.718.403,00**
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARADERO TIPO M10 CON SU RESPECTIVO MUPI	55 días	mié 12/11/25	mié 18/02/26	3	$ 225.718.403,00
16		**SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL**	**33 días**	**mié 24/12/25**	**lun 2/03/26**		**$ 82.637.415,00**
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS	12 días	vie 13/02/26	lun 2/03/26	18CC+10 días	$ 10.585.146,00
18		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA)	20 días	vie 30/01/26	jue 26/02/26	13CC+1 día	$ 18.797.078,00
19		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO	15 días	lun 2/02/26	vie 20/02/26	18CC+1 día	$ 1.136.704,00
20		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS	12 días	vie 13/02/26	lun 2/03/26	18CC+10 días	$ 6.462.550,00
21		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS	15 días	mié 4/02/26	mar 24/02/26	19CC+2 días	$ 2.259.210,00
22		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO	16 días	lun 9/02/26	lun 2/03/26	11CC+10 días	$ 2.375.527,00
23		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO	18 días	mar 3/02/26	jue 26/02/26	13CC+3 días	$ 40.069.000,00
24		**DESMONTE**	**18 días**	**mié 24/12/25**	**lun 9/02/26**		**$ 952.200,00**
25		DESMONTE DE CUBIERTA LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5KM)	8 días	mié 24/12/25	lun 26/01/26	3FC+30 días	$ 121.281,00
26		DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS	10 días	mar 27/01/26	lun 9/02/26	25	$ 830.919,00
27		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	63 días	mié 12/11/25	lun 2/03/26	3	$ 3.530.953,00
28		FIN	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	20;23	$ 0,00

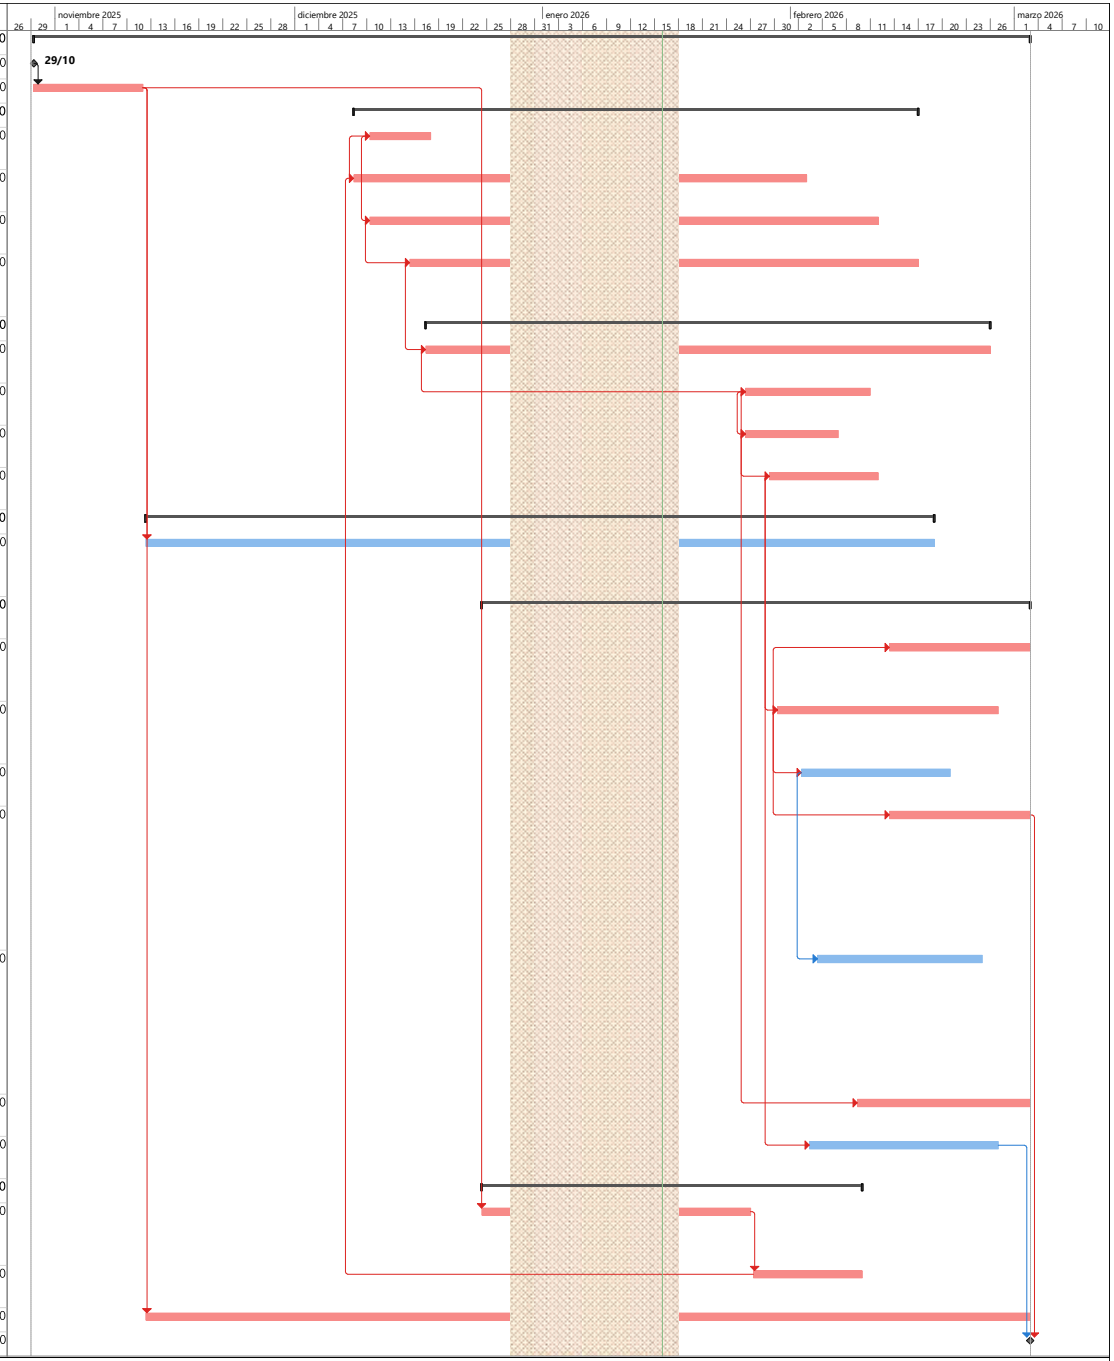

Proyecto: PROGRAMACIÓN V2
Fecha: vie 16/01/26

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Tareas críticas, División crítica, Progreso, Progreso manual
