	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL No. 09 **MES O PERIODO: ABRIL - 2019**

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización		X		7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		9
2.3	Características técnicas del proyecto		X		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		14
3.3	Seguimiento ítems no previstos			X	15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		27
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		29
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		32
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		36
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		38
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		43
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		62
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		127
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		130
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		133
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		133
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		133
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		139
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		136
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		142
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		x	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		183
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		20
5.3	Informes especialistas		X		20
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		181
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		187
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		189
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		191
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		196
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		x	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		199
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		199
7	**Anexos**				
7.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		203
7.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		205
7.3	Actividades social y prediales		X		220
7.4	Actividades ambientales		X		209
7.5	Libro de Obra		X		254

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 09
ABRIL 01 AL 30 DE 2019
Versión 0

Carrera 21 No. 100 – 20, Oficina 602 - Telefax: 2183292 - 2564013 – 2581094
E-mail: copebaing@yahoo.com

BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización
2.2. Inventario y estado inicial de la vía
2.3. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3. Descripción ítems no previstos
3.4. Estado de avance y accione a seguir por parte de la interventoría

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra
4.3. Personal contrato de obra
4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra
4.5. Estado general del tiempo
4.6. Resumen ensayos de laboratorio
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
4.8. Informe avance físico-financiero del contrato de obra
4.9. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo
4.9.2. Seguimiento al programa de obra
4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones
4.9.4. Acta de comité de obra
4.9.5. Informes semanales
4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra
4.11. Otros documentos seguimiento mensual
✓ Seguimiento a la inversión del anticipo
✓ Seguimiento al programa de obra

- ✓ Seguimiento al programa de inversiones
- ✓ Acta de comité de obra
- ✓ Acta de reunión
- ✓ Informes semanales

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor
5.3. Informes especialistas
5.4. Informe del programa anual de caja-PAC
5.5. Información de otros programas y aplicativos

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo contrato de interventoría
6.2. Personal contrato de interventoría
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría
6.6. Seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría
6.7. Otros documentos al seguimiento mensual
- ✓ Seguimiento a la inversión del anticipo

7. ANEXOS

7.1. Relación de la correspondencia
7.2. Registro fotográfico
7.3. Informes especialistas
7.4. Libro de obra

ANEXOS

- *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3*
- *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*
- *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.*
- *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*
- *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10*
- ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11
- *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12.*
- *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14*
- El ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.
- ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRAEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.
- ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA.
- ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN
- ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES
- ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1.
- ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN
- ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

- ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5
- ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7.
- ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9.
- ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA-MINFRA-MN-IN-15-FR-16.
- ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.
- ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO
- ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.*
- *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.*
- ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Reforma Rural Integral, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, desarrolla el "Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial" el cual define criterios para priorizar la intervención en las zonas más necesitadas y urgidas para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este Acuerdo, y son: "i. los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii. El grado de afectación derivado del conflicto; iii. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de capacidad de gestión; iv. Y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS con los recursos disponibles ejecuta el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017., con el resultante del bienestar para los usuarios, que comprenden las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que se garantice una operación segura.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS adjudicó el Contrato de Obra N° 498 de 2018, de fecha 25 de enero de 2018, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien presentó la propuesta PDS18C00866 de fecha 25 de enero de 2018, la cual fue aprobada por el OCAD PAZ.

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS con el fin de dar acompañamiento técnico al Contrato de obra anteriormente citado, adjudicó el Contrato de Interventoría N° 825 de 2018, de fecha 30 de mayo de 2018, previo Concurso de Méritos CMA-DO-SRT-032-2018, a la firma COPEBA LTDA, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN

EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Los Contratos de Obra e Interventoría tuvieron orden de inicio el día 08 de agosto de 2018. El contrato de obra tiene un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018, una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019 y la interventoría tuvo un plazo inicial hasta el 07 de abril de 2019 y una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019.

El Contrato de Obra consta de dos etapas: una etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, y la otra etapa, que es la correspondiente a la construcción.
La primera etapa se dividió en dos fases. La primera corresponde a los Estudios y Diseños para la cual se definió un mes de plazo al contratista entre el 08 de agosto al 08 de septiembre de 2018 y seguida por la revisión de estos estudios y diseños por parte de la interventoría con un plazo de quince días, desde el 08 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2018. El día 03 de diciembre de 2018 mediante el oficio SRT-54505, INVÍAS hizo observaciones a dichos estudios. El día 14 de marzo de 2019, la Interventoría hizo entrega a INVÍAS de los documentos de la Revisión de los Estudios y Diseños. A la fecha de este informe no se han recibido observaciones por parte de INVÍAS.

En el presente Informe Mensual de Interventoría No.09 se reportan las actividades más importantes que se han ejecutado durante el período comprendido entre el 01 de abril de 2019 y el 30 de abril de 2019, correspondiente al noveno mes de desarrollo y ejecución de los Contratos de Obra y de Interventoría del Proyecto.

Del Contrato de Interventoría, se incluyen los aspectos generales, las actividades de supervisión y la información financiera. Al final del Informe se incluye algunos comentarios, conclusiones y observaciones de los aspectos más relevantes del desarrollo y ejecución general del Proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

De acuerdo con las evaluaciones efectuadas por el INVIAS, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, de algunas vías de red secundaria del Quindío presentan un deterioro que amerita su pronta intervención principalmente en los tramos Pijao – Guacas, Génova – Guacas.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, del Sistema general de Regalías por EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ DEL SGR", "Para financiar proyectos de inversión, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el parágrafo 4 y los parágrafos transitorios 7 y 8 del artículo 361 de la constitución política, disponen que los proyectos de inversión que serán financiados con los recursos del SGR correspondientes a los excedentes del ahorro pensional territorial fuente SGR, y aquellos que componen la Asignación para la Paz serán definidos por el OCAD PAZ.

Que el artículo 2 de decreto Ley 1534 de 2017 establece que el OCAD PAZ es responsable de definir los proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para la Paz, o los recursos a los que se refiere al parágrafo 4 del artículo 361 de la Constitución Política. Este OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión, y designará la entidad pública ejecutora en los términos señalados en la ley 1530 de 2012".

Como se comenta en el anterior párrafo, el Instituto Nacional de Vías, fue designado como entidad pública ejecutora de los contratos de obra e interventoria, en acuerdo con el "ACUERDO No.3 DEL 25/01/2018, por medio del cual se adoptan las decisiones relacionadas con proyectos de

inversión financiados o cofinanciados con recursos de Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías SGR".

El Objeto del Proyecto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

La operación y mantenimiento del corredor vial Pijao - Guacas, Génova – Guacas, se encuentra a cargo del Departamento del QUINDÍO, por tratarse de vías secundarias. El proyecto se localiza al Sur-oriente del Departamento, iniciando sobre la carrera 6 calle 18 del casco urbano del municipio de Pijao, donde termina el pavimento hidráulico e inicia el afirmado de la vía (4°19'50.83"N) / 75°42'24.08"W); pasando por Puente Tabla, sobre río Lejos, la escuela Juan XXIII, Río Azul, Caserío la Maizena (escuela 7 de Agosto), quebrada La Maizena, Los Chorros, ingreso a la vereda El Jardín, La Laguna, escuela La Laguna, Guacas, siendo estos los puntos intermedios del recorrido; con un tramo de vía de 17.05 Km hasta con el tramo de Génova - Guacas, con las coordenadas (4°13''10.38"N / 75°46'41.80"W), en una longitud de 25.4km. Los puntos intermedios del tramo Génova-Guacas son: La escuela El Recreo, Finca Venecia, Finca El Porvenir. Quebrada Tamborales, hasta llegar a la glorieta (El caballo) con intersección de la vía Barragán-Génova

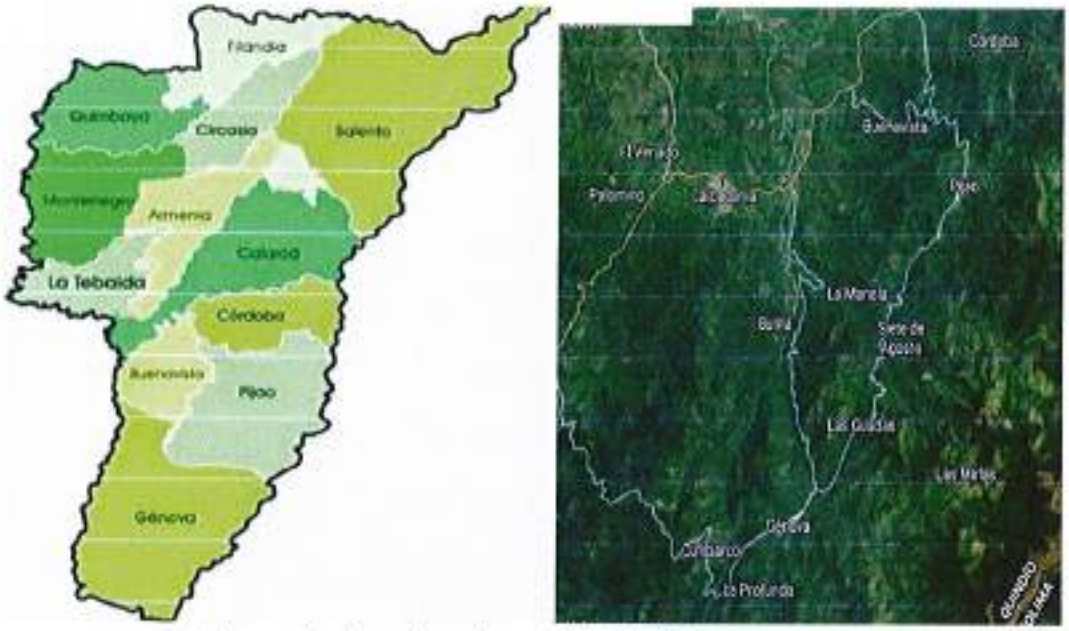


Figura1 - Localización general del Proyecto

2.2. Inventario y estado inicial de la vía

La longitud aproximada de la vía Pijao – Guacas – Génova es de 25.4 Km, subdividida en dos tramos el primero correspondiente al municipio de Pijao que es Pijao – Guacas de longitud 17,05 km y el segundo tramo corresponde al municipio de Génova que es Génova – Guacas con una longitud de 8.35km. La vía actualmente corresponde a una estructura conformada por una capa de afirmado y materiales granulares de espesores variables. El ancho de la calzada varía entre 4.0 y 5.0 m aproximadamente. La geometría horizontal es bastante irregular, con curvas de radios muy pequeños, algunas inferiores a 20m con deflexiones superiores a 90°; desde el punto de vista vertical el alineamiento presenta dificultades en algunos tramos de gran pendiente, en los cuales se tienen proyectadas las Placa – Huellas.

Existen 4 sitios en el sector de Pijao – Guacas y 5 en el sector Génova - Guacas donde se presenta pérdida de banca, y allí se tiene proyectado la construcción de muros de contención



K 12+839 Aspecto Inicial de la vía




Ancho promedio de la vía 3.7m


Como se observa en el registro anterior, el tramo a intervenir presenta un ancho restringido, lo cual permite una sección inicialmente proyectada de 4.10m que corresponde a dos placas huellas de 0.90 separadas por una franja de piedra pegada 0.90 y dos cunetas de 0.7m y con su respectivo bordillo. En visita efectuada por los especialistas de interventoría y contratista (geólogos y geotecnistas), consideran que la rasante existente se podría utilizar como Subrasante y en algunos sectores como sub-base.

2.3 Características técnicas del Proyecto

El proyecto presenta tres características específicas que son, la construcción de placas huella, la construcción de muros de contención y la construcción de alcantarillas u obras transversales; así:

De las placas huellas existen dos modelos: una con una calzada de 5,00 m y otra con calzada de 4,10 m, dependiendo del ancho disponible

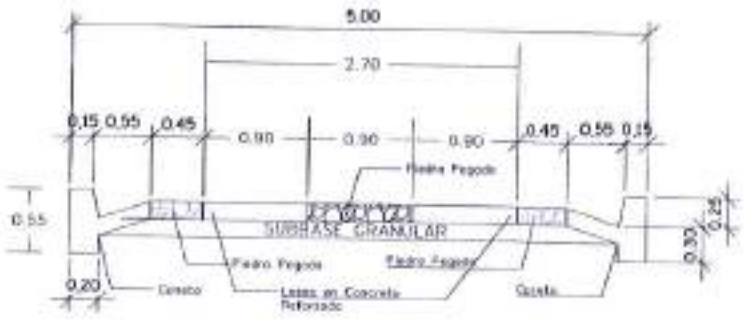

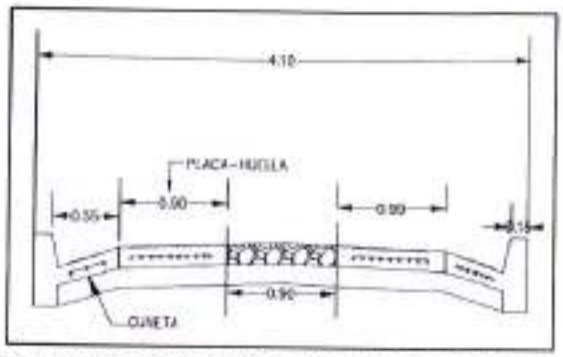

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA PROPUESTA POR EL ESTUDIO
PARA LA VÍA PIJAO – GUACAS – GENOVA

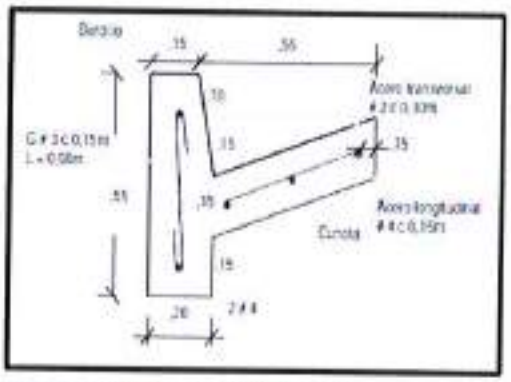


Figura 2.13 Corte Borma-cuneta Sección en la Cuneta

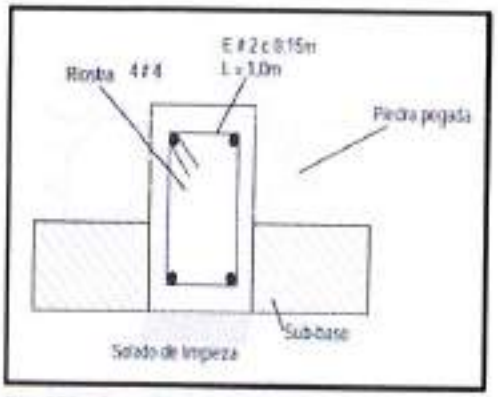


Figura 2.7 Corte Transversal Sección en Piedra Pegada

- Construcción de placas huella entre.

PLACA HUELLA			
PIJAO – GUACAS	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K3+169	K3+457	288
	K6+705	K7+005	300
	K10+165	K10+445	280
	K12+275	K12+400	125
	K12+400	K12+580	180
	K12+841	K13+071	230
	Sub-total		**1403**

PLACA HUELLA			
GUACAS – GENOVA	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K17+657	K18+002	345
	K18+002	K18+757	755
	K22+232	K22+332	100
	K23+755	K23+810	55
	Sub-total		**1256**

Ancho de calzada de 4.10m y 5,00 m, con cunetas en concreto de 0.7 m.

- Construcción de muros de contención.

MUROS DE CONTENCION			
	MURO	ABSCISA	LONGITUD
PIJAO / GUACAS	1	K2+770	14,75
	2	K4+280	13,1
	3	K7+380	10
	4	K8+670	17,05
		Sub-total	**54,9**

MUROS DE CONTENCION			
	MURO	ABSCISA	LONGITUD
GENOVA / GUACAS	1	K18+964	7,1
	2	K19+163	7,4
	3	K19+413	7
	4	K22+321	8,05
	5	K18+380	**5,00**
			34,55

Para los cuales se debe instalar la señalización preventiva previa su inicio de construcción.

- Construcción de alcantarillas

ALCANTARILLAS		
	ABSCISA	CANTIDAD
PIJAO / GUACAS	K4 + 280	1
	K6 + 670	1
	K6 + 878	1
	K6 + 960	1
	K7 + 280	1
	K7 + 380	1
	K8 + 350	1
	K8 + 640	1
	K8 + 750	1
	K10 + 150	1
	K10 + 350	1
	K10 + 545	1
	K10 + 660	1
	K10 + 800	1
	K11 + 933	1
	K12 + 905	1
	K13 + 000	1
	K16 + 668	1
Sub-total		**18**

ALCANTARILLAS		
	ABSCISA	CANTIDAD
GENOVA / GUACAS	K17 + 675	1
	K17 + 814	1
	K17 + 846	1
	K17 + 921.5	1
	K18 + 102	1
	K18 + 444.5	1
	K18 + 757	1
	K18 + 964	1
	K19 + 413	1
Sub-total		**9**

Ajustando los estudios y diseños a la estructura existente de la vía, obras transversales para drenaje en tubería de 36" en reemplazo de algunas existentes de 24" y otras que han colapsado que solo se detectan con la limpieza de éstas.

El abscisado que se presenta en los cuadros anteriores de localización de las obras corresponde a la etapa preliminar del ajuste de estudios y diseños.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

El Contrato de Obra N.° 498 de 2018 tiene como objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017.

Contrato N°	: 498 de 2018
Contratista	: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Valor Inicial	: $5.419.238.921,23 moneda corriente
Plazo Inicial	: Treinta y uno (31) de diciembre de 2018
Prorrogado a	: Siete (07) de julio de 2019
Orden de Inicio	: 08 de agosto de 2018
Fecha de Terminación	: Siete (07) de julio de 2019
Contacto	: **JOSE MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS** – Director Ejecutivo - Comité Cafeteros del Quindío Km 3.5 vía Armenia, La Tebaida Armenia – Colombia Calle 44B No.57 A-76 PBX (57-6) 736 8999

3.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes de abril 2019.

En el presente mes se realizó: en el tramo Pijao-Guacas, la terminación de la construcción de la placa huella en el sector de Puente Tabla (K 3+169 al K 3+457) Se inicia la construcción de la placa huella del k12+841 al k13+071 (60 ml). En la placa huella de Los Chorros (k12+275 al k12+580), se tiene instalada la subbase. Se termina de la construcción muro 1 k2+770 (falta el sobre muro), el muro 2 (k4+280), la construcción muro 3 K7+380 y del muro 4 (K 8+670), la instalación de la tubería de alcantarilla en el K 13+920 (1 tubo de 36"), k7+380 (1 tubo de 36"). La FNC retiró los derrumbes producidos en las vías de acceso de materiales y personal. Arregló en forma provisional el paso de Don Joaquín (k11+200)

En el tramo Génova-Guacas se inicia la construcción de la placa huella localizada entre el K17+620 al k17+720, con la colocación de la subbase por sectores. La construcción del muro 5 K 18+360, en el muro 3 (k19+413), se construyó un trincho para la protección de la banca. La instalación de tubería de las alcantarillas del K18+282 y K18+023.

Se sigue con el problema de transitabilidad por el sector de Don Joaquín (K11+200) aunque la FNC lo habilitó cuando llueve no se puede transitar

Por el invierno que se ha presentado en la zona no ha sido posible que el Contratista, cumpla con el plan de contingencia presentado en enero y otro a comienzos de este mes.

Comités Técnicos del Mes de abril 2019: (ver anexos)

- No.41 - del 04 de abril de 2019
- No.42 - del 11 de abril de 2019
- No.43 - del 17 de abril de 2019
- No.44 - del 25 de abril de 2019

Informes Semanales del Mes de abril 2019: (ver anexos)

- No.35 del 06 de abril de 2019
- No.36 del 13 de abril de 2019
- No.37 del 20 de abril de 2019
- No.38 del 27 de abril de 2019

3.3. Seguimiento ítems no previstos

A la fecha no hay ítems no previstos aprobados

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoria

Estado de avance

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Básico del contrato de obra	5.138.283.252,00
Inversión de obra acumulada	4.072.199.402,93
Inversión de obra ejecutada acumulada	1.150.397.325,11
Avance de obra %	22,39%
Revisión y ajuste de estudios y diseño Ejecutado	99.034.808,84
Total Ejecutado	1.249.432.133,95
% Ejecución del contrato	24,32%

Acciones por parte de la interventoria

- ✓ Control semanal de cumplimiento del contrato
- ✓ Solicitud mediante oficio de aumento del personal, suministro de insumos y materiales

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto

En el *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3* se hace una descripción del avance del proyecto del período 01 de abril al 30 de abril de 2019.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*, en este período se relaciona maquinaria y equipo del contratista.

4.3 Personal contrato de obra

En el *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8*. En este período se incluye el personal del contratista que participó en el proyecto durante el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2019.

4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra

En el *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*

4.5. Estado general del tiempo

En el *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10* se registra el estado del tiempo en el área del proyecto para este período. Se anexa el informe del estado del tiempo del mes de abril (boletín del IDEAM) del Aeropuerto El Edén de la ciudad de Armenia (Q).

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

En el ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11 Para el presente período se relacionan los ensayos de laboratorio del proyecto.

4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12*, presenta el seguimiento de la Interventoría sobre el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social del personal que labora para el Proyecto, en este período.

4.8 Informe avance fisico-financiero contrato de obra

El *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14*

4.9 Seguimiento a garantías y seguros contrato de obra

El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

4.10 Seguimiento del Plan de Calidad del contrato de obra

El ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRAEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

4.11. Otros documentos seguimiento mensual

✓ **Seguimiento a la inversión anticipo contrato de obra**

El ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

El ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

✓ **Seguimiento al programa de obra**

El ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

✓ **Seguimiento al programa de inversión**

El ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA

INVERSIONES

- ✓ **Actas de comité de obra**

El ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1. Se adjuntan copias de las actas de los comités técnicos efectuados durante el periodo 01 de abril al 30 abril de 2019.

- ✓ **Actas de reunión**

El ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN

- ✓ **Informes semanales**

El ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Se adjunta copia de los informes semanales que fueron elaborados durante el presente mes de abril.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato

El Contrato de Interventoría N.º 825 de 2018, tiene como objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contrato Nº	: 825 de 2018
Contratista	: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor Inicial	: $ 518.020.310 MONEDA CORRIENTE- IVA
Plazo Inicial	: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Orden de Inicio	: 08 DE AGOSTO DE 2018.
Aclaración	: ACLARACION Nº UNO (1) AL CONTRATO Nº 825 DE 2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES.
Fecha Terminación	: HASTA EL 07 DE ABRIL DE 2019
Prorroga 1	: Hasta el 07 de julio de 2019
Contacto	: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100-20 Of. 602 Tel. 2571094 2564013 2183292. Correo electrónico - copebaing@yahoo.com

La interventoría solicitó prórroga de su contrato mediante oficio ADM-INV-825-2018-070, teniendo en cuenta que el contratista hizo lo pertinente a su contrato para poder ejecutar actividades en un plazo prudente ya que el inicial se fue agotando en la etapa de estudios y diseños.

La prórroga le fue otorgada a la interventoría por el Comité de Adiciones y Prórrogas, hasta el 07 de julio de 2019 según Acta No. 74 del 18 de diciembre de 2018 y firmada el 28 de diciembre de 2018.

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes.

Además de las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y en los respectivos contratos, la Interventoría ejecutó las siguientes actividades:

✓ Trámite adecuado de la correspondencia, dando respuestas a las comunicaciones enviadas por el Contratista.

✓ Solicitar al contratista la entrega de manera oportuna de los documentos contractuales del contrato de obra 498 de 2018.

✓ Reuniones semanales con el contratista para la realización de los comités de seguimiento al contrato 498 de 2018 durante el mes de marzo de 2019.

5.3. Informes Especialistas de Interventoría

Para el presente período, se presentan informes de especialistas de las áreas Social y Ambiental de la interventoría.

5.4. Informes del Programa anual de caja-PAC

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

5.5. Información otros programas y aplicativos

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo contrato de interventoría

El ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Para el presente periodo, se relaciona el equipo disponible con el que cuenta la interventoría para el proyecto.

6.2. Personal contrato de interventoría

El ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7. En el formato mencionado, se relaciona el personal que participó en el proyecto, para el presente mes de abril.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el formato mencionado se detalla este informe.

6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

El ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Se verificó la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal de interventoría que a la fecha labora en el proyecto.

6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Se relacionaron las garantías entregadas a la entidad contratante, INVIAS, las cuales a la fecha actual han sido modificadas 6 veces.

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

El ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.

6.7. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

  El ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL

ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO

Como se mencionó en el anterior informe mensual, la Interventoría renunció de manera voluntaria al anticipo del 20% del contrato de interventoría. Esta renuncia la realizó mediante comunicación ADM-INV-825-2018-023 de fecha 10 de septiembre de 2018 dirigida al INVIAS, y con radicado 77060 de fecha 10 de septiembre de 2018

El ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7. ANEXOS

7.1. Relación ***de correspondencia.***

El *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Se entrega* el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el presente período.

7.2 Registro Fotográfico

El *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO*. Se entrega el formato implementado por la Interventoría para el registro fotográfico de las actividades realizadas por la interventoría y el contratista a los sitios de obra.

7.3 Libro de Obra

El ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

- **2.1.** Localización
- **2.2.** Inventario y estado inicial de la vía
- **2.3.** Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

- **3.1.** Información general del contrato
- **3.2.** Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

- **4.1.** Resumen mensual estado general del proyecto
- **4.2.** Maquinaria y equipo contrato de obra
- **4.3.** Personal contrato de obra
- **4.4.** Informe financiero y presupuestal contrato de obra
- **4.5.** Estado general del tiempo
- **4.6.** Resumen ensayos de laboratorio
- **4.7.** Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
- **4.8.** Informe avance físico-financiero del contrato de obra
- **4.9.** Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
  - 4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo
  - 4.9.2. Seguimiento al programa de obra
  - 4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones
  - 4.9.4. Acta de comité de obra
  - 4.9.5. Informes semanales

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **5.1.** Información General del contrato
- **5.2.** Descripción de las actividades realizadas por el Interventor
- **5.3.** Informes especialistas

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **6.1.** Equipo contrato de interventoría
- **6.2.** Personal contrato de interventoría
- **6.3.** Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- **6.4.** Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- **6.5.** Seguimiento garantías contrato de interventoría
  - 6.5.1. Seguimiento a la inversión del anticipo contrato de interventoría
  - 6.5.2. Información de gestión socio-ambiental

7. ANEXOS

- **7.1.** Relación de correspondencia
- **7.2.** Registro fotográfico
- **7.3.** Informes especialistas
- **7.4.** Libro de obra

ANEXOS

- **ANEXO 1.** RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3
- **ANEXO 2.** MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4
- **ANEXO 3.** PERSONAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-6
- **ANEXO 4.** INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8
- **ANEXO 5.** ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10
- **ANEXO 6.** RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11
- **ANEXO 7.** CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12
- **ANEXO 8.** INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA– MINFRA-MN-IN-FR-15-14
- **ANEXO 9.** SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15
- **ANEXO 10.** SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1
- **ANEXO 11.** SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA - MINFRA-MN-IN-2-FR-2
- **AN4EXO 12.** SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES – MINFRA-MN-IN-6-FR-1

- **ANEXO 13.** ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1
- **ANEXO 14.** INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2
- **ANEXO 15.** EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5
- **ANEXO 16.** PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7
- **ANEXO 17.** INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9
- **ANEXO 18.** CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-13
- **ANEXO 19.** SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-16
- **ANEXO 20.** SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-3-FR-1
- **ANEXO 21.** RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
- **ANEXO 22.** REGISTRO FOTOGRÁFICO
- **ANEXO 23.** INFORMES ESPECIALISTAS
- **ANEXO 24.** LIBRO DE OBRA.

ANEXO 1. RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA A OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31 | 5 | 2018 (Día | Mes | Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINO

PERIODO INFO: 31 DE MAYO DE

CONTRATO DE OBRA No. 0495 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL CICAD RED EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 7204 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN: 9 de agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 6.414.000.987 ,19
VALOR ACUMULADO: $ 6.414.000.987 ,19
ANTICIPOS CONCEDIDOS: $

PLAZO ACUMULADO: 11.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de junio de 2019
VALOR ADICIONALES: $
PRÓRROGAS/PLAZO: 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0495 2018 INTERVENTOR: CONSULTEC

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO RESIDENTE DE ACUERDO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO PUERTO GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PUERTO GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO GUACAS-GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO GUACAS -GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJE

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			BIP	Costos de Inversión (I)	CIE	IIC
		Obra (E)	Ajustes (A)	Total (Cmás A)				
En el mes:	$ 850.129.760,28	$ 459.054.493,00	$	$ 459.054.493,00		$ 51.329.643,00	100,00%	11,23%
Acumulado:	$ 3.992.514.588,59	$ 2.007.396.667,00	$	$ 2.007.396.667,00	15,68%	$ 377.247.863,00	100,00%	18,63%
		$ 2.511.936.771,17	(E)					

	IVV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Saldo Programado para los meses faltantes del plazo.
Cantidades:	46,33%	9,67	88,73%	1,13	$ 4.110.865.296,78	0	-	$ 4.110.865.296,78
Intervención:	0,00%	9,67	88,73%	1,13	$ 350.591.119,00	0	-	$ 350.591.119,00

F: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA)
I: Valor acumulado del contrato (incluido IVA)

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2018	$ 6.414.000.987,19
Total	$ 6.414.000.987,19

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
COSTOS SOCIALES	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presente estructura económica contractual

ULTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	09/05/2018	07/01/2019
Salario, Prestac y Garantías extensión del amparo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/01/2018	07/01/2021
Calidad de Calzada y Diseños	31/12/2018	07/01/2024
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2018	07/01/2024

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	09/05/2018	07/01/2019
Otros		

Documentos y fecha de vencimiento otras garantías y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES: Indicar si se dio en que va con cuenta el proceso administrativo de multa e informe a la fecha

CONCEPTOS DADOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Oficio PNC-495-018-455, referencia para dar solicitud en la construcción de levantamiento en el barrio Psicobuitrus.

Oficio PNC-495-208-5-136, Elaboración para remover vista huella del sector de puente Tolda K3+160 al K3+440

Oficio PNC-495-221-2-136, Mantenga tanto a la ejecución de la obra por los pagos oportuno del personal

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Las demás relevante en los días tramos vigue produciendo (en orden), que siguen impidiendo el cobro de los mismos sobre el mismo hasta los cobros. Por estos motivos tramos los pasos de Don Joaquín (K1+000) y el Sinaloa (K9+600) se han determinado, a fal punto con por algunos días no hayan finalizado el contrato

Se han presentado inconvenientes con el paso del sustito de los trabajadores por parte del subcontratista

La PNC con los cumplimientos actuales no alcanza a terminar la subida y el tramo estimado. En varias ocasiones trabajos (10 de) y en las reuniones de comité de obra, en los cronogramas sobre una mayor implementación y seguimiento de la mano con el personal, pero con los días de lluvia, el subsuelo y tramos de los mismos

Firma:
Nombre: Natalia del Pilar Peña Sánchez
Director de Interventoría
Matrícula No. 76202246323 CND

Original: Oficina principal Archivo de Gestión del contrato (Unidad Ejecutora)
Copia: Interventoría / Contratista

28

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	M-INFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ABRIL

CONTRATO No. 0492 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		total
Retroexcavadora 1 Cat (con martillo)	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		23
Retroexcavadora 2 CAT 420 F	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		23
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Motoniveladora	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		A	A	A	A	I	I		I	I		4
Vibro compactador 1	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		A	A	A	A	I	I		I	I		4
Vibro compactador 2	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Camioneta doble cabina	A	A	A	A	A	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		18
Volquetas de 7 m3 (1)	I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 1	A	A	A	A	A	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		18
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 2	A	A	A	A	A	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		18
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 3	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 4	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Vibradores de concreto 2	A	A	A	A	A	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		18
Vibradores de concreto 3	A	A	A	A	A	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		18
Vibradores de concreto 4	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		0
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión (retroexcavadora)	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I			I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		19
Compactadores manual vibratorio (Rana) (2)	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A			I		A	A	A	A	A	A		A	A		19
total	9	9	9	9	9	4	0	3	3	3	3	10	10	0	9	9	9	0	0	0	0	11	11	11	11	9	9	0	9	9	0	188

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

Firma: Wilker A Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma:
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0731 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 4 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ABRIL

CONTRATO No. 0490 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTAL
Retroexcavadora 1 Cat (con martillo)	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Retroexcavadora 2 John Deere 310 k	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		23
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J	A	A	A	A	A	A		A	A	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		8
Motoniveladora	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A		13
Vibro compactador 1	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A		13
Vibro compactador 2	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Camioneta de Estacas	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		13
Volquetas de 7 m3 (1)	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		11
Mezcladoras de concreto de mínimo 2.0 bultos 1	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		13
Mezcladoras de concreto de mínimo 2.0 bultos 2	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		17
Mezcladoras de concreto de mínimo 2.0 bultos 3	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Mezcladoras de concreto de mínimo 2.0 bultos 4	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Vibradores de concreto 2	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		13
Vibradores de concreto 3	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Vibradores de concreto 4	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I		0
Equipo de Topografía	I	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A		6
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1	A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		13
Compactadores manual vibratorio (SALTARIN) (2)	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A		13
TOTAL DIAS/MAQUINA	9	9	9	9	9	9	0	4	4	4	4	5	5	0	10	10	10	0	0	0	0	8	8	8	8	10	10	0	11	11	0	192

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

Firma
Nombre: PABLO ALBERTO VALENCIA R
Director de Obra Comité Cafeteros
Matrícula No.: CND 821

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEBOS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTOF SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME ABRIL CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018 CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA SECTOR: PUAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA I 0926 - 2018 INTERVENTOR: COPESA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		total
LUIS NORBERTO SANCHEZ RENDON	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X				
ANDRES FELIPE SOTO ARISMENDY	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
DIEGO FERNANDO TOBON GUINTERO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
ABSALON DUQUE	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JHON OROZCO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
WILLIAN ORREGO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
CARLOS PIÑEDO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
MARIO TABARQUINO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JHON PARRA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JAVIER MUÑOZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
CARLOS AVILA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
EDISON ZULUAGA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
HOLGUER REINA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
NELSDON C FUENTES	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
YEISON CASTAÑEDA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
LUIS GONZALES	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
COSTAIN CLARO RAMOS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoria que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma: Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 CND

Firma:
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoria
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

83

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ABRIL

CONTRATO DE OBRA No. 0458 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0835 - 2018

INTERVENTOR: COPESA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		total
PABLO ALBERTO VALENCIA R.	DIRECTOR OBRA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
PABLO ALEJANDRO GRANADOS VALENCIA	INGENIERO AUXILIAR	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
MARIA INES VELEZ SANCHEZ	SOCIAL	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
GLORIA ELENA PELAEZ	SOCIAL -INCAPACITADA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
EDWAR DARIO BENITEZ SANCHEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
FABIO BETANCOURTH VALENCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
ANDRES MAURICIO CLAVIJO RUGGERIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JAIRO COMBITA MORENO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JOHN JAIRO COMBITA VARIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
MARCOS COY ARIZA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
EZEQUIEL DIAZ CATRIGA	AYUDANTE	X																														
ERIKA ANDREA PARRA GARRO	AYUDANTE	X																														
JORGE IVAN MUÑOZ ORREGO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
HUGO OJEDA ARBAYLO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
MARIA EDILMA ZAPATA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
CRISTIAN DAVID VELASQUEZ COLLAZOS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
GERARDO VIANA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
LUIS EDUARDO OROZCO PEREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
EDWIN GIOVANNY CORREGO ROJAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JULIO CESAR OSORIO ARIAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
LUIS ALBERTO PAILLA RENGIFO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
FREDY JOHANY PINZON SANCHEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JOSE ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JOSE MIGUEL RAMIREZ YATE	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
SERGIO ALEJANDRO SALDAÑO OSORIO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma: Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-222347 CND

Firma:
Nombre: EDISSON PALACIOS OJEDA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-5751 FEM/08

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Director Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ABRIL

CONTRATO DE OBRA No. 0488 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAD -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0625 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														TC
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X																				
FABIAN SIERRA MORALES	INGENIERO AUXILIAR	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
MARIA INES VELEZ SANCHEZ	SOCIAL	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
RICARDO CLARETH GARCIA ROJAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
DULMAR ORLANDO BERNAL ARANGO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X												
JHONATAN MONTOYA RUBIO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
DAIRO ALEJANDRO GONZALEZ PULGARIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X					
JHON FABIO PEREZ RENDON	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JHOBANY ALBERTO ALVAREZ PEREZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X												
JHONATAN DAVID MONTENEGRO GUALTEROS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JACINTO PERDOMO PIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
LUIS FERNANDO PEREZ RENDON	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JHON DAIRO MARIN GARCIA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
JHON JAMER RENDON RENDON	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X												
OSCAR JAVIER RINCON ALZATE	AYUDANTE	X																		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ SAVEDRA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
EDUARDO SUAREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
ANDREY ALEXIS HORTUA HOLGUIN	AYUDANTE	X																														
CESAR AUGUSTO GAVIRIA POSADA	AYUDANTE	X																														
TOTAL																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALBERTO VALENCIA R.
Director de Obra Cuerpo Cafeteros
Matrícula No.: 0920-031

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEBUS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
FECHA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINO

FECHA: 03 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: 0196 - 2018

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUJAO - GENOVA

SECTOR: PUJAO - GUADUAS Y GENOVA - QUINCE 2

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	418	800-0402-0000-2018-1101-01-0001	10000	NACION	196	$ 419.239.992,93
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 419.239.992

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Periodo de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.418 De (28/01/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Recibo parcial	sep-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 419.239.992,93	0,00	$ 419.239.992,93	NA		NO	
2	Recibo parcial	sep-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 419.239.992,93	0,00	$ 419.239.992,93	NA		NO	
3	Recibo parcial	oct-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 419.239.992,93	0,00	$ 419.239.992,93	NA		NO	
4	Recibo parcial	nov-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 419.239.992,93	0,00	$ 419.239.992,93	NA		NO	
5	Recibo parcial	dic-18	89.322.926,44	16.812.066,40	99.934.992,84	0,00	0,00	$ 319.304.994,09	0,00	$ 319.304.994,09	NA		NO	
6	Recibo parcial	ene-19	329.374.917,00	0,00	329.374.917,00	0,00	0,00	$ 690.829.267,09	0,00	$ 690.829.267,09	NA		NO	
7	Recibo parcial	feb-19	431.134.424,00	0,00	431.134.424,00	0,00	0,00	$ 559.744.843,09	0,00	$ 559.744.843,09	NA		NO	
8	Recibo parcial	mar-19	377.896.375,00	0,00	377.896.375,00	0,00	0,00	$ 181.848.468,09	0,00	$ 181.848.468,09	NA		NO	
9	Recibo parcial	abr-19	330.321.692,00		330.321.692,00	0,00	0,00	$ 851.486.776,09	0,00	$ 851.486.776,09	NA		NO	
						0,00	0,00	$ 851.486.776,09	0,00	$ 851.486.776,09	NA		NO	
	TOTALES					0,00	0,00	$ 851.486.776,09	0,00	$ 851.486.776,09	NA		NO	

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse antes o en ésta fecha.

BALANCE FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 138.280.208,00	0,00	$ 138.280.208,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y SABADOS A LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	89.322.926,44	16.812.066,40	99.934.992,84
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	99.113.809,72	13.131.629,28	80.245.400,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	99.113.809,72	13.131.629,28	80.245.400,00
ESTUDIOS Y CARACTERIZACIÓN VIAL ACORDE A LA RESOLUCIÓN 1682 DE 2013	14.967.290,00	2.782.841,18	17.450.000,00
SALDO			14,28
VALOR TOTAL	$ 374.380.426,71	0,00	$ 419.239.992,93

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la programación económica aprobada.

NOTAS:

El responsable del monitoreo / seguimiento corresponde al consignado por el reporte SIIF (incluir las aclaraciones pertinentes)

Nombre: PABLO ALBERTO [illegible]
Director de Obra
Matrícula No.: DND 031

Nombre: [illegible]
Director de Interventoría
Matrícula No.: [illegible]

37

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
VERSIÓN			
FECHA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/04/2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	15	22	11	19	21	24	23	23	23	23	24	24	24	24	24	20	18	18	17	18	9	22	21	24	23	24	24	24	24		632
Lluvias moderadas		9		11						2							4	2	3	4	6	9		3		1	1					55
Lluvias intensas	2		2	2	5	3		1	1	3	1							4	3	3		6	2									38
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	0	725

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro pluviométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
VERSIÓN			
FECHA	1	DE	1

FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/04/2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: GÉNOVA-GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	22,5	19	21,5	12	19	21	24	24	24	19	23	24	24	22	20	18	19	21	22	20	21	19	21	22	24	24	24	24	24	24		646
Lluvias moderadas						3				2				1	4	4	5		2	3	3		3	2								32
Lluvias intensas	1,5	5	2,5	12	5					3	1			1		2		3		1		5										42
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro pluviométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: PABLO ALBERTO VALENCIA R
Director de Obra Comité Cafeteros
Matrícula No.: QND 031

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/06

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

AC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "I D E A M"

GRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

BOLETÍN DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

AÑO: 2019
MES: ABRIL
DIA: 29

ESTACION AEROPUERTO	PRECIPITACIÓN (mm)			DIAS CON LLUVIA		FENÓMENO METEOROLÓGICO RELEVANTE	TEMPERATURA (°C)		
	DIA	ACUMULADO	PROMEDIO	ACUMULADO	PROMEDIO		MED	MAX	MIN
	29	EN EL MES	MENSUAL	EN EL MES	MENSUAL		DIA	DIA	DIA
							29	29	30
Armenia	0,0	331,2	262,6	23	20	Bancos de niebla	23,1	29,2	18,0

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "I D E A M"

GRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

BOLETÍN DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

AÑO: 2019
MES: ABRIL
DIA: 24

ESTACION AEROPUERTO	PRECIPITACIÓN (mm)			DIAS CON LLUVIA		FENÓMENO METEOROLÓGICO RELEVANTE	TEMPERATURA (°C)		
	DIA	ACUMULADO EN EL MES	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADO EN EL MES	PROMEDIO MENSUAL		MED DIA	MAX DIA	MIN DIA
	24						24	24	25
Armenia	0,0	316,4	262,6	20	20	NIEBLA DENSA	21,9	27,6	17,4

42

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Ingeniería de Calidad

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO. METODO DEL CONO DE ARENA

(MÉTODO DEL CONO DE ARENA - E 161-13 AASHTO T-191-04 ASTM D-1556-00 NTC 1667)

Cod:	1104	Fecha:	25 de abril de 2019
Obra:	TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	Material:	SUB BASE
Localizacion:	GENOVA - QUINDIO	Procedencia:	AGREGADOS ÉXITO
Solicito:	ING. PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	Densidad Max (gr/cm3)	2,285
Cliente:	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	Gravedad Especif. Agregado Grueso (gr/cm3)	2,505

PRUEBA No.	N° 1	N° 2								
ABSCISA /UBICACION	K17+645 Eje	K17+745 Derecho	K18+818 Izquierdo Peralte							
Peso frasco arena inicial (gr)	5886	5799	5690							
Peso arena restante (gr)	2507	2544	2393							
Peso arena usada (gr)	3379	3255	3297							
Constante del cono (gr)	1781	1781	1781							
Peso arena en el hueco (gr)	1598,0	1474,0	1516,0							
Densidad de la Arena (gr/cm3)	1,400	1,400	1,400							
Volumen del hueco (cm3)	1141,4	1052,9	1082,9							
Peso del material extraido con "3/4" en gr	2958,0	2702,0	2752,0							
Peso del material retenido tamiz 3/4" en gr	879,0	742,0	766,0							
% de gravas retenidas "3/4"	29,72	27,46	27,83							
Densidad húmeda (gr/cm3)	2,591	2,568	2,541							
Humedad Ponderada %	9,30	9,00	8,20							
Densidad seca del sitio (gr/cm3)	2,371	2,354	2,349							
Densidad Corregida Laboratorio (gr/cm3)	2,415	2,408	2,410							
%Compactacion del terreno	98,0	97,8	97,5							

OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS 2013 CON CORRECCION POR HUMEDAD Y POR PARTICULAS GRUESAS SEGUN INVIAS E-228-07 HUMEDAD SEGUN NORMA 150, 122. CON CORRELACION SEGUN CALIBRACION EQUIPO.

ING. FRANK E. OSORIO VALENCIA

TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	REVISO	GERENTE
ANDRES FABIAN OCAMPO CAÑAS	ING. LUISA FERNANDA BURITICA	ING. FRANK EDWARD OSORIO

Carrera 12 N°8-06 Tel:7354640 e-mail: fosorio.byo@gmail.com, lfburitica.byo@gmail.com
ARMENIA - QUINDIO

44

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL CANCO DEL CICAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CLIENTE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194 **FECHA** martes, 26 de marzo de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm²	Carga en KN	Resistencia Kg/cm²	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	1	6-mar.-19	23-mar.-19	19	2,84	60,12	159,2	135,57	2479	3000	90,83%	Viga 1, K384664	3	
1194	1	6-mar.-19	23-mar.-19	19	2,47	60,12	146,2	124,51	2600	3000	89,49%		4	
1194	2	6-mar.-19	23-mar.-19	19	2,99	60,12	130,2	110,85	2266	3000	73,54%	Escala Alcanzalitado K374675	4	

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7454640 Cel: 3188813733 - 3105056247
laboratorio.byu@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorización por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODS PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CLIENTE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1104

FECHA sábado, 16 de marzo de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm²	Carga en KN	Resistencia Kg/cm²	Resistencia MPA	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	9	16-feb.-19	16-mar.-19	28	2,44	65,52	363,8	567,01	55,61	3000	189,04%	Placa Huella K3+300 (Acelerado a 3 días)	6	CUMPLE
1104	8	16-feb.-19	16-mar.-19	28	2,46	65,55	388,6	605,61	59,41	3000	198,03%		4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-05 Tel 7594640 Cel 3183815710 - 3105356247
laboratorio.iyo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorización por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingenieria de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL CASCO URBANO DEL CASCO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CLIENTE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1304

FECHA Armenia, 18 de marzo de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm²	Carga en KN	Resistencia Kg/cm²	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	10	18-feb.-19	18-mar.-19	28	2.40	44.92	201.2	2823.6	4091	3000	134.13%	Ciclopeo Placa Huella K3+280	4	CUMPLE
1104	10	18-feb.-19	18-mar.-19	28	2.38	84.95	242.8	3541	4135	3000	137.72%		4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7554640 Cel: 3188813710 - 3205658243
laboratorio.lyq@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorización por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CLIENTE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1184

FECHA martes, 19 de marzo de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm²	Carga en KN	Resistencia Kg/cm²	Resistencia PSI	Resistencia (Psi)	% Alcanzado	Localizacion	Tipo de Falla	Estado
1184	11	15-feb.-19	19-mar.-19	28	2.56	78.57	288.4	3670	3679	3400	109,21%	Cilindro Placa Huella K3+550	3	CUMPLE
1184	11	15-feb.-19	19-mar.-19	28	2.52	69.71	279.5	3670	4262	3800	185,39%		3	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7554660 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.lyo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorización por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL DCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CODIGO 1104 FECHA viernes, 15 de marzo de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm²	Carga en KN	Resistencia Kg/cm²	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	14	1-mar-19	15-mar-19	14	2.37	84.95	182.3	218.87	3116	3000	103.86%	Muro 4 K8+639	4	CUMPLE

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingenieria de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CODIGO 1104 **FECHA** lunes, 18 de marzo de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm²	Carga en Kilogramos	Resistencia Kg/cm²	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	10	18-feb.-19	18-mar.-19	28	2.40	83.32	23512	282.90	4024	3000	134,13%	Ciclopeo Placa Huella K3+280	4	CUMPLE
1104	10	18-feb.-19	18-mar.-19	28	2.38	84.95	24218	290.51	4132	3000	137,73%		4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056243
laboratorio.byu@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank Lozano

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorización por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CODIGO 1104

FECHA martes, 16 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	16	2-abr.-19	16-abr.-19	14	2,54	80,12	181,5	231,00	3286	3000	109,52%	Muro 1 Caisson, Pijao	3	CUMPLE
1104	17	2-abr.-19	16-abr.-19	14	2,56	80,12	206,7	263,13	3742	3000	124,75%	Bordillo Cuneta Pijao	3	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETO
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CODIGO 1104

FECHA jueves, 11 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	15	13-mar.-19	11-abr.-19	29	2,47	80,12	306,3	389,87	5545	3000	184,84%	Muro 4, Pijao	3	
1104	15	13-mar.-19	11-abr.-19	29	2,47	80,12	300,7	382,74	5444	3000	181,40%		4	
1104	16	2-abr.-19	11-abr.-19	9	2,43	81,71	150,1	187,34	2664	3000	88,82%	Muro 1 Caisson, Pijao	3	

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

29

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CODIGO 1104

FECHA martes, 30 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1104	16	2-abr.-19	30-abr.-19	28	2,45	83,32	202,7	248,06	3528	3000	117,61%	Muro 1 Caisson, Pijao	4	CUMPLE
1104	17	2-abr.-19	30-abr.-19	28	2,48	83,32	235,7	288,45	4103	3000	136,75%	Bordillo Cuneta Pijao	4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETO Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA lunes, 01 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	1	4-mar.-19	1-abr.-19	28	2,43	83,32	200,8	245,75	3495	3000	116,51%	Muro 1, K18+964	4	CUMPLE
1194	1	4-mar.-19	1-abr.-19	28	2,62	84,95	205,6	246,80	3510	3000	117,01%		4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA miércoles, 03 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	3	20-mar.-19	3-abr.-19	14	2,46	89,92	195,9	222,15	3160	3000	105,32%	Descole Alcantarillado K17+738	3	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA viernes, 05 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	2	6-mar.-19	5-abr.-19	28	2,60	80,12	151,3	192,57	2739	3000	91,30%	Escole Alcantarillado K17+675	3	BAJO

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA miércoles, 17 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cm^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	3	20-mar.-19	17-abr.-19	28	2,44	89,92	225,4	255,60	3635	3000	121,18%	Descole Alcantarillado K17+738	4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETO Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA jueves, 11 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistaacia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	4	23-mar.-19	11-abr.-19	19	2,58	80,12	180,9	230,26	3275	3000	109,17%	Muro 4, Genova, Quindio	4	

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

58

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA sábado, 13 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	5	5-abr.-19	12-abr.-19	7	2,36	81,71	152,7	190,56	2710	3000	90,34%	Muro 5, Genova, Quindio	3	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CODIGO 1194

FECHA sábado, 20 de abril de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	4	23-mar.-19	20-abr.-19	28	2,54	80,12	207,9	264,60	3763	3000	125,45%	Muro 4, Genova, Quindio	4	CUMPLE
1194	5	5-abr.-19	20-abr.-19	15	2,47	89,92	190,2	215,64	3067	3000	102,24%	Muro 5, Genova, Quindio	4	

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 93-LAD-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 704588

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.
N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
006	PLACA PISO K17+885 (1)	2019-04-05	30.8	30.8	15.5	188.7	1.99	19	2019-04-24	13324	1.00	2.293	474900	256.6	25.3	21	120.6	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	FIRMA: FECHA:	Pág. 1/1 2019-04-25

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC IDONEC 17025-2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO** **NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 702350

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm²)	Relación (h/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm³)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm²)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
005	ZARPAS MODULO 2, MURO 4 ,K8+670 (M.D)	2019-03-13	31.0	31.0	15.2	181.5	2.04	28	2019-04-10	13855	1.00	2.463	584000	328.2	32.4	21	154.2	Cono y 6

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	FIRMA: _____ FECHA: _____	Pág. 1/1 2019-04-10

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	1 de 1
FECHA	30 / 4 / 2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y PENSILVA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0499 2017

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2019

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - QUIMBAYA Y GENOVA - QUIMBAYA

VERIFICACION DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días Mes (Base Liquidación)	IBC	Días del Mes																																	EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razon Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
		ABRIL	30	7.964.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		10607000	30	10607000	30	10607000	30	10607000	30		
		ABRIL	30	1.094.000.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		10607000	30	10607000	30	10607000	30	10607000	30		
		ABRIL	30	1.112.000.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		10607000	30	10607000	30	10607000	30	10607000	30		
		ABRIL	30	10.993.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		84607108070	30	84607108070	30	84607108070	30	84607108070	30		
		ABRIL	30	10.446.700	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		84607108070	30	84607108070	30	84607108070	30	84607108070	30		
		ABRIL	30	1.099.700.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	11.051.600	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	1.099.000.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	4.504.800	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	10.636.679	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	9.713.843	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	1	44.034.994	X																														39843727	1	39843727	1	39843727	1	39843727	1		
		ABRIL	1	4.514.000.467	X																														39843727	1	39843727	1	39843727	1	39843727	1		
		ABRIL	30	10.435.722	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	14.767.500	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	11.051.600	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	1.099.700.000	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		
		ABRIL	30	9.713.843	X	X	X	D	D	X		D	D	D	X	X	X		D	D	D		X		X	X	X	X	X	X		X	X		39843727	30	39843727	30	39843727	30	39843727	30		

NOTA:

1. El responsable del pago debe ser responsable al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social no responde al nombre del Contratista de la prestación de servicios.

2. El interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. Mediante oficios No FNC-609-2018-0869 radicado el 23 de enero de 2018, y FNC-609-2018-1182, se solicita al contratista los aportes de seguridad social y su vinculación con SERVICOOL, a la fecha de elaboración de este informe aún se habia hecho llegar el dia del personal profesional. La Federación manifiesta que SERVICOOL, es una empresa temporal que se utiliza, mientras se vincula directamente al personal.

4. Se anexan resoluciones de pensión del Sr Pablo Alberto Valencia #RESOL 3613 de 21 de enero de 2015 de la caja de Pensión Social y de Bloria Inés Velez #RESOLUCION DEL 2005 del Seguro Social (colpensiones).

5. La Federación asume el pago de seguridad social del personal durante el 23 de enero de 2018 del Director, de los ingenieros Wilber Jordan, Pablo Alejandro Quevedo y Fabian Soma.

6. Mediante oficios No FNC-609-2018-0868 de fecha 23 de febrero, solicita la modificación de planilla de pago de algunos trabajadores, errores de documento, que debieron marcarse un dia y de otros que no aparecen y que trabajaron, y el tipo de vinculación de SERVICOOL S.A.S. con la FEDERACION. Tan se han efectuado correcciones.


7. A la fecha de este informe, la Federación no ha hecho llegar la planilla de pago de los trabajadores [illegible] dias en el mes laborados, de maquinarias, cuya solicitud se han radicado en las oficinas de obra de los dias 01 y 14 de febrero de 2018. Se anexan y oficios FNC-609-2018-0868 y FNC-609-2018-100.

8. La señora Gloria Elena Pelaez se encuentra en incapacidad por accidente laboral el 20 de febrero 2018. La federación aporta la seguridad social del mes de febrero del personal profesional mediante oficio GDS19000387 de fecha 20 de marzo de 2019, quedando pendiente la entrega del personal en obra operativo.

9. Mediante oficio FNC-609-2018-129, radicado el 23 de enero de 2018 [illegible] contratista cancela de pago de seguridad social del personal en abrogaciones, viaticos, alimento, ajustables, subsidios, operadores de maquinaria en obra).

Firma:
Nombre: PABLO ALBERTO VALENCIA
Director de Obra Contratista
Matricula No.: 0760-02

Firma:
Nombre: ANDRES DEL RIAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2202286670 CND

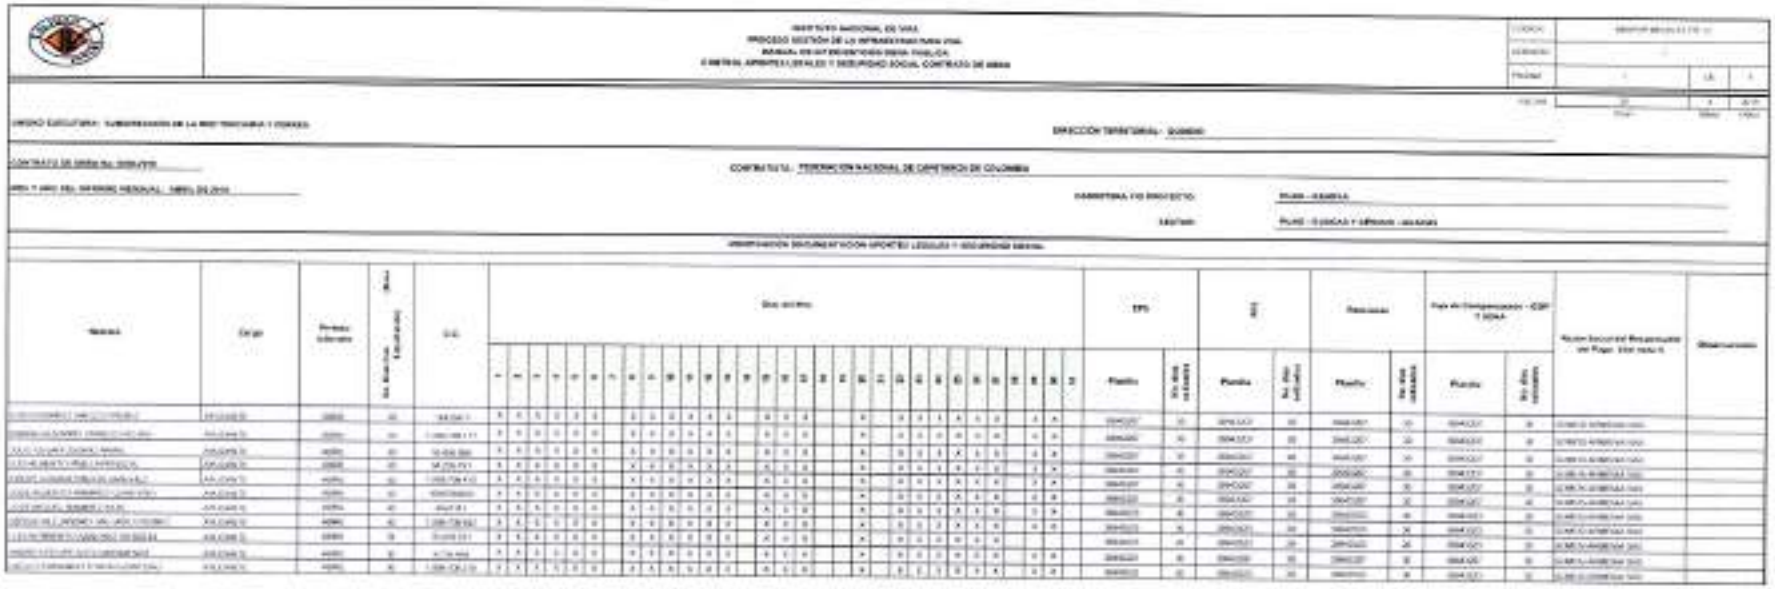

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y PUERTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 0008 DE 2016

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2016

CARRETERA Y/O PROYECTO: PLANO – ESMERALDA

TRAMO: PLANO - CUSCAZU Y ESMERALDA - LAS AGUAS

DESCRIPCIÓN SEGURIDAD SOCIAL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombres	Cargo	Periodos Laborados	Días Base Cotización	C.C.	Días del mes																																					EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Nuevo Ingreso del Respectivo mes Reporte: Solo nuevo	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																	
																																										Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		

Firma
Nombre:
Cargo:
Cédula de Ciudadanía No.:

Firma
Nombre:
Dirección de Interventoría
Número No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	[illegible]		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	[illegible]	[illegible]	2016

UNIDAD EJECUTORA: [illegible]

DIRECCIÓN TERRITORIAL: [illegible]

CONTRATO DE OBRA No. [illegible]

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: [illegible]

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CARRETERA Y/O PROYECTO: [illegible]

SECTOR: [illegible]

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes (1–31)	EPS Planilla	EPS No. días cotizados	ARL Planilla	ARL No. días cotizados	Pensiones Planilla	Pensiones No. días cotizados	Caja de Compensación - ICBF Y SENA Planilla	Caja No. días cotizados	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NOTA:

1. [illegible]

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

Firma:
Nombre: [illegible]
Director de Obra [illegible]
Matrícula: [illegible]

Firma:
Nombre: [illegible]
Director de Interventoría
Matrícula No. [illegible]

65

aportes en línea

Planil Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900566226	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467377	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	4442.78033	8492108079	E	2019/05/08	2019/05/08	BANCOLOMBIA	0	$140,471,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: ESPECIALIZADOS ARMENIA (4 Afiliados)																					$4,878,000	$652,700			$4,878,000	$511,400			$4,878,000	$365,800			$4,878,000	$292,600			$1,822,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																					$2,438,000	$390,100			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600			$585,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$2,438,000	$390,100			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600			$585,300
1	CC	1000							X											25-14	28	$2,438,000	$390,100	EPS044	28	$2,438,000	$97,600	CCF43	28	$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600	28	28	$585,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																					$466,400	$74,700			$466,400	$18,700			$466,400	$13,300			$466,400	$13,300			$114,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$466,400	$74,700			$466,400	$18,700			$466,400	$13,300			$466,400	$13,300			$114,600
2	CC	1094897			X															236301	11	$466,400	$74,700	EPS005	11	$466,400	$18,700	CCF43	11	$466,400	$13,300		11	$466,400	$13,300	11	11	$114,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)																					$4,174,600	$187,900			$4,826,000	$161,900			$4,826,000	$380,400			$4,826,000	$380,400			$790,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																					$4,174,600	$187,900			$4,826,000	$161,900			$4,826,000	$380,400			$4,826,000	$380,400			$790,400
3	CC	1111			X															236301	11	$1,736,600	$187,900	EPS044	11	$1,736,600	$47,000	CCF43	11	$1,736,600	$47,000		11	$1,736,600	$81,300	11	11	$363,700
4	CC	4442							X												0	$0	$0	EPS037	28	$2,437,400	$114,100	CCF43	28	$2,437,400	$114,100		28	$2,437,400	$243,740	28	28	$471,940
Total Afiliados(4)																					$4,878,400	$652,700			$6,930,400	$277,400			$6,930,400	$391,800			$6,930,400	$391,800			$1,822,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900566226	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467377	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	4442.78033	8492108079	E	2019/05/08	2019/05/08	BANCOLOMBIA	0	$140,471,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$652,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$390,100
PORVENIR	236301	800,224,808	8	2	$262,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$282,800
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,001,686	1	3	$282,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$277,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$277,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$277,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$144,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,700
TOTAL				4	$1,490,300

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, identificado con CC 7505550 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
	1080*680	E	2019/05/09	AFP	SINAFP	SINAFP	2019-04	2019-05	0		X													0	0,0000000	$ 0
				EPS	EPS044	MEDIMAS EPS			30		X													0	0,1250000	$ 662.500
				ARP	14-11	ARL SURA			30		X													0	0,0696000	$ 368.880
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30		X													0	0,0400000	$ 212.000
				SENA	SENA	SENA			30		X													0	0,0200000	$ 106.000
				ICBF	ICBF	ICBF			30		X													0	0,0300000	$ 159.000
				ESAP	ESAP	ESAP			30		X													0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30		X													0	0,0000000	$ 0

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA, identificado con CC 1094909620 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
				AFP	230501	PORVENIR			30																0	0,1600000	$ 525.600
				EPS	EPS544	MEDIMAS EPS			30																0	0,1250000	$ 410.600
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 228.600
	7597680	E	2019/05/09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	2019-04	2019-05	30																0	0,0400000	$ 131.500
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 65.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 98.600
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA, identificado con CC 18468702 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										IRO	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT		
				AFP	230301	PORVENIR			30																0	0,1400000	= 300.200
				EPS	EPS033	SANITAS			30																0	0,1200000	= 279.200
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696500	= 155.000
	1530*360	E	26/06/2018	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	2018-05	2018-05	30																0	0,0400000	= 89.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	= 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	= 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	= 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	= 0

PAGADO

8

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que FABIAN ENRIQUE SIERRA MORALES, identificado con CC 13993080 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	IRP	AVP	VCT			
				AFP	23/0361	PORVENIR			30																0	0,1600000	$ 306.200
				EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.			30																0	0,1200000	$ 276.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 155.500
	1580*992	E	23/08/19	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	2019-04	2019-05	30																0	0,0400000	$ 69.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 44.800
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

PAGADO

SEGURIDAD SOCIAL PIJAO – MES ABRIL

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

ARUS

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:13:41 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943823

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037391212		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					ZAPATA MUNOZ MARIA EDILMA	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	[illegible]	[illegible]	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$ 828.116	230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
[illegible]		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0

Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	5	6.960 %	$ 828.116	$ 57.700

Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

72

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:13:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4522815		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	03					VIANA GERARDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	S. Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
1 0 30 30 30			$ 828.116	[illegible]		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS044		12 %	$ 828.116	$ 100.600	$ 0

Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	5	6.960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

73

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:59:31 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					VELASQUEZ COLLAZOS CRISTIAN DAVID	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	V. Ingreso	Salario	Pensión							Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRL	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLE	INT	ELM	AVP	VCT	ETP	VDT	RET	Días AFP	Días CCF	Días ARP	Días EPS								Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS			Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC															
														0	30	30	30																																					

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 100.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:12:56 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS		
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO — **Total Afiliados** 1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099708218		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					TOBON QUINTERO DIEGO FERNANDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	S.Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$ 828.116	25 %		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
EPS044		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

75

ARUS	SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL
	Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:59:20 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207
	Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904
	Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9738469		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					SOTO ARIZMENDY ANDRES FELIPE	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	S. Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
EPS005		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	[illegible]	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0%	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

76

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

ARUS

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:12:24 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 38943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70810331		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SANCHEZ RENDON LUIS NORBERTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	[illegible]	[illegible]	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
[illegible]				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X 1 26 26 26 26			$ 828.116	230301		16 %	$ 717.701	$ 114.900	$ 0	$ 0	EPS040		12,5 %	$ 717.701	$ 89.802	$ 0	14-11	1	6.960 %	$ 717.701	$ 50.000	CCF24	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 114.900	$ 0	$ 0	$ 89.800	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

EXPERTOS en PILA

77

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:12:12 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943923

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099709942		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					SALGADO OSORIO SERGIO ALEJANDRO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	V. Incapac	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															1	30	30	30			23000		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS040		12,8 %	$ 828.116	$ 105.600	$ 0	14-11	0	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

28

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-30, 02:23:09 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7356557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4524141		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RAMIREZ YATE JOSE MIGUEL	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Subempresa	# Integral	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
SLN	IGE	LNR	VAC	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																	0	30	30	30				$ 828.116	23-14		16 %	$ 828.116	$ 132.500	0.0	0.0	EPS044		12.5 %	$ 103.500	$ 103.500	0.0	14-11	0	0.522 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	0.0	0.0	0 %	0.0	0 %	0.0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.500	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:59:10 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099708600		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RAMIREZ QUINTERO JOSE ALBERTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF																																						
															1	30	30	30			$ 828.116	220000		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS041		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	0	0,522 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	2 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	POSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS	**SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL**
	Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:58:25 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39843207
	Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904
	Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099708410		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PINZON SANCHEZ FREDY JOHANY	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	R. Integral	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

81

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

ARUS

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:58:08 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS		
Documento	NI 900708074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO — **Total Afiliados** 1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94226191		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PINILLA PENAGOS LUIS ALBERTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	[illegible]	S. Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$ 828.116	25-14		16%	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
[illegible]		12.5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	[illegible]	6.960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

82

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:57:53 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402592		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18438008		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					OSORIO ARIAS JULIO CESAR	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exonerado	S. Integral	Salario	Pensión							Salud					
[illegible]				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
1 30 30 30 30			$ 828.116	230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS016		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0

Riesgos					Caja				Parafiscales			
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:57:44 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 35943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					ORREGO ROJAS EDWIN GIOVANNY	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRP	SLN	INT	LMA	VSP	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días ARL	Días CCF	Días SENA	Días ICBF	Días ESAP	Días MEN		Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aportes AFP	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																					0	30	30	30	30	30	30	30	3.828.116	230301		16 %	3.828.116	$ 130.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	3.828.116	$ 100.800	$ 0	14-1	1	6,960 %	3.828.116	$ 57.700	0.0744	4 %	3.828.116	$ 153.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 100.800	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000

ARUS. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:57:31 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18435411		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OROZCO PEREZ LUIS EDUARDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**V. Integral**	**Salario**	**Pensión**						**Salud**					**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	IGE	SUS	IRP	Días AFP	Días PEN	Días ARP	Días CCF									Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aportes AFP	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30								$ 828.116	22-1000		16 %	$ 828.116	$ 149.500	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 828.116	$ 103.515	$ 103.500	14-1	3	0,522 %	$ 828.116	$ 37.700	CCF44	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.500	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS	**SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL**
	Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:11:28 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523
	Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904
	Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 74752500		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					OJEDA AREVALO HUGO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Sintegral	S.Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
[illegible]		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0

Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	[illegible]	[illegible] %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

86

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:11:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943623

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18435732		Residente		Extranjero	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MUNOZ ORREGO JORGE IVAN	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Subsistencia	S. Solidaridad	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
																						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																					$ 828.116	23001		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS040		12.5 %	$ 828.116	$ 103.500	$ 0	14-11	0	6.960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.500	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:57:21 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1015332497		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					IBARRA GARRO ERICA ANDREA	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]			[illegible]	230201		16 %	[illegible]	$ 4.500	$ 0	$ 0	EPS037		[illegible]	[illegible]	$ 3.500	$ 0	14-7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 2.000	[illegible]	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000

EXPERTOS en PILA

88

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:10:59 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4403954		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ ORTEGA EZEQUIEL	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	E. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
IRL	SLN	IGE	LMA	VAC	TDP	TAE	TDE	TAP	VSP	COR	VST	SUS	INC	ATEP	VIP	VTE	RET	Días APO	Días TDG	Días ANO	Días COT				Código AFP	Código Tarifa AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aportes AFP	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Código EPS	Código Tarifa EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																	X																																									
																		0	1	1	1				230301		16 %	$ 27.804	$ 4.500	$ 0	$ 0	EPS034		12,5 %	$ 27.804	$ 3.500	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 27.804	$ 2.000	55Fam	4 %	$ 0	$ 0	0 %	0	0 %	0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:57:08 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7356557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9778837		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					COY ARIZA MARCOS	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
2 30 30 30 30	$ 828.116	25-14		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
ESSC62		12,5 %	$ 828.116	$ 103.500	$ 0

Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700

Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja
CCF14	0 %	$ 0	$ 0

Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.500	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

90

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:10:36 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18436076		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Codigo Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					COMBITA VIANA JOHN JAIRO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
$ 828.116	230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS041		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF63	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

912

ARUS	SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL					
	Fecha creación reporte	2019-04-29, 03:10:25 PM	**Tipo Planilla**	E	**Número Planilla**	39943523
			Periodo Cotización	201903	**Periodo Servicio**	201904
	Cliente:					

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4524366		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					COMBITA MORENO JAIRO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exonerado	S. Integral	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			828.116	230201		16 %	828.116	132.500	$ 0	$ 0

Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS041		12.5 %	828.116	103.500	$ 0

Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	5	6.960 %	828.116	57.700

Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.500	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

92

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:10:14 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				N	CLAVIJO PULGARIN ANDRES MAURICIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Tarifa	Salario Integral	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
																				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517836.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:56:23 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
	CC 14951051					N				
Tipo Cotizante	01	00					BETANCOURTH VALENCIA FABIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Sub Interna	T. Interna	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
SNO	IGE	LNR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Días SENA	Días ICBF									Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.698	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.898

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:55:10 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096706489		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					BENITEZ SANCHEZ EDWARD DARIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exterior	S. Integral	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$828.116	230301		16%	$828.116	$132.500	$0	$0

Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS037		12,5 %	$828.116	$103.600	$0

Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-7	5	6,960 %	$828.116	$57.700

Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja
CCF44	0%	$0	$0

Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
0%	$0	0%	$0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

95

SEGURIDAD SOCIAL GÉNOVA – MES ABRIL

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:54:53 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 30943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS		
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO — **Total Afiliados** 1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18365002		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					SUAREZ RODRIGUEZ EDUARDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	R. Mayor	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			$ 828.116	[illegible]		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0

Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
[illegible]	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

97

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:09:05 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520967		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9801664		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ SAAVEDRA ANGEL GABRIEL	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exonerado	S. integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X [illegible]			[illegible]	[illegible]		16 %	$ 27.604	$ 4.500	$ 0	$ 0	[illegible]		[illegible] %	$ 27.604	$ 3.500	$ 0	14-11	[illegible]	[illegible] %	$ 27.604	$ 2.000	[illegible]	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9464 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

98

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:54:35 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099683373		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RINCON ALZATE OSCAR JAVIER	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	R. Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible] 1 00 00 00 00			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

99

![ARUS]

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:54:17 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS		
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO — **Total Afiliados** 1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9801143		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RENDON RENDON JHON JAMES	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Subtipo	N. Ingreso	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]			$ 828.116	230301		16%	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	ESS062		12.5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	[illegible]	6.960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF63	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 405 4405 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517866.

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:53:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39843207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9800220		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PEREZ RENDON LUIS FERNANDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Subtipo	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
[illegible]				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

50

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:53:26 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 32943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4428458		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PEREZ RENDON JHON FABIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																**Extranjero**	**V. Integral**	**Salario**	**Pensión**						**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
																			Código AFP	Código Tarifa AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tarifa EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X													15	15	15			$ 828.116	230201		16 %	$ 324.474	$ 64.000	$ 0	$ 0	ESS062		12.5 %	$ 324.474	$ 40.600	$ 0	14-7	0	0.522 %	$ 324.474	$ 28.600	CCF44	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:52:18 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39843207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94253025		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PERDOMO IPIA JACINTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Exonerado	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días CCF	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Traslado AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Traslado EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30				23000		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	230204		12.5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14.7	5	0.522 %	$ 828.116	$ 37.700	CCF44	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

13

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:52:07 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS		
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO — **Total Afiliados** 1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1097033725		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MONTOYA RUSSI JHONNATHAN	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Días [illegible]	Días [illegible]	Días [illegible]	Días [illegible]	[illegible]	[illegible]	Salario
X	1	30	30	30			$828.116

Pensión: Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
230301		16 %	$717.701	$114.800	$0	$0

Salud: Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS002		12,5 %	$717.701	$89.800	$0

Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-7	5	6,960 %	$717.701	$50.000

Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja
CCF44	0 %	$0	$0

Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
0 %	$0	0 %	$0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 89.800	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 86 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

104

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:08:40 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7366667		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099683760		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MONTENEGRO GUALTEROS JHONATAN DAVID	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Días	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X	2, 15, 15, 15, 15	$ 828.116	230201		16%	$ 414.058	$ 66.300?	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 414.058	$ 51.800?	$ 0	14-11	[illegible]	6,960 %	$ 414.058	$ 28.900?	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING - PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 51.800	$ 28.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517805.

105

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:08:04 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1005093547		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ PULGARIN DAIRO ALEJANDRO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exonerado	S. integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
1 30 30 30 30			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS040		12,5 %	$ 828.116	$ 103.500	$ 0

Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja
CCF44	4 %	$ 0	$ 0

Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.500	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

166

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:07:41 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943523

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70855050		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GARCIA ROJAS RICARDO CLARETH	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exterior	E. Mayor	Salario	Pensión: Código AFP	Código Tras AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
[illegible]			[illegible]	230201		16 %	[illegible]	$ 84.000	$ 0	$ 0

Salud: Código EPS	Código Tras EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS040		12,5 %	[illegible]	$ 65.600	$ 0

Riesgos: Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	5	6,960 %	[illegible]	$ 36.600

Caja: Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Parafiscales: Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

107

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:51:38 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022417375		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					BERNAL ARANGO DULMAR ORLANDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Salario	Subsidio	V. Integral	Días	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS EPS	DIAS ARP	DIAS COT																																														
																										$ 828.116	$ 0		30																												

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 100.800	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:51:19 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
umento	NI 900706074	Dirección	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7355557		
Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
dad	ARMENIA	Departamento	QUINDIO		
resentante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	Identificación	CC 18402992		

ATOS DEL AFILIADO

ocumento	CC 96603041		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
o Cotizante	01	00					ALVAREZ PEREZ JHOBANY ALBERTO	63001000 - 63		QUINDIO

APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
TAR	TDP	TAP	RTP	CDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días AFP	Días CCF	Reintegro	S. Integral		Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
													0	30	30	30			$ 828.116	28201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	14-7	1	0,348 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	3 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
ROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

RUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

109

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 03:08:19 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 38943023

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9801932		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MARIN GARCIA JHON DAIRO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días AFP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															1	16	16	16	16	16				23001		16 %	$ 524.474	$ 84.000	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 524.474	$ 65.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 524.474	$ 36.500	CCF44	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517866.

10

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-04-29, 02:51:53 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 39943207

Periodo Cotización 201903 **Periodo Servicio** 201904

Cliente:

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1097730301						N				
Tipo Cotizante	01	00					HORTUA HOLGUIN ANDREY ALEXIS	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Tarifa	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
Sec	ING	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días COT	Días APO CCF	Días COT CCF	Trabajador	V. Integral		Código AFP	Código Trad. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Total Aporte AFPS	Código EPS	Código Trad. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																30	1	1	1			$ 828.116	230301		16 %	$ 27.604	$ 4.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 27.604	$ 3.500	$ 0	14-1	3	0,522 %	$ 27.604	$ 2.000	CCF14	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS®

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte	2019-04-29, 03:07:53 PM	**Tipo Planilla**	E	**Número Planilla**	39943523
		Periodo Cotización	201903	**Periodo Servicio**	201904
Cliente:					

PAGADA 2019-04-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900708153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 89005510		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GAVIRIA POSADA CESAR AUGUSTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Extranjero	S. Integral	Salario	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
X X 0 1 1 1 1			$ 828.116	25-14		16%	$ 27.604	$ 4.500	$ 0	$ 0

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
EPS025		12.5 %	$ 27.604	$ 3.500	$ 0	14-11	1	6.960 %	$ 27.604	$ 2.000

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CCF41	0%	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 00 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

112

COPEBA LTDA.
Nit: 830.811.122-9

SIDoc - Comité Quindío
Cons: E1900376
Radi: 04/02/2019 04:32:00 p.m.

Bogotá D. C., 02 de febrero de 2019

FNC-825-2018-080

SEÑORES:
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Attn. Ing. Pablo Alberto Valencia R.
Director de Obra
Quindío

REF. CONTRATO 0825 DE 2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asunto: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Respetado Ingeniero,

Una vez revisado el pago de la seguridad social del mes de diciembre de 2018, del personal de obreros, oficiales, operadores y maestros de obra, se encontraron las siguientes inconsistencias:

1. En las planillas de pago figura que el personal solo laboró un día. Pero hay personal como el maestro de obra, un operador de maquinaria y otros que trabajaron más días.
2. Según el reporte del personal en obra hay personal al que no se le ha cancelado la seguridad social, principalmente el que laboró los días 28 y 29 de diciembre (son 4 obreros).

Por lo anterior, se solicita, muy cordialmente:

a. Rectificar las planillas de pago, donde se reconozcan los días que realmente trabajó el personal.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebahtg@yahoo.com

113

b. Realizar el pago de la seguridad social del personal que no figura en las planillas y que realmente trabajó, principalmente el personal que laboró los días 28 y 29 de diciembre de 2018.

c. Enviar el documento de relación de la empresa SIMARMENIA S.A.S, con la FEDERACIÓN.

Atentamente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ.
Director de Interventoría
Copeba Ltda.

Proyectó y elaboró: Hugo Cardona Castaño- Ingeniero auxiliar de interventoría
Revisó: Edisson Palacios – Residente de Interventoría
Aprobó: Andrea Peña S – Director de Interventoría

COPEBA LTDA.
Nit: 830.011.122-9

Bogotá - Comité Quindío
Conf: E2021170
Rad: 20-03-2019 04:50:35 p.m.

Bogotá D. C., 20 de marzo de 2019

FNC-825-2018-100

SEÑORES:
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Attn. Ing. Pablo Alberto Valencia R.
Director de Obra
Quindío

REF. CONTRATO 0825 DE 2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asunto: Recordatorio de entrega de las planillas de seguridad social

Respetado Ingeniero,

La FNC cancela las planillas de seguridad social antes del 11 de cada mes. Por esto, la interventoría le solicita la remisión de las planillas de pago de parafiscales del personal que labora en el contrato de obra 498 de 2018, así mismo, se solicita el envío de las planillas de los especialistas.

La documentación exigida, es un documento para el trámite de cuentas.

Atentamente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA S.
Director de Interventoría
Copeba Ltda.

Proyectó: Hugo Cardona Castaño – Ingeniero Auxiliar de Interventoría
Revisó: Edisson Palacios – Residente de Interventoría
Aprobó: Andrea Peña S – Director de Interventoría

COPEBA LTDA.
Nit: 830.011.122-9

SiDoc - Comité Quindío
Cons: E1900172
Rad: 22/01/2019 08:28:31 a m

Bogotá D. C., 21 de enero de 2019

FNC-825-2018-069

SEÑORES:
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Attn. Ing. Pablo Alberto Valencia R.
Director de Obra
Quindío

REF. CONTRATO 0825 DE 2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asunto: Aporte de resoluciones de pensión de personal.

La interventoría solicita que le sean aportadas las resoluciones de pensión del personal que se relaciona a continuación, el cual hace parte de la nómina del contratista:

- Ing. Pablo Alberto Valencia
- TS. María Inés Vélez

De otra parte, la residente social debe estar amparada en riesgo nivel V y el aporte se está realizando por nivel III.

También se requiere informar por qué los pagos no están cargados a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, sino a la empresa SERVICOL S.A.S.

Se solicita aportar los parafiscales del mes de diciembre de 2018.

La anterior documentación, y las actualizaciones de aportes de la residente social deben ser remitidas a la Interventoría en el comité del próximo viernes 26 de enero de 2019.

Atentamente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA S.
Director de Interventoría
Copeba Ltda.

Proyectó: Edisson Palacios – Residente de Interventoría
Aprobó: Andrea Peña S – Director de Interventoría

106

COPEBA LTDA.
Nit: 830.011.122-9

Bogotá D. C., 03 de mayo de 2019

FNC-825-2018-128

SIDoc - Comité Quindío
Cons: E1901735
Radi: 03/05/2019 02:49:49 p.m.

SEÑORES:
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Attn. Ing. Oscar Javier Zorro.
Director (E) de Obra
Armenia, Quindío

REF. CONTRATO 0825 DE 2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Asunto: Informe del mes de abril de 2019. Solicitud de documentos

Con el fin de terminar y presentar ante INVÍAS el informe mensual N°9 del mes de abril de 2019, la interventoría les solicita, muy cordialmente, lo siguiente:

1. Planilla de pago de la seguridad social del personal de la obra (profesionales, maestros, oficiales, ayudantes, celadores, operadores de maquinaria en obra)
2. Los resultados faltantes de los ensayos de laboratorio realizados en el mes de abril de 2019

Atentamente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA S.
Director de Interventoría
Copeba Ltda.

Proyectó, elaboró: Hugo Cardona Castaño- Ingeniero Auxiliar de interventoría
Revisó: Edisson Palacios Guio-Ingeniero residente de interventoría
Aprobó: Andrea Peña S – Director de Interventoría

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
NIT 860.007.538-2

Comité de Cafeteros
del Quindío

QDE19C00123

COPEBA LTDA
CONTRATO 625
Fecha: 1 febrero 2019
Hora: 11:50 am
Nombre:
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Armenia, febrero 01 de 2019

Doctora
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante legal
Copeba Ltda.
Interventoría

Referencia: Contrato de obra N° 00498 de 2018 *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017"*

Asunto: respuesta oficio FNC-825-2018-069

Cordial saludo,

En atención al asunto me permito adjuntar las resoluciones de pensión del ingeniero Pablo Alberto Valencia y la trabajadora social María Inés Vélez. Además de los parafiscales del mes de diciembre y los certificados de ARL de las residentes sociales amparadas bajo riesgo V.

Los pagos del personal se empiezan a ver reflejados en la nómina de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a partir del mes de enero de 2019.

Cordialmente,

PABLO ALBERTO VALENCIA RODRÍGUEZ
Director de Obra

3/2

PETICIONARIA RAD. Nº FOLIOS CDO SOLIC.

Sin Armenia 22/02/05

930432

21 ENE. 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE

RESOLUCION No. 2813 del 2004

RADICADO Nº 14716/2004

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pension mensual vitalicia por vejez.

La Subgerencia de Prestaciones Económicas, en uso de las atribuciones conferidas por la resolución 242 del 22 de enero de 2004, y en cumplimiento de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que el(a) señor(a) VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7506550 de ARMENIA solicita a esta Entidad el reconocimiento y pago de una pension mensual vitalicia por vejez radicada bajo el Nº 14716 de fecha 19 de abril de 2004.

Que el artículo 36 de la ley 100/93 establece:

"REGIMEN DE TRANSICION. : La edad para acceder a la pension de vejez, el tiempo de servicio o el numero de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o mas años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o mas años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, sera la establecida en el regimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demas condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variacion del Indice de Precios al Consumidor según certificación expedida por el DANE."

Que el(a) peticionario(a) aportó para la pensión los siguientes tiempos:

ENTIDAD	DESDE	HASTA	D I A S DIAS LABORADOS
CAJA NAL. DE PREV. SOCIAL CONTRATO QUIN	19751015	19780830	0 1036
MINISTERIO DE TRANSPORTE	19780901	19951030	0 6180
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	19951101	20031230	0 2940
			0 10156

119

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez DE VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO

SIENE.

que laboró un total de : 10156 dias, 1450 semanas.

que nacio el 05 de agosto de 1948 y cuenta con mas de 55 años de edad.

que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

que adquirio el estatus juridico el 05 de agosto de 2003.

que la liquidación se efectua con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario de 9 años 9 meses, conforme a lo establecido en el articulo 36 de la Ley 100/93. , y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional. entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2003 . asi:

F A C T O R E S	I.P.C	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO ACTUAL(IPC)	PROPORCION POR AÑO
1994 ASIGNACION BASICA	22.59	$ 467903.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 14230.50		
(Promedio mensual de 270 dias)		$ 502133.50	1680503.40	129269.48
(Aplica: IPC94-IPC95-IPC96-IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1995 ASIGNACION BASICA	19.46	$ 575726.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 16792.01		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 592518.01	1617083.50	165906.00
(Aplica: IPC95-IPC96-IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1996 ASIGNACION BASICA	21.63	$ 1266342.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 37518.31		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1323860.31	3025413.95	310296.87
(Aplica: IPC96-IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1997 ASIGNACION BASICA	17.68	$ 1389250.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 40519.79		
BONIFICACION POR COMPENS		$ 77181.00		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1506950.79	2831398.56	290399.65
(Aplica: IPC97-IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1998 ASIGNACION BASICA	16.70	$ 1701059.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 49614.25		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1750673.25	2795145.20	286681.56
(Aplica: IPC98-IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				
1999 ASIGNACION BASICA	8.23	$ 1905187.00		
BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 55567.92		
(Promedio mensual de 360 dias)		$ 1960754.92	2662574.14	273135.81
(Aplica: IPC99-IPC00-IPC01-IPC02)				

120

por la cual se reconoce y ordena el pago de una pension mensual vitalicia por vejez DE VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO

21 ENE. 2005

2000	ASIGNACION BASICA	6.75	$ 2069801.00		
	BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 60696.83		
	(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2130497.83	2668502.31	273682.54
	(Aplica: IPC00-IPC01-IPC02)				
2001	ASIGNACION BASICA	7.65	$ 2150032.67		
	BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 63029.50		
	(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2213062.17	2548888.49	261424.46
	(Aplica: IPC01-IPC02)				
2002	ASIGNACION BASICA	6.99	$ 2264238.60		
	BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 66040.25		
	(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2330276.25	2493162.56	255708.96
	(Aplica: IPC02)				
2003	ASIGNACION BASICA	6.49	$ 2368841.75		
	BONIFICACION SERVIC.PRES		$ 66040.25		
	(Promedio mensual de 360 dias)		$ 2434882.00	2434882.00	249731.49
	(No aplica IPC)				
				T O T A L =	$ 2.496.249.05

I.P.C. --> 1994:22.59 1995:19.46 1996:21.63 1997:17.68 1998:16.70
1999: 9.23 2000: 8.75 2001: 7.65 2002: 6.99

Pension: ($2.498.249.05X75%) = $1.873.686.78. SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 M/CTE .

DISTRIBUCION A CARGO :	DED. DIAS
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	0 10156
	10156

PROPORCION A CARGO :	VALOR-CUOTA
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	$ 1.873.686.78
	$ 1.873.686.78

efectiva a partir del 01 de enero de 2004.

Son disposiciones aplicables: Ley 100/93 art. 36, Dcto 1158/94, Dcto 01/84..

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor del(a) señor(a) VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO ya identificado(a), de una pensión mensual vitalicia por vejez, en cuantia de ($1.873.686.79) UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 M/CTE efectiva a partir del 01 de enero de 2004 . El peticionario debe demostrar retiro definitivo del servicio en los terminos previstos por la Ley, para el disfrute de esta pensión.

121

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez DE VALENCIA RODRIGUEZ PABLO ALBERTO

21 ENE. 2005

ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional pagara al interesado la suma a que se refiere el articulo anterior, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley con observancia del turno respectivo.

ARTICULO TERCERO: Deducir de cada mesada pensional el valor correspondiente para los servicios medico-asistenciales, Ley 100/93. Para tal fin el peticionario debe allegar fotocopia del formulario único de inscripción o certificacion de la EPS respectiva. De no aportarse lo anterior al momento de la notificación, la Caja Nacional de Prevision Social EICE, salvo cualquier responsabilidad por el destino del citado descuento.

ARTICULO CUARTO : Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD	DIAS	VALOR-CUOTA
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	10158	$ 1.873.686.79
		$ 1.873.686.79

ARTICULO QUINTO : La presente pensión estara sujeta a todas las incompatibilidades legales.

ARTICULO SEXTO : Notifiquese al INTERESADO haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede interponer por escrito el recurso de Reposición ante la Subgerencia de Prestaciones economicas. De este recurso podra hacerse uso dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA ARISTIZABAL BOTERO
SUBGERENTE PRESTACIONES ECONOMICAS

Sustanció: EDGAR RODRIGUEZ-ACEVEDO
EDGO - P1 - 12/01/2005

Revisó: LIDA P. MANJARRES

122

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
SECCIONAL QUINTO

PRESTACIONES ECONOMICAS

Armenia Q. 14 FEB. 2005

Notifique personalmente a INTERESADO

Le entregue Boletas

Manifiesta que

En constancia de Folio Uno

CC No. 7.524.570 Armenia

El Notificador

ISS - Centro Administrativo Nacional CAN - Apartado Aéreo 5003 - Cables "ISS" - Bogotá - Colombia

ISS-CAN-0100103-0451

RESOLUCION N° 002543 DE 2005

Por la cual se resuelve una solicitud de Prestaciones Económicas en el Sistema General de Pensiones - Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SECCIONAL RISARALDA

En uso de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O

Que el día **26 de ENERO de 2005**, el asegurado(a) **MARIA INES VELEZ SANCHEZ** , con fecha de nacimiento 24 de ENERO de 1950, C.C. 41,463,527, afiliación 941463527 200349304 de la Seccional **QUINDIO** elevó solicitud de pensión por vejez, teniendo como último patrono ANDRES VELEZ HENAO Patronal 00009730506.

Que según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de transición se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema general de pensiones tenían 35 años la mujer o 40 años el hombre o 15 años de servicios cotizados, para reconocer la pensión con la edad, tiempo y monto en él establecido.

Que el régimen aplicable en transición para los afiliados al ISS exige tener 60 años o más de edad el hombre o 55 la mujer y 500 semanas pagadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la referida edad o 1000 semanas cotizadas en cualquier época, para adquirir el derecho a la pensión, según lo dispuesto por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Que en el caso concreto del peticionario, se cumplen las condiciones anteriormente indicadas para ser beneficiario del régimen de transición y cumple los requisitos de edad y semanas exigidos para adquirir el pretendido derecho, razón por la cual se procederá a conceder la pensión de vejez solicitada a partir del 01 de MAYO de 2005.

ESTO ES UNA COPIA NO VALIDA PARA PAGO

Que en consecuencia,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer pensión por vejez a el(a) asegurado(a) MARIA INES VELEZ SANCHEZ así:

A PARTIR DE	PENSION
01 MAY 2005	381,500

La liquidación se baso en 754 semanas cotizadas, con ingreso base de liquidación $ 396,813.00 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 60.00%

ARTICULO SEGUNDO: Los valores reconocidos en la presente resolución serán incluidos en la nómina del mes de MAYO , la cual se cancela a partir del 01 de JUNIO de 2005, a través de BANCO AV VILLAS ARMENIA CENTRO Cuenta: 08000041463527.

Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación, de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en PEREIRA , a los 25 días del mes de ABRIL de 2005

ANA MARIA SARMIENTO V.
Jefe Departamento de Pensiones

ANA MARIA ZARMIENTO VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PENSIONES

ESTO ES UNA COPIA NO VALIDA PARA PAGO

NOTA: En caso de que la presente resolución no pueda notificarse personalmente al interesado, se notificará mediante edicto que será fijado el

124

equidad

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) MARIA INES VELEZ SANCHEZ identificado(a) con CC número 41463527 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS		
N° Identificación:	900566326		
Centro de trabajo:	Riesgo V - Tarifa - 6.960%	Sueldo básico:	$ 2.300.000
Inicio de cobertura:	10/07/2018	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	Activo

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web https://www.laequidadarl.coop el dia: viernes, 25 de enero de 2019 a las 08:29 AM

Cordialmente,

Maria Isabel Ortiz Quintero

Coordinador Técnico y de Procesos

LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales

equidad

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) GLORIA ELENA PELAEZ identificado(a) con CC número 30338367 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS		
N° Identificación:	900568326		
Centro de trabajo:	Riesgo V - Tarifa - 6.960%	Sueldo básico:	$ 2.300.000
Inicio de cobertura:	10/07/2018	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	Activo

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web https://www.laequidadarl.coop el dia: viernes, 25 de enero de 2019 a las 08:29 AM

Cordialmente,

Maria Isabel Ortiz Quintero

Coordinador Técnico y de Procesos

LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCIONES LA RED TERCIARIA Y VIVIENDA

DIRECCION TERRITORIAL: CUNDIO

ACTA No: 3

PERIODO DES: MES: de Abril

VALOR FACTICO ACTA: $

CONTRATO DE OBRA No:
OBJETO:

CONTRATISTA:
GESTOR:
NIT:
TRAMO:

CONTRATO DE INTERV. (CDI):

Abril - 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
PUNTO CARDINAL Y GENERAL CUNDIO

PUNTO CARDINAL

FECHA DE INICIACION: 11 de noviembre de 2019

FECHA DE TERMINACION:
VALOR INICIAL (ANUALIDAD): $
VALOR ACUMULADO: $
ANTICIPO CONCEDIDO: $

PLAZO ACUMULADO (MESES): 11
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 Enero de 2021
VALOR REPROGRAMADO: $
AMORTIZACION ANTICIPO:

INTERVENTOR: CONSULTA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ANDRES HERNAN RAMIREZ VALDES

1. AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado		Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2019	$
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATOS DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Valor Programado ($)	Avance Ejecutado Fisico Obra (Incluye IVA) Valor ($)	Ajustes ($)	Total ($ Con Aj)	Cuotas de Interventoria ($)	CIF	CIM	PC
Mes								
Acumulado								

	Dir		Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional/Adicional	Plazo Ejecutado Disponible	Valor Programado para los meses faltantes del plazo
Contratista									
Interventor									

1. Mes en curso (incluye anticipo del contratista, no lo)
2. Valor acumulado de actividades ejecutadas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción	Medidas
Calzada	
Cunetas	
Taludes	
Cap. Vegetal	
Obras	
Longitud	
Ancho	

Observaciones: Sin observaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción	Medidas
Calzada	
Cunetas	
Taludes	
Cap. Vegetal	
Obras	
Longitud	
Ancho	

Observaciones: Sin observaciones

OTRAS CONDICIONES ESPECIFICAS

	Valor en $/a
ESTAMPILLAS (Variable)	
CONTRAPARTIDA	
GESTION SOCIAL	
GESTION AMBIENTAL	
DIRECCION TECNICA (Fijo)	
VALOR TOTAL	

1. Valor consignado debera corresponder al de la propuesta económica del tramo

CONDICIONES

Programado

Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRUPO DE PARTIDAS DE PAGO (DGT)	UNIDAD	Programado (mes)	Ejecutado (mes)	Programado Acumulado (PA)	Ejecutado Acumulado (EA)	EA/PA	AVANCE ACUMULADO DE OBRA En el mes Programado	En el mes Ejecutado	Anterior Al pasado Acumulado Programado	Anterior Al pasado Acumulado Ejecutado
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML						20	0	81.700	1.000
PLACA HUELLAS	ML	150,00	110,00	679,11	465,44	68,54%	300.703	130.000	649.010	445.440
ALCANTARILLAS	UND	1,00	1,00	5,26	5,00	95,00%	22.000	22.000	3.000.000	144.000
MUROS DE CONTENCION	UND	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00%	9.000.000	22.000	3.000.000	0
OBRA SUBROGATIVA	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20	0	80	0
							$232.000	170.000	$1.730.000	589.000
							$232.017	170.000	$1.730.000	589.000


NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Avance Ejecutado Acumulado (EA)" hacen referencia a lo programado durante el mes en curso.
2. Cuando se presenten en el mes valores negativos, estos corresponden a ajustes realizados en meses anteriores.
3. Cuando se presenten valores negativos en la columna "Avance Ejecutado Acumulado" en alguna actividad se debe a ajustes presentados en meses anteriores.
4. Cuando en alguna actividad se presente un valor en la columna "Avance Ejecutado Acumulado" en una actividad se debe a ajustes presentados en meses anteriores.

Nombre:
Cargo:
Interventoria:
Cedula de ciudadanía:

Nombre: PEDRO LUIS PUENTES CANCINO
Cargo: Director de Interventoria
Cedula de ciudadanía: 79.294.643 (UD)

Original: Interventoria Archivo Dirección de Contratación y Gestión con Administradora
Copia: Supervisor Dirección Territorial

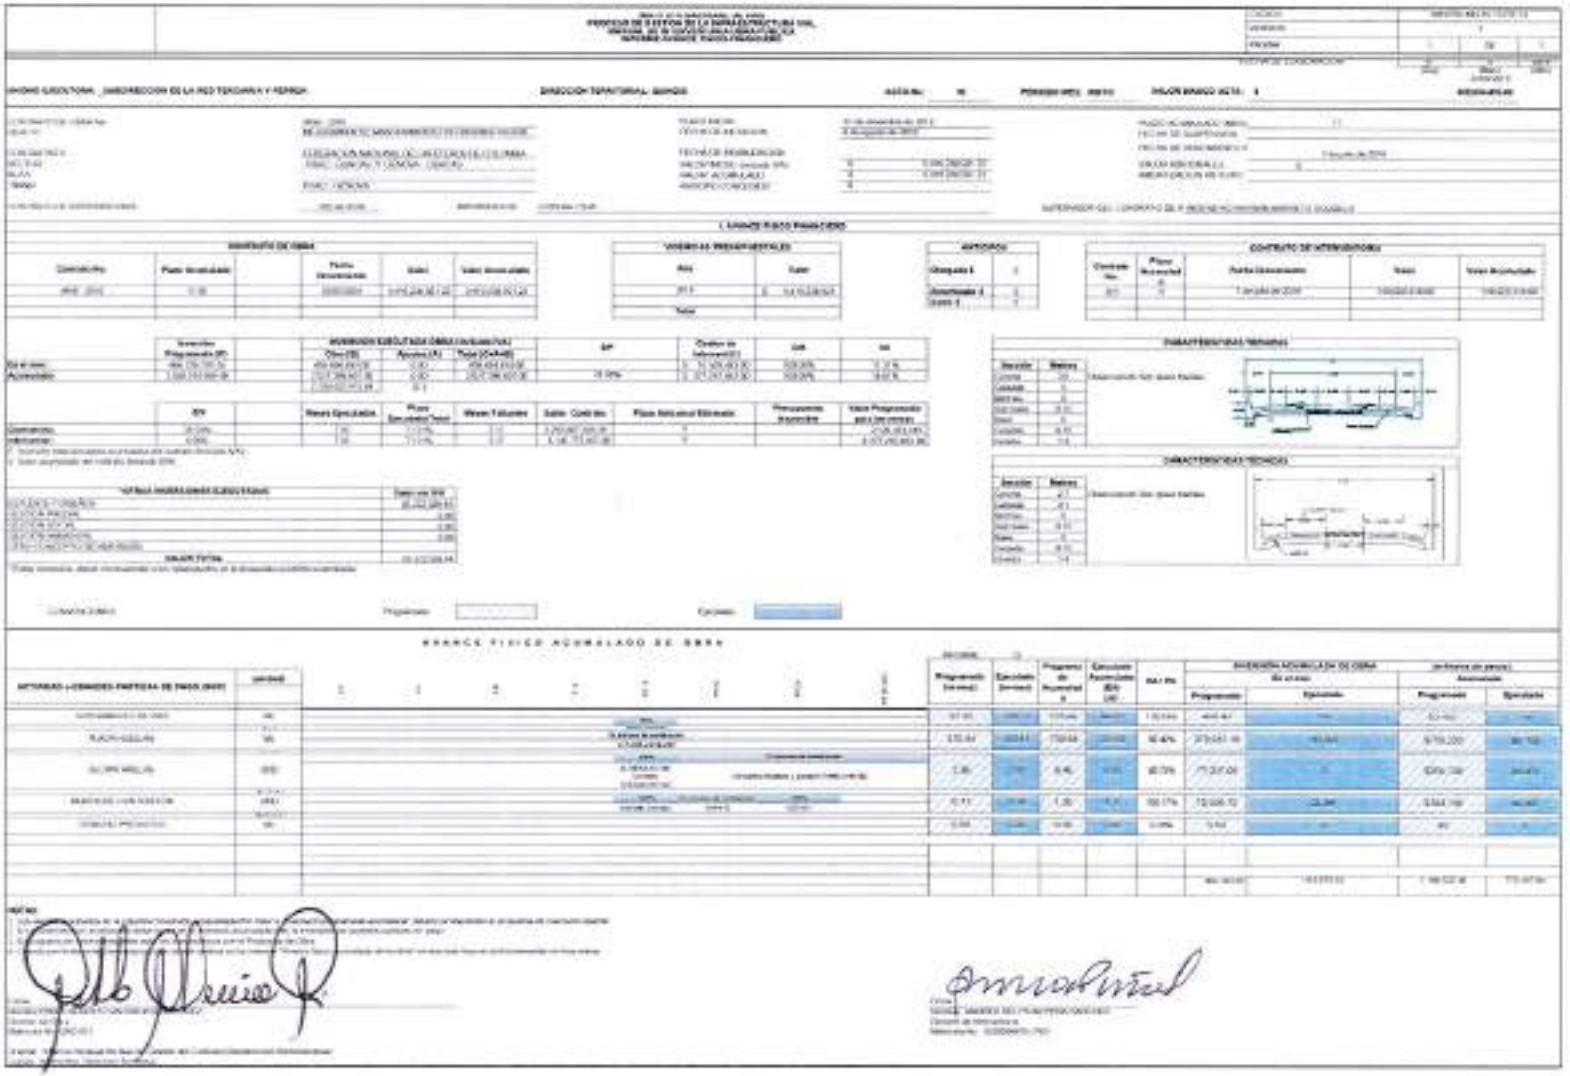

924

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 DE 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIONDE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08/08/2018

PLAZO INICIAL: 31/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5,419,238,921.23

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 99,034,808.84

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	31/12/2021
Calidad de Estudios y Diseños	30% Estudios	$ 29,511,474.00	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	31/12/2018	31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2019272-3

Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros		NA	Dia	Dia

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	07/07/2022
Calidad de Estudios y Diseños	30% Estudios	$ 29,511,474.00	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	08/07/2019	07/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7.21%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros	NA		Dia	Dia

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520266875 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 10. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) | 4 (Mes) | 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 490 DE 2018 — CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 — INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:

Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 78670 el 13 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia la anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 490 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 490 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 490 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTA, referente al anticipo

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
TOTAL		NA	NA	NA	NA	NA	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Solo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar dos o más la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre) PABLO ROBERTO VALENCIA R
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matrícula No.: QND 031

(Firma)
(Nombre) ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula No.: 3520386675 QND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

124

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CODIGO	MINFRA.MN.IN-2.FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. NA **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 490 **DE** 2018

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE ADAPTACION EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

Mediante el oficio GER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79670 el 19 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia la anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 490 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 490 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 490 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTA, referente al anticipo

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA.MN.IN-2.FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($) NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NA **FECHA** NA **VALOR** NA
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA.MN.IN-2)


OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: PABLO ALBERTO VALENCIA
Director de Obra Comité de Cafeteros
Contratista
Matrícula No.: CND 031

Firma:
Nombre: AMPARO DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Director Interventoría
Matrícula No.: 25202/99975 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

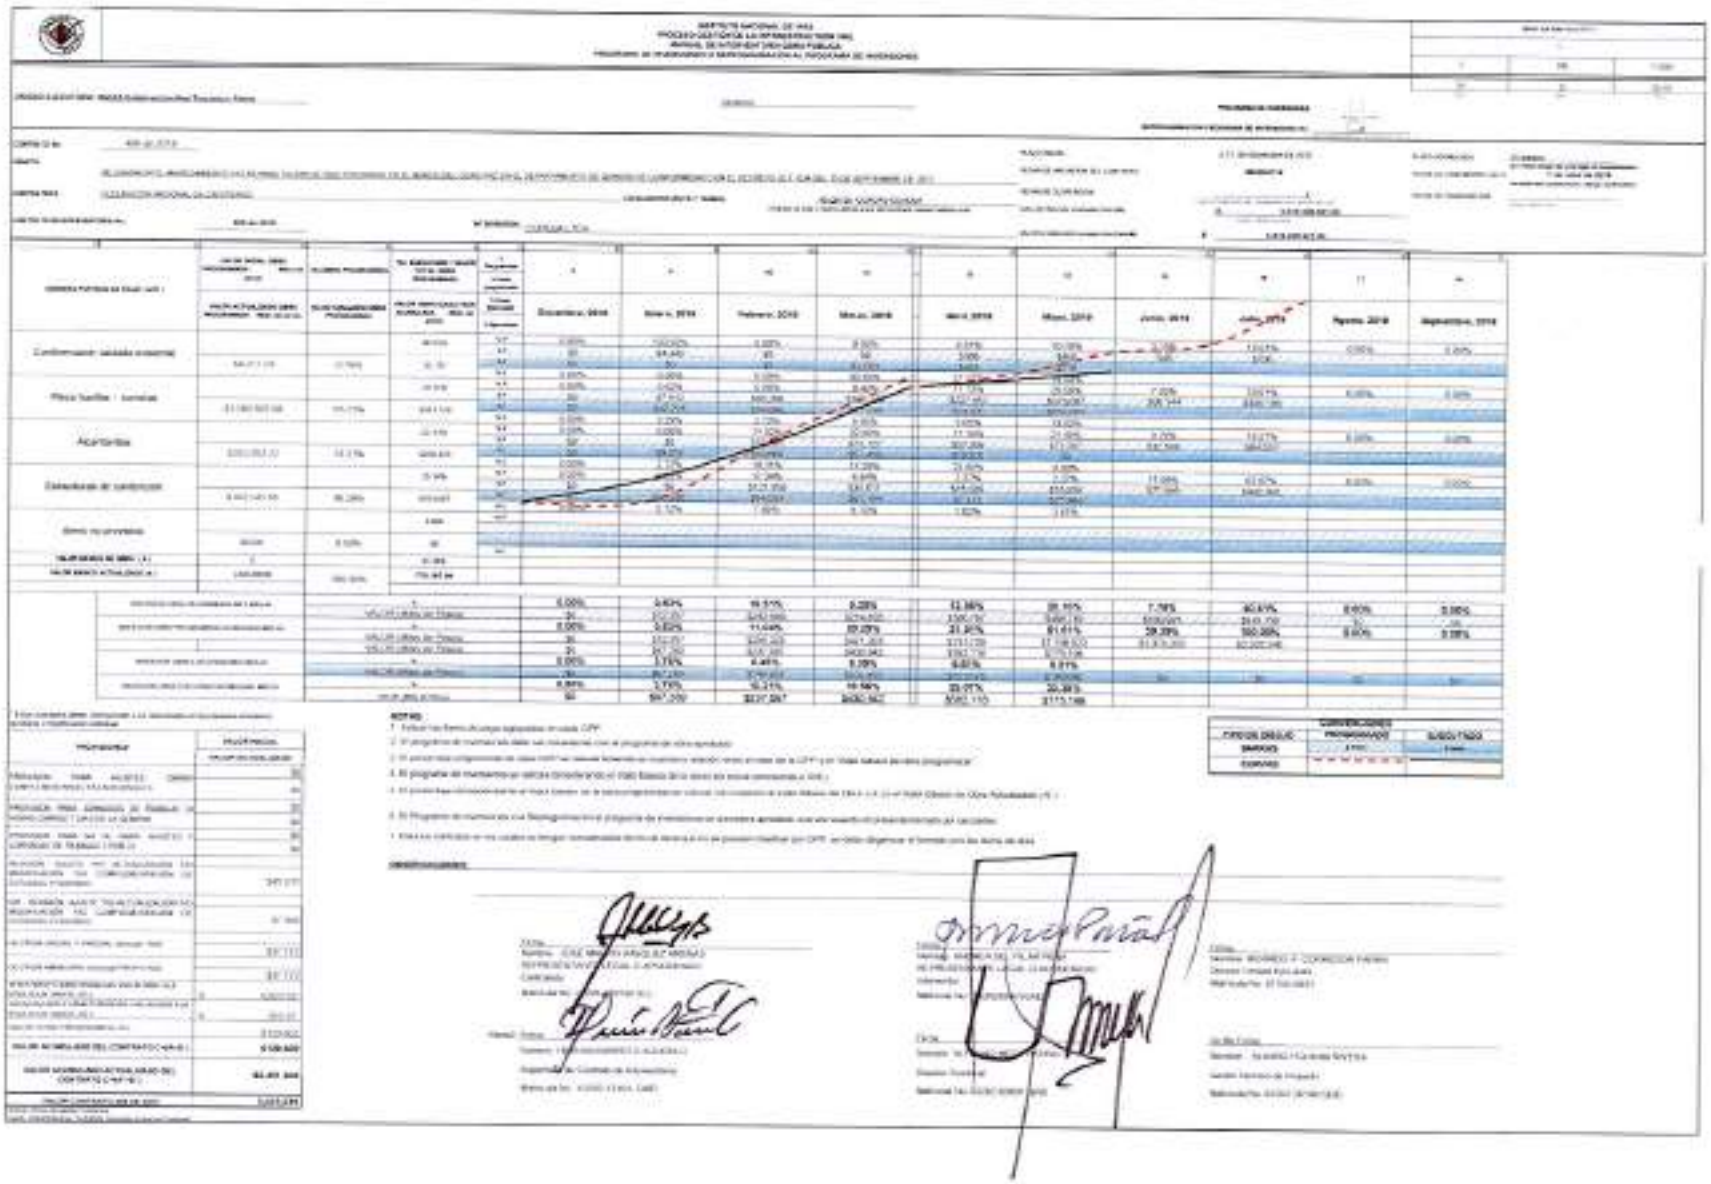

37

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS Subdirección Red Terciaria y Fluvial — CONTRATO — PROGRAMA DE INVERSIONES — REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2

CONTRATO No. 550 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL CICAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS — LOCALIZACIÓN (VIA Y TRAMO): — PLAZO INICIAL: 4.01 de diciembre de 2018 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTA: 01/07/2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 535 de 2018 — INTERVENTOR: CONSULTOR — FECHA DE SUSPENSIÓN — FECHA DE REANUDACIÓN — VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 5,415,239,331.00 — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 5,415,239,331.00

ORDEN PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos)	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos)	VALOR EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
					Diciembre, 2018	Enero, 2019	Febrero, 2019	Marzo, 2019	Abril, 2019	Mayo, 2019	Junio, 2019	Julio, 2019	Agosto, 2019	Septiembre, 2019
Conformacion calzada existente	$1,728.39	0.00%		%	26.00%	22.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$	$1,197	$473	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				M	50	$1,720	30	30	90	90	90	90	90	90
Placa huella - cunetas	$1,286,191.20	48.09%		%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				$	1.78%	29.84%	28.50%	45.00%	0.00%	0.00%	4.83%	36.90%	0.00%	0.00%
				M	$23,047	$385,134	$369,439	$580,084	$89,763	$87,343	$62,649	$711,966	$0	$0
Alcantarillas	$469,578.91	17.24%		%	0.00%	100.00%	$782,902	$30,000	$160,000	$229,240				
				$	1.07%	18.31%	0.00%	14.90%	2.39%	9.24%	17.00%			
				M	$7,302	$88,905	22.80%	0.00%	0.00%	0.00%				
Estructuras de contencion	$1,922,462.62	35.88%		%	0.00%	100.00%	$197,948	$18,600	$23,859	$34,178	5.87%	67.79%	0.00%	0.00%
				$	$0	$43,175	$24,710	$77,158	$17,858	$0	$77,948	$232,644	$0	$0
				M	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
Items no previstos	$0.00	0.00%		%	0.00%	8.53%	11.77%	15.00%	7.78%	7.10%				
				$	$45,048	$99,496	$104,760	$172,241	$41,508	$71,618	11.66%	44.40%	0.00%	0.00%
				M	$0	$45,048	$94,032	$70,918	$30,853	$30,853	$122,894	$459,224	$0	$0
VALOR BASICO DE OBRA (A)				%	0.00%	7.77%	8.70%	7.26%	2.23%	2.85%				
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

	%	1.45%	20.48%	24.90%	31.47%	10.61%	7.08%	7.57%	49.92%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$40,913	$576,021	$701,276	$886,172	$299,080	$199,349	$213,149	$1,402,935	$0	$0
	%	1.45%	21.91%	46.81%	78.28%	89.53%	96.61%	104.18%	154.09%	0.00%	0.00%
	(Miles de Pesos)	40,913	616,934	1,318,212	2,204,389	$2,503,919	2,703,268	2,916,417	4,319,352		
		$0	242,105	523,400	707,440	$2,503,919	$2,799,888	$3,413,018	$3,915,944		
	%	0.00%	8.60%	9.99%	6.54%	6.30%	0.47%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$242,105	$281,295	$184,040	$176,194	$96,870	$0	$0	$0	$0
	%	0.00%	8.60%	18.58%	25.12%	31.48%	40.95%				
	(Miles de Pesos)	$0	$242,105	$523,400	$707,440	$880,984	$1,143,147				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presente
** Incluye ajustes y modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y/ O NOCTURNAS DE LA SEMANA	$0
PROVISIÓN PARA VIA DE OBRA, AJUSTES Y/ JORNADAS DE TRABAJO Y/ POR 24	$0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$411,811.39
N/A REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$411,811.39
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye SSA)	$ 7,906.74
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PMA o PAR)	$ 46,371.14
NUMERO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANCES A REALIZAR EN OBRA DE ARTE	$46,371.14
LA INVERSIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE	$0.00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 1,906.47
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (VIGENTE)	$101,353.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (VALOR +)	$0.00

NOTAS:

1. Valorar las Items de pago agrupados en cada OPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje con respecto al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion el programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los cambios en los cuales se tengan contemplados items de obra que no se puedan clasificar por OPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No. 70208-178190 VLL

Firma
Nombre: NORMA ARENAS DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No. 25202[illegible] CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO ACUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No. 63202-0454 CND


Firma
Nombre: [illegible] MEJIA PATIÑO
Director Territorial
Matrícula No. 63252704604 CND


Vo.Bo. Firma
Nombre: ALVARO ROLANDO RIVERA
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula No. 63202-25140 CND

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR RANGEL
Jefe oficina Ejecutora
Matrícula No. 01100-0831

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 12. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

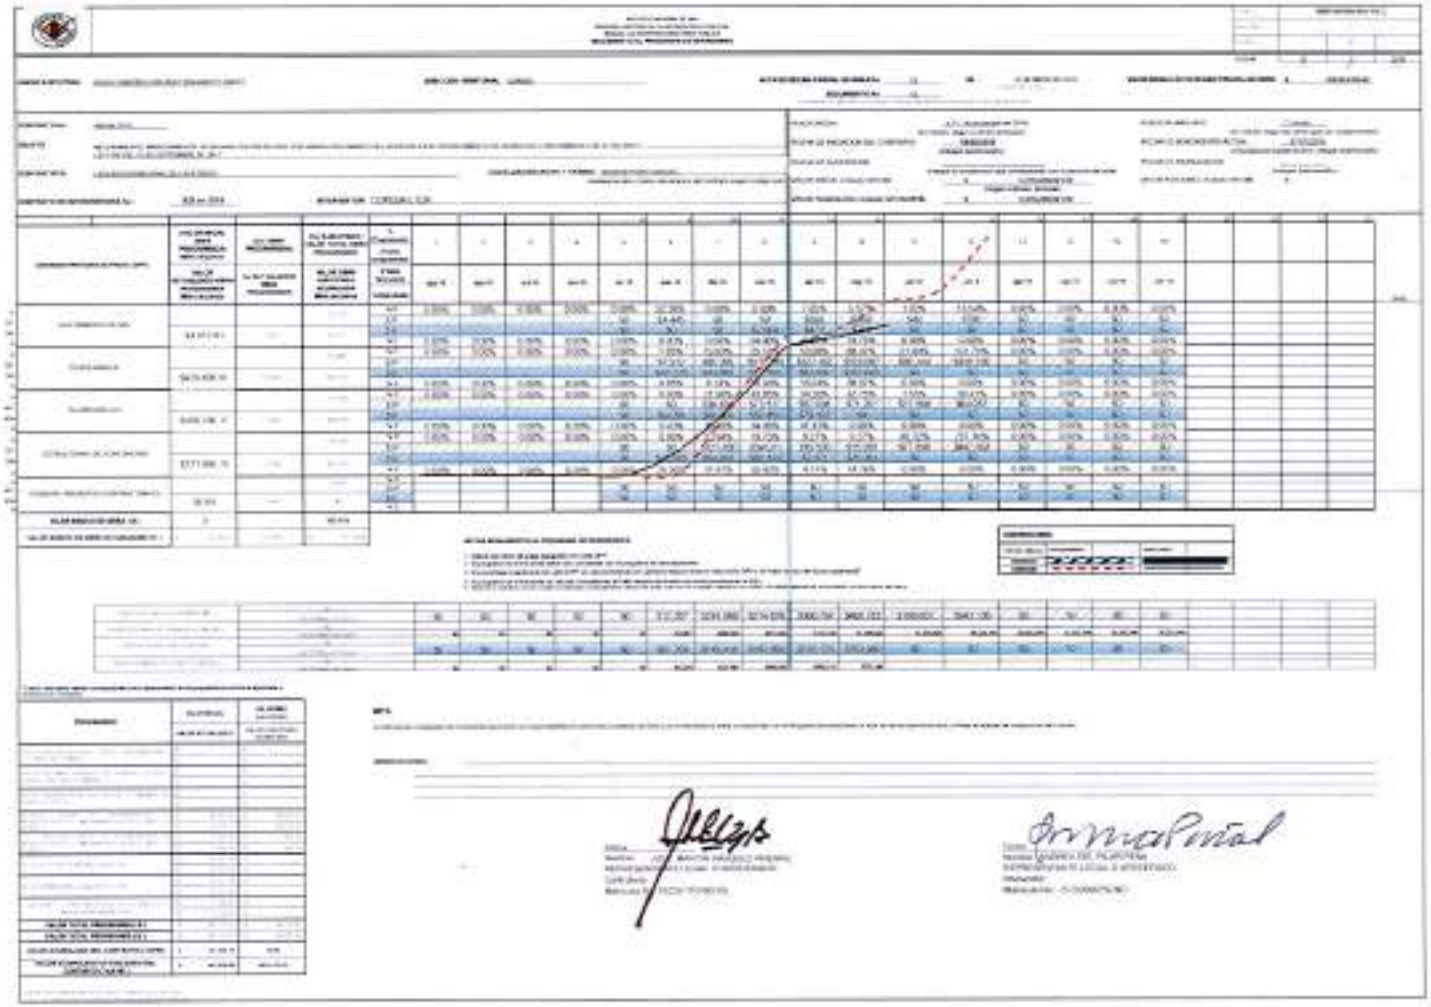

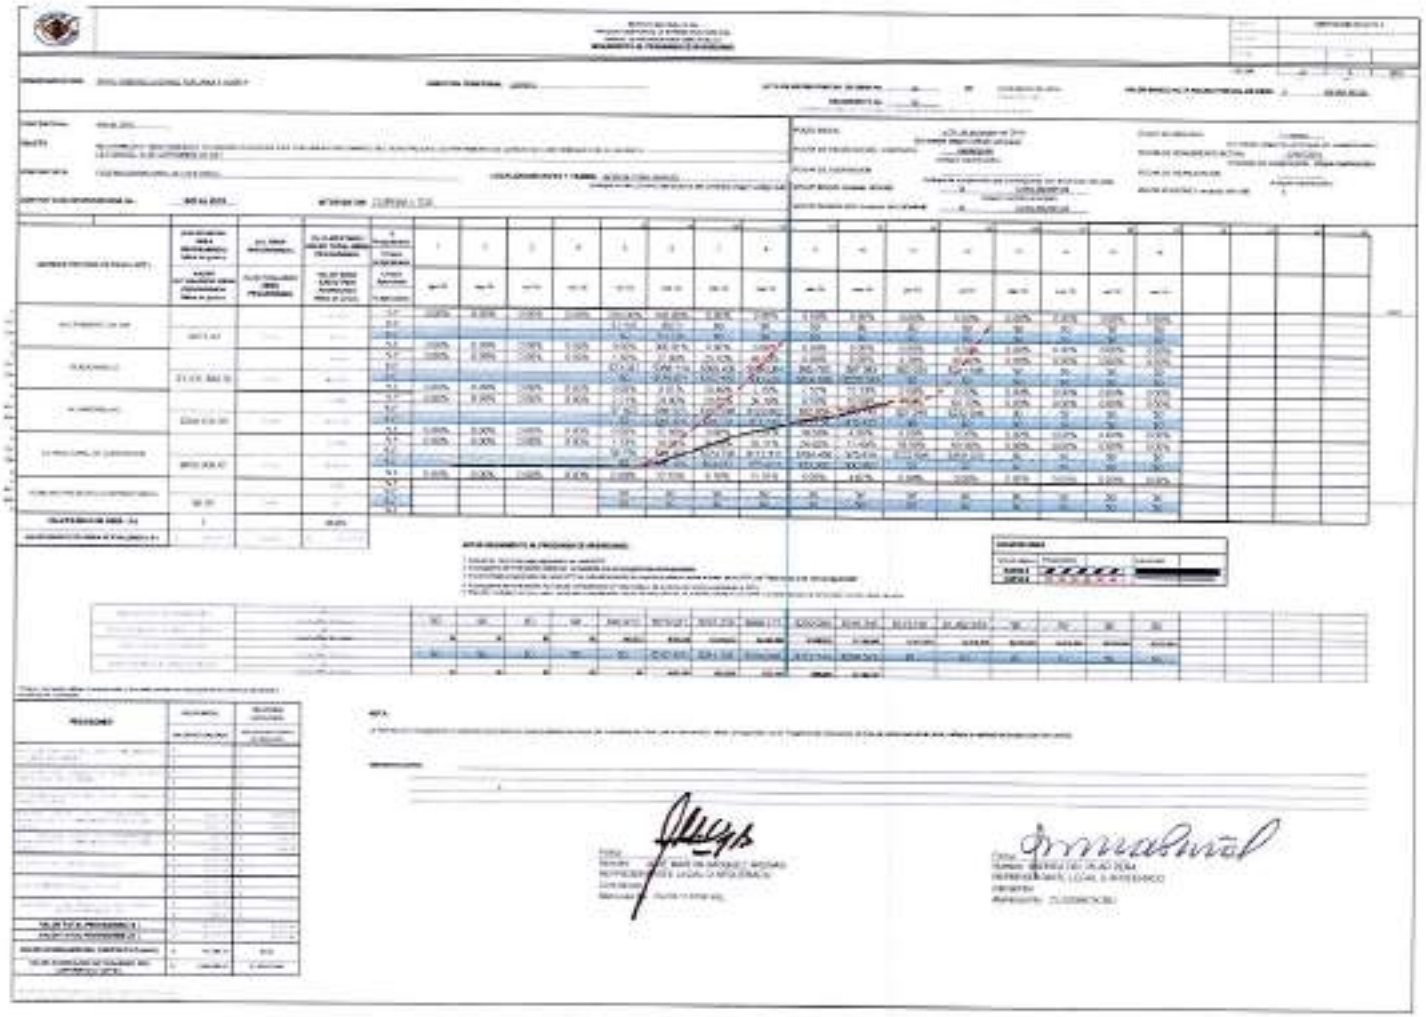

ANEXO 13. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MNTRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA: 25 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 44
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 835 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Hugo Cardona Cortes	Ing Auxiliar INT	Copeba Ltda.
María E Zapata Munoz	P- SST	FNC.
(2) Diana A. Johann M.	Ing Residente Proy	FNC.
JAVIER POPPO CASTRO	GESTOR PROYECTO	FNC
PABLO A VANEGAS R.	DIRECTOR OBRA	F.N.C.
Maria Inés Vélez Sánchez	Residente Social	F.N.C.
Nury Correa	DNI Ing	Copeba LTDA
John O. Cano	Esp Ambiental	Copeba Ltda.
Edisson Palacios Cano	Residente Interventoría	COPEBA LTDA
Andres Felipe Mendoza T.	Esp. Ambiental - contratista	F.N.C

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control a la ejecución de la obra, verificando el cumplimiento de los compromisos establecidos en actas anteriores

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace lectura del acta anterior # 43

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Temas Técnicos
SST
Ambientales
Sociales

143

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CODIGO	MINFRA.MM.IN-14.FR.1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	6

FECHA: 25 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Temas Técnicos

Verificando los compromisos del acta anterior el contratista manifiesta que el aumento de personal se esta cumpliendo parcialmente pero en el sector de Cáceres - Tarazá no se ha incrementado debido a que la temporada de lluvia ha sido muy intensa y poco permite laboral.

El segundo compromiso del acta anterior, que es la entrega de señalizacion de curvas en el sector de Caucasia no se ha terminado pues se tiene adelantado.

El tercer compromiso de levantar acta con el propietario de la finca Baltimore se realizará el dia de hoy, manifiesta el contratista.

El cuarto compromiso que consiste en la entrega del balance del contrato sin ajuste ya se envió por correo electrónico al contratista el viernes antes de comenzar la semana santa de esta semana.

El quinto compromiso del acta anterior era la realizacion de ensayo de laboratorio (densidad de campo) para dar continuidad al proceso de construcción de placa huella en el sector de Cáceres - Caucasia, a lo cual el contratista manifiesta que no ha sido posible realizarlo por las fuertes lluvias pero hoy se tiene previsto realizarlo.

El sexto compromiso del acta anterior es la entrega parcial del ajuste a los estudios y diseños para mañana 26 de abril. El contratista manifiesta que no se ha dado inicio a la construcción del concreto de la placa huella del sector de Cáceres - Caucasia debido a las intensas lluvias que se han presentado pero ya se tiene cierre figurado de las vigas para una longitud desarrollable aproximadamente de 200 mts.

La interventoria solicita al contratista documentar en forma clara y premiscuente sobre los inconvenientes y retrasos en la ejecución de la obra.

La interventoria solicita la presencia de ingeniero residente de obra para el sector Cáceres - Caucasia. El contratista manifiesta que debido a la reciente renuncia del ingeniero Ivanchez se encuentra haciendo selección de hoja de vida para dicho cargo.

La interventoria solicita al contratista atender las inquietudes presentadas en la reunion de comité de interventoria cumpliendo el

144

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

día anterior en el sector Tenería - Río de Tunjuelo; por lo anterior se extra a contratación dos ingenieros para atender en el poco tiempo y de respuesta antes del 29 de mayo cuando está fijada la fecha de prórroga vencida: la primera tiene que ver con el monitoreo o seguimiento al empotramiento del puente Bamberales, el cual debe saber realizando el contratista y que tendrán reportes sobre la intervención, la segunda inquietud que de igual manera tiene que ver con dicho puente es el requerimiento de información a cerca de la intervención que pueda o se vaya a realizar a dicho puente, como se les menciono en la reunión de inicio o socialización del proyecto.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MIN-04-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	6

FECHA: 25 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Seguridad y Salud del Trabajo: La interventoría solicita al contratista presentar a la siguiente de competencia:
Examenes de ingreso, sino de ellos para los trabajadores que aún no capacitaciones, entrega de EPP de acuerdo a la tarea, presentar estadística del COPASST y su correspondiente implementación, examenes de egreso y lo demas que aplique.

Ambiental:

Buenavista: Ubicado en el frente de obra de Cerro y Cuba y zona Centauros brigada de Cuba y area el contratista manifiesta hacer la restauración para el 27/04/2019.
ZODME (La Legua):

Requerimientos legales: Concesión de aguas: Según lo expuesto el contratista en comité ambiental realizado el 26/03/2019 el contratista manifiesta radicar el documento para el 29/04/2019.
Plan de gestión social: El contratista manifiesta haber radicado la gestión ante la E.S.P.A. manifiestan entregar los certificados para el día 03/05/2019.
Informe de avance: El contratista manifiesta hacer la entrega del informe no mensual. Para el día martes 30/04/2019.
Residuos especiales: La carta de la disposición de los aceites usados, donde consta el manejo y disposición final de residuos de aceite provenientes de mantenimiento preventivo y correctivo y elementos empapados con aceite de los vehículos se presentara en la misma fecha el día martes 30/04/2019.
Con respecto a las bolsas de cemento para disposición final se presentara el concepto para el día 30/09/2019.

Interventoría: El contratista manifiesta entregar los dos informes faltantes pendientes para el viernes 26/04/2019, los mensuales de avance de obra se presentan desde el mes de enero de 2019 hasta la fecha por lo cual se dio inicio a los recorridos de obra, la interventoría manifiesta tener los informes en regla.
Días de acompañamiento del profesional ambiental del contratista: Manifiesta realizar visita de obra los días martes y sabados para el seguimiento ambiental del contrato.

146

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-05-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	6

FECHA	25	09	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Temas sociales

- proyecto 1 de atención a la Comunidad: Se recomienda al contratista tener un apoyo mientras la contingencia de la incapacidad de la profesional Social Elena Pelaez para la atención a la comunidad
- Proyecto 2 de Información y divulgación Se solicita informar de manera oportuna a los propietarios de las Fincas para sacar la producción. Cuando inicien los cierres totales para el tramo de Genova.
- proyecto 3 Manejo de Infraestructura de predios y de servicios públicos Actualizar acta de vecindad antes de la intervención en la Finca Baltimore
- proyecto 5 Cultura vial y participación ciudadana, luego de la reunión del Comité de participación ciudadana se da a conocer los compromisos por las inquietudes de los participantes como el manejo y seguimiento que se le esta realizando al puente tamborales a lo que el contratista informó que el área técnica realiza seguimiento.

La interventoría solicita de manera especial que se atiendan los PQRS para no tener inconvenientes al cierre del contrato y se informe de manera oportuna para dar seguimiento y el respectivo trámite Asimismo, se recomienda que el área usada en el centro educativo quede en mejores condiciones, por las afectaciones en las que incurrió la obra se anexa copia de PQRS de la Señora María Inés Mejía Finca Baltimore.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MIV-INI-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	6

FECHA: 25 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
incremento de personal para los frentes Pijao - Guacas y Cabrera - Guacas	Próximo comité de obra (02-05-2019)	Contratista
Realizar la reunión de inicio para plan Medio Cabrera - Guacas	Próximo comité	Contratista
Mantenimiento y conservación de cauce Abscisa de obra Cabrera - Guacas	Próximo comité de obra (02-05-2019)	Contratista
Compromisos establecidos en el desarrollo del presente comité	Los fijados en el desarrollo del presente comité	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 02 (Día) 05 (Mes) 2019 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Hugo Cortes C.	
María E Zapata Mejía	María E Zapata
Wilmer A. Jaramillo M.	Wilmer A Jaramillo.
JAVIER TORRES CASTILLO	
PABLO A. VALENCIA P.	
María Inés Vélez Sánchez	María Inés Vélez
JUAN CARLOS LOPEZ	
John C. Cano García	
Edwin Palacios Cano	
Andrés F. Mendoza T.	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

No. Contrato 00408 de 2018	RECEPCION DE PQRS		Fecha Abril 8- 2019
INVIAS	Contratista:	Interventor:	OBJETO
	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	COPEBA LTDA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ XXVII DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SOLICITUD No: _____ MUNICIPIO: Pijao FECHA: Abril 8 - 2019

TIPO DE RECEPCIÓN: P__ Q__ R__ S X

NOMBRE DEL PETICIONARIO: María Inés Mejía de Gómez C.C 41574963

DOMICILIO: Cr 5 #13-42 Pijao TELEFONO 3107627821

CORREO ELECTRÓNICO: agnes513@hotmail.

1. DESCRIPCIÓN DE LA P.Q.R.S Durante los trabajos realizados en el K7+380, se presentaron afectaciones en el capital de mi finca Baltimore, motivo por el cual solicito como compensación Trasladar la cereza acumulada alrededor de la despulpadora de la finca, al capital del sector de La Playa.

FIRMA: María Inés Mejía de Gómez

2. GESTION ADELANTADA POR EL CONTRATISTA Una vez verificadas las afectaciones expuestas en el capital cerca a la obra en ejecución del K7+380, el área técnica del proyecto coordina con el equipo de trabajo existente en el proyecto la atención a lo solicitud presentada, iniciándose el traslado de la cereza el lunes 15 de abril.

3. VERIFICACION ADELANTADA POR INTERVENTORIA

4. FECHA DE CIERRE DE LA INQUIETUD

5. FIRMA A SATISFACCION DEL PETICIONARIO

Firma _____ Firma _____

Nombre _____ Nombre _____

Residente Social - Contratista Representante de Interventoria

149

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	4

FECHA: 17 (Día) 04 (Mes) 19 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 43
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 826 DE 2018

INTERVENTOR: COPESA LTDA.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
PABLO ALBERTO VALENCIA P	DIRECTOR OBRA	FNC.
WILMER A JORDAN	ING. RESIDENTE DA	FNC
María Luis Vélez S	Residente Social	F.N.C.
Hugo Carlos Castro	Ing Auxiliar Ingeo	COPESA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control semanal en la ejecución del contrato

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta N°42, que con anterioridad se le hizo llegar al correo electrónico

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA - Cumplimiento de Ejecuciones

Temas Técnicos

Temas Sociales

Temas Administrativos

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	2	DE	4
	FECHA	17 (Día)	04 (Mes)	15 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

-Cumplimiento de compromisos.

1 La FNC hará llegar a las obras el acero

2 El ajuste y justificación de la baja ejecución, la interventoría manifiesta que hará entrega el próximo lunes con Nueva Planeación.

Aspectos Técnicos.

El contratista ha Terminado el muro 5, Faltando el sobrecimiento que se Terminara la otra semana.

En la Placa huella de Puente Tabla K3+169 al K3+197, Falta por Terminar el deshale de la cuneta K3+199.

En el muro 3, se ha ejecutado el módulo 2 y el módulo 3 ha Terminado completo la otra semana, con la instalación de la alcantarilla. En la Placa huella de la Laja se Fijará hierro para la reconstrucción de sol, que inicia a fundir el jueves Santo.

En el muro 5 de Gánova K15+380, se encuentra filtro y se realiza el llano respectivo, así como en el muro 4 K22+321. Por el invierno no se puede realizar la reconstrucción de la Placa huella K17+620 al K18+722. Se hace buen Tiempo se inicia la otra semana.

En el muro 2 de Gánova K18+413 (K18+413), se está reconstruyendo un Terraplen para la protección de la banca e iniciar con los Caissons.

Aspectos Sociales

Se acuerda el compromiso de hablar con los propietarios de la finca Baltimore sobre las afectaciones por la construcción del muro 3 K7+330 así como el compromiso con el inventario de cercas en Gánova.

Aspectos administrativos.

La FNC aclara que la seguridad social pagada es la del mes de febrero de 2019 y no la de marzo que la harán llegar a la interventoría apenas la reciban.

La FNC suspenderá el personal en cada Frente de la obra a partir del lunes 22 de Abril, en el fin de dar cumplimiento al contrato. Así mismo dispone como mínimo con 2 cuadrillas para la construcción de los pocetas, cabezales y descoles de las alcantarillas.

En el correo electrónico les llegó los recursos disponibles para la obra, por la cual se deben ajustar además del IVA, otros recursos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4

	FECHA	17	4	19
		(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

La FNC hace llegar este correo, anexando el cuadro con la revisión disponible a la Interventoría.

Sobre el ejeVIAL a los diseños, la FNC manifiesta que tiene parte de las Placas huellas, faltando la margen K10+220 al K10+500 la de la Charca K12+400 al K12+550 y la de K12+729 al K11+979 (10 m).

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 17 (Día) 04 (Mes) 13 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Cumplimiento del Personal	22 abril de 2019	FNC.
Entrega de inventario Cerca de Obra.	22 abril de 2019	FNC.
Entrega acta con Propietarios de Fca Bellavue	22 abril de 2019	FNC
Entrega de balance ambiental.	22 abril de 2019	EMPRESA LTDA
Envio laboratorio Plastilleno Ensayo	22 abril de 2019	FNC.
Entrega presupuesto ajuste estudio y diseño	26 abril de 2019	FNC.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
PABLO ALBERTO VALENCIA R.	
Wilmer A. Jaramillo Mosquera	
María Inés Vélez Sánchez	
Hugo Cardona Patiño	

Original: Informe mensual de Interventoría

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-N-14-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	9

FECHA: 11 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 42
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 490 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Wilmer A. Jaramillo	Ing. Residente Pivo	F.N.C.
María Inés Vélez Sánchez	Residente Social	F.N.C.
Pablo B. Valencia R.	Director Obra	F.N.C.
Oscar Javier Zorro C.	Gestor	F.N.C.
Leandro Sánchez V.	Residente Geotec	F.N.C.
Hugo Cindy Cetina	Auxiliar Interventoría	COPEBA LTDA.
Andrea Peña S.	Rep. Legal / Dir Interventoría	COPEBA LTDA.
Felipe Palacios Ruiz	Residente Interventoría	COPEBA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control semanal a la ejecución del contrato

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta Nº 41.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Temas Técnicos:

Temas sociales:

Temas Administrativos:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MNPRA-MN IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	4
		FECHA	11 (DÍA)	04 (MES)	2019 (AÑO)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Temas Técnicos

El avance de las obras no ha sido el más elevado por los siguientes factores: Paro de los trabajadores desde el dia 08 de abril hasta el 11 de abril de 2019 falta de suministro de acero para la losa y el concreto premezclado en la zona.

En el K17+951 se retiró la estructura para la alcantarilla, En el sitio PR 8+670, se inició la construcción del lleno del muro. En Bypass se retiró la subbase de la placa huella K17+631 al K17+819, la construcción de pantallas cerradas de las alcantarillas K17+855, K18+027.

En el muro 3 de Pipe Covers se instaló el cuarto de los (K7+380), En el PR 8+670, se instalaron 24m de Tubería de 36".

La FNC como ha podido mantenido el tránsito de vehículos por el Sector de Obra Tuquina PR 11+200 con material de subbase, la construcción de zanjas. El Tiendo de no se puede realizar durante el tiempo que duran las lluvias.

Temas Sociales.

La FNC, hace el informe de la cantidad de reses, que hay que reparar en el sector Cárcavas-Cuevas, Entregando este con los propietarios de la finca Bellavista en donde se construye el muro 3 (K7+380), en donde hay afectación de árboles de café.

Temas administrativos

- La Interventoría presenta la solicitud de la Reprogramación presentada por la FNC, mediante el oficio QDB 19 000475.
- La Interventoría presenta la corrección del Polvo de obra presentado por la FNC mediante el oficio de 08 de Abril de 2019

La Interventoría deja constancia que estas correcciones se han remitido al correo de FNC OBRAPAZ previamente.

La Ingeniera Andrea del Pilar, manifiesta que es necesario que el contratista aumente considerablemente el personal y planifique el suministro de los materiales de una forma más eficiente.

La Ingeniera Andrea del Pilar, que se debe ajustar más, la justificación de la localización de las obras, que se están efectuando con respecto a lo que se ejecuta según lo establecido en el anexo Técnico del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	4.

	FECHA	11	04	2019
		(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se deja constancia que la FNC no puede pagar oportunamente a los trabajadores por un problema en el sistema de contabilidad de la empresa. Así mismo el funcionario de Acero se retiran por incumplimiento de despacho del Proveedor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MM-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4
		FECHA	17 (Día)	04 (Mes)	2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Suministro de Acero	12 abril de 2019	FNC
Aumento de Personal	22 abril de 2019	FNC
Ajuste y Justificación de la localización de obras	16 abril de 2019	Interventoría
Entrega de inventario de Equipos reposo en Estación	27 abril de 2019	FNC.
Citar en la próxima reunión de la Mesa Técnica el Plan sobre las afectaciones	23 abril de 2019	FNC - secretaria

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 17 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Wilmer A. Jaramillo	Wilmer A. Jaramillo
Gloria Inés Vélez Sánchez	
Pedro J. Venegas Rodríguez.	
Oscar Javier Zorro Castro	
Cesar Sánchez V.	
Hugo Cardona Castaño	
Andrea Peña S.	
Edison Palacios Cano	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	3

FECHA: 04 (Día) 04 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 41
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Wilmer A. Jaramillo	Ing. Residente Obra	FNC.
Fredy Alberto Valencia R.	Director Obra	FNC.
Leonardo Sánchez C.	Ing. Asociado Gestor Gestor Proyectos	FNC
Oscar Javier Zorro C.		
Hernán Barrera A.	Superv. Interv.	Instituto Nal. de Vías
Jorge Cardona C.	Ing. Ambiental Residente Interventoría	Copeba Ltda.
Edison Palacios		Copeba Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control semanal a la ejecución del contrato

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta #40

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Temas técnicos

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 04 (Día) 07 (Mes) 2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Temas Tratados

Contratista manifiesta que la construcción del muro del sector Pijao - Cauca se recepcionó el 9 de abril y no el 6 de abril como se tenía previsto. También expresa que hubo demora en el suministro de materiales a la obra debido a que fue que hacer un tramite para conseguir dinero para adquirirlos, por tal razón se retrasó bastante el proceso en este frente de trabajo.

El contratista manifiesta que hay inconveniente por parte del subcontratista para continuar la placa huella entre el PR 12+800 y el PR 13+020 aproximadamente el 30 de abril teniendo en cuenta las lluvias.

El contratista dice que también destinara una cuadrilla de mínimo 6 trabajadores para la reconstrucción de alcantarillas.

En el sector de Cimarrona - Cauca el contratista manifiesta que de ha sido posible extender subbase para placa huellas debido a las lluvias fuertes. Para el próximo lunes 8 de abril se contara con mayor personal para dar continuidad a las obras.

El contratista manifiesta que las polizas solicitadas por la interventoría se encuentran en el SECOP, sin embargo las mismas permanecen en la interventoría.

El contratista manifiesta que para la cuneta tipo #3 del sector Cimarrona - Cauca, el especialista en costos debe complementar cantidades.

La federación nacional de cafeteros dice que aportara próximamente el documento de referencia de soporte a la CRA sobre su pronunciamiento de la compuerta de mayo para las obras que le requieren.

Supervisor: La suspensión del contrato y del predio en general manifiesta que ha explicado la gestión para conseguir material para mejora, el fue por el sector de Cimarrona de dos fuentes y seguirá pendiente de esta gestión con la ebanistería del departamento.

El supervisor recuerda mantener haciendo el seguimiento y control a la seguridad social de los trabajadores. La interventoría solicita al contratista prescriba la inscripción social de cada nuevo trabajador.

El supervisor solicita un cronograma donde se presente a la dirección territorial el registro de inversiones a la gobernación del departamento a partir de las reuniones de comité de obra, consumado de gran importancia su participación.

La supervisora del contrato solicita a la interventoría que notifique al contratista la necesidad urgente de incremento de personal y la continuidad en las obras que lleve de haberse ausente se encuentren en abandono e sin actividad. La interventoría respecto al supervisor, que el día anterior se contrajeron y se remiten electrónicamente del contratista los oficios de reclamaciones 110, 111 y 112 donde el ENC-825-2018-710 es referente solicitando el incremento de personal; de igual modo el pasado 27 de marzo se emitió oficio recordatorio al contratista para dar continuidad a las obras y cumplir con los compromisos de ejecución de las mismas, dicho oficio fue el ENC-825-2018-709, cabe aclarar nuevamente dicho se muestra que ya fue atendida la solicitud del Sr. Supervisor y que se estará pendiente de que el contratista atienda dichas solicitudes la próxima semana.

El Supervisor solicita sea entregado al pares el balance del contrato.

El contratista aporta acta de visita de la oficina de gestión de riesgo a la finca el jacinto el día 06 de abril de 2019.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 09 (Día) 09 (Mes) 2014 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Continuidad en las obras que se han iniciado e ingresante de personal	08 de abril	Contratistas
Presentar PTS de alta de descargas	próxima semana	Contratista
Entrega Balance del contrato al pago	próxima semana	interventoria
Acta de mediciones de cantidades	próxima semana	Contratista
Localizacion de obras con su ordenamiento	próxima semana	interventoria

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Wilmen A. Jordan M.	
Pablo Alberto Valencia	
Leonardo Sanchez V	
Oscar Javier Zorro	
Hugo Cardona Cortés	
[illegible]	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Municipio de Génova Quindío	ACTA DE VISITA	RC-SG-0075 VERSION 2 JUNIO DE 2016

ACTA DE VISITA

Siendo las 4:00 horas de la tarde, del día de hoy 06 de marzo del año 2019, el Despacho de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, se trasladó a la finca el Jazmin, con el fin de practicar diligencia de visita a Arboles en riesgo ubicada en esta dirección Vereda El Recreo, en el perímetro Rural de esta Municipalidad. En esta dirección somos atendidos por el señor (a) Adonai Toro con cedula No. 4369497 expedida en Armenia Q, con celular número 3113680123

Número de Habitantes:_____

Número de niños: ____ madres gestantes: __ adultos mayores __ Adultos: ____

Género: F ___ M ____

Tipo de población: Vic/Des: __ Dis: __ MCH: __ Flias: __ LGTB: ___ ERU____

Etnia: ROM: ___ Afro: ____ Indi: ____ Mesti: ____

Desarrollo de la visita: Se realizó visita con el fin de verificar arboles que estan generando riesgo en la via principal de la vereda El Recreo, donde se evidencian 4 eucaliptos, 1 balso blanco y 4 platanares, los cuales tienen sus raices expuestas, dañados en las obras transversales que se estan interviniendo para el mantenimiento de dicha via, generando riesgo para la comunidad, los vehiculos y los trabajadores de esta obra. Se socializó con el propietario del predio quien manifiesta que esta de acuerdo con la tala de los arboles

Municipio de Génova Quindío	ACTA DE VISITA	RC-SG-0075 VERSION 2 JUNIO DE 2016

Recomendaciones: Se debe realizar tala de arboles por parte de personal profesional para evitar accidentes la madera debe ser de uso domestico, prohibida su venta.

VIC/DES: VÍCTIMAS O DESPLAZADOS DIS: DISCAPACIDAD MCH: MUJER CABEZA DE HOGAR FLIAS: FAMILIAS EN ACCIÓN LGTB: LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES, ERU: ESTRATEGIA RED UNIDOS, ROM Gitanos AFRO: AFRODESCENDIENTES IND: INDÍGENAS MEST: MESTIZOS

En esta forma se determina y en constancia se firma tal como aparece, por lo que en ella intervinieron.

Comisión que visita:

NOMBRE: Jeisson Aguilera	NOMBRE: Karol Aracon H
CARGO: Pasante	CARGO: Contratista CMGRD
ENTIDAD: C.R.C.	ENTIDAD: Alcaldia mpal
FIRMA:	FIRMA: KarolAracónH
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:
ENTIDAD:	ENTIDAD:
FIRMA:	FIRMA:

Quien atendió la visita
NOMBRE: Adonai Toro
CÉDULA: 4369499 DE Armenia Q.
FIRMA:

162

ANEXO 14. INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		
FECHA		

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD RAZ EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1 : PUAO - GUACAS; TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAINÍA — SEMANA No.: 28 (Numeración consecutiva) del 03/09/2019 al 27/04/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNANI BARRETO AGUDELO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANIA RINCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD RAZ EN EL DEPARTAMENTO DE GUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL — FECHA DE INICIO: 5-ago-19

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: 17 obras hidraulicas, 8 muros y 3000 m de placa huella

PUAO - GUACAS

KM PLACA HUELLA:	1.400 KM
ALCANTARILLAS:	18 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	4 MUROS DE CONTENCIÓN

GENOVA - GUACAS

KM PLACA HUELLA:	1.600 KM GUACAS-GENOVA
ALCANTARILLAS:	11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	4 MUROS DE CONTENCIÓN

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	3456 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 5.410.236.957,00
PLAZO INICIAL:	MESES 11 DÍAS 0	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	08/07/19 - 1 AGO 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 5.410.236.957,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTOR:	CONSULTORIA 10%		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	3456 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 518.000.000,00
PLAZO INICIAL:	MESES 11 DÍAS 0 2019	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	08/07/19 - 1 AGO 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 518.000.000,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO REQUERIDO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.410.236.957,00	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	$ 5.136.064.952,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.359.711.961,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$ 1.410.073.962,23
AVANCE DE OBRA (%) (B/A)	27,46%
% PROGRAMADO	26,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Diferente a Diseños, gastos predial, social, ambiental y otros)	$ 50.034.000,24
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.359.711.961,00

PRESENTÓ FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: $ -

(Si el avance de la obra es diferente al % programado indicar a que se debe)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 330.000.000,00

PRESENTÓ FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: $ -


(Si el avance de la obra es diferente al % programado indicar a que se debe)

III. AVANCE FÍSICO

(Tramo 1 : PUAO - GUACAS (0 KM MAS ALTO 1.4 KM))

AVANCE DE PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(ES)			TOTAL
EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN (M)	180.10ML		180.10ML
PLACA HUELLA (M)	230.72		230.72
MUROS DE CONTENCIÓN (M2)	54.56		54.56
ALCANTARILLAS (M)	6.00		6.00
PLACA HUELLA (M3)	300.47		300.47
CAPACHO (M)	552.50		552.50
MINGA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
OTRAS INTERVENTORÍA (%)	0,00%		0,00%



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(ES)			TOTAL
Retroexcavadora	1		1
Volqueta	1		1
Compactador de suelo cc 10.000 lbs	1		1
Vibrador de 5 hp	1		1
Mezcladora de concreto de trompo 2 sacos	1		1
Vibrador de concreto	2		2
Compresor de 125 psi y martillo con martillo de	1		1
Formaleta para muros de concreto	1		1
Herramientas	10		10

TRAMO Y/O SECTOR 1: Puao - guacas (0 km mas alto 1.4 km)

TRAMO Y/O SECTOR 1:

164

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	M2			
PLACA HUELLA				
	M3			
	HA			
	M2			
	M3			
	Kg			
	M3			
	MM			
ALCANTARILLAS				
	MM			
	ML			
	MM			
	MM			
	KG			
	MM			

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	M3			
	M3			
	ML			
	MM			
	M3			
	M3			
	Kg			
	ML			
	M2			
	M3			
ITEMS NO PREVISTOS				
	m3			
	ml			
	m3			
	und			

TRAMO 2: GUACAS - SIBINOYA (K 17+620 AL K 23+600)

	1	2	TOTAL



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO VII SECTOR 1:

TRAMO 2: GUACAS - SIBINOYA (K 17+620 AL K 23+600)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	M2			
PLACA HUELLA				
	M3			
	HA			
	M2			
	M3			
	Kg			
	M3			
	M3			
ALCANTARILLAS				
	MM			
	ML			
	MM			
	MM			
	KG			
	MM			

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	M2			
	M3			
	ML			
	ML			
	M3			
	M3			
	Kg			
	ML			
	M3			
	M3			
ITEMS NO PREVISTOS				
	m3			
	ml			
	m3			
	und			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS [illegible]

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: [illegible]

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS	SI	NO		N/A
EMISIONES	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cuál)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA [illegible]

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. [illegible]

OBSERVACIONES

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO, NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

OBSERVACIÓN: [illegible]

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	20	1

RUTA No. _____ TRAMO: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE LA VIA

PR 0 +000 (0 KM) PR 17.000 (DA CAS) PR [illegible] +400 SENTIDO:

El presente informe debe ser diligenciado por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pipa, placa huella inclinada en concreto



Pipa, construcción cabezal 3 (km inicial 0 (K 7+000)



Obras, canalización alcantarilla existente

NOTA:

AL RESPONDER LAS ACCIONES A EJECUTAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SIN CONSECUENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
NOMBRE:
No. MAT:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	1
FECHA	

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR (S): TRAMO 1: RUJIO – GUACAS
TRAMO 2: GUACAS – SEDHOYA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y VEREDA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | SEMANA No: 57 del 13/04/2018 al 20/04/2018
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO | DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO COLMENA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL | FECHA DE INICIO: 19-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 27 obras biomecanicas 3 muros y 2 box in de piedra huella

TRAMO 1 - GUACAS

KM PLACA HUELLA:	1.421 KM
ALCANTARILLAS:	2 CONCRETO - 43
MUROS DE CONTENCIÓN:	1.48 MTS DE CONTENCIÓN

GUACAS - SEDHOYA

KM PLACA HUELLA:	1.72 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS:	10 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	0.44 MTS DE CONTENCIÓN

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	0438 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 5.413.296.921,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 JULIO DE 18	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 JULIO 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 5.413.296.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR:	CONSULTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	0625 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 515.000.210,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 JULIO - 2018	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 JULIO 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 515.000.210,00

2. INFORMACION PRESUPUESTAL Y Avance Financiero

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA:	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA:	$ 5.413.296.921	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar moneda del Objeto)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	$	5.136.296.921,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$	4.446.007.990,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$	1.293.513.424,57
AVANCE DE OBRA EN % (B/A)		25,21%
% PROGRAMADO		86,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$	89.634.308,04
(Estudios o Diseños, predios prediales, social, ambiental u otros)		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	$	1.430.994.394,71

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTES DE	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ | FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE EIT SATIACION: $

¿En el evento de no haberse facturado en el mes anterior indique el motivo?

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 233.847.256,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: | FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE EIT SATIACION: $

¿En el evento de no haberse facturado en el mes anterior indique el motivo?

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA, OBRA PUBLICA
INFORME MENSUAL

Código			
Versión			
Página		de	

8. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PUJAO - GUACAS (K [illegible] AL K 171+000)

MONTAJE DEL PROYECTO

TRAMO NO SECTORES			TOTAL
0	EXCAVACION Y RETIROS (%)	100,00%	100,00%
9,13	PLACA HUELLA (M)	311,73	311,73
24,13	MUROS DE CONTENCION (M)	51,90	51,90
14,13	ALCANTARILLAS (M)	0,00	0,00
1,13	ALCANTARILLO VIG (M)	963,47	963,47
28,13	CUNETAS (M)	515,45	515,45
0	RAZAS	0,00%	0,00
0	BOCAS	0,00%	0,00
0	ESTABILIZACION (%)	0,00%	0,00%



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO NO SECTORES			TOTAL
Motoniveladora	1		1
Volco compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10.000 litros	1		1
compactor de 1 ton	1		1
Retroexcavadora de cadenas de mínimo 2.5 metros	1		1
Cilindradora de 1 ton vib	1		1
Compactador de 10 golpes o superior, con vibrador de	1		1
Compactadores manuales eléctricos (Ranas)	2		2
Vibroapisonadores	1		1
	0		0

TRAMO 1/0 SECTOR 1: PUJAO -GUACAS (K [illegible])

TRAMO 1/0 SECTOR 1:


ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
[illegible]	M2	1917,06	0	1917,06
PLACA HUELLA				
[illegible]	M3	1386,97	0	310,33
ROCERA	KM	0,82	0	0,09
[illegible]	M2	1985,66	0	8362,5
[illegible]	M3	2383,18	0	336,77
[illegible]	Kg	61567,00	1389,0	14289,4
[illegible]	M3	981,00	0	204,33
[illegible]	M3	561,75	0	80,6a
ALCANTARILLAS				
[illegible]	ml	994,24	0	478,27
[illegible]	ML	89	0	28,5
[illegible]	M3	251,52	0	69,66
[illegible]	M3	248,8	0	4,46
[illegible]	KG	22460,66	0	3,13
[illegible]	ml	397,2	0	149,94

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
[illegible]	M3	515,00	0	391,96
[illegible]	M3	164,31	0	64,84
[illegible]	ML	0,06	0	0,06
[illegible]	M3	5,60	0	5,6
[illegible]	M3	164,54	7,96	69,66
[illegible]	M3	21,06	0	19,26
[illegible]	Kg	11826,6a	0	11075,76
[illegible]	ML	64,75	0	10,26
[illegible]	M3	15750,40	0	1669
[illegible]	M3	526,15	0	172,8
ITEMS NO PREVISTOS				
[illegible]	m3	21,60	0	14,13
[illegible]	m	20,00	0	20
[illegible]	m	1483,00	0	399
[illegible]	und	13,00	0	12

TRAMO 2: GUACAS – SENOVIA (K 12+000 AL K 22+000)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO VIA SECTOR 2	1	2	TOTAL
EXCAVACION Y DISPOSICION			100,00%
ALCANTARILLADO (M)		1144,84	1144,84
MURO DE CONTENCION (M 3)		26,25	26,25
PEDRAPLEN (M3)		4,00	4,00
SUBDRENAJES VIAL (M)		0,00	0,00
CUNETA (M)		1.000,00	1.000,00
OBRA			
DOC (M)			
CARACTER DAC (SI / NO)			0,00%
			0



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO VIA SECTOR 2			TOTAL
Motoniveladora		1	1
Mantenimiento		1	1
Volco compactador		1	1
Compactador de agua de 10.000 litros		1	1
Cargador de 1 m3		1	1
Mezcladora de concreto de entrega 300 litros		1	1
Vibrador de concreto		1	1
Compactador de 10 ton a 3 pasadas con martillo de		1	1
Compactadora manual vibratorio pequeño		1	1
		0	0
		0	0
		0	0

TRAMO VIA SECTOR 2: GUACAS-SENOVIA (K17+000 AL K 22+000)

TRAMO VIA SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - SENOVIA (K 17+000 AL K 22+000)

ELEMENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	M2	4.836,60	0,00	2.795,60
PLACA HUELLA				
	M2	1.188,74	0,00	282,50
	MA	2,00	0,00	0,00
	M2	8.790,25	0,00	5.064,50
	M3	2.165,22	0,00	665,00
	Kg	58.763,78	0,00	0,00
	M3	860,12	0,00	0,00
	MA	514,00	0,00	0,00
ALCANTARILLAS				
	M3		0,00	286,91
	ML		0,00	42,00
	M3		0,00	88,40
	M3		0,00	21,17
	KG		0,00	1.921,02
	M3		0,00	42,94

TRAMO 2: GUACAS - SENOVIA (K 17+000 AL K 22+000)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	M3	121,00	0,00	121,00
	M3	115,00	66,49	82,49
	ML	0,00	0,00	0,00
	ML	0,00	0,00	0,00
	M3	36,43	0,00	20,00
	M3	7,00	3,42	3,67
	Kg	8.244,97	0,00	2.138,61
	ML	20,25	0,00	7,00
	M3	3.340,29	0,00	1.562,19
	M3	423,97	0,00	423,97
ITEMS NO PREVISTOS				
	m3	19,00	0,00	19,00
	ml	18,00	0,00	28,00
	m	1.282,94	13,00	997,22
	und	17,00	0,00	16,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO		
VERSION	1	
PAGINA	1	de 1

GESTION AMBIENTAL

PUENTES DE MATERIALES

UBICACION: ADHERIDOS EXITO
PERMISO MANEJO SI 6 NO
LICENCIA AMBIENTAL SI 6 NO

UBICACION: Municipio Ubicado en Barrangán Cesara
PERMISO MANEJO SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES NO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI 3	NO		NIR	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO		NIR	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO		NIR	
CONCESION DE AGUAS	SI	NO		NIR	
OCUPACION DE CAUCES	SI	NO		NIR	
VERTIMIENTOS	SI	NO		NIR	
EMISIONES	SI	NO		NIR	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		NIR	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICO ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACION REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 233 Y SE SUBIA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE HASTA LA FECHA NO SE AUTORIZADO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató el especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista el profesional SST

OBSERVACIONES:

GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NO
AVALUOS APROBADOS:	NO
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NO

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	42	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO: SERVICIOS CONTRATO DE CAMINO PUNTUAL Y MENSUAL	
OTROS:			

Un punto en cada tema

DESCRIPCION: Se han instalado los baños portátiles a la altura media de La Laguna K13+681 al K13+671 y al otro a la entrada de la vereda La Manzana (57 de Agosto) K15+000

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

De inicio al comité semanal de obra

La interventoría mediante oficio INC-ADA-320-5-113 de fecha 10 de abril de 2019, pidió la seguridad social de trabajadores y operadores de maquinaria

La interventoría ambiental oficio INC-ADA-320-5-116 de fecha 10 de abril de 2019, Revisión de la especificaciones ambientales de procesos

La interventoría mediante oficio INC-ADA-320-5-117 de fecha 10 de abril de 2019, Remisión del programa del contratista

La interventoría mediante oficio INC-ADA-320-5-118 de fecha 10 de abril de 2019, Inquietud sobre la presentación para la construcción de las obras hueco

La interventoría mediante oficio INC-ADA-320-5-119 de fecha 10 de abril de 2019, Mantenimiento vial sector de San Joaquín y otros arroyos

La interventoría mediante oficio INC-ADA-320-5-120 de fecha 10 de abril de 2019, Plan de Contingencia durante la construcción del descapotamiento y Hueco Tipo - Cuneta

La interventoría mediante oficio INC-ADA-320-5-121 de fecha 17 de abril de 2019, Prórroga de ejecución de obra No 8

Hueco Tipo - Cuneta

El oficio 1, se remitió con la construcción del metraje 1

De acuerdo la coordinación del hueco 1 y 2, el oficio nuevo 2

De acuerdo con la construcción de cuneta y huella entre 12+ 900 al 13+071 con la instalación del acero en 90,00 m

Sobre la construcción de las alcantarillas, Fueron enviadas solicitando la ubicación de las ALCANTARILLAS ESTANDAR ADICIONALES ESTANDAR y diseños adicionales y diseño, Mencionando la construcción de cuentas, revisión, cabezotes y cabezotes

Sobre la marca de demarcación, Se encuentran coordinadas las localidades en el ALCANTARILLAS metraje 1 al 2, falta el cabeza Puente, ALCANTARILLAS metraje entregados 1 al 2, METRAJE pisando la, complemento, El metraje 3 del muro 3 ALCANTARILLAS, tramo tanto al acero instalado

Sobre las placas huellas, Puente 1 ubicado (521100 al 521400), esta constituida por las estaciones, de La Laguna (K 12+681 al 12+671), se encuentra con bahía, esta con formaleta en 50,00 ml y el area de refuerzo en 50,00 m2, la cerca Chamizo (K 12+675 al K 12+650), tiene instalada la sustenta, morales y conformación de cepos, El tipo de las placas huellas no se han realizado actividades

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

[illegible]

RUTA No. [illegible]

PIJAO — GUACAS — [illegible]



Pijao, [illegible]



Pijao, construcción [illegible]



Génova, construcción del muro [illegible]

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSION | FECHA

FECHA: 13 ABRIL 2018

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(ES): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y HERMEA | DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO | SEMANA No: 58 del 09/04/2018 al 13/04/2018 (Numeracion consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO | GESTOR TECNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANIA RIVIERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL | FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 27 obras transversales, 8 muros y 2650 m de obras varias

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,450.00
ALCANTARILLAS: 19 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,200.00 PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS: 8 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 3499 - 2018 | VALOR INICIAL: $ 5,410,296,921.00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 29/JUN/2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 7 JULIO 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 5,410,296,921.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSIA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 3500 - 2018 | VALOR INICIAL: $ 616,000,000.00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 29/JUN/2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 7 JULIO 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 616,000,000.00

2. INFORMACION PRESUPUESTAL Y ESTADO FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA:	$ 5,410,296,921	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5,136,360,262.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,283,573,095.94
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,271,190,041.33
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	24.91%
% PROGRAMADO	24.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Diseños y Disenos, gestion predial, social, ambiental y otros)	$ 88,204,809.84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,415,275,451.67
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI: NO: X
MES FACTURADO:	
VALOR FACTURA: $	FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIAHACION:	$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el motivo del mismo)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO:	$ 239,681,393.00
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI: NO: X
MES FACTURADO:	
VALOR FACTURA:	FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIAHACION:	$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el motivo del mismo)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL


CÓDIGO		REGISTRO INTERNO
VERSIÓN		
FECHA		

II. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PUJAO – GUACAS (K 39+000 AL K 17+450)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO VIO SECTORES	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	100,00%		100,00%
PLACA HUELLA (M)	398,34		398,34
MUROS DE CONTENCION (ML)	44,73		44,73
ALCANTARILLAS (U)	5,00		5,00
MEJORAMIENTO VIA (KM)	383,47		383,47
OBRAS (M)	515,00		515,00
PAGA	1,00%		0,00
SOCIAL	1,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	1,00%		0,38%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del

TRAMO VIO SECTOR 1: PUJAO -(GUACAS (K 0+000 AL K 17+450)

TRAMO VIO SECTOR 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO VIO SECTORES (1)	1		TOTAL
Motoniveladora 1	2		2
Mixer compactador	1		1
Carrotanque de 4 a 5 de 10.000 litros	2		2
Volquetas de 7 m3	4		4
Mezcladora de concreto de minimo 2.3 bultos	3		3
Otro tipo de equipo	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de	1		1
Compactadora manual vibratoria (Rana)	2		2
Mini cargadora	0		0
	0		0

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION Y CUNETAS EN TIERRA	M2	1817,06	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	1388,97	0	31,8,20
IMPRIMACION	HA	0,62	0,20	0,08
CONFORMACION DE LA CALZADA EN ARENA	M2	6960,60	1872,5	6982,5
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	2260,15	81,71	598,77
ACERO DE REFUERZO FY 420MPA	Kg	81507,59	71,40	12886,4
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	360,66	0	224,33
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	337,79	0	90,94
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES A MANO EN CUALQUIER	M3	904,24	0	478,27
TUBERIA PLASTICA NOVAL D=	ML	99	0	99,8
ENCAMA GRANULAR CLASE B	M3	231,83	88,19	69,58
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	249,6	4,48	4,48
ACERO DE REFUERZO FY 420MPA (60000 PSI)	KG	33460,89	256,89	910
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	307,3	0	143,84

ESTRUCTURAS DE CONTENCION

		CANTIDADES PROGRAMADA S APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES MANO EN CUALQUIER MASA	M3	379,00	27,71	281,96
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	584,07	0	36,09
PILOTAJE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	8,00	8,00	16
CAMA DE PERFORACION DE DIAMETRO 0.80 HOR 1 Guia Rio Cauca (E)	M3	5,60	0	5,6
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	150,84	14,88	66,82
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3000 PSI)	M3	21,00	12,29	19,29
ACERO DE REFUERZO FY 420MPA	Kg	11506,84	1571,00	11078,79
Tuberia Perforada en PVC de 2	ML	84,73	0	83,28
GEOTEXTIL NORTH SEA O SIMILAR (TEJIDO)	M2	18160,40	0	1808
MATTRAS GAVIONES (RENO M6)	M3	529,15	0	172,8

ITEMS NO KENOTOS

RELLENO CON ARENA	M3	21,40	0	14,72
REMATADOR DE ALCANTARILLAS	TN	30,00	1	30
TUBO METAL PLACA TIPO CORRUGADA ENTRADA Y PASO CUNETA 10 mm	TN	1400,00	0	298
ESPESSIMETRO SONDEO LAM 125 DE Office Standard Plus 2)	und	12,00	0	13

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+450 AL K 39+000)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO VIO SECTORES (1)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			100,00%
PLACA HUELLA (M)		172,34	172,34
MUROS DE CONTENCION (ML)		20,20	20,20
ALCANTARILLAS (U)		4,00	4,00
MEJORAMIENTO VIA (KM)		0,00	0,00
OBRAS (M)		1.040,99	1.040,99
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del

TRAMO VIO SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (K17+450-K39+000)

TRAMO VIO SECTOR 2

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO VIO SECTORES (2)			TOTAL
Motoniveladora	2		2
Mini cargadora	1		1
Mixer compactador	1		1
Carrotanque de 4 a 5 de 10.000 litros	1		1
Volquetas de 7 m3	3		3
Mezcladora de concreto de minimo 2.3 bultos	2		2
Otro tipo de equipo	1		1
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de	1		1
Compactadora manual vibratoria (Rana)	1		1
	0		0
	0		0
	0		0

134

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CONTRATO			
REPORTE	2		
Fecha:	1	08	

TRAMO 2: SUMOS – GENOVA (K 17+000 AL K 35+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
[illegible]	M2	4.885,63	2.150,00	2.150,00
PLACA HUELLA				
[illegible]	M3	1.386,74	0,00	280,90
[illegible]	UN	0,55	0,00	0,35
[illegible]	M2	6.760,25	3.354,00	5.354,00
[illegible]	M3	2.142,72	0,00	980,88
[illegible]	Kg	99.783,78	0,00	0,00
[illegible]	M3	980,13	0,00	0,00
[illegible]	M3	314,55	0,00	0,00
ALCANTARILLAS				
[illegible]	M3	685,74	84,03	298,51
[illegible]	ML	69	0,00	43,00
[illegible]	M3	172,8	0,00	88,40
[illegible]	M3	148,59	0,00	21,07
[illegible]	KG	117345,44	40,00	1.051,86
[illegible]	M3	159,8	13,12	82,84

TRAMO 2: SUMOS – GENOVA (K 17+000 AL K 35+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADOS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
[illegible]	M3	121,56	0,00	121,56
[illegible]	M3	115,00	16,00	16,00
[illegible]	ML	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ML	0,00	0,00	0,00
CONCRETO REFUERZO 21MPA (3)	M3	58,42	0,00	26,60
CONCRETO REFUERZO 17 MPA (3)	M3	7,98	0,00	3,20
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	Kg	9.844,87	0,00	2.139,81
Tuberia Perforada en PVC de 3"	ML	39,25	0,00	7,40
[illegible]	M3	3.982,28	0,00	3.982,28
[illegible]	M3	423,07	13,81	423,88
ITEMS NO PREVISTOS				
[illegible]	m3	10,00	0,00	10,00
[illegible]	ml	18,00	7,00	25,00
[illegible]	ml	1.282,34	0,00	643,33
[illegible]	Und	17,00	0,00	16,00

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS GUTO — PERMISO MINERO: SI 9 NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI 9 NO ___

UBICACION: Kilometro 4 de la via Sarmiento Zalmora — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	9	NO	___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL	SI	___	NO	___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	___	NO	___	N/A ___
CONCESION DE AGUAS	SI	___	NO	___	N/A ___
OCUPACION DE CAUCES	SI	___	NO	___	N/A ___
VERTIMIENTOS	SI	___	NO	___	N/A ___
EMISIONES	SI	___	NO	___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A ___

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRD LA DOCUMENTACION REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA Nº 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA, NO HA AUTORIZADO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional EST

OBSERVACIONES:

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VI. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	52	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	52	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCION DEL SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: SEDES: PUNTO DE INFORMACION TURISTICO PUNTO Y SEMANA	
OTROS:		Si puesto en esta misma	

OBSERVACIONES: EL CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES EN LA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII FUE ABIERTADO, FUE RETIRADO, PUNTO ECOLOGICOS, 2 BAÑOS PORTATILES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSION	
FECHA	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

De manera el corrido semanal de obra.
La interventoria mediante oficio INT-825-2019-0230 de fecha 08 de abril de 2019, hace solicitud de plan de mantenimiento preventivo de obra for 1000 de 2018
La interventoria mediante oficio INT-825-2019-115 de fecha 12 de abril de 2019, hacia entrega de acta parcial de obra No 6
La interventoria mediante oficio INT-825-2019-114 de fecha 12 de abril de 2019, hacia entrega de acta parcial de obra No 7
Fue entregada el INVIAS el acta parcial de pago No 08 correspondiente al mes de marzo de 2019

Tramo: Pijao - Guacas

En el PR277 + 50 se inicia con la construcción del box coulvert y se instala el acero del muro
Se termina la construcción del muro K 84+870 modulo 1
Se continúa con la construcción de bordillos y cabezas de la obra huella de Puente Tierra K 2+100 al K 2+217
Se construyen el módulo 1 del muro 3 K 7+200 y se instala fierro del módulo 2
Se inicia con la construcción de la obra huella del K 13+371 al K 13+411
Sobre la estabilización de los pavimentos: Tercer semana reparando la tubería de alcantarillas de los Km298, K7+200, K10+150, K10+300 Y K 13+400, con excavación de los K 12+ 918. Ninguna tiene construcción de cabezal (muro), tabiques y deflectos.
Sobre los muros de contención: Se encuentran terminados los monolitos en el K7+775 (medidas 12 cm, 4cm/30 centímetros, K7+850 (medida 11, 45cm/30 centímetros), El módulo 1 del muro K24+775, tiene todo el acero instalado los módulos 2 y 3 del muro 3 K7+200, tienen todo el acero instalado
Sobre las placas huellas: Pudrero 1 placa (K0+139 al Q4+420) - está construida en su totalidad, en La Laguna (K11+941 al 12+417) se encuentra con base, está con formaleta en 40,00 mt, la de los Chorros (K7+175 al K 13+680), tiene instalada la subbase, nivelada y conformación de calzada. En las demás placas también no se han instalado estructuras

Tramo: Guacas - Ceneiva

Instalacion sin subrasante de las alcantarillas K 17+000
Construcción de aletas cerradas K 17+ 010
Se continúa la relleno de la subbase de la obra huella K 20+180 al K 19+714
Se construye filtro n-1 el muro 3 K 19+413
Se inicia y se termina el muro 6 K 19+360

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construida: K17+670, K17+730, K17+728 y K17+818. La del K17+700, le hace falta la construcción del cabezal de descarga y deflector, la del K19+620, tiene la tubería instalada

Sobre los muros: En construcción se encuentran terminados, faltando solo los filtros y drenes, los del K 19+380, K19+660 y K21+327, El muro 2 K 19+180, no se ha instalado, el muro 3 K 21+413, no ha sido instalado, ninguno filtro.
Sobre la obras huellas solo se inicio con la construcción de la bocatoma entre K17+200 al 18+770, con respecto a conformación de subrasante, tiene filtros y cunetas entre el K17+600 al 17+810 y del K 18+380 al K 18+713+. En las demas obras no se han iniciado actividades

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo: Pijao - Guacas

Continuación en la obra huella K 12+941 al K 13+371
Terminación de la construcción del modulo 1 DE muro 1 K 2+770
Terminación del bordillo de la obra huella continuada K 2+170 al K 2+347
Lleno del muro 4 K 84+870 y terminación de instalación de cubierta de alcantarilla K 84+940
Continuación de la construcción del muro 3 K 7+200 modulos 2 y 3

Tramo: Guacas - Ceneiva

EXCAVACIONES E INSTALACIÓN DE FILTROS (CANALIZACIÓN DE FLUJO HUELLA VEHICULAR) K18+700
CONSTRUCCIÓN DE SUBRASANTE K 17+457 AL K 18+761
Construcción de filtros y drenes en los muros 5 (K 19+380) y del muro 4 K 22+321
Construcción de cabezales (muros alcantarillas K 17+ 980
Construcción pozos (cunetas) alcantarillas K 17+700

Ri/Tr+ No. 402935 — ESTE CORRESPONDE PERMANENTE DE LA VIA
K 0 + 000 PIJAO — K 17.200 GUACAS — K 26 + 400 GIGANTA

El presente grafico sera definido por el interventor de acuerdo con el diseño del contrato de obra

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, Paso de Don Joaquin K11+200



Pijao, costado de topografia Muro 3 K 7+200



Ceneiva, conformacion de subbase placa huella K17+620 AL K 18+730

NOTA:

X. RECOMENDAR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRARRESTEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

Realizar el comunicado sobre requerimientos, comunicados o incumplimientos
Realizacion de visita técnico contractual para el control y seguimiento de la programación del contrato
Realizar el comunicado el aumento de los frentes de trabajo
Realizar la suspensión, ampliación de los trabajos
Exigir el cumplimiento la entrega de programaciones semanales de obra, debido a que los cronogramas serán por tramos de 5 kilómetros

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRES: ANDRES FELIPE MUÑOZ GONZALEZ
No. MAT: 25202-284675 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSION | FECHA

FECHA: 8 (DIA) ABRIL (MES) 3-(19) (AÑO)

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR (S): TRAMO 1: PLAN - GUACAS / TRAMO 2: GUACAS - SIBERIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | SEMANA No.: 55 (Numeración consecutiva) del 01/04/2019 al 07/04/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. HERNAN RODRIGO AGUDELO | DIRETOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANIA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL | FECHA DE INICIO: 09-ago-18

Km A MEJORAR: | Km A REHABILITAR: | Km A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 27 obras hidraulicas, 5 muros y 2456 m de obras fluvial

PLAN - GUACAS
KM PLAZA HUELLA: 1.400 KM
ALCANTARILLAS: 20 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

SIBERIA - GUACAS
KM PLAZA HUELLA: 1.200 KM PLAZA HUELLA
ALCANTARILLAS: 9 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 4 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0490 - 2018 | VALOR INICIAL: $ 5.413.208.921,00
PLAZO INICIAL: HASTA 7-JULIO-2019 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7-JULIO-2019 | VALOR ACUMULADO: $ 5.413.208.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: CONSULTA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0500 - 2018 | VALOR INICIAL: $ 316.000.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 07-AGOSTO-2019 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7-JULIO-2019 | VALOR ACUMULADO: $ 316.000.310,00

2. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FISICO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

Vigencia	2018	2019	2020	2021
Ejecución por vigencia	$ 5.413.208.921,00		$ -	$ -
Acumulado	$ -	$ -	$ -	$ -

(Incluir ultimas 4 vigencias)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.136.393.052,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.201.571.865,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.212.042.961,15
AVANCE DE OBRA EN % (B/A)	23,10%
% PROGRAMADO	81,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestion predial, social, ambiental y otros)	$ 99.034.959,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.311.077.920,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI: | NO: X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ | FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE DAFIN/ADM: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el motivo del retardo)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 200.665.260,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI: | NO: X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: | FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE DAFIN/ADM: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el motivo del retardo)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSION			
PAGINA	1	DE	1


8. AVANCE FISICO

TRAMO 'A' (PLAYA - GUACAS (PR 0+000 AL PR 17+400))

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	781,00		781,00
MUROS DE CONTENCION (ML)	19,00		19,00
ALCANTARILLAS (M)	9,00		9,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)	383,41		383,41
OTROS (M)	537,84		537,84
PAVIMENTO	0,00%		0,00
TRICHOS	0,00%		0,00
CAPACITACION (HORAS)	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance fisico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1		TOTAL
Retroexcavador	1		1
Volco compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10.000 litros	1		1
Vibradores de 7 mil	4		4
Mezcladores de concreto de mínimo 2.5 bultos	1		1
Vibradores de concreto	1		1
Compresor de 125 pies3 o superior, con martillo de	1		1
Compactadores manual -Bailarina (Rana)	2		2
Motoniveladora	1		1
	0		0
	0		0

TRAMO Y/O SECTOR 1: PLAYA - GUACAS(PR 0+000 AL PR 17+400)

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	1917,08	0	1917,08
PLACA HUELLA				
TUBERIA DE GALVANIZADA CLASE B	MG	1388,87	0	315,38
ACERO	KG	0,62	0	0,59
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9965,55	0	4980
EXCAVACIONES MANUALES MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2383,19	4,4	241,38
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2	Kg	51407,69	0	10815,17
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (3)	M3	981,06	0,43	224,33
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (3) RELLENO	M3	981,75	0,51	80,64
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES MANUALES CUALQUIER	M3	994,34	43,54	479,27
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC	ML	98	0	80,6
SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	251,62	0	10,8
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3)	M3	240,6	0	0
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA	KG	22480,88	0	80,51
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CONFINADOS	M3	207,2	0	149,84

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES MANUALES EN ROCA SUELO ROCA	M3	575,00	0	234,38
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	584,31	4,14	36,09
ACERO DE LOSAS CONCRETO REFORZADO EN CONCRETO 21 MPA	KG	0,89	0	0,59
CAMPO PERMANENTE DE CONCRETO EXTERIOR 3 DIAS SIN CONCRETO	M2	0,60	0	0,6
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA(3)	M3	104,64	1,57	71,14
CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 MPA (3)	M3	21,26	0,36	0,95
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	11800,84	1342,38	8482,85
Tubos Perforados PVC de 2	ML	54,73	3,6	18,25
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE ALTA CALIDAD	M2	15790,44	0	1099
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	829,14	0	173,6
ITEMS NO PREVISTOS				
EXCAVACION CON MAQUINA	m3	21,00	0	14,12
DEMOLICION DE ALCANTARILLAS	m	36,00	0	18
TUBERIA DE PLASTICO 36" CORRUGADA NTC	ml	1400,00	0	980
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI SUMINISTRO COLOCACION	MC	12,00	0	12

TRAMO 2: GUACAS - GRANZAL (PR 17+400 AL PR 23+600)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		779,00	779,00
MUROS DE CONTENCION (ML)		22,00	22,00
ALCANTARILLAS (M)		9,00	9,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)		0,00	0,00
OTROS (M)		960,72	960,72
PAVIMENTO			
TRICHOS			
CAPACITACION (HORAS)			0,00%
			0

Los conceptos para determinar el avance fisico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)			TOTAL
Retroexcavador		1	1
Motoniveladora		1	1
Volco compactador		1	1
Carrotanque de agua de 10.000 litros		1	1
Vibradores de 7 mil		1	1
Mezcladores de concreto de mínimo 2.5 bultos		1	1
Vibradores de concreto		1	1
Compresor de 125 pies3 o superior, con martillo de		1	1
Compactadores manual -Bailarina (Rana)		2	2
		0	0
		0	0

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS(PR 0+000 AL PR 17+400)

TRAMO Y/O SECTOR 1:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO:		
VERSION:		
PAGINA:		

TRAMO 2: GUACAS - SENGUA (PR 17+000 AL PR 23+000)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
[illegible]	M2	4.000,00	0,00	0,00
PLACA HUELLA				
[illegible]	M3	1.199,74	135,20	365,60
[illegible]	HA	0,00	0,00	0,00
[illegible]	M2	6.760,26	0,00	2.000,00
[illegible]	M3	2.452,50	0,00	863,00
[illegible]	Kg	10.703,75	0,00	0,00
[illegible]	M3	980,12	0,00	0,00
[illegible]	M3	314,88	0,00	0,00
ALCANTARILLAS				
[illegible]	M3	953,94	28,63	331,68
TUBERIA PLASTICA TROPICAL 24"	ML	80	0,00	43,00
[illegible]	M3	173,8	0,00	89,40
[illegible]	M3	459,94	2,47	21,92
[illegible]	KG	11345,44	156,30	1.81 1,63
[illegible]	M2	953,4	17,63	89,62

TRAMO 2: GUACAS - SENGUA (PR 17+000 AL PR 23+000)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADA A EJECUTAR	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
[illegible]	MO	121,00	0,00	121,00
[illegible]	MO	110,00	0,00	0,00
[illegible]	ML	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ML	0,00	0,00	0,00
[illegible]	M3	26,67	4,00	26,00
[illegible]	M3	7,00	0,00	5,25
ACERO DE REFUERZO FY=420MPA	Kg	9.944,67	552,50	2.720,67
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	20,20	2,00	7,00
[illegible]	M3	3.682,29	0,00	3.580,29
[illegible]	M3	429,67	0,00	423,67
ITEMS NO PREVISTOS				
[illegible]	m3	10,80	0,00	10,00
[illegible]	ml	16,00	0,00	16,00
[illegible]	ml	1.283,54	0,00	843,00
[illegible]	und	17,00	0,00	16,00

GESTION AMBIENTAL

PUNTOS DE MATERIALES:

UBICACION: ADHESIVOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ / LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACION: Glorieta K de la Via Santagón-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ / LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	___	NO	___	N/A	___
CONCESION DE AGUAS	SI	___	NO	___	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	___
VERTIMIENTOS	SI	___	NO	___	N/A	___
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	___
OTROS (Especifique cual)	SI	___	NO	___	N/A	___

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICO ANTE LA CRC LA DOCUMENTACION REQUERIDA (ADJUNTO SUSCRITO EL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO

P.M.S.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y con el transcurso de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO, NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 22
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEÑOR COMITE DE CAPACITADOS PLANO Y GENERAL
Un punto en cada frente

OBSERVACIONES: EL CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES EN LA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII FUE ADECUADO, FUE DESALOJADO, PUNTO ECOLOGICO, 3 BAÑOS PORTATILES

13

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra.
La interventoría mediante oficio INC-605-2018-109 de fecha 02 de abril de 2018. Con observación exigida para nuestras oficinas y sede de riego permiso del mes de marzo de 2018.
La interventoría mediante oficio INC-605-2018-108 de fecha 02 de abril de 2018. Requerimiento de documentos de orden y calidad de los materiales.
La interventoría mediante oficio INC-605-2018-110 de fecha 05 de abril de 2018. Sobre personal en obra.
La interventoría mediante oficio INC-605-2018-111 de fecha 06 de abril de 2018.Sobre el suministro de materiales.
La interventoría mediante oficio INC-605-2018-112 de fecha 09 de abril de 2018. Requerimiento de la trimestralidad.

Tramo Pijao - Guayas

En el Hato 1 se termina con la construcción de los cabezotes y con ellos el muro en mampostería.
Se termina la construcción del muro PR 5+870 margen 1.
Se continúa con la construcción del cimiento y cuerpo de la placa huella en Puente Tablas PR 3+700 al PR 3+800
Se continuó el módulo 1 del muro 2 PR 7+300 y se inició nuevo del módulo 2.
Se inicia con la construcción de la placa huella del PR 7+700 hasta el PR 7+771

Tramo Guayas - Gaitania

Finalización de tubería de las escalerillas PR 17+600
Construcción de cunetas revestidas PR 17+ 618
Se construyó la losa de la entrada de la placa huella PR 19+000 al PR 19+110
Se construyó PR4 en el Hato 3 PR 13+673
Se inicia y se termina el muro 3 PR 16+360

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao – Guayas

Construcción de la placa huella PR 12+800 al PR 13+000
Terminación de la construcción del módulo 1 del muro1 PR 8+700
Terminación del bombeo de la placa huella localizada PR 3+100 al PR 3+700
Losa del muro 4 PR 8+870 y bombeo de instalación de tubería de escalerilla PR 9+000
Continuación de la construcción del muro 5 PR 11+360, modulos 2 y 3

Tramo Guayas - Gaitania

EXCAVACIONES E INSTALACIONES DE TUBERIA DE ESCALERILLAS PARA LA ENTRADA AL DESPLANTE
CONSTRUCCION DE SUBDRENANTE PR 17+600 AL PR 19+100
Construcción de filtros y barbacanas en los muros 5 (PR 9+ 880 al Del Muro 4 PR 10+ 021)
Construcción de cabezotes mampostería escalerillas PR 17+600
Construcción cuneta revestida escalerillas PR 17+ 600

RUTA No. 40GAI05 RUTA CONFIGURACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA
PR 0 + 000 PIJAO PR 17.000 GUACAS PR 33 + 400 GAITANIA

El presente informe será diligenciado por el interventor de acuerdo con el avance del contrato de obra

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, construcción cabezotes muro 1 modulo 2 PR (5+770)



Pijao, construcción placa huella del PR 12+800 al PR 13+000 (MARGEN IZQUIERDA)



Gaitania, construcción del muro 5 PR 10+360

NOTA:

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE DEMUESTRAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR

Realizar el seguimiento diario, mensualmente, cumplimiento a especificaciones
Realización del comité semanal para el control y seguimiento de la programación de personal
Realizar el cumplimiento al reglamento de los trabajos de trabajo
Informe de actividades, reportes de las actividades
Llegar a acuerdos a entrega de programaciones semanales se vea. Juntos a los requerimientos exigidos por trabajo de la semana.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: INGRID KATHERINE SANCHEZ
No. MAT: 2520239-71283

Archivo: Gestión Pública con Calidad

ANEXO 15. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15.FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ABRIL **CONTRATO No.** 0605 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

INTERVENTORÍA: COPEBA LTDA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	ESTACIÓN TOPCOM - GTS-255 KB 4102 Y NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM - AT-B2 SERIES 1965	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
CAMPERO DE MAS DE 2000 CC	MONTERO PLACA CVH 677 MODELO 2008	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
MOTOCICLETA	YAMAHA PLACA CPH33C MODELO 2012	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	
LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CONCRESERVICIOS ARMENIA					X	X																								
OFICINA (dotacion de sillas, mesas, computadores, impresora)	PIJAO, CALLE 14 6-26 APTO 4	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serial)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: TODO EQUIPOS SIA. CERTIFICADO No 0065. Estacion Total marca TOPCON. Y No 0088 . Nivel TOPCON (SE ANEXA)

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente Interventoria
Matrícula No.: 01105-0761 FEM/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de interventoria
Matrícula No.: 63202-13454 CND

Original: informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COMPBALTDA

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPBALTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi Montero | MODELO: 2.28 | PLACA: CUH 633

INSPECCIONÓ: Ingeniero Ramiro Avila M | FECHA: 12-04-2019 - 19-04-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 109333 | KILOMETRAJE FINAL: 109-875

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Faroles (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUIDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Tuercas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Fornas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

COPERALTOS

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPERALTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubichi Montero | MODELO: 2008 | PLACA: CLH677

INSPECCIONÓ: Cabo R. Avilla Arias | FECHA: 15-04-2019 - 17-04-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 168949 | KILOMETRAJE FINAL: 169332

ÍTEM	DETALLE	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
LUCES DE TRABAJO	Faroles (altas y bajas)	X		X		X										
	Direccionales		X		X		X									
	Stops	X		X		X										
	Luces de tablero	X		X		X										
	Testigos de advertencia	X		X		X										
CABINA	Defensa delantera	X		X		X										
	Defensa trasera	X		X		X										
	Retrovisores	X		X		X										
	Antena	X		X		X										
	Plumillas (limpiadores de parabrisas)	X		X		X										-
	Panorámico delantero	X		X		X										
	Panorámicos traseros	X		X		X										
	Vidrios puertas delanteras	X		X		X										
	Vidrios puertas traseras	X		X		X										
	Placas	X		X		X										
	Luces/pitos	X		X		X										
	Sillas	X		X		X										
	Cinturones de seguridad	X		X		X										
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	X		X		X										
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	X		X		X										
	Pito	X		X		X										
	Elevadores de vidrios delanteros	X		X		X										
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X									
	Ventilador refrigerante de motor	X		X		X										
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	X		X		X										
	Encendido	X		X		X										
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	X		X		X										
	Revisión y cambio de aceite de caja	X		X		X										
	Líquido de frenos	X		X		X										
	Refrigerante de radiador		X		X		X									
	Nivel de plumillas	X		X		X										
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS	Llantas	X		X		X										
	Llanta de repuesto	X		X		X										
	Bases	X		X		X										
	Kit de carretera	X		X		X										
	Kit anti derrames		X		X		X									
	Suspensión delantera	X		X		X										
	Suspensión trasera	X		X		X										
	Documentos del vehículo (Soat, tecnomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	X		X		X										
	Tronco	X		X		X										

1EA

COPEBA LTDA

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi Montero [?] | MODELO: 2008 | PLACA: CWH 677 [?]

INSPECCIONÓ: Jhon [?] [illegible] | FECHA: 08-04-2019 - 13-04-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 108379 [?] | KILOMETRAJE FINAL: 108949 [?]

ÍTEM	DETALLE	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámicos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUIDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X	✓	X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

165

COOPERALTIVA

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COOPERALTIVA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: Mitsubishi Montero | MODELO: 2008 | PLACA: CUH677

INSPECCIONÓ: Ingri Bibiana Avila Mejia | FECHA: 1-04-2019 - 6-04-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 106897 | KILOMETRAJE FINAL: 106379

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Faroles (altas y bajas)	X		X		X		✓		X		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	X		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		X		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CARINA	Defensa delantera	X		✓		X		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓		X		✓		✓		?		X				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	X		X		✓		✓		X		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras		X		X		X		X		X		X			
	Placas	X		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		X		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUIDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Tiner	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Gratis cerrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

ANEXO 16. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

162

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	INVIAS-MN-IN-15-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ABRIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0025 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

INTERVENTOR: COPERA LTDA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA				X	X	X					X	X	X					X	X	X						X	X				
EDISSON PALACIOS GUIO	RESIDENTE INTERVENTORIA	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	SECRETARIA	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
NURY GARCIA LOPEZ	TRABAJADORA SOCIAL						X	X	X	X																	X	X	X	X	X	
JOHN OSWALDO CANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL						X	X	X	X																	X	X	X	X	X	
JAIR RAMIRO ARDILA ARIZA	CONDUCTOR	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
LUIS FERNANDO BORBON	TOPOGRAFO	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
JONH MAYRON HINESTROZA	CADENERO	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
HUGO CARDONA CASTAÑO	AUXILIAR INTERVENTORÍA	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	INSPECTOR	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERMAN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0626-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GÉNOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA-GUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	418	006-2402-0603-2018-130101-0001	A63000	Nación	Contrato principal 626 de 2018	$18.020.310,30
				TOTAL		$18.020.310,30

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $18.020.310,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1119 De (01/06/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 518.020.310,00		$ 518.020.310,30		
1	ago-18	$ 13.706.568,00	$ 2.604.018,00	$ 16.310.376,00	$ -	$ -	$ 501.713.934,00	$ 16.309.376,00	$ 501.713.934,30		
2	sep-18	$ 25.700.000,00	$ 4.883.381,00	$ 30.583.384,00	$ -	$ -	$ 471.125.550,00	$ 46.894.760,00	$ 471.125.550,30		
3	oct-18	$ 30.945.615,00	$ 5.879.705,00	$ 36.825.320,00	$ -	$ -	$ 434.300.230,00	$ 83.720.080,00	$ 434.300.230,30		
4	nov-18	$ 25.812.624,00	$ 4.904.399,00	$ 30.717.023,00	$ -	$ -	$ 403.583.207,00	$ 114.437.303,00	$ 403.583.207,30		
5	dic-18	$ 26.807.518,00	$ 5.093.428,00	$ 31.900.946,00	$ -	$ -	$ 371.682.261,00	$ 146.338.249,00	$ 371.682.261,30		
6	ene-19	$ 30.531.073,00	$ 5.800.904,00	$ 36.331.977,00	$ -	$ -	$ 335.350.284,00	$ 182.670.226,00	$ 335.350.284,30		
7	feb-19	$ 35.650.525,00	$ 6.773.697,00	$ 42.424.463,00	$ -	$ -	$ 292.925.821,00	$ 225.094.700,00	$ 292.925.821,30		
8	mar-19	$ 41.027.296,00	$ 7.795.196,00	$ 48.822.492,00	$ -	$ -	$ 244.103.119,00	$ 273.917.191,00	$ 244.103.119,30		
9	abr-19	$ 43.349.584,00	$ 8.236.421,00	$ 51.586.005,00	$ -	$ -	$ 192.517.114,00	$ 325.503.196,00	$ 192.517.114,30		
TOTALES		$ 273.532.097,00	$ 51.971.099,00	$ 325.503.196,00			$ 244.103.119,00	$ 273.917.191,00	$ 244.103.119,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202086075 CND

Firma:
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 03000 - 13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión documental (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

190

ANEXO 18. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

FECHA	30 (DÍA)	4 (Mes)	2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PEÑA	52.253.696	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 8.254.000,00	$ 8.254.000,00	$ 32.700,00	$ 250.200,00	$ 1.063.300,00	$ -		
2	EDISSON PALACIOS GUIO	7.167.367	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 215.800,00	$ 124.000,00	$ 496.000,00	$ -		
3	HUGO CARDONA CASTAÑO	4.522.755	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.435.000,00	$ 2.435.000,00	$ 169.500,00	$ 97.400,00	$ 389.600,00	$ -		
4	NURY GARCIA LOPEZ	52.880.526	TRABAJADORA SOCIAL	$ 1.553.116,00	$ 1.553.116,00	$ 8.200,00	$ 62.200,00	$ 248.500,00	$ -		
5	JOHN OSWALDO CANO	79.855.440	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.065.000,00	$ 828.116,00	$ 74.200,00	$ 109.600,00	$ 132.500,00	$ -		
6	LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	4.118.715	INSPECTOR	$ 1.800.300,00	$ 1.800.300,00	$ 125.400,00	$ 72.100,00	$ 288.100,00	$ -		
7	JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	24.988.802	SECRETARIA	$ 869.500,00	$ 869.500,00	$ 60.600,00	$ 34.800,00	$ 139.200,00	$ -		
8	LUIS FERNANDO BORBON	7.548.791	TOPOGRAFO	$ 1.820.241,00	$ 1.820.241,00	$ 126.700,00	$ 72.900,00	$ 291.300,00			
9	JAIR RAMIRO ARDILA ARIZA	18.435.773	CONDUCTOR	$ 828.116,00	$ 828.116,00	$ 57.700,00	$ 33.200,00	$ 132.600,00	$ -		
10	JOHN MAYRON HINESTROZA	1.099.709.891	CADENERO	$ 869.500,00	$ 869.500,00	$ 60.600,00	$ 34.800,00	$ 139.200,00			
					$ 20.357.889,00	$ 931.400,00	$ 885.200,00	$ 3.920.200,00	$ -		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 20.694.773,00	TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					$	5.136.800,00

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matrícula No.: 2520256675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

192

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.C.	2564013	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	446558504	5490169712	E	2019/05/08	2019/05/15	BANCOLOMBIA	7	$16,213,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COP BOGOTA (12 Afiliados)					$18,990,262	$3,141,200			$23,386,349	$935,800			$22,976,908	$903,400			$24,214,465	$121,700		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBABOG (12 Afiliados)					$18,990,262	$3,141,200			$23,386,349	$935,800			$22,976,908	$903,400			$24,214,465	$121,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)					$18,990,262	$3,141,200			$23,386,349	$935,800			$22,976,908	$903,400			$24,214,465	$121,700		$0	$0
1	CC	7718 [illegible]	CARRILLO DAZA JAIME ENRIQUE	28-14	30	$4,000,000	$480,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	COF24	30	$4,000,000	$160,000	14-16	30	$4,000,000	$20,000	30	$0	$0
2	CC	1032412944	CORREA SANTANA WISNER ALEJANDRO	230501	24	$3,080,000	$330,400	EPS005	24	$3,080,000	$80,200	COF24	24	$3,080,000	$80,200	14-16	24	$3,080,000	$10,800	24	$0	$0
3	CC	1032412944	CORREA SANTANA WISNER ALEJANDRO	230501	6	$520,000	$62,200	EPS005	6	$520,000	$20,800	COF24	0	$0	$0	14-16	6	$520,000	$0	0	$0	$0
4	CC	5201 5204	GARCIA VALENCIA, DIANA MARIA	23-14	30	$1,500,000	$284,400	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	COF24	30	$1,500,000	$60,000	14-16	30	$1,500,000	$8,300	30	$0	$0
5	CC	1026078571	GRANDE MEJIA DAYANA ALEXANDRA	230501	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	COF24	30	$828,116	$33,200	14-16	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
6	CC	1102671209	GUTIERREZ GUTIERREZ CHRISTIAN JAVIER		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	COF24	30	$1,750,000	$70,000	14-16	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
7	CC	6041 3758	GUTIERREZ PARRA RAFAEL	230501	30	$903,000	$149,300	EPS017	30	$903,000	$37,400	COF24	30	$903,000	$37,400	14-16	30	$903,000	$4,900	30	$0	$0
8	CC	1014211799	HOVEL CAÑON LUIS FELIPE	23 501	30	$1,750,000	$290,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	COF24	28	$1,750,000	$70,000	14-16	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
9	CC	5088474	ISLAS BABEL ARELIS FEDRA	230501	12	$321,247	$53,000	EPS005	12	$321,247	$13,300	COF24	12	$321,247	$13,300	14-16	12	$321,247	$1,800	12	$0	$0
10	CC	5088474	ISLAS BABEL ARELIS FEDRA	230501	18	$496,870	$79,500	EPS005	18	$496,870	$19,900	COF24	0	$0	$0	14-16	18	$496,870	$0	0	$0	$0
11	CC	5077360	MENESES GUTIERREZ LUZ MILA	230501	7	$307,039	$50,200		0	$0	$0	COF24	7	$307,039	$8,300	14-16	30	$828,116	$4,400	7	$0	$0
12	CC	5233646	PEÑA SANCHEZ ANDRES DEL FELIP	28-14	30	$4,254,000	$1,060,200	EPS005	30	$4,254,000	$250,200	COF24	30	$4,254,000	$250,200	14-16	30	$4,254,000	$22,700	30	$0	$0
13	CC	17161857	PEÑA BARRERA EUCEVIO		0	$0	$0	EPS007	30	$2,835,000	$61,000	COF24	30	$2,835,000	$61,000	14-16	30	$2,835,000	$15,600	30	$0	$0
14	CC	41555855	SANCHEZ DE PEÑA LUZ HELIETA		0	$0	$0	EPS005	30	$828,116	$33,200	COF24	30	$828,116	$33,200	14-16	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA OBRA (4 Afiliados)					$4,481,532	$179,500			$4,481,532	$179,500			$4,481,532	$179,500			$4,481,532	$233,200		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA OBRA (3 Afiliados)					$2,928,416	$438,600			$2,928,416	$117,300			$2,928,416	$117,300			$2,928,416	$204,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$2,928,416	$438,600			$2,928,416	$117,300			$2,928,416	$117,300			$2,928,416	$204,000		$0	$0
11	CC	98155794	HERNANDEZ EUGENIO JESUS HEMI	231501	30	$828,116	$130,900	EPS017	30	$828,116	$33,200	COF24	30	$828,116	$33,200	14-16	30	$828,116	$37,700	30	$0	$0
14	CC	79160167	JUNO ORREGO FERNANDO		0	$0	$0	EPS005	5	$500,000	$12,000	COF24	5	$500,000	$12,000	14-16	5	$500,000	$30,900	5	$0	$0
17	CC	41 [illegible]	TORRES HARGAN LUIS ALEJANDRO	230501	30	$1,625,000	$308,500	EPS017	30	$1,625,000	$65,000	COF24	30	$1,625,000	$65,000	14-16	30	$1,625,000	$125,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA0001 (1 Afiliados)					$1,553,116	$248,500			$1,553,116	$62,200			$1,553,116	$62,200			$1,553,116	$8,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,553,116	$248,500			$1,553,116	$62,200			$1,553,116	$62,200			$1,553,116	$8,200		$0	$0
18	CC	52888566	GARCIA LOPEZ MARY [illegible]	230501	30	$1,553,116	$248,500	EPS005	30	$1,553,116	$62,200	COF24	30	$1,553,116	$62,200	14-16	30	$1,553,116	$8,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 954 ANTIOQUIA (11 Afiliados)					$20,171,231	$3,317,500			$22,699,478	$900,200			$22,699,478	$900,200			$22,699,478	$1,580,200		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA954 (11 Afiliados)					$20,171,231	$3,317,500			$22,699,478	$900,200			$22,699,478	$900,200			$22,699,478	$1,580,200		$0	$0
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)					$20,171,231	$3,317,500			$22,699,478	$900,200			$22,699,478	$900,200			$22,699,478	$1,580,200		$0	$0

2019/05/17 09:55 AM

03

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
19	CC	[illegible]	MENDEZ MOSQUERA MIGUEL ANTONIO		0	$0	$0	EPS005	12	$331,247	$13,300	COF02	12	$331,247	$13,300	14-16	12	$331,247	$39,700	12	$0	$0
20	CC	[illegible]	LOPEZ URREGO JOSE MANUEL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	COF02	30	$2,000,000	$80,000	14-16	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
21	CC	[illegible]	LOPEZ CAÑAS JUL MARIANA	05-14	30	$850,400	$136,100	EPS040	30	$850,400	$34,100	COF02	30	$850,400	$34,100	14-16	30	$850,400	$59,200	30	$0	$0
22	CC	[illegible]	MORALES SOLANO BRIGITH MILE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	COF02	30	$2,000,000	$80,000	14-16	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
23	CC	[illegible]	PEÑARANDA ARIAS SILVI LEONARDO	05-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	COF02	30	$2,300,000	$92,000	14-16	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
24	CC	[illegible]	PULIDO RODRIGUEZ HUGO ARMANDO	230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS044	30	$3,600,000	$144,000	COF02	30	$3,600,000	$144,000	14-16	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
25	CC	[illegible]	RESTREPO JIMENEZ ALFREDO ALEJANDRO	230201	8	$220,831	$35,400	EPS017	8	$220,831	$8,900	COF02	8	$220,831	$8,900	14-16	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0
26	CC	[illegible]	ROJAS VARGAS NICOLETTE		0	$0	$0	EPS016	30	$2,197,800	$87,900	COF02	30	$2,197,800	$87,900	14-16	30	$2,197,800	$153,000	30	$0	$0
27	CC	[illegible]	SIERRA OLIVEROS JONATHAN FERNANDO	230301	30	$5,400,000	$918,000	EPS044	30	$5,400,000	$216,000	COF02	30	$5,400,000	$216,000	14-16	30	$5,400,000	$375,900	30	$0	$0
28	CC	[illegible]	URREGO SADRA ROBINSON RICARDO	230301	30	$1,800,000	$306,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	COF02	30	$1,800,000	$72,000	14-16	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
29	CC	[illegible]	ZULETA CORTES CARLOS ALEXANDER	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS044	30	$2,000,000	$80,000	COF02	30	$2,000,000	$80,000	14-16	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 825 QUINDIO (9 Afiliados)						$9,922,357	$1,367,800			$9,922,357	$397,100			$9,922,357	$397,100			$9,922,357	$490,900		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA825 (6 Afiliados)						**$9,922,357**	**$1,367,800**			**$9,922,357**	**$397,100**			**$9,922,357**	**$397,100**			**$9,922,357**	**$490,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: PIJAO Depto: QUINDIO (6 Afiliados)						**$9,922,357**	**$1,367,800**			**$9,922,357**	**$397,100**			**$9,922,357**	**$397,100**			**$9,922,357**	**$490,900**		**$0**	**$0**
[illegible]	CC	[illegible]	ARDILA AREA SAIR [illegible]	[illegible]	30	$828,716	$132,500	[illegible]	30	$828,716	$33,200	COF43	30	$828,716	$33,200	14-16	30	$828,716	$57,500	30	$0	$0
[illegible]	CC	[illegible]	ARDILA AREA JOHANA ROCIO	[illegible]	30	$869,500	$139,100	[illegible]	30	$869,500	$34,800	COF43	30	$869,500	$34,800	14-16	30	$869,500	$60,600	30	$0	$0
[illegible]	CC	[illegible]	BORDON LUIS FERNANDO	[illegible]	30	$1,820,241	$291,200	[illegible]	30	$1,820,241	$72,900	COF43	30	$1,820,241	$72,900	14-16	30	$1,820,241	$126,700	30	$0	$0
[illegible]	CC	[illegible]	CARDONA CASTAÑO HUGO	[illegible]	30	$2,423,800	$387,800	[illegible]	30	$2,423,800	$97,000	COF43	30	$2,423,800	$97,000	14-16	30	$2,423,800	$168,900	30	$0	$0
[illegible]	CC	[illegible]	HINESTROSA VALENCIA JHON MAYRON	05-14	30	$869,500	$139,100	[illegible]	30	$869,500	$34,800	COF43	30	$869,500	$34,800	14-16	30	$869,500	$60,600	30	$0	$0
[illegible]	CC	[illegible]	PALACIOS GUAPACHA EDISON MONTHERLANT	[illegible]	30	$3,100,000	$496,000	[illegible]	30	$3,100,000	$124,000	COF43	30	$3,100,000	$124,000	14-16	30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					**$53,265,382**	**$8,715,600**			**$60,489,716**	**$2,420,600**			**$59,679,875**	**$2,388,200**			**$61,317,832**	**$3,466,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CDP BOGOTA	CR 21 100 30 OFICINA 402	BOGOTA-BOGOTA D.C.	2564213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	445558504	5490169712	E	2019/05/08	2019/05/15	BANCOLOMBIA	7	$16,213,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$8,715,600	$45,500	$0	$8,761,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$412,500	$2,200	$0	$414,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,641,000	$13,800	$0	$2,654,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,389,700	$22,900	$0	$4,412,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,272,400	$6,600	$0	$1,279,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,605,000	$13,500	$0	$2,618,500
LIBERTY	14-18	860,008,845	7	33	$2,605,000	$13,500	$0	$2,618,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$2,388,200	$12,400	$0	$2,400,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,843	6	11	$908,200	$4,700	$0	$912,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	$397,100	$2,100	$0	$399,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,082,900	$5,600	$0	$1,088,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				32	$2,420,600	$12,900	$0	$2,433,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,200	$600	$0	$114,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$236,200	$1,300	$0	$237,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$87,900	$500	$0	$88,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$255,900	$1,400	$0	$257,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$672,900	$3,500	$0	$676,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$302,300	$1,600	$0	$303,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$34,800	$200	$0	$35,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$682,300	$3,600	$0	$685,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$34,100	$200	$0	$34,300
TOTAL				33	$16,129,400	$84,300	$0	$16,213,700

2019/05/17 09:55 AM

ANEXO 19. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 DE 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08/08/2018

PLAZO INICIAL: 31/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5,419,238,921.23

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 99,034,808.84

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	31/12/2021
Calidad de Estudios y Diseños	30% Estudios	$ 29,511,474.00	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	31/12/2018	31/12/2023

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7%	$ 390,821,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros		NA	Dia	Dia

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	4	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	07/07/2022
Calidad de Estudios y Diseños	30% Estudios	$ 29,511,474.00	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	06/07/2019	07/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7.21%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros	NA		Dia	Dia

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520286675 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 20. SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MN-PA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la revisión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoria renuncia al anticipo, radicada ante INVIAS el dia 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060

Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y rótmino. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos, en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
AMPARO DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula No. 2520266875 CND

(Firma)
HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de interventori
Matrícula No. 63061-1345A(CUNDINAMARCA)

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

100

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) | 4 (Mes) | 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCION TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: [X] (Marque X si corresponde)

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 625 **DE** 2018

CUENTA BANCARIA No.: NA **BANCO** NA **SUCURSAL** NA

ANTICIPO OTORGADO: NA %

VALOR DEL ANTICIPO: NA (MCTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL DCAO PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

Mediante el oficio No ADM-INV-625-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoría renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el día 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77000

Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 625 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, en aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 625 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ NA (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No NA **FECHA** NA **VALOR** $

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma

Nombre: ANDRE DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula No.: 2520296675 CND

Firma

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No. 63202-13454(QUINDIO)

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

COPEBA LTDA.
Nit: 830.011.122-9

Bogotá D. C., 10 de septiembre de 2018

ADM-INV-825-2018-023

SEÑORES:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS
Attn. Ing. Mónica Benavides
Gestora Técnica
Subdirección de Red Terciaria
Bogotá

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:
RADICACION 77060 10/09/2018 04:06:29 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

REF. CONTRATO 0825 DE 2018: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ASUNTO: RENUNICIA AL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar al INVIAS, que por decisión voluntaria renunciamos al anticipo del 20% del valor del contrato que se encuentra estipulado dentro de la cláusula séptima del contrato de interventoría de la referencia.

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
COPEBA LTDA.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-mail copebaing@yahoo.com

202

ANEXO 21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Interventor : COPEBA LTDA

Contrato de Interventoria : 0825 - 2018

Objeto : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contratista : FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Contrato de Obra : 0498 - 2018

CONSECUTIVO	DIRIGIDO POR	DIRIGIDO A	FECHA ENVIADO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO	OBSERVACIONES
					ABRIL	
QDE19C00448	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	01/04/2019	01/04/2019	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-126	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	30/03/2019	01/04/2019-14482	RELACIÓN OFICIOS SEMANA DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-105	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	27/03/2019	01/04/2019-E1901235	RESPUESTA A OFICIO QDE19C00035, ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EMERGENCIA, BALANCE CONTRACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-106	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	27/03/2019	01/04/2019-E1901234	CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-107	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	29/03/2019	01/03/2019-E1901233	SUMINISTRO DE MATERIALES	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-127	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	01/04/2019	02/04/2019-14812	ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS #7 DE INTERVENTORIA	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-108	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	01/04/2019	02/04/2019-E1901230	DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA REALIZAR INFORME Y ACTA DE PAGO PARCIAL DEL MES DE MARZO DE 2019	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-109	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	01/04/2019	02/04/2019-E1901140	RECORDATORIO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN Y CALIDAD DE LOS MATERIALES	COPEBA LTDA
QER19C00442	OSCAR JAVIER ZORRO-GESTOR DE PROYECTOS	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	29/03/2019	29/03/2019	ENTREGA DE CARATULAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PLANES DE INVERSION	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-110	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	03/04/2019	05/04/2019-E1901337	SOBRE PERSONAL EN OBRA	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-111	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	03/04/2019	05/04/2019-E1901335	DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-112	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	03/04/2019	05/04/2019-E1901336	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-128	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	MONICA BENAVIDES-SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA BOGOTA	04/04/2019	04/04/2019-26848	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 8 DE INERVENTORIA -ATENCIÓN DE OBSERVACIONES OFICIO INVIAS SRT 11953	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-129	ANDREA DE PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	06/04/2019	08/04/2019-27392	RELACIÓN DE OFICIOS SEMANA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	COPEBA LTDA
DT-QUI-14733	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	08/04/2019	08/04/2019	DEVOLUCIÓN INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS No.7 DE INTERVENTORIA	INVIAS
ADM-FNC-825-2018-029	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	08/04/2019	08/04/2019	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA N.498 DE 2018	COPEBA LTDA
QDC19C00699	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	08/04/2019	09/04/2019	RESPUESTA COMPROMISOS EJECUCIÓN DE OBRA	COMITÉ CAFETEROS
QER19C00697	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	08/04/2019	09/04/2019	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL DEL PROYECTO EN MENCION DEL MES DE MARZO DE 2019	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-130	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLINA RIVERA-GESTOR TECNICO INVIAS BOGOTA	10/04/2019	10/04/2019-28439	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.7	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-132	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLINA RIVERA-GESTOR TÉCNICO INVIAS BOGOTA	10/04/2019	11/04/2019-29008	PRESPUESTA OFICIO SRT 9776-ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.5	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-113	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	12/04/2019	12/04/2019-E1901453	ENTREGA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-114	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ PEÑA-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	12/04/2019	12/04/2019-E1901454	ENTREGA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No.7	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-131	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORIA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	10/04/2019	12/04/2019-29188	ENTREGA DE ACTA DE OBRA No.8	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-133	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO -DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	10/04/2019	12/04/2019-29192	RELACIÓN DE INVITACIONES A LA GOBERNACION A PARTICIPAR DEL COMITÉ DE OBRA SEMANAL	COPEBA LTDA

FNC-825-2018-115	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	15/04/2019	16-04-2019-E1901467	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES Y OPERACORES DE MAQUINARIA	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-116	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	15/04/2019	16-04-2019-E1901488	REVISIÓN DE LA REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSION	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-117	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	15/04/2018	16-04-2019-E1901489	REVISIÓN DEL BALANCE DEL CONTRATO	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-118	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	15/04/2019	16-04-2019-E1901484	RATIFICACIÓN SOBRE LA ORGANIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACAS HUELLAS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-119	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	15/04/2019	16-04-2019-E1901485	MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE DON JOAQUIN Y OTROS PASOS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-120	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	15/04/2019	16-04-2019-E1901486	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL TRAMO PUAC-GUACAS	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-134	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	13/04/2019	16-04-2019-30169	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-121	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	17/04/2019	17/04/2019-E1901528	ENTREGA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	COPEBA LTDA
DT-QUI 15900	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	16/04/2019	17/04/2019	DEVOLUCIÓN DE ACTA DE OBRA No.8	INVIAS ARMENIA
CDE19C00527	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTLORÍA	17/04/2019	17/04/2019	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS DEL MES DE MARZO	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-136	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS QUINDIO	20/04/2019	23/04/2019-31182	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2019	COMITÉ CAFETEROS
AMD-INV-825-2018-103	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	23/04/2019	23/04/2019-31184	FORMATOS DEL INFORME NO.8 DE INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR, POR HABER SIDO OBJETO DE OBSERVACIONES	COPEBA LTDA
CDE19C00555	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	23/04/2019	24/04/2019	INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA	COMITÉ CAFETEROS
CDE19C00556	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	23/04/2019	24/04/2019	ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLACA HUELLA	COMITÉ DE CAFETEROS
ADM-FNC-825-2018-030	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	24/04/2019	25/04/2019-E1901622	REVISIÓN OBSERVACIONES VOLÚMENES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	COPEBA LTDA
CDE19C00559	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	26/04/2019	26/04/2019	MEJORAMIENTO PASO DE DON JOAQUIN K11+300	COMITÉ CAFETEROS
CDE19C00560	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	26/04/2019	26/04/2019	PLAN DE CONTINGENCIA ALCANTARILLAS	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-122	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	26/04/2019	26/04/2019-CORREO ELECTRONICO-RADICADO	SUMINISTRO DE MATERIALES EN LA OBRA	COPEBA LTDA
CDE19C00590	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	29/04/2019	29/04/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL FRENTE A LA EMERGENCIA MANIFIESTA	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-123	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA -DIRECTOR OBRA	29/04/2019	29/04/2019-E1901649	ACTUALIZACIÓN A LOS VOLÚMENES DE DISEÑOS REITERACIÓN	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-138	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS QUINDIO	27/04/2019	30/04/2019-33337	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	COPEBA LTDA

ANEXO 22. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION VIAS TERCIARIAS–QUINDIO
ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.09



Pijao, Construcción del módulo 1 del muro 3 k7+3280



Pijao, construcción del módulo 2 del muro 1 k2+770



Pijao, construcción Placa Huella k12+841 al k13+071



Génova, construcción muro 4 k22+321



Génova, construccion del muro 3 K19+413



Génova, construccion subbase placa huella k17+620 al k18+02

ANEXO 23. INFORMES ESPECIALISTAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
COPEBA LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 825 DE 2018	
INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°09	
Periodo: 08 Abril - 07 Mayo 2019	
Localización proyecto: Municipio de Pijao (Quindío).	Fecha elaboración: Mayo 08 de 2019.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato 498 de 2018 **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.".**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:

- La interventoría realiza aprobación del documento PAGA Versión 4 presentado por el contratista para su implementación durante la ejecución del contrato y posterior cierre finalizadas las obras correspondientes al alcance de esta obra.

- Se realiza visita de campo los días 23, 24, 25 y 26 de Abril para revisar el estado de actividades de obra, haciendo recorrido para el tramo de Pijao y Génova respectivamente.

- Se realiza comité socio ambiental en conjunto entre contratista e interventoría para revisar los hallazgos encontrados en obra y que deben ser ajustados de acuerdo a lo establecido dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

- Se solicita al contratista presentar los insumos para la presentación de los informes trimestrales que hacen parte de los compromisos adquiridos por el contratista e interventoría, durante la ejecución del presente contrato.

- **Seguridad y Salud y Trabajo:**

Se solicita al contratista presentar la siguiente documentación para verificación por parte de la interventoría:

- Exámenes de ingreso del personal en obra.
- Pago de seguridad social desde el momento del ingreso a laborar y certificación del trabajador que se encuentra cotizando en riesgo cinco ante la ARL.
- Indicar cuál es el personal que realiza trabajos en altura, presentando el curso que lo acredita para el desarrollo de esta actividad con su correspondiente vigencia.
- Se solicita que el inspector de Seguridad se encuentre revisando los frentes de trabajo periódicamente, revisando y aprobando los análisis de trabajo seguro.

- **Ambiental:**

  - **Solicitud predio para disposición de material de excavación y/o derrumbes:**

    La interventoría solicita a la Federación presentar la documentación que legalice el predio La Laguna para disposición de material de excavación, teniendo en cuenta que la zona a rellenar presenta forma de batea, lo que facilita su disposición y estabilización.

    Dentro de la documentación a presentar se tiene la siguiente:

    - Solicitud por parte del propietario que necesita material en donación para nivelación topográfica.
    - Certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días.
    - Certificado de uso del suelo expedido por planeación municipal.
    - Certificado de viabilidad ambiental expedido por planeación municipal.
    - Plano topográfico del terreno antes de intervención.
    - Plan de Manejo ambiental y de abandono para el predio durante y finalizadas las actividades de colocación de material de excavación y/o derrumbes.

- **Requerimientos legales:**

  - **Permiso de Ocupación de Cauce:** La interventoría reiteró a la Federación enviar carta a la CRQ, reiterando respuesta a la solicitud realizada para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la construcción esperando la expedición del acto administrativo que avale su ejecución.

  - **Agua para uso industrial:** Presentar la certificación donde la Empresa de Servicios Públicos del Quindío autoriza a la federación la compra de agua en bloque antes de tratamiento, para la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

  - **Permiso de tala de árboles por riesgo de caída en temporada de lluvias:** La interventoría reitera al contratista presentar un informe de la gestión realizada ante la Secretaría de Agricultura del municipio de Génova (Quindío), haciendo acompañamiento al propietario de la finca ubicada en inmediaciones del PR 17+600 solicitando autorización para la tala de los árboles que se encuentran en riesgo de caída por los portes que tienen y por encontrarse ubicados en zonas de derrumbe y suelos saturados.

- **Biodiversidad:**

  - **Escuelas verdes:** De acuerdo al apéndice ambiental del contrato, el contratista debe implementar el Programa de "Escuelas Verdes" la interventoría solicitó la presentación del Plan de Implementación para este programa para la escuela del municipio de Pijao como para la de Génova, haciendo la claridad que los recursos invertidos, hacen parte de la administración del contrato.

- **Residuos sólidos:**

  - **Brigada de orden y aseo**: La interventoría solicita la implementación de la brigada ambiental para el contrato, con el objeto de limpiar los frentes de obra que se encuentran finalizando obras, ya que se encuentran desechos de cajas de puntillas, madera que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores por tener puntillas en sus extremos, entre otros.

  - **Residuos peligrosos y/o especiales**: Se solicita presentar certificación de entrega de las bolsas de cemento que están quedando como residuos especiales como consecuencia de la ejecución de las obras de concreto.

    Solicitar certificación a la Asociación de volquetas, donde conste que las volquetas que envía al frente de obra cumplen con los documentos y mantenimientos preventivos y/o correctivos al día. Afiliaciones de seguridad social y pagos a la ARL conforme lo estipula la Ley para esa actividad.

- Informes:

  - **Trimestral:** La interventoría solicita al contratista el diligenciamiento del formato del informe trimestral ambiental que se debe presentar en conjunto entre contratista e interventoría, para radicación ante la Subdirección de Medio Ambiente.

  - **De Avance mensual:** Presentar informes de avance mensual, adjuntando soportes de cumplimiento que sirvan como herramienta para compilar el informe trimestral ambiental.

- PAGA:

  Se debe actualizar el PAGA, teniendo en cuenta que se va a incluir un nuevo ZODME para la ejecución del contrato. Además de complementar la información solicitada por el INVIAS mediante oficio SMA 18593 del 08 de mayo de 2019.

- Se realiza comité ambiental el día 25 de abril de 2019 donde se realizan recomendaciones por parte de la interventoría, incluyendo temas ambientales y de seguridad de acuerdo con las condiciones físicas de terreno y el microclima presentado en el área de influencia directa del contrato.

Descripción de actividades del periodo:

Dentro del recorrido de obra se observó lo siguiente:

En el tramo de Píjao y Génova se están construyendo muros para prevenir la pérdida de banca con el objeto de garantizar el libre tránsito de los usuarios de la vía que transitan las áreas rurales de los dos municipios.

	
Foto 1. Instalación de filtros para manejo de aguas en el tramo de Genova.	Foto 2. Filtros conectados a posetas que conducen las aguas por las alcantarillas instaladas durante el presente contrato.

	
Foto 3. Conformación de la vía realizado por la Federación.	Foto 4. Conformado de la vía para transporte de materiales para la ejecución de la obra.

Se reitera que la Federación no ha iniciado contacto con el rector de los colegios del área de influencia directa donde se va a implementar el programa de "Escuelas Verdes", el cual se encuentra incluido dentro del apéndice ambiental del contrato.



Foto 5. Sendero peatonal para acondicionar dentro del programa de Escuelas Verdes.



Foto 6. Área del colegio a implementar con el programa de Escuelas Verdes.

Se cuenta con baños móviles para uso de los trabajadores que se encuentran en los frentes de obra.



Foto 7. Instalación baño sector de puente tabla.



Foto 8. Instalación baño frente placa huella.

Materiales acopiados al borde de la vía para construcción de encoles y descoles para las obras transversales.

	
Foto 9. Preparación de concretos para fundición de descole, se acopian bolsas de cemento para traslado y disposición final.	Foto 10. Material de construcción al borde de la vía para actividades de concreto y construcción de filtro.

Actividades de tala de árboles que presentaban riesgo de caída por las condiciones del terreno, autorizados por la Secretaría de agricultura del municipio de Génova al propietario de la finca, por el riesgo que representaban.

	
Foto11. Arboles talados por el dueño de la finca por representar riesgo de caída.	Foto 12. Arboles talados por el dueño de la finca por representar riesgo de caída.

Punto para disposición de material de excavación ubicado en la finca la laguna ubicada aproximadamente en el PR 14+500.

La interventoría solicitó al contratista presentar la documentación para poder legalizar el predio para la colocación de material de excavación.

	
Foto13. Finca la laguna, posible punto para disposición de escombros.	Foto 14. Punto apto por las condiciones topograficas del terreno para disposición de material de excavación.

	
Foto15. Finca utilizada para pastoreo de ganado.	Foto 16. Finca la laguna en proceso de legalización para disposición de material de excavación y/o derrumbes.

Falta de orden y aseo en los frentes de obra, la interventoría solicitó la creación de la Brigada de Aseo y Limpieza para organizar los frentes de obra.

	
Foto17. Zonas laterales de la vía donde se construyeron alcantarillas con falta de orden y aseo.	Foto 18. Frente de obra con materiales de construcción dispuestos de forma inadecuada, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores.

CONCLUSIONES

- ***PAGA***. La interventoría expide oficio INVIAS-825-2018 –008-AM con fecha 14 de febrero 2019, donde se aprueba el PAGA presentado por la Federación en su versión 4 para ser implementado durante la ejecución del presente contrato y posterior cierre una vez finalizadas las obras de construcción.

- ***Permisos ambientales.*** El contratista informa a la interventoría sobre el trámite del permiso de Ocupación de Cauce, manifiestan haber realizado la radicación el día 21 de diciembre de 2018 ante la Corporación para dar inicio formal a la solicitud de este acto administrativo.

  El contratista radica ante la CRQ una carta solicitando informe del avance del trámite de Ocupación de Cauce.

  El agua para uso industrial se va a comprar a la Empresa de Servicios Públicos del municipio. La interventoría se encuentra atenta a la entrega del convenio realizado entre la Empresa de Servicios Públicos y la Federación para el suministro de agua para uso industrial.

- ***Transporte de Material.*** La Federación dio inicio al traslado de material pétreo a los frentes de obra para construcción de muros, filtros y obras transversales.

  Realizó el mantenimiento al sector denominado como "el verdal" punto crítico para el paso vehicular de las volquetas que transportan material pétreo para la ejecución de las obras.

- ***ZODMES***. La Federación ya identifico un punto para disposición de material sobrante y/o escombros que se encuentra ubicado en el municipio e Quimbaya (Quindío) el cual cuenta con el permiso de la Alcaldía de Quimbaya y concepto de favorabilidad por parte de la Autoridad Ambiental para este uso.

  La Federación presenta a la interventoría un punto para disposición de material de excavación ubicado en la finca la laguna localizada aproximadamente en el PR 14+500.

  La interventoría solicitó al contratista presentar la documentación para poder legalizar el predio para la colocación de material de excavación.

RECOMENDACIONES

- ***PAGA.*** Realizar inducción al personal de obra tanto administrativo como operativo sobre la implementación del PAGA durante la ejecución de las obras. Con el objeto de controlar y mitigar impactos que se puedan generar al ambiente y al entorno desde los componentes ambiental y social.

  Contar con un profesional ambiental al 100% dentro del contrato de obra que este pendiente de la implementación del PAGA y cree conciencia ambiental sobre los directos responsables de la ejecución de la obra, tanto en la parte administrativa como operativa del contrato.

  Crear la Brigada de orden aseo y limpieza para mantener organizado el frente de obra.

- ***Permisos ambientales.*** Hacer gestión ante la CRQ para dinamizar el proceso de obtención del permiso de Ocupación de Cauce; lo anterior, para poder ejecutar las obras que requieren de legalización ante la Autoridad Ambiental del Departamento y conocer las posibles medidas compensatorias solicitadas por la Corporación ya que se deben ejecutar antes del plazo de terminación del presente contrato.

  Se aclara que las obras que requieren permiso ambiental no podrán ser iniciadas hasta no contar con el permiso expedido por la Autoridad Ambiental.

- ***Transporte de Material.*** La interventoría recomienda analizar puntos de acopio temporal de materiales de construcción debido a las condiciones del terreno y luego realizar trasiego de materiales en vehículos más pequeños que faciliten el acceso a los frentes de obra.

- ***ZODMES.*** Verificar posibles puntos de disposición de material de excavación que se puedan legalizar para la ejecución del presente contrato.

  Realizar un buen manejo del material de excavación generado para evitar daños en los proyectos productivos que tienen las fincas que se encuentran en ambos costados de la vía, como son el café y el plátano.

Ing. John Oswaldo Cano
Especialista Ambiental
Copeba Ltda.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

INFORME FASE CONSTUCTIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 0825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME DE ABRIL DE 2019

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha –Etapa	Elaboró
1 al 30 de abril de 2019	
Versión 0	NURY JAZMÍN GARCÍA LÓPEZ
Cargo	Profesional Social – Interventoría
Descripción	Elaboración del documento para revisión inicial

220

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ETAPA PRELIMINAR 6
3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 7
3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 12
3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 22
3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 26
3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 31
3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL 33
4 CONCLUSIONES 36

TABLAS

Tabla 1 Aprobaciones de documentos 6
Tabla 2 Revisión al Documento Paga 6
Tabla 3 Desarrollo de la Gestión Social en informes 7
Tabla 4 Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información 7
Tabla 5 Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI 9
Tabla 6 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Pijao 9
Tabla 7 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Génova 10
Tabla 8 Indicadores de Gestión 11
Tabla 9 Control y Verificación por la Interventoría 11
Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio 12
Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao 12
Tabla 12 Consolidado de reuniones de Génova 15
Tabla 13 Distribución de Piezas Comunicativas 16
Tabla 14 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación 21
Tabla 15 Indicadores de Gestión 21
Tabla 16 Control y Verificación por la Interventoría 21
Tabla 17 Entrega de copias de actas de vecindad 22
Tabla 18 Relación de Comunicados de actas de vecindad 23
Tabla 19 Actas de compromiso Pijao 23
Tabla 20 Actas de compromiso Pijao 24
Tabla 21 Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos 25
Tabla 22 Indicadores de Gestión 25
Tabla 23 Control y Verificación por la Interventoría 25
Tabla 24 Talleres de Cultura Vial 26
Tabla 25 Comités de Participación Comunitaria 27
Tabla 26 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria 29
Tabla 27 Indicadores de Gestión 29
Tabla 28 Control y Verificación por la Interventoría 30
Tabla 29 Contratación de la Mano de Obra 31
Tabla 30Capacitación - Inducción 31
Tabla 31 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL 32
Tabla 32 Indicadores de Gestión 32
Tabla 33 Control y Verificación por la Interventoría 33
Tabla 34 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural 33
Tabla 35 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural 35
Tabla 36 Control y Verificación por la Interventoría 35

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de vías -INVIAS y COPEBA LTDA, interesados en involucrar la participación ciudadana en su proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Pijao y Génova en el Departamento de Quindío. Y permitiendo interactuar y participar activamente durante sus diferentes fases en el desarrollo del proyecto mejorando las condiciones físicas de los espacios que se encuentran en riesgo para la movilidad.

Así mismo, con la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, se contribuye a complementar el desarrollo rural y urbano, buscando mejorar la relación existente entre las personas y su territorio estimulando la consolidación de una cultura, permitiendo a las comunidades reconocerse como actores de cambio social y gestores de su propio desarrollo, bajo condiciones de dignidad y garantía de sus derechos ciudadanos relacionados con el bienestar colectivo. Es por esto que por medio de este proyecto, se lograra establecer condiciones favorables a futuro y a su vez pueda mejorar la movilidad propiciando mayor accesibilidad, conectividad, alternativas comerciales y económicas para los municipios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las acciones y en brindar la información del seguimiento y acompañamiento social, se realiza el informe de consolidación y verificación de las acciones de efectuadas por el contratista y supervisada por la interventoría social del CONTRATO 0825 DE 2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Dado cumplimiento de las actividades del "Apéndice E Obligaciones de Gestión Social" enmarcada dentro de las disposiciones de los Pliegos de Condiciones y los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, describiendo en forma concisa todos los aspectos relevantes del contrato, evidenciando el estado de evaluación del Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA se realiza este informe.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Acompañamiento y verificación de las actividades desarrolladas, propuestas y ejecutadas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, mediante el Comité de Cafeteros del Quindío, respondiendo a criterios de calidad, eficiencia y oportunidad con resultados, proporcionando la información pertinente en el manejo de los impactos sociales en la ejecución del presente proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la gestión realizada por el cumplimiento del proyecto de atención a la comunidad en el Punto SAU y atenciones ciudadanas, durante el desarrollo del contrato de los municipios de Pijao y Génova.

- Verificar la gestión ejecutada por el contratista frente al cumplimento del proyecto de información y divulgación durante las diferentes fases de ejecución, durante el desarrollo del contrato.

- Verificar el desarrollo del proyecto del manejo de la Infraestructura a predios y servicios públicos en el acompañamiento a las actividades técnicas, durante el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, elaboración de los registros fotográficos, fílmicos de las vías y las actas de compromiso con la comunidad en el desarrollo del contrato.

- Verificar las acciones para el proyecto de recuperación al derecho de vía.

- Verificar la gestión por el contratista frente al desarrollo de proyecto de Cultura vial y la participación ciudadana durante el desarrollo del contrato.

- Verificar la gestión en la recepción y del proyecto de Contratación de la Mano de Obra No Calificada Local y población vulnerable en los municipios de Pijao y Génova

- Acompañar según concepto del ICANH las acciones a efectuar de posibles hallazgos arqueológicos.

3. ETAPA PRELIMINAR

La interventoría para la fase preliminar ya realizó la aprobación al capítulo social al documento PAGA, con los respectivos soportes, se está a esperas del contratista actualice fechas de los formatos, recolección de firmas e imprima el documentos para la entrega final.

Tabla 1 *Aprobaciones de documentos*

Fecha	Observaciones	Aprobación/ revisión
25 de septiembre de 2018	Plantillas y aprobación de formatos	QER18CO1219
2 de octubre de 2018	Aprobación formatos y plantillas	Correo electrónico

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 2 *Revisión al Documento Paga*

Fecha	Versión	Observaciones	Aprobación/ revisión
10 de septiembre de 2018	0	SOC.FNC-825-2018-001	Revisión
2 de octubre de 2018	1	QER18C01239	Revisión
11 de octubre de 2018	1	Mesa de trabajo	Revisión y ajustes
24 de octubre de 2018	2	QER18C01397	Revisión
1 de noviembre de 2018	3	SOC-FNC-825-2018-002	Aprobación del Capítulo de Gestión Social Paga V3 (Pendiente ajuste presupuesto)
11 de febrero de 2019	4	ADM-INV-825-2018-101	Aprobación interventoria y radicación al INVIAS

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 3 *Desarrollo de la Gestión Social en informes*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron a la fecha	Se aprobó documento PAGA	No se presentaron eventualidades a la fecha.

Elaborado COPEBA LTDA

3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

- **Punto SAU**

  La interventoría verificó la atención de las oficinas de los puntos SAU que se encuentran en los Municipios de Pijao y Génova, la permanencia y actualización de los Puntos Satélites de Información con sus respectivos buzones:

  1. Pijao – Fonda los Chorros
  2. Génova - Casa lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova

Tabla 4 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información*

Municipio de Pijao	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros	Carrera 5 N 11 – 36 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:00 pm Jueves: 8:00 a.m. a 12 m Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m
	

Puntos Satélites - Fonda la Chorros	
	
Municipio de Génova	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros	Calle 26 N 12 – 23 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:30 pm Jueves: 2:00 p.m. a 5:30 pm Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m
	
Punto Satélite- Casa Lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova	
	

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 5 *Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
Para el periodo no se reporta atrasos	La interventoría verifica el cumplimiento de la atención a los ciudadanos en los horarios establecidos Se realiza la actualización a los PSI y buzones de sugerencias.	Por la incapacidad de la profesional Gloria Pelaez,la atención a los ciudadanos se ajusto para realizar atención movil para os dos municipios.

Tabla 6 *Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas* – Pijao

No	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Solicitud (traslado por competencia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Rad. 28513)	26 de noviembre de 2018 27 de diciembre de 2018	Arley Arias	Finca el Jardín de los Cerezos, Vereda la Maicena	Revisar algunos PR de obras transversales y su diseño constructivo	**Abierta** Visita el 29 de diciembre de 2018
2	Reclamación	22 de enero de 2019	Hugo Hernán Murcia	Calle 13 # 3 -11	Adecuar el espacio y delimitar la zona de acopio de materiales de la zona de juegos y de permanencia de los niños.	**Cerrada** (28/01/2019) Se adecuo el espacio y por parte de la Alcaldía municipal se autorizó el uso del servicio de energía.
3	Queja	5 de febrero de 2019 |	Marco Álvarez	Correo electrónico	Inconformidad por el cierre total de vía puente tabla	**Cerrada** (8 de febrero de 2019 – respuesta correo electrónico)

						Se aclaró que por las intervenciones a realizar solo se podía realizar adecuaciones para el paso peatonal y las alternativas de transporte.
4	Solicitud	8 de abril de 2019	María Inés Mejía Gómez	Carrera 5 # 13- 42 finca Baltimore	Afectaciones a los cafetales y compensación por los daños causados por la obra	**Abierta**

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 7 *Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas* – Génova

N°	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Queja	28 de febrero de 2019	Alber Toro	Finca el Jazmín	Daños en columna de concreto de acceso a la finca, parqueadero, cerco y pintura en el zócalo de la vivienda	Abierta El 8 de marzo de 2019 nuevamente realiza petición estableciendo compromiso de reparación de los dos de su predio.
2	Queja	12 de marzo de 2019	Andréi Alexis Hortua	Barrio el porvenir	desvinculación laboral	Abierta

3	Queja	22 de marzo de 2019	Jhonatan Montenegro	Barrio la Isla	desvinculación laboral	Abierta

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 8 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones cerradas en el mes Pijao = Número de manifestaciones presentadas en el mes en Pijao =	0/1*100% =0%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones cerradas en el mes en Génova= Número de manifestaciones presentadas en el mes en Génova =	1/0*100% =0%

Tabla 9 *Control y Verificación por la Interventoria*

Control	Etapa	Verificación
Se verificaron las actividades adelantadas por el contratista del cumplimiento contractual.	Etapa Preliminar	4 y 5 de diciembre de 2018
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa Preliminar	Mes de diciembre de 2018.
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22 y 23 de enero de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	27,28 y 29 de marzo de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	23, 24 y 25 de abril de 2019

3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La interventoría verifica el cumplimiento del proyecto en los municipios de Pijao y Génova en la implementación de las estrategias contractuales de información y divulgación las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio

Fecha	Actividad
24 de octubre de 2018	Correo electrónico de la interventoría de los requerimientos para la reunión de inicio
3 de noviembre de 2018	Respuesta a correo electrónico del 24 de octubre de 2018 – reunión de inicio, adjunto cuña radial, invitación entidades y volante de convocatoria.
4 de noviembre de 2018	Presentación de inicio por parte del contratista.
6 de noviembre de 2018	Comunicado del contratista , respecto a las observaciones emitidas para la reunión de inicio
6 de noviembre de 2018	Respuesta ADM-FNC-825-2018-016 Observaciones a la revisión de actividades de las reuniones de inicio.
6 de noviembre de 2018	Entrega de documentos corregidos, invitación a entidades, cuña radial, volantes de Pijao.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Pijao	10 de noviembre de 2018	106	10	Desarrollada en el comité de cafeteros del municipio de Pijao

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
2	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Génova	10 de noviembre de 2018	36	16	Efectuada en el comité de cafeteros del municipio de Génova
3	Reunión extraordinaria	Solicitud ubicación PSI y el buzón	Quindío/ Pijao	14 de noviembre de 2018	2	1	Finca Los Chorros (propietaria Ruby Palechor)
4	Reunión extraordinaria	Socialización de los cierres viales	Quindío/ Pijao	11 de enero de 2019	2	1	Gerente de Empresa de Transporte de Pijao, (Juan Carlos Cañon) COOTRANSPIBU
5	Reunión extraordinaria	Establecer alternativas que mitiguen el impacto de la movilidad en los cierres	Quindío/ Pijao	09 de febrero de 2019	1	3	Alternativas de movilidad

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
		programados del 11 al 13 de febrero 2019					
6	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	11	2	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
7	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcción de la caja de inspección	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	1	1	Propietaria de la finca Baltimore por la afectación considerable de los cafetales, no permite que la obra ingrese a su propiedad privada.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 12 *Consolidado de reuniones de Génova*

N°	Tipo de reuniré	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Génova	12 de febrero de 2019	21	3	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.

Elaborado COPEBA LTDA

Divulgación:

Para el municipio de Pijao, se revisó y aprobó las siguientes piezas informativas:

- Volante N°10 de cierre restringido de la vía que se efectuaría del 23 al 26 de abril de 2019 desde el km 7 + 380 sector Los Chorros.

- Volante N° 11 de cierre restringido de la vía desde el 2 al 3 de mayo de 2019 desde el km 11 + 933 sector Los Chorros.

Para el municipio de Génova se revisó la siguiente pieza informativa:

- Volante N° 6 Paso restringido a peatones, bicicletas y motos desde 24 al 26 de abril de 2019, desde el Pr 17+657 al Pr 18 + 510 vereda el recreo - sector de la finca el jazmín.

Tabla 13 *Distribución de Piezas Comunicativas*

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de Octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Pijao	9 de octubre de 2018	39	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
2	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Génova	12 de octubre de 2018	11	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Génova
2	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	55	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
3	**Invitación a entidades municipales de Pijao**	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	15	INVIAS, Gobernación del Quindío, Alcaldía Local, Secretaría Gobierno, Secretaría Departamental, enlace municipal de víctimas, concejo municipal,

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
					Personería, Parroquia.
4	**Invitación a entidades municipales de Génova**	Quindío/ Génova	6 de noviembre de 2018	15	Invitaciones a las entidades: Alcaldía Local, Secretaría Gobierno y desarrollo social, planeación, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, Comando de policía, Instituciones educativas, Parroquia, defensa civil, trasportadores.
5	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Génova	6 y 8 de noviembre de 2018	75	Se distribuyeron en el Área de Influencia Directa

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
6	**Cuña radial**	Quindío/ Génova	6 al 10 de noviembre de 2018	30	Se emitieron 30 cuñas radiales en la emisora manantial 93.1 f.m en los siguientes horarios: 8 a.m, hasta las 6 pm cada hora.
7	**Comunicado 03** Cierre vial	Quindío/ Pijao	28 de diciembre de 2018	46	Se distribuyó en el AID y las empresas de transporte
8	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	09 de enero de 2019	42	Distribución en el AID y las empresas de transporte
9	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	25 de enero de 2019	61	Divulgación y distribución al AID, padres de familia y las empresas de transporte
10	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	8 de febrero de 2019	64	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte.

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
11	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	38	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
12	**Comunicado 03** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	18,19,20,25 y 26 de febrero de 2019	26	Volantes y actas de socialización del cierre
13	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	2 de marzo de 2019	25	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
14	**Comunicado 09** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	9 de marzo de 2019	33	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
15	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	21 y 22 de marzo de 2019	24	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
16	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	30 de marzo de 2019	37	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
17	**Comunicado 10** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	17 de abril de 2019	10	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
18	**Comunicado 11** Cierre restringido de la vial	Quindio/ Pijao	30 de abril de 2019	36	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, concejo municipal.
19	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindio/ Génova	23 de abrl de 2019	35	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte

Registro de Fotográfico





Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 14 *Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan	Se distribuyó volantes N°10 y 11 en Pijao para los cierres totales de vial. Se distribuyó volante N° 6 de cierre total de la vía en Génova.	No se presentaron

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 15 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Pijao Número de reuniones programadas en el mes Pijao =	1/1*100% =100%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Pijao = Total de comunicados propuestos para el periodo en Pijao	46/46*100%=100

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Génova Número de reuniones programadas en el mes en Génova =	0/0*100% =0%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Génova = Total de comunicados propuestos para el periodo en Génova	36/36*100%=100

Tabla 16 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 3 cierre de la vía	Etapa Preliminar e inicio de obra	Diciembre de 2018

Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 4 y 5 del cierre total de la vía	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 6,y 7 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 3 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 8 y 9 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 4 y 5 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Marzo de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 10 y 11 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 6 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Abril de 2019

3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

La interventoría verificó las planillas de entrega de las copias de las actas de vecindad:

Tabla 17 *Entrega de copias de actas de vecindad*

Fecha	Municipio	Total
1 de febrero de 2019	Pijao	4
febrero de 2019	Génova	17

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 18 *Relación de Comunicados de actas de vecindad*

Fecha	Comunicado	Actividad
2 de octubre de 2018	QER18C01248	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2018
9 de octubre de 2018	QDS18C01288	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales a partir del 9 de octubre de 2018 desde el k 0 hasta el k 24.9
9 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-004	Observaciones de actas de vecindad.
26 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-006	Aprobación actas de vecindad del municipio de Pijao
Se entregaron en original a la profesional social de Génova		Aprobación actas de vecindad del municipio de Génova

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 19 *Actas de compromiso Pijao*

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Luz Albeniz Ortiz Prieto / Escuela Juan XXIII	Permiso de acopio de materiales
2	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Arley Arias Zuleta/Finca Los Cerezos	Permiso de acopio de materiales
3	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	José Orego Espinoza/ Finca el Pacifico – Vereda la Maicena	Permiso de acopio de materiales
4	16 de enero de 2019	Quindío/ Pijao	Dubian Alberto Henao/ Lote inicio de la obra finca la Laguna	Permiso de acopio de materiales
5	8 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Florentino Collazos Rodríguez/ acopio de materiales en la escuela la Maizena	Permiso de acopio de maquinaria y materiales

6	16 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Familia Gil – propietarios de las fincas el tabor, el pacifico, el encanto	Permiso para verificación de estudios técnicos en revisión de talud del margen IZ para la viabilidad de ampliación de la vía.
7	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Autorización para el tránsito vehicular de automotores por la vía interna de la finca la laguna
8	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Permiso para utilizar la bodega ubicada frente de la casa principal de la finca la laguna

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 20 *Actas de compromiso Génova*

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	23 de noviembre de 2018	Quindío/ Génova	Amanda Moncada García / Casa Lote el Mirador	Solicitud de ubicación del PSI y buzón de sugerencias
2	6 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Autorización de acopio de materiales
3	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca La Elda	
4	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Vereda el Recreo PR 18+169 al PR 18 + 510	
5	22 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca las Delicias – Vereda el Recreo	Espacio de corte y figurado de acero y cuarto de disposición del material

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 21 *Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se han entregado las copias de acta de vecindad del municipio de Pijao	No se reportan en el periodo	No se presentan para el periodo

Tabla 22 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de actas propuestas = Total de actas levantadas y revisadas =	33/33*100% =100%
Productividad	Total de actas de entorno propuestas = Total de actas levantadas de entorno =	2/2* 100% = 100

Tabla 23 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó actas de vecindad levantadas, donde se realizaron observaciones para su diligenciamiento y entrega	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Para el mes de noviembre no se presenta ninguna novedad		
Se revisó las actas de vecindad levantadas, con observaciones para su aprobación	Etapa Preliminar e inicio de obra	3 al 5 de diciembre de 2018
Se aprobó las actas de vecindad y entorno de los municipios de Pijao y Génova	Etapa Preliminar e inicio de obra	Enero de 2019
Se verificaron planillas de entrega de copias de actas de vecindad a la comunidad del área de intervención directa	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificaron actas de compromiso en el área de intervención directa	Etapa constructiva	Marzo de 2019
Para el mes de abril no se presenta ninguna novedad		

3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Comité de participación

El contratista informo que realizó la reunión con los integrantes del comité de participación comunitaria el 30 de abril de 2019, donde se informó los avances e inconvenientes por la ola invernal, los pagos de los trabajadores, cierres restringidos de las vías y las acciones que se han adelantado para mitigar las molestias de la población.

En el municipio de Génova se realizó reunión del comité de participación y recorrido con los integrantes del comité de participación comunitaria el 24 de abril de 2019 donde asistieron los integrantes del comité, alcaldía y personería.

Tabla 24 *Talleres de Cultura Vial*

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
1	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	31 de enero de 2019	10	Se realizó charla informativa en el centro docente Juan XXIII – se entregó folleto
2	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	7	Se realizó charla informativa en el Centro Educativo Juan XXIII, al rector y padres de familia
3	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	9	Se realizó charla informativa al concejo municipal en recorrido que adelantaban en obra

Tabla 25 *Comités de Participación Comunitaria*

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
1	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Pijao	10 de noviembre de 2018	5	0	Comunidad y representante de la empresa de trasportes
2	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Génova	10 de noviembre de 2018	1	3	Participó el personero, planeación y defensa civil y un integrante de la comunidad.
No se presentaron actividades en el mes de diciembre de 2018							
3	Primera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	24 de enero de 2019	7	3	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, Transportadores, colegio.
4	Primera reunión comité de participación	Avances y recorrido de obra	Quindío / Génova	19 de febrero de 2019	3	1	Participaron los integrantes del comité en compañía del área

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	ciudadana						social y técnica
5	Segunda reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	26 de marzo de 2019	2	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
6	Segunda reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Génova	20 de marzo de 2019	4	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.
7	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	30 de abril de 2019	3	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
8	Tercera reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	24 de abril de 2019	3	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	ciudadana						





Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 26 *Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se ha realizado talleres de cultura vial I	Se efectuó el tercer comité de participación comunitaria para los municipios de Génova y Pijao.	Se informó que se planean realizar los talleres en el mes de mayo de 2019.

Tabla 27 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Pijao = / Total de talleres ejecutados en Pijao =	0/0*100% =0%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Pijao = / Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Pijao	1/1*100% =100%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Génova = / Total de talleres ejecutados en Génova =	0/0*100% =0%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Génova = / Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Génova	1/1*100% =100%

Tabla 28 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la metodología de talleres para las instituciones educativas	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó la conformación del comité de participación comunitaria	Etapa Preliminar	10 de noviembre de 2018
Se acordó no realizar actividades en este proyecto por temporada vacacional.	Etapa Preliminar	3, 4 y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la charla informativa al centro docente Juan XXIII y el primer comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Enero de 2019
El contratista informo las actividades informativas adelantadas en campo	Etapa Constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la segunda reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Marzo de 2019
Se verificó y acompaño a la tercera reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	24 y 30 Abril de 2019

3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La interventoría reviso el listado del personal aportado por el contratista en relación a la contratación de la Mano de Obra No Calificada su contratación se priorizó en el área directa de intervención de los municipios de Pijao y Génova con la siguiente relación de personal:

Tabla 29 *Contratación de la Mano de Obra*

Municipio	Total de trabajadores	Mano de Obra Calificada	Mano de Obra No Calificada
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019			
Pijao	54	29	25
Génova	12	6	6
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019			
Pijao	69	34	35
Génova	27	11	16
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019			
Pijao	44	20	24
Génova	30	14	16
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019			
Pijao	35	10	25
Génova	28	10	18

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 30*Capacitación - Inducción*

Fecha/ tramo	Tema	Asistentes
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019		
31 de enero de 2019/ Pijao	PAGA – ubicación del punto SAU y PSI	28 trabajadores
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019		
7 de marzo de 2019/ Pijao	Socialización PAGA	21 trabajadores

12 de marzo de 2019/Génova	Socialización PAGA	18 trabajadores
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 31 *Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan atrasos	Se continua priorizando la mano de obra no calificada en los sectores del AID de los municipios	A la fecha cumplen con más del 50% de la contratación de la zona de la AID

Tabla 32 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL en Pijao = Número de trabajadores de MONC en Pijao=	24/35*100% =68%
Productividad	Total de inducciones realizadas en Pijao / Total de inducciones programadas en Pijao	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas en Pijao / Total de capacitaciones programadas en Pijao	1/1*100% =100%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL en Génova = Número de trabajadores de MONC en Pijao=	18/28*100% =64%
Productividad	Total de inducciones realizadas en Génova / Total de inducciones programadas en Génova	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas en Génova / Total de capacitaciones programadas en Génova	0/0*100% =0%

Tabla 33 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la recepción de las hojas de vida. Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información referente al proceso de contratación de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó atención a los ciudadanos e información para la recepción de hojas de vida, limitando el plazo de convocatoria	Etapa Preliminar	3,4,y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la asistencia en relación con la capacitación e inducción al personal	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información de la recepción de hojas de vida de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la asistencia a la capacitación al personal	Etapa constructiva	Marzo 2019

3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Para el periodo correspondiente no se efectuaron actividades en este proyecto.

Tabla 34 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural

Fecha	Solicitud	Consecutivo	Observaciones
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación del estado de patrimonio	ADM-INV-825-2018-019	Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH

	arqueológico para el proyecto		
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación población indígena, minorías y ROM para el proyecto	ADM-INV-825-2018-020	Ministerio del interior
10 de septiembre de 2018	Respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-35688-DAI-2200	En las bases de datos del Ministerio del interior no hay presencia de comunidades indígenas y Kumpañy
17 de septiembre de 2018	Solicitud de pronunciamiento del patrimonio Arqueológico y procedimientos	ICANH 18 de septiembre 499	Comité de Cafeteros del Quindío
25 septiembre de 2018	Ratifican respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-38209-DAI-2200	No hay identificación ni registro de comunidades indígenas y Kumpañy (Gitanos)
30 de octubre de 2018	Respuesta del ICANH enviada mediante correo electrónico.	ICANH – 130 5445 N° Recibido 4669	Implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico (aclaración)
27 de noviembre de 2018	Respuesta del ICANH, luego de la aclaración del tipo de obra.	ICANH – 130 6001 N° Recibido 4991	Certificación de la No implementación de las investigaciones de campo, sin embargo de encontrar hallazgos se debe informar a la entidad de forma inmediata.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 35 *Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
N/A	No se reporta	Se recibió respuesta del ICANH, emitiendo el concepto de la No implementación del Plan de Manejo Arqueológico.

Tabla 36 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó las comunicaciones conjuntas enviadas para el ICANH La interventoría entrego respuesta al contratista por parte del Ministerio del Interior.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
La interventoría entrego respuesta al contratista del ICANH para la implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico	Etapa Preliminar	30 de octubre de 2018
El contratista entrego el oficio del de la NO implementación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH.	Etapa Preliminar	4 de diciembre de 2018
Se socializó en los proyectos del PAGA procedimiento en caso de encontrar hallazgos arqueológicos	Etapa Constructiva	Marzo de 2019

4 CONCLUSIONES

- La interventoría verifica las actividades adelantadas en el cumplimiento de los proyectos establecidos en el PAGA

- En la atención a la comunidad, por la coyuntura de la incapacidad de la profesional Gloria Peláez, se estableció concentrar la atención de la comunidad en campo como SAU MOVIL.

- Se reviso la distribución de los volantes para los dos municipios, sin embargo, por molestias de la comunidad se estableció que el área técnica debe aportar la programación antes de la divulgación.

- Se desarrolló el comité de participación ciudadana en los municipios de Pijao y Génova.

ANEXO 24. LIBRO DE OBRA

Pyco.

01-01-2019.- NOTA: Lluvia intensa de 5.00 a 7.00 P.M Domingo 31.

Personal en obra: Ings. Director de Obra, Residente, Auxiliar, 1 Maestro, 4 oficiales, Profesional S-30, 2 operadores, 18 ayudantes, 1 Conductor.

Equipo: 2 Retrocargadoras, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.

Actividades: Se funde caisson 1, módulo 1, muro 1

del INVIAS Territorial Quindio y Hernan Barreto, Supervisor del Proyecto, por parte del INVIAS.

04-01-2019: Se presenta lluvia moderada desde las 11.00 P.M del dia anterior hasta las 10.00 a.m. del dia de hoy.
Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 5 oficiales, Profesional SISO, 1 Hornero, 12 ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: 2 Retrocargadores, 2 Mezcladoras, 2 Vibrocompactadores, Tipo rana, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado de acero para Zarpa modulo 1, muro 1, K2+770. (M.I.)
Se funde Bordillo de cuneta entre el K31169 y el K31184 (M.I)
Se continua corte y fijamado de hierro.
Fundida de Concreto para completar base del módulo 2, muro 3, en el K7+380 (M.D.)
Se realiza excavación para Viga de placa huella en el K13, y se continua armado de la muleta.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa de 1.00 a 6.00 P.M.

Inspector Interventoria.

05-01-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Residente, Auxiliar, Profesional SISO, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Hornero, 12 Ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: 2 Retrocargadoras, 2 Mezcladoras, 2 Vibrocompactadores, Tipo rana, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se continua armado de acero para Zarpa de módulo 1 del muro 1, en el K2+770 (M.I.)
Fundida de bordillo de cuneta entre el K31169 y el K31221 (D.)
Se funde dentellón para módulo 3 del muro # 3, y la Zarpa del mismo en el K7+380 (M.D.)
Excavación para Sobrecancho placa huella K13.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa desde las 5.00 p.m. a las 10 a.m.

Inspector Interventoria.

06-01-2019: INVIAS: Se presentó lluvia intensa entre las 9.00 a.m y las 1.00 a.m. las excavaciones realizadas para viga de placa huella fueron entregadas por material en el K13.

Fundido de bordillo entre el K3+280 y el K3+270 (a.-t.)
y entre el K3+221 y el K3+254 (re.-t.)
Fundido de vástago modulo 1, muro 4, K8+670 (p. 2)
Se continúa armado de formaleta para placa huella
en el K13.
Estado del Tiempo: Lluvia entre las 4:00 y las 6:00 P.M.
Respectiva Interventoria

02-01-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Residente, Auxiliar y Maestro, 5 oficiales, 2 Hierro, 17 ayudantes, 1 Conductor
Equipo: 2 Retroexcavadoras, 2 Mezcladoras, 2 compactadoras tipo rana, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Llano y Conformación de Piso para Zaga en el módulo 1, muro 4, K2+770 (M.-T.)
Se funde bordillo entre el K3+205 y el K3+220 (01-T.)
Se continúa armado de formaleta para Vástago del módulo 1 muro 3, K7+380 (01-D.)
Se continúa armado de formaleta para placa huella K13,
Estado de tiempo: Hubo Lluvia desde las 6:00 a.m. a las 3:00 P.M.
Respectiva Interventoria

03-01-2019: Personal en Obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, Profesional Sisa, 2 Maestros, 5 oficiales, 2 Hierros, 17 Ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: 2 Retrocargadoras, 2 Mezcladoras, 2 vibrocompactadoras tipo rana, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre entre el K3+770 y el K3+205 (01-T.)
Fundida de bordillo de Cuneta entre el K7+180 y el K3+205 (M.-T.)
Excavación para obra de empalme en el K7+280 (01-T.)
Fundida de vástago de módulo 1, muro 3, en el K7+380 (01-D.)
Armado de formaleta para placa huella en el K13.
Estado de Tiempo: Lluvia de 4:00 P.M. a 6:00 P.M.
Respectiva Interventoria.

Nota: Hubo Presencia en obra los Ings. Alfonso Mesa Director

del 1
Supe
01-01-2019: S
ante
Pase
Profe
Ingen
de ca
Activ
4, K
Se fu
Se Co
Fundi
muro
Se rea
y se c
Estado
Inspect
06-01-2019: To
Profes
dantes,
Equip
tipo ra
Activi
módu
Fundi
se fu
Zarpa
excav
Estado
Inspecto
06-01-2019: L
4:00
a 6:00

El día de hoy el personal de obra no laboró en la ejecución de las labores en los diferentes frentes de trabajo del Tramo Bajo - Guacar, según el log por no haberseles cancelado el salario. Hay fotografías que evidencian la ausencia total del personal.

Inspector Interventoría

08-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, 2 Operadores, 1 Conductor.
Equipo: 2 Retrocargadores, 1 Volqueta.
Actividades: Lleno en el muro #9, K81+670 (M.D.)
Mejoramiento de la vía en la curva "Don Joaquín" K81+200, aprox.
Llega 1 viaje de cemento (200 bultos).
Estado del Tiempo: Lluvia moderada de 3:00 a 4:00 p.m.
NOTA: El personal de Trabajadores de obra no laboró en el día de hoy.

Inspector Interventoría

09-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, 2 operadores, 3 Conductores,
Equipo: 2 Retrocargadores, 3 Volquetas,
Actividades: Se continúa lleno en el muro 9, K81+670 (M.D.) y el mejoramiento de la curva en la curva "Don Joaquín".
Llega Material Subbase, Triturado y Arena.
Estado del Tiempo: Lluvia entre las 5:20 y las.
NOTA: El día de hoy Tampoco laboró el personal de Trabajadores de obra.

Inspector Interventoría.

10-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, 2 Operadores, 3 Conductores.
Equipo: 2 Retrocargadores, 3 Volquetas.
Actividades: Acopio de material para lleno.
Llega material Subbase clasificada.
No hubo Personal de Trabajadores de obra.

11-04-2019: Pers
Cond
Equi
Activi
en el
llega
No hu
Estado
Inspect

12-04-2019: Per
Sabo
3 Con
Equip
Activi
Amon
Confo
Com
llega
Estad
Inspect

13-04-2019: Per
Profe
1 Ayu
Equi
de Co
Activ
Arma
muro
Fun
Esta

Estado del Tiempo: Lluvia de 4.00 a 6.00 P.M.

Inspector Interventoria

11-04-2019: Personal en obra: Ings. Auxiliar, 2 operadores, 3 Conductores.
Equipo: 2 Retrocargadores, 3 Volquetas.
Actividades: se continua acopio de material para llenar en el K8+350.
Llega material subbase clasificada y acero.
No hubo trabajadores en obra.
Estado del tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria

12-04-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 4 oficiales, 1 Herrero, 11 Ayudantes, 3 Conductores.
Equipo: 2 Retrocargadores, Volquetas. Herramienta Menor.
Actividades: Armado de acero de refuerzo módulo 1, muro # 1, en el K2+770 (M.I.)
Armado de acero en el módulo 3, muro # 3, K7+350 (D.)
Conformación de piso para Tubo alcantarilla K12+905
Cama de arena, instalación de Tubo, y llenos.
Llega material triturado y arena.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria.

13-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 4 oficiales, 1 Herrero, 11 Ayudantes, 1 Conductor,
Equipo: 2 Retrocargadores, 2 Mezcladores, vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de Zapa Módulo 1, muro 1 K2+770 Armado de Acero y formaleta para módulo 3, del muro # 3, K7+350 (M.D.)
Fundida de Bordillo de cuneta en el K7+447 (D.)
Estado del Tiempo: Dia Seco, (Firma)

Inspector Interventoría.

17-04-2018.

15-04-2018. Personal en obra: 1 inspector, 1 Ing residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 herrero, 7 ayudantes, 1 Director profesional SST.
Equipo: 3 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, 2 vibrocompactadores tipo rana, pulidora, 1 volqueta, 2 retroexcavadoras, 1 camioneta, 1 cargador, 1 vibrocompactador.
Tiempo: lluvia intensa en horas de la tarde, daños en la subbase de la Pkra huella PR17+620 al PR17+985.
Actividades: colocación de acero de refuerzo en la parte de la alcantarilla K18+023, con construcción de filtro en el muro 1
Actividades realizadas: colocación de formaleta del módulo 1 del muro 1 K2+770, colocación de formaleta del módulo 2 del muro 3 K7+380, corte y figurado del hierro para la Pkra huella de la Laguna Km12+841 al K13+971.
Tiempo en la obra: lluvias intensas en horas de la tarde.

Ing. Auxiliar de interventoría.

16-04-2018. Personal en obra: 1 inspector, 1 Ing residente, 1 profesional SST, 1 maestro, 1 herrero, 7 ayudantes.
Equipo: 3 mezcladoras, 1 cargador, 1 vibrocompactador, 2 vibrocompactadores tipo rana, 2 volquetas, 1 camioneta.
Tiempo: llovió en la mañana, por la tarde llovió intenso.
Actividades: fundición del voltago del módulo 1 del muro 1 (K2+770), fundición del voltago del módulo 2 del muro 3 (K8+630), se continúa con la figuración y corte de acero para la pkra huella de la laguna Km 12+841 al K13+071

Ing. Auxiliar de Interventoría.

22-01-2019

NOTA

17-01-2018. Personal en obra: 1 inspector, 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro, 2 oficiales, 1 herrero, 1 celador, 7 ayudantes.
Equipo: 2 retroexcavadoras, 3 motobombas, 2 vibradores de concreto, 1 remolcador, 1 vibrocompactador, 2 vibrocompactadores tipo rana, herramienta menor.
Tiempo: Sirve durante todo el día.
Actividades: Desformaleteado del vaciado del modulo 1 del marco 1 (K2+770), desformaleteado del vaciado del modulo 2 del marco 3 (K8+670) colocacion de Acero de refuerzo de la Placa huella de la laguna K12+841 al K13+071.
Se aclara que la comisión de Topografía del contratista estuvo en la Placahuella K12+841 al K13+071. el día lunes, los días martes y miércoles, en la Placa huella K11+923 al K11+933 y en la de los Chorros. K12+275 al K12+580.
La comisión de Topografía de la interventoría estuvo en el lugar de la construcción de la Placahuella de la Quebrada la Manzana K10+760 al K10+950 el día lunes, los Días martes y miércoles en la Placa huella de la manzana @ K10+270 al K10+500

Ing Auxiliar de interventoría

22-01-2019 Se presentaron lluvias desde las 6:00 P.M. del día anterior hasta las 9:00 a.m. del día de hoy.
Personal en obra: Ings. Director, Residente, Auxiliar, 2 Maestros, Profesional SISO, oficiales, ayudantes, 2 Herreros, 4 Conductores, 4 operadores.
Equipos: 1 Motoniveladora, 2 Retrocargadores, 1 vibrocompactador, 2 Alargadoras, Vibrador de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Corte y fijamiento de hierro para placa huella y Cabezotes de alcantarillas.
Instalación de acero de refuerzo para Vigas de placa huella
NOTA: A partir del día de hoy el contratista cuenta

con una cuadrilla para construcción de Alcantarillas,
Compuesta por un Maestro, 1 oficial y 4 ayudantes.
También se vincularon 4 ayudantes más.
Estado del Tiempo: Se presenta nuevamente lluvia desde
las 17.20 P.M. hasta las 6.00 P.M.

Inspector Interventoria

23-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra,
Residente, Auxiliar, Profesional SISO, 1 Maestro
5 oficiales, 18 ayudantes, 1 Herrero, 1 operadores
2 Conductores.
Equipo: Motovibradora, 2 Retrocargadores, 1 Rodillo com-
pactador, 2 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto,
Camioneta de Platón, Herramienta Menor.
Actividades: Corte y figurado de hierro para placa huella.
Excavación para Muro PK, 36, en alcantarilla del (K1+380,
Instalación de Tubo.
Conformación de Calzada de via en el (K5+880 Aprox.)
Fundida de módulos de placa huella, cintas reforzadas
K13, (6 Módulos).
Instalación y anclaje de acero de refuerzo para placa
huella, K13.
Estado del Tiempo: Lluvia Ligera de 1.30 a 6.30 P.M.
NOTA: La cuadrilla para construcción de Alcantarillas
no pudo presentarse el día de hoy.

Inspector Interventoria

24-04-2019: Personal en Obra: Ings. Director de obra, Residente,
Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 5 oficiales, 22 ayu-
dantes, 2 Herreros, 4 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Motovibradora, 2 Retrocargadores, 1 Rodillo compac-
tador, Camioneta Doble cabina, 2 Mezcladoras, 2 vibradores de
Concreto, Herramienta menor.
Actividades, se inicia armado de formaleta para
vástago del Estribo 3, del muro 3.
Se continua Corte y figurado de acero.

Instala
K13.
14 de
Estado
Ing
Inspecto
25-04-2019: Te
23 de
Cor
Cami
Herra
Activi
módu
Corte
Instala
Fundi
Llegu
Estado
NOTA:
Obra
pente
Ing
Inspec
26-04-2019: Per
Auxil
Ayud
Equi
2 Ele
1 Vol
Retro
en e
se Co
hue
Fundi
K13+
Estado

262

Instalacion y amarre de acero para placa huellas K13. Fundida de cintas reforzadas de placa huella 19 modulos.
Estado del tiempo: lluvia moderada de 9:00 a 7:00 P.M.
Inspector Interventoria.

25-09-2017: Personal en obra: Ing. Residente, 1 Residente, 5 oficiales, 23 ayudantes, 2 Veneros, 4 operadores, 3 Conductores,
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, 1 Retroexcavadora, Camioneta Doble cabina, 2 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Se termina armado de formaleta para cabezote del módulo 3, en el muro 3, K7+380 (M. D.)
Corte y figurado de acero para placa huella.
Instalacion y amarre de acero para placa huella K13.
Fundida de placa de cuneta entre el K13+011 y el K13+031 (M.D.)
Llega material Subbase (2 viajes), Arena (4 viajes)
Estado del tiempo: Dia Seco.
Notas: Hicieron presencia el Ingeniero Ambiental Jhon Cano y Nury Garcia Profesional Social por parte de la Interventoria.
Inspector Interventoria.

26-09-2017: Personal en obra: Dgs. Director de obra, Residente, Auxiliar, Profesional Soc, 1 Residente, 5 oficiales, 23 Ayudantes, 2 Veneros, 2 operadores, 2 Conductores, Equipo: 2 Retrocargadores, Camioneta doble cabina, 2 Mezcladoras, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor, 1 Volqueta.
Actividades: Fundida de cabezote del modulo 3, muro 3, en el K7+380 (M.D.)
Se continua Corte y figurado de acero para placa huella y instalacion y amarre de acero.
Fundida de placa de cuneta entre el K13+011 y el K13+031 (M.D.). Se reanuda entre el K13+021 y el K13+019.50 (D)
Estado del tiempo: lluvia moderada entre las 2:00 y 3:00 P.M.

Inspector-Fiscalizadora

27-04-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Civil, 1 Maestro, 5 oficiales, 2 Hemeros, 23 ayudantes, 2 operadores, 2 Conductores,
Equipo: 2 Retroexcavadoras, 1 Camioneta doble cabina, 2 Vibradores de Concreto, 1 Volqueta, Herramienta Menor.
Actividades: Desencofrado de formaleta de cuneta del módulo 3, muro 3, en el K7+380 (Rt. D.)
Se continúa Corte y figurado de hierro para placa huella e instalación y armado del mismo.
Fundida de Cinta Central de placa huella completa ejecutada entre el K13+411 y el K13+050.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Inspector Interventoría.

29-04-2019: NOTA: El día hoy no se realizó ninguna actividad en obra por falta de Cemento.
Llegan 18 Viajes de materiales agregados (Triturado y arena).

30-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, 1 Maestro, Profesional Civil, 4 oficiales, 2 Hemeros, 20 Ayudantes, 2 Operadores, 6 Conductores.
Equipo: 2 Retroexcavadoras, 6 Volquetas, 1 Camioneta doble Cabina, 1 Jeep, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Corte y figurado de acero para placa huella y alcantarillas. Instalación y armado de acero en placa huella. Llega Material agregados y Cemento.
Se fundieron 14 modulos de las dos Cintas Centrales de placa huella, entre el K13+958 y el K13+000.
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría.

Inspector-Fiscalizadora

[illegible] oficiales, Equipo Cabina Hemeros Actividades huella en placa fundida ambos Estado

Inspector

02-05-2019: Personal Civil, 1 2 operadores Equipo Cabina, Herramienta Actividades y Alcantarillas Fundida Cinta Se finalizó Llega Estado

Inspector

03-05-2019: Personal, 20 Equipo doble Concreto, 1 Actividades 36" en Instalación

6ènaa.

01-04-2019.- Personal en obra: Ing. Residente, Auxiliar, y Maestro, 3 oficiales, y Herrero, 10 ayudantes, 2 conductores,
Equipo:- Motoniveladora, 2 Retrocargadoras, Vibrocompactadores, 2 Mezcladoras, Volqueta, Herramienta menor.
Actividades:- Excavacion muro #5,
Se arma formaleta para caja K17+818 (M.I.)
Cunido de filtro,
excavacion para filtro en el muro #3,
Figurado de hierro.
Estado del Tiempo: Lluvia entre las 11:00 a.m. y las 1:30 p.m. y entre las 4:00 p.m. y las 5:30 p.m.

Inspecta Interventoria,

02-04-2019.- Personal en obra: Ing. Auxiliar, y Maestro, 3 oficiales, y Herrero, 10 ayudantes, 2 Conductores, 4 operadores,
Equipo:- Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, 2 Mezcladoras, Volqueta, Herramienta menor,
Actividades:- Se continuo armado de formaleta para Caja de aforo K17+818 (M.I.)
Figurado y armado de hierro para muro #5,
Instalacion de geotextil, Tubo de drenaje, material Filtrante en filtro de drenaje muro #3, K17+813 (M.D.)
Descargue de 2 viajes de Concreto en la finca "Venecia" con destino al Tramo Pijao - Buenos.
Estado del Tiempo:- Lluvia intensa entre las 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Inspecta Interventoria,

03-04-2019.- Personal en obra: Ing. Residente, Auxiliar, y Maestro, 3 oficiales, y Herrero, 10 Ayudantes, 2 Conductores, 90peradores
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadoras, Vibrocompactador, 2 Mezcladoras, Planta electrica, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida Zapata muro #5,
Se fundio Caja (aforo) en el K17+818 (M.I.)
Fundida Solado de Caja aforo K17+885 (M.I.)
Armada de hierro Voladizo muro #5,

Estado del Tiempo
Inspecta Interven

04-04-2019: Amanecc
entenio hasto
Personal en ob
3 oficiales, y He
Equipo: Moto
2 Mezcladoras, 2
Actividades: M
Se termino arm
de formaleta.
Excavacion de c
Se llena con
armado de hierro
Inspecta Interventoria

05-04-2019.- Personal e
3 oficiales, y He
Equipo:- Mot
2 Mezcladoras, 1
Actividades:- Fu
Se Termino de a
Estado del Tiem
Inspecta Interventoria

06-04-2019.- Personal en
3 oficiales, y
Equipo: Moto
2 Mezcladoras, 1
Actividades: e
Fundida de So
Retiro de ma
Estado del Tie
Inspectora Interventoria

Estado del tiempo: Lluvia intensa de 4.30 a 7.00 P.M.

Inspector Interventoría

-09-2019: Amanece el día con lluvia intensa desde la noche anterior hasta las 10.00 a.m. del día de hoy.
Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, y Maestro, 3 oficiales, y Herrero, 10 ayudantes, y Conductor, 4 operadores
Equipo: Motoniveladora, 2 Retro cargadores, Vibrocompactador, 2 Mezcladoras, Planta eléctrica, Vibrador de concreto, Herramienta menor,
Actividades: Llenado de agua y limpieza de Caja K17+738 (M.I.)
se termino armado acero muro 5 y se inicia armado de formaleta,
Excavación de alcantarilla K18+023 (M.I.), se instala Tubo, y se llena con material sobre este,
armado de viga para Caja encole K17+885 (M.I.)

Inspector Interventoría

09-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, y Maestro, 3 oficiales, y Herrero, 10 ayudantes, y Conductor, 4 operadores.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retro cargadores, Vibrocompactador, 2 Mezcladoras, Planta eléctrica, Vibrador de concreto, Herramienta menor,
Actividades: Fundida de placa piso para Caja en obra MUROS
se termino de armar formaleta para muro 5, y se funde,
Estado del Tiempo: Lluvia de 8.00 - 10.00 A.M.

Inspector Interventoría

-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, y Maestro, 3 oficiales, y Herrero, 10 ayudantes, y Conductor, 4 operadores
Equipo: Motoniveladora, 2 Retro cargadores, Vibrocompactador, 2 Mezcladoras, Planta eléctrica, Vibrador de concreto, Herramienta menor,
Actividades: Excavación manual para descole obra K18+023,
Fundida de solado para Caja encole en el K18+023 (M.I.)
Retiro de material de excavaciones
Estado del Tiempo: Lluvia moderada, de 6.00 a.m. a 9.00 a.m.

Director de Interventoría

8-09-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, 4 operadores,
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador,
Actividades: Retiro de material de excavaciones,
Conformación de vía para paso de volquetas,
Estado del Tiempo: Dia Seco.
NOTA: El Personal de trabajadores de mano de obra no laboró el día de hoy.

Inspector Interventoría.

-09-2019. Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar,
4 Operadores,
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores,
Vibrocompactador,
Actividades: Extendido de material Sub-base entre el K17+635 y el K17+675,
Llega material Sub-base (18 viajes) y material filtrante (6 viajes),
Estado del Tiempo: Dia Seco.
NOTA: El personal de mano de obra no labora.

Inspector Interventoría

09-2019. Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Topógrafo,
Cadenero, 4 operadores,
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, Equipo de Topografía,
Actividades: Aproximación de Niveles de Sub-base entre el K17+675 y el K17+818.
Se fijan niveletas para Sub-base de pluvial calle.
Retiro de materiales de excavaciones,
Estado del Tiempo: Lluvia intensa de 12m a 1 P.M, y de 3.0 a 5.0 P.M, Lluvia moderada de 5:00 a 7.0 P.M.
NOTA: El día de hoy Tampoco laboró el personal de obra.

Inspector Interventoría.

11-09-2019: Personal en
Cadenero,
Equipo: Moto
Equipo de Topo
Actividades:
extendido de
Se reunieron
de Pivao, los
rial INVIAS, En
de interventoría
tor del Contrat
del Contratista
Estado del Tie

Inspector Interva

12-09-2019: Personal en
y Maestro, 2 O
dores, Topografo
Equipo: Moto
Equipo de Topogra
Actividades: R
del K18+023
Amano de hie
Caja de encol
Fraguado de
se fijan nivel
Estado del Tiem

Inspector Interventor

13-09-2019: Personal en
Cadenero, y Maestro, 6
Equipo: Moto
Equipo de Topogra
Actividades:
de alcantarilla
Se termino de

11-04-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 4 operadores, Topografo Cadenero.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, Equipo de Topografia.
Actividades: Replanteo de nivele de Subbase.
extendido de material Subbase.
Se reunieron en el Comité de carreteras del municipio de Piyao, los ingenieros Alfonso Olaya, Director Territorial INVIAS, Emanuel, Ingeniera Andrea Peña, Directora de interventoria, Ingeniero Pablo Alberto Valencia, Director del Contratista, e Ingenieros Residentes y Auxiliares del Contratista e Interventoria.
Estado del Tiempo: Lluvia de 8:00 a 6:00 P.M.
Aspecto Interventoria.

12-04-2019: Personal en obra: Ing. Director de obra, Auxiliar, 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Maestro, 6 ayudantes, 4 operadores, Topografo, Cadenero, 4 Conductores.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, Equipo de Topografia, Volquetas, Herramienta Menor.
Actividades: Armado de acero para caja de encole obra del K18+023 (M.I.)
Amarre de hierro y armado de formaleta para caja de encole en el K17+885 (M.I.)
Fundido de acero para alcantarilla y placa huella.
se hacen niveles de subbase entre el K17+635 y el K17+818.
Estado del Tiempo: Dia seco.
Aspecto Interventoria.

13-04-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Maestro, 6 Ayudantes, 4 operadores, Comision Topografia.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, Equipo de Topografia, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de solado, Descole y Placas de alcantarilla en el K18+023.
Se terminan de amarrar hierro para caja de encole

en el K17+885 (M. 2.)
Extendido de Sub-base entre el K17+635 y el K17+885,
Estado del tiempo: Dia Seco.

Inspector de Vía Férrea.

15-04-2019. Personal en obra: 1 Ing. Auxiliar, 1 Director, 1 Ing. del subcontratista de Mtto de obra, 2 oficiales, 1 Maestro 6 ayudantes, operador de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 1 operador de vibrocompactador, 1 chofer de camioneta.
Equipo: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 2 retroexcavadoras, 6 volquetes, 1 vibrocompactador tipo canguro, 2 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, Herramienta menor, 1 camioneta de pitacas.
Tiempo: Tiempo seco en la mañana, lluvias intensas en la tarde.
Actividades: Instalacion de Acero de refuerzo en la poceta Alcantarilla K18+023, construccion de filtros en el muro 5 K18+380 y el muro 4 K22+321, construccion del Acero de ambos muros, conformacion de Subbase Plena huella K17+020 al K18+720.

Ing. Auxiliar Interventoría

15-04-2019. Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Ing. Director, 1 Ing. residente del subcontratista, 1 profesional en SST, 1 maestro, 1 chofer de camioneta, 5 operadores de equipo pesado, 2 oficiales, 1 maestro de obra, 1 Herrero, 6 ayudantes.
Equipo: 2 retroexcavadoras, 2 mezcladoras, 2 vibrocompactadores (1 tipo rana, 1 tipo canguro), 6 volquetas, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 Camioneta, Herramienta menor.
Actividades: Instalacion de fundicion poceta del Alcantarilla K18+023 (pilo), Terminacion de llenos de los muros 1 (18+382) y muro 21 (K22+321).

Avance de sub
dia anterior,
K19+113. Di

Ing.

17-04-2019. Personal
obra, 1 Ing.
obra, 2 Of
chofer de c
Equipo: 1
vibrocompactad
1 camioneta
Tiempo: lluvi
Actividades:
Tanilla K18+
refuerzo de
de Tuchos,
de llenos sobr
la placa huell
fuertes, llu

Ing.

22-04-2019 Personal
Residente, 2
Equipo: 1 Re
estacas, 2 Mar
alambre.
Actividades:
Se inicio con
Retiro de ma
Caja de em
Estado del Tiem

Inspector de Interventoría

Arreglo de subbase dañada por las fuertes lluvias del día anterior, Construcción de Tercho en el muro 3 K19+413. Día lluvioso, llovió intenso, hasta de la Tarde

Ing. Auxiliar Interventoría

17-01-2019. Personal en obra: 2 Ing Auxiliar, 1 Director de obra, 1 Ing. residente del subcontratista, 1 maestro de obra, 2 Oficiales, 1 Herrero, 6 ayudantes, 1 conductor de camioneta, 5 operadores de maquinaria pesada
Equipo: 1 motoniveladora, 2 retroexcavadoras, 1 vibrocompactador, 1 vara, 1 cargador, 2 mezcladoras, 1 camioneta de oficina, herramienta menor.
Tiempo: lluvia durante todo el Tiempo de Tipo moderado
Actividades: Terminación de fundición de muros alrededor Torilla K18+023 (pocata), reforzamiento del solado del reborde de la alcantarilla K18+023, Continuación de Tercho en el muro 3 (K19+413), e instalación de llanta sobre dicho tercho, Arreglo de subbase de la pista hacella K17+620 al K18+720, dañada por las fuertes lluvias.

Ing. Auxiliar de interventoría.

18-01-2019 Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, Residente, 2 oficiales, 1 Helpero, 8 ayudantes, 1 operador, Equipo: 1 Retro cargador, 1 Volqueta, 1 Camioneta de oficina, 2 Mezcladoras, 1 Rana, 1 Canguro, Herramienta Menor,
Actividades: Se continuia llenado en el Muro 3, K19+413(D) Se inicia construcción de Campamento. (K17+800 D.I.) Retiro de material de derrumbe en el K17+700 (D.I.) Cajeo de encole.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa de 1:00 P.M. a 6:00 P.M.

Inspector de interventoría

23-04-2019: Personal en obra, Ings. Director de obra, Residente, Auxiliar, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 operador, 1 Minero, 8 ayudantes, 2 Conductores, 1 operador,
Equipos: 1 Retrocargador, 1 Volqueta, 1 Camioneta de cabina, 2 Mezcladoras, 1 Rana, 1 Compac, Vibrador de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Se termina Construcción de Campamento, Se trasladan materiales al Campamento,
Se funde Placa piso de obra desde en el K181023(M.D.)
Se termina Muro en el Muro 3, K191413 (M.D.)
Estado del Tiempo: Lluvia moderada desde las 1:00 a las 7:00 PM
Inspector Interventoría

24-04-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Mineros, 8 ayudantes, 2 Conductores, 1 operador
Equipos: 1 Retrocargador, 1 Volqueta, 1 Camioneta de cabina, 2 Mezcladoras, 1 Rana, 1 Compac, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Corte y Figurado de acero para placa huella.
Excavación para alcantarilla en el K181282.
Cama de arena para tubo de 36" PVC, e instalación de tubo, Llena sobre tubo.
Limpieza de Cuneta en el K171735 (M.I.) (zampeado)
Estado del Tiempo: Lluvia moderada entre las 6:00 y las 8:00 PM.
Inspector Interventoría

NOTA: Hicieron recorrido de obra en las horas de la tarde el Ing. Alvaro Cano, Especialista Ambiental, la profesional Social Nury Garcia, en compañía del Ing. Edisson Valencia, residente de Interventoría.

25-04-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Residente, Auxiliar, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Mineros, 8 ayudantes, 2 conductores, 1 operador.
Equipos: 1 Retrocargador, 1 Volqueta, 1 Camioneta de cabina, 2 Mezcladoras, 1 Rana, 1 Compac, Vibrador de Concreto, Herramienta Menor.

Actividades:
Fundida de Placa
Fundida de Co
Armado de
y gleteo
Inspector Interventoría

26-04-2019: Personal
1 Maestro, 2 o
(Herramienta
Equipos: 1
Cargador, 1 V
1 Rana, 1 Co
Actividades:
para Placa
Terminado
del K18178
Desalbeo
Estado del
Inspector Interv

27-04-2019: Person
2 oficiales,
(Herramien
Equipos: 1
Cargador, 1 V
1 Rana, 1 Co
Actividades
para Placa
Fundida de Co
Armado
y gleteo
Inspector Interventoría

[redacted]

Actividades:- Armado de formaleta para cabezote descole de alcantarilla en el K184023 (M-D.)
Armado y amarre de hierro para caja y cabezote del cole alcantarilla del K181282.
Fundida de Solados de caja de empate y descole de obra del K181282.
Estado del Tiempo: Dia Seco.
[signature]
Inspector de Interventoria

26-01-2019.- Personal en obra: 1 Ings. Residente, 1 auxiliar, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Herrero, 8 ayudantes, 2 Conductores, (Herramienta Menor) 3 operadores,
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 Volqueta, 1 Camioneta de oficina, 2 Mezcladoras, 1 Planta, 1 Compresor, Vibrador de Concreto, Herramienta Menor,
Actividades:- Se continua corte y figurado de acero para placa huella.
Terminado de armado y amarre de acero para obra del K181282, Excavación para dentellón, se funde Dentellón y placa Piso.
Estado del Tiempo: Dia Seco.
[signature]
Inspector de Interventoria

27-01-2019: Personal en obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 2 oficiales, 8 ayudantes, 1 Herrero, 2 Conductores, (Herramienta Menor) 3 operadores,
Equipos: 1 Motoniveladora, Vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 Volqueta, 1 Camioneta de oficina, 2 Mezcladoras, 1 Planta, 1 Compresor, Vibrador de Concreto, Herramienta Menor,
Actividades:- Se continua Corte y figurado de hierro para placa huella.
Fundida cabezote y Aletas Descole, obra del K184023(D) Armado y (figurado) amarre de hierro para Caja y aletas K181282, Estado del Tiempo: Dia Seco.
[signature]
Inspector de Interventoria.

29-04-2019.- Personal en obra: Jefe Directo de obra, Residente, Auxiliar, 1 Maestro, 3 oficiales, 11 ayudantes, 1 Hevero, 4 Conductores, 3 operadores,
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retrocargador, Camioneta de enlace, 3 Volquetes, 2 Excavadores, Rana, Compactador Vibrador de Concreto, Herramienta Menor,
Actividades: Conformación de calzada entre el Km 1+200 y el Km 1+300 aprox.
Aproximación de nivel de Sub-Base (exponte) entre el Km 1+625 y el Km 1+818.
Fundida de Plinto Pilas de Caja encole en el Km 1+282 (I.) y Armado de formaleta para Guardaruedas y Muros (paralelos).
Se inicia excavación para Caissons, de Pilas 3, Km 1+413 (M.D.)
Estado del Tiempo: Día Seco,

Inspector Interventoría

30-04-2019.- Se funde placa y cabezote de alcantarilla en el Km 1+282.
Se continúa corte, figurado de acero para placa huella.
Se funden anillos en los caissons 1 y 3 del muro 3 Km 1+413
Personal en obra: Jefe Residente, Auxiliar, 1 Maestro, 1 Ayudante, 1 Ayudante,
3 oficiales, 1 Hevero, 3 operadores, 2 Conductores, topografía
Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retrocargador, Camioneta de enlace, Volqueta, 2 Excavadores, 1 Rana, 1 Compactador Vibrador de Concreto, herramienta Menor.
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría

Equipos: Moto
Volqueta, Com
to, vibrado de C
Estado del tiempo.

Inspector Interventoría

3-05-2019.- Personal en
1 Hevero, 3 ope
Equipos: Moto
Volqueta, Camio
pare, vibrado de
la mano.
Actividades: Se
de acero, Fam
Se continúa c
del muro 3,
Estado del Tiem

Inspector Interventoría

01-05-2019.- Personal
ciales, 1 Hevero,
Cadenero, 1
Equipos: Mot
Volqueta, Com
pare, vibrado
miento Menor
Actividades: Co
Traslado del m

EN EL PRESENTE INFORME NO SE INCLUYE PROGRAMA DE OBRA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.
