Apartadó, 15 de diciembre de 2025

DR. LUIS ALFREDO GUERRA
Gerente
EICE – EDUH Apartado
Notificaciones a:
proyectos@eduha.gov.co

REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS LUMINOSA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ, CHOCÓ, PARA LA AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA SEGURIDAD ELÉCTRICA Y LA ARMONÍA ESTÉTICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ.

Cordial saludo,

El Municipio de NUEVO BELEN DE BAJIRA firmo con la EICE EDUH Apartadó el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **CI-007-2025** para la administración de recursos y realizar acciones pertinentes para ejecutar el proyecto PARA LAS INSTALACIONES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO BELEN DE BAJIRA EN LA ZONA URBANA RURAL**.** De lo cual el EICE EDUH delegó por medio del **CONTRATO DE OBRA NO. EDUH-CD-030-2025** a la empresa ELECTROSISTEMAS INGENIERIA JM S.A.S la ejecución del contrato mencionado

Por medio del presente se adjunta el informe de ejecución de actividades del periodo comprendido entre el 28 de Noviembre de 2025 hasta 15 de Diciembre de 2026.

Se anexa dos copias de:
Informe de actividades Nº. 1
Seguridad social y certificado de paz y salvo

VICTOR LIZARAZO ARGEL
C.C. 1.098.679.836
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROSISTEMAS INGENIERÍA J.M. S.A.S
NIT. 901.379.850-1

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Nº 1
CONTRATO DE OBRA NO. EDUH-CD-030-2025



CONTRATANTE: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO NIT 901.445.176-6
CONTRATISTA: ELECTROSISTEMAS INGENIERÍA J.M S.A.S.

ACTA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. GENERALIDADES 4
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO 7
3. CARACTERISTICAS TECNICAS 7
4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 7
5. ASPECTOS CONTRACTUALES 8
6. POLIZA DEL CONTRATO 9
6.1. póliza de garantía única de cumplimiento 9
6.2. Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual: 9
7. PERSONAL EN OBRA 10
8. HERRAMIENTA Y EQUIPO EN OBRA. 10
9. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 11
10. INFORMACIÓN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 11
11. ACTA DE AVANCE Nº 1 37
12. MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 37
13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 37

1. INTRODUCCIÓN

El Alumbrado Navideño es una tradición conocida en el ámbito mundial que aviva los valores de la ciudadanía en torno a la familia y la apropiación del espacio público, constituye una oportunidad de esparcimiento en la época decembrina que se caracteriza por la disposición de los ciudadanos para visitar lugares que evocan la unión, el amor, la fe y la esperanza. Igualmente, motiva a la celebración en la búsqueda de lugares donde compartir en familia, los cuales influyan a realizar recorridos nocturnos, apropiándose del territorio y rescatando las costumbres y tradiciones navideñas.

El alumbrado Navideño actúa como estímulo económico y social capaz de incentivar el turismo en la zona, favoreciendo así la afluencia de visitantes locales y extranjeros por las calles y espacios en las que se han instalado las luces. Con el alumbrado Navideño se crean experiencias únicas que contagien la magia de la Navidad a toda la población, indiferente de su edad. Durante esta temporada, la iluminación confluye con figuras y elementos artísticos, cobrando una especial relevancia pues a través de esta expresión artística las personas viven nuevas experiencias y disfrutan espacios de encuentro llenos de magia y diversión.

La administración municipal de Nuevo Belén de Bajirá- Chocó, busca exaltar dichas costumbres y convertir al municipio en un sitio obligado de visita de quienes disfrutan y recorren la región gozando de la tradición, de un festival de arte y luces que permite dinamizar la economía local en sectores como transporte, comercio y hotelería, entre otros.

Se presenta a la EDUH el presente Informe de ejecución de actividades del **CONTRATO de suministro Nº EDUH-CD-030-2025** celebrado entre la EICE – EDUH Apartadó y ELECTROSISTEMAS INGENIERÍA J.M S.A.S.CHOCO cuyo objeto es **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS LUMINOSA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ, CHOCÓ, PARA LA AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA SEGURIDAD ELÉCTRICA Y LA ARMONÍA ESTÉTICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS”**

2. GENERALIDADES

La cultura en Nuevo belen de Bajira es un reflejo de la diversidad étnica y social de la región, marcada por la influencia de comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. En el

marco de la institucionalidad, el Municipio de Nuevo Belen de Bajira carece de una política publica que apoye la cultura, así como de infraestructuras y espacios recreativos para llevar a cabo diversas actividades

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Nuevo Belén de Bajirá es un municipio colombiano del departamento del Chocó, su cabecera municipal es Belén de Bajirá, se encuentra localizado en la subregión del Urabá, en la cuenca del río Atrato.

Belén de Bajirá y sus áreas circundantes fueron centro de una disputa territorial entre los departamentos de Chocó y Antioquia.

El día 30 de noviembre de 2022, la Asamblea departamental de Chocó, mediante Ordenanza N.º 162 de 2022[5] aprueba la creación del municipio Nuevo Belén de Bajirá.

Nuevo Belén de Bajirá está delimitado por los siguientes municipios:

Noroeste: Riosucio (Río Atrato)	*Norte:* Límite entre Riosucio y Turbo (Antioquia)	*Nordeste:* Turbo (Antioquia)
Oeste: Riosucio (Caño La Lepra)		*Este:* Mutatá (Antioquia) (Río Pavarandó)
Suroeste: El Carmen del Darién	*Sur:* El Carmen del Darién (Río Curvaradó)	*Sureste:* El Carmen del Darién (Río Antadía)

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL PAÍS



UBICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO



UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO



Municipio de Nuevo Belen de Bajira

Localización especifica dentro del municipio:

- En el parque principal de Nuevo Belén de Bajirá.
- En el Corregimiento de Blanquicet.
- En el Corregimiento de Playa Roja.
- En el Corregimiento de Nuevo Oriente.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

El proyecto contempla el suministro e instalación de elementos decorativos de alumbrado navideño, figuras, pendones, luces y decoraciones en entradas al casco urbano, en el parque principal del Municipio y en zonas públicas de los corregimientos.

4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El presente informe da a conocer la situación actual de las actividades desarrolladas con el inicio al CONTRATO DE SUMINISTRO N° EDUH-CD-030-2025 desde el día 28 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, el cual consiste en el **SUMINISTRO, INSTALACION, REHABILIACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION DE**

FIGURAS DECORATIVAS LUMINOSAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS DEMAS ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA ZONA URBANA Y LAS ZONAS RURALES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO, LA EFICIENCIA ENERGETICA, LA SEGURIDAD ELECTRICA Y LA ARMONIA ESTETICA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($343.027.643)**

5. ASPECTOS CONTRACTUALES

CONTRATO	EDUH-CD-030-2025
CONTRATISTA	ELECTROSISTEMAS INGENIERÍA J.M S.A.S. NIT N° 901.379.850-1 R./LEGAL. VÍCTOR ALFONSO LIZARAZO ARGEL, identificado con cedula de ciudadanía número 1.098.679.836, expedida en el Municipio de Bucaramanga, Santander
OBJETO	“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS LUMINOSA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS ORNAMENTALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ, CHOCÓ, PARA LA AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA SEGURIDAD ELÉCTRICA Y LA ARMONÍA ESTÉTICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS”
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($343.027.643)
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
FECHA INICIAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 DE ENERO DE 2026

Tabla 1. Generalidades contrato

6. POLIZA DEL CONTRATO

6.1. póliza de garantía única de cumplimiento

Póliza de Aseguradora Seguros del estado S.A N° 75-46-101019651

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	$ 34,302,764.30	28	11	2025	28	07	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 171,513,821.50	28	11	2025	28	05	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 34,302,764.30	28	11	2025	28	01	2029
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 34,302,764.30	28	11	2025	28	02	2026

Tabla 1. Póliza de garantía única de cumplimiento Anexo 0

6.2. Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual:

Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia N° 75-54-101002174

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Predios labores y operaciones	$ 284.700.000,00	28	11	2025	28	07	2026

Tabla 6. Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual Anexo 0

7. PERSONAL EN CAMPO

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

NOMBRE	CARGO	TIEMPO (MESES)	% DE OCUPACIÓN
VICTOR LIZARAZO	RESIDENTE DE OBRA	2	100%
MANUEL OCHOA	DIRECTOR DE OBRA	2	10%

8. HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
Pulidoras	Unidad	1	Bueno
Taladros	Unidad	1	Bueno
Destornilladores	Unidad	15	Bueno
Ponchadora de impacto	Unidad	2	Bueno
Corta cable	Unidad	5	Bueno
Tester para medir continuidad	Unidad	1	Bueno
Tijeras de laminas	Unidad	1	Bueno
Medidor de voltaje	Unidad	4	Bueno
Alicates	Unidad	4	Bueno
Cortador de tubo	Unidad	2	Bueno

9. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

N° ACTA	VALOR	VALOR PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO
INICIAL	$ 343.027.643,00	N/A	N/A
ANTICIPO	$ 171.513.822,00	$ 0	N/A
N°1	$ 308.724.879.00	$ 0	$ 154.362.440
VALOR NETO A PAGAR		$ 154.362.439.00	
AVANCE SEGÚN ACTAS		90.00 %	

10. INFORMACIÓN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

El Contrato a corte del 15 de diciembre de 2025 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 90.00%, para un valor acumulado de ejecución $ 308.724.879.00

Descripción de las Actividades Desarrolladas

N°	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1.1	SUMINISTRO DE MATERIALES, LOCACIONES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA, LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REEMPLAZO DE PINTURAS, VERIFICACIÓN DE SOLDADURAS E IMPLEMENTOS DECORATIVOS Y DE ILUMINACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y EL REFUERZO PARA SER USADAS Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**GL**	1,00
1.2	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN EL CORREGIMIENTO DE NUEVO ORIENTE, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN ORIENTE, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
1.3	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN LA ENTRADA POR BARRANQUILLITA, Y LOS ELEMENTOS	**GL**	1,00

1.4	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN LA ENTRADA POR MUTATA, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.	**GL**	1,00
1.5	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN EL CORREGIMIENTO DE PLAYA ROJA, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
1.6	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN LA ENTRADA POR DE RIOSUCIO, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
1.7	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN EL CORREGIMIENTO DE BLANQUICET, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
1.8	SUMINISTRO DE DECORACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES, PLATAFORMA EN FORMA DE TÚNEL DE LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	2,00
1.9	SUMINISTRO DE ARBOLES DE NAVIDAD, LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
2	SUMINISTRO DE DECORACIÓN DE TÚNEL DE LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
2.1	SUMINISTRO DE RENOS, PLATAFORMA EN FORMA DE TÚNEL DE LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	6,00
2.2	SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	7,00

2.3	SUMINISTRO DE FIGURA AÑO 2026 DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	4,00
2.4	SUMINISTRO DE DECORACIÓN DE CONTORNO DE LA CASETA CENTRAL DE DOS PISOS DEL PARQUE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	**GL**	1,00
2.5	MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ	**GL**	1,00
2.6	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MONTAJE Y CONEXIONES ADEMÁS DE LAS DESCONEXIONES, EL EMBALAJE Y EL ALMACENAMIENTO DE LAS FIGURAS DECORACIONES NAVIDEÑAS del MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ	**GL**	1,00
2.7	TRANSPORTE DE FIGURAS DESDE EL CASCO URBANO Y HACIA LA ZONA RURAL REQUERIDA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ, ADEMÁS DE FIGURAS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO	**GL**	1,00

Semana 1 y 2.

En el desarrollo de las actividades realizadas para la ejecución de Alumbrado Navideño en el Municipio de Nuevo Belén de Bajirá. Una vez realizada Acta de Inicio se empezaron las actividades de compra de los elementos necesarios como varilla, soldadura, flejes, laminas y perfiles para los herrajes con las formas de las figuras navideñas para el municipio, estas compras se hicieron por fuera del área del municipio por la carencia de cantidades en las proveedoras locales y la mano de obra especializada para la actividad de moldeado, modelado y soldadura a gran escala por el volumen de las figuras objeto del contrato.

- La compra de los materiales para las estructuras metálicas.
- El inicio de la figuración y el moldeado de las figuras
- La pintura con anticorrosivo de las estructuras metálicas con formas navideñas
- El traslado de las figuras y sus volúmenes al municipio del objeto del contrato
- La compra de los materiales para decorar las estructuras navideñas
- La instalación de los materiales en las estructuras con formas navideñas en el municipio de Nuevo Belén de Bajirá
- La Compra de los materiales eléctricos para la instalación en los puntos establecidos con el operador de Red y el municipio para la puesta en funcionamiento de las estructuras decoradas con formas navideñas en el municipio de Nuevo Belén de Bajirá.
- La Instalación en los sitios finales de las figuras navideñas en los postes, parques, senderos y jardines.

Semana 3 a la 7.

- Actividades de verificación del funcionamiento de las figuras que se encuentran en el tiempo navideño.
- Verificación del funcionamiento de las FIGURAS DECORATIVAS DE JARDIN.

DESCRIPCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DESAROLLADAS

ITEM 1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES, LOCACIONES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA, LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REEMPLAZO DE PINTURAS, VERIFICACIÓNDE SOLDADURAS E IMPLEMENTOS DECORATIVOS Y DE ILUMINACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y EL REFUERZO PARA SER USADAS Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS





Se realizó el suministro y utilización de los materiales, insumos y elementos necesarios para la limpieza, restauración y mantenimiento integral de las figuras de alumbrado navideño existentes en el municipio de Nuevo Belén de Bajirá. Las actividades ejecutadas comprendieron la limpieza general de las estructuras decorativas, retirando suciedad, residuos y elementos deteriorados que afectaban su apariencia y funcionamiento.

Se efectuó la verificación técnica del estado estructural de cada figura, incluyendo la inspección y corrección de soldaduras, refuerzos metálicos y puntos de unión, garantizando la estabilidad y seguridad de las mismas para su reutilización. Así mismo, se realizó el reemplazo y aplicación de pinturas protectoras con recubrimiento anticorrosivo, mejorando la durabilidad de las estructuras metálicas y su presentación estética.

En cuanto al componente eléctrico, se llevó a cabo la revisión y verificación del funcionamiento de los sistemas de iluminación, sustituyendo elementos defectuosos tales

como mangueras lumínicas, conectores, adaptadores y accesorios eléctricos, asegurando la correcta operación de las figuras conforme a las condiciones técnicas requeridas. Se repusieron y ajustaron implementos decorativos deteriorados, garantizando la uniformidad visual y el cumplimiento del diseño navideño establecido.

Finalmente, se suministraron y utilizaron todos los elementos necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de las figuras rehabilitadas, asegurando su adecuado anclaje, conexión eléctrica segura y cumplimiento de las normas técnicas vigentes, dejando las figuras existentes en óptimas condiciones para su uso durante la temporada navideña.

ITEM 1.2. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN EL CORREGIMIENTO DE NUEVO ORIENTE, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN ORIENTE, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Se realizó el suministro, transporte e instalación de figuras alusivas a la Navidad tipo pasacalles, pendones, decoración de postes y figuras de piso nuevas en el corregimiento de Nuevo Oriente, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, estabilidad e instalación segura.

1.2.1. Un, Pasacalle feliz navidad de 7 X 1,50 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.




Se suministró e instaló un (1) pasacalle alusivo a la Navidad con la leyenda “Feliz Navidad”, con dimensiones aproximadas de 7,00 metros de largo por 1,50 metros de alto. La figura fue fabricada en estructura de hierro y flejes unidos mediante soldadura, garantizando la resistencia mecánica y estabilidad necesaria para su instalación en espacio público.

La estructura fue decorada con colores alusivos a la temporada navideña, complementada con iluminación ornamental mediante manguera lumínica de diferentes colores, instalada en los contornos de la figura. El sistema de iluminación fue fijado mediante amarras plásticas, conectores y adaptadores eléctricos adecuados para uso exterior.

Para su correcta instalación se suministró e instaló el soporte estructural correspondiente, así como los elementos de fijación en postes, puntos de conexionado eléctrico y demás accesorios necesarios, asegurando el adecuado anclaje, alineación, funcionamiento eléctrico continuo y cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad requeridas.

1.2.2. Diez campanas para poste o figuras para poste de 120X180. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

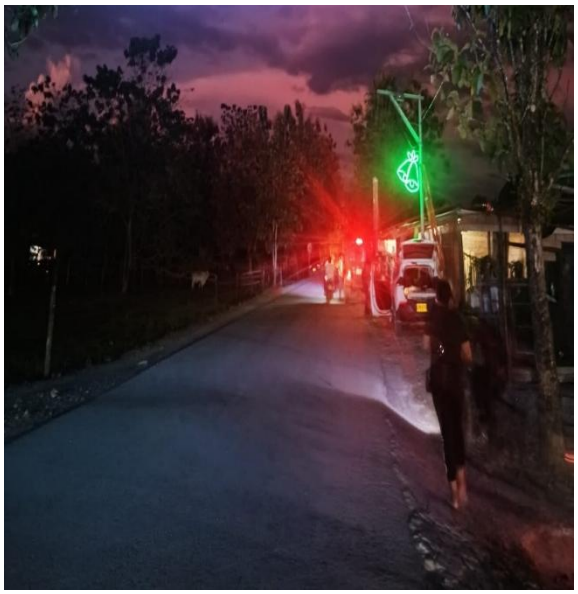


Se suministraron e instalaron diez (10) campanas decorativas para poste, con dimensiones aproximadas de 1,20 metros de ancho por 1,80 metros de alto, elaboradas en estructura de hierro y flejes unidos mediante soldadura, garantizando su resistencia y durabilidad para instalación en espacio público.

Las figuras fueron decoradas en colores alusivos a la temporada navideña, y complementadas con iluminación ornamental mediante manguera lumínica de diferentes colores, instalada en los contornos de cada figura. El sistema de iluminación fue asegurado mediante amarras plásticas, conectores y adaptadores eléctricos adecuados para uso exterior.

Para su correcta instalación, se suministraron e instalaron los soportes estructurales correspondientes, así como los elementos de fijación en postes, puntos de conexionado eléctrico y demás accesorios necesarios, garantizando el adecuado anclaje, estabilidad, correcto funcionamiento del sistema de iluminación y cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas.

1.2.3. Cinco Copos de nieve: Instalación de luces de diferentes referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad de 80 X 80 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



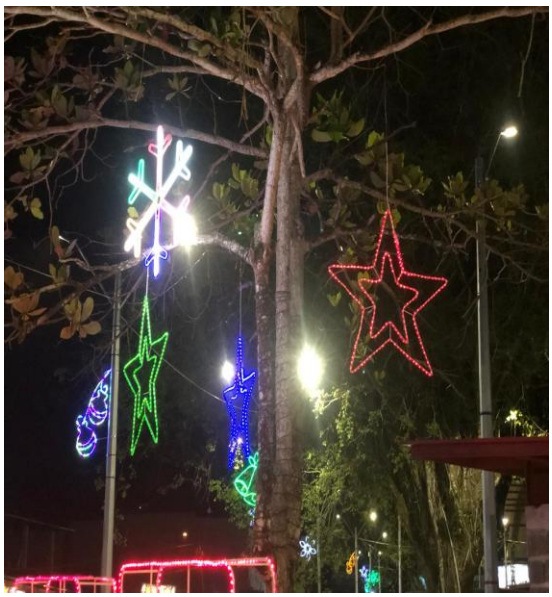

Se suministraron e instalaron cinco (5) figuras decorativas con forma de copos de nieve, con dimensiones aproximadas de 0,80 metros por 0,80 metros. Cada figura fue fabricada en estructura de hierro y flejes unidos mediante soldadura, asegurando resistencia y durabilidad para su exposición en espacio público.

Las figuras fueron decoradas en colores alusivos a la Navidad, y complementadas con iluminación ornamental mediante manguera lumínica de diferentes colores, instalada en los contornos de cada figura. Los elementos de iluminación fueron fijados mediante amarras plásticas, conectores y adaptadores eléctricos adecuados para uso exterior.

Para garantizar su correcta instalación, se suministraron e instalaron los soportes estructurales correspondientes, así como los elementos de fijación en postes, puntos de conexionado eléctrico y demás accesorios necesarios, asegurando estabilidad, correcto funcionamiento del sistema de iluminación y cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad requerida

1.2.4. Ocho Estrella fugaz: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 130 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



Se instalaron ocho (8) figuras decorativas con forma de estrella fugaz, con dimensiones aproximadas de 1,30 metros de largo por 0,60 metros de ancho, diseñadas para colocación en postes del espacio público. Cada figura fue construida con estructura metálica en hierro y flejes unidos mediante soldadura, garantizando estabilidad y resistencia a las condiciones climáticas.

Las estrellas fueron en colores vivos alusivos a la Navidad, y contaron con iluminación a lo largo de sus contornos mediante manguera lumínica de diversos colores. Los componentes eléctricos, incluyendo conectores, adaptadores y amarras plásticas, se aseguraron correctamente para evitar desplazamientos y fallas en la instalación.

Se instalaron los soportes estructurales y los elementos de fijación necesarios en postes y puntos de conexionado, asegurando la correcta sujeción de las figuras, su funcionalidad lumínica y el cumplimiento de los estándares de seguridad y normativas técnicas aplicables.

1.2.5. Ocho Bastón para poste: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 120 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



Se instalaron ocho (8) figuras con forma de bastón, diseñadas para colocación en postes del municipio, con dimensiones de 1,20 metros de alto por 0,60 metros de ancho. Cada figura fue fabricada con estructura metálica de hierro y flejes soldados, garantizando solidez y durabilidad.

Las figuras fueron decoradas en colores vivos alusivos a la Navidad, y sus contornos se iluminaron con manguera lumínica de diferentes colores. Todos los elementos eléctricos, incluyendo adaptadores, conectores y amarras plásticas, se fijaron correctamente para asegurar un funcionamiento seguro y estable.

Se instalaron los soportes estructurales y los elementos de fijación necesarios en los postes y puntos de conexión, asegurando que cada bastón permaneciera seguro, funcional y cumpliendo con los estándares técnicos de instalación y seguridad requeridos.

ITEM 1.3. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN LA ENTRADA POR BARRANQUILLITA, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

1.3.1. Diez campanas para poste o figuras para poste de 120X180. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.3.2. cinco Estrella fugaz: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 130 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con

soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.3.3. Ocho Bastón para poste: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 120 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 1.4. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN LA ENTRADA POR MUTATA, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

1.4.1. Un, Pasacalle feliz navidad de 7 X 1,50 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.4.2. Diez campanas para poste o figuras para poste de 120X180. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.4.3. Cinco Copos de nieve: Instalación de luces de diferentes referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad de 80 X 80 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.4.4. Ocho Estrella fugaz: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 130 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación



1.4.5. Ocho Bastón para poste: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 120 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 1.5. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN EL CORREGIMIENTO DE PLAYA ROJA, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

1.5.1. Un, Pasacalle feliz navidad de 7 X 1,50 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.5.2. Diez campanas para poste o figuras para poste de 120X180. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.53. Cinco Copos de nieve: Instalación de luces de diferentes referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad de 80 X 80 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.5.4. Ocho Estrella fugaz: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 130 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación



1.5.5 Ocho Bastón para poste: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 120 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de
fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 1.6. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN LA ENTRADA POR DE RIOSUCIO, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

1.6.1. Un, Pasacalle feliz Un, Pasacalle feliz navidad de 7 X 1,50 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.




1.6.2. Diez campanas para poste o figuras para poste de 120X180. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 1.7. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD TIPO PASACALLES, PENDONES, DECORACIÓN DE POSTES O FIGURAS DE PISO NUEVAS EN EL CORREGIMIENTO DE BLANQUICET, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

1.7.1. Un, Pasacalle feliz Un, Pasacalle feliz navidad de 7 X 1,50 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

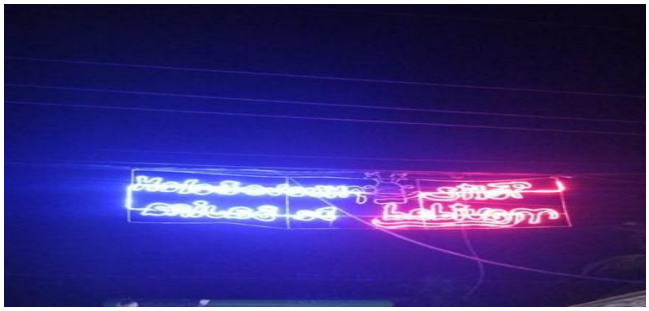

1.7.2. Diez campanas para poste o figuras para poste de 120X180. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.7.3. Cinco Copos de nieve: Instalación de luces de diferentes referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad de 80 X 80 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera

lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.7.4. Ocho Estrella fugaz: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 130 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



1.7.5. Ocho Bastón para poste: para poste e instalación de luces referencias y formas además de figuras alusivas a la navidad 120 X 60 Centímetros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la

navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 1.8. SUMINISTRO DE DECORACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES, PLATAFORMA EN FORMA DE TÚNEL DE LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

1.8.1. ÁRBOL NATURAL DECORADO CON LUCES Y FIGURAS APARIENCIA NIEVE. CON 8-10 CADENAS DE LUCES DE CASCADAS DE 6 METROS.



TÚNEL NAVIDEÑO: Túneles soportados en las estructuras de alumbrado público del espacio plataforma o puente central con guayas tensoras e instalaciones contactadas en serie de acuerdo con su capacidad eléctrica en cadena de mil luces por instalación, protegidas y conectadas con foto controles soportadas en guayas dando efecto de caída.

100 extensiones luz cálida, Con medidas 14 metros de largo por 6 metros de ancho por 4 metros de Altura, soportados en guayas con grilletes y correas plásticas blancas



ITEM 1.9. SUMINISTRO DE ARBOLES DE NAVIDAD, LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN ÁRBOL DE NAVIDAD DECORADO, hecho con hierro y flejes unidos con soldadura y pintados con anticorrosivo con dimensiones de 8 metros de altura por 6 metros de diámetro con luces cascada tipo exterior con decoraciones plásticas tipo guirnaldas que simulan vegetación y otras más alusivas a la navidad., el precio incluye traslado al municipio de Nuevo Belén de Bajirá, chocó desde el municipio de Montería, además de todo lo necesario para su decoración y conexionado, puesta en funcionamiento para su correcta instalación.



1.9.1 Cuatro estrellas para zonas verdes de 1 Metro. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de

diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Con medidas 14 metros de largo por 6 metros de ancho por 4 metros de Altura soportados en guayas con grilletes y correas plásticas blancas



ITEM 2. SUMINISTRO DE DECORACIÓN DE TÚNEL DE LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Túneles soportados en las estructuras de alumbrado público del espacio plataforma o puente central con guayas tensoras e instalaciones contactadas en serie de acuerdo con su capacidad eléctrica en cadena de mil luces por instalación, protegidas y conectadas con foto controles soportadas en guayas dando efecto de caída. 150 extensiones luz cálida



ITEM 2.1 SUMINISTRO DE RENOS, PLATAFORMA EN FORMA DE TÚNEL DE LUCES DESDE INICIO HASTA FINAL, DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE

BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Seis FIGURA RENO TRIDIMENSIONAL 1,5 X 2,0 METROS. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación



Trineo en color y estilos navideños decorado con luces de 2,50 X 1,30 X 1,20 Metros, Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



Regalo decorado de 2,50 X 2,50 Metros Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 2.2. SUMINISTRO DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Letras Feliz navidad 0,8 Metros X 7 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



ITEM 2.3 SUMINISTRO DE FIGURA AÑO 2026 DEL PARQUE PRINCIPAL DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Números y feliz año nuevo 2026 1 X 0,6 X 0,2 Metros. Figuras en hierro y flejes unidos con soldadura decoradas con Tela tipo Bombril o similares coloridas alusivas a la navidad, en diferentes tamaños y medidas y sus contornos decorados con manguera lumínica de diferentes colores sujetas con amarras plásticas conectores y adaptadores eléctricos además del soporte estructural, elementos de fijación en postes y puntos de conexionados y demás elementos necesarios para su correcta instalación



ITEM 2.4. SUMINISTRO DE DECORACIÓN DE CONTORNO DE LA CASETA CENTRAL DE DOS PISOS DEL PARQUE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Contorno de Kiosko principal del parque, instalación de luces de diferentes refiere Indicar materiales, si va forado o solo es el borde en luces de diferentes formas, además de figuras alusivas, 270 Metros cuadrados de luces. En tipo manguera en instalaciones con apariencia de cascada sujetadas con chazos y grapas y conectadas con todos los elementos necesarios para el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes, de acuerdo a los contornos perimetrales propios de la construcción civil, siguiendo la forma y el diseño.



ITEM 2.5. MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ

Realizado por personal artesano propio del municipio con experiencia en manualidades, pertenecientes a las comunicades y negritudes que se encuentren organizadas y conformadas en el territorio, así como el acompañamiento profesional de diseñadores con experiencia en decoraciones navideñas y de alumbrado público. Así como electricistas certificados con licencia profesional vigente para realizar trabajos como chequeos, pruebas y conexionados eléctricos varios.



ITEM 2.6. MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MONTAJE Y CONEXIONES ADEMÁS DE LAS DESCONEXIONES, EL EMBALAJE Y EL ALMACENAMIENTO DE LAS FIGURAS Y DECORACIONES NAVIDEÑAS del MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ

Se ejecuto en compañía permanente de un ingeniero electricista con experiencia en montajes y alumbrado público, con personal calificado para trabajos en alturas cumpliendo la reglamentación vigente, así como las respectivas matriculas profesionales para trabajos en postes



ITEM 2.7. TRANSPORTE DE FIGURAS DESDE EL CASCO URBANO Y HACIA LA ZONA RURAL REQUERIDA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ, ADEMÁS DE FIGURAS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO



Se transporta hacia las zonas rurales en vehículos reconocidos en la zona para el ingreso.

11. ACTA DE AVANCE Nº 1

Ver Documento anexo (Acta de Avance)

12. MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


La obra cuenta con Personal administrativo, operario, materiales y equipos para el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

La supervisión realiza constante seguimiento y verificación a todas las actividades adelantadas.
Durante la ejecución del proyecto no se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- El aforo de la carga consumida de las figuras durante el tiempo de conexión fue conciliado con EPM en visita conjunta en los diferentes sectores del municipio.
- El desmonte se inicia en la ultima semana de la ejecución del contrato.

- El contratista manifiesta que a la fecha del presente informe las obras se ejecutaron de acuerdo con las condiciones técnicas acordadas y especificaciones pactadas por el contratante, por un valor total de $ 308.724.879.00



VICTOR LIZARAZO ARGEL
C.C. 1.098.679.836
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROSISTEMAS INGENIERÍA J.M. S.A.S
NIT. 901.379.850-1
