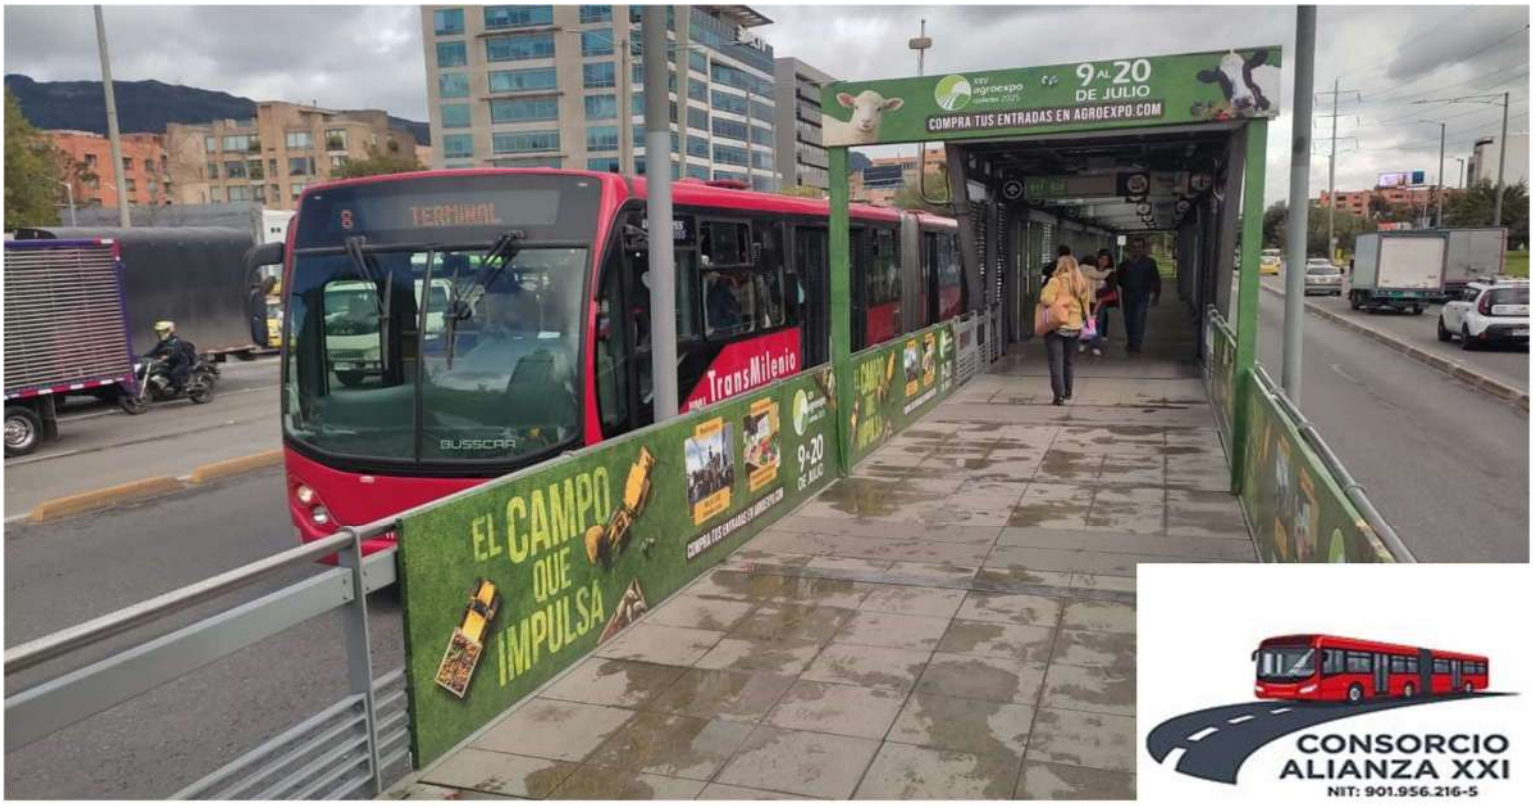


Informe Mensual de Interventoría No. 1

Contrato No.1369-25

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

Periodo 21 de Julio 2025 al 20 Agosto 2025 **Bogotá D.C. – AGOSTO 2025**

Informe Mensual de Interventoría No. 1



Contrato No. CTO1369-25

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

Periodo 21 de Julio 2025 al 20 Agosto 2025

Versión 1.0

Bogotá D.C. - Agosto de 2025

Elaboro:	**Sebastián Betancourth. Mitchel Rojas. Rodrigo Bustos. John Moreno.**	**Revis o:**	**Eduardo Andrés Acero Cajigas.**	**Aprobó:**	**Eduardo Andrés Acero Cajigas.**
Fecha:	*20/08/2025*	*Fecha:*	*20/08/2025*	*Fecha:*	*20/08/2025*
Firma:		*Firma:*		*Firma:*	
Cargo:	*Residente*	*Cargo:*	*Director de proyecto*	*Cargo:*	*Director de proyecto*

Contenido

INTRODUCCIÓN 6
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 12
PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS: 18
ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 23
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN 23
INFORMACIÓN LOTE 1 23
INFORMACIÓN LOTE 2 24
SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES 25
LOTE 1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 25
GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 26
SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES LOTE 2 27
GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28
RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO DEL CONTRATISTA 29
PERSONAL MINIMO LOTE 1 29
PERSONAL MINIMO LOTE 2 30
RELACION DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA 31
RELACION DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA 31
INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 1 31
INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 2 31
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
OBLIGACIONES GENERALES 32
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 32
SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES 33

RELACIÓN DEL PÉRSONAL DE INTERVENTORÍA 36
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERÍODO 37
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 43
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 45
INFORME PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 46
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 1 47
TRONCAL NORTE B 48
TRONCAL NQS SUR G 48
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 2 49
TRONCAL CALL 80 50
TRONCAL NQS CENTRAL 51
INFORME PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 53
COMPONENTE DE CALIDAD 54
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DURANTE EL PERIODO 54

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Listado de estaciones asignadas a Lote 1 10
Tabla 2 Listado de estaciones asignadas a Lote 2 11
Tabla 3 Listado de actividades comprendidas en el contrato 13
Tabla 4 Información General del Contrato de Adecuación Lote 1 23
Tabla 5 Información General del Contrato de Adecuación Lote 2 24
Tabla 6 Relación Póliza Cumplimiento CTO1380-25 25
Tabla 7 Resumen Póliza CTO1380-25 26
Tabla 8 Relación Póliza Cumplimiento CT0 1381-25 27
Tabla 9 Resumen Póliza RCE CTO 1381-25 28
Tabla 10 Personal mínimo lote 1 29
Tabla 11Personal mínimo lote 1 30
Tabla 12 Información general de interventoría 33
Tabla 13 Seguimiento a Garantías CTO 1369-25 34
Tabla 14 Personal Interventoría 36
Tabla 15 Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 1. 38
Tabla 16 Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 2. 39

Tabla 17 Relación de actividades Lote 1 40
Tabla 18 Relación de actividades Lote 2 41
Tabla 19 Estado ordenes de trabajo Lote 1 42
Tabla 20 Porcentaje de atraso, ordenes de trabajo Lote 1 43
Tabla 21 Estado ordenes de trabajo Lote 2 43
Tabla 22 Resumen Programado Vs Ejecutado 46
Tabla 23 Ejecución presupuestal del Lote 1 47
Tabla 24 Ejecución presupuestal del troncal norte B. 48
Tabla 25 Ejecución presupuestal detallada lote 2 49
Tabla 26 Ejecución presupuestal detallada, troncal 80. 51
Tabla 27 Ejecución presupuestal detallada, troncal NQS. 52

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Mapa del Sistema de Transporte Masivo 9
Ilustración 2 Póliza de responsabilidad civil extracontractual 26
Ilustración 3 Póliza Cumplimiento del contrato 28
Ilustración 4 Póliza de cumplimiento de obligaciones, salarios y prestaciones sociales. calidad del servicio 35
Ilustración 5 Actividades realizadas 38
Ilustración 6 Gráfico de distribución del estado de las órdenes de trabajo LOTE 1. 42
Ilustración 7 Gráfico de distribución del estado de las órdenes de trabajo LOTE 2. 44
Ilustración 8 Estado de OTS generadas por periodo Lote 1 periodo del 21 de julio del 2025 al 20 de agosto del 2025 45
Ilustración 9 Suma total programado y suma total ejecutado 46
Ilustración 10 Ejecución presupuestal programado vs realizado. 47
Ilustración 11 Suma valor total AU troncal Norte B 48
Ilustración 12 Suma valor total AU troncal NQS SUR G 49
Ilustración 13 ejecución presupuestal detallada lote 2 50
Ilustración 14 Suma valor total AU,troncal cll 80 51
Ilustración 15 Suma valor total AU troncal NQS 52
Ilustración 16 Evidencia fotográfica de las pruebas realizadas en campo Lote 1 54
Ilustración 17 Evidencia fotográfica de las pruebas realizadas en campo Lote 2 55

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los habitantes de la capital y usuarios del sistema de transporte masivo TRANSMILENIO y su administración a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. han evidenciado que la evasión del pasaje afecta significativamente la seguridad de los usuarios del sistema y la calidad del servicio. Este problema ha ido en aumento, deteriorando la calidad del servicio ya que las frecuencias de operación se programan en base a la demanda. Sin embargo, al no tener información precisa sobre el número de evasores en el sistema, la demanda utilizada para planificar la operación del sistema es limitada. Además, este fenómeno de evasión ha tenido un impacto negativo significativo en la infraestructura del sistema, ya que hay recursos en actividades correctivas por actos de vandalismo y uso indebido de la infraestructura, lo que reduce el presupuesto disponible para actividades para mantenerla y mejorar su calidad.

Según lo anterior y enfocándose en fortalecer la infraestructura y considerando las responsabilidades de la Dirección de Infraestructura y de TRANSMILENIO S.A., se ha reconocido que ciertas actividades de adaptación en la infraestructura ayudarían a reducir la evasión en el Sistema. Aunque estas actividades pueden no ser esenciales para la prestación del servicio de transporte, desde la perspectiva de la seguridad de los usuarios y de los diversos actores involucrados en el Sistema, de la cultura ciudadana, y de la prevención y mitigación de la evasión, sí complementan y fortalecen la infraestructura existente y son necesarias para la mejora continua del servicio de transporte de manera integral.

Por lo mencionado, la entidad adelantó el proceso de licitación pública TMSA- LP-02-2025 con el objeto de “Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.” proceso mediante el cual fueron seleccionados dos contratistas para la ejecución de las actividades de adecuación mediante el acto de adjudicación con la resolución 533 del 20 de octubre de 2023 identificados como CONSORCIO MYE BOGOTA y UNION TEMPORAL SANDIEGO para el desarrollo de los contratos producto del proceso en LOTE 1 y LOTE 2 respectivamente.

Paralelamente y en cumplimiento a la normatividad colombiana se desarrolló el concurso de méritos TMSA-CM-01-2025 con el objeto de “Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y

financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A." para el cual como adjudicatario se designó a CONSORCIO ALIANZA XXI.

Como parte de los productos de los procesos mencionados anteriormente el interventor CONSORCIO ALIANZA XXI remite el presente informe donde se presenta el control realizado en los aspectos generales constructivos, técnicos, administrativos, operativos y financieros para el periodo comprendido entre el 21 de JULIO de 2025 y 20 de AGOSTO de 2024 incluyendo las observaciones y recomendaciones que ayuden a la correcta ejecución y terminación del proyecto.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Empresa De Transporte Masivo Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A en el ejercicio de sus funciones y específicamente de la administración de la infraestructura específica y exclusiva del Sistema Transmilenio, tiene como alcance llevar a cabo las actividades de adecuación y/o construcción de obras complementarias ordenadas sobre la infraestructura del componente BRT del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Bogotá D.C. y sus áreas de influencia que se encuentre a cargo de TRANSMILENIO S.A., en los tiempos de ejecución definidos por el Interventor y la Entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en este Anexo Técnico, así como en los demás anexos del proceso. Estas actividades se realizarán incluyendo el suministro de la mano de obra, insumos, equipos, herramientas, transporte y demás necesarios para cada labor en los Lotes establecidos más adelante (dos lotes). Cada Contratista deberá cumplir con todas y cada una de las características, actividades, condiciones y obligaciones técnicas del Anexo Técnico, Estudio Previo y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso, así mismo tener en cuenta la descripción técnica del proceso constructivo y de ejecución de cada actividad y su detalle, lo cual se ha compilado en el documento denominado "Fichas de actividades", anexo a los documentos del proceso. Para cada actividad a ejecutar en el Contrato se desarrolló la Ficha de Actividades que describe las especificaciones técnicas y condiciones generales y específicas, el alcance, el proceso para su ejecución, las condiciones para el recibo, la unidad de media, la forma de pago, los elementos incluidos para pago, esquemas, entre otros. Adicionalmente, la Entidad ha elaborado el Listado de Actividades, el cual contiene el código y nombre de la actividad, la unidad de medida y los valores unitarios de cada actividad. El Listado de Actividades y las Fichas de Actividades se presentan en los Anexos #3 y #4 que hacen parte del

presente proceso. Para efectos de calidad se deberán cumplir todas las normas técnicas vigentes en el país y aplicables al objeto y actividades propias de los Contratos, lo cual será revisado por parte del Interventor. En el contexto y alcance de los Contratos que se pretenden suscribir como resultado del presente proceso de selección, la adecuación y/o construcción de la infraestructura corresponderá a la ejecución de actividades y obras de mayor magnitud (proyectos de mayor envergadura, actividades sobre elementos y/o fachadas completas, entre otros) o actividades de mejora estética y/o funcional, que se consideran diferentes a las actividades sobre esos mismos elementos que se realizan en menor escala bajo los contratos de mantenimiento de la infraestructura del Sistema.

Si bien algunas actividades del presente proceso son similares a actividades que se ejecutan en los contratos de mantenimiento, la Entidad determinará bajo cuál contrato es viable ejecutar cada actividad según las necesidades identificadas y los lineamientos y procedimientos establecidos más adelante. Los requisitos de las actividades a realizar, así como las especificaciones de carácter técnico para el desarrollo del Contrato se encuentran en este Anexo Técnico General y demás anexos del proceso de selección, así:

1. Anexo # 1 Ambiental. Incluye formato R-OP-019 Reporte Información PIGA.
2. Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Anexo # 3 Listado de Actividades.
4. Anexo # 4 Fichas de Actividades. 5. Anexo Técnico General.
6. Estudio Previo.
7. Y demás documentos que hicieron parte integral del proceso de selección

Dentro de la línea fortalecimiento de la infraestructura, la empresa TRANSMILENIO S.A. mediante el proceso de selección No TMSA- LP-02-2025 designó dos contratistas para la intervención de las estaciones y portales del sistema Transmilenio mediante los contratos de obra CTO1380-25 y CTO1381-25 para LOTE 1 y LOTE 2 respectivamente. Contratos mediante los cuales se suministrarán e instalarán elementos en la infraestructura del sistema que permitirán mitigar el fenómeno de evasión en el mismo.

Como complemento a los contratos de obra y mediante el contrato TMSA-CM-01-2025 correspondiente a la interventoría se realizará seguimiento integral a fin de garantizar la correcta ejecución y puesta en marcha de las actividades objeto de los contratos de adecuación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos principales se realizará a la infraestructura del componente BRT del Sistema Transmilenio que se encuentre a cargo de TRANSMILENIO S.A., Dividida en (2) Lotes.

A continuación, se presenta el plano general del proyecto, lo mismo que la distribución Lotes de la siguiente forma:



Ilustración 1Mapa del Sistema de Transporte Masivo.

Fuente: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/150402/publicacionesmapa-interactivo-de-transmilenio/

Tabla 1. Listado de estaciones asignadas a Lote 1

LOTE 1 (10 estaciones)		
CALLE 26	ESTACION CORFERIAS	CERRAMIENTO TIPO ONDA
CALLE 26	CIUDAD UNIVERSITARIA	CERRAMIENTO TIPO ONDA
AUTO NORTE	CALLE 106	REALCE ZONA TRANSICION
AUTO NORTE	CALLE 142	REALCE ZONA TRANSICION
AUTO NORTE	CALLE 146	REALCE ZONA TRANSICION / MODULACION VAGON
AUTO NORTE	MAZUREN	REALCE ZONA TRANSICION / MODULACION VAGON
AUTO NORTE	CALLE 161	REALCE ZONA TRANSICION / MODULACION VAGON
AUTO NORTE	TOBERIN	REALCE ZONA TRANSICION
AUTO SUR	PERDOMO	REALCE ZONA TRANSICION
AUTO SUR	COMUNEROS	REALCE ZONA TRANSICION

Tabla 2 Listado de estaciones asignadas a Lote 2

LOTE 2 (12 estaciones)		
NQS CENTRAL	LA CASTELLANA	REALCE ZONA TRANSICION / MODULACION VAGON
NQS CENTRAL	MOVISTAR ARENA	CERRAMIENTO TIPO ONDA
NQS CENTRAL	CAMPIN	CERRAMIENTO TIPO ONDA
CALLE 80	CARRERA 90	CERRAMIENTO TIPO ONDA
CALLE 80	AV. CALI	CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES
CALLE 80	BOYACA	CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES
CALLE 80	CARRERA 90	CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES
NQS CENTRAL	AV. CHILE	REALCE ZONA TRANSICION
NQS CENTRAL	MOVISTAR	REALCE ZONA TRANSICION
NQS CENTRAL	NQS CALLE 75	REALCE ZONA TRANSICION
NQS CENTRAL	PALOQUEMAO	REALCE ZONA TRANSICION

Los trabajos se ejecutarán en todas las estaciones asignadas a cada Lote, según la necesidad de la Entidad.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

- La ejecución de las actividades del contrato de adecuación, que se requieren en la infraestructura del sistema, se basa en los siguientes lineamientos:

- **Aspectos generales:** Las actividades de adecuación y construcción que desarrollen los Contratistas serán las definidas y ordenadas por TRANSMILENIO S.A. a través de la Interventoría, según las Fichas de Actividades anexas a los documentos del proceso, siempre procurando mantener, adecuar y mejorar la infraestructura del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público Transmilenio en condiciones adecuadas para la prestación del servicio. Todos los trabajos y las actividades desarrolladas para la ejecución de los Contratos serán supervisadas, aprobadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría. TRANSMILENIO S.A. solicitará a las partes lo que considere necesario y prestará atención continua al desarrollo de los Contratos y la atención y diligencia a las solicitudes realizadas.

  Los Contratistas deben asegurar que se atiendan los requerimientos en los tiempos requeridos por la Entidad y el Interventor. En todo caso, los Contratistas se obligan a realizar todas las gestiones, incluyendo el suministro de equipo, personal e infraestructura adecuada, así como de tramitar los permisos y autorizaciones requeridos para la adecuada ejecución de las actividades, para cumplir a cabalidad el objeto del Contrato. En general, los Contratistas deben ajustarse a las condiciones solicitadas para este proceso, con el fin de garantizar la calidad de los elementos, insumos, personal y de los servicios requeridos, así:

  • Garantizar equipos en óptimas condiciones para la prestación de los servicios a satisfacer.

  • Que el personal que se encargue de la ejecución de los trabajos esté debidamente capacitado, dotado de uniformes adecuados para la labor a desempeñar e identificado.

Tabla 3 Listado de actividades comprendidas en el contrato

ÍTEM	GRUPO	ACTIVIDAD	LINEAMIENTOS/VIABILIDAD EJECUCIÓN
MET-01	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA	Adecuación, suministro e instalación de celosía metálica para remplazo de vidrios fijos, incluye nombre de estación	Como mínimo la Orden de Trabajo a ejecutar mediante el presente contrato debe ser por la fachada completa de un vagón. Cantidades menores se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-02	METÁLICAS	Suministro e instalación de celosía metálica en vanos de zona de transición en estaciones	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser como mínimo para una transición completa. Cantidades menores se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-03	CERRAMIENTOS	Adecuación, suministro e instalación de cerramiento en onda con tubo 2,5", de altura 1,50m-1,85m (1,20m*1,55m libre)	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por cantidades iguales o superiores a 100ml, bien sea para extensión del cerramiento existente o nuevo. Cantidades menores a 100ml se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-04	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE	Adecuación, suministro e instalación de puertas sencillas y/o dobles abatibles en celosía metálica con pasador	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe tener como mínimo cuatro (4) puertas en un vagón completo. Cantidades menores, reparaciones o remplazos se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.

	CARPINTERÍA METÁLICA		
MET-05	METÁLICAS	Suministro e instalación de celosía en cerramiento para división operativa de plataformas de portales	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por cantidades iguales o superiores a 50 m^2. Cantidades menores a 50 m^2 se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-06	METÁLICAS	Suministro e instalación de lámina microperforada en cerramiento para división operativa de plataformas de portales	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por una plataforma completa (Troncal o Alimentadora). Cantidades menores se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-07	METÁLICAS	Reemplazo y desmonte de fachada en vidrio por estructura soporte con lámina corte láser para superficies de portal o estación	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por una cantidad igual o superior a 50m^2. Cantidades menores a 50 m^2 se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-08	METÁLICAS	Cambio de modulación de vagón articulado a biarticulado en un vagón sencillo, incluye estructura de	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por una cantidad igual o superior a 50m^2.

ÍTEM	GRUPO	ACTIVIDAD	LINEAMIENTOS/VIABILIDAD EJECUCIÓN
MET-09	METÁLICAS	Cambio de piso en rampa y/o puente peatonal interno	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por una cantidad igual o superior a 30m^2. Cantidades menores a 30 m^2 se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
MET-10	METÁLICAS	Suministro e instalación de estructura metálica para realce de cubierta en estaciones	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser por un vagón completo. Cantidades menores se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
SEÑ-01	SEÑALIZACIÓN	Adecuación, ensamble y montaje de vallas para nueva señalética e información al usuario sobre vinilo adhesivo impreso, laminado mate en base APC entre 3mm y 4mm	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser como mínimo para la señalización total de un vagón. Cantidades menores o reparaciones o cambios en señalización menores a un vagón se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
SEÑ-02	SEÑALIZACIÓN	Adecuación, ensamble y montaje de ruteros sobre vinilo adhesivo impreso, laminado mate sobre PS cal. 80	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser como mínimo para la señalización total de un vagón. Cantidades menores o reparaciones o cambios en señalización menores a un vagón se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.

SEÑ-03	SEÑALIZACIÓN	Adecuación, ensamble y montaje de vallas para nueva señalética de emergencia sobre vinilo fotoluminiscente de 5 horas sobre APC entre 3mm y 4mm	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser como mínimo para la señalización total de un vagón. Cantidades menores o reparaciones o cambios en señalización menores a un vagón se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
SEÑ-04	SEÑALIZACIÓN	Suministro e instalación de estructuras para vallas de señalética e información al usuario	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser para una plataforma completa (Troncal o Alimentadora). Cantidades menores se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.

ÍTEM	GRUPO	ACTIVIDAD	LINEAMIENTOS/VIABILIDAD EJECUCIÓN
SEÑ-05	SEÑALIZACIÓN	Suministro de estructura descolgada para vallas en portal	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser para una plataforma completa (Troncal o Alimentadora). Cantidades menores a 20 ml se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
OBC-01	CUBIERTAS	Desmonte, suministro e instalación de cubiertas en portales	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser para una plataforma completa. Cantidades menores a 100m^2 se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
OBC-02	CUBIERTAS	Desmonte, suministro e instalación de cubierta en estaciones	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser para un vagón completo. Cantidades menores a 20m^2 se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
OBC-03	CUBIERTAS	Desmonte, suministro e instalación de cubierta en estaciones con lucernarios	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser para un vagón completo. Cantidades menores a 20m^2 se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.
OBC-04	CERRAMIENTOS	Suministro e instalación de cerramiento perimetral tipo portal	La Orden de Trabajo por ejecutar mediante el presente contrato debe ser para un portal con cantidad igual o superior a 100ml. Cantidades menores a 100ml se realizarán mediante los contratos de mantenimiento.

Todas las actividades que se ejecuten dentro del contrato serán inspeccionadas, aprobadas y reportadas ante la Entidad, esto con el fin de brindar información específica acerca de cada una de estas labores, que serán objeto de pago. Es de esta manera, que la interventoría está dada a supervisar al contratista para que en la ejecución de cada actividad se cumplan los requerimientos específicos, los cuales están determinados por los anexos de las condiciones del pliego (ambiental, seguridad y salud en el trabajo, catalogó de actividades, técnico, estudios previos, estructura económica y demás que están consignados en la propuesta), que tiene como fin garantizar la calidad de los elementos, insumos, personal y equipo idóneo, que en general con lleva al desempeño óptimo de las labores.

PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Previo al inicio de trabajos de cualquier índole, el Contratista gestionará el ingreso al Sistema, dispondrá de los recursos necesarios y adecuará la zona, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para cada actividad en la Ficha correspondiente, así como a las siguientes obligaciones mínimas:

- Solicitar a TRANSMILENIO S.A. la autorización expresa para el ingreso a la troncal, al Sistema y/o la estación/portal/patio donde requiera realizar actividades.
- Contar con Orden de Trabajo debidamente autorizada.
- Localizar la zona de trabajo, revisar las actividades a realizar, normas técnicas, especificaciones y procedimientos aplicables.
- Disponer de recurso humano idóneo y suficiente; insumos, herramientas y equipos necesarios en perfecto estado.
- Tener disponibles y utilizar únicamente materiales que el Interventor haya verificado y que cumplan con las condiciones de calidad y normativa vigentes en el país.
- Señalizar la zona de trabajo conforme al Manual de Señalización aprobado.
- Utilizar todos los elementos de Seguridad Industrial, acordes con las actividades a ejecutar, según lo requerido en el Anexo Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo del proceso.
- Verificar el cumplimiento de normas colombianas vigentes para trabajo en altura o ambientes confinados, cuando sea aplicable por el tipo de trabajo.
- Cumplir las exigencias ambientales según la normativa aplicable y el Anexo Ambiental del proceso.
- Realizar y entregar al Interventor el inventario de todos los elementos que le sean entregados o que sean retirados de la infraestructura del Sistema que tengan un valor comercial para su entrega final en Patio de la Hoja o en el lugar indicado por TRANSMILENIO S.A. El Inventario

deberá entregarse en cada informe mensual, debe coincidir con lo suministrado al Contratista y debe ser revisado y avalado por el Interventor.

- **Análisis de precios unitarios:** El análisis de los precios unitarios de cada uno de los ítems expuestos en el formato de oferta económica, correspondientes a las actividades deberán tener en cuenta todos los valores, costos y precios, que estarán expresados en el proceso de selección No TMSA- LP-02-2025 esto con el fin de evidenciar que dichos precios coincidan con la oferta económica utilizada en la evaluación de las propuestas. De llegar a presentarse alguna discordancia, esta deberá ser ajustada por parte del contratista, de tal manera que concuerde el precio unitario con la oferta presentada.

  Para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista es quien debe contemplar todo lo necesario para la óptima ejecución de la actividad, en la cual se debe respetar y cumplir con las respectivas especificaciones técnicas contractuales y detalles de construcción; tales como son el equipo idóneo, los materiales adecuados y de calidad, el transporte y la disposición final, y la mano de obra. En caso de error u omisión en los costos de los análisis de precios unitarios, es importante anotar que es directamente responsabilidad del contratista, por lo que este no podrá reclamar a la entidad ningún adicional en el valor de los precios unitarios entregados dentro de la propuesta económica.

- **Expedición de órdenes de trabajo:** Es la interventoría del contrato quien genera las órdenes de trabajo, lo cual permite que el contratista por su parte pueda iniciar la ejecución de estas, siempre teniendo presente los tiempos. Por esta razón y acorde al artículo 32 de la ley 80 de 1993, la interventoría tiene la obligación de socializar de manera escrita las órdenes de trabajo generadas, así mismo como la información adicional. Para ello, es importante que entre la interventoría y el contratista se establezca un medio físico que permita informar por medio escrito sobre estas órdenes de trabajo.

  Es importante mencionar, que únicamente se ejecutaran y pagaran actividades que estén dentro de los ítems establecidos en el contrato. Adicionalmente, se fija que ninguna actividad que haya sido ejecutada sin previa orden, podrá ser incluida en actas de costos de pago.

  De esta manera, se establece que únicamente, las ordenes que sean cerradas por el interventor, que se encuentren con recibido a satisfacción serán las que se incluyan en el acta mensual de obra, para que estas sean pagadas. Por esto, se encuentra prohibido el pago de actividades que no hayan sido culminadas, ni cerradas.

La interventoría podrá asignar órdenes de trabajo al mismo tiempo, ya sea para una actividad o varias. Sin embargo, el contratista debe tener claro el cumplimiento con los tiempos estimados, los cuales están determinados de forma independiente para cada orden. Por ello, es importante que el contratista y la interventoría establezcan el uso de un software ofimático comercial, esto con el fin de llevar el control de órdenes de trabajo generadas en el contrato.

- **Horario de trabajos:** Por tratarse de labores en un sistema de transporte masivo de pasajeros, un alto porcentaje de las actividades a realizar se deberán ejecutar en horario nocturno, una vez cierre la operación el Sistema, es decir, entre las 11:00 pm (once de la noche) de un día y las 4:00 a.m. (cuatro de la mañana) del día siguiente, siempre atendiendo las indicaciones de horarios y turnos de trabajo establecidos por la administración distrital y nacional. En el eventual caso que se requiera la intervención de la infraestructura vial o vial peatonal no exclusiva del Sistema, será necesario que los Contratistas cumplan con lo establecido en el artículo 101 del Código Nacional de Tránsito Terrestre – Ley 769 de 2022. Las actividades de adecuación y/o construcción en zonas que no afecten la circulación de los usuarios y/o la normal prestación de los servicios, podrán programarse en horario diurno, previa y expresa autorización de TRANSMILENIO S.A. TRANSMILENIO S.A. podrá autorizar a su discreción la ejecución de ciertas actividades en hora valle de operación del Sistema de Transporte Masivo. TRANSMILENIO S.A., en la medida de lo posible y acorde a la disponibilidad, facilitará el ingreso al Sistema para la ejecución y seguimiento de las actividades en horas de operación al personal puesto al servicio del Contrato, para lo cual entregará al Contratista tarjetas funcionario para uso única y exclusivamente de la ejecución puntual de actividades del contrato, NO para ser utilizada por el personal como medio de pago del pasaje, ni tampoco para ser utilizada en el sistema zonal y/o cualquier otro sistema diferente al componente troncal del Sistema. Adicionalmente, su utilización debe estar ajustada al protocolo de usos vigente establecido por la Entidad; cada Contratista deberá realizar un estricto control y seguimiento a la correcta utilización de estas de acuerdo con las actividades programadas, para lo cual mensualmente cada Contratista entregará a la Entidad un informe de uso detallado por tarjeta. Los siguientes requisitos para la entrega y preservación de las tarjetas son adicionales a los establecidos en el protocolo de uso:
  • Remitir a la Entidad el listado de funcionarios (Nombre y número de Cedula) a quienes les serán asignadas las tarjetas.
  • Remisión mensual a la Entidad de un informe ordenado y detallado por tarjeta respecto a la utilización diaria acorde a las actividades programadas; este informe deberá ser verificado y avalado por el respectivo Residente del Contratista.
  • Los pasos realizados no justificados, acorde al protocolo de uso deberán ser cancelados de acuerdo con lo allí establecido antes de la presentación del siguiente informe.

- **Transmilenio s.a**. podrá solicitar la devolución y/o retiro de las tarjetas por mal uso y/o incumplimiento de lo acá estipulado y/o incumplimiento de los protocolos establecidos por la Entidad; situación que deberá ser asumida y prevista por el Contratista, sin que por ello se vea afectado el cumplimiento en la ejecución de actividades

- **Trabajo bajo condiciones ambientales restringidas:** Por razones técnicas, en especial por requerimientos de temperatura, punto de rocío y humedad relativa, entre otras, pero sin limitarse a ellas, el Contratista podrá solicitar a TRANSMILENIO S.A. autorización para el cierre parcial o total de vagones, plataformas y/o estaciones; igualmente podrá solicitar el cierre en determinadas zonas del Sistema.

- **Preparación de los trabajos:** Previo al inicio de trabajos de cualquier índole, el Contratista gestionará el ingreso al Sistema, dispondrá de los recursos necesarios y adecuará la zona, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para cada actividad en la Ficha correspondiente, así como a las siguientes obligaciones mínimas:

  a. Solicitar a TRANSMILENIO S.A. la autorización expresa para el ingreso a la troncal, al Sistema y/o la estación/portal/patio donde requiera realizar actividades.
  b. Contar con Orden de Trabajo debidamente autorizada.
  c. Localizar la zona de trabajo, revisar las actividades a realizar, normas técnicas, especificaciones y procedimientos aplicables.
  d. Disponer de recurso humano idóneo y suficiente; insumos, herramientas y equipos necesarios en perfecto estado.
  e. Tener disponibles y utilizar únicamente materiales que el Interventor haya verificado y que cumplan con las condiciones de calidad y normativa vigentes en el país.
  f. Señalizar la zona de trabajo conforme al Manual de Señalización aprobado.
  g. Utilizar todos los elementos de Seguridad Industrial, acordes con las actividades a ejecutar, según lo requerido en el Anexo Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo del proceso.
  h. Verificar el cumplimiento de normas colombianas vigentes para trabajo en altura o ambientes confinados, cuando sea aplicable por el tipo de trabajo.
  i. Cumplir las exigencias ambientales según la normativa aplicable y el Anexo Ambiental del proceso.

     Realizar y entregar al Interventor el inventario de todos los elementos que le sean entregados o que sean retirados de la infraestructura del Sistema que tengan un valor comercial para su entrega final en Patio de la Hoja o en el lugar indicado por TRANSMILENIO S.A. El Inventario deberá entregarse en cada informe mensual, debe coincidir con lo suministrado al Contratista y debe ser revisado y avalado por el Interventor.

- **<u>Actualización de precios unitarios:</u>** En caso de presentarse alguna prórroga en el Contrato se aplicará el siguiente procedimiento para la actualización de precios unitarios a partir del mes 11 de ejecución: En el mes 10 de ejecución, el Contratista y la Interventoría actualizarán la totalidad de precios de las actividades mediante el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles ICOCIV generado por el DANE, según la siguiente formula:

$$R = P * [\left(\frac{I}{IO}\right) - 1]$$

R: Valor a ajustar sobre el costo directo del Acta Mensual.
P: Valor costo directo del Acta Mensual de Cálculo.
I: Valor del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al mes en el que se actualiza la base de datos.
Io: Valor del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al mes de la fecha de suscripción del Contrato.

Esta actualización entrará en vigor a partir del mes 11 de ejecución y se aplicará al Acta de ese mes. El pago del ajuste por cambio de vigencia se realizará sobre los valores unitarios de los ítems ejecutados y facturadas a partir del mes 11 de ejecución.

El Listado de Actividades con los precios actualizados será radicado por el Interventor en TRANSMILENIO S.A. a más tardar el último día hábil del mes 10 de ejecución y, en todo caso, operará con este a partir del día 1 del mes 11 de ejecución.

ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN

INFORMACIÓN LOTE 1

Tabla 4 Información General del Contrato de Adecuación Lote 1

Entidad contratante:	TRANSMILENIO S. A
Contratista:	CONSORCIO MYE BOGOTÁ
Contrato:	CTO1380-25 Lote 1
Objeto:	Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.
Valor inicial del contrato	$ 13.750.000.000
Valor total del contrato	$ 13.750.000.000
Plazo de ejecución inicial	10 meses
Fecha de inicio	21 de julio de 2025
Fecha de terminación actualizada	20 de mayo de 2026

INFORMACIÓN LOTE 2

Tabla 5 Información General del Contrato de Adecuación Lote 2

Entidad contratante:	TRANSMILENIO S. A
Contratista:	CONSORCIO UNION TEMPORAL SAN DIEGO
Contrato:	CTO1381-25 Lote 2
Objeto:	Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.
Valor inicial del contrato	$ 13.750.000.000
Valor total del contrato	$ 13.750.000.000
Plazo de ejecución inicial	10 meses
Fecha de inicio	21 de julio de 2025
Fecha de terminación actualizada	20 de mayo de 2026

SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

LOTE 1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 6 Relación Póliza Cumplimiento CTO1380-25

CONTRATO	CTO1380-25
VALOR	$ 13.750.000.000
ANTICIPO	$
PLAZO	10 meses
FECHA INICIO	24/06/2025
FECHA TERMINACION	21/05/2031
No POLIZA CUMPLIMIENTO	BCH-100044568
ANEXO	1

AMAPRO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento de las obligaciones del contrato	BCH-100044568	1	24/06/2025	21/05/2031	$ 4.125.000.000	29/07/2025
Salarios y prestaciones sociales	BCH-100044568	1	24/06/2025	21/05/2031	$ 1.375.000.000	29/07/2025
Estabilidad y calidad de la obra	BCH-100044568	1	24/06/2025	21/05/2031	$ 4.125.000.000	29/07/2025

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tabla 7 Resumen Póliza CTO1380-25

CONTRATO	CTO 1380-25
VALOR	$ 13.750.000.000
ANTICIPO	$ -
PLAZO	10 meses
FECHA INICIO	21/07/2025
FECHA TERMINACION	21/05/2026
No POLIZA CUMPLIMIENTO	BCH-100009725
ANEXO	2

AMAPRO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	BCH-100009725	**2**	21/07/2025	21/05/2026	$ 687.500.000.000	29/07/2025




Ilustración 2 Póliza de responsabilidad civil extracontractual

SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES LOTE 2

LOTE 2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 8 Relación Póliza Cumplimiento CT0 1381-25

CONTRATO	CTO 1381-25
VALOR	$ 13.750.000.000
ANTICIPO	$ -
PLAZO	10 meses
FECHA INICIO	21/07/2025
FECHA TERMINACION	21/05/2031
No POLIZA CUMPLIMIENTO	BCH -100391857
ANEXO	2

AMAPRO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento de las obligaciones del contrato	BCH -100391857	**2**	21/07/2025	21/05/2031	$ 4.125.000.000	03/01/2024
Salarios y prestaciones sociales	BCH -100391857	**2**	21/07/2025	21/05/2031	$ 1.375.000.000	03/01/2024
Estabilidad y calidad de la obra	BCH -100391857	**2**	21/07/2025	21/05/2031	$ 4.125.000.000	03/01/2024

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tabla 9 Resumen Póliza RCE CTO 1381-25

CONTRATO	CTO 1381-25
VALOR	$ 13.750.000.000
ANTICIPO	$ -
PLAZO	10 meses
FECHA INICIO	21/07/2025
FECHA TERMINACION	21/05/2031
No POLIZA RCE	NB-100391857
ANEXO	2

AMAPRO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	NB-100391857	2	21/07/2025	21/05/2031	$ 4.125.000.000,00	29/07/2025

La interventoría se permite manifestar que, el CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026, realizó el cargue de las pólizas del contrato de obra 1381-25 en la proforma del SECOP II, como se soporta en la siguiente imagen.

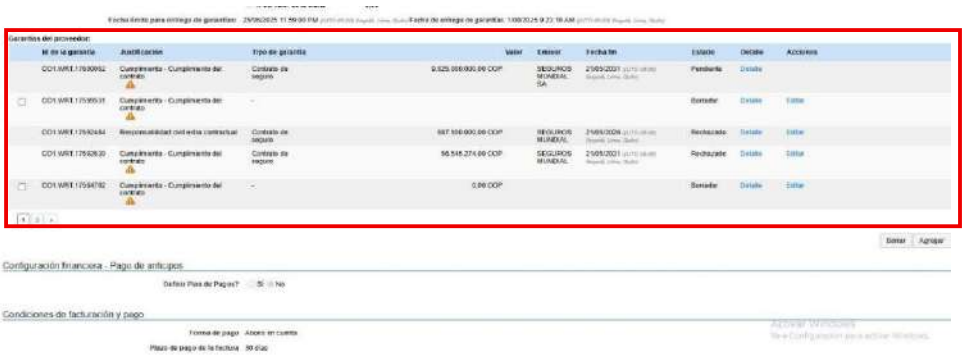


Ilustración 3 Póliza Cumplimiento del contrato

RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO DEL CONTRATISTA

En el presente periodo el Contratista contó con el personal requerido en el pliego de condiciones, cumpliendo con las exigencias del contrato durante el periodo objeto de este informe no se ha sustituido personal profesional o técnico del Contratista.

PERSONAL MINIMO LOTE 1

Tabla 10 Personal mínimo lote 1

Cargo	Nombre
DIRECTOR DE OBRA	JENY SIERRA
RESIDENTE OBRA DIURNO	VILMA ZARATE
RESIDENTE OBRA NOCTURNO	EDUARD MARTINEZ
INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CATHERINE BOTERO
INGENIERO AMBIENTAL	JENNIFER CAPERA
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CARLOS MANCILLA
INSPECTOR AMBIENTAL	LISETH MARQUEZ
INSPECTORES DE OBRA DIURNO	ROBERT TORRES
INSPECTORES DE OBRA NOCTURNO	SERGIO MATEUS
SECRETARIA	JUAN CORNEJO
ALMACENISTA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA BEDOYA

En el anexo A del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 1380-25.

PERSONAL MINIMO LOTE 2

Tabla 11Personal mínimo lote 1

Cargo	Nombre
DIRECTOR DE OBRA	EDWARD GUEVARA
RESIDENTE OBRA DIURNO	FREDY GARCIA
RESIDENTE OBRA NOCTURNO	CESAR PATARROYO
INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ALEJANDRA PINTO
INGENIERO AMBIENTAL	CARLOS SOTO
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MARIA MORALES
INSPECTOR AMBIENTAL	JESSICA CORTÉS
INSPECTORES DE OBRA DIURNO	PAULA LOPEZ
INSPECTORES DE OBRA NOCTURNO	SANTIAGO GALLO
SECRETARIA	INES ARIZA
ALMACENISTA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RICARDO GOMEZ

En el Anexo B del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 1381-25.

RELACION DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA

Según lo establecido en el numeral 10. INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS del anexo técnico de los contratos de obra CTO1380-25 y CTO1381-25, la interventoría se permite informar lo siguiente para cada contratista de obra.

RELACION DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA

Según lo establecido en el numeral 10. INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS del anexo técnico de los contratos de obra CTO1380-25 y CTO1381-25, la interventoría se permite informar lo siguiente para cada contratista.

INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 1

El contratista, mediante comunicado Formato Visita Verificación Cumplimiento Instalaciones, Equipos y EPP Consorcio MYE L1, entregó la relación de las instalaciones, equipos y herramientas, que la interventoría revisó y validó el 17 de julio del 2025, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico, en el:

Anexo soporte fotográfico instalaciones-equipo-epp lote 1

En el anexo B del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 1380-25 y 1381-25.

INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS LOTE 2

El contratista, mediante Visita Verificación Cumplimiento Instalaciones, Equipos y EPP Consorcio SAN DIEGO, hizo entrega de la relación de las instalaciones, equipos y herramientas, las cuales, fueron revisadas y validas por la interventoría el pasado 11 de julio de 2025 como se evidencia en el siguiente registro fotográfico, en el:

Anexo SOPORTE FOTOGRAFICO INSTALACIONES-EQUIPO-EPP.1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES GENERALES

- Vigilar y asegurar el cumplimiento de los Contratos Principales y normas vigentes.
- Hacer seguimiento a plazos, informes, actividades y aplicar sanciones por incumplimientos.
- Verificar calidad técnica, cumplimiento legal y ambiental.
- Emitir informes periódicos y atender requerimientos de TRANSMILENIO S.A.
- Garantizar que actividades se ajusten al presupuesto autorizado y tengan no objeción.
- Aprobar solo trabajos realizados a satisfacción y con soporte técnico.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- Contar con personal idóneo y recursos desde el inicio hasta el fin del contrato.
- Verificar que contratistas cumplan con tiempos, calidad y requisitos del contrato.
- Autorizar y controlar actividades a través de Órdenes de Trabajo (OT).
- Supervisar materiales, herramientas, fichas técnicas y precios según lo pactado.
- Asegurar cumplimiento de normativas de seguridad laboral y ambientales.
- Garantizar que se cumplan ofrecimientos realizados en propuestas y normativas de género.

Tabla 12 Información general de interventoría

Entidad contratante:	TRANSMILENIO S. A
Contratista:	DAIMCO S.A.S
Contrato:	CTO 136925-25
Objeto:	Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.
Valor inicial del contrato	$ 1.468.768.808
Plazo de ejecución inicial	10 meses
Fecha de inicio	21 de julio de 2025
Fecha de terminación actualizada	20 de mayo de 2026

SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

De acuerdo con sus obligaciones, la Interventoría presentó las garantías contractuales, las cuales fueron aprobadas por la Entidad Contratante, a continuación, se presenta la información relevante sobre cubrimiento y vigencias, con fecha de vigencia correspondiente a el Acta de Inicio del contrato.

Tabla 13 Seguimiento a Garantías CTO 1369-25

CONTRATO	CTO1369-25
VALOR	$ 1.468.768.808
PLAZO	10 meses
FECHA INICIO	21/07/2025
FECHA TERMINACION	24/05/2031
No POLIZA	21-44-101472662
ANEXO	5

AMAPRO	No Póliza	Anexo	VIGENCIA		VALOR	FECHA APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
Cumplimiento de las obligaciones del contrato	21-44-101472662	**5**	21/07/2025	23/11/2026	$220.315.321,20	30/07/2025
Salarios y prestaciones sociales	21-44-101472662	**5**	21/07/2025	24/05/2029	$73.438.440,40	30/07/2025
Calidad del servicio	21-44-101472662	**5**	21/07/2025	24/05/2029	$220.315.321,20	30/07/2025

La interventoría se permite manifestar que, la empresa DAIMCO S.A.S, realizó el cargue de las pólizas del contrato de obra CTO 1369-25 en la plataforma del SECOP II, como se soporta en la siguiente imagen.



Ilustración 4 Póliza de cumplimiento de obligaciones, salarios y prestaciones sociales. calidad del servicio

RELACIÓN DEL PÉRSONAL DE INTERVENTORÍA

La Interventoría reporta que, durante este informe, se contó con todo el personal requerido contractualmente y así cumplir con las actividades a su cargo.

A continuación, la relación del personal de la Interventoría:

Tabla 14 Personal Interventoría

CARGO	OPERACIÓN	APELLIDOS	NOMBRES
DIRECTOR DE PROYECTO	DIURNO/NOCTURNO	ACERO CAJIGAS	EDUARDO ANDRÉS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIURNO	BETANCOURTH CASTAÑO	SEBASTIÁN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIURNO	ROJAS	MITCHEL HUMBERTO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NOCTURNO	BUSTOS	RODRIGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NOCTURNO	MORENO CÁRDENAS	JOHN JARLIS
INSPECTOR DE CALIDAD Y SST	NOCTURNO	ARIAS	MARISOL
INSPECTOR AMBIENTAL	NOCTURNO	HERRERA	TATIANA
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	DIURNO	SÁNCHEZ	MIYER FERNANDO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	DIURNO	PALACIO	ANGEL
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	NOCTURNO	TAFUR DUARTE	FABIAN ALEJANDRO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	NOCTURNO	TORRES	ANGEL
SECRETARIA	N/A	MELO	DIANA MARCELA
CONDUCTOR	N/A	MORENO	BRAYAN
INGENIERO DE CALIDAD Y SST	DIURNO	CIENDUA	OSCAR
INGENIERO AMBIENTAL	DIURNO	CARMONA	ANDRÉS

En el anexo C del informe de SST se adjuntan las planillas de seguridad social de la plantilla mínima del contrato 1380-25. Adicionalmente, en el anexo 3 se adjuntan los contratos del personal aprobado por la supervisión para el contrato objeto del presente informe.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERÍODO

La entidad durante el periodo del presente informe generó la necesidad de ejecución de las siguientes actividades, para las cuales, se emitieron y autorizaron órdenes de trabajo a los Contratistas de Lote I y Lote 2 el pasado 21 de julio del 2025.

CONSORCIO MYE - LOTE 1					
CTO 1380-25					
		ACTIVIDADES A REALIZAR			
ESTACION	TRONCAL	CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES (MET-01)	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)	MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO (MET-08)
CORFERIAS	CALLE 26			NORTE Y SUR	
CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERÍA DE BOGOTÁ	CALLE 26			NORTE Y SUR	
CALLE 106	AUTO NORTE		ORIENTE Y OCCIDENTE		
CALLE 142	AUTO NORTE		ORIENTE Y OCCIDENTE		
CALLE 146	AUTO NORTE		ORIENTE Y OCCIDENTE		VAGON B AMBOS SENTIDOS
MAZUREN	AUTO NORTE		ORIENTE Y OCCIDENTE		VAGON A SENTIDO SUR - NORTE
CALLE 161	AUTO NORTE		ORIENTE Y OCCIDENTE		VAGON A SENTIDO SUR - NORTE Y VAGON B SENTIDO NORTE - SUR
TOBERIN	AUTO NORTE		ORIENTE Y OCCIDENTE		
PERDOMO	AUTO SUR		NORTE Y SUR		
COMUNEROS	AUTO SUR		NORTE Y SUR		

Nota: ESTE LISTADO NO SON ORDENES DE TRABAJO SON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS NECESIDADES PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD

1. Es importante verificar que la estación asignada corresponda al lote asignado,
2. Es importante que la interventoría realice una verificación previa y tenga un registro fotográfico y fílmico del antes y después de los trabajos realizados
3. Es importante que la interventoría realice una validación previa y presentar el presupuesto y cronograma.

CONSORCIO UT SAN DIEGO 2026 - LOTE 2					
CTO 1381-25					
ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDADES A REALIZAR			
		CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES (MET-	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)	CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)	MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO (MET-08)
LA CASTELLANA	NQS CENTRAL		OR Y OCC		VAGON A SENTIDO SUR - NORTE Y VAGON B SENTIDO NORTE - SUR
MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL			COSTADO ORIENTAL	
CAMPIN U. ANTONIO NARIÑO	NQS CENTRAL			COSTADO ORIENTAL	
CARRERA 90	CALLE 80			NORTE Y SUR	
AV. CALI	CALLE 80	NORTE Y SUR			
BOYACA	CALLE 80	NORTE Y SUR			
CARRERA 90	CALLE 80	NORTE Y SUR			
POLO	CALLE 80	NORTE Y SUR			
AV. CHILE	NQS CENTRAL		OR Y OCC		
MOVISTAR	NQS CENTRAL		OR Y OCC		
NQS CALLE 75	NQS CENTRAL		OR Y OCC		
PALOQUEMAO	NQS CENTRAL		OR Y OCC		

Nota: ESTE LISTADO NO SON ORDENES DE TRABAJO SON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS NECESIDADES PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD

1. Es importante verificar que la estación asignada corresponda al lote asignado.
2. Es importante que la interventoría realice una verificación previa y tenga un registro fotográfico y fílmico del antes y después de los trabajos realizados
3. Es importante que la interventoría realice una validación previa y presentar el presupuesto y cronograma.

Ilustración 5 Actividades realizadas

De lo anterior, se relacionan las órdenes de trabajo emitidas en el periodo para la correspondiente ejecución por parte de los contratistas de adecuación. Las fechas de inicio y finalización de actividades están sujetas a lo dispuesto en el numeral 6. FORMA DE PAGO del anexo técnico de los contratos de adecuación.

Tabla 15 Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 1.

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	ACTIVIDAD	INICIO DE INTEREVENCIÓN	FIN DE INTEREVENCIÓN
OT-003	CALLE 106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	25/07/2025	14/08/2025
OT-004	CALLE 142	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	25/07/2025	14/08/2025
OT-009	PERDOMO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	25/07/2025	14/08/2025
OT-010	COMUNEROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	25/07/2025	14/08/2025

Tabla 16 Relación de órdenes de trabajo generadas LOTE 2.

	LOTE 2					
ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VALOR ORDEN DE TRABAJO	INICIO DE INTEREVENCIÓN	FIN DE INTEREVENCIÓN
OT-001	AVENIDA CALI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	OT-001		25/07/2025	14/08/2025
OT-002	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	OT-002		25/07/2025	14/08/2025
OT-003	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	OT-003		25/07/2025	19/08/2025
OT-004	AVENIDA BOYACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	OT-004		25/07/2025	14/08/2025
OT-006	MOVISTAR ARENA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	OT-006		25/07/2025	19/08/2025
OT-007	MOVISTAR ARENA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	OT-007		25/07/2025	14/08/2025
OT-008	CAMPIN - UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	OT-008		25/07/2025	19/08/2025
OT-009	PALOQUEMAO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	OT-009		25/07/2025	14/08/2025
OT-010	AVENIDA CHILE	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	OT-010		25/07/2025	14/08/2025

Aunando a lo anterior, se tiene el siguiente reporte de actividades ejecutadas por los contratistas de lote 1 y lote 2 durante el periodo comprendido del 21 de julio del 2025 al 20 de agosto del 2025.

Tabla 17 Relación de actividades Lote 1

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	ACTIVIDAD
OT-003	CALLE 106	NORTE B	DESMONTE DE PASAMANOS
			INSTALACIÓN DE PERFIL INFERIOR
			INSTTALACIOÓN DE PLATINAS
			INSTALACIÓN DE CELOSÍAS
			APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-004	CALLE 142	NORTE B	DESMONTE DE PASAMANOS
			INSTALACIÓN DE PERFIL INFERIOR
			INSTTALACIOÓN DE PLATINAS
			INSTALACIÓN DE CELOSÍAS
			APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-009	PERDOMO	NQS SUR G	DESMONTE DE PASAMANOS
			INSTALACIÓN DE PERFIL INFERIOR
			INSTTALACIOÓN DE PLATINAS
			INSTALACIÓN DE CELOSÍAS
			APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-010	COMUNEROS	NQS SUR G	DESMONTE DE PASAMANOS
			INSTALACIÓN DE PERFIL INFERIOR
			INSTTALACIOÓN DE PLATINAS
			INSTALACIÓN DE CELOSÍAS
			APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA

Tabla 18 Relación de actividades Lote 2

LOTE 2					
ORDEN DE TRABAJO	**ESTACION**	**TRONCAL**	**ORDEN DE TRABAJO**		**ACTIVIDAD**
OT-001	AVENIDA CALI	CALLE 80	OT-001		INSTALACION DE CELOSIA
					APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-002	CARRERA 90	CALLE 80	OT-002		INSTALACION DE CELOSIA
					APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-003	CARRERA 90	CALLE 80	OT-003		ARMADO DE ACERO
					APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJE
					ANCLAJE DE CASTILLO
					INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
					ENCOFRADO
					FUNDIDA
OT-004	AVENIDA BOYACA	CALLE 80	OT-004		INSTALACION DE CELOSIA
					APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-006	MOVISTAR ARENA	NQS	OT-006		ARMADO DE ACERO
					APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJE
					ANCLAJE DE CASTILLO
					INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
					ENCOFRADO
					FUNDIDA
OT-007	MOVISTAR ARENA	NQS	OT-007		DESMONTE DE PASAMANOS
					INSTALACION DE PERFIL INFERIOR
					INSTALACION DE PLATINAS
					INSTALACION DE CELOSIAS
					APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-008	CAMPIN - UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	NQS	OT-008		ARMADO DE ACERO
					APERTURA DE HUECOS PARA ANCLAJE
					ANCLAJE DE CASTILLO
					INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
					ENCOFRADO
					FUNDIDA
OT-009	PALOQUEMAO	NQS	OT-009		DESMONTE DE PASAMANOS
					INSTALACION DE PERFIL INFERIOR
					INSTALACION DE PLATINAS
					INSTALACION DE CELOSIAS
					APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA
OT-010	AVENIDA CHILE	NQS	OT-010		DESMONTE DE PASAMANOS
					INSTALACION DE PERFIL INFERIOR
					INSTALACION DE PLATINAS
					INSTALACION DE CELOSIAS
					APLICACIÓN DE MASILLA Y PINTURA

Por lo tanto, para la fecha de corte del presente informe mensual No 1, se tiene el siguiente estado de las ordenes de trabajo de los contratos de obra CTO 1380-25.

Tabla 19 Estado ordenes de trabajo Lote 1

LOTE 1				
ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
OT-003	CALLE 106	20/08/2025	0	0%
OT-004	CALLE 142	20/08/2025	0	0%
OT-009	PERDOMO	20/08/2025	0	0%
OT-010	COMUNEROS	20/08/2025	0	0%

.

OTs GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
4	4	4

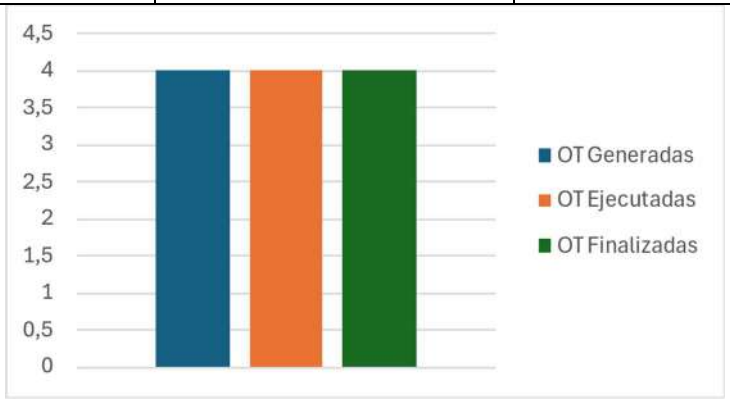


Ilustración 6 Gráfico de distribución del estado de las órdenes de trabajo LOTE 1.

A la fecha de corte de elaboración del presente informe se evidencian atrasos para las actividades autorizadas por esta Interventoría y generada la necesidad por la Entidad, y en ejecución por parte del contratista LOTE 1 – MYE CTO1380-25.

Tabla 20 Porcentaje de atraso, ordenes de trabajo Lote 1

LOTE 1				
ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	DIAS DE ATRASO	% ATRASO
OT-003	CALLE 106	19/08/2025	0	0%
OT-005	CALLE 146	19/08/2025	0	0%
OT-006	MAZUREN	19/08/2025	0	0%
OT-007	CALLE 161	19/08/2025	0	0%
OT-008	TOBERIN	19/08/2025	0	0%

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

Los contratistas dieron culminación a las actividades programadas para el periodo durante los tiempos establecidos en los requisitos contractuales del contrato de adecuación cumpliendo en un 4.16% con la programación de actividades terminadas del periodo. No obstante, es de aclarar que las actividades "En Ejecución" del numeral 7.1 del presente informe tienen fecha de terminación proyectada en el periodo 2 del contrato de adecuación.

Tabla 21 Estado ordenes de trabajo Lote 2

LOTE 2							
ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	FECHA DE RECIBO A SATISFACCION	DIAS DE ATRASO	% ATRASO	DIAS DE EJECUCION	INICO	FIN
OT-001	AVENIDA CALI	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	14/08/2025
OT-002	CARRERA 90	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	14/08/2025
OT-003	CARRERA 90	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	19/08/2025
OT-004	AVENIDA BOYACA	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	14/08/2025
OT-006	MOVISTAR ARENA	RECIBIDO	0	0,00%	26,00	25/07/2025	19/08/2025
OT-007	MOVISTAR ARENA	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	14/08/2025
OT-008	CAMPIN - UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	RECIBIDO	0	0,00%	26,00	25/07/2025	19/08/2025
OT-009	PALOQUEMAO	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	14/08/2025
OT-010	AVENIDA CHILE	RECIBIDO	0	0,00%	20,00	25/07/2025	14/08/2025

OTS GENERADAS	OTs EJECUTADAS	OTs FINALIZADAS
9	9	9

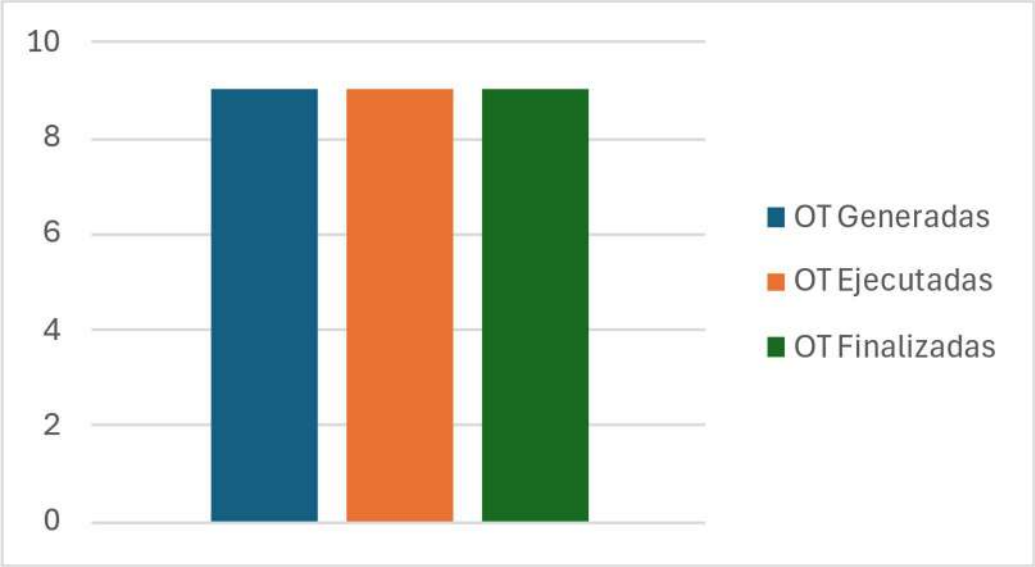


Ilustración 7 Gráfico de distribución del estado de las órdenes de trabajo LOTE 2.

A la fecha de corte de elaboración del presente informe se evidencian atrasos para las actividades autorizadas por esta Interventoría y generada la necesidad por la Entidad en las estaciones, av. chile, calle 95, rio negro, puente largo, Niza calle 127 y portal Usme y en ejecución por parte del contratista LOTE 2 - CONSORCIO SAN DIEGO 2025.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

Los contratistas no dieron culminación en su totalidad a las actividades programadas para el periodo, durante los tiempos establecidos en los requisitos contractuales del contrato de adecuación incumpliendo en un 5%, en promedio, con la programación de actividades del periodo. No obstante, es de aclarar que varias actividades aún tienen tiempo de finalización después del presente informe.





Ilustración 8 Estado de OTS generadas por periodo Lote 1 periodo del 21 de julio del 2025 al 20 de agosto del 2025

INFORME PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante el periodo comprendido del 21 de JULIO del 2025 al 20 de AGOSTO del 2025, se tuvo una inversión total de $ 2.076.031.098,48 entre los contratos de obra 1380-25 y 1381-25, lo que corresponde al 6.58% del recurso presupuestal dispuesto por la TRANSMILENIO S.A para realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de evasión del pago de pasajes por parte de los usuarios del sistema.

Tabla 22 Resumen Programado Vs Ejecutado

LOTE	TRONCAL	SUMA DE TOTAL PROGRAMADO	SUMA DE TOTAL EJECUTADO
1	NORTE B	$ 169.170.790,94	$ 169.170.790,94
1	NQS SUR G	$ 166.050.365,92	$ 166.050.365,92
2	CALLE 80	$ 741.402.482,72	$ 741.402.482,72
2	NQS CENTRAL	$ 999.407.458,91	$ 999.407.458,91
	TOTAL	**$ 2.076.031.098,48**	**$ 2.076.031.098,48**

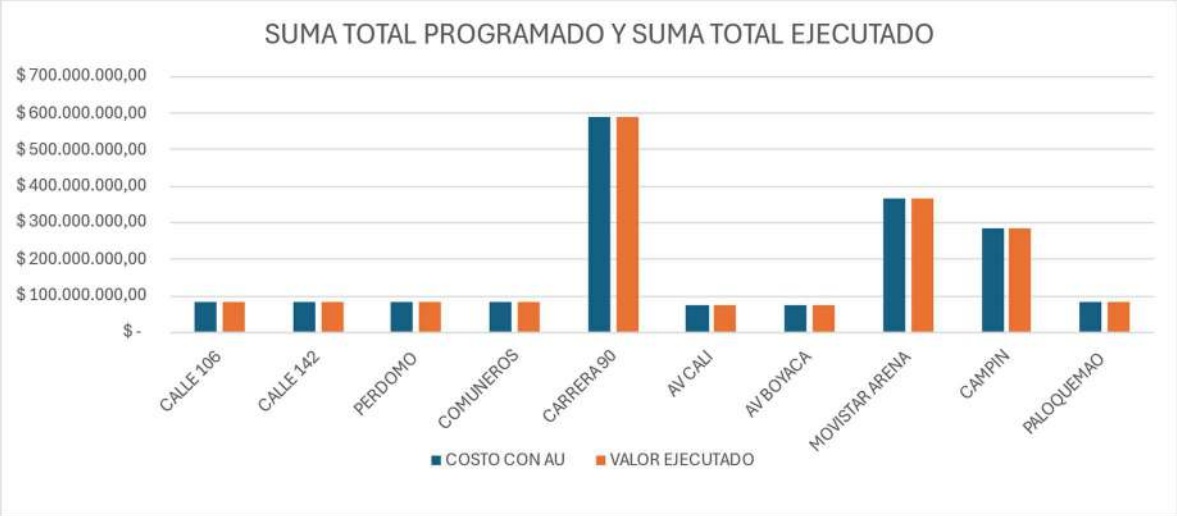


Ilustración 9 Suma total programado y suma total ejecutado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 1

En el periodo No. 1 la inversión del valor del contrato de obra CTO1380-25 es el siguiente, con relación a las actividades objeto de intervención.

Tabla 23 Ejecución presupuestal del Lote 1

ESTACION	MET	TRONCAL	REALCE	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL
	MET-02	NORTE B	36,80	$ 933.632,00	$ 34.357.657,60	$ 42.373.299,12
CALLE 106	MET-02	NORTE B	36,66	$ 933.632,00	$ 34.226.949,12	$ 42.212.096,35
	MET-02	NORTE B	36,71	$ 933.632,00	$ 34.273.630,72	$ 42.269.666,77
CALLE 142	MET-02	NORTE B	36,75	$ 933.632,00	$ 34.310.976,00	$ 42.315.726,70
PERDOMO	MET-02	NQS SUR G	72,23	$ 933.632,00	$ 67.436.239,36	$ 83.169.114,00
COMUNEROS	MET-02	NQS SUR G	71,98	$ 933.632,00	$ 67.202.831,36	$ 82.881.251,92

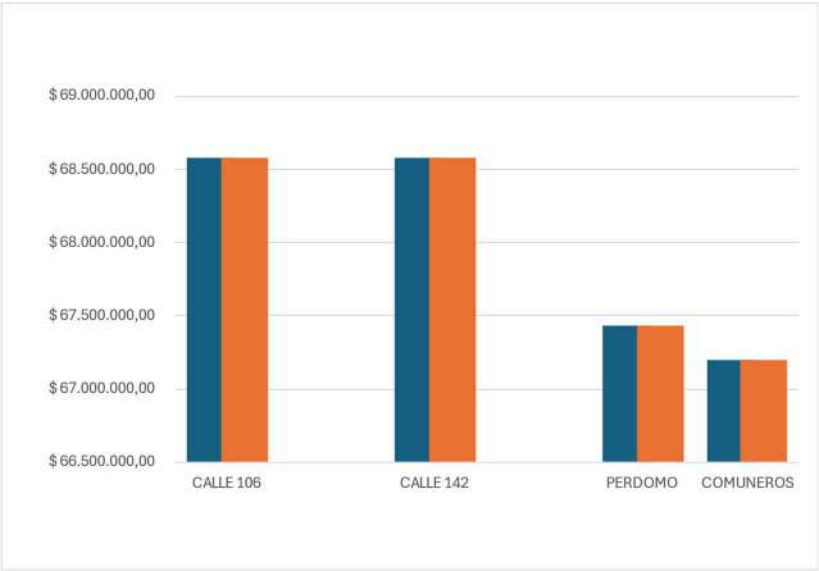


Ilustración 10 Ejecución presupuestal programado vs realizado.

De lo anterior, se tiene la siguiente ejecución presupuestal por troncal del sistema por parte del contratista MYE BOGOTÁ CTO1380-25.

TRONCAL NORTE B

Norte B se tiene una ejecución presupuestal de $169.170.790,94 correspondiente al 1,23% de la ejecución presupuestal del Lote 1 de la ejecución presupuestal del Lote 1.

Tabla 24 Ejecución presupuestal del troncal norte B.

ORDEN DE TRABAJO	MET	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	UNIDAD	SUMA CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	VALOR PROGRAMADO AU
OT-003	MET-02	NORTE B	CALLE 106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	73,46	$ 933.632,00	$ 68.584.606,72	$ 84.585.395,47
OT-004	MET-02	NORTE B	CALLE 142	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	73,46	$ 933.632,00	$ 68.584.606,72	$ 84.585.395,47

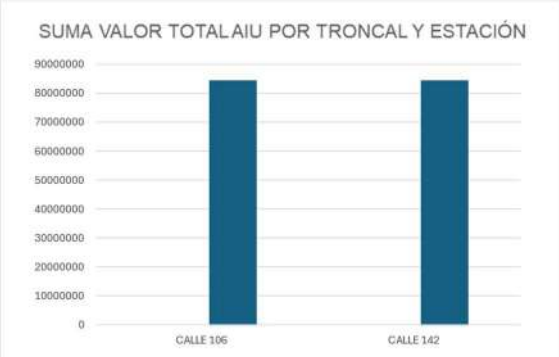


Ilustración 11 Suma valor total AU troncal Norte B

TRONCAL NQS SUR G

Para la troncal NQS sur se tiene una ejecución presupuestal de $166.050.365,92 correspondiente al 1,21% .

ORDEN DE TRABAJO	MET	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	UNIDAD	SUMA CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	VALOR PROGRAMADO AU
OT-009	MET-02	NQS SUR G	PERDOMO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	72,23	$ 933.632,00	$ 67.436.239,36	$ 83.169.114,00
OT-010	MET-02	NQS SUR G	COMUNEROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	71,96	$ 933.632,00	$ 67.202.831,36	$ 82.881.251,92

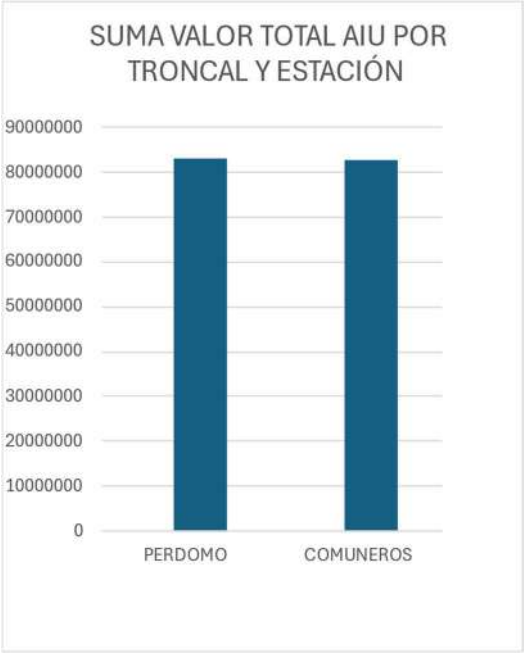


Ilustración 12 Suma valor total AU troncal NQS SUR G

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA LOTE 2

En el periodo No. 1 la inversión del valor del contrato de obra CTO1381-25 es el siguiente, con relación a las 4 actividades, en ejecución, objeto de intervención.

Tabla 25 Ejecución presupuestal detallada lote 2

LOTE	UBICACIÓN	PROGRAMADO SIN AU	EJECUTADO SIN AU
LOT 2	AV CALI	$ 61.392.257,18	$ 61.392.257,18
LOT 2	CR 90	$ 478.224.353,24	$ 478.224.353,24
LOT 2	AV BOYACA	$ 61.536.785,12	$ 61.536.785,12
LOT 2	MOVISTAR	$ 295.993.326,50	$ 295.993.326,50
LOT 2	CAMPIN	$ 231.062.675,00	$ 231.062.675,00
LOT 2	PALOQUEMAO	$ 66.651.430,00	$ 66.651.430,00
LOT 2	AV CHILE	$ 216.644.842,00	$ 216.644.842,00

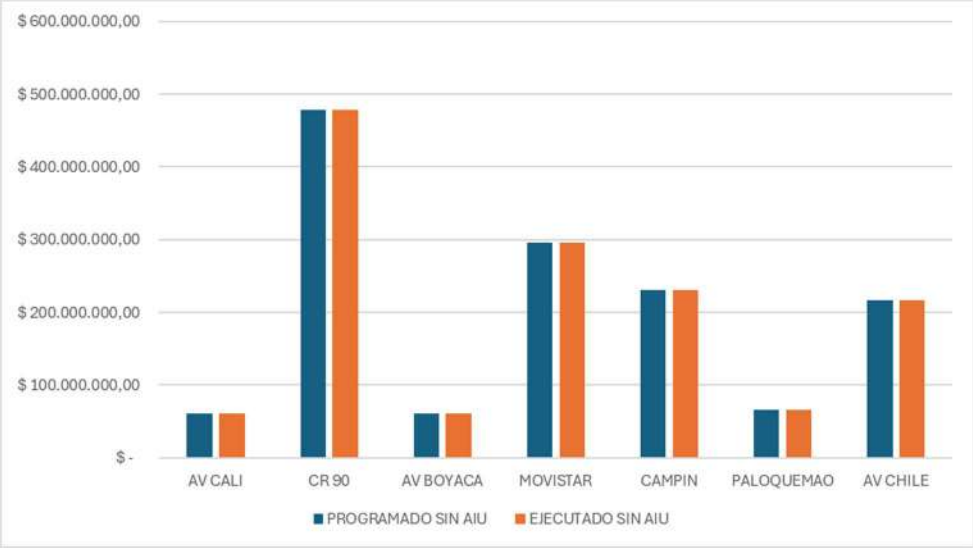


Ilustración 13 ejecución presupuestal detallada lote 2

De lo anterior, se tiene la siguiente ejecución presupuestal por troncal del sistema por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026 para el contrato 1381-25

TRONCAL CALL 80

Para la troncal CALLE 80 se tiene una ejecución presupuestal de $ 741.402.482,72 correspondiente al 5.39% de la ejecución del Lote 2.

	ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	UNIDAD	SUMA CANTIDAD	SUMA VALOR UNITARIO	SUMA VALOR TOTAL SIN AU
2	OT-001	CALL 80	AVENIDA CALI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	76,46	$ 75.715.070,78	$ 61.392.257,16
2	OT-002	CALL 80	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	75,78	$ 75.041.695,84	$ 60.846.262,74
2	OT-003	CALL 80	CARRERA 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	ML	370,30	$ 514.752.399,01	$ 417.378.090,50
2	OT-004	CALL 80	AVENIDA BOYACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	76,64	$ 75.893.317,09	$ 61.536.785,12

Tabla 26 Ejecución presupuestal detallada, troncal 80.

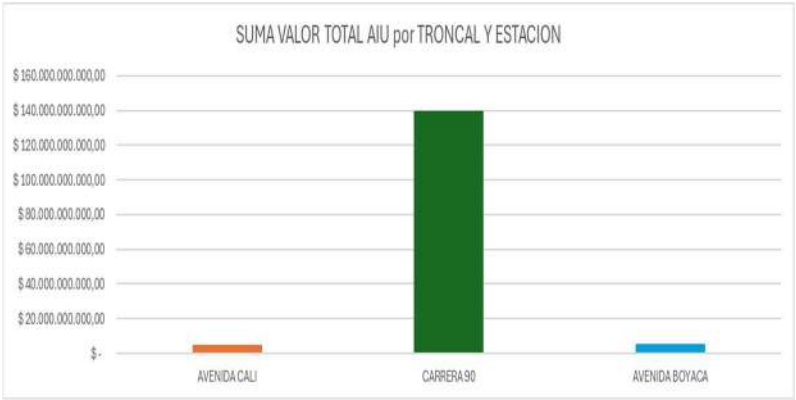


Ilustración 14 Suma valor total AU,troncal cll 80

TRONCAL NQS CENTRAL

Para la troncal NQS CENTRAL se tiene una ejecución presupuestal de $ 999.407.458,91 correspondiente al 7.27% de la ejecución del Lote 2.

	ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	UNIDAD	SUMA CANTIDAD	SUMA VALOR UNITARIO	SUMA VALOR TOTAL SIN AU
2	OT-006	NQS	MOVISTAR ARENA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	M2	202,90	$ 282.050.396,33	$ 228.695.691,50
2	OT-007	NQS	MOVISTAR ARENA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	72,90	$ 82.998.173,25	$ 67.297.635,00
2	OT-008	NQS	CAMPIN - UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	ML	205,00	$ 284.969.597,08	$ 231.062.675,00
2	OT-009	NQS	PALOQUEMAO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	72,2	$ 82.201.208,62	$ 66.651.430,00
2	OT-010	NQS	AVENIDA CHILE	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	234,68	$ 267.188.083,64	$ 216.644.842,00

Tabla 27 Ejecución presupuestal detallada, troncal NQS.

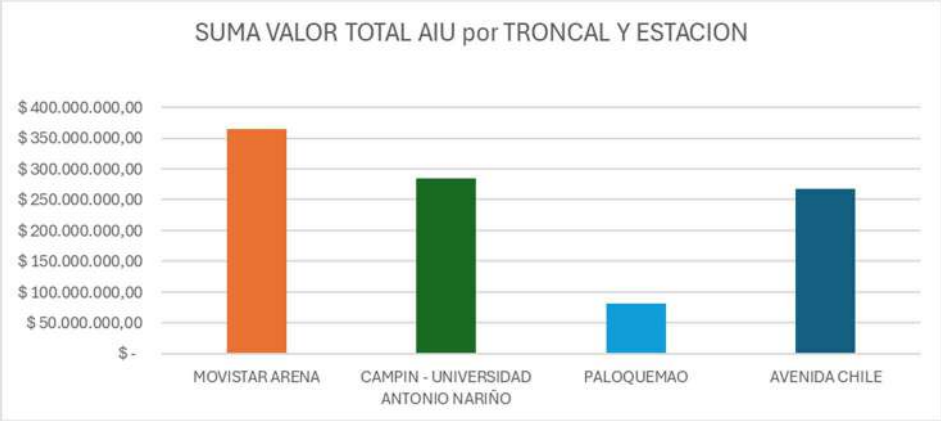


Ilustración 15 Suma valor total AU troncal NQS

Por consiguiente, se tiene una inversión para el periodo No 1 del 12.66% el cual corresponde a $ 1.740.809.941,63 del valor total del contrato de obra 1381-25.

INFORME PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

- En el presente periodo se realizó acompañamiento a la ejecución y revisión de las actividades de adecuación adelantadas por los contratistas del Lote 01 (CONSORCIO MYE BOGOTA) y del Lote 2 (UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026). Los cuales cumplen con los términos indicados en los Contratos Principales y sus anexos.
- Los Contratistas del Lote 1 y Lote 2 vienen cumpliendo con las obligaciones dadas en el acuerdo de voluntades suscritos con la Entidad; las inversiones en el primer periodo ascienden al 7,31% del valor total del contrato de obra 1380-25– Lote 1, y del 12.66% del valor total del contrato de obra 1381-25 – Lote 2.
- A la fecha de corte del presente informe, y en plena ejecución, se adelantan las órdenes de trabajo que corresponden a los INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES – cero (0) para Lote 1 y tres (3) para lote 2, en total tres (3), SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA ESTACIONES –, cero (0) para Lote 1 y tres (3) para Lote 2, en total tres (3), SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES –, tres (3) para Lote 1 y nueve (9) para Lote 2, en total doce (12), CAMBIO DE MODULACIÓN DE VAGÓN ARTICULADO A BIARTICULADO EN UN VAGÓN SENCILLO INCLUYE ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN CINTAS Y CELOSÍAS NECESARIAS – cero (0) para Lote 1 y uno (1) para lote 2, en total uno (1), SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALE – cero (0) para Lote 1 y uno (1) para lote 2, en total uno (1), SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES – cero (0) para Lote 1 y uno (1) para lote 2, en total uno (1).
- Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo, ni trabajos en espacios confinados, durante el desarrollo de las actividades de interventoría y el desarrollo de las actividades por parte del Lote 1 (CONSORCIO MYE BOGOTA) y del Lote 2 (UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026.

COMPONENTE DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de Inspección y Calidad presentado a interventoría, tomamos los registros correspondientes al MET-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES, como se evidencia en tabla anexa

INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DURANTE EL PERIODO

Para el caso particular del MET-02, se tienen en cuenta ciertos aspectos de control de calidad, uno de ellos es la verificación visual, en donde se debe validar que cada uno de los cordones de soldadura de la reja en celosía este correctamente soldada y sobre todo que no falte ningún cordón en las diferentes uniones del elemento.

Adicionalmente se valida la dimensionalidad de los elementos, se valida la ortogonalidad de las celosías, se toman las medidas longitudinales y transversales las cuales deben coincidir en cada sentido, de tal manera certificar que el elemento cumple dimensionalmente.

También se realiza la medición del espesor en la pintura aplicada, se hace la verificación de los espesores mínimos permitidos según lo definido en el Plan de inspección de calidad y la normativa establecida vigente.

A continuación, se comparte la evidencia fotográfica de la muestra y el consolidado de la toma de las lecturas realizadas para ambos lotes.



Ilustración 16 Evidencia fotográfica de las pruebas realizadas en campo Lote 1



Ilustración 17 Evidencia fotográfica de las pruebas realizadas en campo Lote 2
