Bogotá, 18 de diciembre de 2025

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
PE. Maritza Calderon
Avenida Carrera 7 n° 32-84
Bogotá

Referencia: Reporte de instalación UPS Sede Neiva


El día 17 de diciembre se realiza la instalación y arranque de la ups:

Modelo: UPO22-10AX
Serial: 231223-5671547
SNMP: 98002407100225

Registro fotográfico:


Ups existente que se desmonto para dar lugar a la nueva



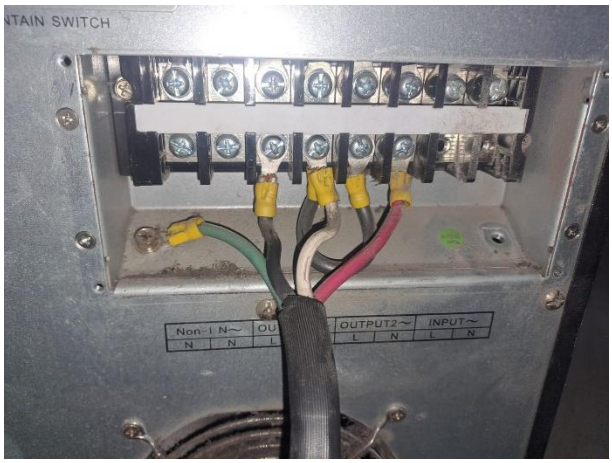


Medición de voltajes de entrada y salida



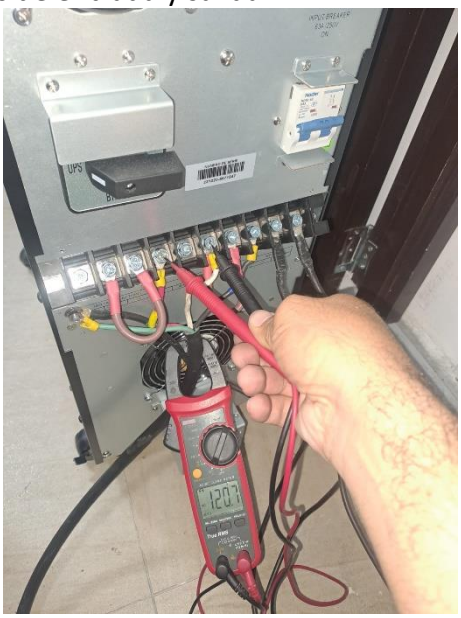

Toma de amperaje línea 1 y 2

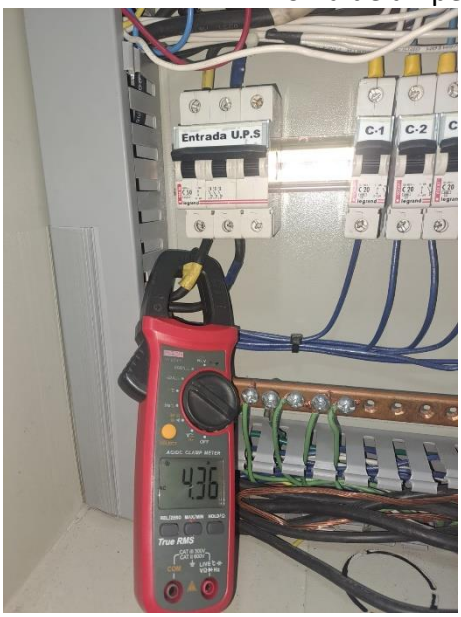



UPS nueva instalada y en operación normal





Instalación de SNPM en la ups





La actividad se realizo con acompañamiento de la Prosperidad Social, la ups queda en operación normal

ComputelSystem
Soluciones que integran valor

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY

PROTOCOLO DE ARRANQUE

BIFASICAS [X] **TRIFASICAS** [ ]

Report Pg# 1 OF 2	Fecha 17-12-2015					Nombre del Ingeniero

INFORMACION DE CLIENTE

Compañia	Depto Prosperidad Social			
Direccion	Cll 8 # 12-65 Edi Nueva Piso1			
Ciudad	Neiva.			
Contacto:	**Nombre**	**No Telefonico**	**Ext #**	**Correo electronico**
Primario	Yeanez del P. Velasquez	3157162225		yvelasquez@prosperidadsoc
Secundario				
Ubicacion de la unidad	**Piso** 1		**Oficina**	Neiva - Huila.

IDENTIFICACION SISTEMA UPS

	Modelo	**Número de serie**
Modulo de potencia	UPO22-10AX.	231223-5671547
Modulo del Transformador		
Modulo de baterias	Total 20 Internos	12V 90 A-H
Accesorio SNMP	AOX9HOL67261910007	

REVISION DE INSTALACION ELECTRICA ENTRADA Y SALIDA

Elementos del tablero	Llave de bypass	Si (X) No ( )	Indicadores	Si (X) No ( )
	Calibre	**Distancia a la unidad**	**Tipo de cubierta**	**Tipo de empalme**
Cable de tablero a entrada UPS	#8	4mts.	THNN #8.	
Cable de salida UPS a Tablero	#8	4mts.	THNN #8.	
Cable para Circuitos de Salida	#10	2mts.	THNN #8.	
Tipo de Receptaculo	Entrada 3X50		Salida 3X40	HW ( )

Amperaje 50Amp.

	R	S	T
Breaker del tablero de Entrada	7	6	8
Breaker del tablero de salida	4	5	10
Circuitos X Fase			
Numero de circuitos de salida	3	3	3.

Voltaje Neutro tierra Tablero 0,0084 V · V

Voltajes

	RN	SN	TN	RS	ST	TR
Voltaje de entrada	123	124	123	244	215	

Frecuencia de entrada **Hz**

R	S	T	RS	ST	TR
61	60	60			

Corriente de Tierra 0.02 Amp. A.

Se cuenta con Generador Elecrico No [X] Si [ ] Marca — Capacidad — Frecuencia — Hz

Transferencia Automatica [X] Manual ( ) Voltaje — VCA

Prueba de sincronía con planta de emergencia: satisfactoria si ( ) no [X]

TVSS en la acometida No [X] Si [ ] Capacidad

Tipo De sector Hogar ( ) Industrial ( ) Rural ( )

Tipo de aplicacion Computo [X] Equipos de laboratorio ( ) Otros

Consumo de la aplicacion 2260 VA 1860 Watts Peak

Punto de Red Disponible No [X] Si [ ] Descripcion

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura En sitio 24 C Aire Acondicionado Si [X] No ( )

Humedad Controlada (30%) No Controlada ( )

Ubicacion Fisica OK cm/Inch Techo — cm/Inch Lateral Izq — cm/Inch posterior — cm/Inch Lateral Der

Tipo de montaje RacK [X] Torre ( )

CONEXION DE UNIDAD

HERRAMIENTAS

Voltimetro OK Secuenciador de Fases OK

Amperimetro OK Osciloscopio

Frecuencimetro

Conexion entre Modulos de acuerdo al manual Si [X] No ( )

ARRANQUE EN FRIO

Voltaje de bateria (voltaje minimo aceptable por celda 10.5V)

Voltaje de bateria en Self Test

Voltaje de salida en Self Test

Frecuencia de salida en Self Test

Secuencia de Fases a la Salida

ComputelSystem
Soluciones que integran valor

PARAMETROS DE ENTRADA Y SALIDA

Breakers de Entrada activos si (X) No ( )
Estado de la unidad(5k-80k) Modo Normal (X) Modo Economico ____
Secuencia de arranque exitosa Si (X) No ( )

LECTURAS

Voltaje de Entrada		Voltimetro	Display
Voltaje de AC (VAC)	RS	224	213
	ST		
	TR		
	HZ		

Voltaje de Bypass		Voltimetro	Display
Voltaje de Bypass (VAC)	RS	223	212
	ST		
	TR		

Voltaje de Bypass (VAC)		Voltimetro	Display
	R - N	122	113
	S - N	123	122
	T - N		
	HZ	60	60
Voltaje de VDC	POS(+) / NEG (-)		

Voltaje de Salida		Voltimetro	Display
Voltaje de Inversor (VAC)	RS	240	235
	ST		
	TR		

Voltaje de Salida		Voltimetro	Display
Voltaje de Inversor (VAC)	R - N	119	118
	S - N	120	119
	T - N		
	HZ		

Voltaje de Neutro a Tierra		Voltimetro	Display
	N - G	0,12	0,13
	Hz	60	60
	KVA		
	KW		

Corriente de Entrada		AMP
	R	4,3
	S	5,3
	T	

Operacion de Bateria		AMP
	RS	
	ST	
	TR	

60 Hz
240 VDC

Corriente de Entrada		Ampmeter	DISPLAY RMS	DISPLAY Peak
	R	4,3		
	S	5,3		
	T			
	N			

	Si	No
Ventiladores funcionando adecuadamente?	X	
Transferencia Manual a Bypass correcto?	X	
Transferencia manual a Inversor correcta?	X	
Funcionamiento correcto de alarmas?	X	

Observaciones y Recomendaciones

Se Instalaron UPS CDP torre doble. Propiedad Social Nevera; en Voltaje y Potencia UPS: Voltaje entrada en: en encendido UPS: se registran Fallos de Normalización Autonomia en: UPS Soporta Carga y Sin alarma: de alguna UPS en orden.

Cliente

Vianney del R. Velasquez A.
Nombre, Firma y Fecha Dic-17-2025

CDP

Seyro Ryn / Myn Ryn.
Nombre, Firma y Fecha

NOTAS:

1. Este formulario no es valido sin la firma del cliente
2. Todos los campos deben ser diligenciados en su totalidad (Escribir N/A en los casos que no corresponda)
3. Para conservar la garantia se deben hacer 2 mantenimientos minimos al año como CERTIFICADOS para UPS expuestas a temperaturas a mayor de 25°, con humedad segun ASHRAE superior a 80% ambientes salinos y/o alta polucion se requieren 4 mantenimientos al año CERTIFICADOS.
