ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

**CONTRATO 1380 DE 2025 - REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1**

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL No 03

## PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025

## CONSORCIO MYE BOGOTÁ


## OCTUBRE 25 DE 2025

**Versión 1**



## CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

| VERSIÓN N°. | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| 0 | 25/10/2025 | VERSION INICIAL | 17 |

## EMPRESA CONTRATISTA

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ING. VILMA ZARATE | ARQ. ANGELICA SIERRA | ARQ. ANGELICA SIERRA |
| **RESIDENTE DE OBRA** | **DIRECTORA DE OBRA** | **DIRECTORA DE OBRA** |

## EMPRESA INTERVENTORA

| Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|
|  |  |
| ING. SEBASTIAN BETANCOURT | ARQ. EDUARDO ANDRES ACERO CAJIGAS |
| **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** |



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

# TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 5
1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación .... 5
1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones ..... 6
1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias. ..... 6
2. ASPECTOS TECNICOS ..... 7
2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo ..... 7
2.1.1. MET 06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA LA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES PLATAFORMA 2 ..... 8
2.1.2. MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES ..... 8
1.1.1. MET 03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA .. 9
2.2. Componente de Calidad ..... 9
2.2.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo ..... 9
3. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST ..... 12
3.1. Personal del proyecto ..... 12
3.1.1. Personal SST ..... 13
3.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración ..... 13
3.2. Gestión SST Durante el Periodo ..... 14
4. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL ..... 15
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL ..... 16
6. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA ..... 17



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales ..... 5
Tabla 2. Valor del Contrato ..... 6
Tabla 3. Garantías del contrato. ..... 6
Tabla 4. Actividades Realizadas durante el Periodo ..... 7
Tabla 5 Certificados de calidad de los materiales ..... 12
Tabla 6. Personal Calidad y SST ..... 13
Tabla 7. Personal Profesionales y Plantilla Mínima ..... 13
Tabla 8. Ejecución presupuestal general del contrato ..... 16
Tabla 9. Ejecución Presupuestal por Troncal ..... 16

# INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Verificación elementos ..... 10
Ilustración 2. Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en taller ..... 11
Ilustración 3. Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en obra ..... 11
Ilustración 4. Indicadores SGSST ..... 14
Ilustración 5. Ejecución Presupuestal por troncal ..... 17



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

# 1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

## 1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación

***Tabla 1.*** *Datos Generales*

| INFORMACIÓN | CONSULTOR | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|---|
| ***No. DEL CONTRATO*** | ***1380-2025*** | | ***1369 - 2025*** | |
| **OBJETO** | REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1 | | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN (LOTE 1 Y LOTE 2), CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. . | |
| **CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN** | **CONSORCIO MYE BOGOTA** | **Participación** | **CONSORCIO ALIANZA XXI** | **Participación** |
| | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS S.A.S | 45.00% | DAIMCO S.A.S | 99.90% |
| | MR GROUP COL S.A.S | 45.00% | DIBENEM S.A.S | 0.10% |
| | COLPETROLEUM SERVICES S.A.S | 10.00% | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCIÓN | | EN EJECUCIÓN | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 19 DE JUNIO DE 2025 | | 16 DE JUNIO DE 2025 | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 DE JULIO DE 2025 | | 21 DE JULIO DE 2025 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** | **20 DE MAYO DE 2026** | | **20 DE MAYO DE 2026** | |



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

## 1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones

***Tabla 2.*** *Valor del Contrato*

| CONSULTORÍA | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $13,750,000,000.00 COP |
| **VALOR ADICIONES** | *No Aplica* |
| **VALOR TOTAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO** | $13,750,000,000.00 COP |

## 1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias.

***Tabla 3.*** *Garantías del contrato.*

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Causa de la Modificación (indicar documento soporte) | Amparo | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta | |
| SEGUROS MUNDIAL | **BCH-100044568** De Cumplimiento | Emisión de Pólizas de garantía al contrato 1380-2025 | *Cumplimiento del Contrato* | 21/07/2025 | 21/11/2026 | $4,125,000,000.00 |
| | | | *Prestaciones Sociales e Indemnizaciones* | 21/07/2025 | 21/05/2029 | $1,375,000,000.00 |
| | | | *Estabilidad de la obra* | 21/05/2026 | 21/05/2031 | $4,125,000,000.00 |
| | **BCH-100009725** Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento | | *Amparo básico* | 21/07/2025 | 21/05/2026 | $685,500,000.00 |
| | | | *Contratistas y subcontratistas* | 21/07/2025 | 21/05/2026 | $685,500,000.00 |
| | | | *Vehículos propios y no propios* | 21/07/2025 | 21/05/2026 | $685,500,000.00 |
| | | | *Patronal* | 21/07/2025 | 21/05/2026 | $685,500,000.00 |
| | | | *R.C. Cruzada* | 21/07/2025 | 21/05/2026 | $685,500,000.00 |



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

# 2. ASPECTOS TECNICOS

## 2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizó la intervención de las siguientes estaciones:

***Tabla 4.*** *Actividades Realizadas durante el Periodo*

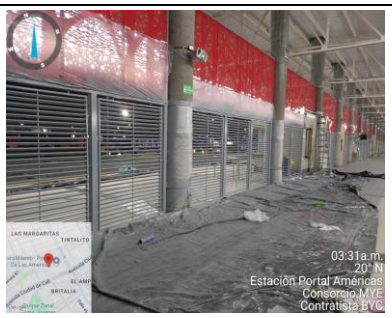
| No DE ORDEN DE TRABAJO | TRONCAL | ESTACION | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|---|
| 1380-L1-016 | AMERICAS | PORTAL AMERICAS | MET 06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA LA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES PLATAFORMA 2 | SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO |
| 1380-L1-017 | AMERICAS | PORTAL AMERICAS | MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES | SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO |
| 1380-L1-020 | NORTE | ALCALA | MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA | SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO |
| 1380-L1-019 | AMERICAS | PORTAL AMERICAS | MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES<br><br>MET 06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA LA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES PLATAFORMA 1 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION |
| 1380-L1-021 | NQS SUR | GENERAL SANTANDER | MET 09 - CAMBIODE PISO EN RAMPA Y/OPUENTE PEATONAL INTERNO | SE ENCUENTRA EN FABRICACION EL PISO |
| 1380-L1-022 | AMERICAS | BANDERAS | MET 11 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA FACHADA VAGONES ETAPA 2 | EN FABRICACION CELOSIAS |
| 1380-L1-023 | AMERICAS | BANDERAS | MET-04 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES | EN FABRICACION PUERTAS |
| 1380-L1-024 | AMERICAS | BANDERAS | MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN | EN FABRICACION LAMINAS |
| 1380-L1-025 | NORTE | NORTE | MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA | EN ESPERA DE APROBACION DE PMT |



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

### 2.1.1. MET 06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA LA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES PLATAFORMA 2

Portal Américas Plataforma 2, se desarrolla la actividad instalación de lámina microperforada:

| TRONCAL | ESTACION | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| AMERICAS | PORTAL AMERICAS | 1380-L1-016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA LA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES PLATAFORMA 2 |
| **ANTES** | **DURANTE** | **DESPUES** |
|  |  |  |



### 2.1.2. MET 05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES

En el Portal Américas, en Plataforma 2, se ejecuta esta actividad:

| TRONCAL | ESTACION | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| AMERICAS | PORTAL AMERICAS | 1380-L1-017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISIÓN OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES – PLATAFORMA 2 |
| **ANTES** | **DURANTE** | **DESPUES** |
|  |  |  |

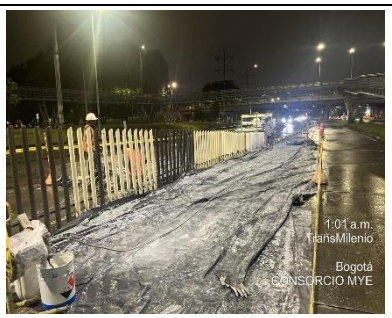




CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

### 1.1.1. MET 03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

La estación Alcalá, se realizó cerramiento tipo onda por los 2 costados, tanto Norte sur, como Sur Norte.

| TRONCAL | ESTACION | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| NORTE | ALCALA | 1380-L1-020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA |
| **ANTES** | **DURANTE** | **DESPUES** |
|  |  |  |

## 2.2. Componente de Calidad

De acuerdo a plan de Inspección y Calidad presentado a interventoría, tomamos los registros correspondientes a los ítems de las actividades ejecutadas en el mes.

### 2.2.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo

En el marco del plan de inspección de calidad de los elementos fabricados e instalados, se siguen los parámetros para la validación de los estándares de aceptación de cada uno de los elementos.

Para todos los ítems del contrato, se siguen tres aspectos de control de calidad, uno de ellos es la verificación visual, en donde se debe validar que cada uno de los cordones de soldadura para los elementos que requieran soldaduras, y que las diferentes de la rejillas o celosías estén correctamente soldadas y sobre todo que no falte ningún cordón en las diferentes uniones del elemento.

Las validaciones practicadas a los materiales fabricados se harán a una muestra representativa del total del lote, para este caso en particular, se realizarán las inspecciones al 10% de los elementos, como indica en el plan de inspección de calidad del contrato.

Como segunda medida, se valida la dimensionalidad de los elementos fabricados, se valida la ortogonalidad de las celosías, en donde, se toman las medidas longitudinales y



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

transversales las cuales deben coincidir en cada sentido, luego se debe tomar la medida de las dos diagonales, las cuales deben coincidir y de tal manera certificar que el elemento cumple dimensionalmente.

A continuación, presentamos un registro de las evidencias de estas inspecciones y verificaciones realizadas tanto en taller como en obra

***Ilustración 1.*** *Verificación elementos*

**Verificación de medidas en celosías en taller**







**Verificación elementos metálicos cerramiento tipo Onda**

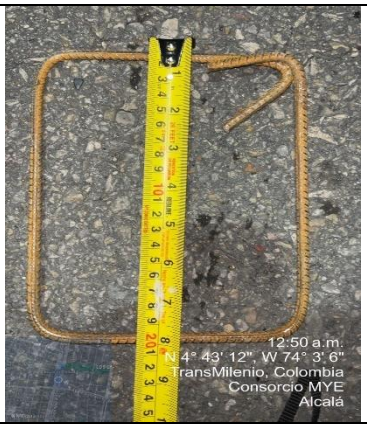






**Validación de flejes para viga de cimentación del cerramiento MET 03 en obra**






CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

**Validación de plomos, medidas y altura del MET 03 en obra**




***Ilustración 2.*** *Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en taller*




***Ilustración 3.*** *Mediciones de espesor de pintura en elementos Metálicos en obra*




Como conclusión se valida que los espesores de pintura requeridos de acuerdo a la especificación cumplen.



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Por otra parte, para validar el cumplimiento del Plan de Inspección y Calidad, se presentan en el informe mensual, los registros correspondientes de las fichas técnicas y de los certificados de calidad, de los materiales o insumos con los cuales se desarrollan las ordenes de trabajo asignadas al proyecto, de acuerdo a la siguiente tabla:

***Tabla 5*** *Certificados de calidad de los materiales*

| 4.3.13 Certificados de calidad de los materiales Y fichas tecnicas: | | |
|---|---|---|
| AACERO | BARRA DE ACEROC ORRUGADO DE 1/2" | |
| TUBERIAS | TUBO COLD ROLLED 50 (50X15X1,5 MM). | LA CAMPANA |
| | TUBO ESTRUCTURAL HR 50 (50X25X1,5MM). | LA CAMPANA |
| | PLATINAS DE 3/16". | 250115Z01053 |
| | PLATINAS DE 7/16"x2". | 76960 |
| | TUBO A.N. 2 1/2". | |
| | PEH1.4SUP 160.60 | |
| | TUBO REDONDO 2 | LA CAMPANA |
| | TUBO A.N. 2 1/2". | LA CAMPANA |
| | TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2 CAL 0,59 10X10 | COLMENA |
| | TUBO CR RECTANGULAR 2X1X6 | AGOFER |
| | TUBO CR RECTANGULAR 3 X 1.12 | AGOFER |
| PINTURA | SUPER EPOXI IMPRIMANTE FOSFATO DE ZINC | PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS |
| | AUTOIMPRIMANTE FOSFATO DE ZINC | PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS |
| | PINTURA | PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS |
| | AJUSTADOR 21-06 | SIGMAFAST 278 |
| LAMINAS | LAMINA GALVANIZADA CAL 18. | |
| | LAMINA ALFAJOR | 3.00 X1.00 X 3 |
| | LAMINA ALFAJOR | 3.00 X1.20 X 3 |
| SOLDADURA | SOLDADURA 6010 | WEST ARCO |
| | SOLDADURA 7018 | |

# 3. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST

El Consorcio MYE implementa el Sistema de Gestión de SST (SG-SST) conforme a la normatividad legal y contractual, priorizando la prevención de riesgos laborales, la protección de los trabajadores y la garantía de entornos seguros, dando cumplimiento al 812% el plan de trabajo del SGSST.

## 3.1. Personal del proyecto

El equipo cuenta con ingenieros de SST, ambientales, inspectores, residentes de obra y personal administrativo, con organigrama y estructura definida para la ejecución del contrato.



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

### 3.1.1. Personal SST

*Tabla 6. Personal Calidad y SST*

| PROFESIONAL | CARGO |
|---|---|
| Oscar Ciendua Torres | Ing. de Calidad Y SST – interventoría |
| Catherine Duque Botero | Ing. de Calidad Y SST |
| Miguel Ángel Briceño Velosa | Ing. de Calidad Y SST |
| Tatiana Rocío Ricardo Torres | Inspector Calidad Y SST |

### 3.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración

*Tabla 7. Personal Profesionales y Plantilla Mínima*

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Antonio Ávila Navarro | 1.020.795.956 | Coordinador De Proyecto - Apoyo |
| 2 | Jeny Angelica Sierra Mayorga | 52.027.642 | Director De Proyecto |
| 3 | Vilma Zulay Zarate Pérez | 68.298.776 | Residente De Obra |
| 4 | Edward Fabian Martínez Palomino | 1.019.104.383 | Residente De Obra |
| 5 | Miguel Ángel Briceño Velosa | 80.029.706 | Ing. Calidad SST |
| 6 | Katherine Duque Botero | 52.849.283 | Ing. Calidad SST |
| 7 | Jorge Eduardo Rodríguez Martínez | 1.032.362.166 | Ing. Ambiental |
| 8 | Jennifer Astrid Capera Sánchez | 1.136.880.609 | Ing. Ambiental |
| 9 | Tatiana Rocio Ricardo Torres | 1067845626 | Inspector De Calidad y SST |
| 10 | Liseth Katherine Márquez Ochoa | 1.030.599.549 | Inspector Ambiental |
| 11 | Robert Andrés Torres Rojas | 1.024.501.619 | Inspector De Obra |
| 12 | Sergio Hernán Mateus Useche | 1.016.097.191 | Inspector De Obra |
| 13 | Juan Felipe Cornejo Nieto | 1.015.484.496 | Auxiliar Administrativo |
| 14 | Rafael Antonio Niño Rodríguez | 1.121.326.909 | Almacenista |
| 15 | Anderson Esneyder García Quintero | 1.015.476.931 | Auxiliar Administrativo |
| 16 | Daniel Antonio Ávila Navarro | 1.020.795.956 | Coordinador De Proyecto - Apoyo |

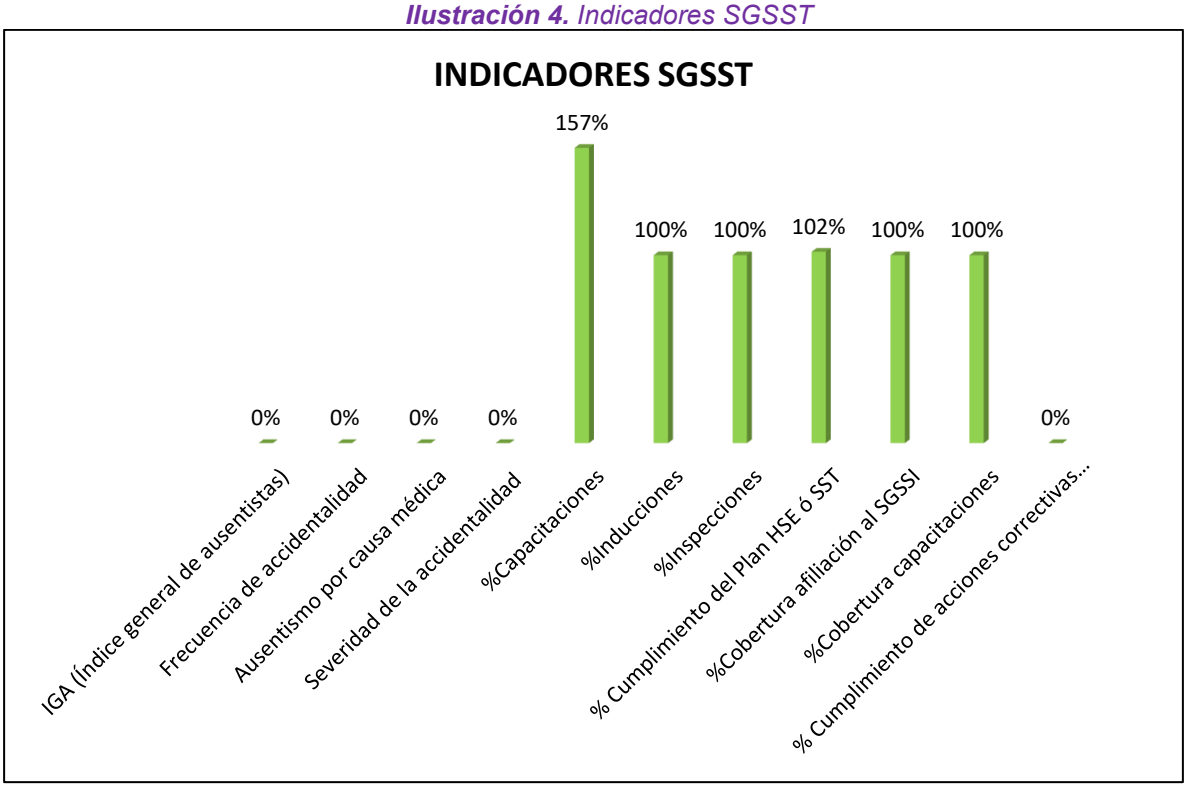


CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

## 3.2. Gestión SST Durante el Periodo

- Inducción y notificación de riesgos: 100% del personal cumplió – Total 6 ingresos.
- Afiliación a seguridad social: soportada para todo el personal.
- Comités: COPASST y de Convivencia Laboral constituidos y con acta de reunión mensual.
- Entrega de EPP: realizada con soportes.
- Capacitaciones e inspecciones: ejecutadas según cronograma de capacitación, 11 temas, programados 7 temas, se ejecutó mayor temario a necesidad del proyecto cumpliendo al 157%.
- Exámenes médicos ocupacionales: aplicados a los 6 ingresos.
- Accidentalidad: no se reportaron accidentes, ni incidentes de trabajo.
- Indicadores SG-SST: cumplimiento satisfactorio, en accidentalidad a 0% y cumplimientos al 102%.
- Afectación a usuarios: no se presentaron eventos.

***Ilustración 4.*** *Indicadores SGSST*




En conclusión, El Consorcio MYE cumple con la implementación del SG-SST, garantizando condiciones de seguridad y salud adecuadas para el personal.



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Se evidencian controles efectivos en afiliaciones, inducciones, comités, entrega de EPP, capacitaciones y exámenes médicos.

No se presentaron accidentes, incidentes laborales ni afectaciones a usuarios.

Las actividades técnicas avanzan conforme al cronograma establecido.

## 4. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre de 2025, se adelantaron actividades de gestión y seguimiento orientadas al manejo de residuos y a la implementación de medidas de protección en las estaciones asignadas de Transmilenio. Estas acciones se enmarcaron en los lineamientos establecidos para garantizar un desarrollo de las obras bajo parámetros de sostenibilidad, seguridad y responsabilidad ambiental.

En relación con los residuos peligrosos (RESPEL), se efectuó el almacenamiento a los gestores debidamente autorizados, y se está a la espera de la recolección de estos lo que asegura la trazabilidad de su disposición final y el cumplimiento de la normativa aplicable. Dichos residuos fueron clasificados, rotulados y almacenados en condiciones seguras mientras se adelantan las gestiones de recolección. Adicionalmente durante este periodo fue remitido el certificado Respel faltante a lo cual el día 16 de octubre se hizo el cargue en el aplicativo WEB de la secretaria de ambiente (SDA) de todos los certificados Respel y RCD de los meses de agosto y septiembre

En el desarrollo de las actividades de campo, se implementaron diversas medidas preventivas y de control, tales como la instalación de cubrimientos en pisos y estructuras durante los trabajos de pintura para evitar deterioro o contaminación de superficies, la colocación de barreras en sumideros durante las fundidas de concreto con el fin de impedir el ingreso de sedimentos a la red de alcantarillado, y la verificación del cumplimiento de los parámetros relacionados con emisiones atmosféricas y generación de ruidos, garantizando que estos no representaran molestias o afectaciones a la comunidad ni al entorno cercano.

De manera complementaria, se llevaron a cabo inspecciones periódicas a los kits de control de derrames, constatando su disponibilidad y buen estado en todos los frentes de trabajo. No fue necesario su uso, dado que durante el periodo no se registraron incidentes de este tipo, lo cual refleja la eficacia de las medidas preventivas aplicadas en el manejo de sustancias peligrosas.

El día 14 de octubre se realizó la entrega del mobiliario desmontado en las estaciones que se encuentran en adecuación por parte del consorcio, esta actividad de realizo en acompañamiento de la interventoría la cual verifico y superviso esta entrega en el Patio de la hoja de Transmilenio y se generó el acta de entrega correspondiente.

Finalmente, se consolidó un registro fotográfico que documenta y respalda todas las actividades ejecutadas, constituyendo evidencia verificable del cumplimiento de las



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

obligaciones en materia ambiental y de la correcta implementación de las medidas establecidas durante el periodo presentado.

## 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

La ejecución presupuestal que se presenta a continuación corresponde a las órdenes de trabajo finalizadas y debidamente recibidas por la interventoría, las cuales constituyen la base para el cálculo de los valores aquí reportados. La información consignada puede ser verificada en el acta de costos, documento en el que se registran y validan los montos asociados a cada una de las actividades ejecutadas.

***Tabla 8.*** *Ejecución presupuestal general del contrato*

| CONCEPTO | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | VALOR EJECUTADO | % | VALOR PENDIENTE |
| VALOR PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN | | $ 11,059,277,729.00 | 33.42% | $ 3,696,514,171.00 | 66.58% | $ 7,362,763,558.00 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE ADECUACION | 24.33% | $ 2,690,722,271.00 | 32.05% | $ 862,396,756.00 | 67.95% | $ 1,828,325,515.00 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE ADECUACIÓN - INCLUIDO EL AIU: | | $ 13,750,000,000.00 | 33.16% | $ 4,558,910,927.00 | 66.84% | $ 9,191,089,073.00 |

Como se observa en la tabla anterior, a la fecha se ha ejecutado el 33.16% del valor total del contrato, correspondiente a **$4,558,910,927.00**, quedando un saldo pendiente por ejecutar de **$9,191,089,073.00**, equivalente al 66.84% del valor contractual.

***Tabla 9.*** *Ejecución Presupuestal por Troncal*

| TRONCAL | VALOR EJECUTADO | % | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| NORTE | $ 1,627,293,828.00 | 44.02% | 44.02% |
| AMERICAS | $ 942,986,884.00 | 25.51% | 69.53% |
| CALLE 26 | $ 801,430,599.00 | 21.68% | 91.21% |
| NQS SUR | $ 324,802,860.00 | 8.79% | 100.00% |
| CARRERA DECIMA | $ - | 0.00% | 100.00% |
| CARRERA SEPTIMA | $ - | 0.00% | 100.00% |

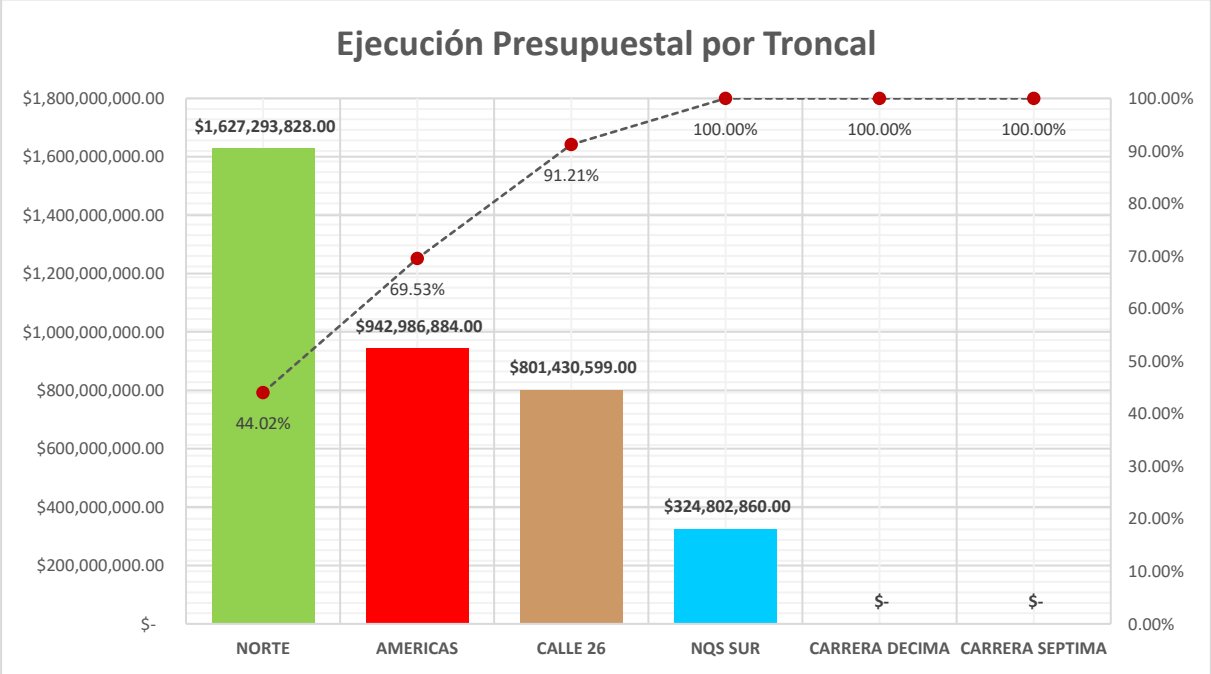
De igual manera, se puede observar que, a la fecha de corte, la troncal con mayor inversión corresponde a la troncal NORTE, con una inversión de **$1,627,293,828.00**, equivalente al 44,00% del valor total ejecutado. En segundo lugar, se encuentra la troncal AMERICAS, con **$942,986,884.00** (25.51 %), seguida la troncal CALLE 26, con **$801,430,599.00**, y finalmente la troncal NQS SUR, con **$324,802,860.00**. De esta manera, el valor total de la ejecución presupuestal asciende a **$3,696,514,171.00.**



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Cabe destacar que, a la fecha, no se han adelantado actividades en las troncales CARRERA DÉCIMA y CARRERA SÉPTIMA, toda vez que no se han emitido órdenes de trabajo para dichos corredores.

***Ilustración 5.*** *Ejecución Presupuestal por troncal*




## 6. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA

Este informe corresponde al Informe Ejecutivo correspondiente **al Periodo No. 03, entre el 21 de septiembre al 20 de octubre de 2025,** como resumen del Informe Mensual presentado y que se encuentra en los documentos relacionados con el Contrato 1380 de 2025.

Adicionalmente todos los documentos relacionados con el informe Mensual del Contratista Consorcio MYE Bogotá, correspondiente al Periodo No. 03, entre el 21 de septiembre al 20 de octubre de 2025, se encuentran alojados en la plataforma SECOP II, en los Documentos de Ejecución del contrato 1380 de 2025.

La Interventoría, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.
