


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
1		**CONVENIO No. 4133.010.27.1.035-2025**	**62.63 días**	**lun 26/01/26**	**sáb 25/04/26**		
2		**PARQUES**	**58.5 días**	**lun 26/01/26**	**mar 21/04/26**		
3		**PARQUETIPO - Comuna 1**	**11 días**	**lun 26/01/26**	**lun 9/02/26**		
4		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 26/01/26**	**mar 27/01/26**		
5		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
6		BODEGAJE	1 día	mar 27/01/26	mar 27/01/26	5	
7		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	1 día	mar 27/01/26	mar 27/01/26	5	
8		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	mar 27/01/26	mar 27/01/26	5	
9		**2. OBRA CIVIL**	**10 días**	**lun 26/01/26**	**vie 6/02/26**		
10		**DEMOLICIONES**	**1 día**	**mié 28/01/26**	**mié 28/01/26**		
11		DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	8	
12		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	8	
13		**BORDILLOS**	**7 días**	**jue 29/01/26**	**vie 6/02/26**		
14		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) HI=36-45CM	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	15	
15		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	18	
16		EXCAVACION TIERRA A MANO	2 días	jue 29/01/26	vie 30/01/26	12	
17		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	16	
18		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	16	
19		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	14	
20		**LOSETA TÁCTIL**	**5 días**	**lun 26/01/26**	**vie 30/01/26**		
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26		
22		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	12	
23		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	22	
24		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	12	
25		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	22	
26		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
27		**ACARREOS DE EXCAVACIONES**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
28		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	16	
29		**ANDEN EN CONCRETO**	**4 días**	**jue 29/01/26**	**mar 3/02/26**		
30		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	12	
31		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	30	
32		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	30	
33		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26	32	
34		DEMOLICIÓN ANDEN E= 0.10	0.5 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	11	
35		**2. AMOBLAMIENTO**	**4 días**	**mar 27/01/26**	**vie 30/01/26**		
36		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	8	
37		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	2 días	jue 29/01/26	vie 30/01/26	36	
38		MANTENIMIENTO JUEGO(S) INFANTIL(ES) EXISTENTE(S)	2 días	jue 29/01/26	vie 30/01/26	36	
39		JUEGO INFANTIL	1 día	mar 27/01/26	mar 27/01/26		
40		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**lun 9/02/26**	**lun 9/02/26**		
41		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	19	
42		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	19	
43		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**4 días**	**mié 28/01/26**	**lun 2/02/26**		
44		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	8	
45		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	8	
46		PRADO GATEADORA	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	45	
47		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	49	
48		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	49	
49		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	45	
50		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	52CC	
51		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	47;48	
52		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	45	
53		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 26/01/26**	**mar 27/01/26**		
54		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26		
55		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 26/01/26**	**jue 29/01/26**		
56		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
57		**PARQUETIPO -Comuna 2**	**5 días**	**lun 2/02/26**	**vie 6/02/26**	**48**	
58		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
59		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
60		BODEGAJE	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	59CC	
61		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	59CC	
62		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
63		**2. AMOBLAMIENTO**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
64		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	36CC	
65		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	64	
66		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
67		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**vie 6/02/26**	**vie 6/02/26**		
68		LIMPIEZA GENERAL	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	74	
69		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	74	
70		**4. ADECUACION PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**4 días**	**mar 3/02/26**	**vie 6/02/26**		
71		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	72;62	
72		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	62	
73		PRADO TRENZA	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	72	
74		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	71	
75		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	71	
76		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	2 días	mar 3/02/26	mié 4/02/26	62	
77		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	79	
78		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	75	
79		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	62	
80		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
81		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26		
82		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 2/02/26**	**jue 5/02/26**		
83		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26		
84		**PARQUETIPO - Comuna 3**	**7 días**	**lun 2/02/26**	**mar 10/02/26**	**59CC**	
85		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
86		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	59CC	
87		BODEGAJE	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
88		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
89		**2. OBRA CIVIL**	**4 días**	**mar 3/02/26**	**vie 6/02/26**		
90		EXCAVACION TIERRA A MANO	2 días	mar 3/02/26	mié 4/02/26	88	
91		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	90	
92		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	90	
93		ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	92	
94		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	92	
95		**3. AMOBLAMIENTO**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
96		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	36CC	
97		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	96	
98		JUEGO INFANTIL	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26		
99		**4. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**lun 9/02/26**	**lun 9/02/26**		
100		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	93	
101		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	93	
102		**5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**6 días**	**mar 3/02/26**	**mar 10/02/26**		
103		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	108	
104		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	88	
105		PRADO TRENZA	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	104	
106		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	103	
107		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	103	
108		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	104	
109		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	111	
110		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	107	
111		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	104	
112		**6. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
113		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26		
114		**7. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
115		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
116		**PARQUETIPO - Comuna 4**	**10 días**	**lun 2/02/26**	**vie 13/02/26**	**59CC**	
117		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
118		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		

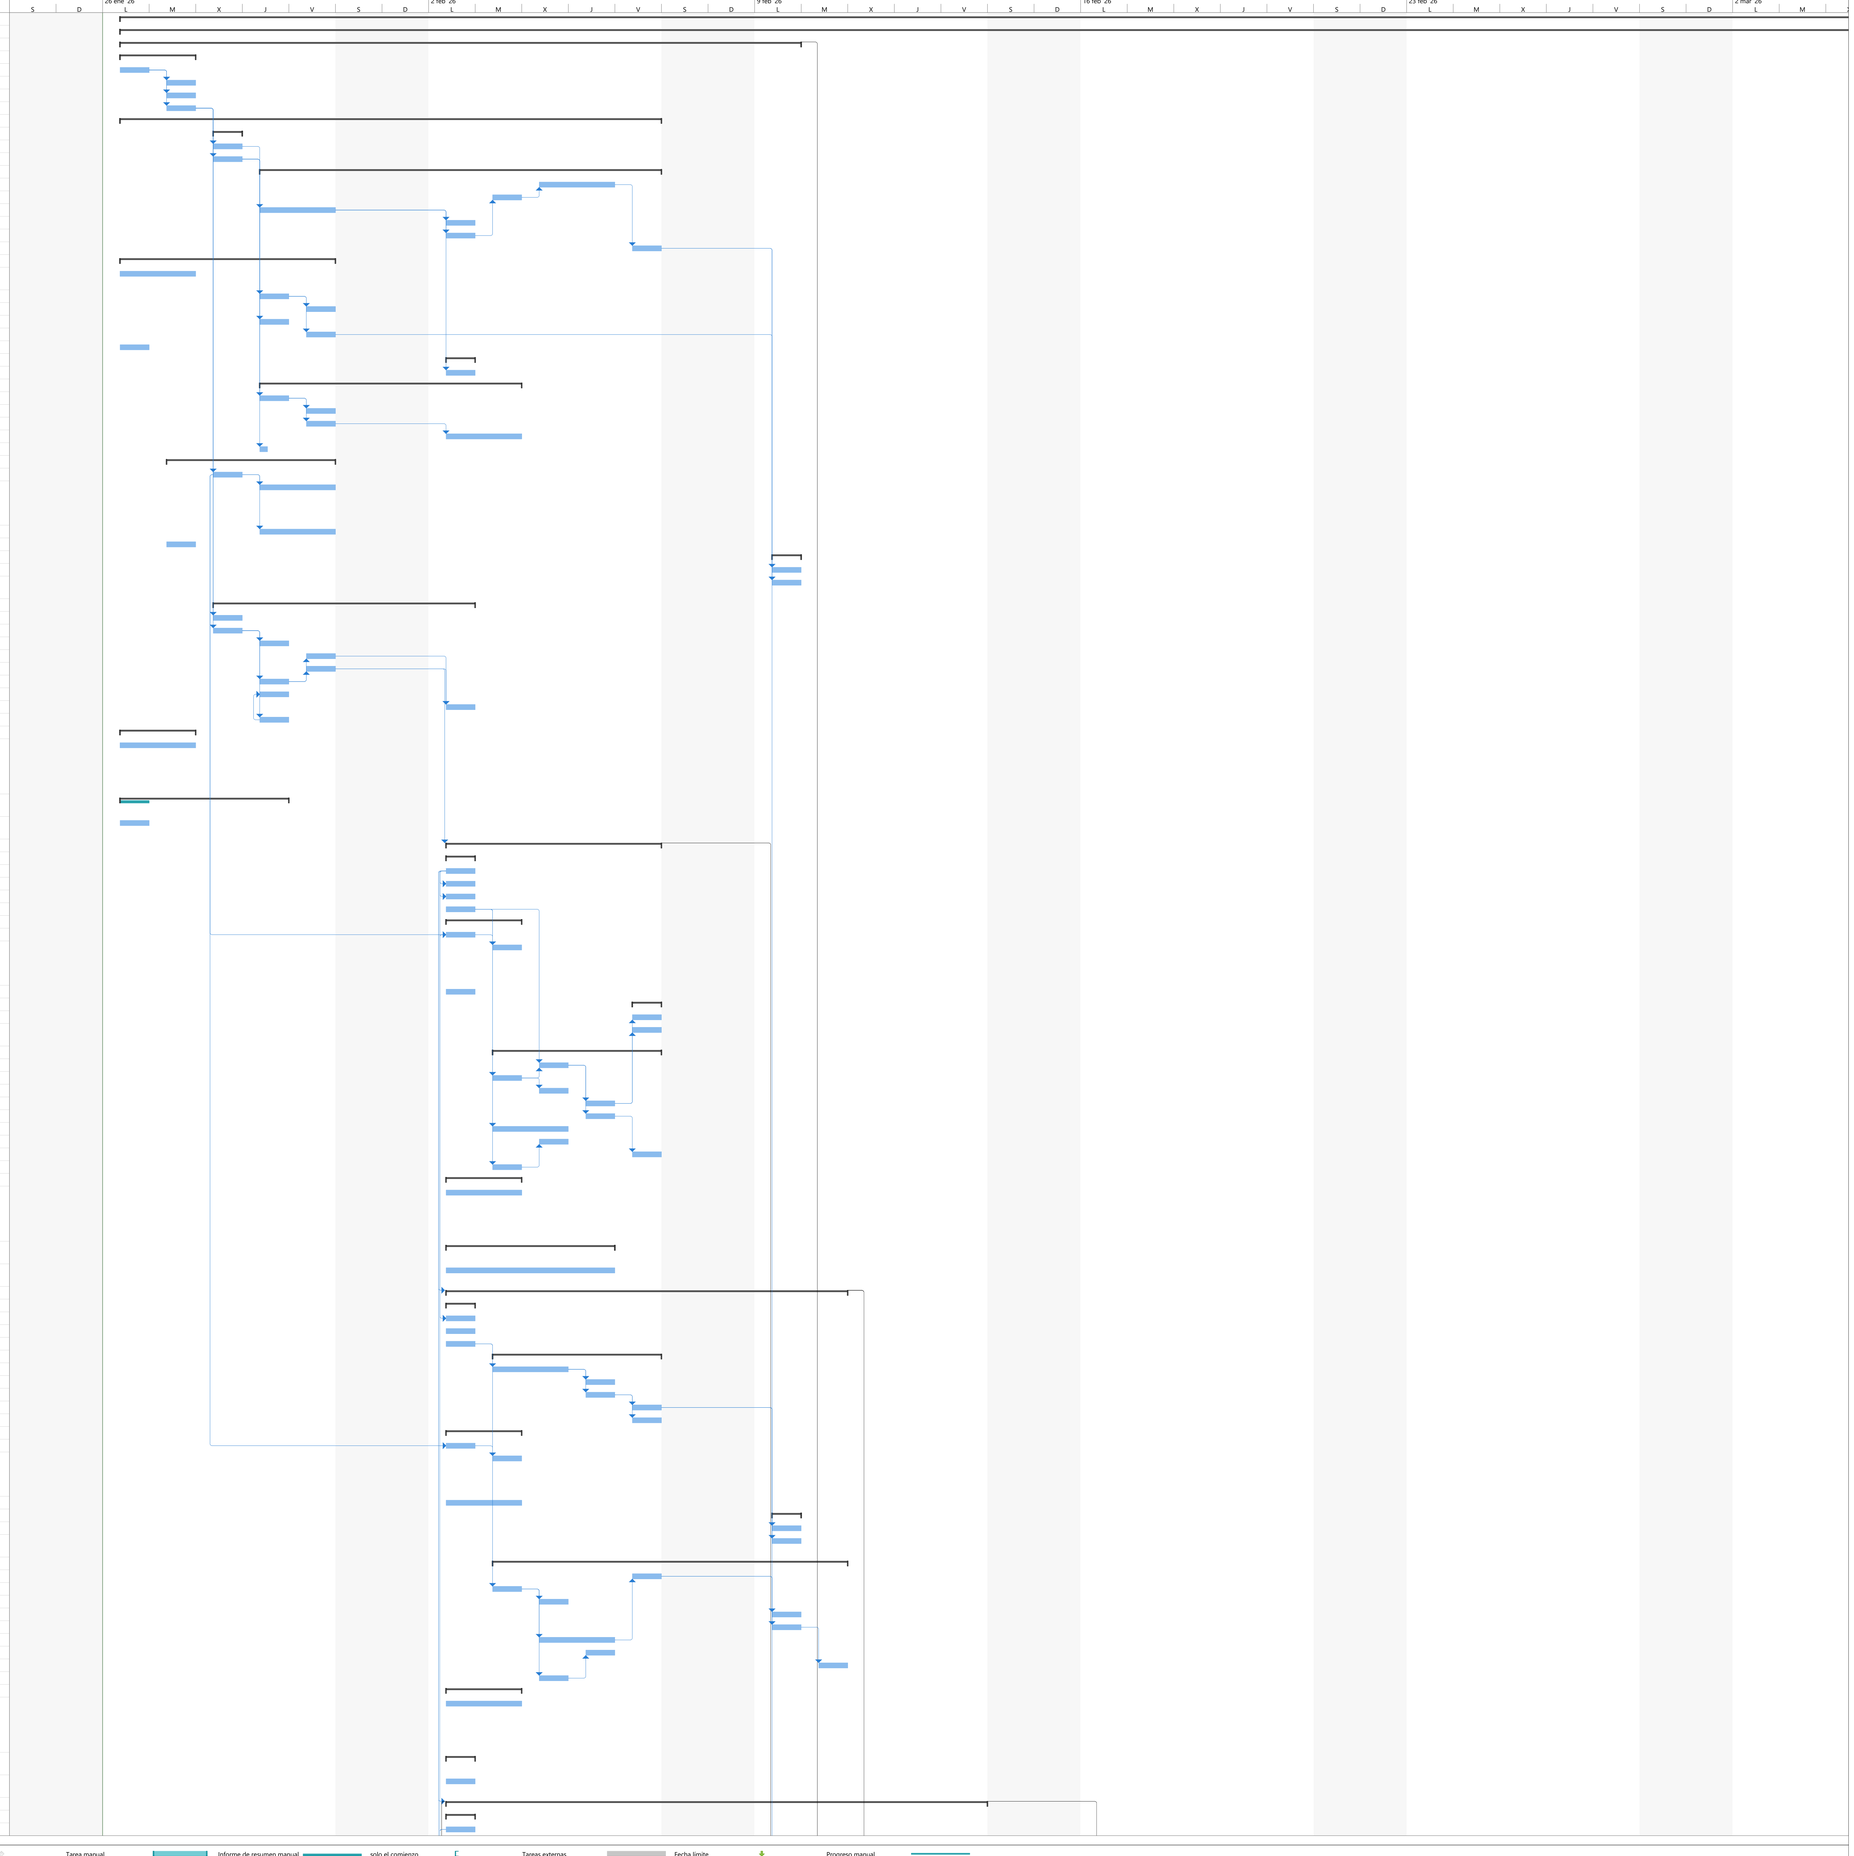

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
119		CAMPAMENTO TABLA 9 M2	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	118CC	
120		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	118CC	
121		**2. OBRA CIVIL**	**9 días**	**mar 3/02/26**	**vie 13/02/26**		
122		**DEMOLICIONES**	**2 días**	**mar 3/02/26**	**mié 4/02/26**		
123		DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	120	
124		DEMOL.ANDEN E=0.10	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	120	
125		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	124;123	
126		**BORDILLOS**	**8 días**	**mié 4/02/26**	**vie 13/02/26**		
127		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26	128	
128		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	131	
129		EXCAVACION TIERRA A MANO	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	124	
130		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	129	
131		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	129	
132		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	127FC+1 día	
133		**LOSETA TÁCTIL RAMPAS-ACCESOS**	**3 días**	**mié 4/02/26**	**vie 6/02/26**		
134		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	138	
135		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	129CC	
136		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	135	
137		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	129CC	
138		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	135	
139		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	138	
140		**ACARREOS DE EXCAVACIONES**	**1 día**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**		
141		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	135	
142		**3. AMOBLAMIENTO**	**1 día**	**lun 9/02/26**	**lun 9/02/26**		
143		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	134	
144		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	134	
145		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26		
146		**4. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**lun 9/02/26**	**lun 9/02/26**		
147		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	134	
148		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	147CC	
149		**5. ADECUACION PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**4 días**	**mar 3/02/26**	**vie 6/02/26**		
150		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	155	
151		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	120	
152		PRADO GATEADORA	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	151	
153		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	155	
154		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	155	
155		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	151	
156		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	158CC	
157		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	153;154	
158		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	151	
159		**6. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
160		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26		
161		**7. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
162		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
163		**PARQUETIPO - Comuna 5**	**6 días**	**lun 2/02/26**	**lun 9/02/26**	**59CC**	
164		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
165		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
166		BODEGAJE	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	165CC	
167		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	165CC	
168		**2. OBRA CIVIL**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
169		**DEMOLICIONES**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
170		DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
171		DEMOL.ANDEN E=0.10	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
172		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	171	
173		**BORDILLOS**	**5 días**	**lun 2/02/26**	**vie 6/02/26**		
174		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	175	
175		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	178	
176		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	167	
177		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	176	
178		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	177CC	
179		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
180		**LOSETA TÁCTIL**	**4 días**	**mar 3/02/26**	**vie 6/02/26**		
181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	185CC	
182		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	176CC;184	
183		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	182	
184		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	167	
185		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	183CC	
186		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	185	
187		**ACARREOS DE EXCAVACIONES**	**1 día**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**		
188		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	182;176	
189		**ADECUACIÓN DE JUEGOS INFANTILES**	**2 días**	**mié 4/02/26**	**jue 5/02/26**		
190		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	184	
191		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	190	
192		RELLENO GRAVA REDONDEADA	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	191CC	
193		**3. AMOBLAMIENTO**	**2 días**	**lun 2/02/26**	**mar 3/02/26**		
194		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	64CC	
195		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	194	
196		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
197		**4. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**lun 2/02/26**	**lun 2/02/26**		
198		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
199		CESTO DE BASURA	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
200		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26		
201		**5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**mar 3/02/26**	**lun 9/02/26**		
202		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	207	
203		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	167	
204		PRADO GATEADORA	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	203	
205		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	207	
206		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	207	
207		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	204	
208		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	204	
209		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	206	
210		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	204	
211		**6. COMPONENTE EDUCATIVO**	**4 días**	**lun 2/02/26**	**jue 5/02/26**		
212		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26		
213		**7. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 2/02/26**	**jue 5/02/26**		
214		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26		
215		**PARQUETIPO - Comuna 6**	**7 días**	**lun 9/02/26**	**mar 17/02/26**	**57**	
216		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 9/02/26**	**lun 9/02/26**		
217		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26		
218		BODEGAJE	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26		
219		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26		
220		**2. OBRA CIVIL**	**7 días**	**lun 9/02/26**	**mar 17/02/26**		
221		**ANDENES PERIMETRALES EN ADOQUÍN**	**7 días**	**lun 9/02/26**	**mar 17/02/26**		
222		DEMOLICIÓN SARDINEL EN CONCRETO 15X15 CM	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	228	
223		EXCAVACIÓN DE TIERRA A MANO	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	222	
224		DEMOLICION DE ANDEN E=10 CM	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	222CC	
225		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	223	
226		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	25	
227		DESMONTE CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	219	
228		CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	229	
229		BORDILLO DE CONFINAMIENTO	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	227	
230		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	223CC	
231		ADOQUIN GRESS PEATONAL H = 2.5	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	226	
232		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	231	
233		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	226	
234		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	229	
235		**2. AMOBLAMIENTO**	**4 días**	**lun 9/02/26**	**jue 12/02/26**		
236		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	232	
237		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26		
238		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**jue 12/02/26**	**jue 12/02/26**		
239		LIMPIEZA GENERAL	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	229	
240		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	239CC	

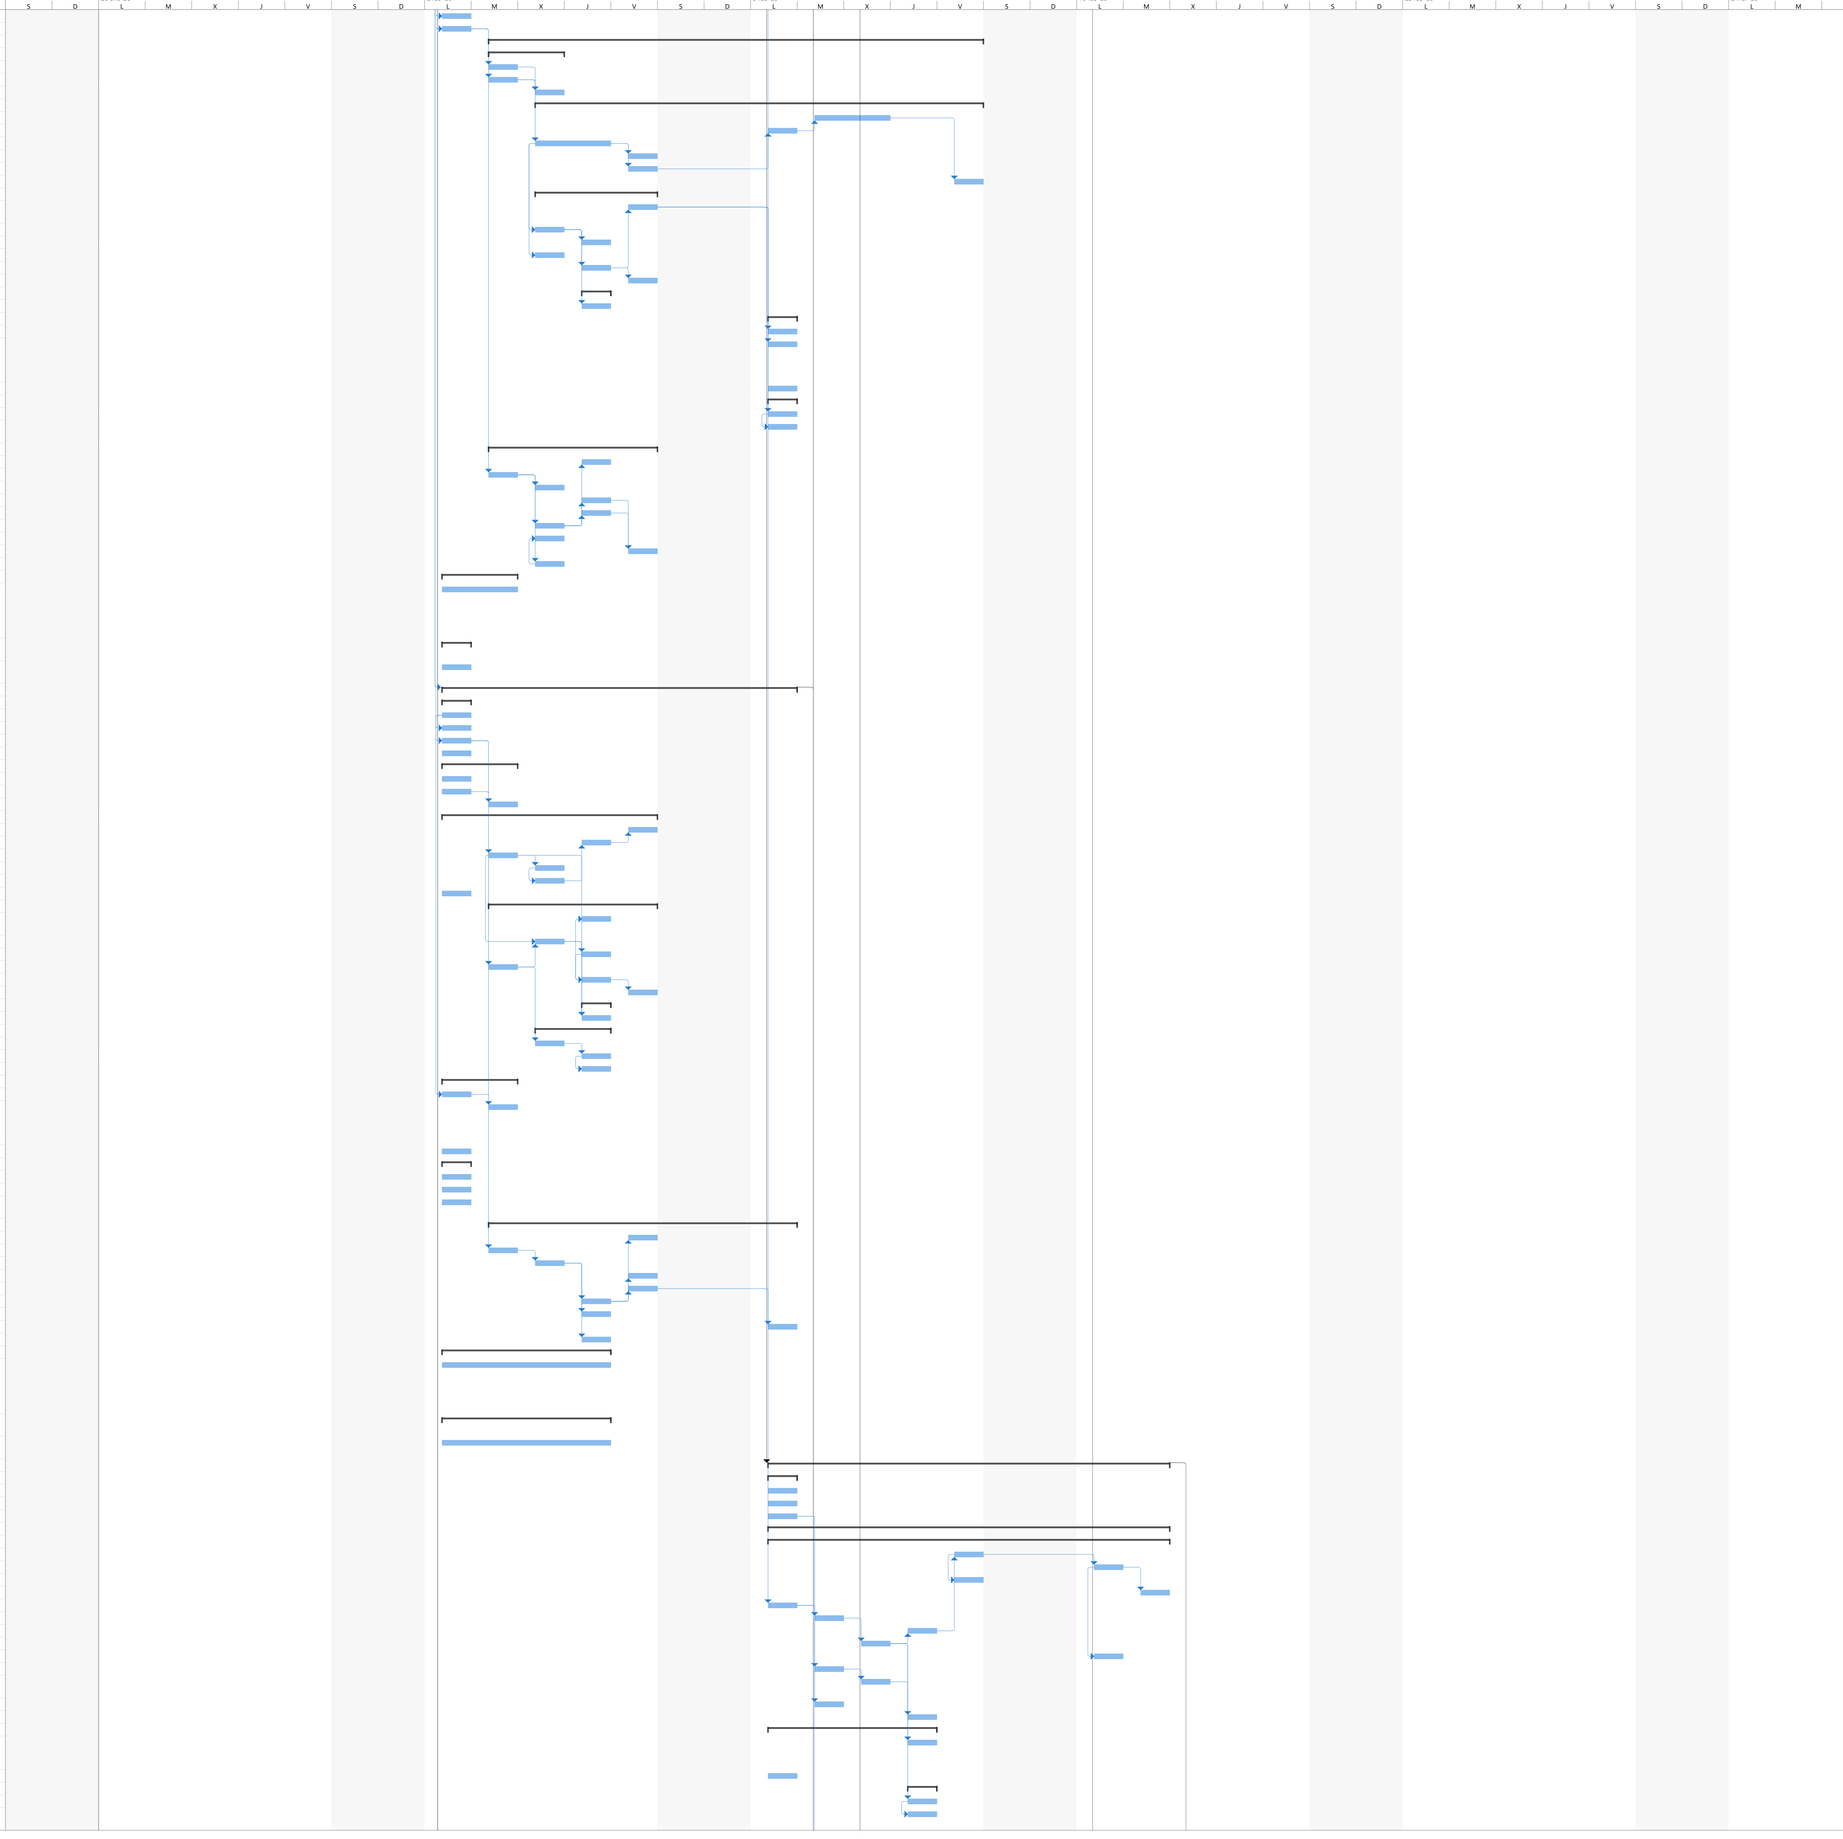


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recurs
241		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**lun 16/02/26**		
242		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	247	
243		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	219	
244		PRADO GATEADORA	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	243	
245		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	247	
246		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	247	
247		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	244	
248		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	250CC	
249		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	245;246	
250		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	244	
251		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 9/02/26**	**mar 10/02/26**		
252		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26		
253		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 9/02/26**	**jue 12/02/26**		
254		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26		
255		**PARQUETIPO - Comuna 7**	**6 días**	**mié 11/02/26**	**mié 18/02/26**	**84**	
256		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**mié 11/02/26**	**jue 12/02/26**	**84**	
257		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26		
258		BODEGAJE	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	257CC	
259		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	257CC	
260		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	259	
261		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**mié 11/02/26**	**mar 17/02/26**		
262		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	260	
263		SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTO DE BASURA EN ACERO INOXIDAB	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	262CC	
264		REPARACION DE JUEGOS EXISTENTE Y JUEGO NUEVO	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26	259	
265		JUEGO INFANTIL	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26		
266		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40 CM X 40 CM X 43 CM	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	259	
267		MURO EN LADRILLO SOGA LIMPIO 1C	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	260	
268		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	267	
269		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**		
270		LIMPIEZA GENERAL	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	267	
271		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	270CC	
272		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**jue 12/02/26**	**mié 18/02/26**		
273		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	278	
274		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	259	
275		PRADO GATEADORA	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	274	
276		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	278	
277		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	278	
278		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	275	
279		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	281CC	
280		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	277	
281		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	275	
282		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**mié 11/02/26**	**jue 12/02/26**		
283		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26		
284		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**mié 11/02/26**	**lun 16/02/26**		
285		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	mié 11/02/26	lun 16/02/26		
286		**PARQUETIPO - Comuna 8**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**lun 16/02/26**	**163**	
287		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 10/02/26**	**mar 10/02/26**		
288		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26		
289		BODEGAJE	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	288CC	
290		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	288CC	
291		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**lun 16/02/26**		
292		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	290FC+2 días	
293		**3. OBRA CIVIL**	**1 día**	mar 10/02/26	mar 10/02/26		
294		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	292	
295		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	290	
296		**4. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**mar 10/02/26**	**mar 10/02/26**		
297		LIMPIEZA GENERAL	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26		
298		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26		
299		**5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**4 días**	**mié 11/02/26**	**lun 16/02/26**		
300		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	305	
301		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	290	
302		PRADO GATEADORA	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	301	
303		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	305	
304		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	305	
305		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	302	
306		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	308CC	
307		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	302	
308		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	302	
309		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	307	
310		**6. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**mar 10/02/26**	**mié 11/02/26**		
311		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26		
312		**7. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**mar 10/02/26**	**vie 13/02/26**		
313		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	mar 10/02/26	vie 13/02/26		
314		**PARQUETIPO - Comuna 9**	**6 días**	**lun 16/02/26**	**lun 23/02/26**	**116**	
315		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 16/02/26**	**lun 16/02/26**		
316		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26		
317		BODEGAJE	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	316CC	
318		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	316CC	
319		**2. AMOBLAMIENTO**	**3 días**	**mar 17/02/26**	**jue 19/02/26**		
320		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	318FC+2 días	
321		REPARACION DE JUEGOS EXISTENTE Y JUEGO NUEVO	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26	318	
322		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	321	
323		SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTO DE BASURA EN ACERO INOXIDAB	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	321	
324		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**vie 20/02/26**	**vie 20/02/26**		
325		LIMPIEZA GENERAL	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	323	
326		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	323	
327		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**mar 17/02/26**	**lun 23/02/26**		
328		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	333	
329		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	318	
330		PRADO GATEADORA	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	329	
331		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	333	
332		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	333	
333		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	330	
334		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	336CC	
335		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	331	
336		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	330	
337		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 16/02/26**	**mar 17/02/26**		
338		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26		
339		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 16/02/26**	**jue 19/02/26**		
340		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26		
341		**PARQUETIPO - Comuna 10**	**6 días**	**mar 17/02/26**	**mar 24/02/26**	**286**	
342		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**		
343		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
344		BODEGAJE	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	343CC	
345		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	343CC	
346		**2. AMOBLAMIENTO**	**6 días**	**mar 17/02/26**	**mar 24/02/26**		
347		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	345FC+2 días	
348		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	325	
349		JUEGO INFANTIL	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
350		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	249CC	
351		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
352		BOLARDO EN CONCRETO	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26		
353		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**		
354		LIMPIEZA GENERAL	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		

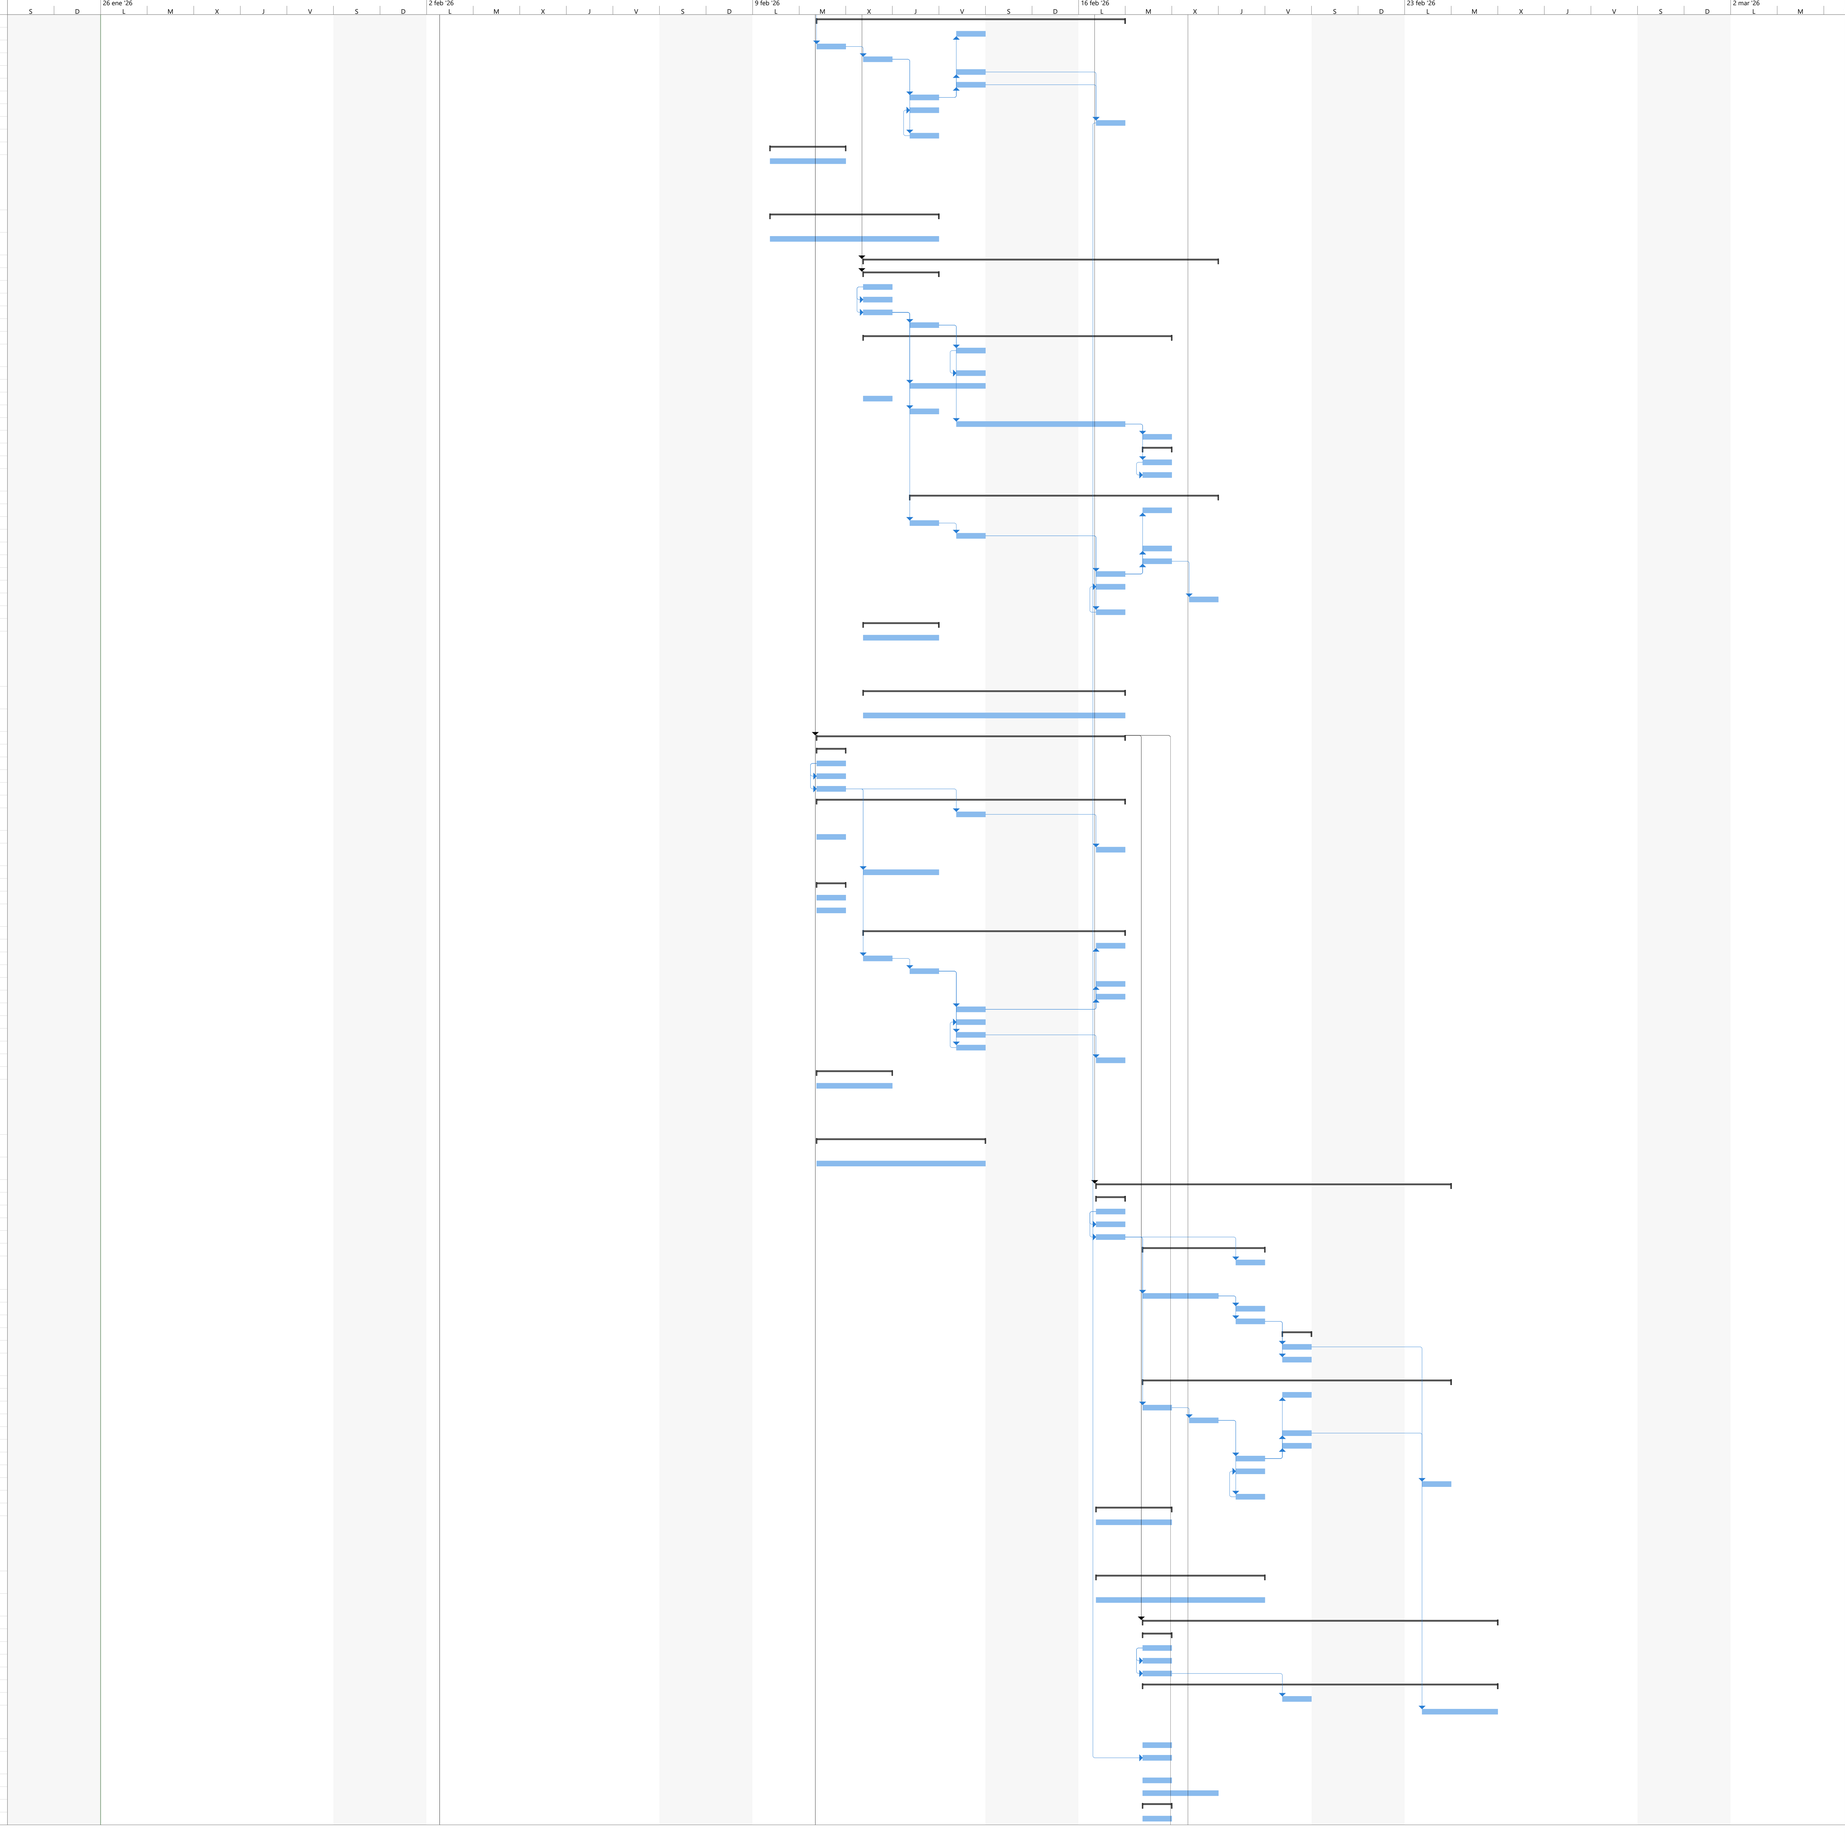

Proyecto: CRONOGRAMA 2026
Fecha: lun 26/01/26


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
355		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
356		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**1 día**	**mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**		
357		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
358		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
359		PRADO GATEADORA	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
360		PLANTA ORNAMELTAL MEDIANA H= 20- 40CM	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
361		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
362		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
363		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
364		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
365		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
366		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**mar 17/02/26**	**mié 18/02/26**		
367		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26		
368		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**mar 17/02/26**	**vie 20/02/26**		
369		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26		
370		**PARQUETIPO - Comuna 11**	**8 días**	**mié 18/02/26**	**vie 27/02/26**	**215**	
371		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 18/02/26**	**mié 18/02/26**		
372		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26		
373		BODEGAJE	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	372CC	
374		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	372CC	
375		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**mié 18/02/26**	**mar 24/02/26**		
376		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	374FC+2 días	
377		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	376	
378		JUEGO INFANTIL	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26		
379		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	376CC	
380		PINTURA PAISAJISTICA EN PARQUES	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	381	
381		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	374	
382		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**mié 18/02/26**	**mié 18/02/26**		
383		LIMPIEZA GENERAL	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26		
384		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26		
385		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**lun 23/02/26**	**vie 27/02/26**		
386		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	391	
387		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	381	
388		PRADO GATEADORA	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	387	
389		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	391	
390		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	391	
391		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	388	
392		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	394CC	
393		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	390	
394		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	388	
395		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**mié 18/02/26**	**jue 19/02/26**		
396		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26		
397		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**1 día**	**mié 18/02/26**	**mié 18/02/26**		
398		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26		
399		**PARQUETIPO - Comuna 12**	**7 días**	**mar 10/02/26**	**mié 18/02/26**	**3**	
400		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 10/02/26**	**mar 10/02/26**		
401		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26		
402		CAMPAMENTO TABLA 9 M2	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	401CC	
403		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	401CC	
404		**2. OBRA CIVIL**	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26		
405		***LOSETA***	**4 días**	**mié 11/02/26**	**lun 16/02/26**		
406		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	411	
407		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	403	
408		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	407	
409		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	403	
410		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	407	
411		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	408	
412		***ACARREOS DE EXCAVACIONES***	**1 día**	**mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**		
413		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	406	
414		***ACARREOS DE EXCAVACIONES***	**1 día**	**mar 17/02/26**	**mar 17/02/26**		
415		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	406	
416		**2. AMOBLAMIENTO**	**2 días**	**mar 17/02/26**	**mié 18/02/26**		
417		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	406	
418		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	419	
419		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	406	
420		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**mié 18/02/26**	**mié 18/02/26**		
421		LIMPIEZA GENERAL	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	415	
422		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	421CC	
423		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**mié 11/02/26**	**mar 17/02/26**		
424		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	429	
425		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	403	
426		PRADO GATEADORA	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	425	
427		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	429	
428		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	429	
429		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	426	
430		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	432CC	
431		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	427	
432		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	426	
433		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**mar 10/02/26**	**mié 11/02/26**		
434		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26		
435		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**2 días**	**mar 10/02/26**	**mié 11/02/26**		
436		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26		
437		**PARQUETIPO -Comuna 13**	**9 días**	**lun 16/03/26**	**lun 30/03/26**	**630FC+9 días**	
438		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 16/03/26**	**mar 17/03/26**		
439		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
440		CAMPAMENTO TABLA 9 M2	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
441		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
442		**2. OBRAS CIVILES**	**7 días**	**mar 17/03/26**	**vie 27/03/26**		
443		***BORDILLOS***	**7 días**	**mar 17/03/26**	**vie 27/03/26**		
444		BORDILLO 15X15	3 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	446	
445		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26	447	
446		PINES DE ANCLAJE EN HIERRO # 2 C/.25	2 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	445	
447		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	441	
448		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**lun 16/03/26**	**mar 24/03/26**		
449		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	2 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	441FC+2 días	
450		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
451		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
452		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**vie 27/03/26**	**lun 30/03/26**		
453		LIMPIEZA GENERAL	1 día	vie 27/03/26	lun 30/03/26	444	
454		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 27/03/26	lun 30/03/26	453CC	
455		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**7 días**	**mar 17/03/26**	**vie 27/03/26**		
456		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mié 25/03/26	jue 26/03/26	461	
457		RETIRO PRADO - MALEZA	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	441	
458		PRADO GATEADORA	2 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	457	
459		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	1 día	mié 25/03/26	jue 26/03/26	461	
460		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	1 día	mié 25/03/26	jue 26/03/26	461	
461		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26	458	
462		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26	464CC	
463		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	jue 26/03/26	vie 27/03/26	459	
464		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26	458	
465		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**		
466		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
467		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**		
468		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26		

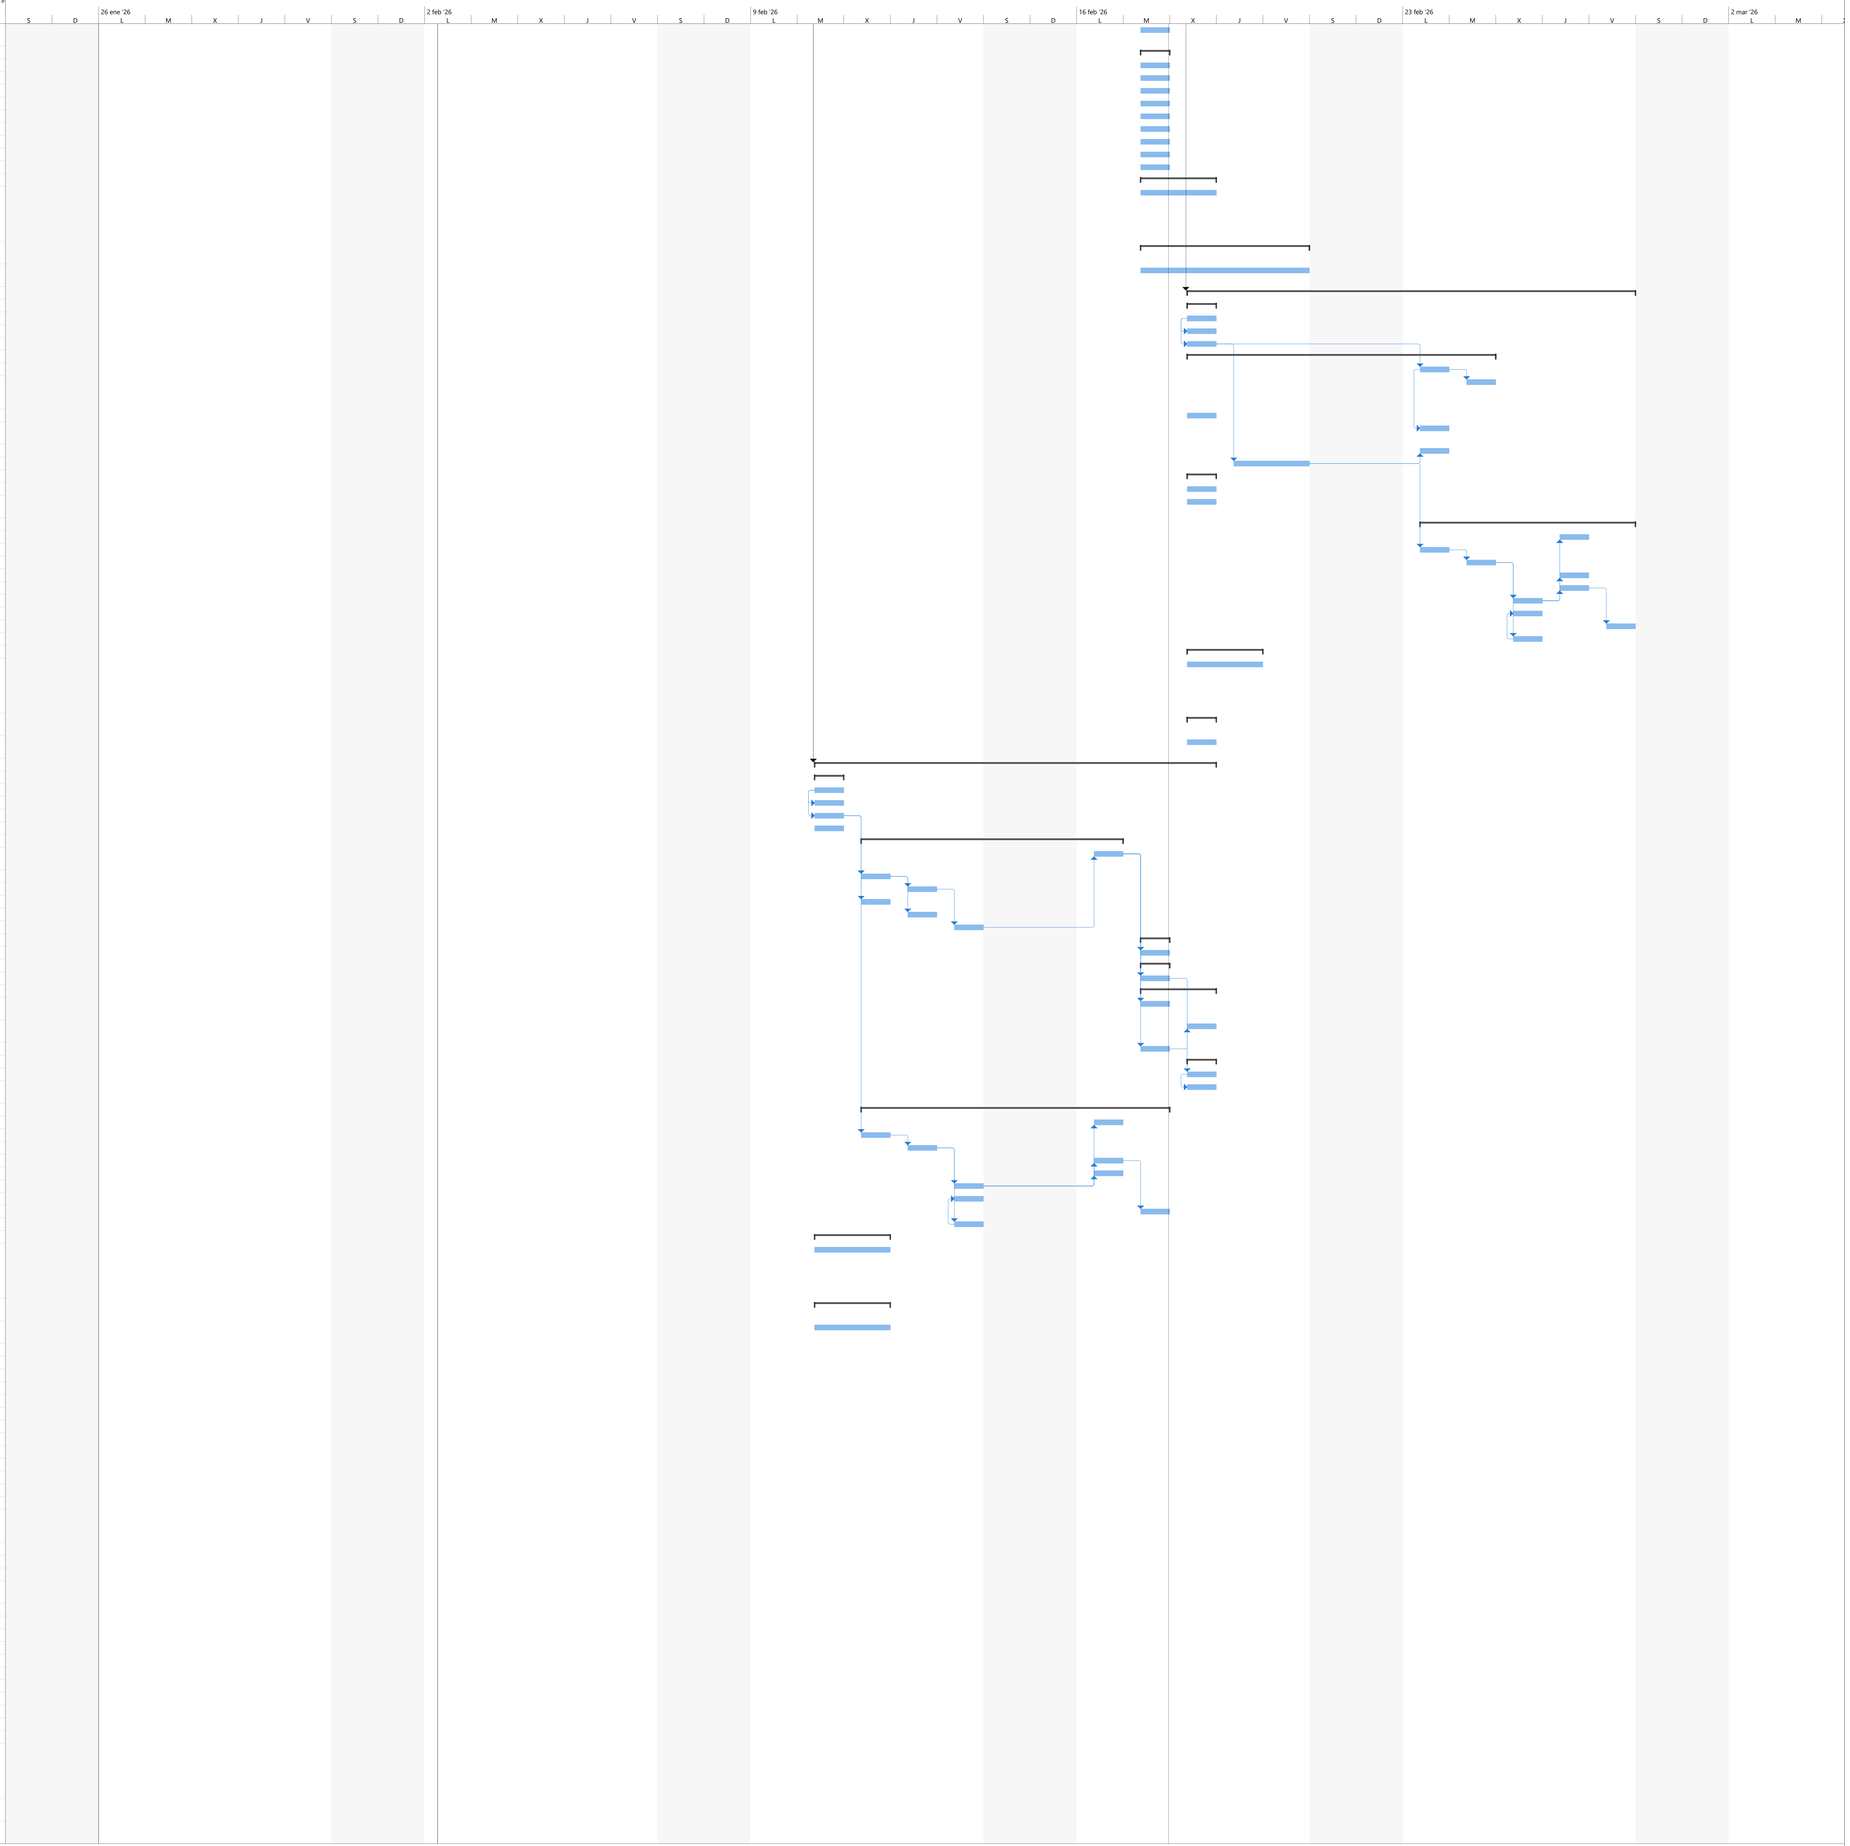


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
469		**PARQUETIPO - Comuna 14**	**21 días**	**lun 16/03/26**	**vie 17/04/26**	**630FC+9 días**	
470		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 6/04/26**	**mié 8/04/26**		
471		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26		
472		CAMPAMENTO TABLA 9 M2	2 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	471CC	
473		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	471CC	
474		**2. OBRA CIVIL**	**19 días**	**lun 16/03/26**	**mié 15/04/26**		
475		**ACCESOS PEATONALES EN CONCRETO CON LOSETA TACTIL**	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
476		***BORDILLOS***	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
477		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	1 día	lun 13/04/26	mar 14/04/26	478	
478		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1 día	vie 10/04/26	lun 13/04/26	482	
479		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mié 8/04/26	jue 9/04/26	473	
480		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	jue 9/04/26	vie 10/04/26	479	
481		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	1 día	mié 8/04/26	jue 9/04/26	473	
482		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	jue 9/04/26	vie 10/04/26	479	
483		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	478FC+1 día	
484		***ACARREOS DE EXCAVACIONES***	**1 día**	**jue 9/04/26**	**vie 10/04/26**		
485		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	jue 9/04/26	vie 10/04/26	479	
486		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**vie 10/04/26**	**vie 17/04/26**		
487		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	2 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	473FC+2 días	
488		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	3 días	mar 14/04/26	vie 17/04/26	477	
489		**3. LIMPIEZA FINAL**	**2 días**	**mar 14/04/26**	**jue 16/04/26**		
490		LIMPIEZA GENERAL	2 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	477	
491		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	490CC	
492		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**6 días**	**mié 8/04/26**	**jue 16/04/26**		
493		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	lun 13/04/26	mar 14/04/26	498	
494		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	mié 8/04/26	jue 9/04/26	473	
495		PRADO GATEADORA	1 día	jue 9/04/26	vie 10/04/26	494	
496		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	2 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	498	
497		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26	498	
498		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	vie 10/04/26	lun 13/04/26	495	
499		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	vie 10/04/26	lun 13/04/26	501CC	
500		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 15/04/26	jue 16/04/26	496	
501		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	vie 10/04/26	lun 13/04/26	495	
502		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**4 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**		
503		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26		
504		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**		
505		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26		
506		**PARQUETIPO - Comuna 15**	**10.13 días**	**mar 17/02/26**	**mar 3/03/26**	**286**	
536		**PARQUETIPO - Comuna 16**	**20 días**	**lun 23/02/26**	**vie 20/03/26**	116CC	
537		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**		
538		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
539		BODEGAJE	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
540		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
541		**2. AMOBLAMIENTO**	**20 días**	**lun 23/02/26**	**vie 20/03/26**		
542		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26		
543		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26		
544		JUEGO INFANTIL	20 días	lun 23/02/26	vie 20/03/26		
545		PINTURA PAISAJISTICA EN PARQUES	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26		
546		EXCAVACION TIERRA A MANO	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
547		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	3 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	546	
548		**3. LIMPIEZA FINAL**	**6 días**	**lun 23/02/26**	**lun 2/03/26**		
549		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	547	
550		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
551		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**6 días**	**lun 23/02/26**	**lun 2/03/26**		
552		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
553		RETIRO PRADO - MALEZA	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
554		PRADO GATEADORA	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	553	
555		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	554CC	
556		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	554CC	
557		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	553	
558		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
559		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	555;556	
560		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	558	
561		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**		
562		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
563		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 23/02/26**	**jue 26/02/26**		
564		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26		
565		**PARQUETIPO - Comuna 17**	**21 días**	**lun 23/02/26**	**lun 23/03/26**	116CC	
566		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**		
567		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
568		BODEGAJE	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
569		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
570		**2. OBRA CIVIL**	**21 días**	**lun 23/02/26**	**lun 23/03/26**		
571		EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
572		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	571	
573		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	572	
574		REPARACION DE JUEGOS EXISTENTE Y JUEGO NUEVO	21 días	lun 23/02/26	lun 23/03/26		
575		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	573	
576		**3. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**lun 23/02/26**	**vie 27/02/26**		
577		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	1.5 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
578		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26		
579		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26		
580		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26		
581		CAUCHO TIPO TOPEROL	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
582		**4. LIMPIEZA FINAL**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**		
583		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
584		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	583	
585		**5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**6 días**	**lun 23/02/26**	**lun 2/03/26**		
586		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1.5 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
587		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
588		PRADO GATEADORA	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	587	
589		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	3 días	mar 24/02/26	jue 26/02/26	587	
590		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	mar 24/02/26	jue 26/02/26	589CC	
591		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	587	
592		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
593		RIEGO DE PRENDIMIENTO	2 días	vie 27/02/26	lun 2/03/26	590;589	
594		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
595		**6. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**		
596		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
597		**7. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 23/02/26**	**jue 26/02/26**		
598		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26		
599		**PARQUETIPO - Comuna 18**	**8.75 días**	**lun 23/02/26**	**jue 5/03/26**	116CC	
630		**PARQUETIPO - Comuna 19**	**7 días**	**lun 23/02/26**	**mar 3/03/26**	116CC	
631		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**		
632		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
633		BODEGAJE	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
634		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	633	
635		**2. OBRAS CIVILES**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**		
636		***DEMOLICIONES***	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
637		DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
638		DEMOL.ANDEN E=0.10	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
639		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
640		***BORDILLOS***	**4.25 días**	**lun 23/02/26**	**vie 27/02/26**		
641		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	1 día	jue 26/02/26	vie 27/02/26	642	
642		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	0.25 días	jue 26/02/26	jue 26/02/26	645	
643		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
644		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	643	
645		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	644	
646		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	645	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
647		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
648		***LOSETA***	**4.75 días**	**mar 24/02/26**	**lun 2/03/26**		
649		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	vie 27/02/26	lun 2/03/26	654	
650		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	652	
651		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	0.5 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	650	
652		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	0.25 días	mar 24/02/26	mar 24/02/26	633	
653		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	mié 25/02/26	jue 26/02/26	651	
654		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	jue 26/02/26	vie 27/02/26	653	
655		***ACARREOS DE EXCAVACIONES***	**1 día**	**vie 27/02/26**	**lun 2/03/26**		
656		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	vie 27/02/26	lun 2/03/26	654	
657		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**lun 23/02/26**	**vie 27/02/26**		
658		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
659		SEÑALETICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26		
660		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26		
661		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
662		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
663		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26		
664		REPARACION DE JUEGOS EXISTENTE Y JUEGO NUEVO	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26		
665		PORTERIA FUTBOL FIJA TIPO 1	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26		
666		**3. LIMPIEZA FINAL**	**2 días**	**lun 2/03/26**	**mar 3/03/26**		
667		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	657	
668		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	667	
669		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**4.5 días**	**lun 23/02/26**	**vie 27/02/26**		
670		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	671	
671		RETIRO PRADO - MALEZA	1.5 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26		
672		PRADO GATEADORA	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	671	
673		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	2 días	mar 24/02/26	jue 26/02/26	671	
674		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	673CC	
675		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	671	
676		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	678	
677		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	673CC	
678		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26		
679		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**4 días**	**lun 23/02/26**	**jue 26/02/26**		
680		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26		
681		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 23/02/26**	**jue 26/02/26**		
682		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26		
683		**PARQUETIPO - Comuna 20**	**7 días**	**lun 16/03/26**	**jue 26/03/26**	**630FC+9 días**	
684		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 16/03/26**	**mar 17/03/26**		
685		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
686		BODEGAJE	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
687		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	686	
688		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**lun 16/03/26**	**mar 24/03/26**		
689		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	5 días	lun 16/03/26	mar 24/03/26		
690		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
691		**3. LIMPIEZA FINAL**	**1 día**	**lun 16/03/26**	**mar 17/03/26**		
692		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
693		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
694		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**7 días**	**lun 16/03/26**	**jue 26/03/26**		
695		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	696	
696		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
697		PRADO GATEADORA	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	695CC	
698		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	3 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	696	
699		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	698CC	
700		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	696	
701		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
702		RIEGO DE PRENDIMIENTO	3 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	698;699	
703		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
704		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**		
705		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
706		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**		
707		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26		
708		**PARQUETIPO - Comuna 21**	**8.25 días**	**lun 16/03/26**	**vie 27/03/26**	**630FC+9 días**	
709		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**		
710		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
711		CAMPAMENTO TABLA 9 M2	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
712		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
713		**2. OBRAS CIVILES**	**8.25 días**	**lun 16/03/26**	**vie 27/03/26**		
714		***BORDILLOS***	**3 días**	**mié 18/03/26**	**mar 24/03/26**		
715		PINTURA PAISAJÍSTICA EN PARQUES	3 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	712	
716		***LOSETA***	**5.25 días**	**lun 16/03/26**	**mar 24/03/26**		
717		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	722	
718		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	720	
719		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	1 día	mié 18/03/26	mié 18/03/26	718	
720		DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	0.25 días	lun 16/03/26	lun 16/03/26		
721		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-SALTARIN	1 día	jue 19/03/26	jue 19/03/26	719	
722		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	721	
723		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	721	
724		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	722	
725		***ACARREOS DE EXCAVACIONES***	**1 día**	**mié 25/03/26**	**mié 25/03/26**		
726		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS HASTA 100 M	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	716	
727		**2. AMOBLAMIENTO**	**5 días**	**lun 16/03/26**	**mar 24/03/26**		
728		SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido	5 días	lun 16/03/26	mar 24/03/26		
729		JUEGO INFANTIL	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
730		**3. LIMPIEZA FINAL**	**2 días**	**jue 26/03/26**	**vie 27/03/26**	**725**	
731		LIMPIEZA GENERAL	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26		
732		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26		
733		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**8 días**	**lun 16/03/26**	**vie 27/03/26**		
734		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	735	
735		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
736		PRADO GATEADORA	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26	734	
737		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
738		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	737	
739		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26	735CC	
740		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
741		RIEGO DE PRENDIMIENTO	3 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	737;738	
742		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
743		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**		
744		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
745		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**		
746		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26		
747		**PARQUETIPO - Comuna 22**	**11 días**	**lun 16/03/26**	**mié 1/04/26**	**630FC+9 días**	
748		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**		
749		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
750		BODEGAJE	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
751		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
752		**2. AMOBLAMIENTO**	**3 días**	**lun 16/03/26**	**jue 19/03/26**		
753		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO, 0.40*0.40*0.40	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
754		SEÑALÉTICA TOTEM TRIANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI, H= 2.90 M - 3.10 M, ANCHO CARAS 0.30 M, ESQUINAS BISELADAS, ACABADO EN GRANITO LAVADO GRIS Y FICHAS EN CERÁMICA INFORMATIVA . INC. FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	3 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26		
755		**3. LIMPIEZA FINAL**	**2 días**	**lun 30/03/26**	**mié 1/04/26**	**758**	
756		LIMPIEZA GENERAL	1 día	lun 30/03/26	mar 31/03/26		
757		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	756	
758		**4. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**9 días**	**lun 16/03/26**	**lun 30/03/26**		
759		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	760	

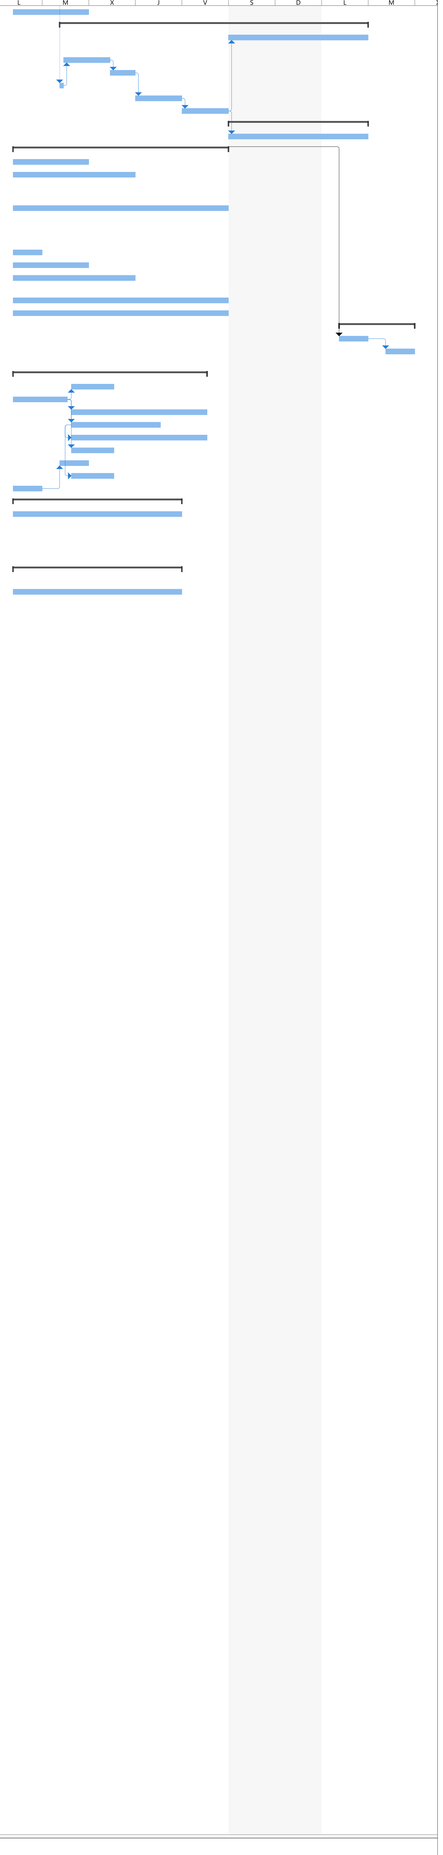


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
760		RETIRO PRADO - MALEZA	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26		
761		PRADO GATEADORA	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	760	
762		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	3 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	759	
763		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	3 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	762	
764		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	760	
765		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	2 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	767	
766		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 27/03/26	lun 30/03/26	762;763	
767		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
768		**5. COMPONENTE EDUCATIVO**	**2 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**		
769		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26		
770		**6. IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)**	**4 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**		
771		IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN OBRA (MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIO Y RCD)	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26		
772		**OMAR TORRIJOS**	**23.5 días**	**lun 26/01/26**	**jue 26/02/26**		
773		**PRELIMINARES**	**3.5 días**	**lun 26/01/26**	**jue 29/01/26**		
774		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
775		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	1.5 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26		
776		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2 días	mar 27/01/26	jue 29/01/26	775	
777		MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
778		**OBRAS CIVILES**	**15 días**	**jue 29/01/26**	**jue 19/02/26**	**773**	
779		**ANDENES PEATONALES EN CONCRETO**	**12 días**	**jue 29/01/26**	**lun 16/02/26**		
780		DEMOLICION ANDEN E=0.10	2 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26		
781		EXCAVACION TIERRA A MANO	3 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26	780	
782		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	2 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26	781	
783		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	1.5 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	782	
784		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	1.5 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26	785	
785		MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	783	
786		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 13/02/26	lun 16/02/26	784	
787		**BORDILLOS DE CONFINAMIENTO**	**7 días**	**jue 29/01/26**	**lun 9/02/26**		
788		DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26		
789		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	2 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26	791	
790		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	2 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26	788	
791		ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2"10-15C	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	790	
792		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 6/02/26	lun 9/02/26	789	
793		**CARPETA ASFALTICA**	**4 días**	**jue 29/01/26**	**mié 4/02/26**		
794		DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26		
795		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	vie 30/01/26	lun 2/02/26	794	
796		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	lun 2/02/26	mar 3/02/26	795	
797		CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]	1 día	lun 2/02/26	mar 3/02/26	795	
798		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	797	
799		**ACTIVIDADES VARIAS**	**5 días**	**jue 29/01/26**	**jue 5/02/26**		
800		DEMOLICION BOLARDOS EN CONCRETO	1.5 días	jue 29/01/26	vie 30/01/26		
801		RETIRO DE LLANTAS	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	800	
802		CORTE POSTES EN MADERA PLASTICA, CERRAMIENTO DE ZONAS VERDES	5 días	jue 29/01/26	jue 5/02/26		
803		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	800	
804		**PASO ELEVADO EN ESTRUCTURA METALICA**	**15 días**	**jue 29/01/26**	**jue 19/02/26**		
805		EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26		
806		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	1 día	vie 30/01/26	lun 2/02/26	805	
807		SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	1 día	lun 2/02/26	mar 3/02/26	806	
808		CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	807	
809		VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	1 día	mié 4/02/26	jue 5/02/26	808	
810		ESTRUCTURA METALICA	5 días	jue 5/02/26	jue 12/02/26	809	
811		EXCAVACION TIERRA A MANO	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	805CC	
812		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	1 día	vie 30/01/26	lun 2/02/26	811	
813		VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI	1 día	jue 5/02/26	vie 6/02/26	809	
814		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	2 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26	811	
815		PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	816	
816		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1.5 días	vie 30/01/26	lun 2/02/26	814CC	
817		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1.5 días	vie 30/01/26	lun 2/02/26	814CC	
818		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	1 día	vie 30/01/26	lun 2/02/26	811	
819		ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	7 días	mié 4/02/26	jue 12/02/26	815	
820		PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	819	
821		ANCLAJE HIERRO ,1/2" PERFORACION ,5/8"10-15C	1.5 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	819	
822		LAMINA METALDECK 2"CAL.20 COLABORANTE"	1 día	lun 16/02/26	mar 17/02/26	821	
823		LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	822	
824		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mié 18/02/26	jue 19/02/26	823	
825		**AMOBLAMIENTO**	**10 días**	**jue 29/01/26**	**jue 12/02/26**	**778CC**	
826		SEÑALETICA VERTICAL 1 CARA H= 0,57 M, A= 0,75 M INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	10 días	jue 29/01/26	jue 12/02/26		
827		**LIMPIEZA FINAL**	**3 días**	**jue 19/02/26**	**mar 24/02/26**	**778;825**	
828		LIMPIEZA GENERAL	2 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26		
829		ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	828	
830		**ADECUACION PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**20 días**	**jue 29/01/26**	**jue 26/02/26**	**778CC**	
831		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	1 día	jue 5/02/26	vie 6/02/26	832	
832		RETIRO PRADO - MALEZA	5 días	jue 29/01/26	jue 5/02/26		
833		PRADO GATEADORA	5 días	vie 6/02/26	vie 13/02/26	831	
834		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26		
835		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	10 días	jue 29/01/26	jue 12/02/26	834CC	
836		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	1 día	jue 5/02/26	vie 6/02/26	832	
837		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	4 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26		
838		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	2 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26	837	
839		RIEGO DE PRENDIMIENTO	10 días	jue 12/02/26	jue 26/02/26	834;835	
840		CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES	3 días	vie 6/02/26	mié 11/02/26	838	
841		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	jue 12/02/26	vie 13/02/26	835	
842		**COMPONENTE EDUCATIVO**	**20 días**	**lun 26/01/26**	**vie 20/02/26**		
843		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	20 días	lun 26/01/26	vie 20/02/26		
844		**PARQUE DEL ANCLA**	**58.5 días**	**lun 26/01/26**	**mar 21/04/26**	**772CC**	
845		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**4 días**	**lun 26/01/26**	**jue 29/01/26**		
846		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
847		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	1.5 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26		
848		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	2.5 días	mar 27/01/26	jue 29/01/26	847	
849		**OBRAS CIVILES**	**24.5 días**	**lun 26/01/26**	**vie 27/02/26**		
850		**ANDENES PERIMETRALES EN CONCRETO**	**8.5 días**	**lun 26/01/26**	**jue 5/02/26**		
851		DEMOLICION ANDEN E=0.10	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26		
852		EXCAVACION TIERRA A MANO	2 días	mié 28/01/26	jue 29/01/26	851	
853		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	852	
854		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26	853	
855		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	1.5 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	854	
856		MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	854	
857		DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26	851CC	
858		**ACCESOS PEATONALES EN CONCRETO CON LOSETA TACTIL**	**8 días**	**jue 5/02/26**	**mar 17/02/26**	**850**	
859		LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS O COLOR TIPO TACTIL DE 40 CM X 40 CM X 6CM	2 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26		
860		SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA CIRCULARES EN CONCRETO REFORZADO DIAM 0.60 M ESTAMPADAS CON FIGURA DE PLANTA	2 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26	859	
861		SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA CIRCULAR EN CONCRETO REFORZADO, DIAM 0,50 M, ESTAMPADA CON FIGURA DE PLANTA	2 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	860	
862		SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DIAM 0,40 M, ESTAMPADA CON FIGURA DE PLANTA	2 días	vie 13/02/26	mar 17/02/26	861	
863		**ZONA DE ESTANCIA EN ADOQUIN O SENDERO EN ADOQUIN**	**24.5 días**	**lun 26/01/26**	**vie 27/02/26**		
864		ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	7 días	mié 18/02/26	vie 27/02/26	865	
865		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	3 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	870	
866		EXCAVACION TIERRA A MANO	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26		
867		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	2 días	mié 28/01/26	jue 29/01/26	866	
868		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	2.5 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26	867	
869		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	868	
870		CINTA DE CONFINAMIENTO 10 CM X 10 CM	7 días	mié 4/02/26	vie 13/02/26	869	
871		**AMOBLAMIENTO**	**16.5 días**	**lun 26/01/26**	**mar 17/02/26**		
872		BANCA PREFABRICADA TIPO CUBO DE 40 CM X 40 CM X 43 CM	3 días	lun 26/01/26	mié 28/01/26		
873		SEÑALETICA VERTICAL 1 CARA H= 0,57 M, A= 0,75 M INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO	3.5 días	jue 29/01/26	mar 3/02/26	872	
874		MODULO EN MADERA PLASTICA EN FORMA DE FLOR	10 días	mar 3/02/26	mar 17/02/26	873	
875		**LIMPIEZA FINAL**	**2.5 días**	**vie 27/02/26**	**mar 3/03/26**	**849;871**	
876		LIMPIEZA GENERAL	1 día	vie 27/02/26	lun 2/03/26		
877		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO A 26 KM	1.5 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	876	
878		**ADECUACION PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL**	**31.5 días**	**mié 4/03/26**	**mar 21/04/26**	**875**	
879		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	3 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26	880	
880		RETIRO PRADO - MALEZA	2.5 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26		
881		PRADO GATEADORA	2 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	879	
882		PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	7 días	vie 13/03/26	mié 25/03/26	881	
883		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	7 días	mié 25/03/26	mar 7/04/26	882	
884		CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	2 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	880	
885		TRATAMIENTO FITOSANITARIO INDIVIDUOS ARBOREOS 6<H<18M	4 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26		
886		RIEGO DE PRENDIMIENTO	10 días	mar 7/04/26	mar 21/04/26	882;883	
887		INTERVENCION PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	4 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26		
888		**COMPONENTE EDUCATIVO**	**20 días**	**lun 26/01/26**	**vie 20/02/26**		

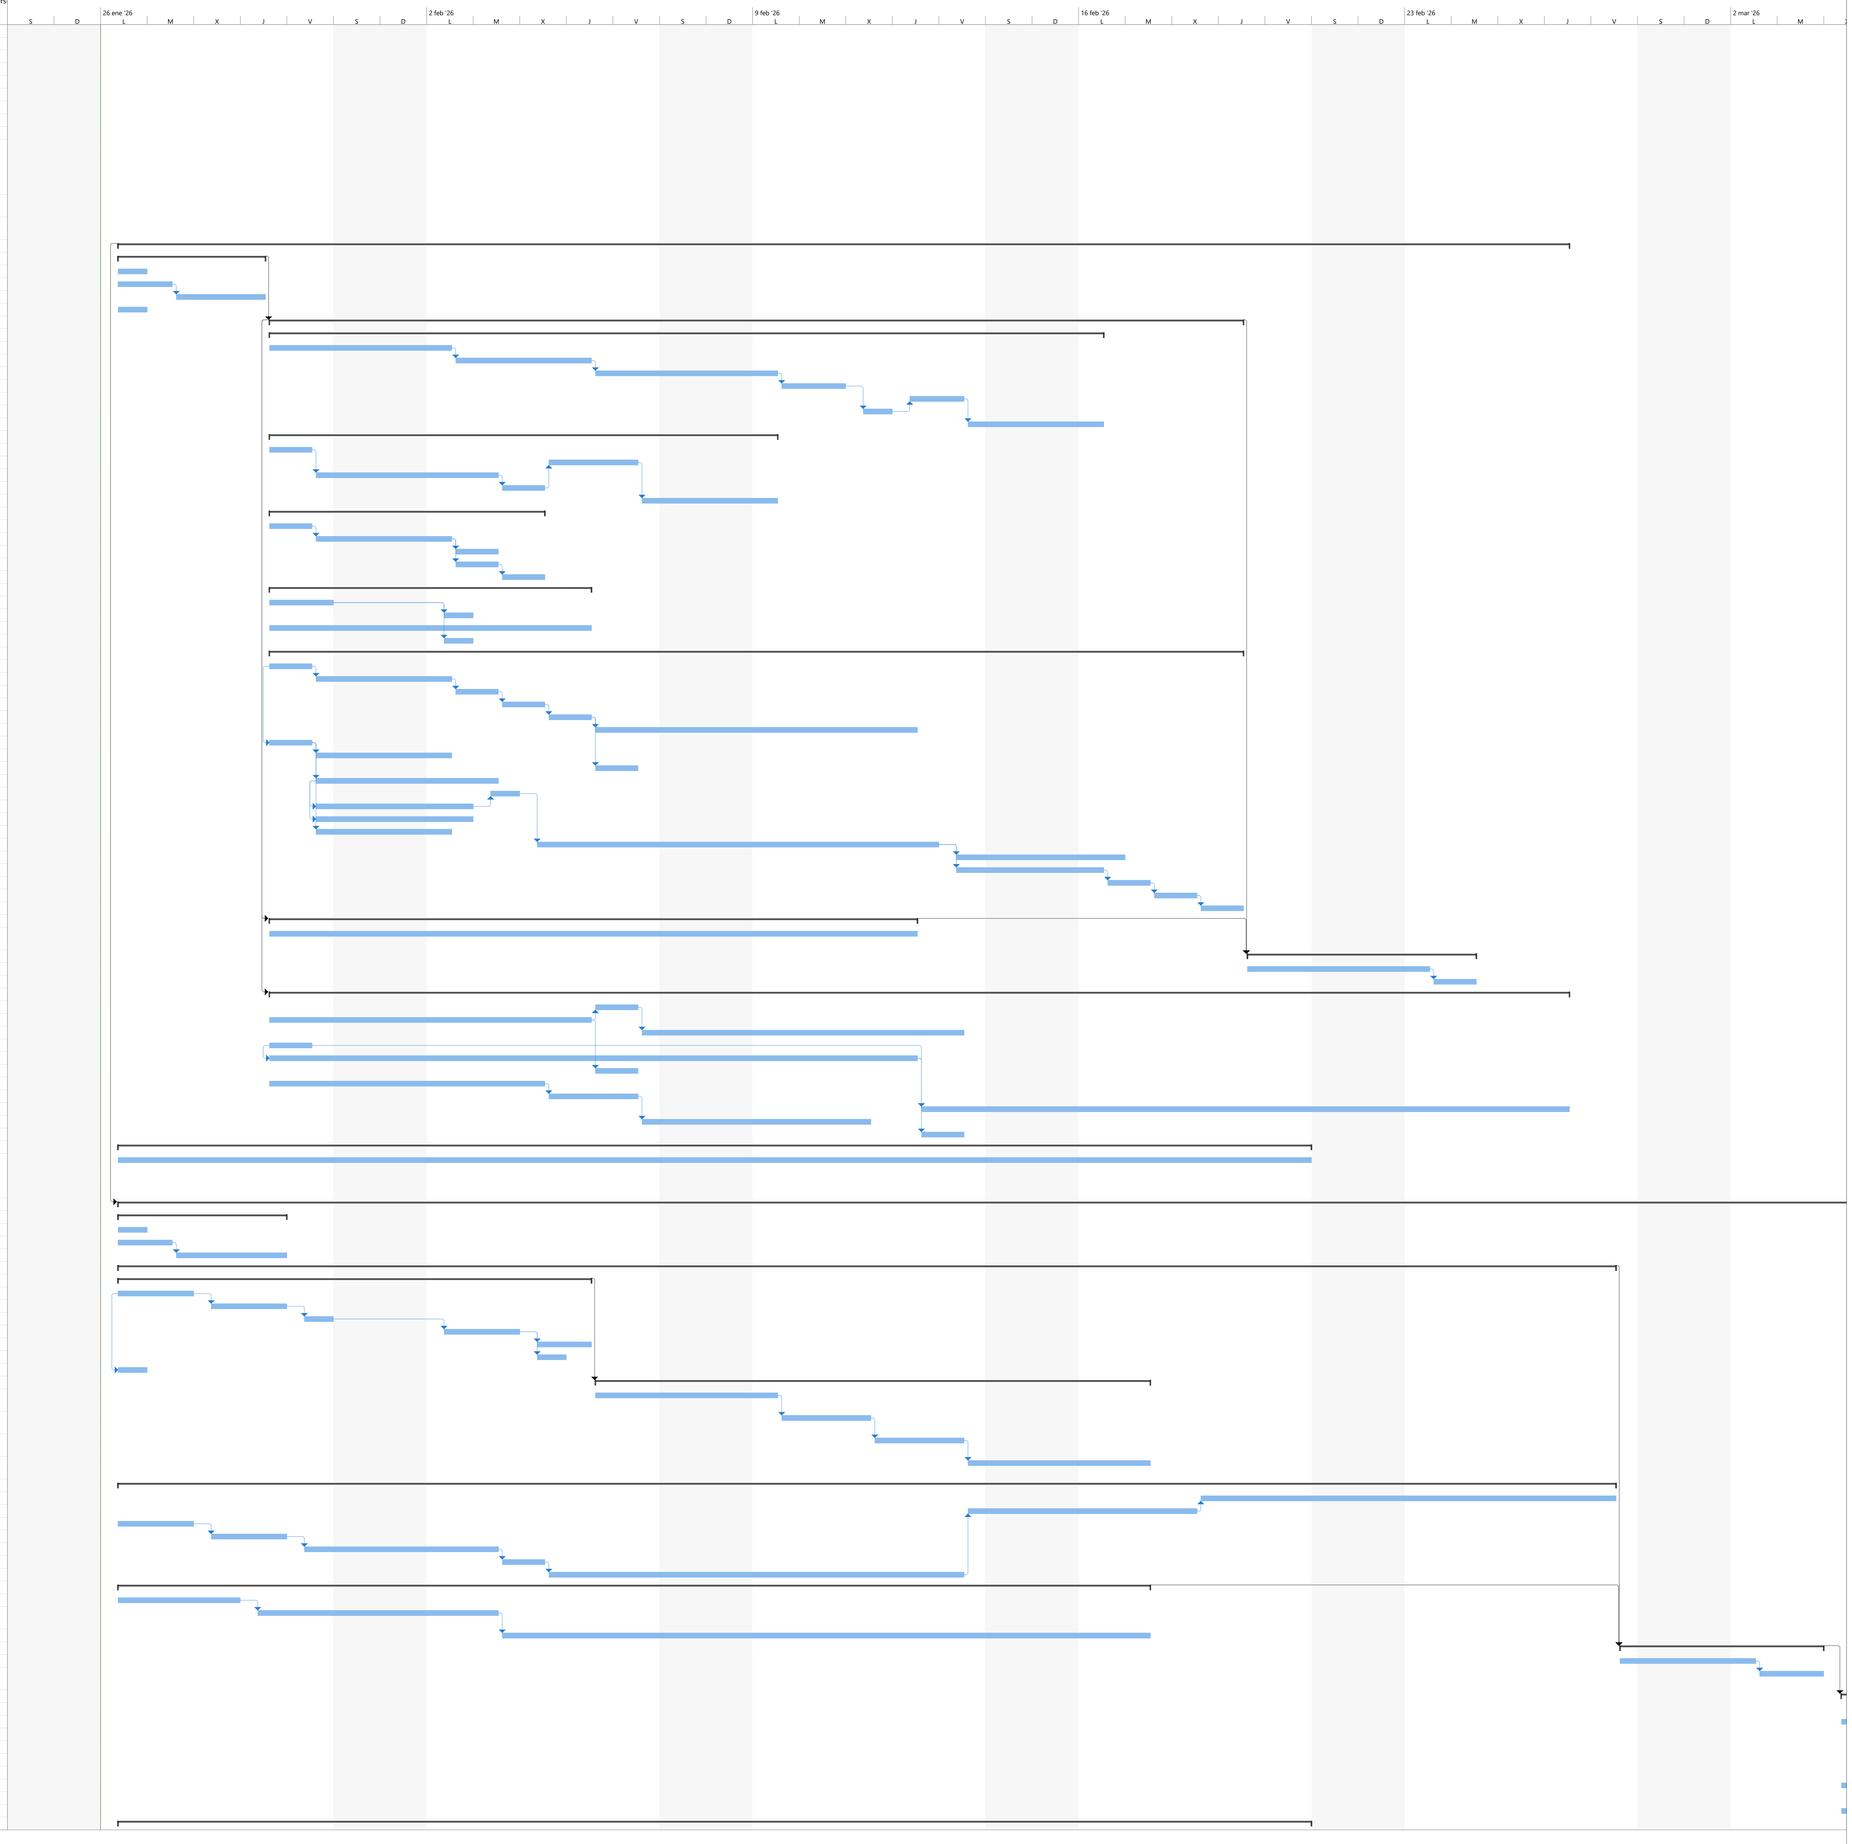

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
889		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	20 días	lun 26/01/26	vie 20/02/26		
890		**SEPARADOR CARRERA 10**	**62.63 días**	**lun 26/01/26**	**sáb 25/04/26**		
891		**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**		
892		BODEGAJE	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
893		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
894		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
895		INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
896		SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES	1 día	lun 26/01/26	lun 26/01/26		
897		**TRAMO 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 (60 M)**	**11 días**	**mar 3/02/26**	**mar 17/02/26**		
898		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26		
899		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	909	
900		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	898	
901		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA VOLUMEN COMPACTADO COMPACTADO	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	900	
902		ANCLAJE HIERRO, 1/2"-PERFORACION, 3/4" 21-25C	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	901	
903		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	902	
904		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	903	
905		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26	904	
906		ARBOL NATIVO H=2-3M	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	905	
907		PRADO GATEADORA	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	903	
908		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H=50-80 CMS	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	905	
909		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERA AGRÍCOLA	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	905	
910		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	905	
911		**TRAMO 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 (77 M)**	**13 días**	**mié 18/02/26**	**vie 6/03/26**	**899**	
912		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26		
913		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26	921	
914		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	912	
915		ACARREO MATERIAL FREYTO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	914	
916		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	915	
917		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	916	
918		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7 CM	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	917	
919		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	vie 27/02/26	lun 2/03/26	918	
920		ARBOL NATIVO H=2-3M	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	923	
921		PRADO GRATEADORA	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	923	
922		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H=50-80CMS	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	923	
923		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	919	
924		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26	920	
925		**TRAMO 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 (65 M)**	13 días	**lun 9/03/26**	**jue 26/03/26**		
926		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26	913	
927		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	936	
928		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	926	
929		ACARREO MATERIAL PETREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	928	
930		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/26	929	
931		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	930	
932		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5-7 CM	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	931	
933		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	932	
934		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	937	
935		PRADO GRATEADORA	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	937	
936		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	937	
937		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	933	
938		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	935	
939		**TRAMO 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 (80 M)**	13 días	**mar 3/02/26**	**jue 19/02/26**		
940		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26		
941		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	950	
942		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	940	
943		ACARREO MATERIAL PETREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	942	
944		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	943	
945		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	944	
946		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	945	
947		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26	946	
948		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	951	
949		PRADO GRATEADORA	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26	951	
950		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	951	
951		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	947	
952		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	949	
953		**TRAMO 5 ENTRE CALLES 10 Y 11 (105 M)**	12 días	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		
954		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	941	
955		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26	964	
956		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	954	
957		ACARREO MATERIAL FREYTO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	956	
958		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	957	
959		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	958	
960		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	959	
961		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	960	
962		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26	965	
963		PRADO GRATEADORA	2 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26	965	
964		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26	965	
965		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	961	
966		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26	964	
967		**TRAMO 6 ENTRE CALLES 11 Y 12 (78 M)**	13 días	**lun 9/03/26**	**jue 26/03/26**		
968		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26	955	
969		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	977	
970		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	968	
971		ACARREO MATERIAL PETREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	970	
972		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/26	971	
973		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	972	
974		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	973	
975		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	974	
976		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	979	
977		PRADO GRATEADORA	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	979	
978		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26	979	
979		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	975	
980		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	978	
981		**TRAMO 7 ENTRE CALLES 12 Y 13 (85 M)**	**13 días**	**mar 3/02/26**	**jue 19/02/26**		
982		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26		
983		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	992	
984		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	982	
985		ACARREO MATERIAL PETREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26	984	
986		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	985	
987		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26	986	
988		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	987	
989		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	988	
990		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	993	
991		PRADO GRATEADORA	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26	993	
992		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	993	
993		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	989	
994		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	990	
995		**TRAMO 8 ENTRE CALLES 13 Y 15 (245 M)**	**17 días**	**vie 20/02/26**	**lun 16/03/26**		
996		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	983	
997		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	1006	
998		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	996	
999		ACARREO MATERIAL PETREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	998	
1000		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	2 días	vie 27/02/26	lun 2/03/26	999	
1001		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	3 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	1000	
1002		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	1001	
1003		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	1002	
1004		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	1007	
1005		PRADO GRATEADORA	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	1007	
1006		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	1007	
1007		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/26	1003	
1008		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	1006	
1009		**TRAMO 9 ENTRE CALLES 15 Y 17 (180 M)**	**15 días**	**mar 17/03/26**	**jue 9/04/26**		
1010		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	997	
1011		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	jue 9/04/26	jue 9/04/26	1019	
1012		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	1010	
1013		ACARREO MATERIAL PETREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	1012	
1014		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. ORACIÓN 3/4" 21-25C	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	1013	
1015		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26	1014	
1016		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5-7CM	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	1015	
1017		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	1016	
1018		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	1021	
1019		PRADO GRATEADORA	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	1021	
1020		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	1021	
1021		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	lun 6/04/26	lun 6/04/26	1017	
1022		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26	1020	

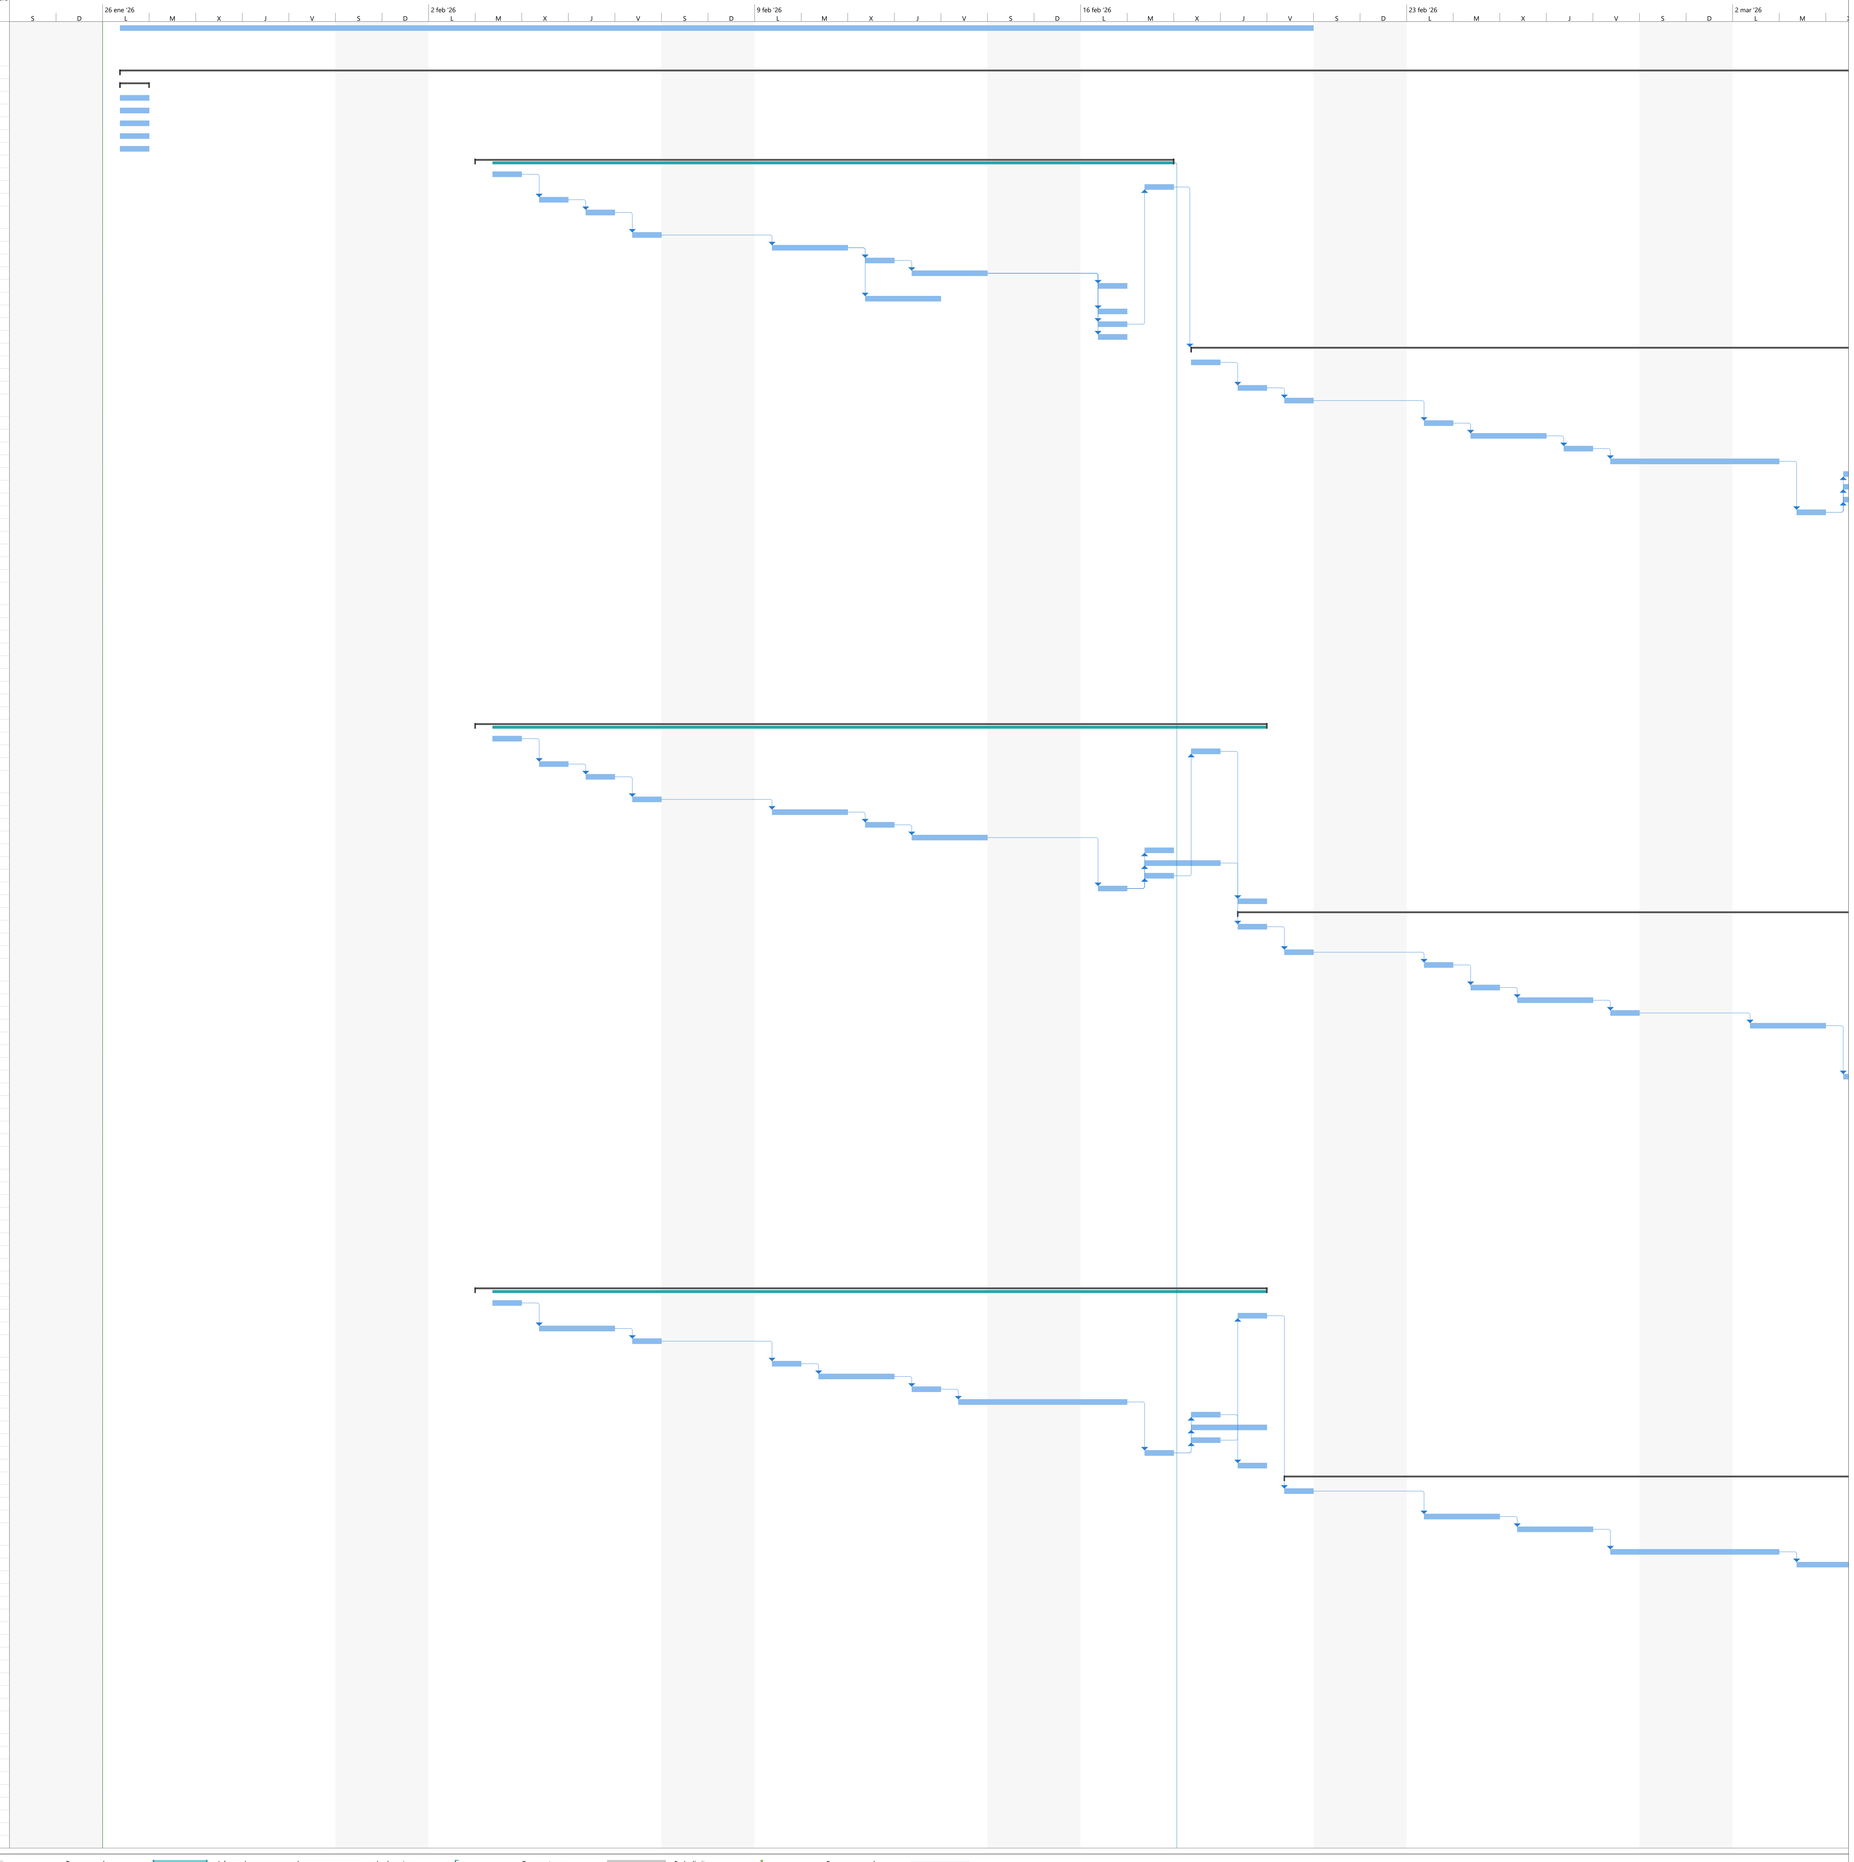


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombre de los recurs
1023		**TRAMO 10 ENTRE CALLES 17 Y 18 (70 M)**	**13 días**	**jue 26/03/26**	**mié 15/04/26**		
1024		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	927	
1025		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1033	
1026		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26	1024	
1027		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	1026	
1028		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERFORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	1027	
1029		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	mié 1/04/26	lun 6/04/26	1028	
1030		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	1029	
1031		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26	1030	
1032		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	1035	
1033		PRADO GRATEADORA	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	1035	
1034		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	1035	
1035		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	1031	
1036		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1033	
1037		**TRAMO 11 ENTRE CALLES 18 Y 19 (85 M)**	**13 días**	**jue 26/03/26**	**mié 15/04/26**		
1038		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	927	
1039		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1047	
1040		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26	1038	
1041		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	1040	
1042		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERFORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	1041	
1043		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	mié 1/04/26	lun 6/04/26	1042	
1044		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	1043	
1045		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26	1044	
1046		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	1049	
1047		PRADO GRATEADORA	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	1049	
1048		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	1049	
1049		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	1045	
1050		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1047	
1051		**TRAMO 12 ENTRE CALLES 19 Y 20 (65 M)**	**12 días**	**vie 27/03/26**	**mié 15/04/26**		
1052		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26	969	
1053		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1062	
1054		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	1052	
1055		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	1054	
1056		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERFORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	1055	
1057		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	1056	
1058		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26	1057	
1059		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	jue 9/04/26	vie 10/04/26	1058	
1060		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	1063	
1061		PRADO GRATEADORA	2 días	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1063	
1062		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	1063	
1063		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	1059	
1064		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1062	
1065		**TRAMO 13 ENTRE CALLES 20 Y 21 (70 M)**	**11.63 días**	**vie 10/04/26**	**sáb 25/04/26**		
1066		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	1011	
1067		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	vie 24/04/26	vie 24/04/26	1076	
1068		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	1066	
1069		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	1068	
1070		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERFORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	1069	
1071		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	1 día	jue 16/04/26	jue 16/04/26	1070	
1072		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	1 día	vie 17/04/26	vie 17/04/26	1071	
1073		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	1072	
1074		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	1 día	jue 23/04/26	jue 23/04/26	1077	
1075		PRADO GRATEADORA	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	1077	
1076		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	1 día	jue 23/04/26	jue 23/04/26	1077	
1077		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	1073	
1078		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	vie 24/04/26	vie 24/04/26	1076	
1079		**TRAMO 14 ENTRE CALLES 21 Y 23 (246 M)**	**21 días**	**mar 17/02/26**	**mar 17/03/26**		
1080		CERRAMIENTO TELA F. TIE H=2.10M-SINB	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26		
1081		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TELA M²	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	1089	
1082		DEMOLICIÓN ANDÉN E=0.10	3 días	mié 18/02/26	vie 20/02/26	1080	
1083		ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26	1082	
1084		ANCLAJE HIERRO 1/2" PERFORACIÓN 3/4" 21-25C	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	1083	
1085		SARDINEL EN CONCRETO 15X15 M.S. HIERRO	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	1084	
1086		COLCHÓN ARENA GRUESA E=5CM	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	1085	
1087		ADOQUÍN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	1086	
1088		ÁRBOL NATIVO H= 2-3 M	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	1091	
1089		PRADO GRATEADORA	3 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	1091	
1090		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	1091	
1091		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	1087	
1092		RIEGO DE PRENDIMIENTO	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	1090	
1093		IMPLEMENTACIÓN PMT	10 días	mar 17/02/26	mar 3/03/26	897	
1094		ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES GRUPOS DE VALOR DIFERENTES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN LOS VISITANTES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A VALORAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL	20 días	mar 17/02/26	mar 17/03/26	897	

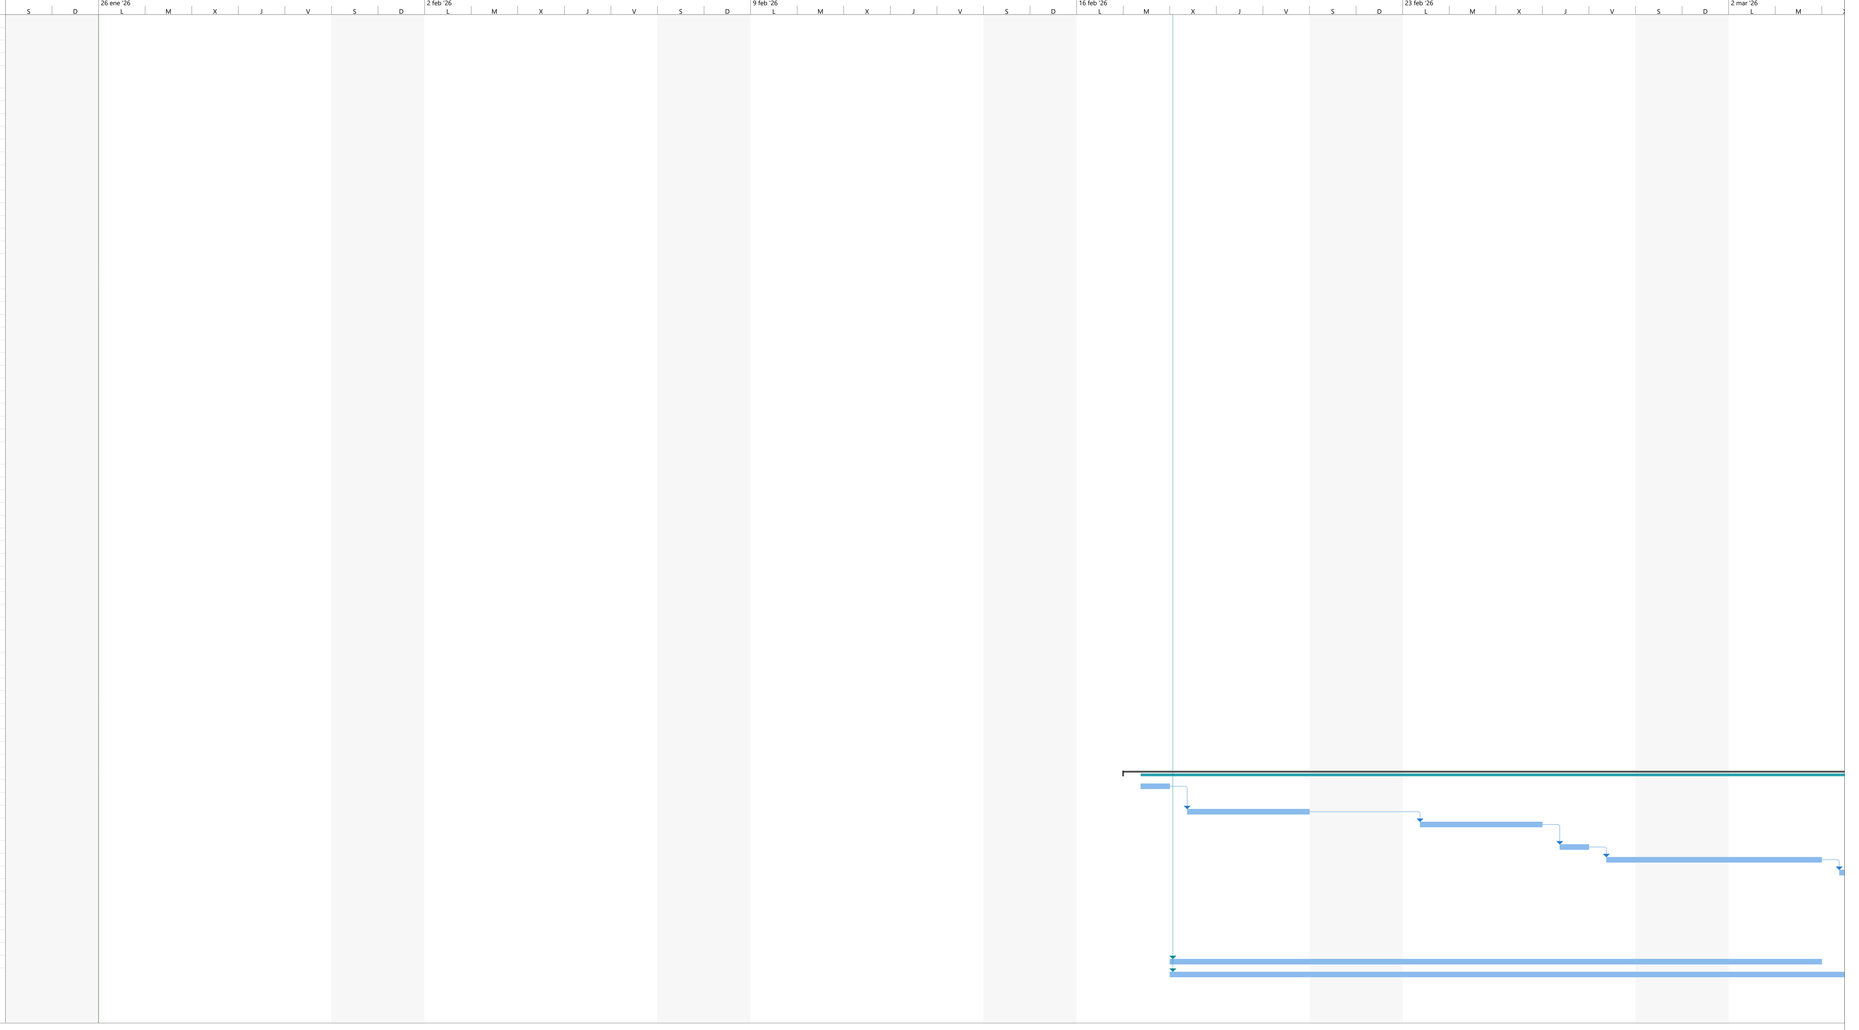



9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D


9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D



9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

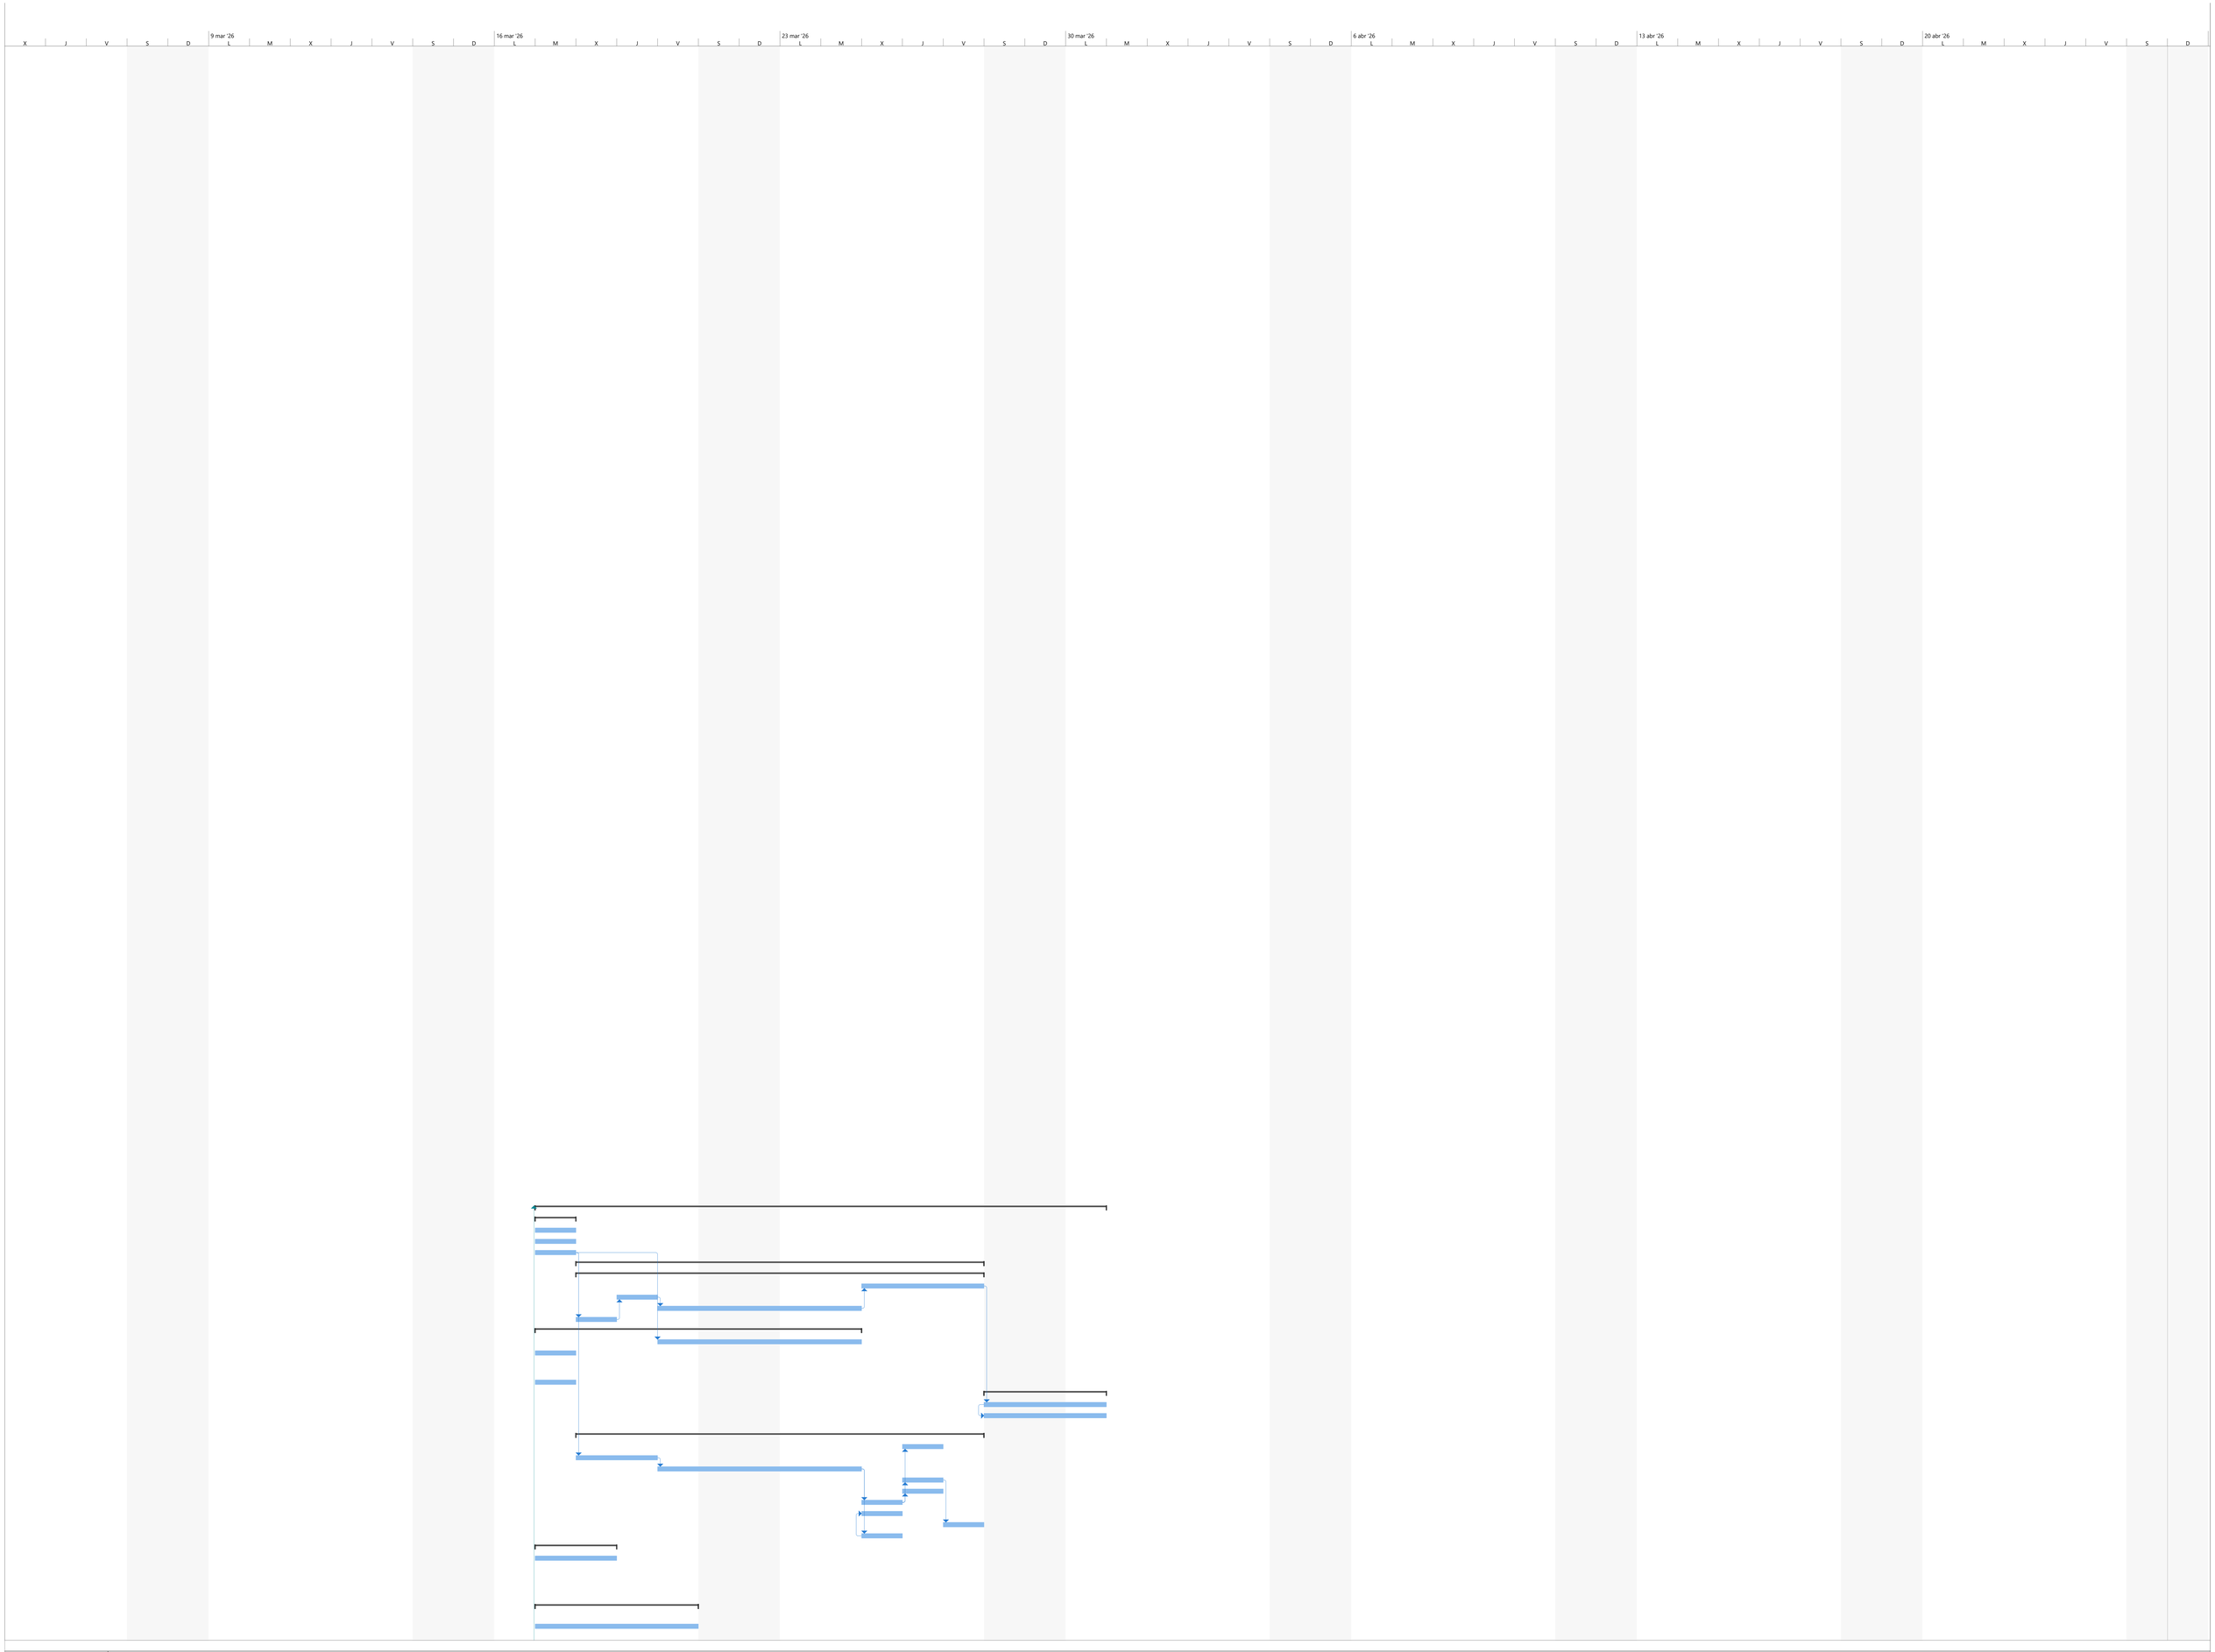
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

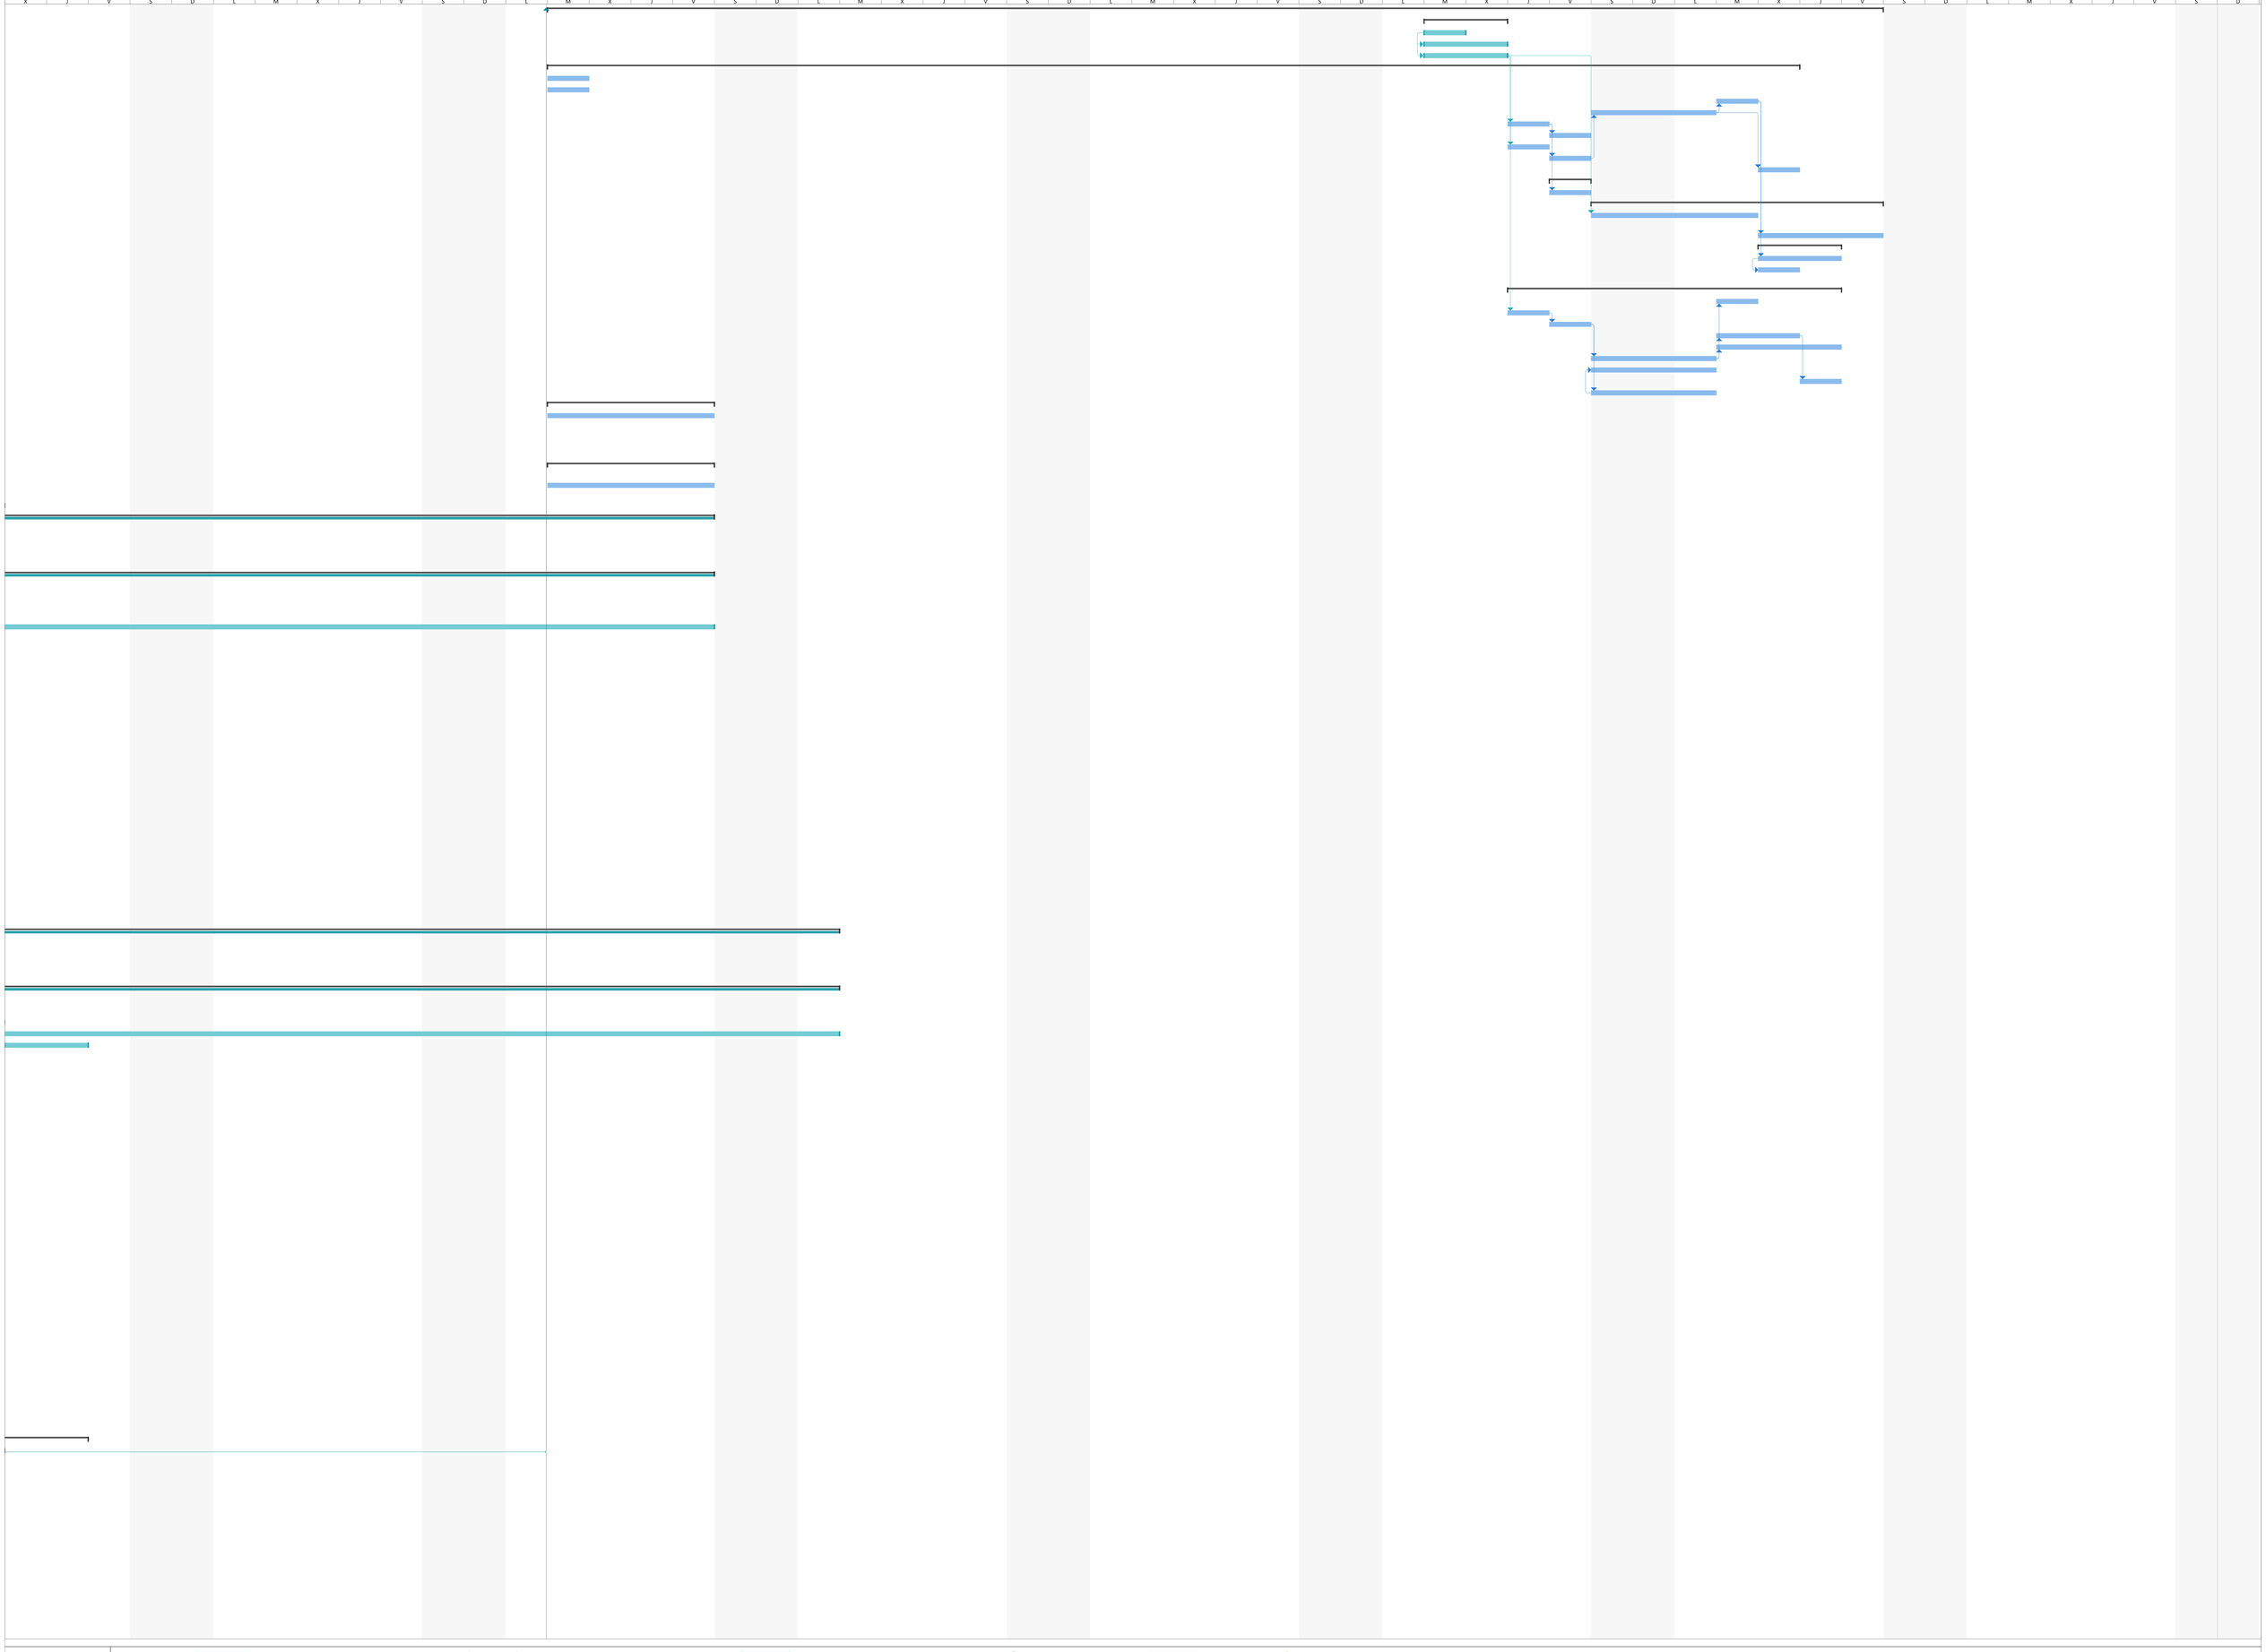


Proyecto: CRONOGRAMA 2026
Fecha: lun 26/01/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

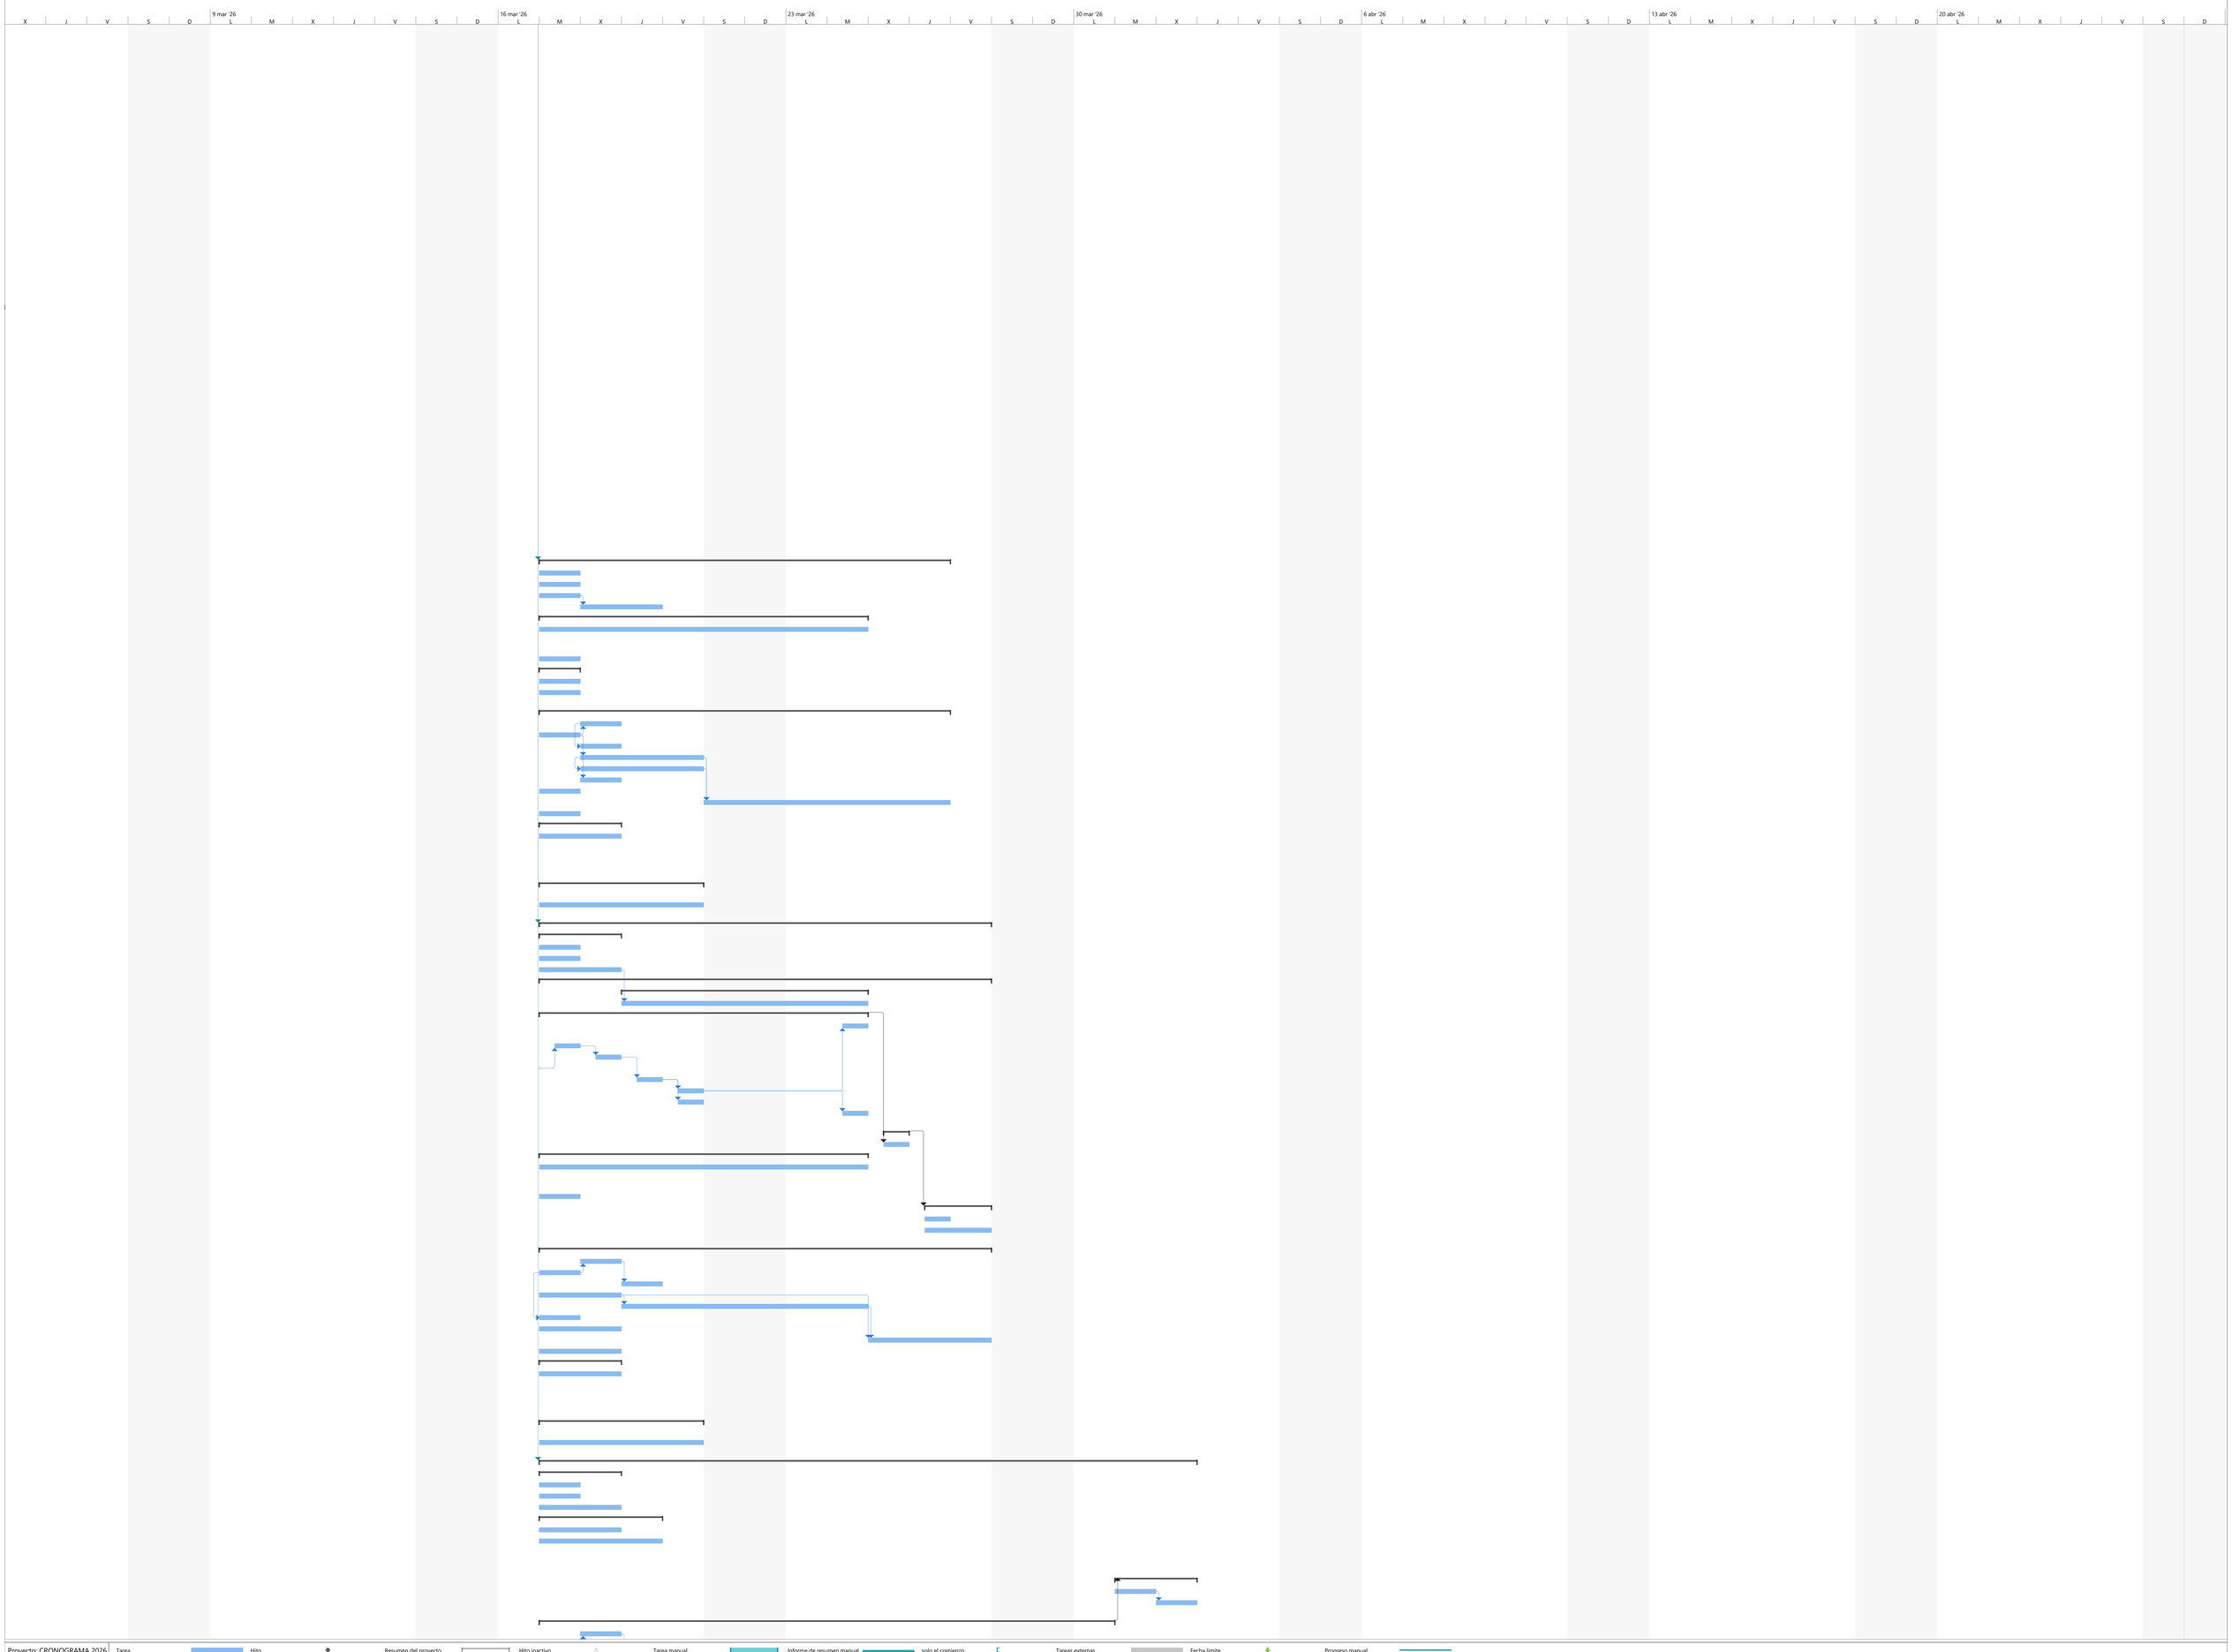

Proyecto: CRONOGRAMA 2026
Fecha: lun 26/01/26


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

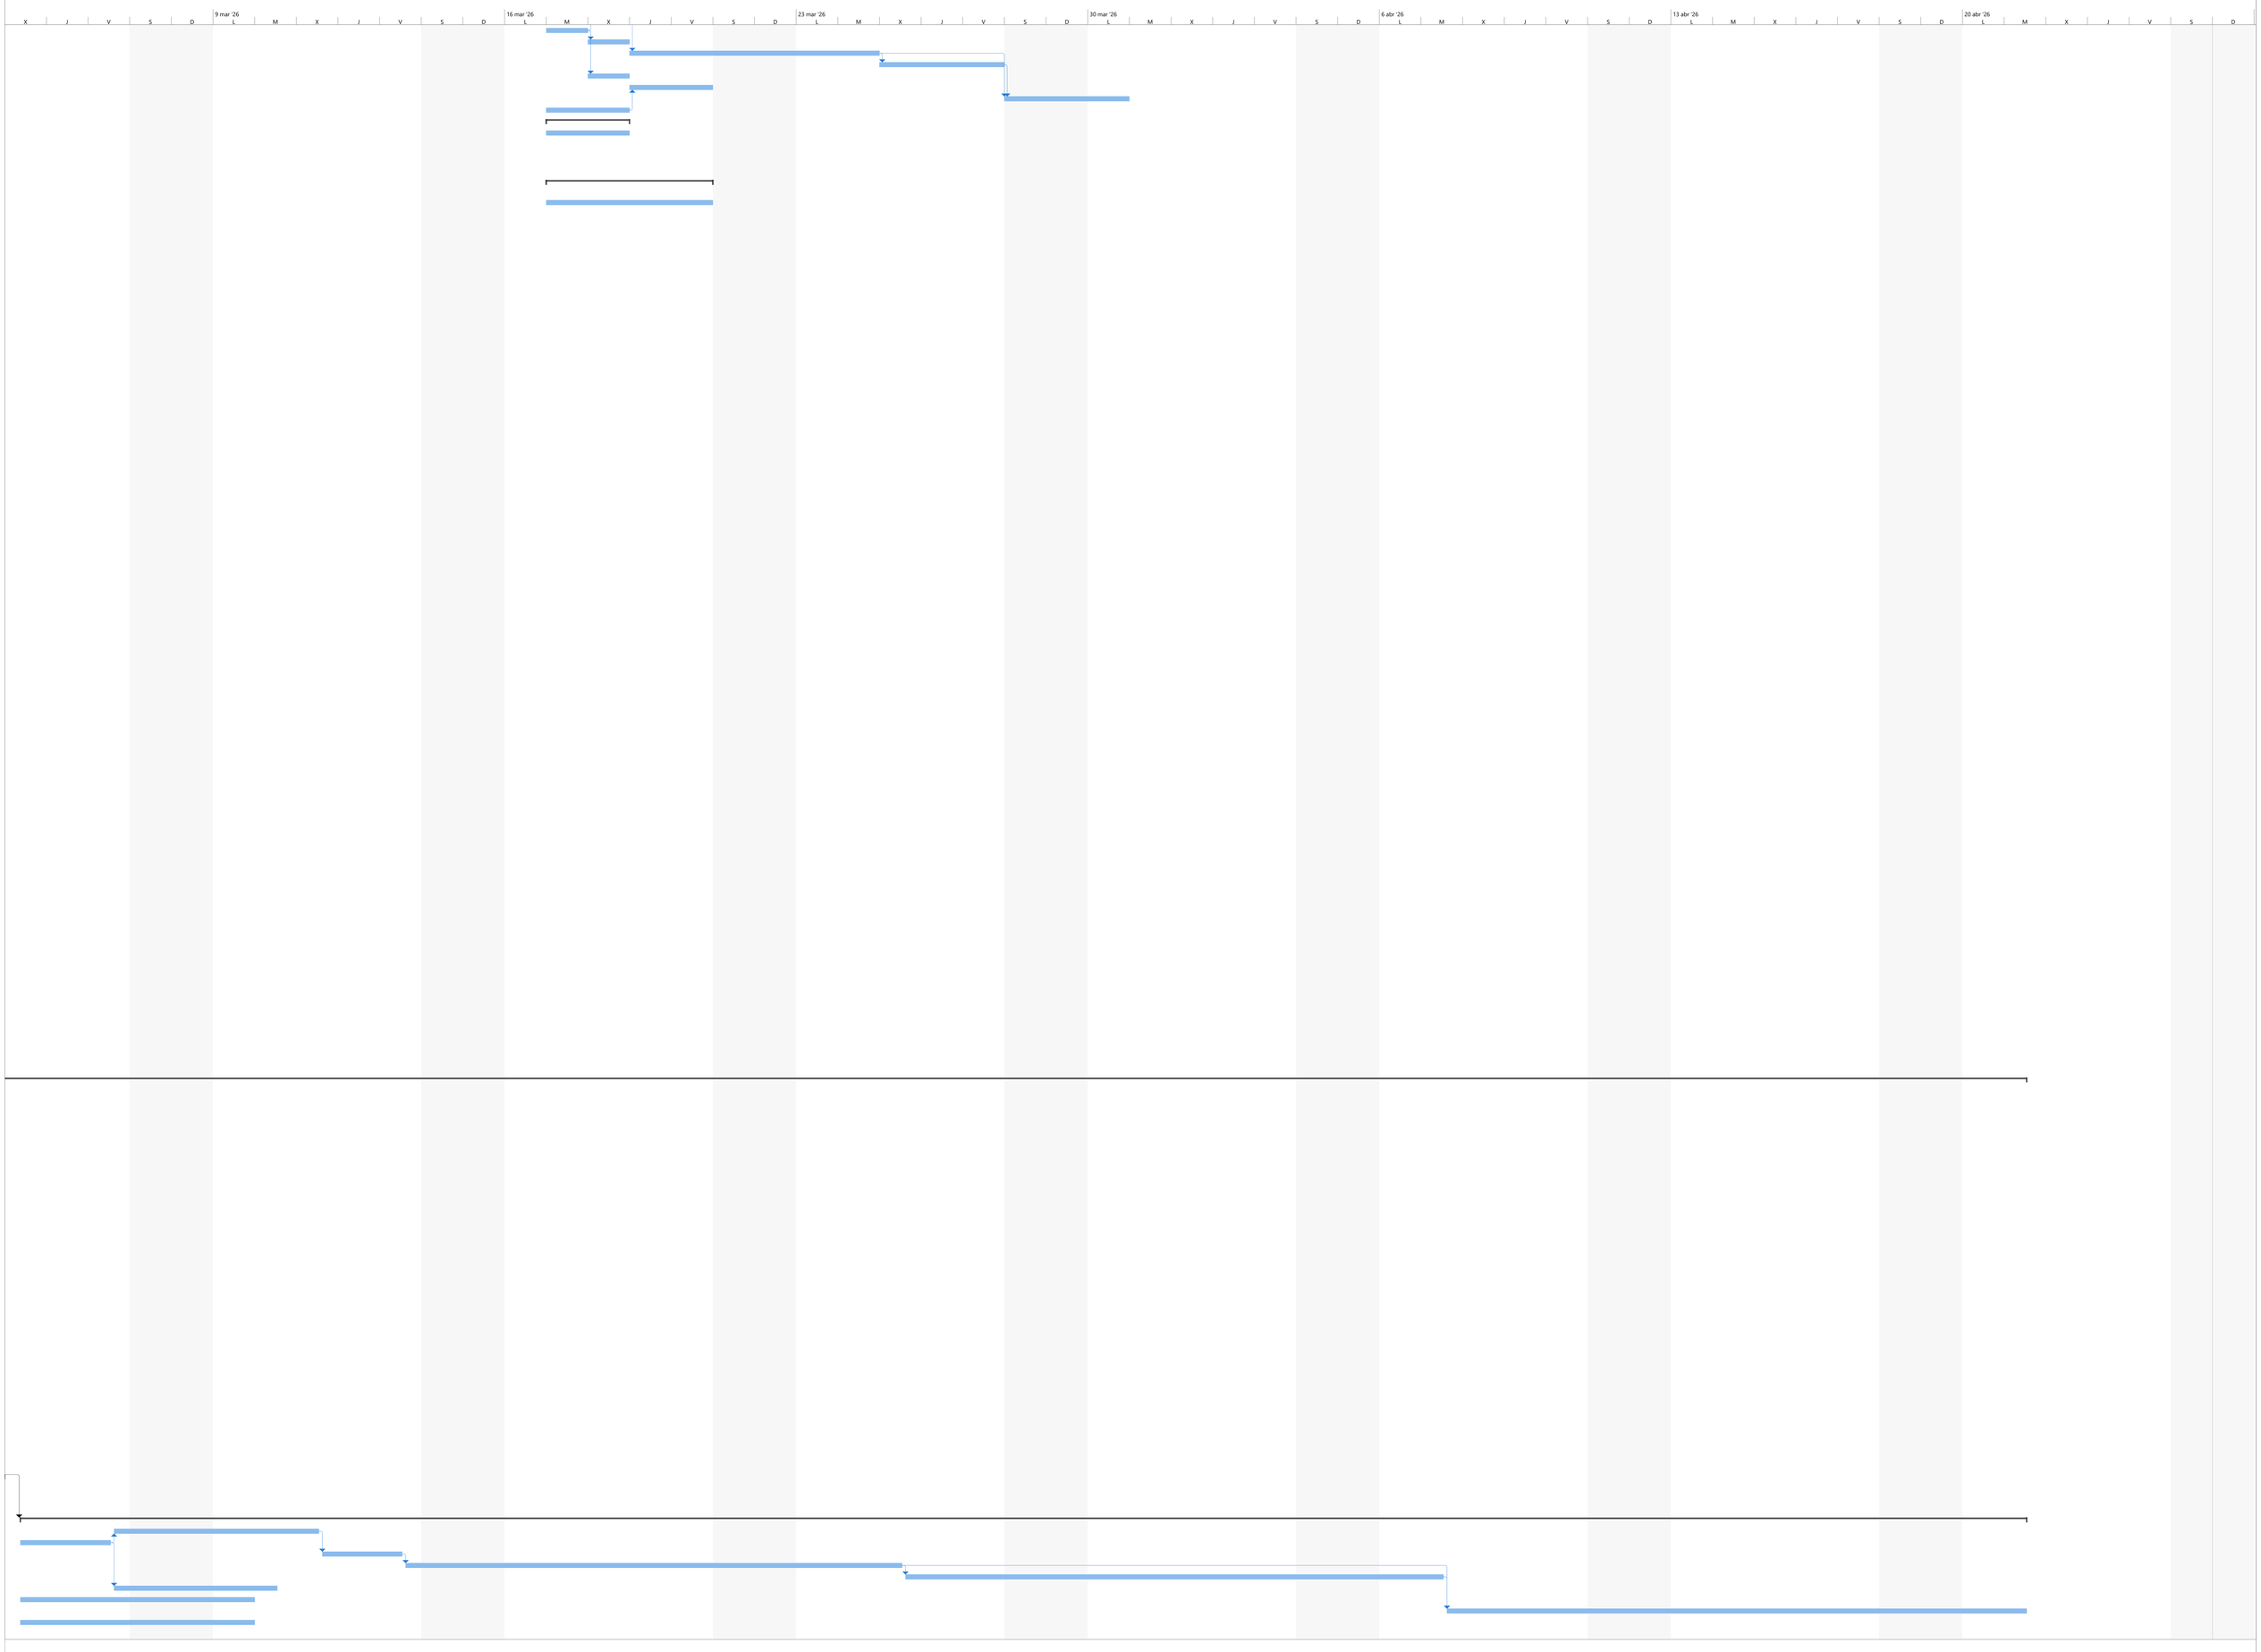
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26

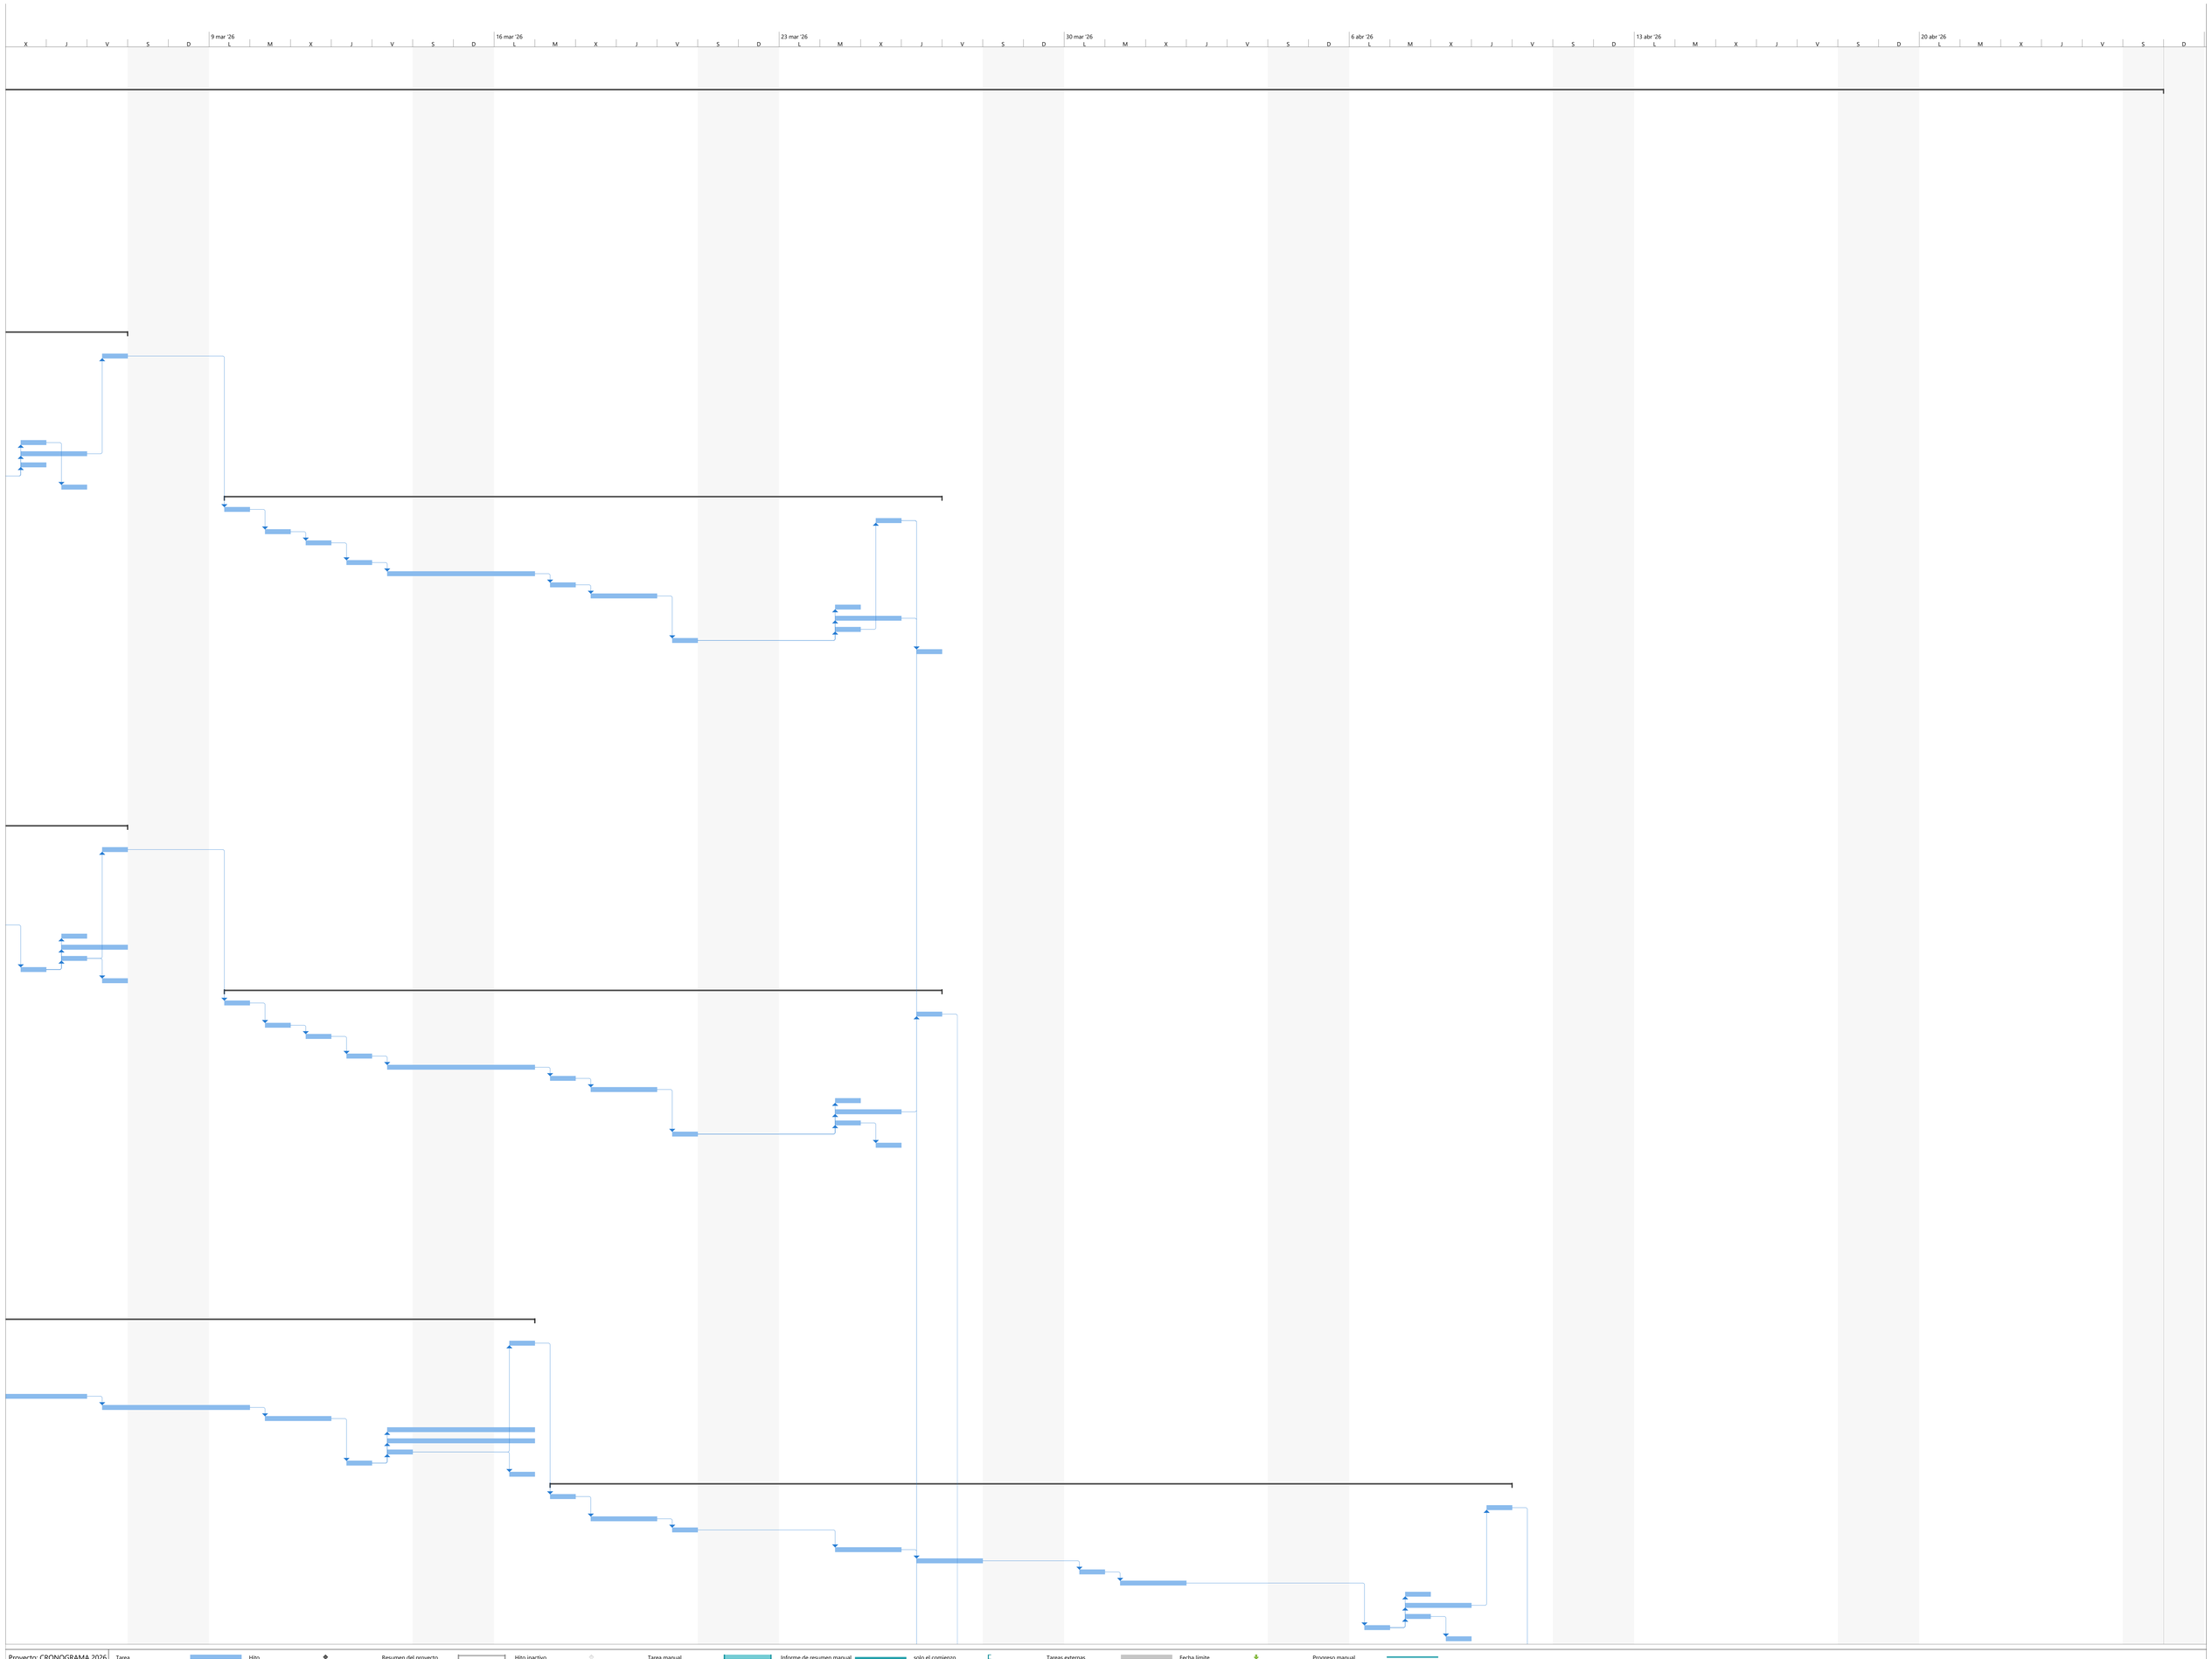

Proyecto: CRONOGRAMA 2026
Fecha: lun 26/01/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

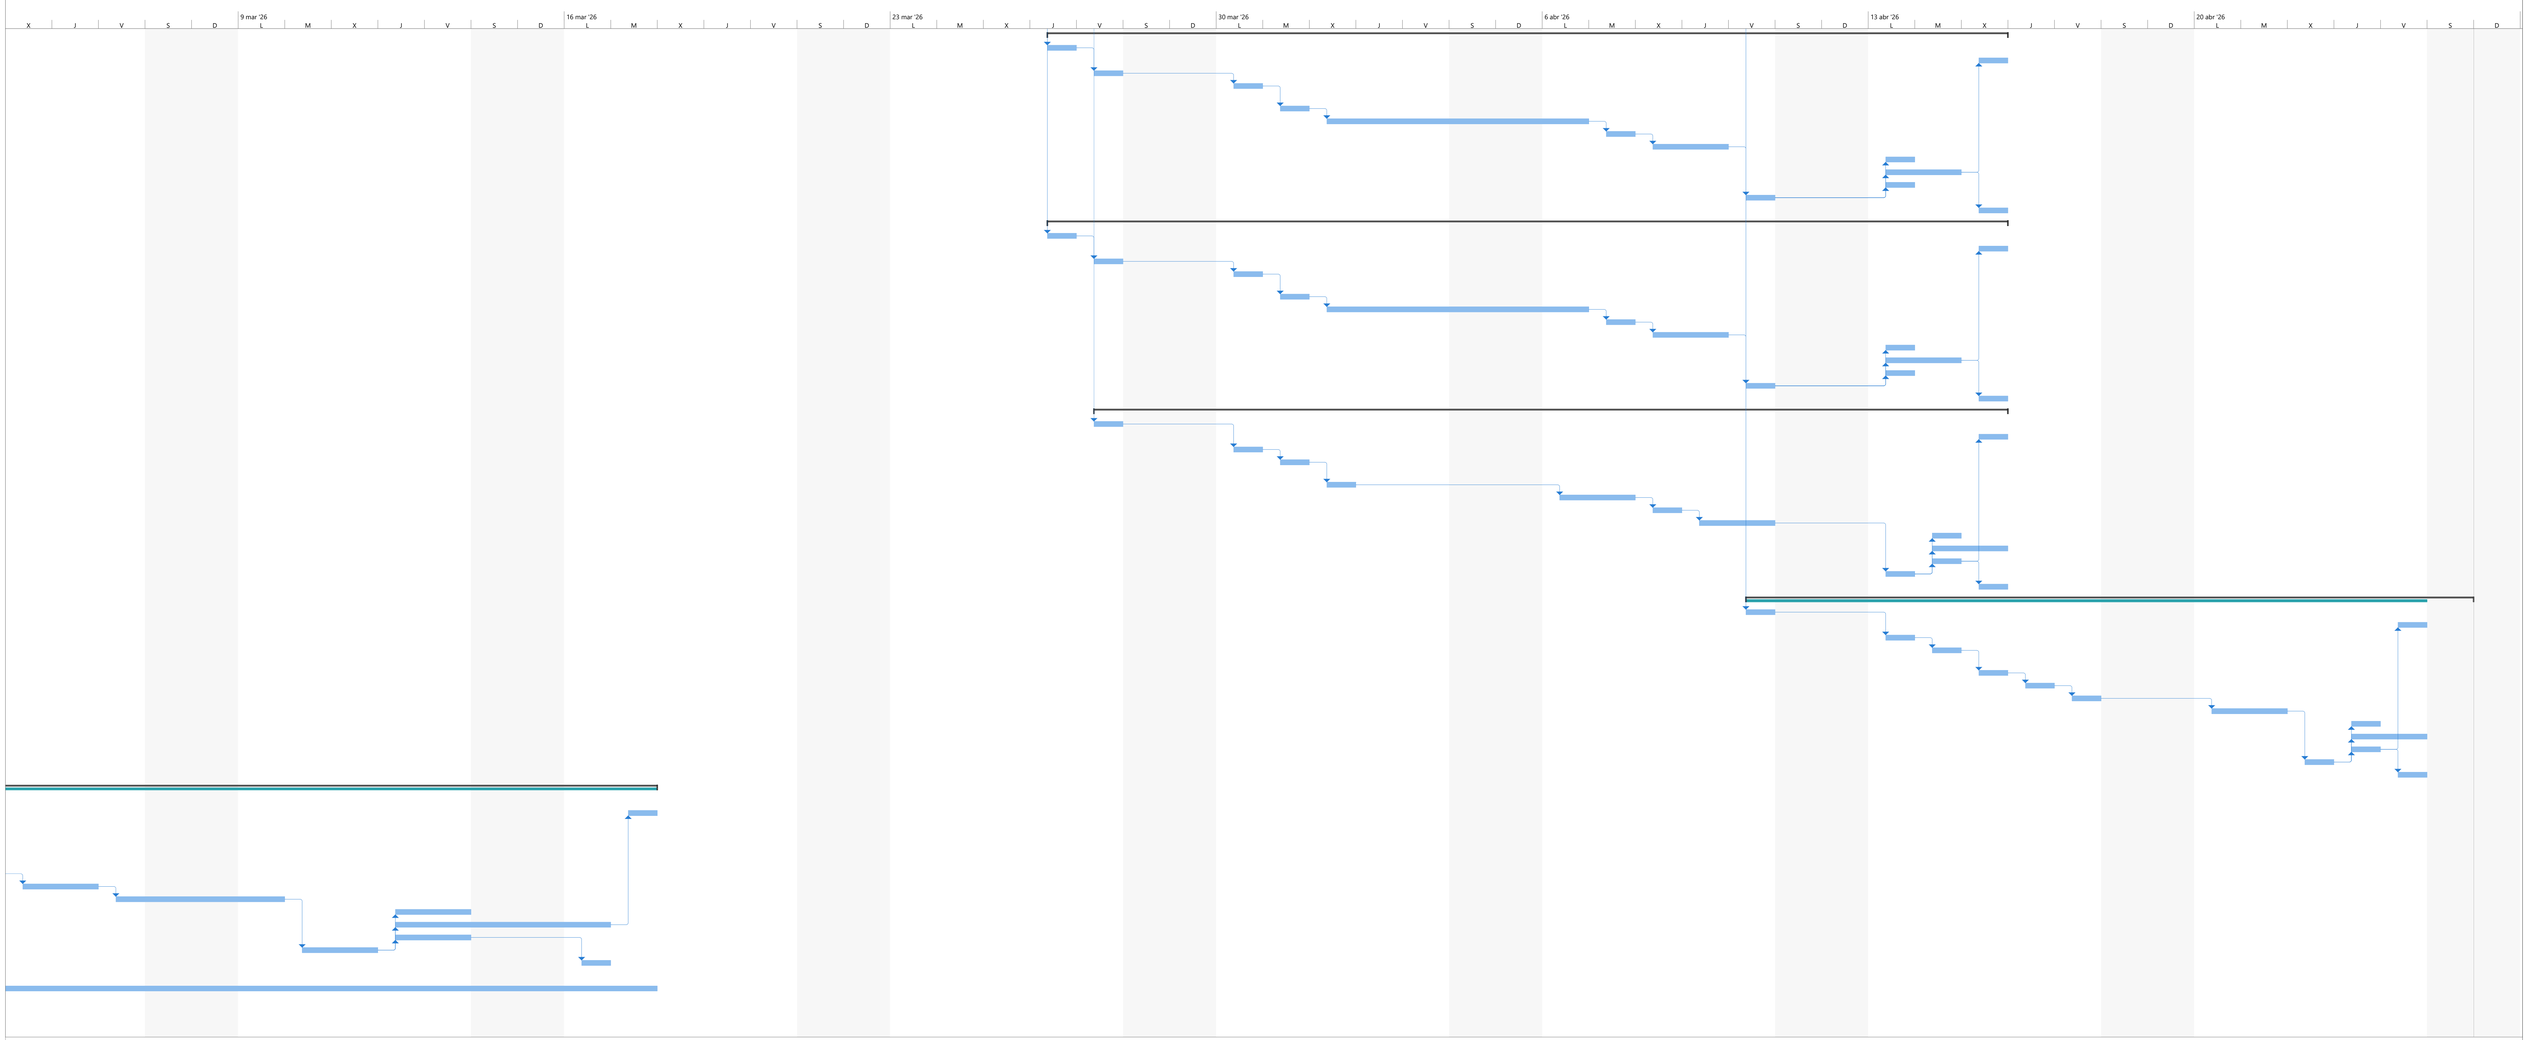

Proyecto: CRONOGRAMA 2026
Fecha: lun 26/01/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
