

INFORME MENSUAL DE OBRA No.21

SEPTIEMBRE 2025

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MAGDALENA FASE II ENTRE LA PLAZA DE BOLÍVAR Y LA CARRERA 2A EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONSORCIO LA CANDELARIA

Contenido

INTRODUCCIÓN 5

1. Descripción del proyecto 6
2. Localización del proyecto 6
3. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del contrato de obra 8
4. Información pólizas del contrato de obra 9
5. Informe de gestión social 15
6. Informe de seguridad y salud en el trabajo 15
7. Informe gestión ambiental 16
8. OBRA CIVIL 16

a. Registro del personal 16

b. Registro climático 16

c. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo 17

9. Conclusión 18

Listado de Tablas

Tabla 1. Información de la obra. 8
Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 8
Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento del proceso de contratación. 9
Tabla 4. Póliza Garantía Cumplimiento Vigencia del proceso de contratación. 9
Tabla 5. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150**. 9
Tabla 6. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150**. 9
Tabla 7. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150**. 10
Tabla 8. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150.** 10
Tabla 9. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por acta de inicio. 10
Tabla 10. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por acta de inicio Vigencia. 10
Tabla 11. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por acta de inicio. 11
Tabla 12. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por acta de inicio vigencia. 11
Tabla 13. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.1. 11
Tabla 14. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.1 Vigencia. 11
Tabla 15. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.1. 12
Tabla 16. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.1 Vigencia. 12

Tabla 17. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.2. 12

Tabla 18. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.2 Vigencia. 12

Tabla 19. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.2. 13

Tabla 20. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No. Vigencia. 13

Tabla 21. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.3. 13

Tabla 22. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.3 Vigencia. 13

Tabla 23. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.3. 13

Tabla 24. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.3 Vigencia. 14

Tabla 25. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.4. 14

Tabla 26. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.4 Vigencia. 14

Tabla 27. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.4. 14

Tabla 28. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.4 Vigencia. 15

Tabla 25. Registro del personal 16

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONSORCIO LA CANDELARIA presenta el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 21, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025. Este informe resume las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Obra Pública CO1.PCCNTR.6137150, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA FASE II ENTRE LA PLAZA DE BOLÍVAR Y LA CARRERA 2A EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

El presente documento detalla el estado actual del proyecto, abarcando aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales, así como el estado del equipo, del personal, los certificados de pago de seguridad social y riesgos laborales, materiales, programa de trabajo, avance de ejecución, y problemáticas que afectan la correcta realización de la obra. Se incluye toda la información relevante para el seguimiento del Contrato CO1.PCCNTR.6137150.

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la construcción de obras para controlar y mitigar la erosión en el margen izquierdo del río Magdalena, en el Municipio de Magangué, entre la plaza de bolívar y la carrera 2a en el municipio de Magangué. La intervención abarca una longitud de 156.4 metros, comenzando en la Abscisa K0+451,7 y finalizando en la K0+608,1. La alternativa seleccionada consiste en un sistema de tablestacas metálicas hincadas en el suelo, arriostradas mediante torones de 5/8", los cuales se fijan a vigas de reparto tipo IPE 330. Todo el sistema se cimenta sobre pilotes de sección cuadrada con 60 cm de lado.

2. Localización del proyecto

El proyecto a ejecutarse bajo el objeto de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MAGDALENA FASE II, ENTRE LA PLAZA DE BOLIVAR Y LA CARRERA 2A EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, se localiza el municipio de Magangué, el cual se encuentra ubicado en el centro del departamento de Bolívar, en la margen occidental del río Magdalena y hace parte de la región geográfica natural denominada Depresión Momposina. Sus límites son los siguientes: al norte limita con el municipio de Córdoba, al sur con los municipios de Pinillos y Achí, al occidente con el departamento de Sucre, Al oriente con los municipios de Cicuco, Mompós y Pinillos, específicamente en la margen izquierda del rio magdalena, iniciando en las coordenadas 9°13´52.41" N – 74°44´34.65" O y finaliza en las coordenadas 9°13´6.82" N – 74°44´34.16" O.

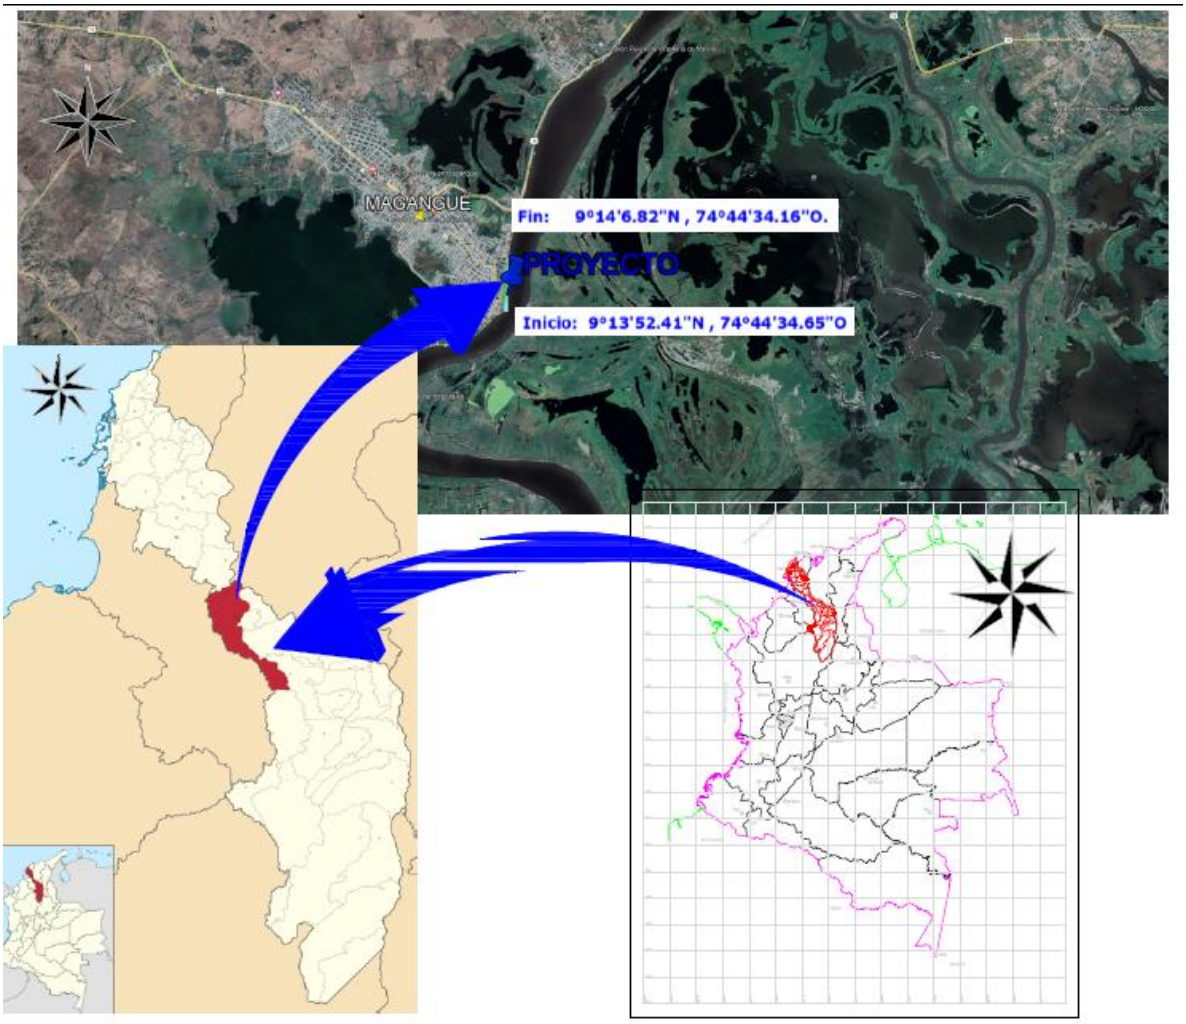


Ilustración 1.Localización del proyecto

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.6137150
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
OBJETO DEL PROYECTO (FASE II)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MAGDALENA FASE II, ENTRE LA PLAZA DE BOLIVAR Y LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO LA CANDELARIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	73.201.971
VALOR INICIAL DEL PROYECTO (FASE II)	$15,165,459,825.00
PLAZO DEL PROYECTO	HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO (FASE II)	17 DE JUNIO DEL 2025
INTERVENTOR	TEKTO INGENIERÍA SAS.

Tabla 1. Información de la obra.

3. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del contrato de obra

Certificado de disponibilidad (CDP) del proyecto	N° 652 del 05 DE JUNIO DEL 2025
Registro presupuestal (RP) del proyecto	N° 4444 del 09 DE JUNIO DEL 2025

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal.

4. Información pólizas del contrato de obra

a. Póliza seriedad de la oferta: Amparar la seriedad de oferta derivada del proceso de contratación No lic-si-001-2024.

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400054189
ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	28/02/2024

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento del proceso de contratación.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Seriedad de la oferta	01/03/2024	01/07/2024	$8.334.480,80

Tabla 4. Póliza Garantía Cumplimiento Vigencia del proceso de contratación.

b. **Pólizas del contrato No. CO1.PCCNTR.6137150:** Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato no CO1.PCCNTR.6137150.

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055399
ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	07/05/2024

*Tabla 5. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150**.*

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	09/04/2024	09/11/2025	$16.421.699.996,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/04/2024	09/07/2028	$2.736.950.000,00
Estabilidad de la obra	09/07/2025	09/07/2030	$2.736.950.000,00

*Tabla 6. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150.***

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055398
CERTIFICADO O N° ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	07/05/2024

*Tabla 7. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150**.*

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	09/04/2024	09/07/2025	$2.736.950.000,00
Contratistas y subcontratistas			$2.736.950.000,00
Responsabilidad civil patronal			$2.736.950.000,00
Vehículos propios y no propios			$2.736.950.000,00

*Tabla 8. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. **CO1.PCCNTR.6137150.***

c. **Póliza actualizada por acta de inicio:** Por medio del presente anexo

y de acuerdo al acta de inicio de fecha 10 de mayo de 2024 se ajustan las vigencias de los amparos contratados. los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055399
ANEXO	3
FECHA EXPEDICIÓN	23/05/2024

Tabla 9. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por acta de inicio.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	10/05/2024	10/12/2025	$16.421.699.996,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10/05/2024	10/08/2028	$2.736.949.999.45
Estabilidad de la obra	10/08/2024	10/08/2029	$2.736.949.999.45

Tabla 10. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por acta de inicio Vigencia.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055398
CERTIFICADO O N° ANEXO	3
FECHA EXPEDICIÓN	23/05/2024

Tabla 11. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por acta de inicio.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	10/05/2024	10/08/2025	$2.736.950.000,00
Contratistas y subcontratistas			$2.736.950.000,00
Responsabilidad civil patronal			$2.736.950.000,00
Vehículos propios y no propios			$2.736.950.000,00

Tabla 12. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por acta de inicio vigencia.

d. Póliza actualizada por OTROSÍ No. 1

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055399
ANEXO	6
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2024

Tabla 13. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.1.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	10/05/2024	10/12/2025	$16.421.699.996,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10/05/2024	10/08/2028	$2.736.949.999.45
Estabilidad de la obra	10/08/2025	10/08/2030	$2.736.949.999.45

Tabla 14. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.1 Vigencia.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055398
CERTIFICADO O N° ANEXO	5
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2024

Tabla 15. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.1.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	10/05/2024	10/08/2025	$2.736.950.000,00
Contratistas y subcontratistas			$2.736.950.000,00
Responsabilidad civil patronal			$2.736.950.000,00
Vehículos propios y no propios			$2.736.950.000,00

Tabla 16. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.1 Vigencia.

e. Póliza actualizada por OTROSÍ No. 2

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055399
ANEXO	7
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2024

Tabla 17. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.2.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/12/2025	$17.471.699.996,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	27/12/2024	10/08/2028	$2.911.949.999,45
Estabilidad de la obra	10/08/2025	10/08/2030	$2.911.949.999,45

Tabla 18. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.2 Vigencia.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055398
CERTIFICADO O N° ANEXO	6
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2024

Tabla 19. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.2.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	27/12/2024	10/08/2025	$2.911.949.999,45
Contratistas y subcontratistas			$2.911.949.999,45
Responsabilidad civil patronal			$2.911.949.999,45
Vehículos propios y no propios			$2.911.949.999,45

Tabla 20. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No. Vigencia.

f. Póliza actualizada por OTROSÍ No. 3

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055399
ANEXO	8
FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025

Tabla 21. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.3.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	19/03/2025	10/12/2025	$17.471.699.996,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	19/03/2025	10/08/2028	$2.911.949.999,45
Estabilidad de la obra	10/08/2025	10/08/2030	$2.911.949.999,45

Tabla 22. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.3 Vigencia.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055398
CERTIFICADO O N° ANEXO	7
FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025

Tabla 23. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.3.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	**19/03/2025**	**10/08/2025**	**$2.911.949.999,45**
Contratistas y subcontratistas			**$2.911.949.999,45**
Responsabilidad civil patronal			**$2.911.949.999,45**
Vehículos propios y no propios			**$2.911.949.999,45**

Tabla 24. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.3 Vigencia.

g. Póliza actualizada por OTROSÍ No. 4

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055399
ANEXO	10
FECHA EXPEDICIÓN	21/05/2025

Tabla 25. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.4.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	9/05/2025	10/03/2026	$22.021.337.944,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	9/05/2025	10/11/2028	$3.670.222.990,70
Estabilidad de la obra	10/11/2025	10/11/2030	$3.670.222.990,70

Tabla 26. Póliza actualizada de seguro de cumplimiento entidad estatal por OTROSÍ No.4 Vigencia.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Nacional de seguros
N° PÓLIZA	400055398
CERTIFICADO O N° ANEXO	9
FECHA EXPEDICIÓN	21/05/2025

Tabla 27. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.4.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	09/04/2024	10/11/2025	$3.670.222.990,70
Contratistas y subcontratistas			$3.670.222.990,70
Responsabilidad civil patronal			$3.670.222.990,70
Vehículos propios y no propios			$3.670.222.990,70

Tabla 28. Póliza actualizada de Responsabilidad Civil Extracontractual por OTROSÍ No.4 Vigencia.

5. Informe de gestión social

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Gestión Social, bajo la orientación de la profesional en trabajo social adscrita al Consorcio La Candelaria. En este documento se recogen las principales acciones ejecutadas, así como las observaciones, sugerencias, inquietudes, dificultades y comentarios generados durante la implementación de dichas actividades.

Igualmente, se incluye un registro fotográfico que evidencia los resultados obtenidos en el proceso de gestión social desarrollado en el proyecto.

Para facilitar su revisión, este informe se presenta de manera independiente como Anexo 1.

6. Informe de seguridad y salud en el trabajo

En relación con el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de septiembre, se presenta la documentación soporte de las actividades desarrolladas por el Sistema de Gestión de SST, conforme a lo establecido en el cronograma de obra y en el plan de trabajo definido para el proyecto.

Este contenido se encuentra detallado en el Anexo 2.

7. Informe gestión ambiental

Como parte del seguimiento ambiental correspondiente al mes de septiembre, se presenta el Anexo 3, el cual contiene el informe de gestión ambiental con el detalle de las actividades implementadas conforme a lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

8. OBRA CIVIL

a. Registro del personal

Para el pedido correspondiente al mes de septiembre, el grupo de trabajo finalizando este periodo queda conformado de la siguiente manera:

RELACIÓN PERSONAL PROYECTO CONSORCIO LA CANDELARIA

ID DEL COLABORADOR	NOMBRE	CARGO	PORCENTAJE COTIZACION	FECHA INGRESO	EMPRESA	VINCULACIÓN AL PROYECTO	ESTADO
C1064997706	JESÚS ALBERTO ZAPA PÉREZ	DIRECTOR DE PROYECTO	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1047462800	KATTY RANGEL ARROYO	INGENIERO RESIDENTE	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C45543864	ILUMINADA CASTELLAR ARRETA	INSPECTOR DE OBRAS	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C9274538	DEIBYS ACUÑA ROJAS	TOPÓGRAFO	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1050006976	DANIELA CONSUEGRA PINO	CADENERO	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1047965818	ETTY CALVO RAMIREZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL	0.522	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1143414289	CAROLINA LOGREIRA MORENO	PROFESIONAL DE CALIDAD	0.522	11/07/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1005604304	YONIS JAVIER CUAVAS BERTEL	PROFESIONAL SISO	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1007855170	NICOLE DE JESUS LLAMAS BARRIOS	ABOGADO	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C33357705	OLADIS MARGARITA REYES RAMOS	CONTADOR	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1007874162	MARÍA CAMILA MONTES VIVANCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.522	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1002101393	EMILSE LORENA VANEGAS MARTINEZ	PROFESIONAL SOCIAL	6.96	17/06/2025	CONSORCIOLA CANDELARIA	DIRECTO	VIGENTE
C1052076168	Fernando Gabriel Pineda Montes	CONDUCTOR	4.350	1/09/2025	SUBCONTRATISTA NAM CONSTRUCCIONES	INDIRECTO	VIGENTE
C1052095745	Jafer Andres Muñoz Olivera	CONDUCTOR	4.350	1/09/2025	SUBCONTRATISTA NAM CONSTRUCCIONES	INDIRECTO	VIGENTE
C1052069905	Juan Alberto Martinez Diaz	CONDUCTOR	4.350	1/09/2025	SUBCONTRATISTA NAM CONSTRUCCIONES	INDIRECTO	VIGENTE
C1053005484	Juan Camilo Pabuena Cuello	CONDUCTOR	4.350	1/09/2025	SUBCONTRATISTA NAM CONSTRUCCIONES	INDIRECTO	VIGENTE
C73433712	Juan Carlos Martinez Diaz	CONDUCTOR	4.350	1/09/2025	SUBCONTRATISTA NAM CONSTRUCCIONES	INDIRECTO	VIGENTE
C1043121528	DIEGO ANDRES GUZMAN BERTEL	OFICIOS VARIOS	6.96	8/08/2025	SUBCONTRATISTA B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES SAS	INDIRECTO	VIGENTE
C72161506	DAGOBERTO GUZMAN RODRIGUEZ	JEFE CUADRILLA	6.96	8/08/2025	SUBCONTRATISTA B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES SAS	INDIRECTO	VIGENTE
C1193436313	WILSON DOSANTOS SALIMETH CHAVEZ	OFICIOS VARIOS	6.96	8/08/2025	SUBCONTRATISTA B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES SAS	INDIRECTO	VIGENTE
C9160527	ROGER ALVARADO RODRIGUEZ	OPERADOR BARCAZA	6.96	8/08/2025	SUBCONTRATISTA B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES SAS	INDIRECTO	VIGENTE
C84581166	WILMAR RAFAEL SANJUAN URBINA	OFICIOS VARIOS	6.96	8/08/2025	SUBCONTRATISTA B&B PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES SAS	INDIRECTO	VIGENTE

Tabla 29. Registro del personal

b. Registro climático

En este periodo se presentaron lluvias moderadas en la zona del proyecto. En el ANEXO 4 se muestra el estado general del tiempo diario, registrándose algunas horas de lluvia dentro del horario laboral; sin embargo, estas condiciones no generaron interrupciones significa fáticas, ni tiempo perdido del proyecto asociada a estas condiciones.

c. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo

Durante el periodo reportado correspondiente al mes de septiembre, se dio inicio a la ejecución de las actividades constructivas del proyecto. En esta etapa, los trabajos se enfocaron en el desarrollo de labores de desmonte y limpieza en zonas no boscosas, así como en la excavación sin clasificar de la explanación y canales. Asimismo, se avanzó con la instalación del tablestacado metálico en acero A36, con un módulo de sección de 1.5×10^{-3} m³/m y un momento de inercia de 2.2×10^{-4} m⁴/m. Se realizó también el hincado de pilotes prefabricados en concreto con sección de 0.60 m, la construcción de la viga de reparto tipo IPE330 y la colocación de concreto reforzado con una resistencia a la compresión de 28 MPa, empleando mezcla comprada. De igual manera, se instaló acero de refuerzo con un esfuerzo de fluencia de 420 MPa y se ejecutó el montaje adicional de tablestacado metálico en acero A36, con módulo de sección de 4.2×10^{-3} m³/m y momento de inercia de 9.0×10^{-4} m⁴/m.

9. Conclusión

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se dio inicio formal a la ejecución del proyecto "Construcción de obras para el control y mitigación de la erosión y del nivel de inundación del margen izquierdo del río Magdalena – Fase II, entre la Plaza de Bolívar y la Carrera 2A en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar", conforme a lo establecido en el Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.6137150.

En esta primera etapa, las actividades constructivas se concentraron principalmente en la ejecución de labores de desmonte y limpieza en zonas no boscosas, y en la excavación sin clasificar correspondiente a la explanación y canales. De manera complementaria, se dio inicio al hincado de pilotes prefabricados en concreto, con sección transversal de 0.60 m, y a la instalación del tablestacado metálico en acero A36, con un módulo de sección de 1.5×10^{-3} m³/m y un momento de inercia de 2.2×10^{-4} m⁴/m.

Adicionalmente, se ejecutó la construcción de la viga de reparto tipo IPE330, empleando acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia Fy = 420 MPa. También se realizó el montaje adicional de tablestacado metálico en acero A36, con módulo de sección de 4.2×10^{-3} m³/m y momento de inercia de 9.0×10^{-4} m⁴/m.

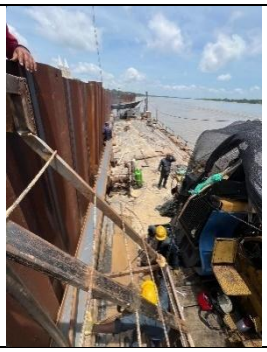
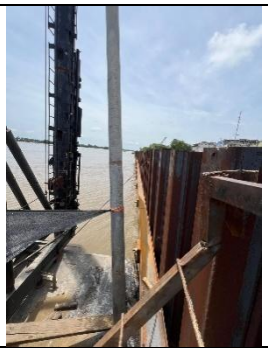
De manera paralela, se llevaron a cabo las gestiones relacionadas con los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), las cuales fueron debidamente documentadas en los respectivos anexos del informe. Para la ejecución de las actividades se dispuso de la maquinaria, equipos y herramientas requeridas, registradas en el informe técnico correspondiente.

Durante el periodo, las condiciones climáticas se caracterizaron por lluvias moderadas, permitiendo el desarrollo normal de las jornadas y el cumplimiento del cronograma de actividades programadas para este primer tramo de ejecución.

Finalmente, se deja constancia del avance físico inicial del proyecto, mediante el registro fotográfico que evidencia las actividades desarrolladas, correspondientes a desmonte y limpieza, excavación, pilotes hincados, instalación de tablestacado metálico, colocación de concreto reforzado, y labores de señalización.

A continuación, se muestra el registro fotográfico:

	
Hincado de tablestaca	Hincado de tablestaca
	
Pilotes hincados	Pilotes hincados
	
Excavación	Desmonte

	
Viga de reparto	Viga de reparto

El presente informe corresponde al periodo de septiembre del año 2025.

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
C.C. No. 73.201.971 de Cartagena
Representante Legal
CONSORCIO LA CANDELARIA

Anexos

Anexo 1. Informe gestión social

Anexo 2. Informe gestión SST

Anexo 3. Informe Ambiental

Anexo 4. Estado general del tiempo

Anexo 5. Ensayo de laboratorios
