INFORME DE VISITA TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE MUESTRA DE VALLA

Contrato No. 4233000-867-2025

Fecha de la visita: 12 de septiembre de 2025

Lugar: Secretaria General, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (Cra 8 # 10-65)

Objeto: "Inspección en sitio de la muestra de valla metálica destinada a la protección perimetral del Edificio Liévano, como parte de las actividades preliminares a la fabricación total, conforme a lo establecido en el contrato."

1. Descripción de la visita y participantes

Se realizó el descargue e instalación de la muestra de valla metálica sobre la Carrera 8, frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., , en la zona proyectada para el cerramiento. La inspección fue acompañada por representantes del equipo técnico, con el fin de verificar las condiciones y características de la muestra, así:

- Arq. Carlos Andrés Hernández Montiel, apoyo a la Supervisión SGA.
- Alexander Rojas Romero, apoyo técnico, Consorcio.
- Arq. Liset Mahecha, apoyo técnico, Consorcio.
- Ramiro Barajas, apoyo técnico, Consorcio.
- Ing, Johon Jairo Nova Melo, Representante de Rocainnova

2. Evaluación de la muestra

Durante la revisión visual y técnica se evidenció:

- Acabados: Correctos, con pintura de buena calidad, sin embargo dentro de la muestra hacía falta la pintura esmalte final, la cual sería entregada en el producto final.
- Soldaduras: Uniformes y bien ejecutadas.
- Materiales: De acuerdo con el anexo técnico y los planos de taller.
- Dimensiones y espesores: Correspondientes con lo especificado contractualmente.
- Instalación: Se realizó en condiciones reales para verificar su comportamiento.



La Secretaría General validó y revisó los componentes de la muestra, los cuales se encontraron acordes con los requerimientos estructurales y de diseño. En consecuencia, se aprueba la muestra presentada para proceder con la fabricación total de los componentes contratados.

3. Observaciones (Pendientes de la muestra)

- Ruedas: Las instaladas en la muestra eran provisionales y de menor tamaño. Se explicó que por agilidad operativa se llevaron ruedas pequeñas, pero que serán reemplazadas por las definitivas, de mayor diámetro, las cuales también fueron llevadas en físico ese día y aprobadas, sin embargo no se realizó la prueba de arrastre con las ruedas definitivas, lo cual es una actividad pendiente.

- Pasadores: Se identificó que los pasadores tipo 'pino' presentaban un exceso de longitud, por lo cual se evaluaron diferentes alternativas. Como resultado, se definió el uso de pasadores tipo 'U' con grapa trasera, solución que facilita su instalación y retiro, además de garantizar la seguridad estructural del sistema."


-Pintura: La pintura validada, no fue la pintura final, la cual quedo en estao pendiente, conocer el acabado final de la valla.

4. Conclusión

La muestra de valla metálica fue aprobada por el equipo técnico y la Secretaria General, presente , cumpliendo con los requisitos establecidos de calidad, materiales y dimensiones, establecidas en el contrato y sus anexos.

Se autoriza la fabricación de la totalidad de las vallas bajo las mismas especificaciones de la muestra presentada, incluyendo los ajustes acordados (ruedas definitivas, pasador tipo U, pintura final).

Conector entre vallas

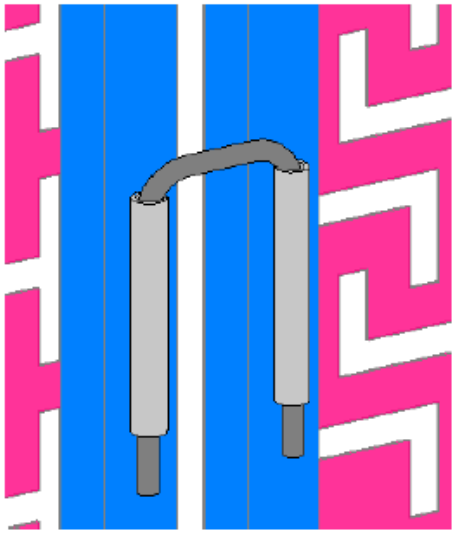

5. Firmas de verificación y aprobación

Mauro Palta Cerón CC ----------
SECRETARIA GENERAL , Supervisor del contrato

Carlos Andrés Hernández Montiel CC 72.287.935 ----------
SECRETARIA GENERAL , apoyo a la Supervisión

Alexander Rojas Romero CC.80082016 ----------
(Gerente Administrativo ROCAINNOVA)

Liset Mahecha CC1018439995 ----------
(arquitecta ROCAINNOVA)

Johon Nova CC 1.077.147.549 ----------
(ingeniero ROCAINNOVA)
