2025 12 27 59,993,830.65

CONDISEING INGENIERIA SAS

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 64

CENTAVOS

obra 002

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 36146

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
39648	SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EL TRIUNFO Y PRADILLA	CI - 170	19/12/2025 00:00:00	61,532,134
			Total:	**61,532,134**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	61532134		1,538,303.35
			Total:	**1,538,303.35**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100502	DAVIVIENDA CTA CTE - RECUADO BOLETINES	0	59,993,830.65
24010101	BIENES	59,993,830.65	0
		Total: 59,993,830.65	**59,993,830.65**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2853	3018	002-obra	1117	1102	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,128,561
2853	3018	002-obra	1117	1102	2.4.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	40,000,000
2853	3018	002-obra	1117	1102	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,403,573
							Total: 61,532,134

DETALLE DEL EGRESO

PAGO SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EL TRIUNFO Y PRADILLA

Preparado **Revisado** **Aprobado**

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN TESORERÍA Tesorería EL COLEGIO, CUND.

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	OBRA 02
CONTRATISTA	CONDISEING INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	900.648.356-3
FECHA DE SUSCRIPCION:	4/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.712.135
PLAZO INICIAL:	1 MES
FECHA DE INICIO:	5/11/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
TIEMPO DE PRORROGA	15 DIAS
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	19/12/2025

MES PAGADO	**FECHA DE PAGO:**

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION:24/NOVIEMBRE/2025**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE 22-15 DICIEMBRE**

Que en razon a dicha ejecucion, el valor correspondiente a pagar es de **SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS $ (61,532,134)**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 2025

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 39648

Tercero: 900648356 - 3 - CONDISEING INGENIERIA SAS
Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 10 X MIL

Factura: 170
Prefijo: CI
Fecha Factura: 19/12/2025
Fecha Vence: 19/01/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: OBRA 02
Fecha: 19/12/2025

Descripción: SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EL TRIUNFO Y PRADILLA
Valor en Letras: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1504	738202150101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO			61,532,134
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			1,538,303.35
374	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS - DECLARANTES 2%					59,993,830.65

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
738202150101	738202150101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO	01	01	010101	900648356	61,532,134	0
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				900648356	0	1,538,303.35
24010101	BIENES				900648356	0	59,993,830.65
					Total:	**61,532,134**	**61,532,134**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **59,993,830.65**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1102	91 - 1117	83 - 3018	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	20,128,561
99 - 1102	91 - 1117	83 - 3018	01	2.4.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	40,000,000
99 - 1102	91 - 1117	83 - 3018	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,403,573
					Total:	**61,532,134**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

CONDISEING Ingeniería SAS

Factura Electrónica de Venta

No.CI-170

CONDISEING INGENIERIA SAS

Nit: 900648356-3
Departamento: Bogota
Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: Calle 135C # 13 - 70 AP 404
Teléfono: 3123762860

Correo: contabilidad@condiseing.com.co
Tipo de contribuyente: Persona jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: Régimen simple de tributación
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Número Documento: NIT 860020094-8
Teléfono: 3112922972
Dirección: Av Medina 6 06
Correo: gerencia@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co
Departamento: Cundinamarca

Ciudad: EL COLEGIO

Fecha Expedición: 17/12/2025 02:54 PM
Fecha Vencimiento: 16/03/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Transferecia Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	% INC	Total
Adecuaciones001 - ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	$ 47,332,411.16	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,332,411.16
Administracion - 24%	$ 11,359,778.68	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,359,778.68
Imprevistos - 1%	$ 473,324.11	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473,324.11
Utilidad - 5%	$ 2,366,620.56	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,366,620.56

Total items: 4 **Total cantidad:** 4

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	$ 61,532,134.51
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 61,532,134.51
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: $ 61,532,135

Valor en Letras

SESENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

Numero de resolución:18764094009137
Rango Autorizado: Desde CI-163 Hasta CI-1000
Vigencia:04/06/2025 Hasta 04/06/2026

Observaciones: PERTENECEMOS AL REGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLE. PARA PAGO FAVOR TENER EN CUENTA ART. 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO "LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN – SIMPLE NO ESTARÁN SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE NI RETENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" – FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 68930713205 DE BANCOLOMBIA.

Cufe:
3e2ed4aeb192c608054d5ec9fcccf72ec64182ca4a749d96e8c9abfe5153b74036819fc7195efbe2c1f60876650a8876

INFORME DE PAGO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**22/11/2025 al 15/12 /2025**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	002 de 2025
CONTRATISTA	CONDISEING INGENIERIA S.A.S	NIT. No.	900.648.356-3
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA	C.C. No.	79.942.058
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		

Informe No:	**02**			Fecha:	DICIEMBRE DE 2025		
Iniciación:	05/11/2025			Suspensión			
Finalización:	04/12/2025	Plazo Inicial:	UN (1) MES	Prorroga:	QUINCE (15) DIAS	Fecha Final	**19/12/2025**

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
1102	**$179.712.135,00**	**1117**	**$179.712.135,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato0	**$179.712.135,00**	Valor Cobrado:	**$61.532.134.51**
		Valor Giros Efectuados	**$ 89.871.439**

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
1. Las actividades ejecutadas de Infraestructura serán entregadas por el Contratista al Supervisor.	X	
2. El Contratista se compromete a realizar las actividades solo con personal capacitado e idóneo, para ello deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad del personal que realizará dichas actividades.	X	
3. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificación de trabajo en alturas, para ello deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabajo en alturas. El equipo utilizado para realizar trabajo en alturas será responsabilidad de contratista.	X	
4. Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, certificar las capacitaciones relacionadas con el tema.	X	
5) Cumplir con la afiliación al sistema general de seguridad social integral del personal utilizado para la ejecución del contrato.	X	
6. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor.	X	
7. Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar accidentes tanto de su personal como de otras administraciones que tengan acceso a lugares aledaños a la obra y evitar daños a las propiedades vecinas. El supervisor podrá exigir al contratista las estructuras adicionales de seguridad que consideren necesarias (señales, barreras, etc.), y su costo será asumido enteramente por el Contratista	X	
8. Garantizar la calidad de los materiales suministrados.	X	
9. Realizar un manejo adecuado de los Residuos generados en el transcurso del Contrato de acuerdo con cómo está establecido en el Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades - PGIRASA-. RESOL UCIÓN NÚMERO 591 DE 04 ABR 2024 "Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades"	X	
10. Las cantidades de la obra civil a todo costo para — desarrollar las actividades de la adecuación de la infraestructura física, se discriminan a continuación en documento anexo:	X	

JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA
C.C 79.942.058 DE BOGOTA D.C

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS MATERIALES

Por medio de la presente pongo a disposición los materiales necesarios en las instalaciones de ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO con el fin de desarrollar los ítems que comprenden el CONTRATO DE OBRA No 002 DE 2025 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT
2	**EXCAVACIONES**		
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	162.3
3	**CIMIENTOS**		
3.1	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0.003
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**		
5,2	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	9.37
5,4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	66.42
5,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	6,00
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
6.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM	M2	84.75
6.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	12.00
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	114.00
6.4	DINTELES EN BLOQUE 0,15 M	ML	3.00
6.6	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	UND	36.00
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA**		
7.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UND	2.00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**		
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL EN LÁMINA COLD ROLLED , FRENTE MUERTO, CHAPA GIRATORIA, MARQUILLADO Y SEÑALIZACIÓN.	UND	2,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE, 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO). INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X8	ML	91.97
9,3	CONEXIÓN NORMALIZADA Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA (INC. BORNAZ ESTAÑADAS AISLADAS.)	UND	2,00

9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO (INCLUYE TOMA DOBLE, TIERRA AISLADA, GRADO HOSPITAL, 20 A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22), MARQUILLADO NORMALIZADO.	UND	16,00
9,7	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO . (INCLUYE 1 CAJA 5800, CONECTOR 3/4" , CONECTOR 3/4" EMT , TUBO 3/4" , INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALÓGENOS).	UND	4,00
9,8	TUBERÍA EMT CONDUIT GALVANIZADA 3/4"	ML	40,00
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	220,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	100,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 2.4ML. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y TRATAMIENTO FAVIGEL.)	UND	2,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X50 DE CAJA MOLDEADA 100A (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .	UND	1,00
10	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
10,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	28.35
10,3	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	18.28
10,4	ENTIBADO TIPO 2	M2	13.95
11	**PINTURAS**		
11,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	21.00
11,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	10,49

JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA
C.C 79.942.058 DE BOGOTA D.C

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

REVISADO: ARQ. GUSTAVO A SARMIENTO V
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

Gobernación de Cundinamarca

CONDISEING ingeniería

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

7. BALANCE GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 02 DE 2025	OBJETO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONDENSING INGENIERIA SAS
JAIR ALEXANDER REODRIGUEZ PEÑUELA
NIT: 900.648.356-3

SUPERVISION: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

ACTA N°1 ACTA DE INICIO
ACTA N°2 ACTA DE COBRO N°1
ACTA N°3 ACTA DE COBRO N°2

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	179.712.138,00
VALOR ACTA DE COBRO N°1	$	89.871.439,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1		50,01%
VALOR ACTA DE COBRO N°2	$	61.532.134,51
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2		34,24%
VALOR POR EJECUTAR	$	28.308.562,49
PORCENTAJE POR EJECUTAR		15,75%

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS								ACTA PARCIAL DE COBRO N°1		ACTA PARCIAL DE COBRO N°2		CONDICIONES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	VALOR TOTAL CON AIU	MATERIALES CON AIU	MANO DE OBRA CON AIU	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES														
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	132,42	$ 13.677,00	$ 1.811.108,34	1,41	$ 2.354.440,84	$ 941.776,34	$ 1.412.664,50	88,64	$ 1.212.260,00	0,00	$ -	43,78	$ 598.847,45
1,2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	88,64	$ 31.545,00	$ 2.796.148,80	1,8	$ 3.634.993,44	$ 1.453.997,38	$ 2.180.996,06	88,64	$ 2.796.148,80	0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	29,76	$ 2.038,00	$ 60.650,88	1,3	$ 78.846,14	$ 31.538,46	$ 47.307,68	29,76	$ 60.650,88	0,00	$ -	0,00	$ -
1,4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	11,90	$ 17.343,00	$ 206.451,07	1,46	$ 268.386,39	$ 107.354,56	$ 161.031,83	11,90	$ 206.451,07	0,00	$ -	0,00	$ -
2	EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	102,30	$ 74.321,00	$ 12.062.298,30	16,4	$ 15.680.987,79	$ 6.272.395,12	$ 9.408.592,67	115,40	$ 8.576.494,76	14,89	$ 1.091.775,49	32,21	$ 2.394.028,05
3	CIMIENTOS														
3,1	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	3,00	$ 912.760,00	$ 2.741.018,28	2,6	$ 3.563.323,76	$ 1.425.329,50	$ 2.137.994,26	3,00	$ 2.738.280,00	0,003	$ 2.738,28	0,00	$ -
3,2	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,87	$ 909.859,00	$ 789.302,68	2,7	$ 1.026.093,49	$ 410.437,40	$ 615.656,09	0,87	$ 789.302,68	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,90	$ 852.991,00	$ 764.279,94	2,8	$ 993.563,92	$ 397.425,57	$ 596.138,35	0,90	$ 764.279,94	0,00	$ -	0,00	$ -
4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO														
4,1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,81	$ 1.175.674,00	$ 955.235,13	4,30	$ 1.241.805,66	$ 496.722,26	$ 745.083,40	0,81	$ 955.235,13	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,69	$ 1.254.073,00	$ 870.326,66	4,26	$ 1.131.424,66	$ 452.569,86	$ 678.854,80	0,69	$ 870.326,66	0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	401,69	$ 8.021,00	$ 3.943.816,61	4,22	$ 5.126.961,60	$ 2.050.784,64	$ 3.076.176,96	401,69	$ 3.943.816,61	0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,50	$ 448.517,00	$ 224.482,76	4,29	$ 291.827,59	$ 116.731,04	$ 175.096,55	0,50	$ 224.482,76	0,00	$ -	0,00	$ -
4,5	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	16,02	$ 110.623,00	$ 1.871.741,16	4,15	$ 2.433.263,51	$ 973.305,40	$ 1.459.958,11	16,02	$ 1.871.741,16	0,00	$ -	0,00	$ -
4,6	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	15,00	$ 78.117,00	$ 1.171.755,00	13,13	$ 1.523.281,50	$ 609.312,60	$ 913.968,90	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.171.755,00
4,7	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	14,76	$ 110.761,00	$ 1.634.832,36	13,14	$ 2.125.282,07	$ 850.112,83	$ 1.275.169,24	14,76	$ 1.634.832,36	0,00	$ -	0,00	$ -
4,8	REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA	KG	88,30	$ 10.561,00	$ 911.456,54	4,23	$ 1.184.893,51	$ 473.957,40	$ 710.936,11	88,30	$ 911.456,54	0,00	$ -	0,00	$ -

Gobernación de Cundinamarca

CONDISEING Ingeniería

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

BALANCE GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°: 02 DE 2025	OBJETO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONDENSING INGENIERIA SAS
JAIR ALEXANDER REODRIGUEZ PEÑUELA
NIT: 900.648.356-3

SUPERVISION: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

ACTA N°1 ACTA DE INICIO
ACTA N°2 ACTA DE COBRO N°1
ACTA N°3 ACTA DE COBRO N°2

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	179.712.136,00
VALOR ACTA DE COBRO N°1	$	89.871.439,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1		50,01%
VALOR ACTA DE COBRO N°2	$	61.532.134,51
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2		34,24%
VALOR POR EJECUTAR	$	28.308.562,49
PORCENTAJE POR EJECUTAR		15,75%

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS									ACTA PARCIAL DE COBRO N°1		ACTA PARCIAL DE COBRO N°2		CONDICIONES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	VALOR TOTAL CON AIU	MATERIALES CON AIU	MANO DE OBRA CON AIU		CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	MAMPOSTERIA Y PINTURA															
5,1	MURO EN BLOQUE N°5 E=0.12 M	M2	42,25	$ 60.662,00	$ 2.563.090,82	5,17	$ 3.332.018,07	$ 1.332.807,23	$ 1.999.210,84		14,40	$ 873.532,80	0,00	$ -	27,85	$ 1.689.558,02
5,2	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	12,00	$ 38.191,00	$ 458.292,00	5,18	$ 595.779,60	$ 238.311,84	$ 357.467,76		0,00	$ -	0,37	$ 357.849,87	2,63	$ 100.442,33
5,4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	94,09	$ 25.561,00	$ 2.428.090,51	18,16	$ 3.156.517,67	$ 1.262.607,07	$ 1.893.910,60		0,00	$ -	60,42	$ 1.697.659,38	28,58	$ 730.431,14
5,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	8,00	$ 16.204,00	$ 97.224,00	18,17	$ 126.391,20	$ 50.556,48	$ 75.834,72		0,00	$ -	8,00	$ 97.224,00	0,00	$ -
5,6	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	31,15	$ 25.100,00	$ 781.915,20	APU 5,6	$ 1.016.489,76	$ 406.595,90	$ 609.893,86		0,00	$ -	0,00	$ -	31,15	$ 781.915,20
	Pañetes revoques y repellos															
6,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM	M2	94,09	$ 27.770,00	$ 2.637.927,84	6,17	$ 3.429.306,19	$ 1.371.722,48	$ 2.057.583,71		0,00	$ -	84,75	$ 2.353.451,06	10,24	$ 284.475,88
6,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	12,00	$ 17.521,00	$ 210.252,00	6,18	$ 273.327,60	$ 109.331,04	$ 163.996,56		0,00	$ -	12,00	$ 210.252,00	0,00	$ -
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	114,00	$ 11.408,00	$ 1.300.512,00	6,3	$ 1.690.665,60	$ 676.266,24	$ 1.014.399,36		0,00	$ -	114,00	$ 1.300.512,00	0,00	$ -
6,4	DINTELES EN BLOQUE 0,15 M	ML	0,48	$ 43.714,00	$ 414.408,72	5,6	$ 538.731,34	$ 215.492,54	$ 323.238,80		0,00	$ -	3,00	$ 131.142,00	0,48	$ 283.266,72
6,5	CONECTOR GRAFIL 6MM- LONGITUD 1.50M	UND	36,00	$ 5.060,00	$ 182.160,00	APU 6,5	$ 236.808,00	$ 94.723,20	$ 142.084,80		0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 182.160,00
6,6	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	UND	36,00	$ 40.000,00	$ 1.440.000,00	APU 6,6	$ 1.872.000,00	$ 748.800,00	$ 1.123.200,00		0,00	$ -	36,00	$ 1.440.000,00	0,00	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA															
7,1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UND	2,00	$ 230.144,00	$ 460.288,00	10,4	$ 598.374,40	$ 239.349,76	$ 359.024,64		0,00	$ -	2,00	$ 460.288,00	0,00	$ -
7,2	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,00	$ 253.767,00	$ -	2.283.903,00	10,5	$ 2.969.073,90	$ 1.187.629,56	$ 1.781.444,34	5,00	$ 1.268.835,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.015.068,00
7,3	PUERTA O VENTANA EN CELOSIA INC. ANTICORRISIVO Y ESMALTE	M2	10,49	$ 450.000,00	$ 4.719.600,00	APU 7,3	$ 6.135.480,00	$ 2.454.192,00	$ 3.681.288,00		10,20	$ 4.590.000,00	0,00	$ -	0,29	$ 129.600,00
	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	42,80	$ 70.454,00	$ 3.015.431,20	11,33	$ 3.920.060,56	$ 1.568.024,22	$ 2.352.036,34		24,20	$ 1.704.986,80	0,00	$ -	18,60	$ 1.310.444,40
8,2	CAJA DE INSPECCIÓN 80X 80	UND	0,00	$ 503.027,00	$ -	4.527.243,00	3,6	$ 5.885.415,90	$ 2.354.166,36	$ 3.531.249,54	5,00	$ 2.615.135,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.012.108,00
8,3	TUBERÍA DRENAJE PVC200	ML	51,33	$ 86.306,00	$ 4.430.086,98	3,13	$ 5.759.113,07	$ 2.303.645,23	$ 3.455.467,84		27,90	$ 2.407.937,40	0,00	$ -	23,43	$ 2.022.149,58
	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS															
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL EN LÁMINA COLD ROLLED , FRENTE MUERTO , CHAPA GIRATORIA, MARQUILLADO Y SEÑALIZACIÓN.	UND	2,00	$ 1.450.000,00	$ 2.900.000,00	APU 9,1	$ 3.770.000,00	$ 1.508.000,00	$ 2.262.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 2.900.000,00	0,00	$ -
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE , 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) . INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X8	ML	138,08	$ 145.000,00	$ 20.021.600,00	APU 9,2	$ 26.028.080,00	$ 10.411.232,00	$ 15.616.848,00		40,11	$ 6.686.523,77	91,97	$ 13.335.076,23	0,00	$ -
9,3	CONEXIÓN NORMALIZADA Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA (INC. BORNAZ ESTAÑADAS AISLADAS.)	UND	2,00	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00	APU 9,3	$ 1.430.000,00	$ 572.000,00	$ 858.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 1.100.000,00	0,00	$ -
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO (INCLUYE TOMA DOBLE, TIERRA AISLADA, GRADO HOSPITAL, 20 A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22), MARQUILLADO NORMALIZADO.	UND	16,00	$ 170.000,00	$ 2.720.000,00	APU 9,4	$ 3.536.000,00	$ 1.414.400,00	$ 2.121.600,00		0,00	$ -	16,00	$ 2.720.000,00	0,00	$ -
9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 120X30 CM, 48 W SYLVANIA O SIMILAR.	UND	4,00	$ 160.000,00	$ 640.000,00	APU 9,5	$ 832.000,00	$ 332.800,00	$ 499.200,00		0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 640.000,00
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO ENSAMBLABLE PARA LUMINARIA LED DE EMPOTRAR 120X30 CM.	UND	4,00	$ 35.000,00	$ 140.000,00	APU 9,6	$ 182.000,00	$ 72.800,00	$ 109.200,00		0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 140.000,00
9,7	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO . (INCLUYE 1 CAJA 5800, CONECTOR 3/4" , CONECTOR 3/4" EMT , TUBO 3/4" , INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALÓGENOS).	UND	4,00	$ 125.000,00	$ 500.000,00	APU 9,7	$ 650.000,00	$ 260.000,00	$ 390.000,00		0,00	$ -	4,00	$ 500.000,00	0,00	$ -
9,8	TUBERÍA EMT CONDUIT GALVANIZADA 3/4"	ML	40,00	$ 40.083,00	$ 1.603.320,00	21,14	$ 2.084.316,00	$ 833.726,40	$ 1.250.589,60		0,00	$ -	40,00	$ 1.603.320,00	0,00	$ -
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	220,00	$ 9.900,00	$ 2.178.000,00	APU 9,9	$ 2.831.400,00	$ 1.132.560,00	$ 1.698.840,00			$ -	220,00	$ 2.178.000,00	0,00	$ -

Gobernación de Cundinamarca

CONDISEING Ingeniería

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

BALANCE GENERAL DE OBRA - ACTA DE COBRO N°1 Y N°2

CONTRATO DE OBRA Nº 02 DE 2025	OBJETO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONDENSING INGENIERIA SAS
JAIR ALEXANDER REODRIGUEZ PEÑUELA
NIT: 900.648.356-3

SUPERVISION: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

ACTA N°1 ACTA DE INICIO
ACTA N°2 ACTA DE COBRO N°1
ACTA N°3 ACTA DE COBRO N°2

FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	179.712.136,00
VALOR ACTA DE COBRO N°1	$	89.871.439,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1		50,01%
VALOR ACTA DE COBRO N°2	$	61.532.134,51
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2		34,24%
VALOR POR EJECUTAR	$	28.308.562,49
PORCENTAJE POR EJECUTAR		15,75%

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS									ACTA PARCIAL DE COBRO N°1		ACTA PARCIAL DE COBRO N°2		CONDICIONES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	VALOR TOTAL CON AIU	MATERIALES CON AIU	MANO DE OBRA CON AIU		CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	300,00	$ 6.000,00	$ 1.800.000,00	APU 9,10	$ 2.340.000,00	$ 936.000,00	$ 1.404.000,00			$ -	100,00	$ 599.976,00	200,00	$ 1.200.024,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 2.4ML. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y TRATAMIENTO FAVIGEL)	UND	2,00	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00	APU 9,12	$ 2.860.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.716.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 2.200.000,00	0,00	$ -
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X50 DE CAJA MOLDEADA 100A (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .	UND	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	APU 9,13	$ 1.950.000,00	$ 780.000,00	$ 1.170.000,00		0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -
10	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
10,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	90,14	$ 178.185,00	$ 17.664.459,07	16,8	$ 22.963.796,79	$ 9.185.518,72	$ 13.778.278,07		70,79	$ 12.612.860,88	28,35	$ 5.051.598,21	0,00	$ -
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	307,08	$ 10.475,00	$ 3.226.090,50	4,40	$ 4.193.917,65	$ 1.677.567,06	$ 2.516.350,59		167,40	$ 1.753.515,00	0,00	$ -	140,58	$ 1.472.575,50
10,3	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	40,04	$ 196.610,00	$ 7.871.753,21	13,16	$ 10.233.279,18	$ 4.093.311,67	$ 6.139.967,51		21,76	$ 4.278.626,82	18,28	$ 3.593.126,38	0,00	$ -
10,4	ENTIBADO TIPO 2	M2	128,33	$ 41.350,00	$ 5.306.238,75	2,20	$ 6.898.110,38	$ 2.759.244,15	$ 4.138.866,23		89,75	$ 2.884.162,50	13,05	$ 570.832,50	44,83	$ 1.845.243,75
11	PINTURAS															
11,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	25,48	$ 4.409,00	$ 112.341,32	18,8	$ 146.043,72	$ 58.417,49	$ 87.626,23		0,00	$ -	21,00	$ 92.580,00	4,48	$ 19.752,32
11,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	10,49	$ 22.788,00	$ 239.000,54	18,9	$ 310.700,71	$ 124.280,28	$ 186.420,43		0,00	$ -	10,49	$ 239.000,54	0,00	$ -
12	CUBIERTAS															
12,1	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	21,60	$ 53.976,00	$ 1.165.881,60	7,23	$ 1.515.646,08	$ 606.258,43	$ 909.387,65		0,00	$ -	0,00	$ -	21,60	$ 1.165.881,60
12,2	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	7,20	$ 50.596,00	$ 364.291,20	7,18	$ 473.578,56	$ 189.431,42	$ 284.147,14		0,00	$ -	0,00	$ -	7,20	$ 364.291,20
12,3	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	8,40	$ 34.656,00	$ 221.798,40	7,37	$ 288.337,92	$ 115.335,17	$ 173.002,75		0,00	$ -	0,00	$ -	8,40	$ 221.798,40

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 138.240.104,00			$ 69.131.876,00	$ 47.332.411,65	$ 21.775.816,54
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION	24,0%	$ 33.177.624,96			$ 16.591.650,24	$ 11.359.778,80	$ 5.226.195,97
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.382.401,04			$ 691.318,76	$ 473.324,12	$ 217.758,17
UTILIDAD	5,0%	$ 6.912.005,20			$ 3.456.593,80	$ 2.366.620,58	$ 1.088.790,83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%	$ 41.472.031,00			$ 20.739.563,00	$ 14.199.723,00	$ 6.532.744,90
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		$ 179.712.135,00	$ 179.712.136,00	$ 71.884.854,00 40%	$ 89.871.439,00	$ 61.532.134,51	$ 28.308.561,50
				$ 107.827.281,00 60%			

-$ 0,00

DRA DIANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 860.020.094-8

DR. DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUBGERENTE Y SUPERVISION ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 860.020.094-8

ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
SUPERVISION Y APOYO ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 860.020.094-8

ING. JAIR ALEXANDER REODRIGUEZ PEÑUELA
CONDENSING INGENIERIA SAS
CONTRATISTA
NIT 900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ


OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

2.1	EXCAVACIONES	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID	ML	UBICACIÓN	GENERAL

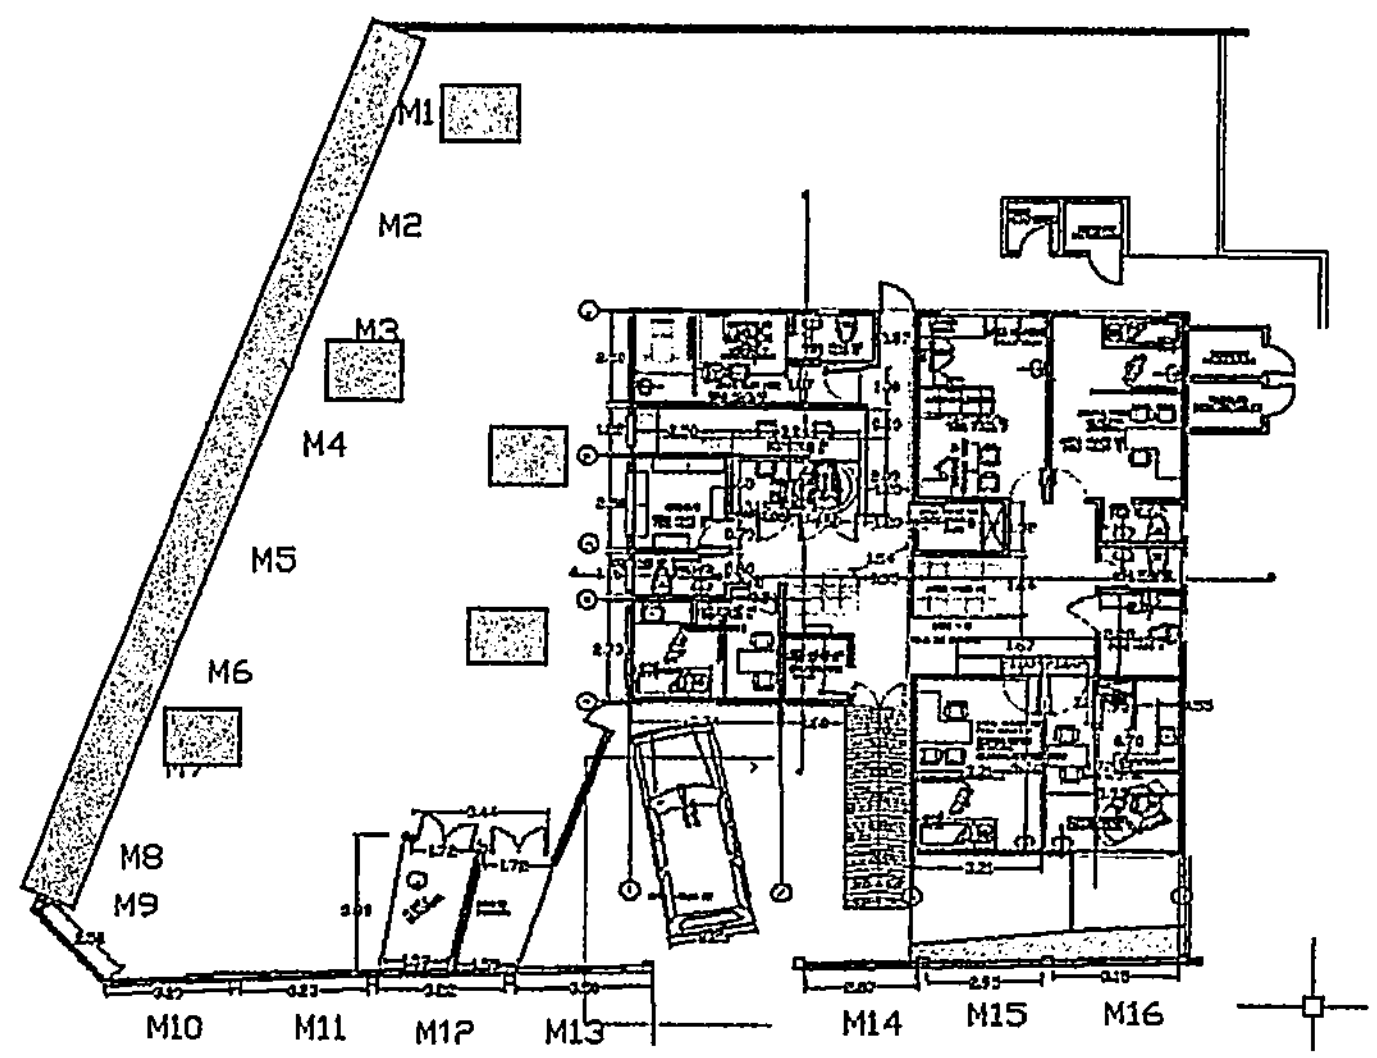

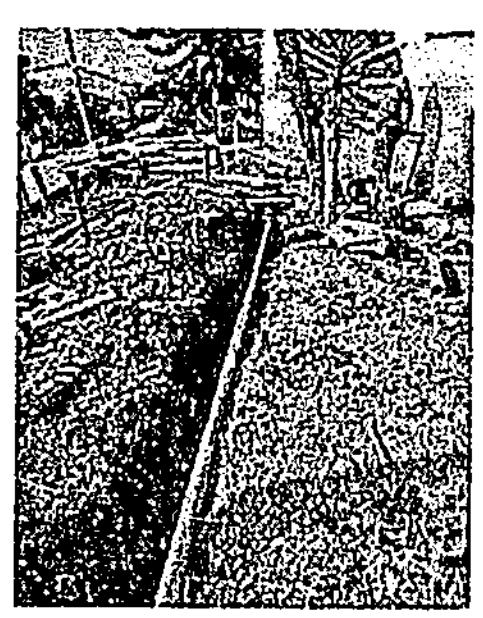

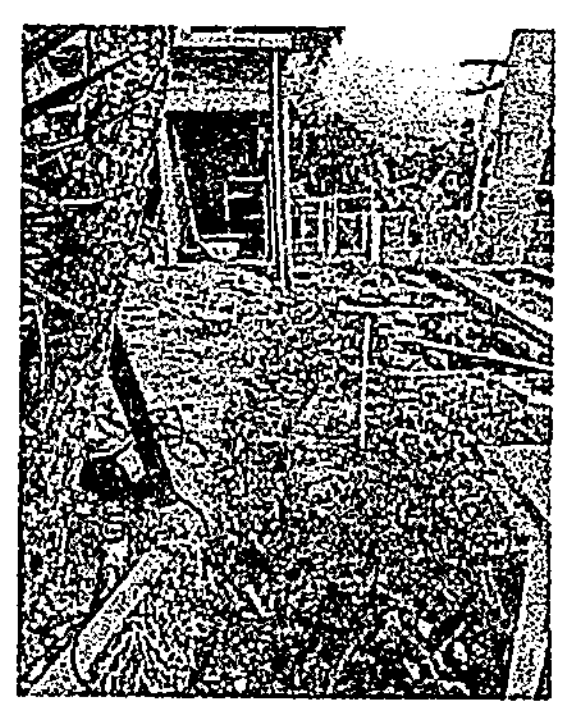

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	EXCAVACION PARA FILTRO	1,00	2,00	27,90	1,00	13,67
	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCIÓN	0,90	1,20	0,90	5,00	1,02
	Subtotal					14,69
	TOTAL					14,69

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	21	MM	11	AA	2025	CORTE Nº	ACTA DE COBRO Nº1	ELABORO

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C	860.020.094-8
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.648.356-3
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº		CONTRATO DE OBRA Nº	02 2025

3.1	CIMIENTOS	ITEM	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	UNID	ML	UBICACION	GENERAL

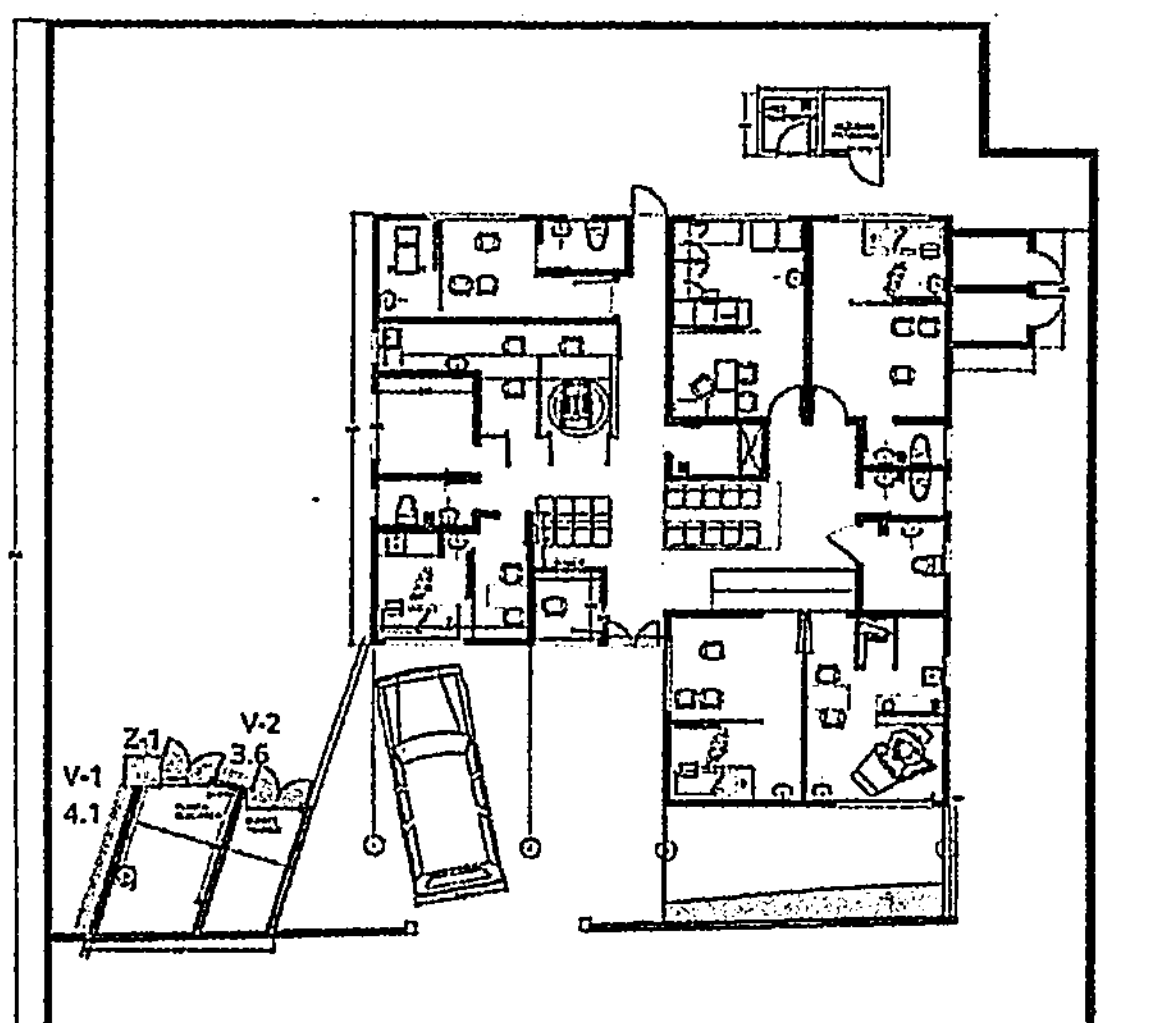

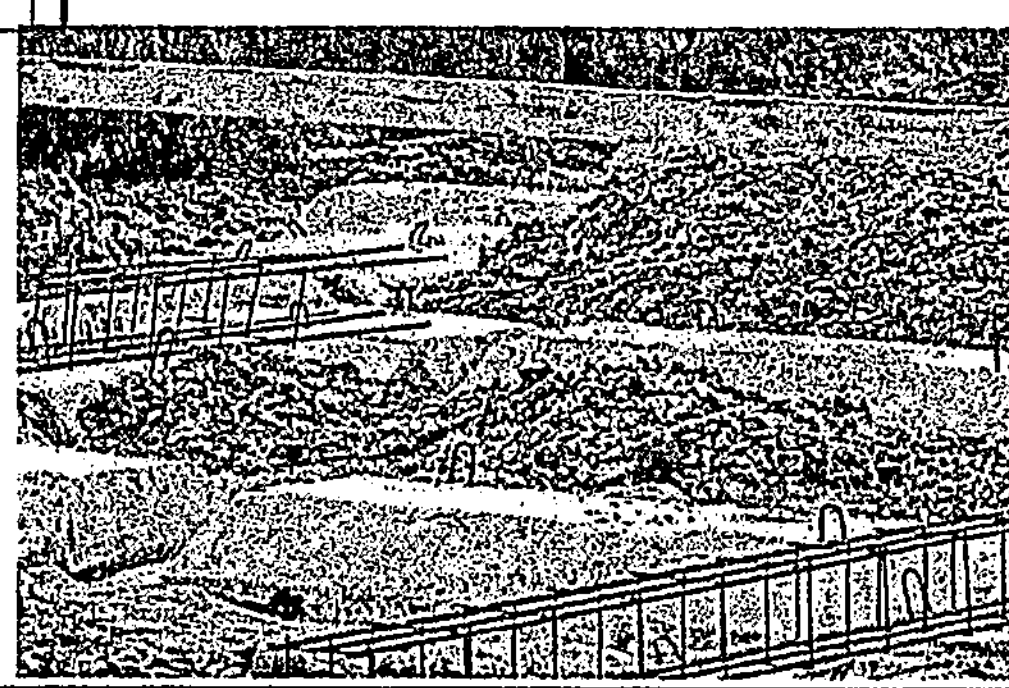

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	VIGA 1	0,50	0,30	0,02	1,00	0,00
	Subtotal					0,00
	TOTAL					0,003

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


CONDISEING


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

5,2	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

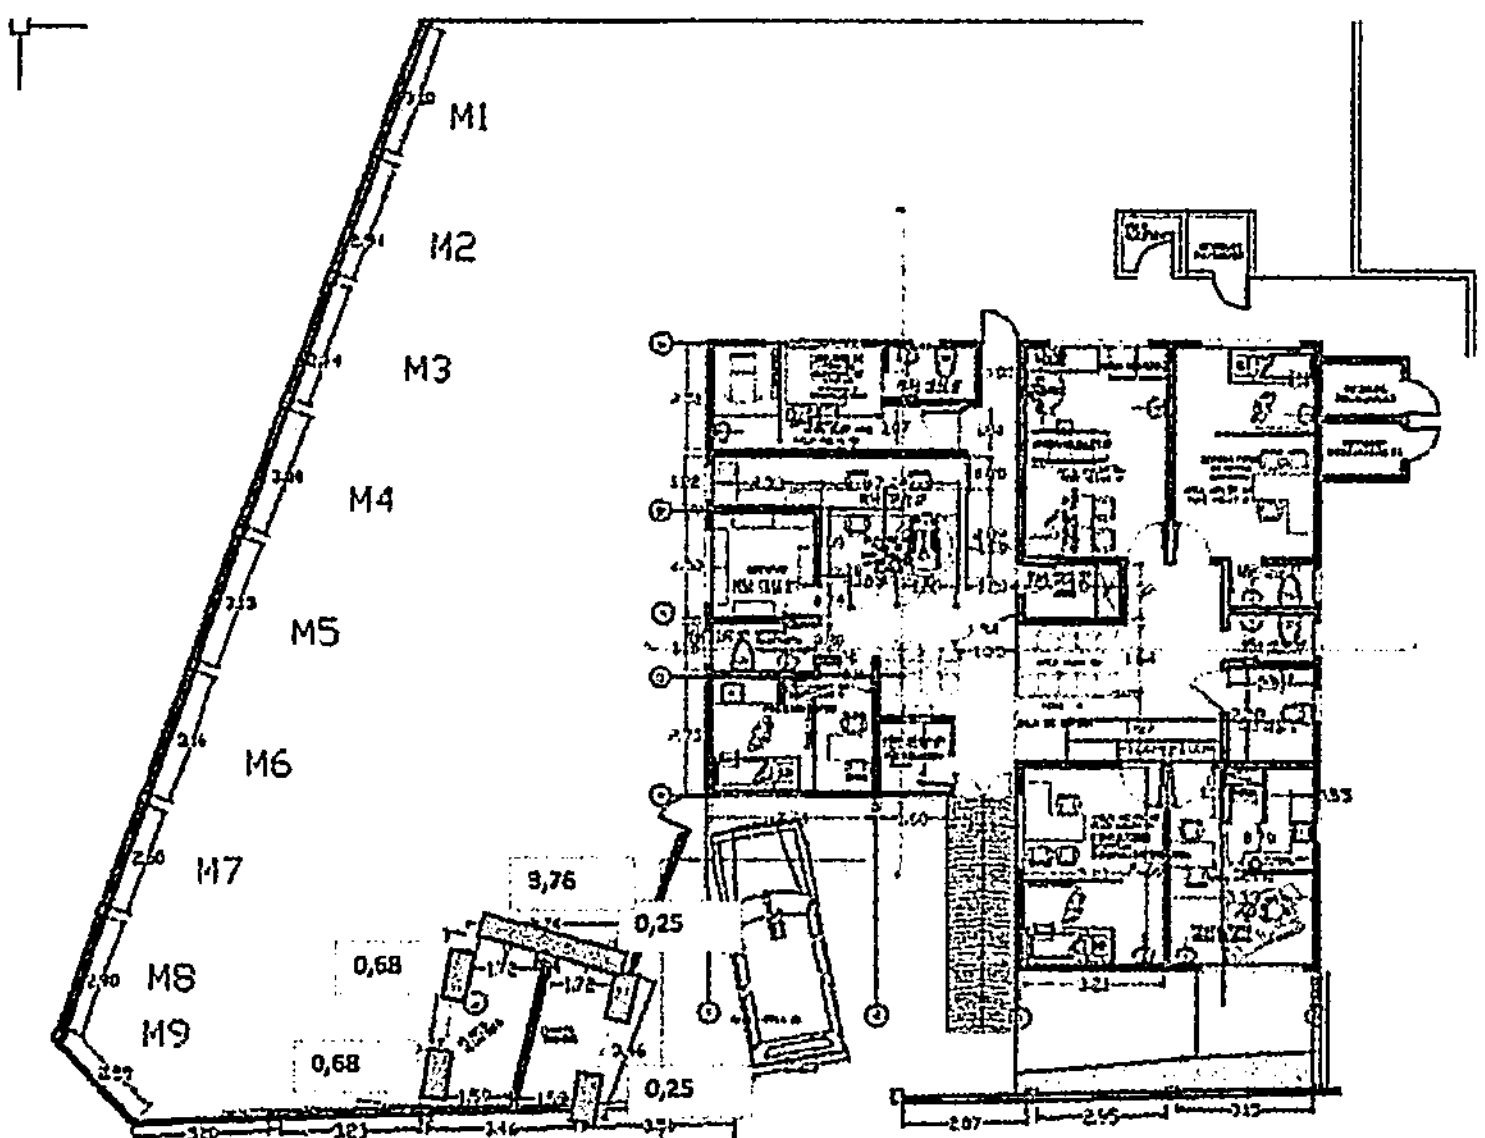

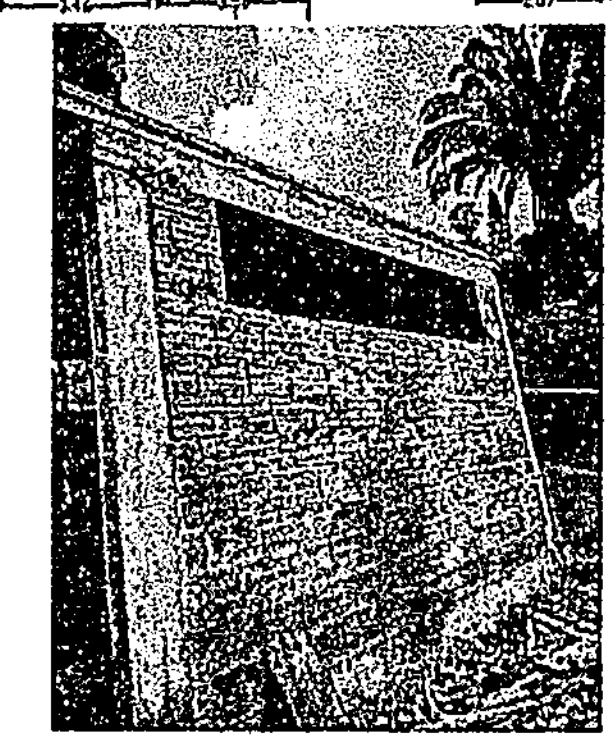

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	MURO 1	1,35			1,00	1,35
	MURO 2	0,50			1,00	0,50
	MURO 3	3,76			2,00	7,52
	Subtotal					9,37
	TOTAL					9,37

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA — NIT O C.C. 860.020.094-8 — CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS — NIT O C.C. 900.648.356-3 — CONTRATO DE OBRA N°: 02 2025

5.4	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

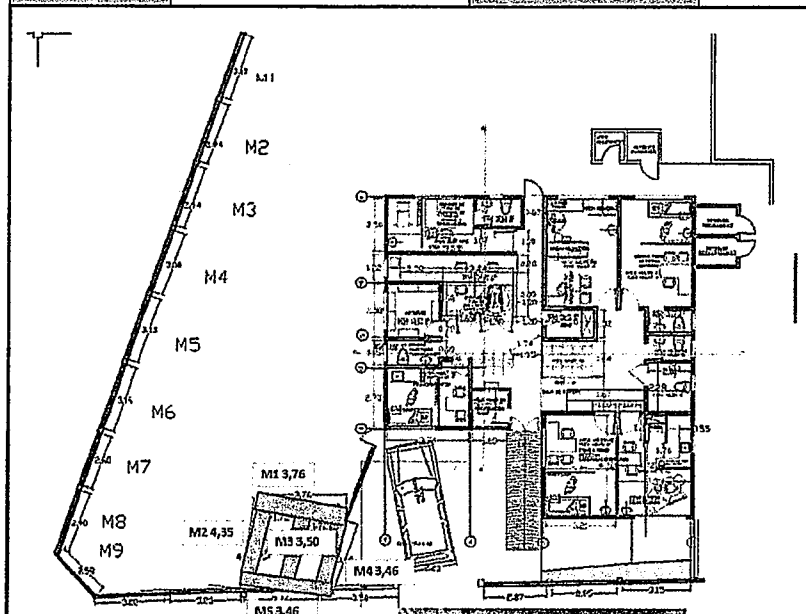

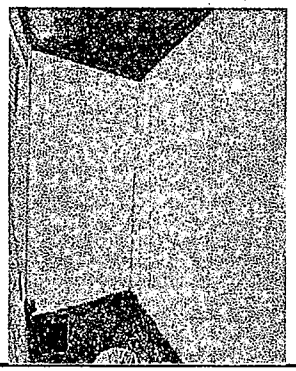



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	MURO 1	3,76	0,65		1,00	2,44
	MURO 2	4,35	3,00		2,00	26,10
	MURO 3	3,50	3,00		2,00	21,00
	MURO 4	3,46	3,00		1,00	10,38
	MURO 5	3,46	3,00		1,00	10,38
	DESCUENTOS					
	VENTANA 1	3,70	0,60		1,00	-2,22
	VENTANA 2	2,78	0,60		1,00	-1,67
					Subtotal	66,42
					TOTAL	66,42

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


	BALANCE GENERAL DE OBRA	CONDISEING ingeniería
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

5,5	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	UNID	ML	UBICACIÓN	GENERAL

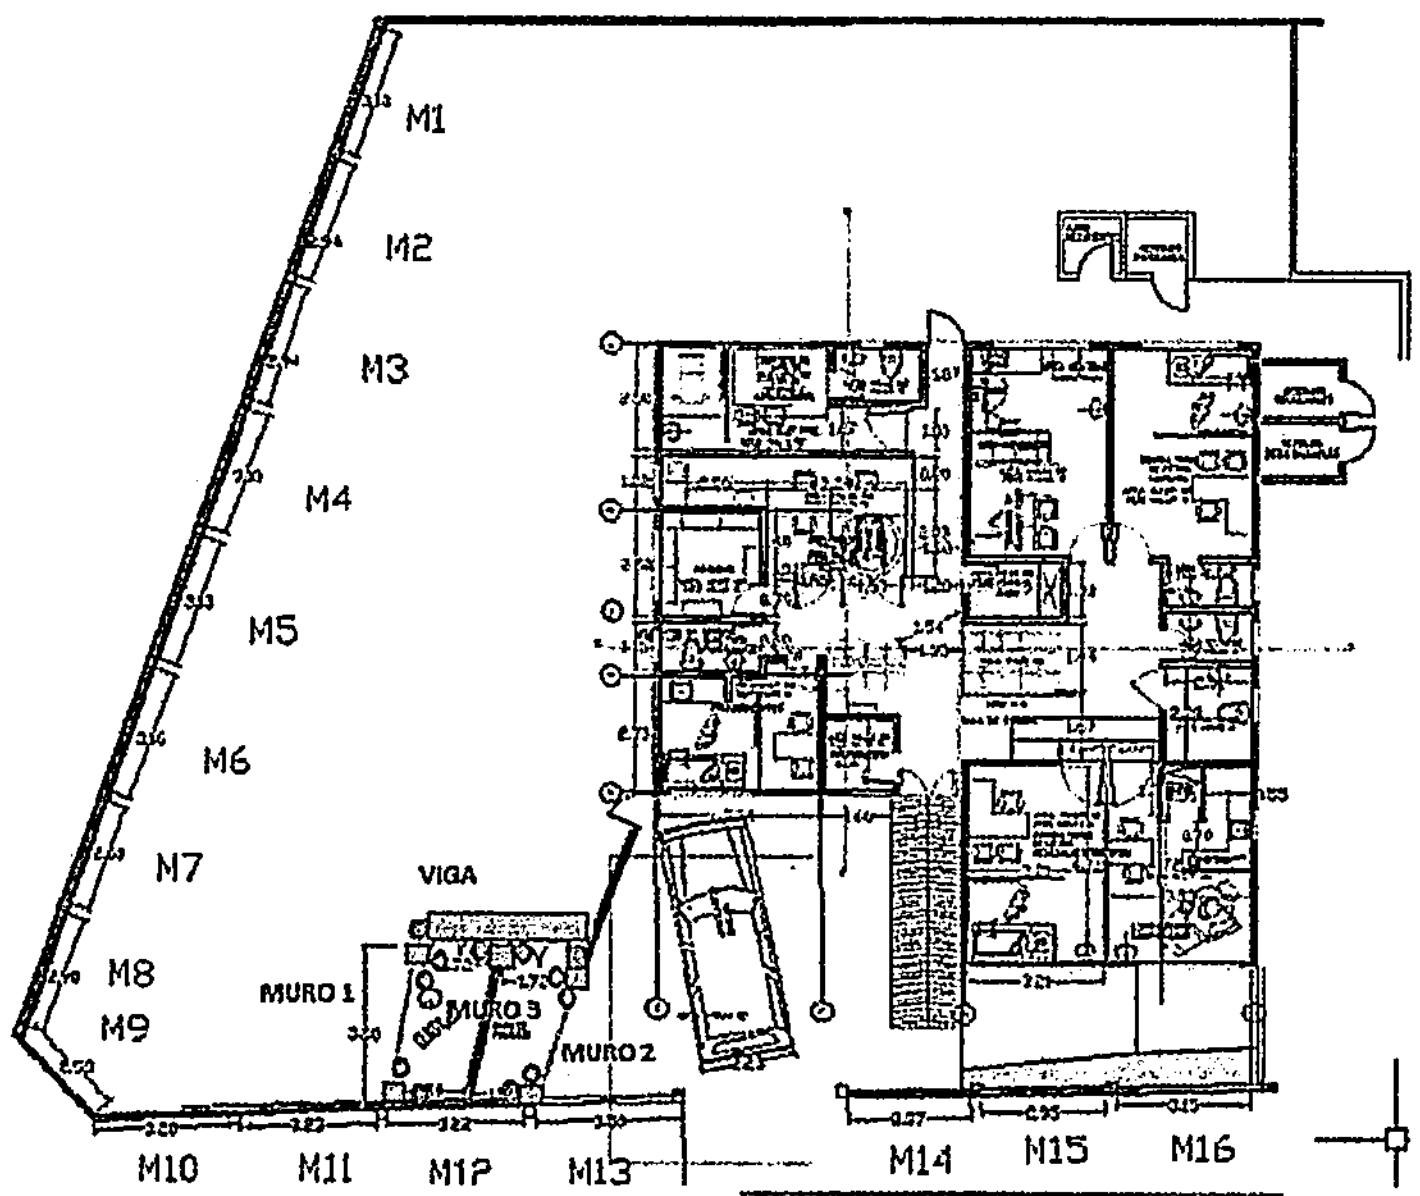

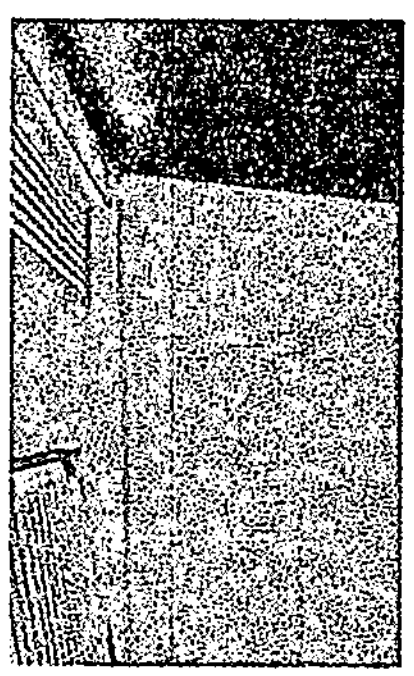

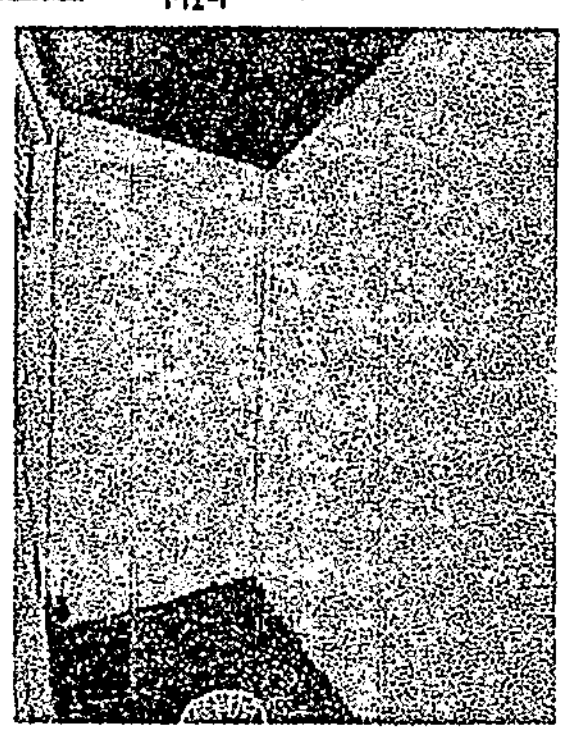

Fecha	Localización	Dimensiones: Ancho	Dimensiones: Alto	Dimensiones: Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	MURO 1		3,00		2,00	6,00
					Subtotal	6,00
					TOTAL	6,00

SUPERVISION **ARQ. GUSTAVO SARMIENTO** **ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN**		**CONTRATISTA** **CONDENSING INGENIERIA SAS** **900.648.356-3**


BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT.O.C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT.O.C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

6,1	Pañetes, revoques y repellos	ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

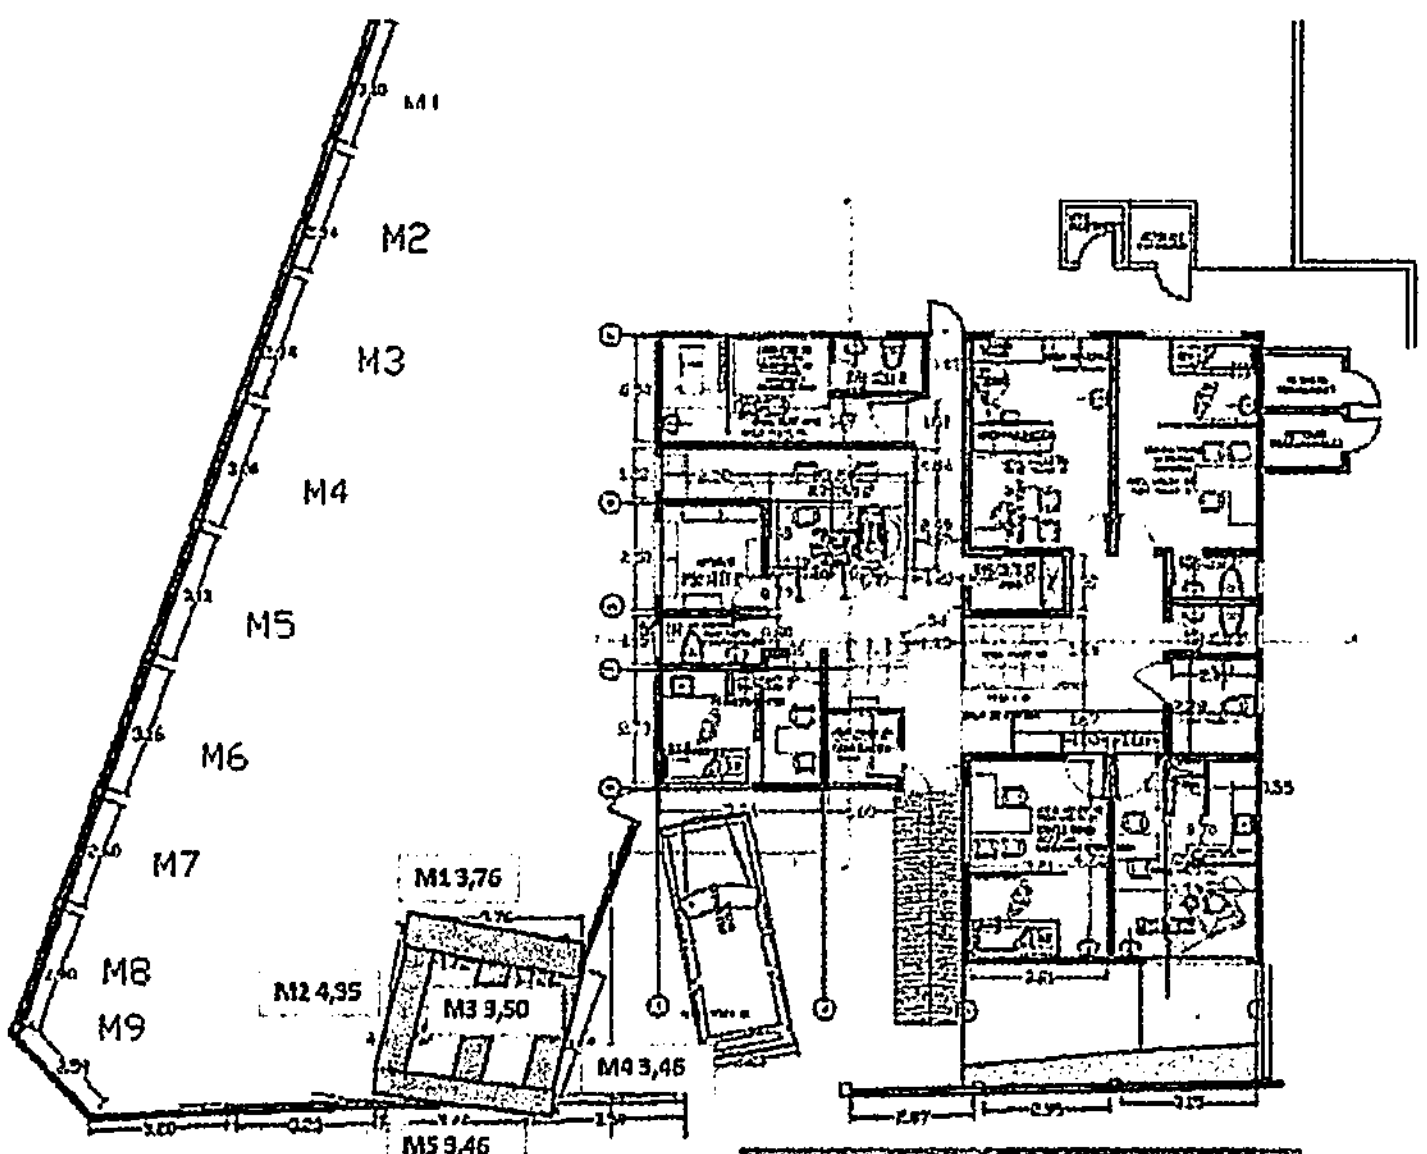





Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	MURO 1	3,76	0,65		2,00	4,89
	MURO 2	4,35	3,00		2,00	26,10
	MURO 3	3,50	3,00		2,00	21,00
	MURO 4	3,46	3,00		2,00	20,76
	MURO 5	3,46	3,00	3,70	2,00	22,20
	DESCUENTOS					
	PUERTA 1		2,20	1,50	1,00	-3,30
	PUERTA 2		2,20	1,50	1,00	-3,30
	VENTANA 1		0,60	3,00	1,00	-1,80
	VENTANA 2		0,60	3,00	1,00	-1,80
	Subtotal					84,75
	TOTAL					84,75

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


	BALANCE GENERAL DE OBRA	CONDISEING ingeniería
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

6,2	Pañetes, revoques y repellos	ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

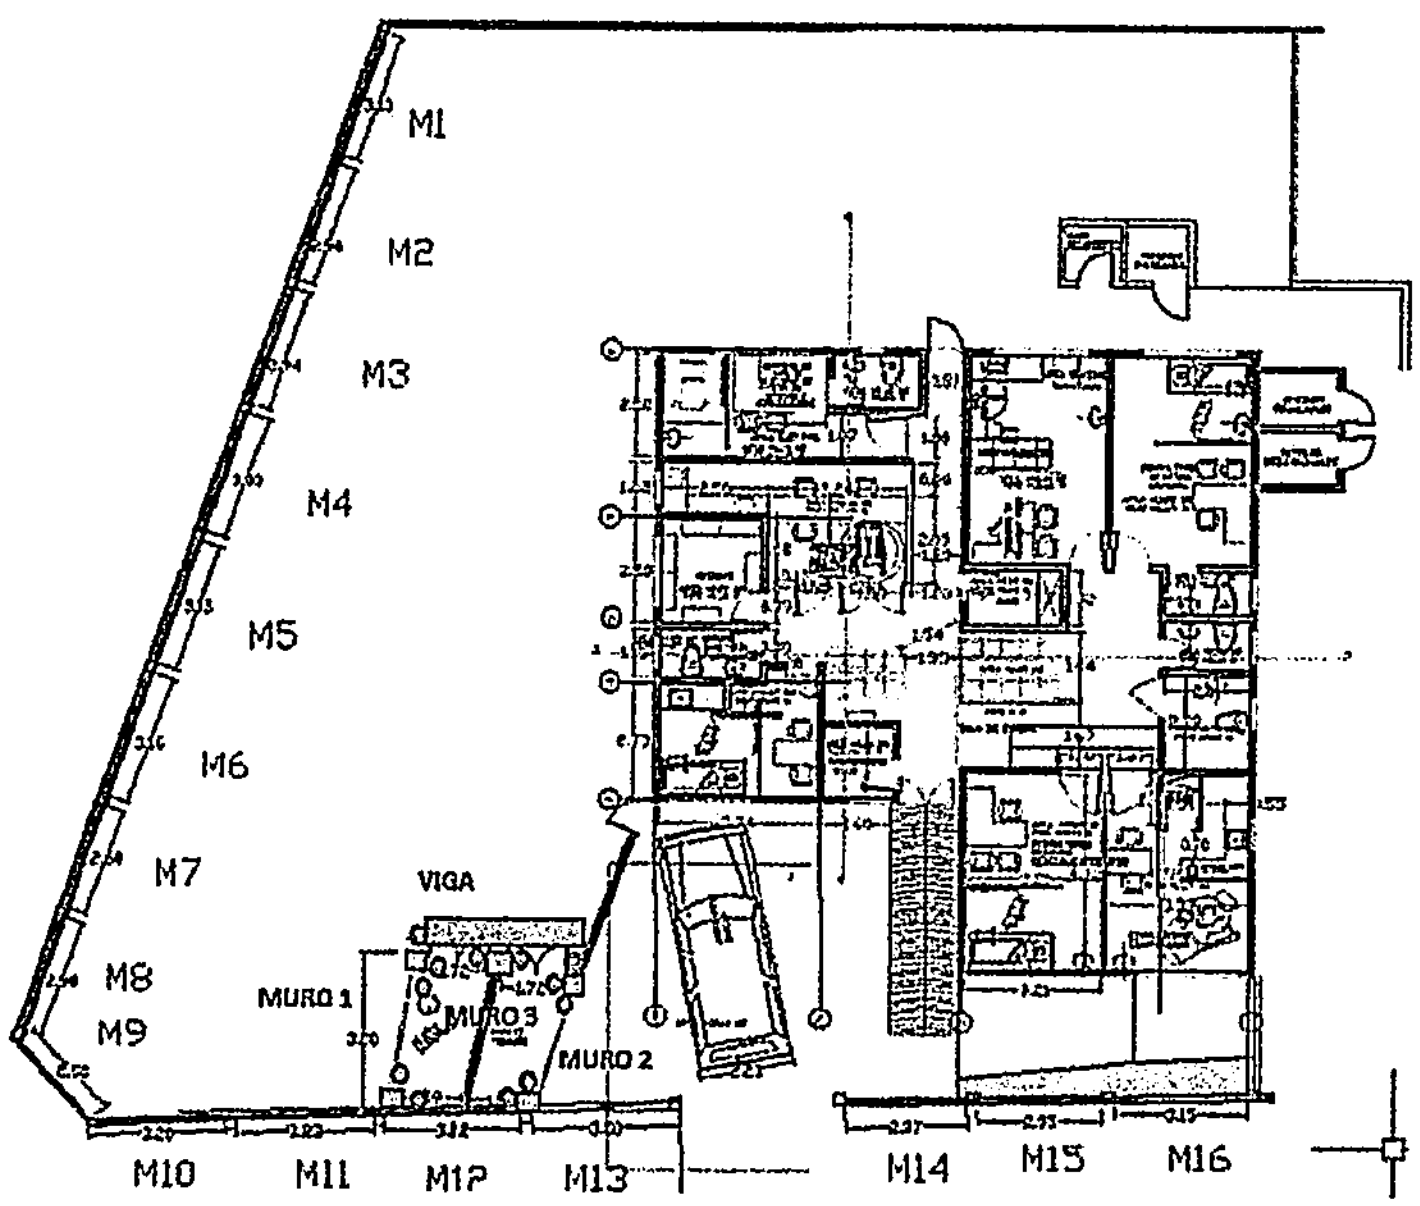

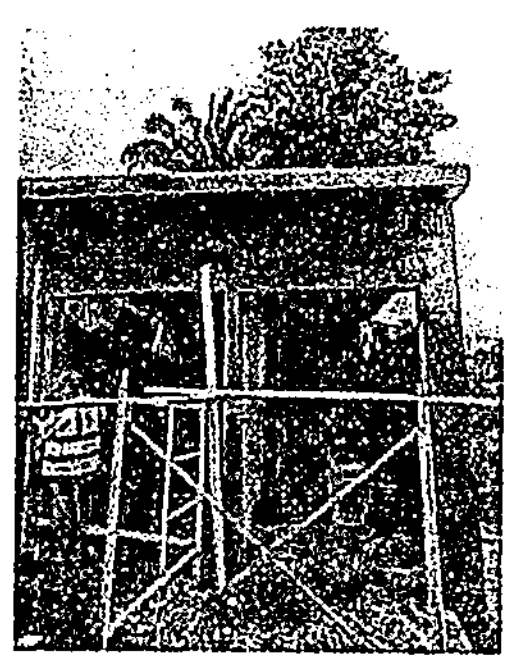



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	MURO 1		3,00		4,00	12,00
	Subtotal					12,00
	TOTAL					12,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


CONDISEING


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE COBRO Nº2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

6.3	Pañetes, revoques y repellos	ITEM	FILOS O DILATACIONES S/MURO	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL

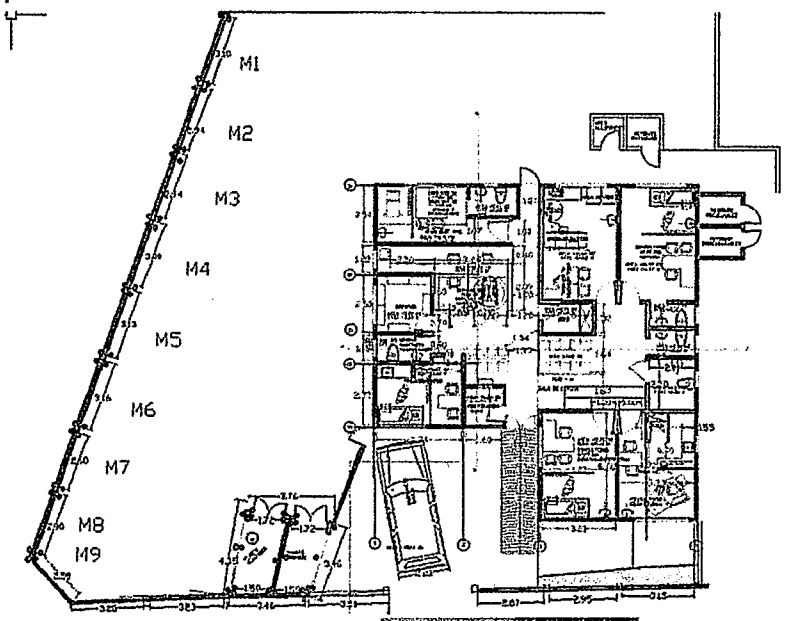

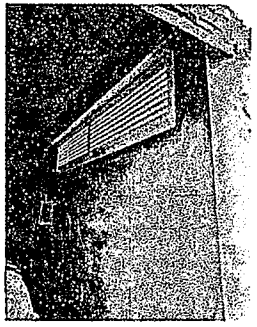

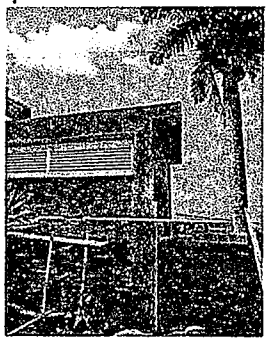

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						-
	MUROS CUARTOS ELECTRICOS	0,10	3,00	0,30	20,00	60,00
	PUERTA 1		2,20		4,00	8,80
	PUERTA 1	1,50			2,00	3,00
	PUERTA 2		2,20		4,00	8,80
	PUERTA 2	1,50	2,20		2,00	3,00
	VENTANA 1	3,70			4,00	14,80
	VENTANA 2		0,60		4,00	2,40
	VENTANA 1	2,70			4,00	10,80
	VENTANA 2		0,60		4,00	2,40
	Subtotal					114,00
	TOTAL					114,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


CONDISEING


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

6,4	Pañetes, revoques y repellos	ITEM	DINTELES EN BLOQUE 0,15 M	UNID	ML	UBICACIÓN	GENERAL

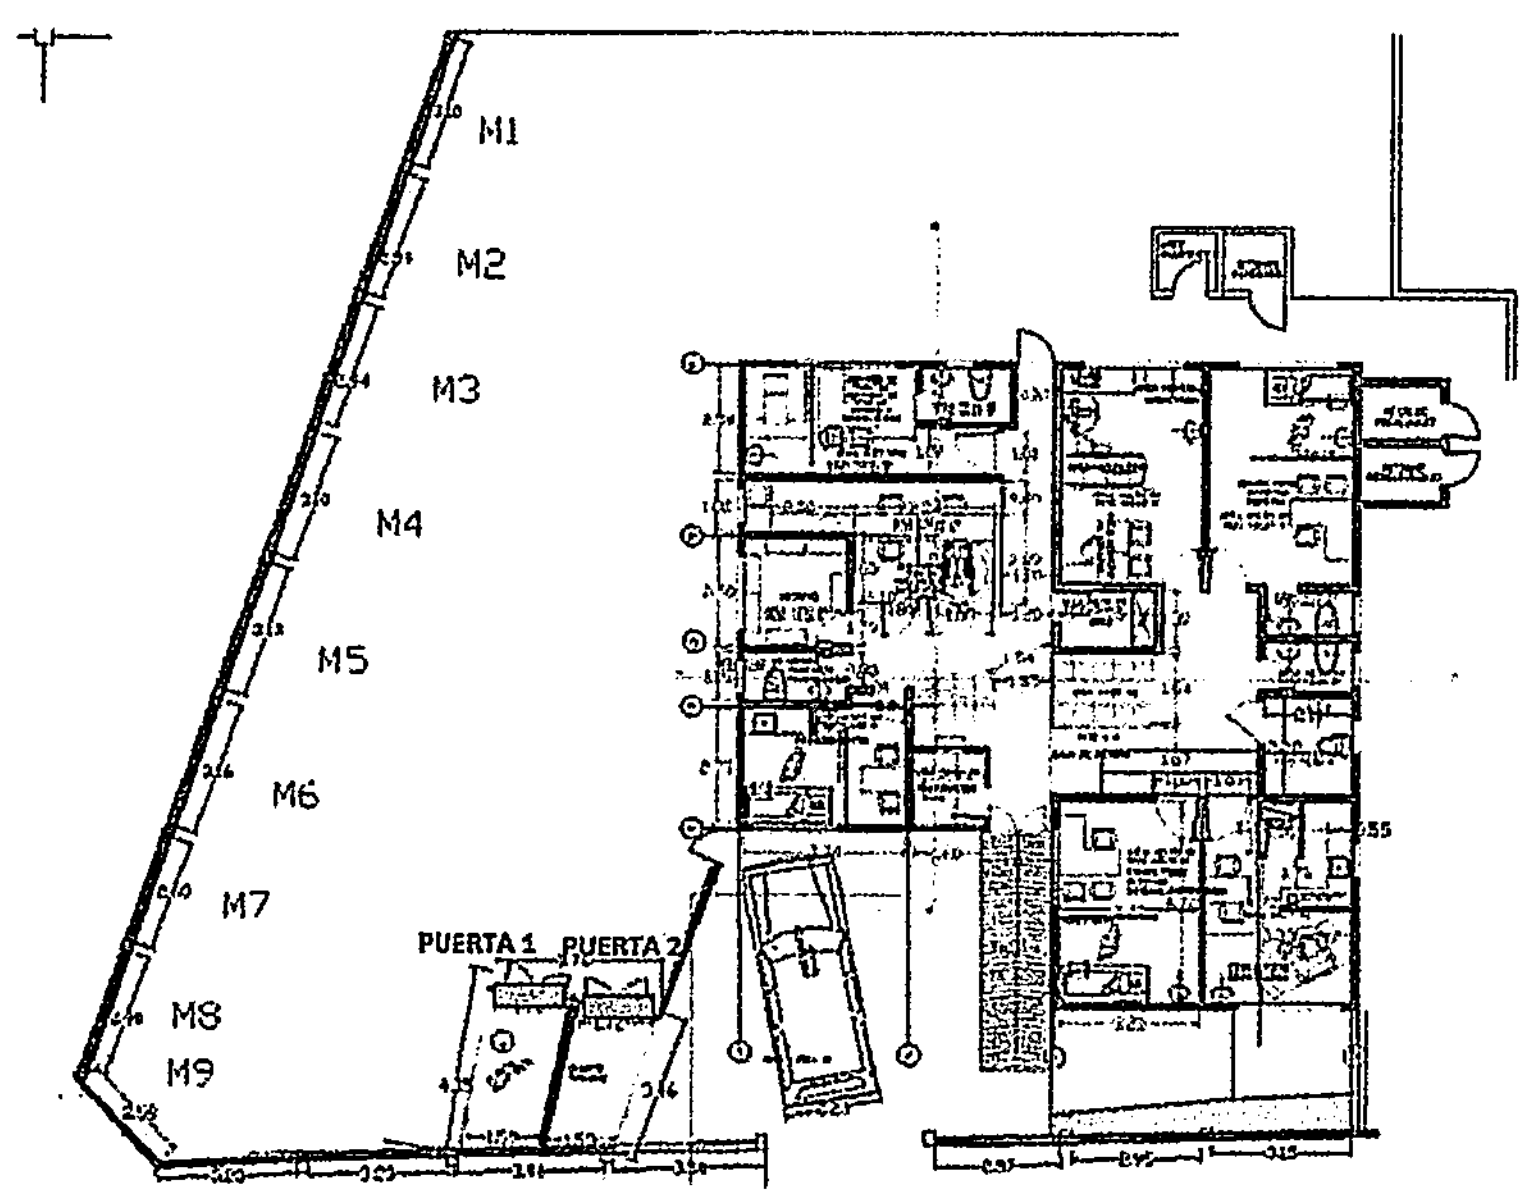

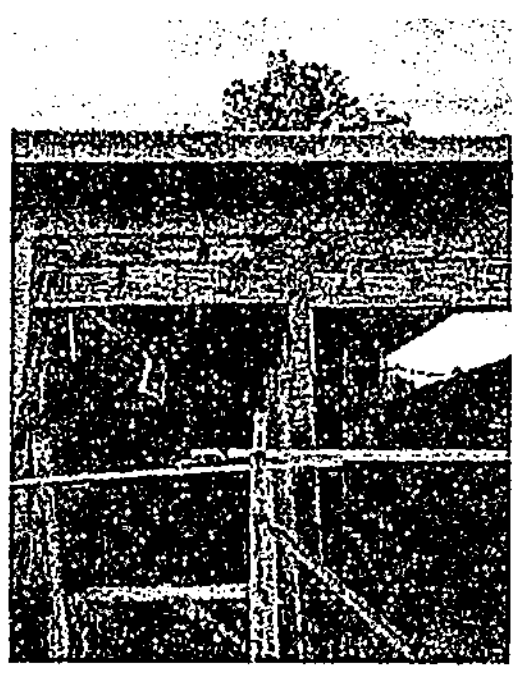



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	PUERTA 1			1,50	1,00	1,50
	PUERTA 2			1,50	1,00	1,50
Subtotal						3,00
TOTAL						3,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CONDISEING ingenieros

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025		CORTE Nº	ACTA DE COBRO Nº2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº:	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA Nº:	02 2025

6,6	Pañetes, revoques y repellos	ITEM	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	UNID	ML	UBICACIÓN	GENERAL	

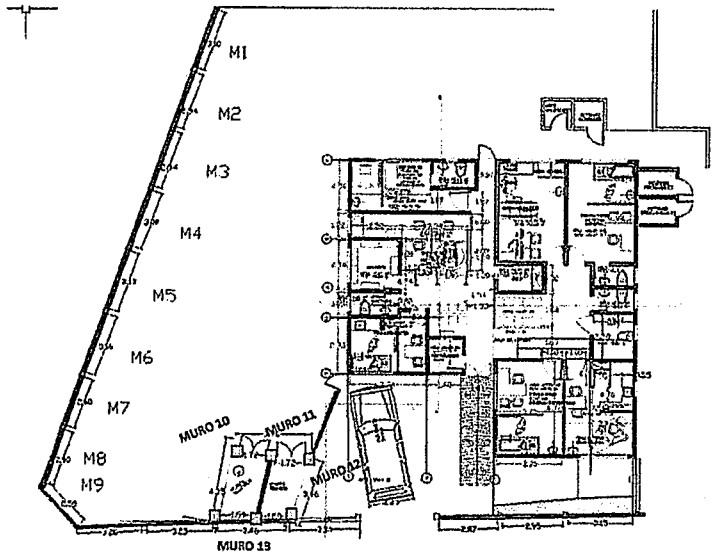

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	MURO 10				12,00	12,00
	MURO 11				12,00	8,00
	MURO 12				8,00	8,00
	MURO 13				8,00	8,00
	Subtotal					36,00
	TOTAL					36,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE Nº	ACTA DE COBRO Nº2	ELABORÓ

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA Nº	02 2025

7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA	ITEM	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UNID	ML	UBICACIÓN	GENERAL

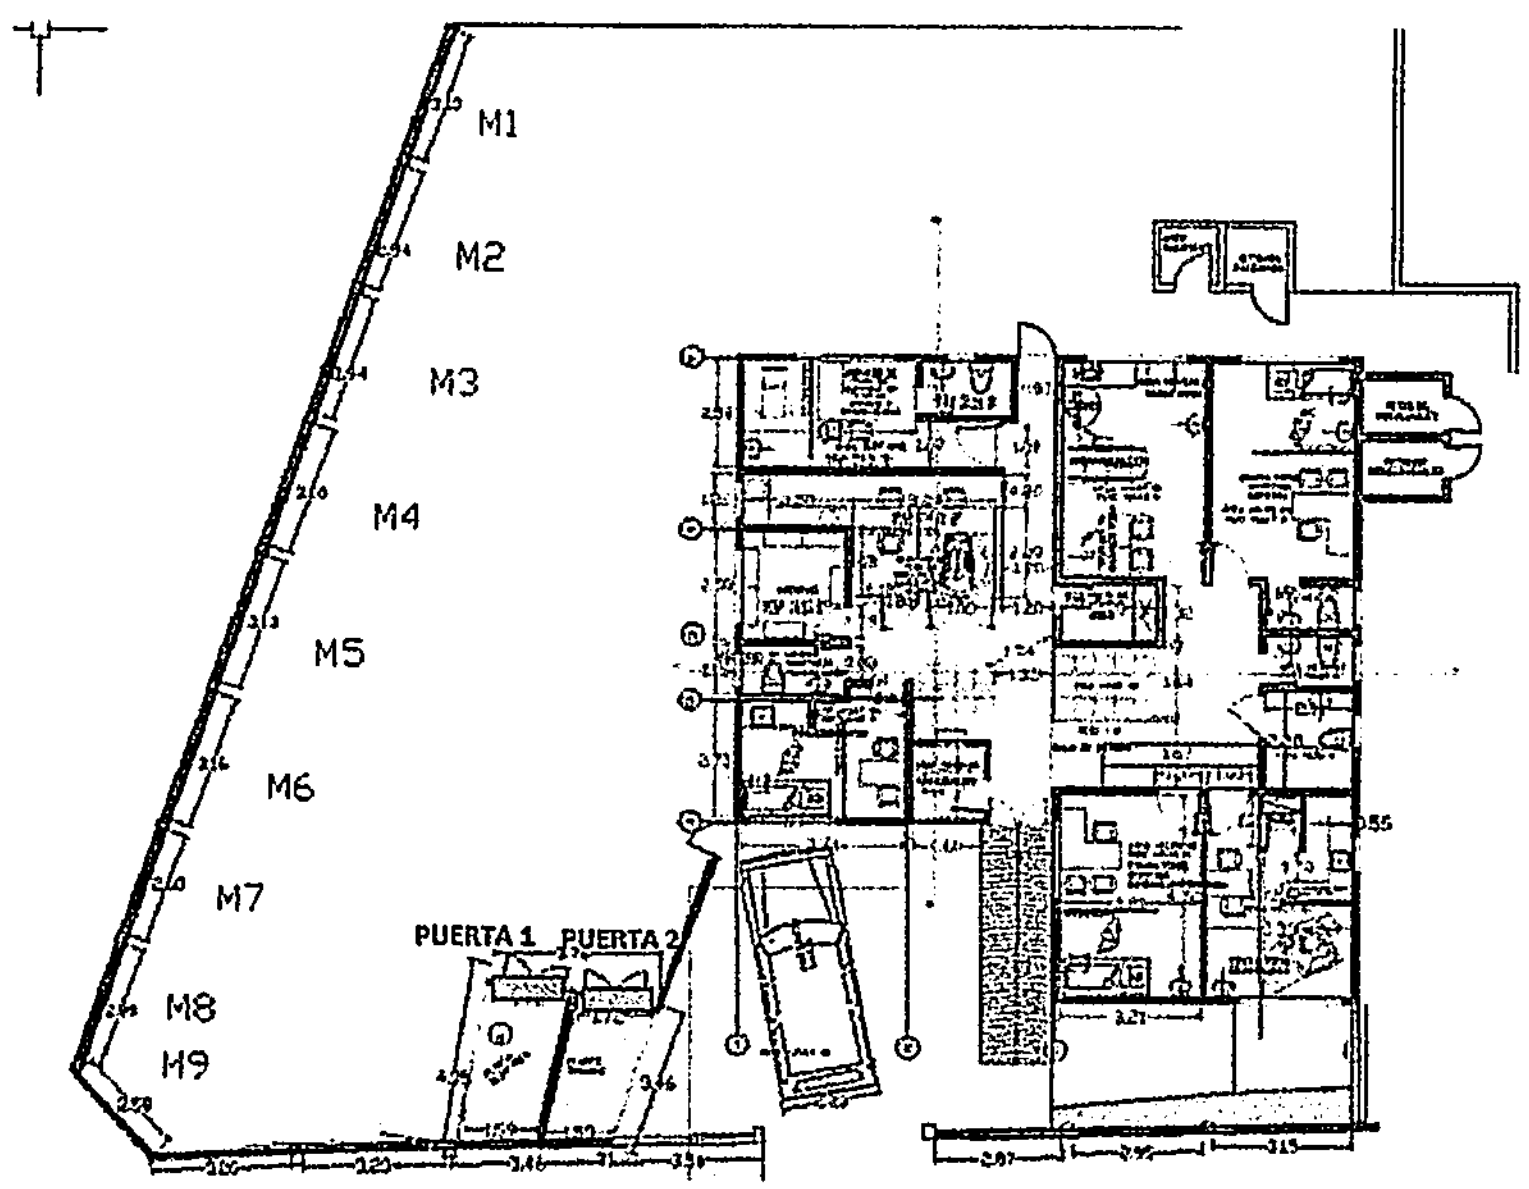

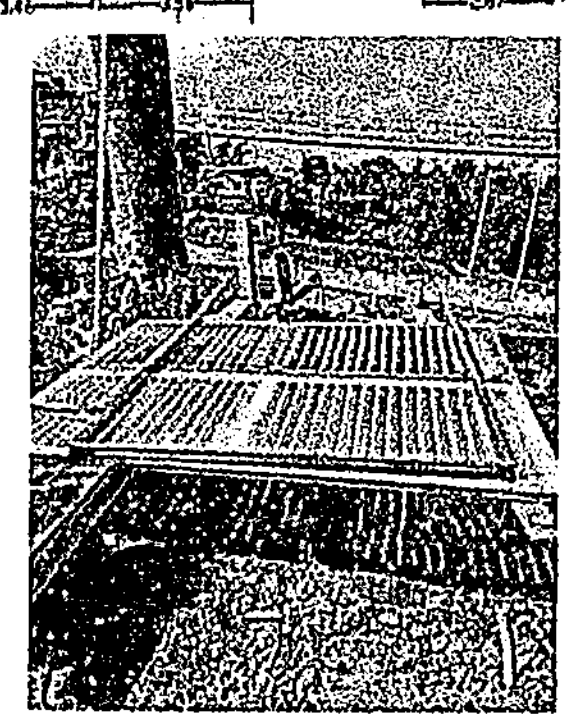

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	PUERTA 1				1,00	1,00
	PUERTA 2				1,00	1,00
	Subtotal					2,00
	TOTAL					2,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CONDISEING

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORO
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA								
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°					
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025				

9.1	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL EN LÁMINA COLD ROLLED, FRENTE MUERTO, CHAPA GIRATORIA, MARQUILLADO Y SEÑALIZACIÓN.	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

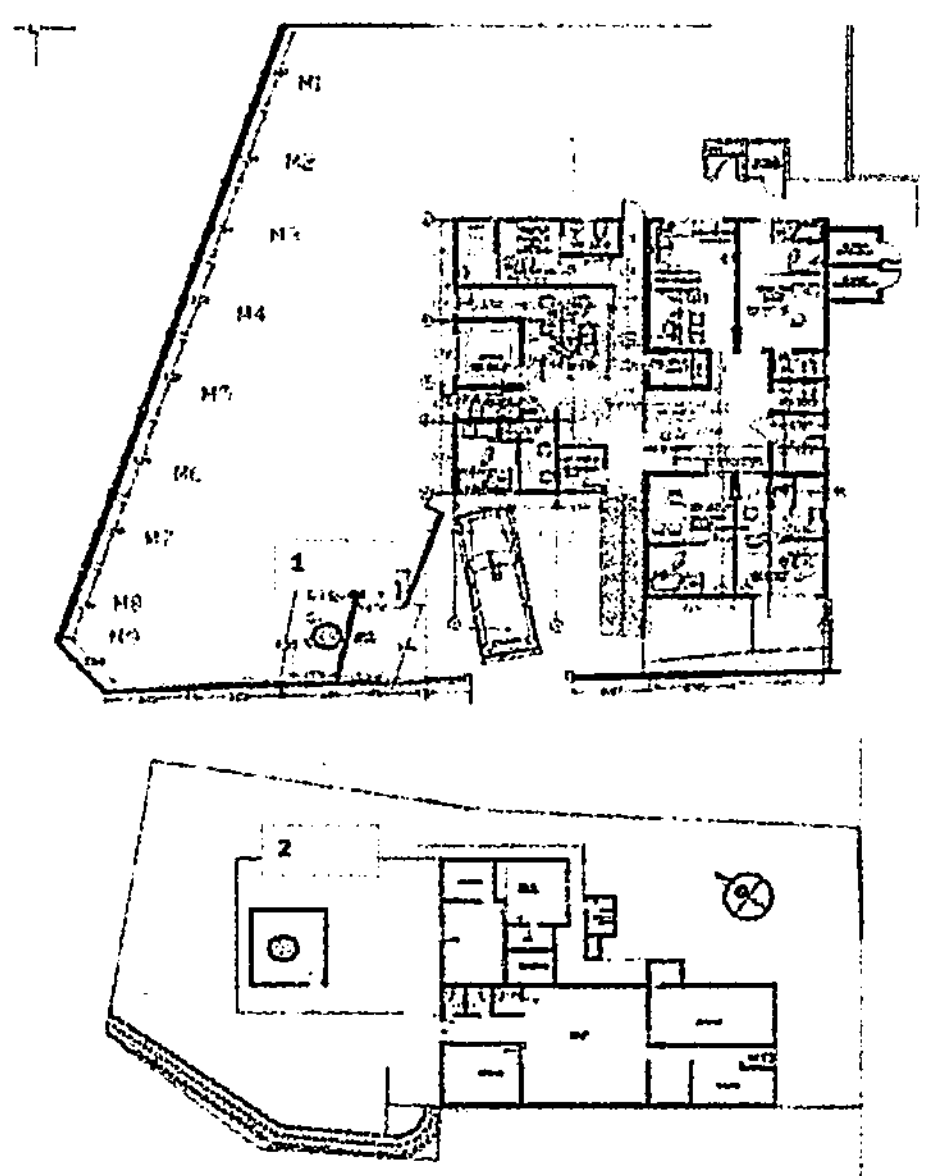

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	1. TRANSFERENCIA MANUAL PRADILLA				1,00	1,00
	2. TRANSFERENCIA MANUAL EL TRIUNFO				1,00	1,00
	Subtotal					2,00
	TOTAL					2,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

9.2	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE , 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) . INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X8	UNID	ML	UBICACIÓN	GENERAL

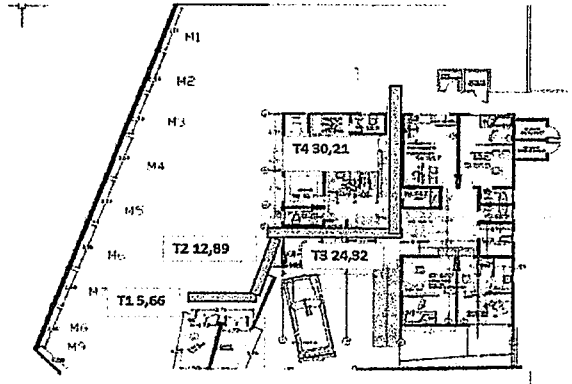



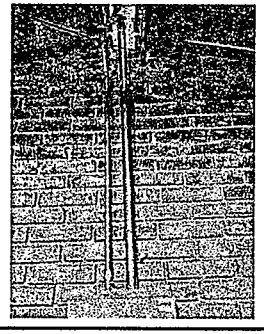

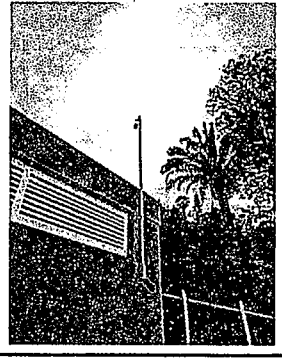

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	T1 PRADILLA			5,66	1,00	5,66
	T2 PRADILLA			12,89	1,00	12,89
	T3 PRADILLA			24,32	1,00	24,32
	T4 PRADILLA			30,21	1,00	30,21
	T5 TRIUNFO			17,00	1,00	17,00
	T7 TRIUNFO			1,89	1,00	1,89
					Subtotal	91,97
					TOTAL	91,97

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN


CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

	BALANCE GENERAL DE OBRA		CONDISEING
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA			
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

9,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	CONEXIÓN NORMALIZADA Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA (INC. BORNAZ ESTAÑADAS AISLADAS.)	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

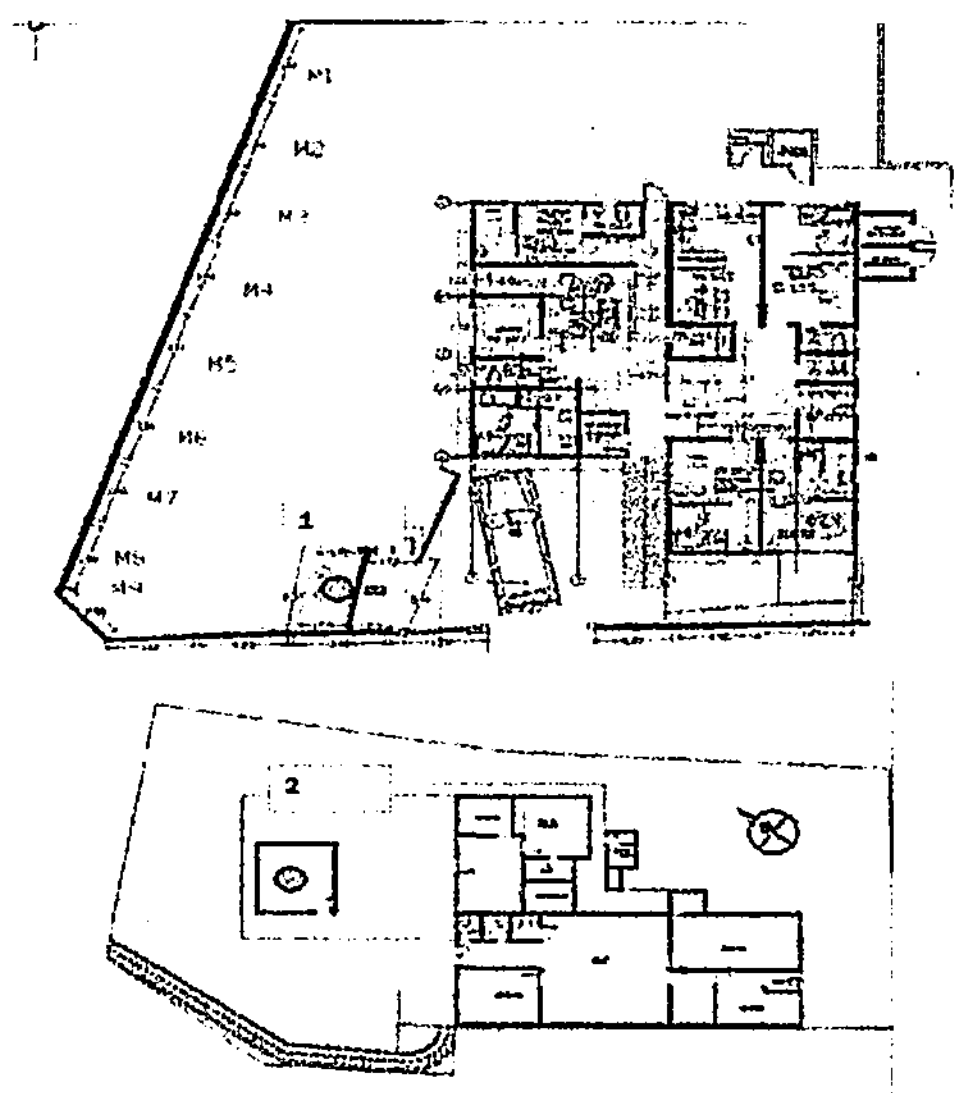

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	1. CONEXIÓN NORMALIZADA Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ELECTRICA PRADILLA				1,00	1,00
	2. CONEXIÓN NORMALIZADA Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ELECTRICA EL TRIUNFO				1,00	1,00
	Subtotal					2,00
	TOTAL					2,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN


CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD 15	MM 12	AA 2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA							
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°				
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025			

9.4	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO (INCLUYE TOMA DOBLE, TIERRA AISLADA, GRADO HOSPITAL, 20 A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22), MARQUILLADO NORMALIZADO.	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL	

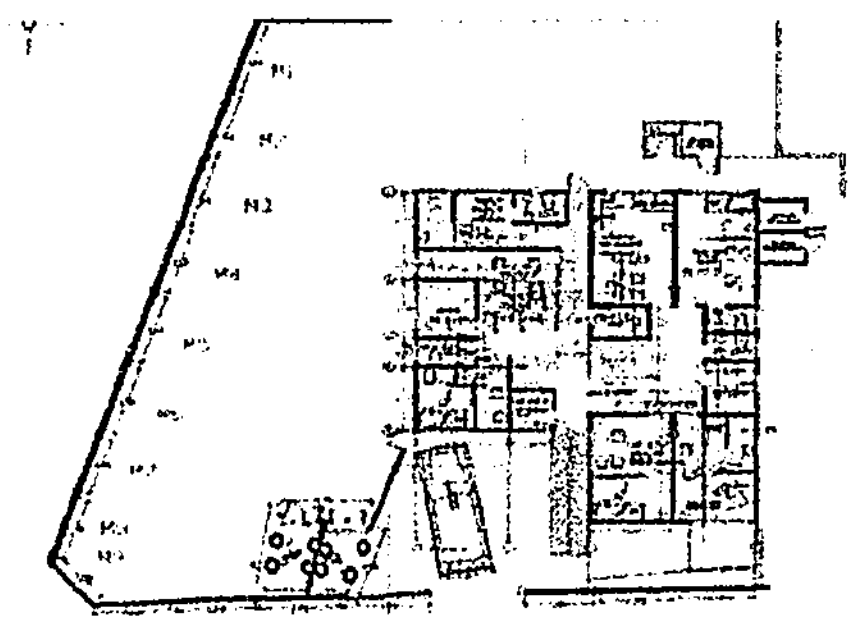

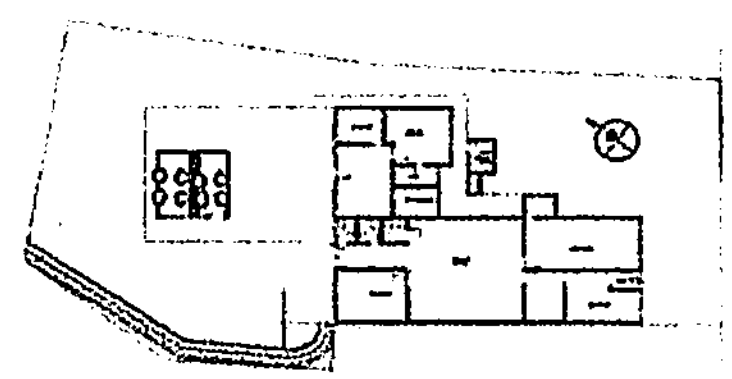



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO PLANTA ELECTRICA PRADILLA				4,00	4,00
	TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO CUARTO TECNICO PRADILLA				4,00	4,00
	TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO PLANTA ELECTRICA, EL TRIUNFO				4,00	4,00
	TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO CUARTO TECNICO, EL TRIUNFO				4,00	4,00
	Subtotal					16,00
	TOTAL					16,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


	BALANCE GENERAL DE OBRA	CONDISEING
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO Nº2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

9,7	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO . (INCLUYE 1 CAJA 5800, CONECTOR 3/4", CONECTOR 3/4" EMT, TUBO 3/4", INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALÓGENOS).	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

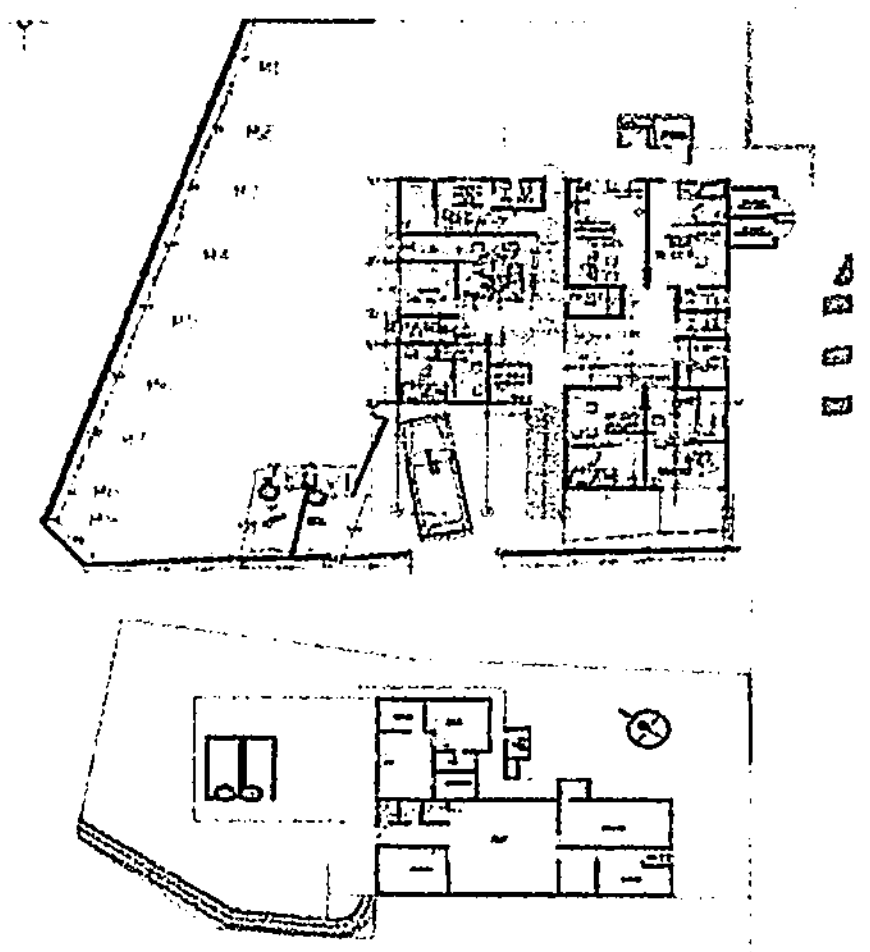

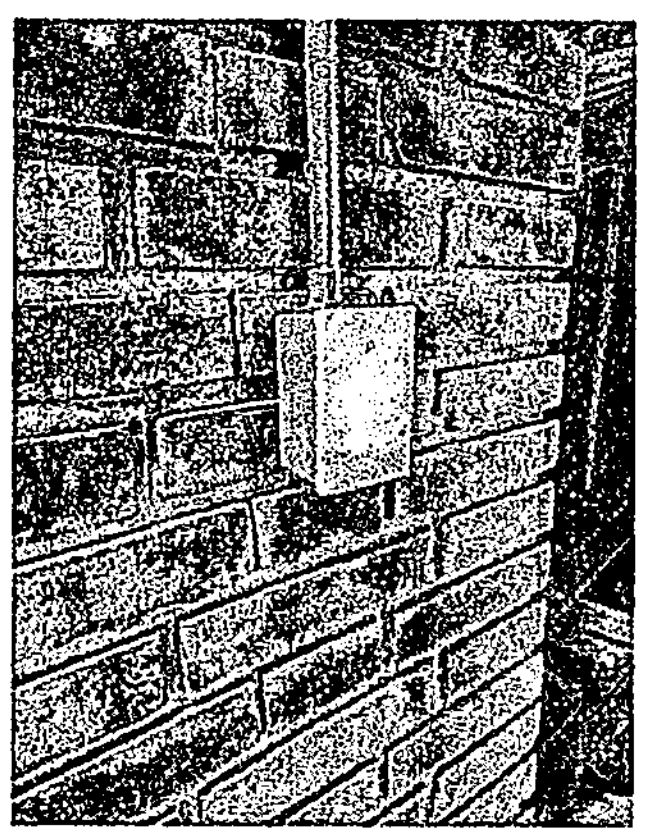

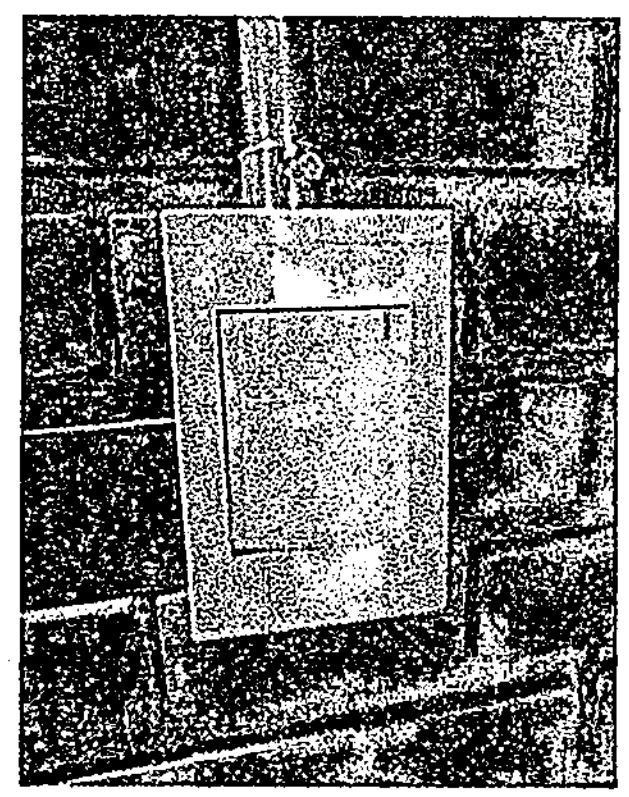

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	INTERRUPTOR SENCILLO PLANTA ELECTRICA, PRADILLA				1,00	1,00
	INTERRUPTOR SENCILLO CUARTO TECNICO, PRADILLA				1,00	1,00
	INTERRUPTOR SENCILLO PLANTA ELECTRICA, EL TRIUNFO				1,00	1,00
	INTERRUPTOR SENCILLO CUARTO TECNICO, EL TRIUNFO				1,00	1,00
				Subtotal		4,00
				TOTAL		4,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN


CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA								
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA					NIT O.C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS					NIT O.C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

9,8	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	TUBERÍA EMT CONDUIT GALVANIZADA 3/4"	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

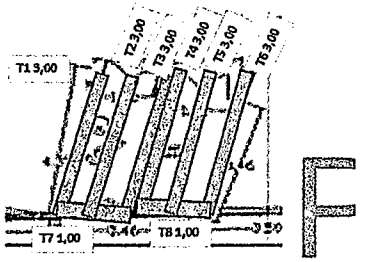

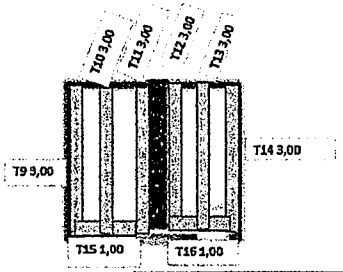

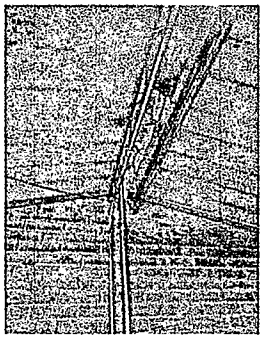

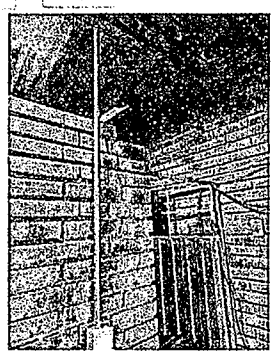

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	T1 PRADILLA			3,00	1,00	3,00
	T2 PRADILLA			3,00	1,00	3,00
	T3 PRADILLA			3,00	1,00	3,00
	T4 PRADILLA			3,00	1,00	3,00
	T5 PRADILLA			3,00	1,00	3,00
	T6 PRADILLA			3,00	1,00	3,00
	T7 PRADILLA			1,00	1,00	1,00
	T8 PRADILLA			1,00	1,00	1,00
	T9 TRIUNFO			3,00	1,00	3,00
	T10 TRIUNFO			3,00	1,00	3,00
	T11 TRIUNFO			3,00	1,00	3,00
	T12 TRIUNFO			3,00	1,00	3,00
	T13 TRIUNFO			3,00	1,00	3,00
	T14 TRIUNFO			3,00	1,00	3,00
	T15 TRIUNFO			1,00	1,00	1,00
	T16 TRIUNFO			1,00	1,00	1,00
	Subtotal					40,00
	TOTAL					40,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO BARMENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

9,0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

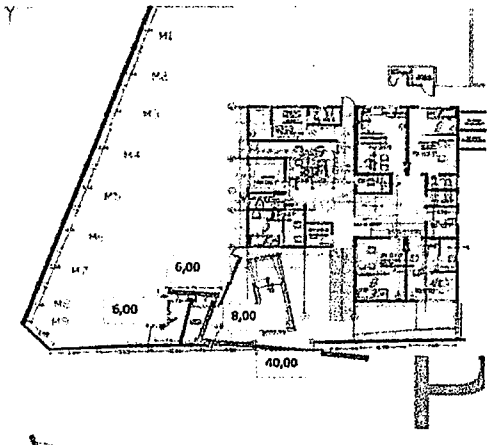



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS, PRADILLA			40,00	3,00	100,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. EL TRIUNFO			24,00	3,00	72,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. EL TRIUNFO			6,00	3,00	18,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. EL TRIUNFO			6,00	3,00	18,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. EL TRIUNFO			4,00	3,00	12,00
	Subtotal					220,00
	TOTAL					220,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN


CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA								
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA						NIT O C.C	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS						NIT O C.C	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N° 02 2025

9,10	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

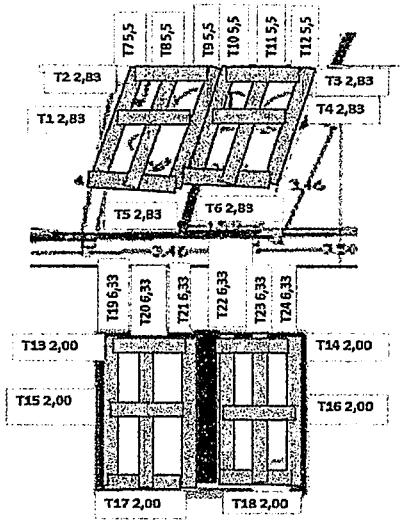

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	T1 PRADILLA			2,83	1,00	2,83
	T2 PRADILLA			2,83	1,00	2,83
	T3 PRADILLA			2,83	1,00	2,83
	T4 PRADILLA			2,83	1,00	2,83
	T5 PRADILLA			2,83	1,00	2,83
	T6 PRADILLA			2,83	1,00	2,83
	T7 PRADILLA			5,50	1,00	5,50
	T8 PRADILLA			5,50	1,00	5,50
	T9 PRADILLA			5,50	1,00	5,50
	T10 PRADILLA			5,50	1,00	5,50
	T11 PRADILLA			5,50	1,00	5,50
	T12PRADILLA			5,50	1,00	5,50
	T13 TRIUNFO			2,00	1,00	2,00
	T14 TRIUNFO			2,00	1,00	2,00
	T15 TRIUNFO			2,00	1,00	2,00
	T16 TRIUNFO			2,00	1,00	2,00
	T17 TRIUNFO			2,00	1,00	2,00
	T18 TRIUNFO			2,00	1,00	2,00
	T19 TRIUNFO			6,33	1,00	6,33
	T20 TRIUNFO			6,33	1,00	6,33
	T21 TRIUNFO			6,33	1,00	6,33
	T22 TRIUNFO			6,33	1,00	6,33
	T23 TRIUNFO			6,33	1,00	6,33
	T24 TRIUNFO			6,33	1,00	6,33
	Subtotal					100,00
	TOTAL					100,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CONDISEING

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA	NIT O C.C. 860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C. 900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°: 02 2025

9,11	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 2.4ML. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y TRATAMIENTO FAVIGEL.)	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

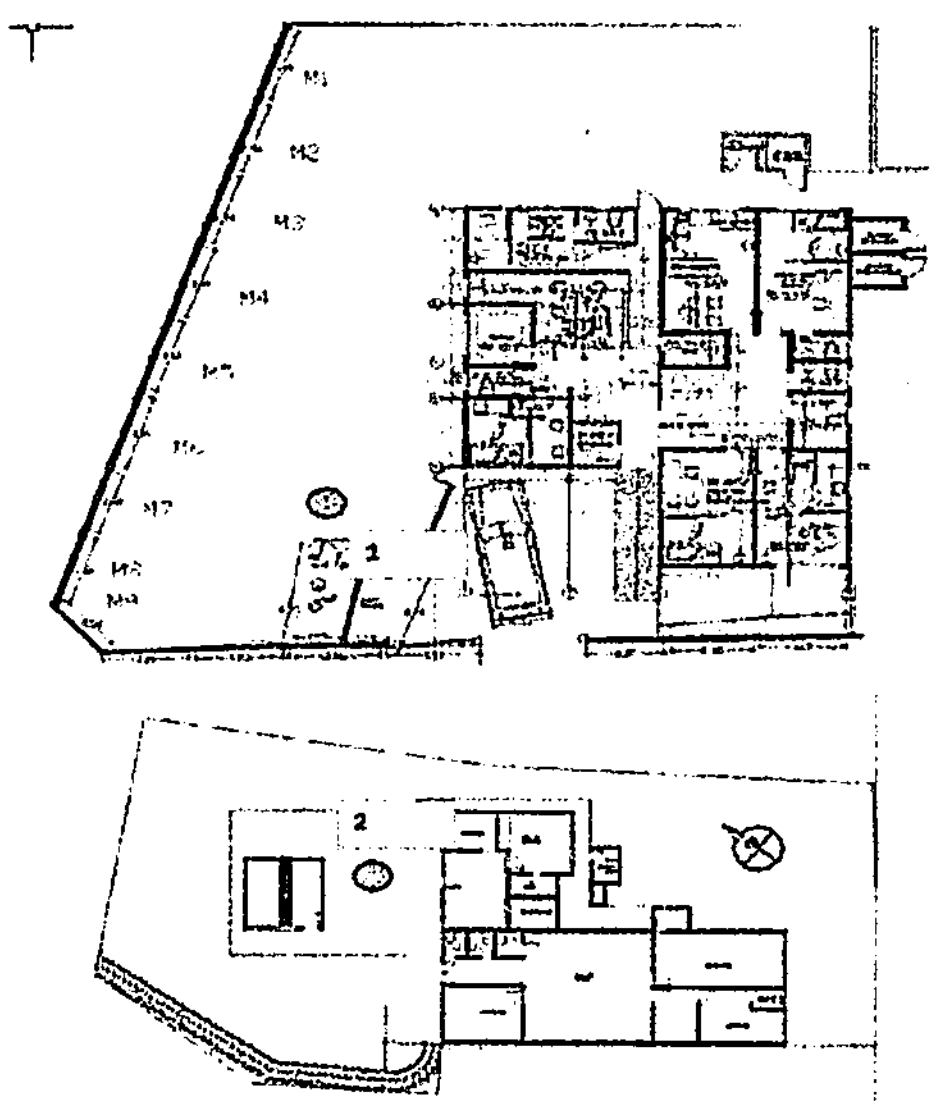

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	1. VARILLA COPPERWELD 2.4 ML, PRADILLA				1,00	1,00
	2. VARILLA COPPERWELD 2.4 ML, EL TRIUNFO				1,00	1,00
	Subtotal					2,00
	TOTAL					2,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

9,12	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X50 DE CAJA MOLDEADA 100A (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

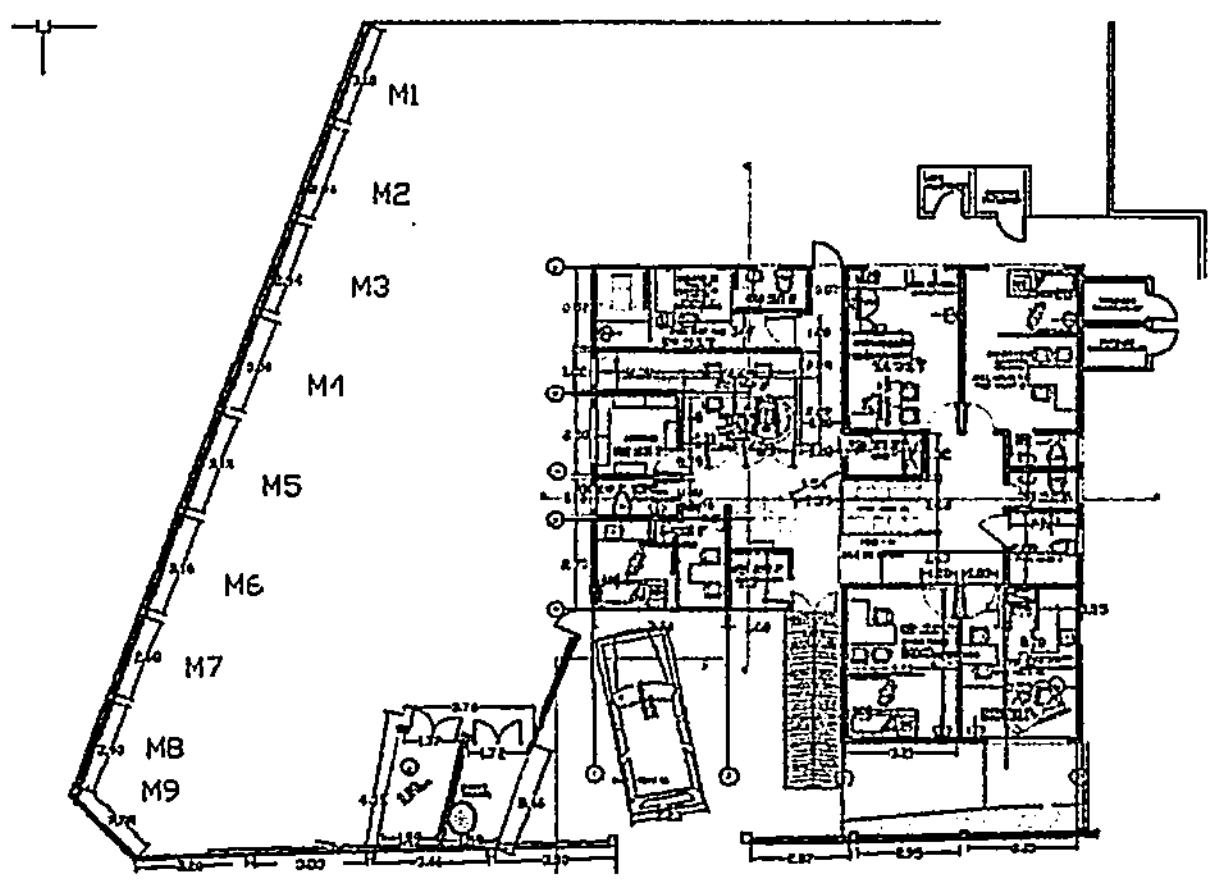

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	CUATO ELECTRICO PRADILLA				1,00	1,00
Subtotal						1,00
TOTAL						1,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.358-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

10.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

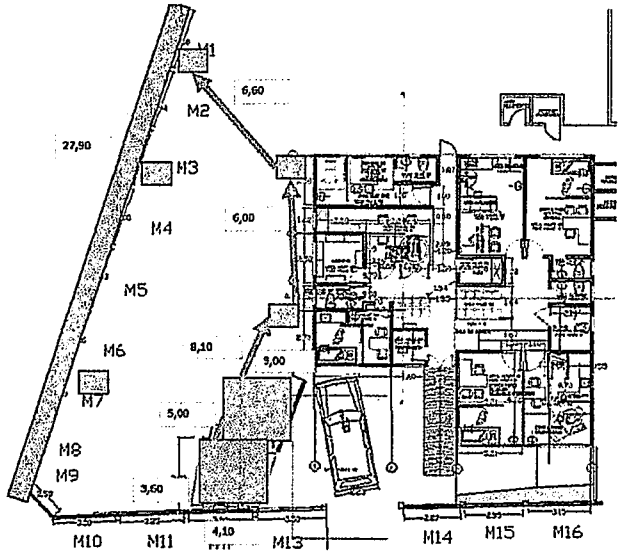





Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	CUARTO ELECTRICO EXTERIOR	3,00	0,12	5,00	1,00	1,74
	PLACA CONTRAPISO CUARTO ELECTRICO	4,10	0,12	3,60	1,00	1,72
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 2	1,00	1,20	6,60	1,00	7,89
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 3	1,00	1,20	6,00	1,00	7,17
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 4	1,00	1,20	8,10	1,00	9,68
	CAJAS DE INSPECCION 1	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 2	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 3	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 4	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 5	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	Subtotal					28,35
	TOTAL					28,35

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.358-3

BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ


OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA	NIT O C.C	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

10,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	TRITURADO GRUESO 3/4	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

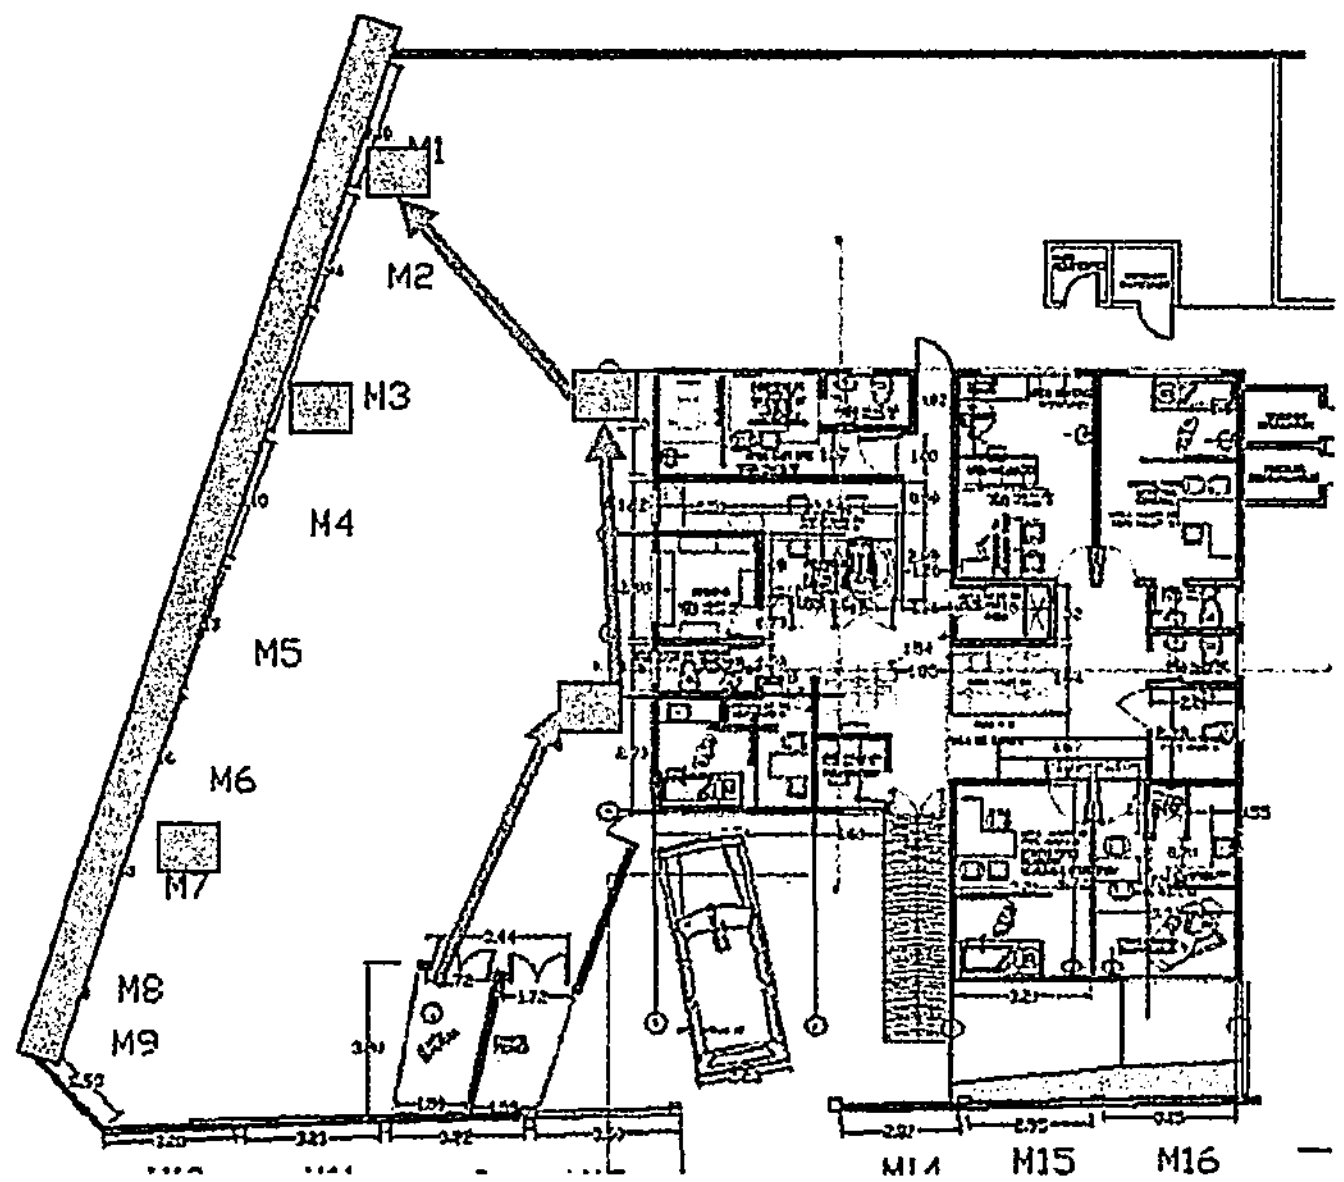

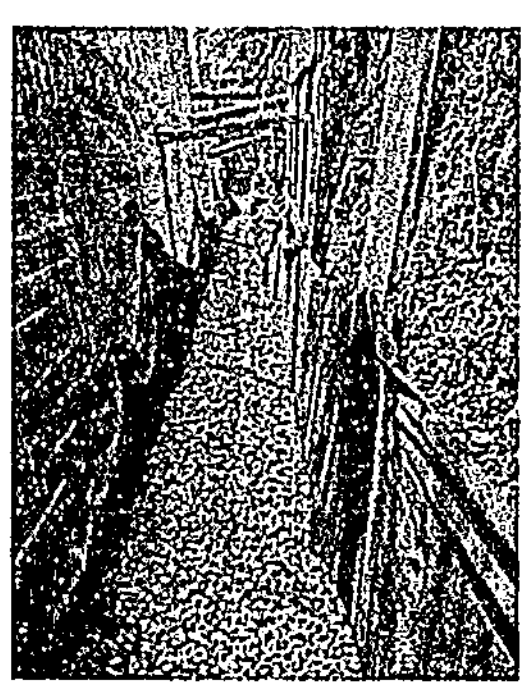

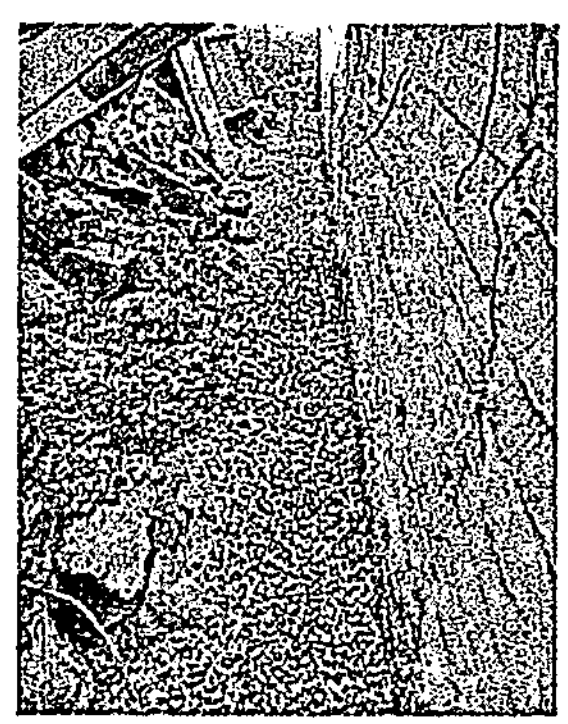

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 2	1,00	0,10	6,60	1,00	0,66
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 3	1,00	0,10	6,00	1,00	0,60
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 4	1,00	0,10	8,10	1,00	0,81
	CAJAS DE INSPECCION 1	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 2	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 3	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 4	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 5	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	TRITURADO GRUESO 3/4 PARA FILTRO	1,45	0,39	27,90	1,00	15,89
					Subtotal	18,28
					TOTAL	18,28

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	16	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

10,4	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	ENTIBADO TIPO 2	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL

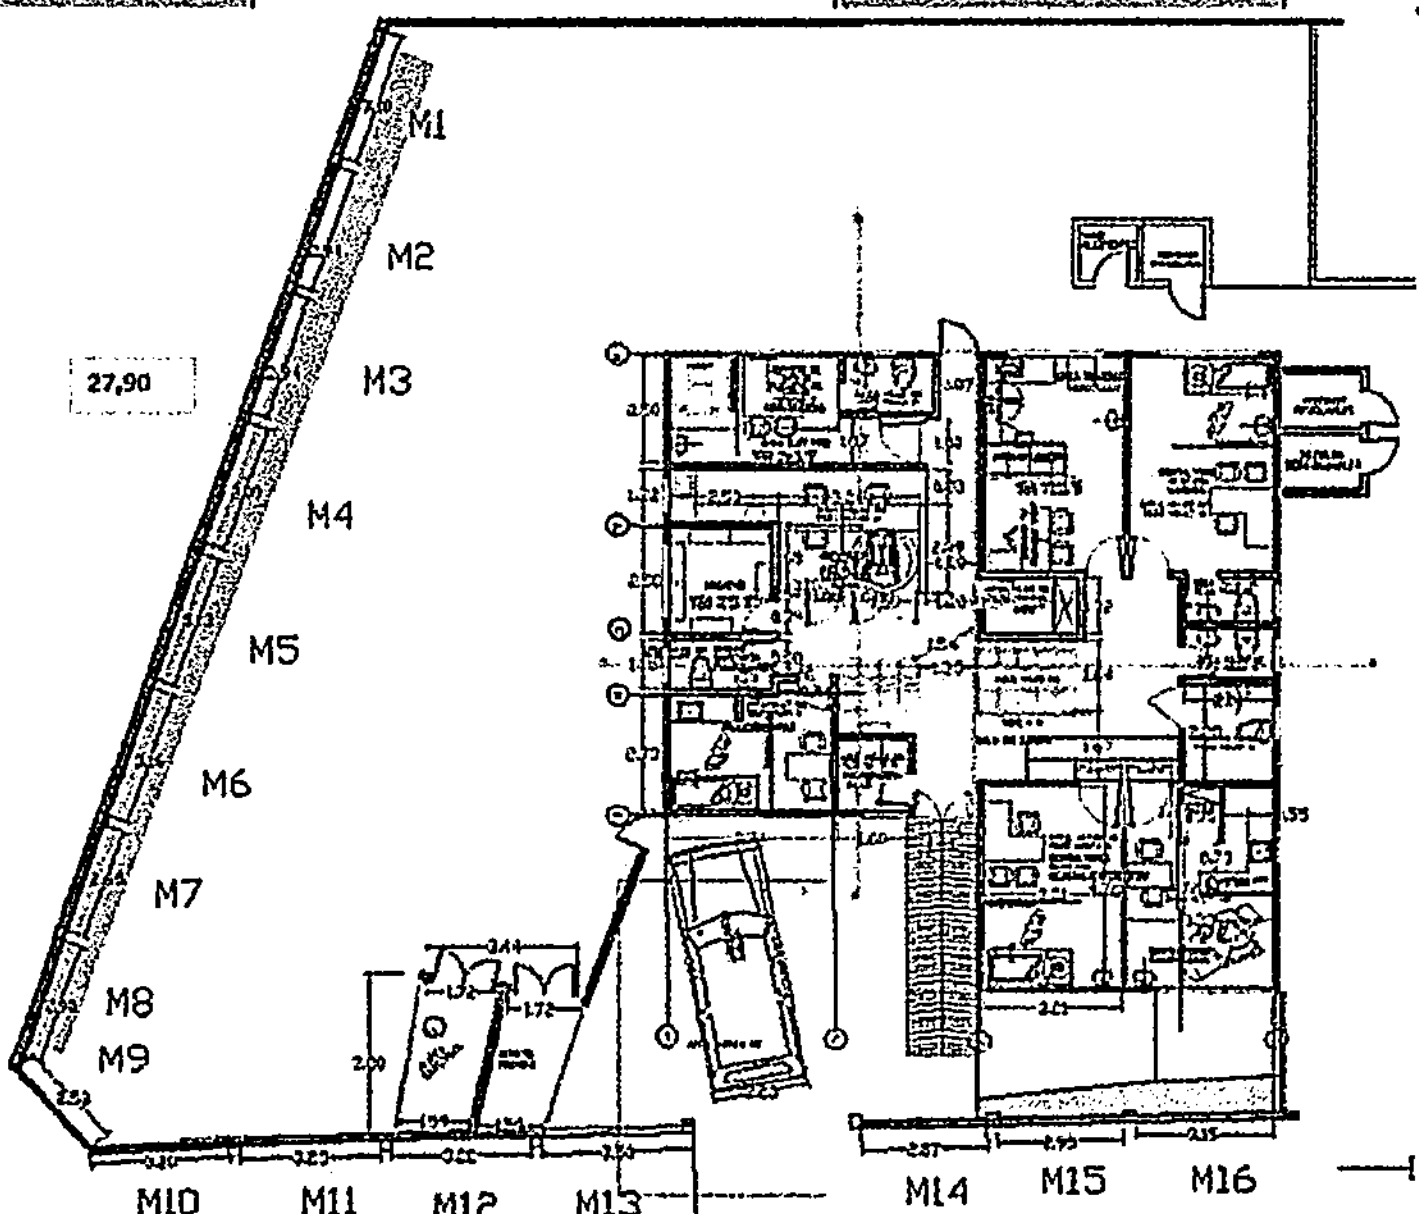

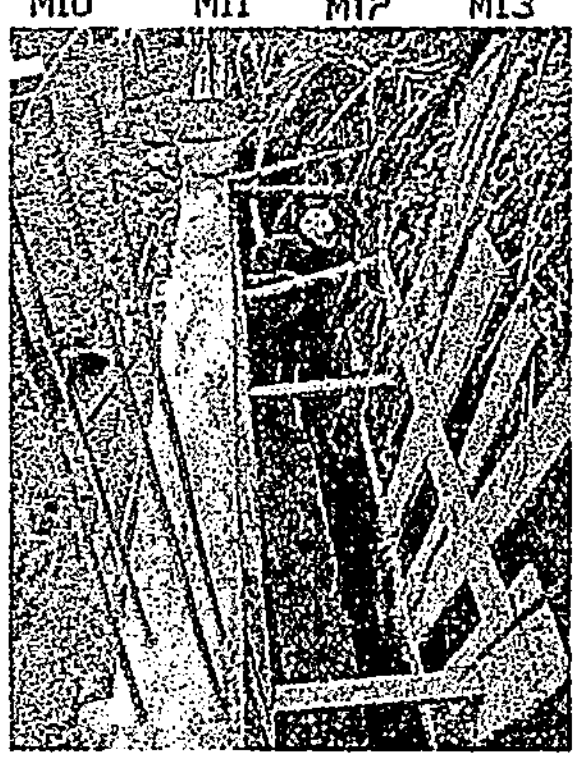

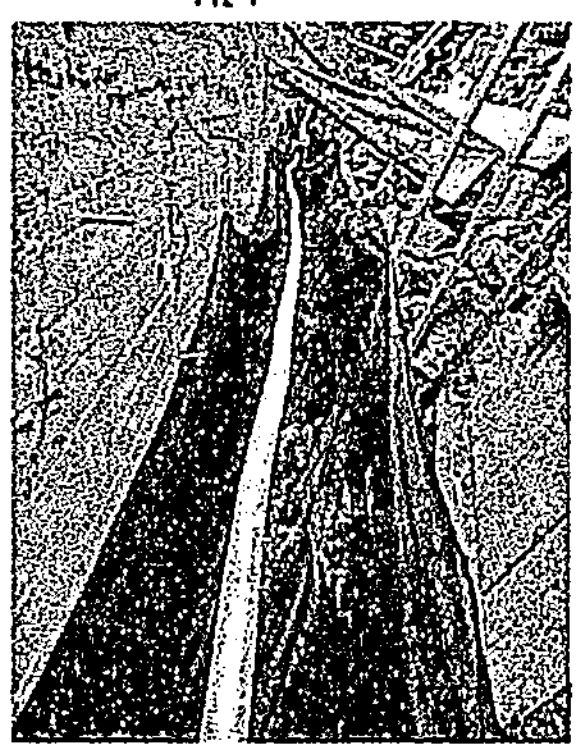

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	TRITURADO GRUESO 3/4 PARA FILTRO		0,50	27,90	1,00	13,95
	Subtotal					13,95
	TOTAL					13,95

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN


CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD 16	MM 12	AA 2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA							
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°				
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025			

11,1	PINTURAS	ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

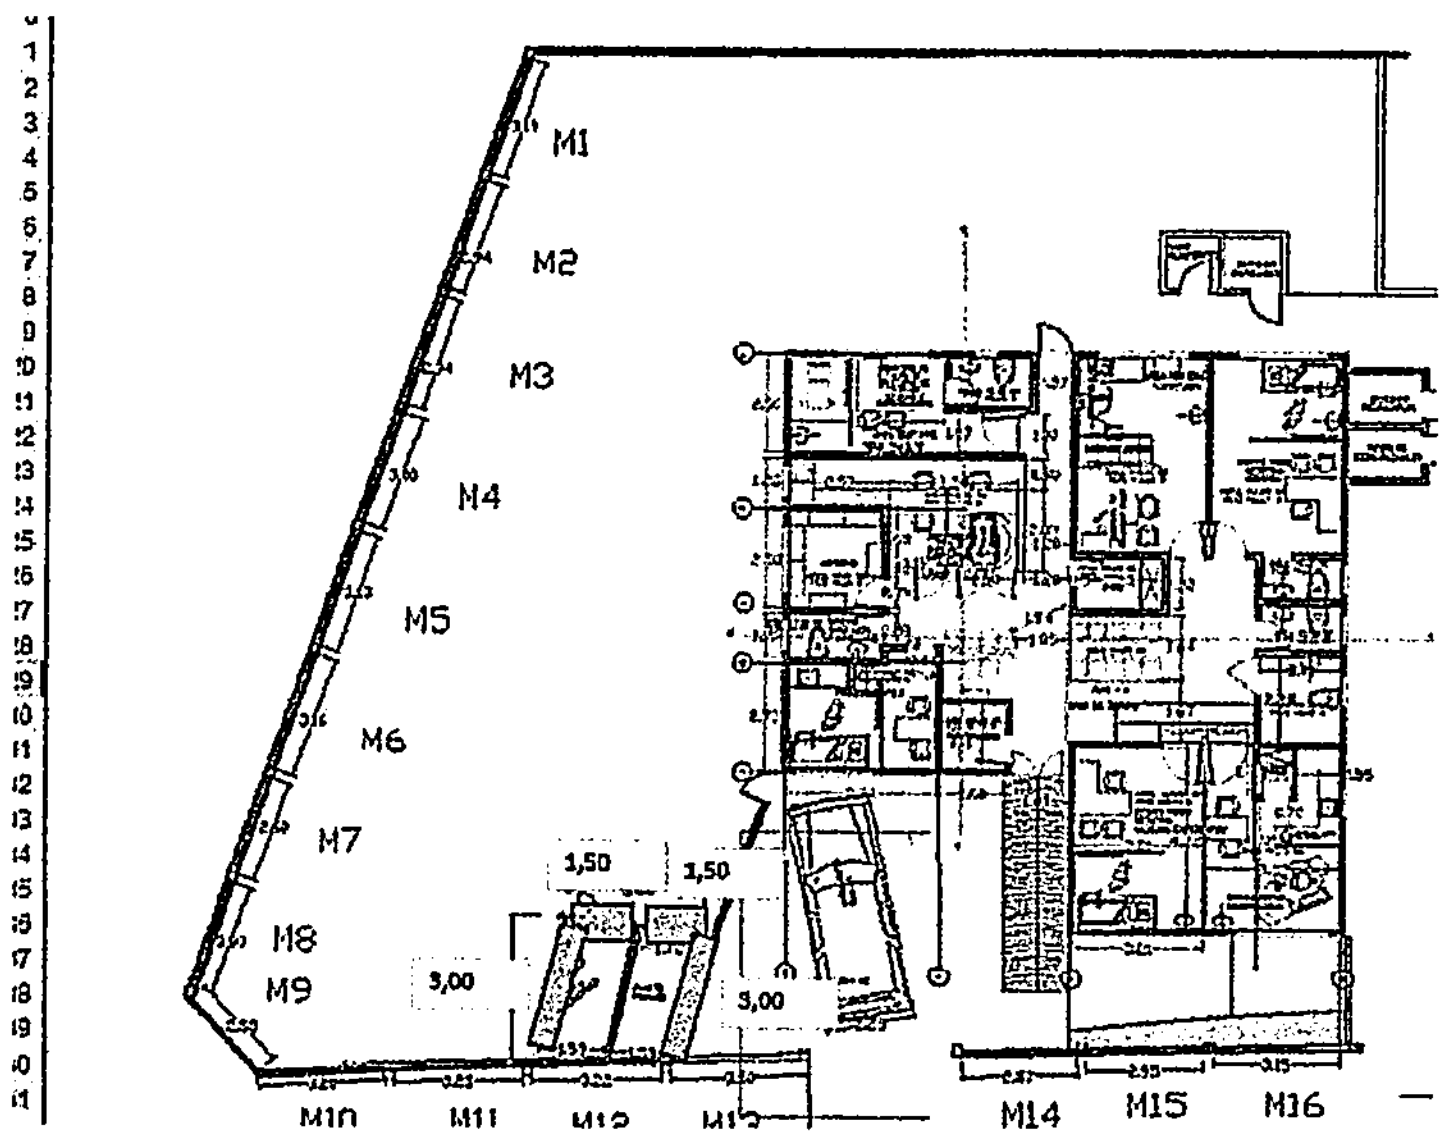

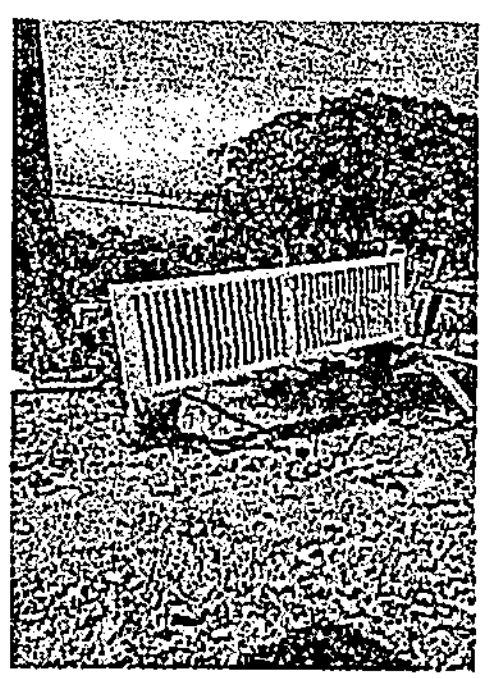

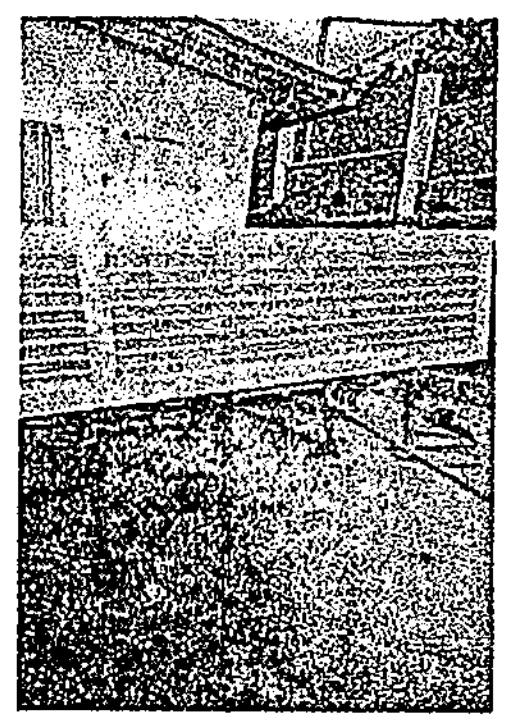

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem	Medida Total
						-
	PUERTA 1	1,50	4,40		1,00	5,90
	PUERTA 2	1,50	4,40		1,00	5,90
	VENTANA 1	3,00	0,60		1,00	4,60
	VENTANA 2	3,00	0,60		1,00	4,60
	Subtotal					21,00
	TOTAL					21,00

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3


BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	15	MM	12	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA	NIT O C.C	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA	CONDENSING INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.648.356-3	CONTRATO DE OBRA N°	02 2025

11.2	PINTURAS	ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	UNID	UND	UBICACIÓN	GENERAL

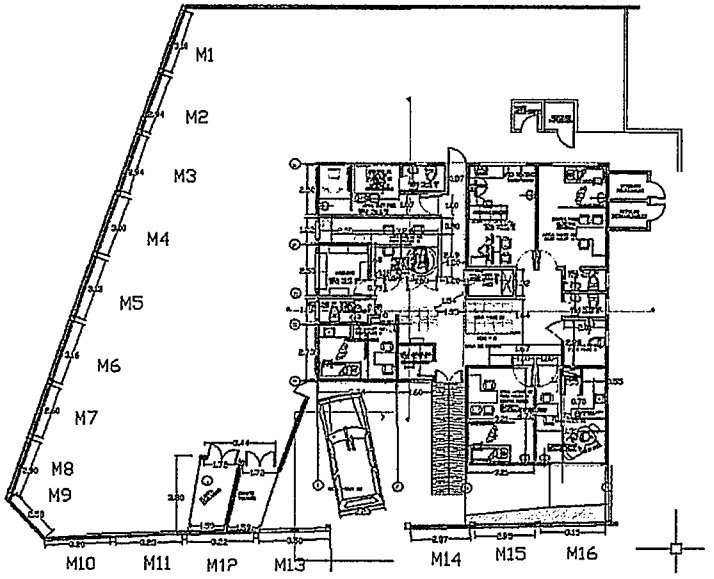



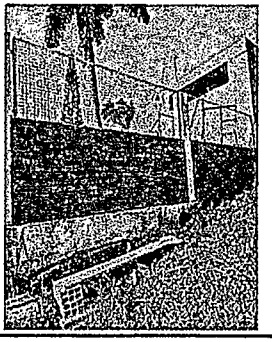

Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No. Elem	Medida Total
						-
	MALLA15	2,74	1,00		2,00	5,49
	MALLA16	2,50	1,00		2,00	5,00
	Subtotal					10,49
	TOTAL					10,49

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SENORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900648358-3	CONDISEING INGENIERIA SAS		CL 135 C 13 70 TO 1 AP 404	3123762860	condiseing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91032582	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	8600021834-9	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900648358-3	CONDISEING INGENIERIA SAS	CL 135 C 13 70 TO 1 AP 404	3123762860	condiseing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91032582	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Fallec. cónyuge	Extranjero	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52454011	SANCHEZ MOLANO JULIANA	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	I	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOJAN FERNANDO SANCHEZ CABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032456993 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 290027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

En mi condición de Representante Legal de CONDISEING INGENIERIA SAS, identificada con NIT: 900.648.356-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar y aportes parafiscales durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los (24) Veinticuatro Días del Mes de Noviembre de 2025.

Firma:

JAIR ALEXANDER RODRÍGUEZ PEÑUELA
Representante Legal
CONDISEING INGENIERIA SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290027-T



YOJAN FERNANDO
SANCHEZ CABRA
C.C. 1032456993
RES. INSCRIPCION 2900 DEL 18/11/2021
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312960 330649

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contable., según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.456.993
SANCHEZ CABRA
APELLIDOS
YOJAN FERNANDO
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-JUN-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00310793-M-1032456993-20110628 0027303187A 1 36573990

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.456.993
SANCHEZ CABRA

APELLIDOS
YOJAN FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-JUN-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1500150-00310793-M-1032456993-20110628 0027309187A 1 36573990

Escaneado con CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tabio, 14 de Noviembre de 2025

Señor:

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONDISEING INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 900648356 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Numero Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	68912404513	2013/08/28	A ACTIVA

Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400. Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte, Medellín – Colombia.

Página 1 de 1

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO CONDISEING INGENIERIA SAS
Fecha Pago	28/12/2025
Hora Pago	10:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900648356	**Referencia**	8600200948
Nombre	CONDISEING INGENIERIA SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4513	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 59.993.830,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial
