
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0001	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE EL GUSANITO

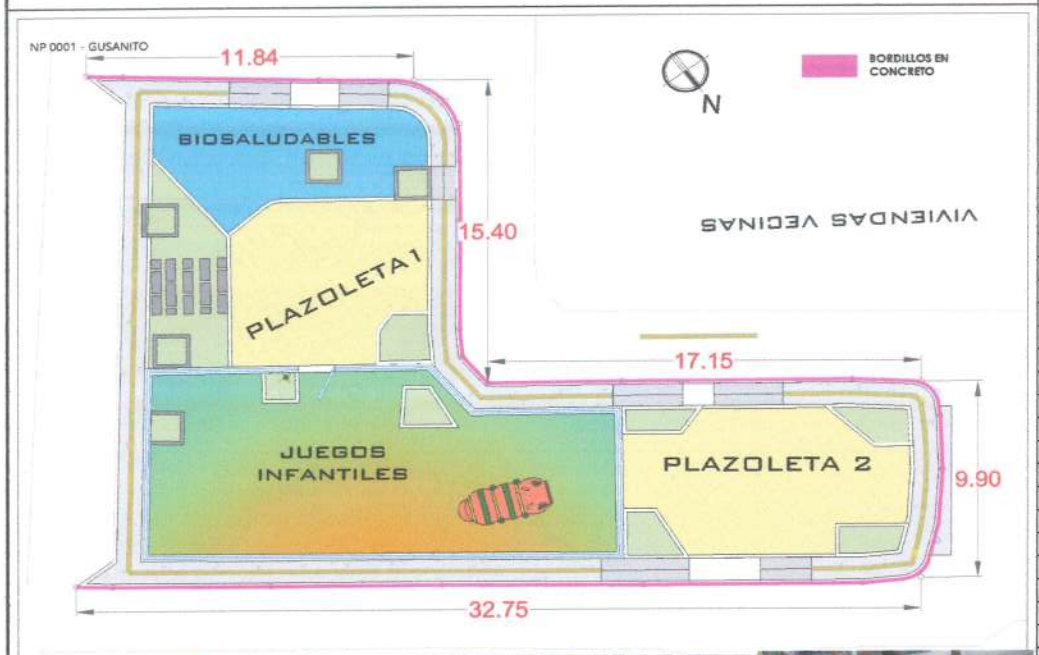



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BORDILLOS								
ANDENES - BORDILLO EXTERNO	32.75				1.00	32.75		
	9.90				1.00	9.90		
	17.15				1.00	17.15		
	15.40				1.00	15.40		
	11.84				1.00	11.84		
TOTAL PRESENTE ACTA:						87.04		

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	2 de 2


CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0001	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE 5 ESTRELLAS







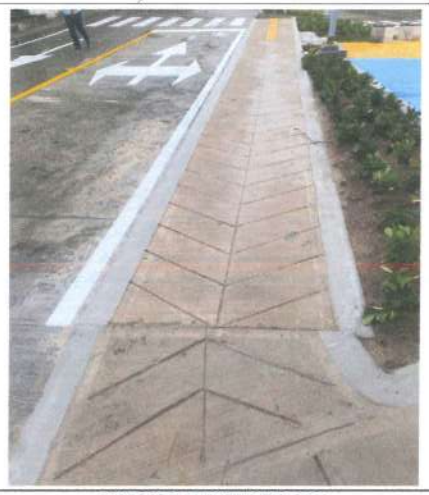

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BORDILLOS								
BORDILLO CARRERA 37	19.80				1.00	19.80		
BORDILLO CALLE 84B	5.54				1.00	5.54		
BORDILLO CARRERA 36B	6.04				1.00	6.04		

Cantidad según modificativa 5	350.00
Acumulado anterior	229.90
Acumulado a presente acta	348.32
Obra por ejecutar	1.68

TOTAL PRESENTE ACTA:	31.38

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0002	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUBASE GRANULAR COMPACTDO INCLUYE COMPACTACION MECANICA

PARQUE EL GUSANITO

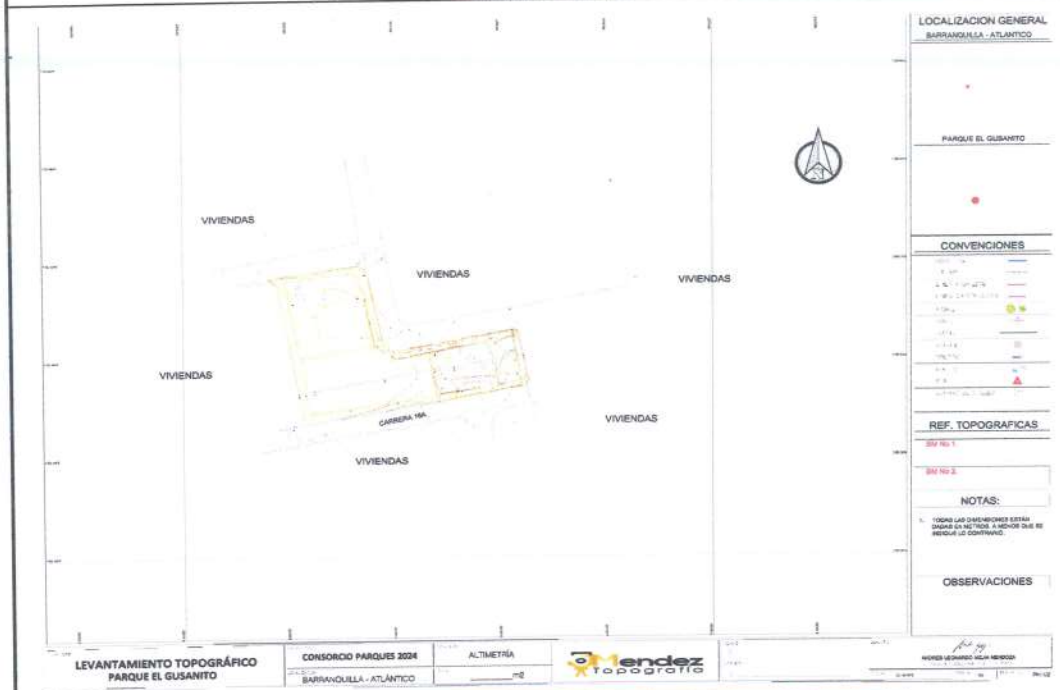









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
SEGÚN CARTERA					1,00			251,81

Cantidad según modificativa 5	3374,66
Acumulado anterior	2812,19
Acumulado a presente acta	3064,00
Obra por ejecutar	310,66

TOTAL PRESENTE ACTA:	251,81


OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

VOLÚMENES DE RELLENO - PARQUE EL GUSANITO			
ABSCISA	INTERVALO	AREA	VOLUMEN
0+000.06		4.25	
0+003	2.94	4.87	13.38
0+006	3.00	4.87	14.61
0+009	3.00	4.86	14.60
0+012	3.00	4.85	14.57
0+015	3.00	4.84	14.55
0+018	3.00	4.96	14.71
0+021	3.00	12.46	26.13
0+024	3.00	12.50	37.44
0+027	3.00	12.52	37.52
0+030	3.00	12.55	37.60
0+032.17	2.17	12.06	26.70
VOLUMEN TOTAL (M3):			251.81

ANDRES LEONARDO MEJIA MENDOZA
LIC. PROFESIONAL No: 01-18448
JMENDEZ TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SAS
TOPOGRAFO

EDGAR JAVIER BLANCO LINERO
LIC. PROFESIONAL No: 01-17145
EDUBAR S.A.
TOPOGRAFO

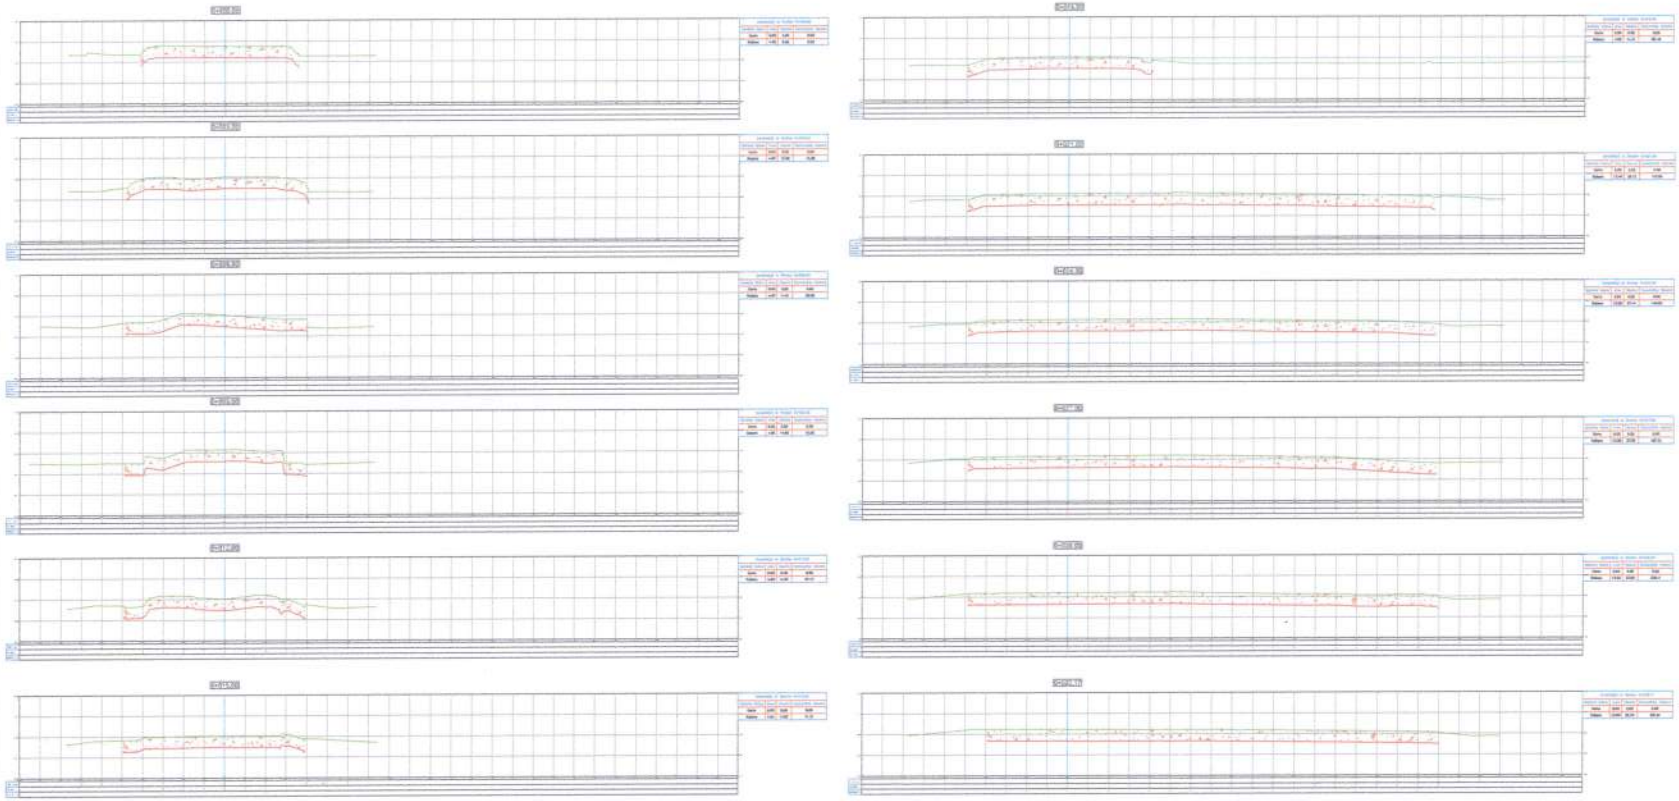

LOCALIZACION GENERAL

BARRANQUILLA - ATLANTICO

PARQUE EL GUSANITO

CONVENCIONES

- BORDE VIA
- EJE VIA
- LINEA PROPIEDAD
- LINEA CONSTRUCCIÓN
- ARBOL
- POSTE
- JARDIN
- MANJOL
- SENTIDO
- POINTS
- B.M.
- CURVAS DE NIVELES

REF. TOPOGRAFICAS

BM No 1.

BM No 2.

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

OBSERVACIONES

NOMBRE: **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE EL GUSANITO**	PROPIETARIO: **CONSORCIO PARQUES 2024**	CONTIENE: ALTIMETRÍA		REVISO: X	ELABORO: ANDRES LEONARDO MEJIA MENDOZA, Licencia Profesional No: 01-18448
	LOCALIZACION: BARRANQUILLA - ATLÁNTICO	AREA: _____m2		APROBO: X	FECHA: 06-10-2025 / ESCALA: 1:100 / PLANO No: Pln:2/2



LOCALIZACION GENERAL

BARRANQUILLA - ATLANTICO

PARQUE EL GUSANITO

CONVENCIONES

- BORDE VIA
- EJE VIA
- LINEA PROPIEDAD
- LINEA CONSTRUCCIÓN
- ARBOL
- POSTE
- JARDIN
- MANJOL
- SENTIDO
- POINTS
- B.M.
- CURVAS DE NIVELES

REF. TOPOGRAFICAS

BM No 1.

BM No 2.

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

OBSERVACIONES

NOMBRE: **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE EL GUSANITO**	PROPIETARIO: **CONSORCIO PARQUES 2024**	CONTIENE: ALTIMETRÍA		REVISO: X	ELABORO: ANDRES LEONARDO MEJIA MENDOZA, Licencia Profesional No. 01-18448
	LOCALIZACION: BARRANQUILLA - ATLÁNTICO	AREA: _____m2		APROBO: X	FECHA: 30-10-2025 ESCALA: 1:150 PLANO No: Pln:1/2

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

DENSIDAD EN EL TERRENO

OBRA: PARQUE EL GUSANITO **REFERENCIA**: CONSORCIO PARQUE 2024
BARRIO: LAS NIEVES **FECHA**: 3 DE OCTUBRE DE 2025
LOCALIZACIÓN: K 16A C 27B **EJECUTADO:** ANAYA LUIS
DESCRIPCIÓN: MATERIAL GRANULAR SUB- BASE **NIT**: 901913394-3

_ENSAYO No.	1	2	3	4	5	6
LOCALIZACION	JUEGOS INFANTILES			ZONA DE GIMNASIOS		
PROFUNDIDAD METROS	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6529	6535	6522	6534	6498	6487
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	3413	3421	3430	3416	3425	3418
PESO ARENA TOTAL USADA	3105	3103	3118	3102	3121	3126
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458	1458	1458
PESO ARENA EN EL HUECO	1647	1645	1660	1644	1663	1668
DENSIDAD DE LA ARENA	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
VOLUMEN DEL HUECO	1409	1417	1408	1415	1412	1407
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	3325	33320	3299	3337	3311	3310
% HUMEDAD	7,30%	7,60%	7,10%	7,70%	7,40%	7,90%
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	3088	3095	3069	3074	3065	3042
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	136,82	136,35	136,07	135,62	135,51	134,97
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	95,82	96,15	96,34	96,67	96,74	97,13
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla – Colombia

Fernando Anaya Carrasquilla

Ingeniero Civil – Esp. Vías y Transporte – Planeación Urbana y Rural
Estudio de Suelos – patología de la construcción
Geotecnia y Materiales – Control de calidad

ENSAYO No.	7	8	9	10	11	12
LOCALIZACION	ANDENES			PLAZOLOETAS		
PROFUNDIDAD METROS	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
PESO FRASCO Y ARENA TOTAL USADA	6541	6533	6530	6535	6539	6537
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	3413	3421	3430	3416	3425	3418
PESO ARENA TOTAL USADA	3105	3103	3118	3102	3121	3126
CONSTANTE DEL CONO	1458	1458	1458	1458	1458	1458
PESO ARENA EN EL HUECO	1647	1645	1660	1644	1663	1668
DENSIDAD DE LA ARENA	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
VOLUMEN DEL HUECO	1411	1399	1409	1405	1404	1409
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO	3325	33320	3299	3337	3311	3310
% HUMEDAD	7,30%	7,60%	7,10%	7,70%	7,40%	7,90%
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO	3102	3089	3105	3101	3056	3112
DENSIDAD DEL MATERIAL GMS/CC	2,20	2,21	2,20	2,21	2,18	2,21
DENSIDAD DEL MATERIAL LBS	137,24	137,84	137,57	137,79	135,88	137,88
DENSIDAD MAX. LABORATORIO	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
% HUMEAD ÓPTIMA LABORATORIO	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
% DE COMPACTACIÓN TERRENO	95,52	95,11	95,29	95,15	96,48	95,08
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICA	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

OBSERVACIONES: _____

LABORATORIO **LABORATORISTA** **INGENIERO**

MP 08202-125571 ATL

Calle 41 No. 46-186 Cel. 314-5049381
Barranquilla – Colombia

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que CANTERAS MUNARRIZ S.A.S. con NIT número No. 8001764143, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 21087 ubicado en el municipio PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO, para la exploración y explotación de un yacimiento de GRAVAS DE CANTERA, CALIZA, RECEBO.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 22 días del mes de octubre del año 2025.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas


CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	630
	30	JUN	2025		

INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**	
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**	
CÓDIGO EXPEDIENTE	**21087**			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	**CANTERAS MUNARRIZ S.A.S.**			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT X	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	**800.176.414-3**			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	**ATLANTICO**			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	**PUERTO COLOMBIA**			
MINERAL EXPLOTADO	**SUB-BASE GRANULAR**			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	**254**			
UNIDAD DE MEDIDA	METRO CUBICO			

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	**CONSORCIO PARQUE 2024**			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT X	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**901.913.394-3**			
No. RUCOM	RUCOM-			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	 CANTERAS MUNARRIZ S.A.S.			

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0006	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 3/8"

PARQUE 5 ESTRELLAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	ANCLAJE A CADA	CANT.	TOTALES UN	TOTALES M2	TOTALES M3
BORDILLOS								
BORDILLO CARRERA 37	19,80			0,40	2,00	100,00		
BORDILLO CALLE 84B	5,54			0,40	2,00	28,00		
BORDILLO 36B	6,04			0,40	2,00	30,00		



Cantidad según modificativa 5	3000,00
Acumulado anterior	2249,00
Acumulado a presente acta	2407,00
Obra por ejecutar	593,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	158,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 06	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/2021
		Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V		
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0007	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE IGOL DENSO	

PARQUE EL GUSANITO











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
JARDINERAS								
JARDINERA VIGA - 1	1,40	0,20			2,00		0,56	
	1,10	0,20			2,00		0,44	
JARDINERA VIGA - 2	1,93	0,20			2,00		0,77	
	1,10	0,20			2,00		0,44	
JARDINERA VIGA - 3	1,12	0,20			2,00		0,45	
	1,08	0,20			2,00		0,43	
JARDINERA VIGA - 4	1,10	0,20			2,00		0,44	
	1,40	0,20			2,00		0,56	
JARDINERA VIGA - 5	0,90	0,20			2,00		0,36	
	1,28	0,20			2,00		0,51	
JARDINERA VIGA - 6	1,38	0,20			2,00		0,55	
	0,92	0,20			2,00		0,37	
JARDINERA VIGA - 7	1,50	0,20			1,00		0,30	
	2,73	0,20			1,00		0,55	
	2,85	0,20			1,00		0,57	
	2,23	0,20			1,00		0,45	
JARDINERA BLOQUE - 1	1,04	0,21			1,00		0,22	
	1,95	0,21			1,00		0,41	
	2,25	0,21			1,00		0,47	
	2,19	0,21			1,00		0,46	
		0,21						
JARDINERA BLOQUE - 2	1,50	0,21			1,00		0,32	
	2,41	0,21			1,00		0,51	
	1,25	0,21			1,00		0,26	
	3,30	0,21			1,00		0,69	
JARDINERA BLOQUE - 3	2,26	0,21			1,00		0,47	
	1,28	0,21			1,00		0,27	
	2,60	0,21			1,00		0,55	
	2,67	0,21			1,00		0,56	
JARDINERA BLOQUE - 4	3,00	0,21			1,00		0,63	
	1,55	0,21			1,00		0,33	
	3,46	0,21			1,00		0,73	
	2,10	0,21			1,00		0,44	
JARDINERA BLOQUE - 5	3,00	0,21			1,00		0,63	
	1,51	0,21			1,00		0,32	
	1,43	0,21			1,00		0,30	
	3,04	0,21			1,00		0,64	
TOTAL PRESENTE ACTA:							**16,96**	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

NP 0007 - GUSANITO

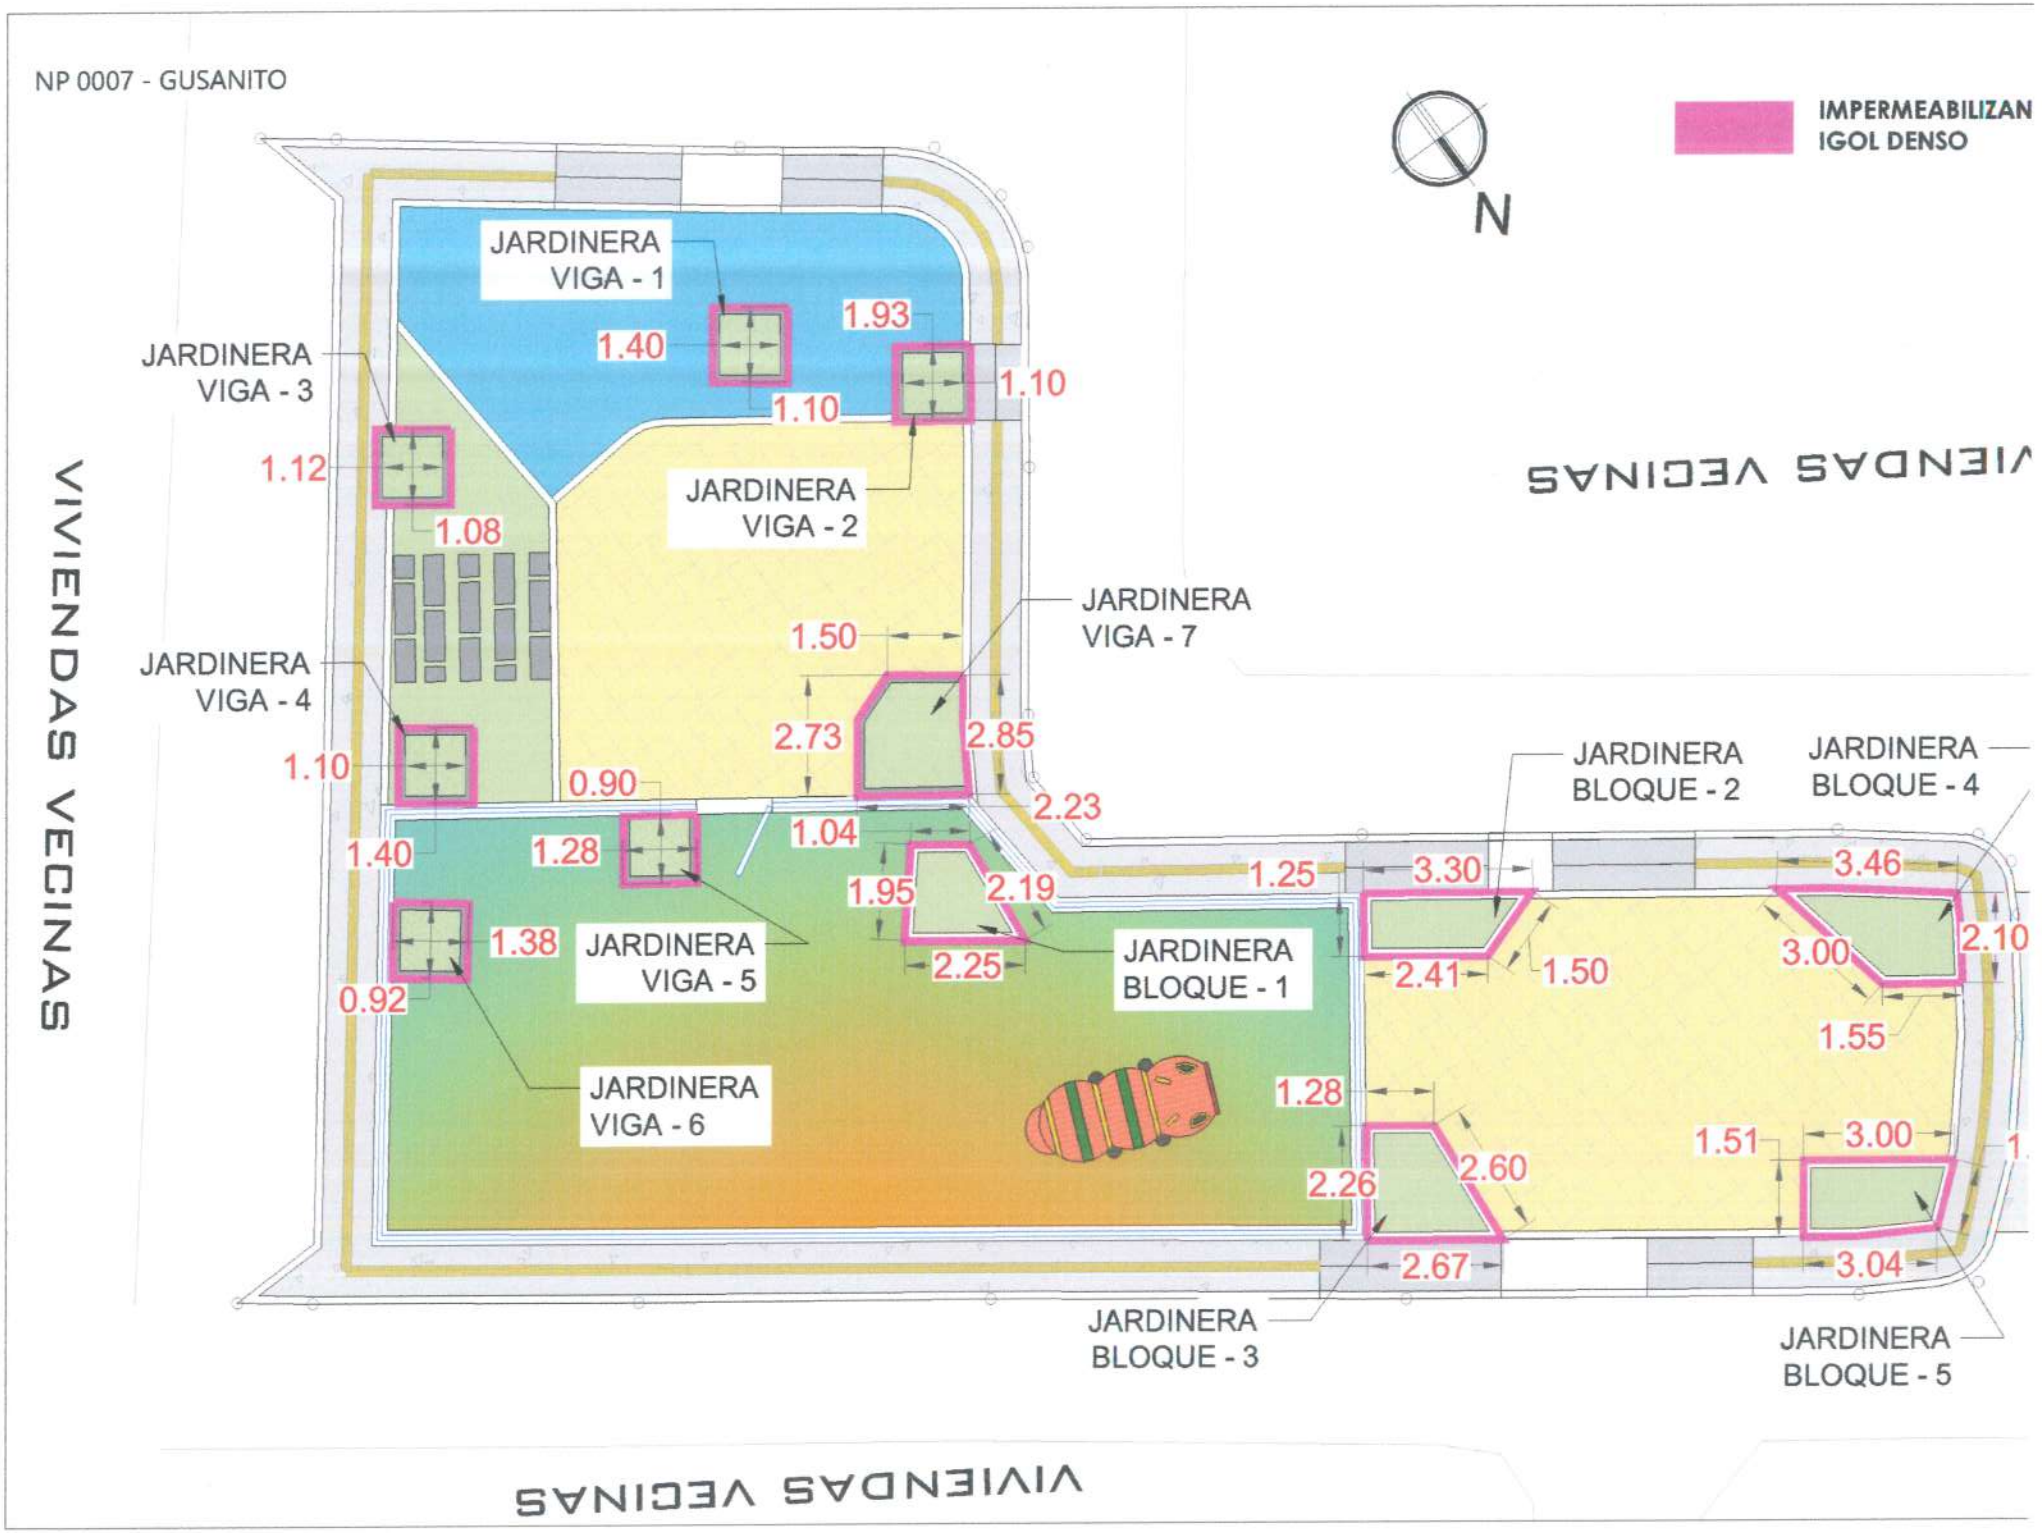

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0007	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE IGOL DENSO

PARQUE 5 ESTRELLAS









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
MURO								
BIOSALUDABLES	5,10	0,63			1,00		3,21	
	6,65	0,63			1,00		4,19	
	1,30	0,63			1,00		0,82	
ANDEN CARRERA 36B	9,92	0,21			1,00		2,08	
	0,85	0,21			1,00		0,18	

Cantidad según modificativa 5	86,00
Acumulado anterior	58,41
Acumulado a presente acta	85,85
Obra por ejecutar	0,15

TOTAL PRESENTE ACTA:	10,48


OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** **ACTA No. 06**	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/2021
		Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP 0014	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	BASE MEJORADA CON SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	

PARQUE VILLA DEL CARMEN

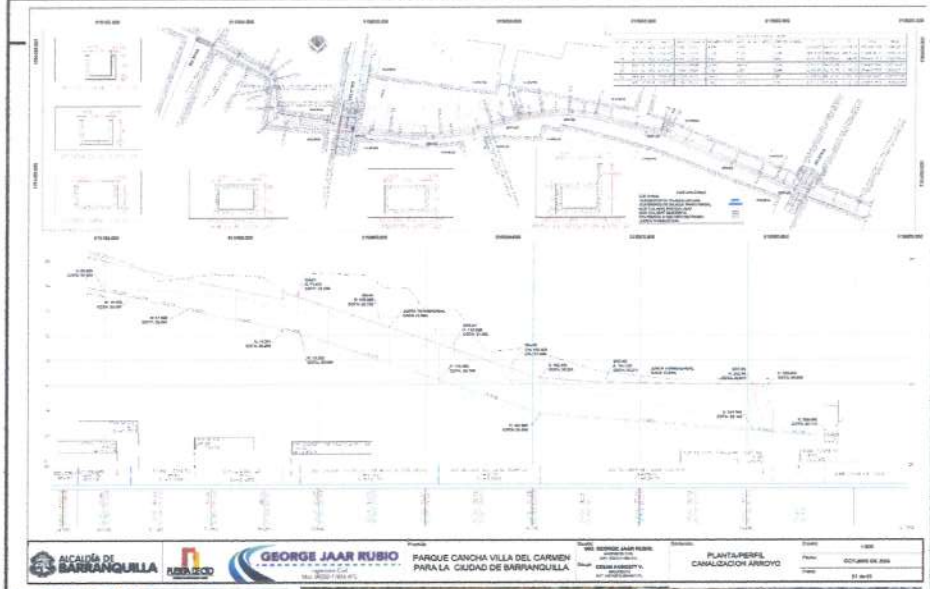








LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BOX VEHICULAR CALLE 73 C								
K0+64,5-K0+70,9								
LOSA DE FONDO	6,40	3,00	0,20		1,00			3,84
BOX PEATONAL								
TRAMO DE K0+70,9-K0+82,9								
LOSA DE FONDO	12,00	3,20	0,20		1,00			7,68
TOTAL PRESENTE ACTA:								11,52

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0014	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BASE MEJORADA CON SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	

PARQUE 5 ESTRELLAS



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BIOSALUDABLES	8,24	8,26	0,15		1,00			10,21
PLAZOLETA	4,15	3,89	0,15		1,00			2,42







Cantidad según modificativa 5	57,38
Acumulado anterior	33,23
Acumulado a presente acta	57,38
Obra por ejecutar	0,00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

TOTAL PRESENTE ACTA:	12,63

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0017	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ANDENES,CANCHAS Y PISOS ESTAMPADOS

PARQUE EL GUSANITO

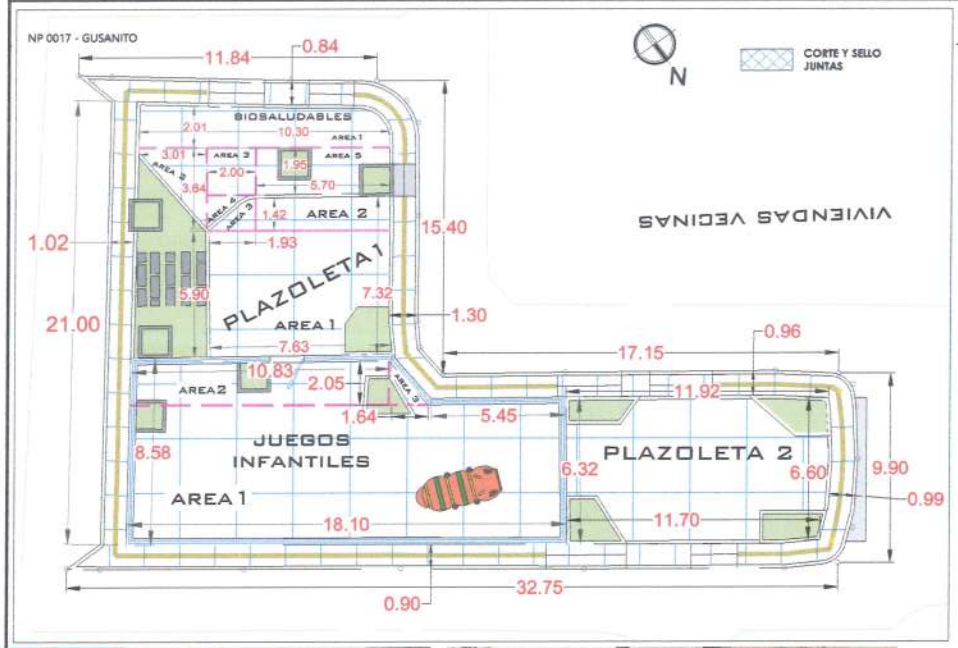








LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
PLAZOLETA 1								
AREA 1	5,90				2,00	11,80		
	7,63				2,00	15,26		
AREA 2	1,42				2,00	2,84		
	5,70				1,00	5,70		
AREA 3	1,42				0,50	0,71		
	1,93				0,50	0,97		
PLAZOLETA 2	6,46				4,00	25,84		
	11,81				2,00	23,62		
JUEGOS INFANTILES								
AREA 1	18,10				2,00	36,20		
	6,32				3,00	18,96		
AREA 2	2,08				4,00	8,32		
	10,83				1,00	10,83		
AREA 3	2,08				0,50	1,04		
	1,71				0,50	0,86		
BIOSALUDABLES								
AREA 1	2,01				2,00	4,02		
	10,30				1,00	10,30		
AREA 2	3,64				0,50	1,82		
	3,01				0,50	1,51		
AREA 3	1,95				1,00	1,95		
	2,00				1,00	2,00		
AREA 4	1,55				0,50	0,78		
	2,00				0,50	1,00		
AREA 5	1,95				1,00	1,95		
	5,70				1,00	5,70		
						-		
ANDENES						-		
ANDENES - BORDILLO EXTERNO	0,90				13,00	11,70		
	0,99				5,00	4,95		
	0,96				9,00	8,64		
	1,03				8,00	8,24		
	0,84				6,00	5,04		
ANDENES - BORDILLO INTERNO	1,02				11,00	11,22		
TOTAL PRESENTE ACTA:								**243,77**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

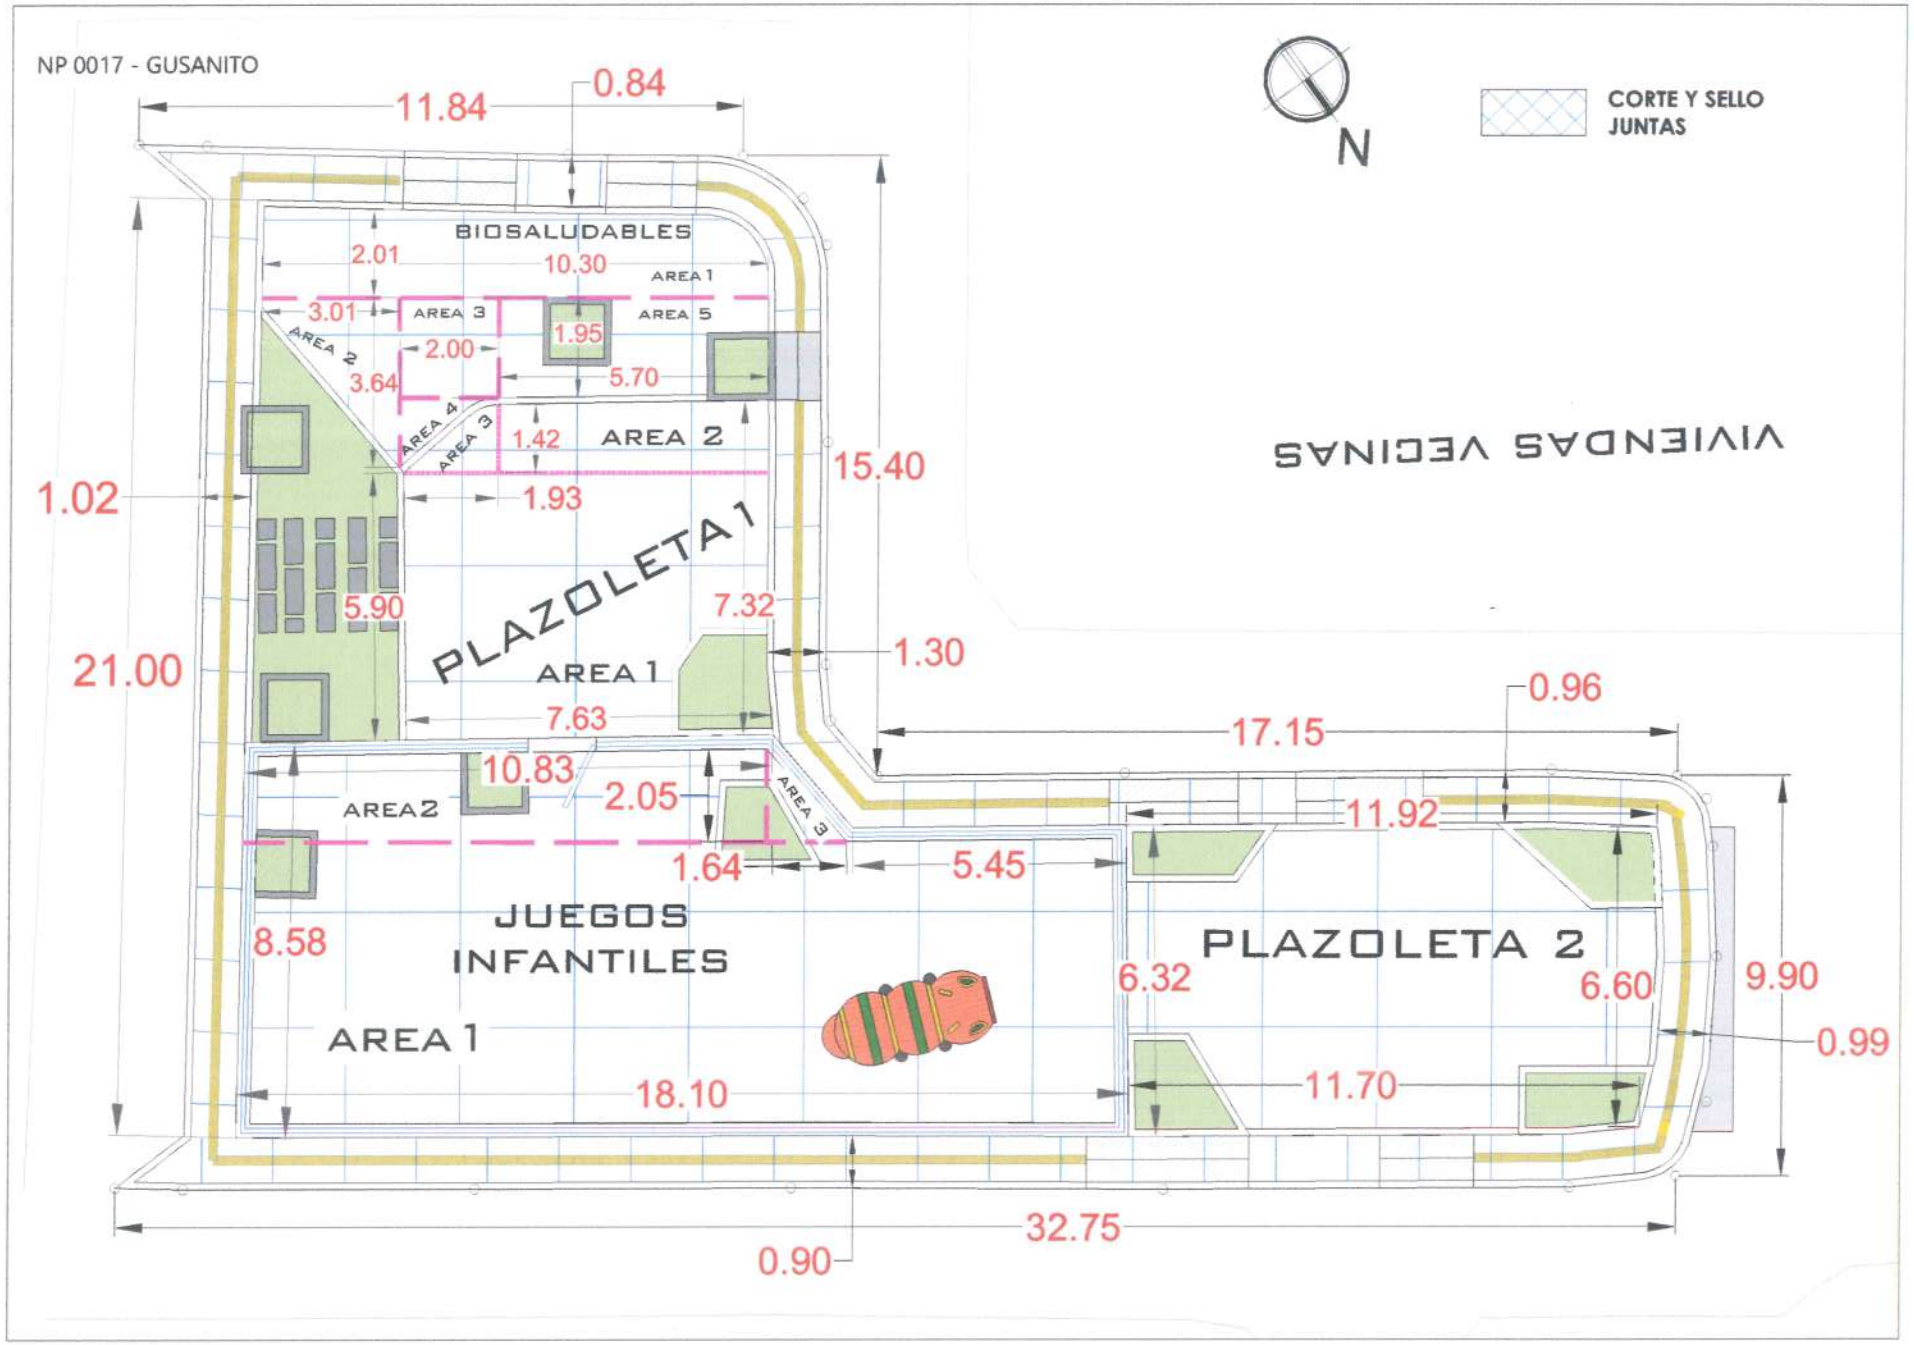
NP 0017 - GUSANITO
N
CORTE Y SELLO JUNTAS
VIVIENDAS VECINAS
11.84
0.84
BIOSALUDABLES
2.01
10.30
AREA 1
3.01
AREA 3
AREA 5
1.95
AREA 2
2.00
3.64
5.70
AREA 4
AREA 3
1.42
AREA 2
15.40
1.02
1.93
PLAZOLETA 1
5.90
7.32
1.30
21.00
AREA 1
7.63
0.96
17.15
10.83
2.05
AREA 3
11.92
AREA2
1.64
5.45
8.58
JUEGOS INFANTILES
PLAZOLETA 2
6.32
6.60
9.90
0.99
AREA 1
18.10
11.70
32.75
0.90

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2


CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0017	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ANDENES,CANCHAS Y PISOS ESTAMPADOS	

PARQUE 5 ESTRELLAS










LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BIOSALUDABLES	8,24				2,00	16,48		
	8,26				2,00	16,52		
PLAZOLETA	4,15				1,00	4,15		
	3,89				1,00	3,89		
ANDENES								
ANDEN CARRERA 36B	0,80				7,00	5,60		
	1,05				1,00	1,05		
	0,93				2,00	1,86		
ANDEN CARRERA 37	1,05				8,00	8,40		
ANDEN VIVIENDAS	1,05				7,00	7,35		

Cantidad según modificativa 5	4365,00
Acumulado anterior	4000,23
Acumulado a presente acta	4309,30
Obra por ejecutar	55,70

TOTAL PRESENTE ACTA:	65,30

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

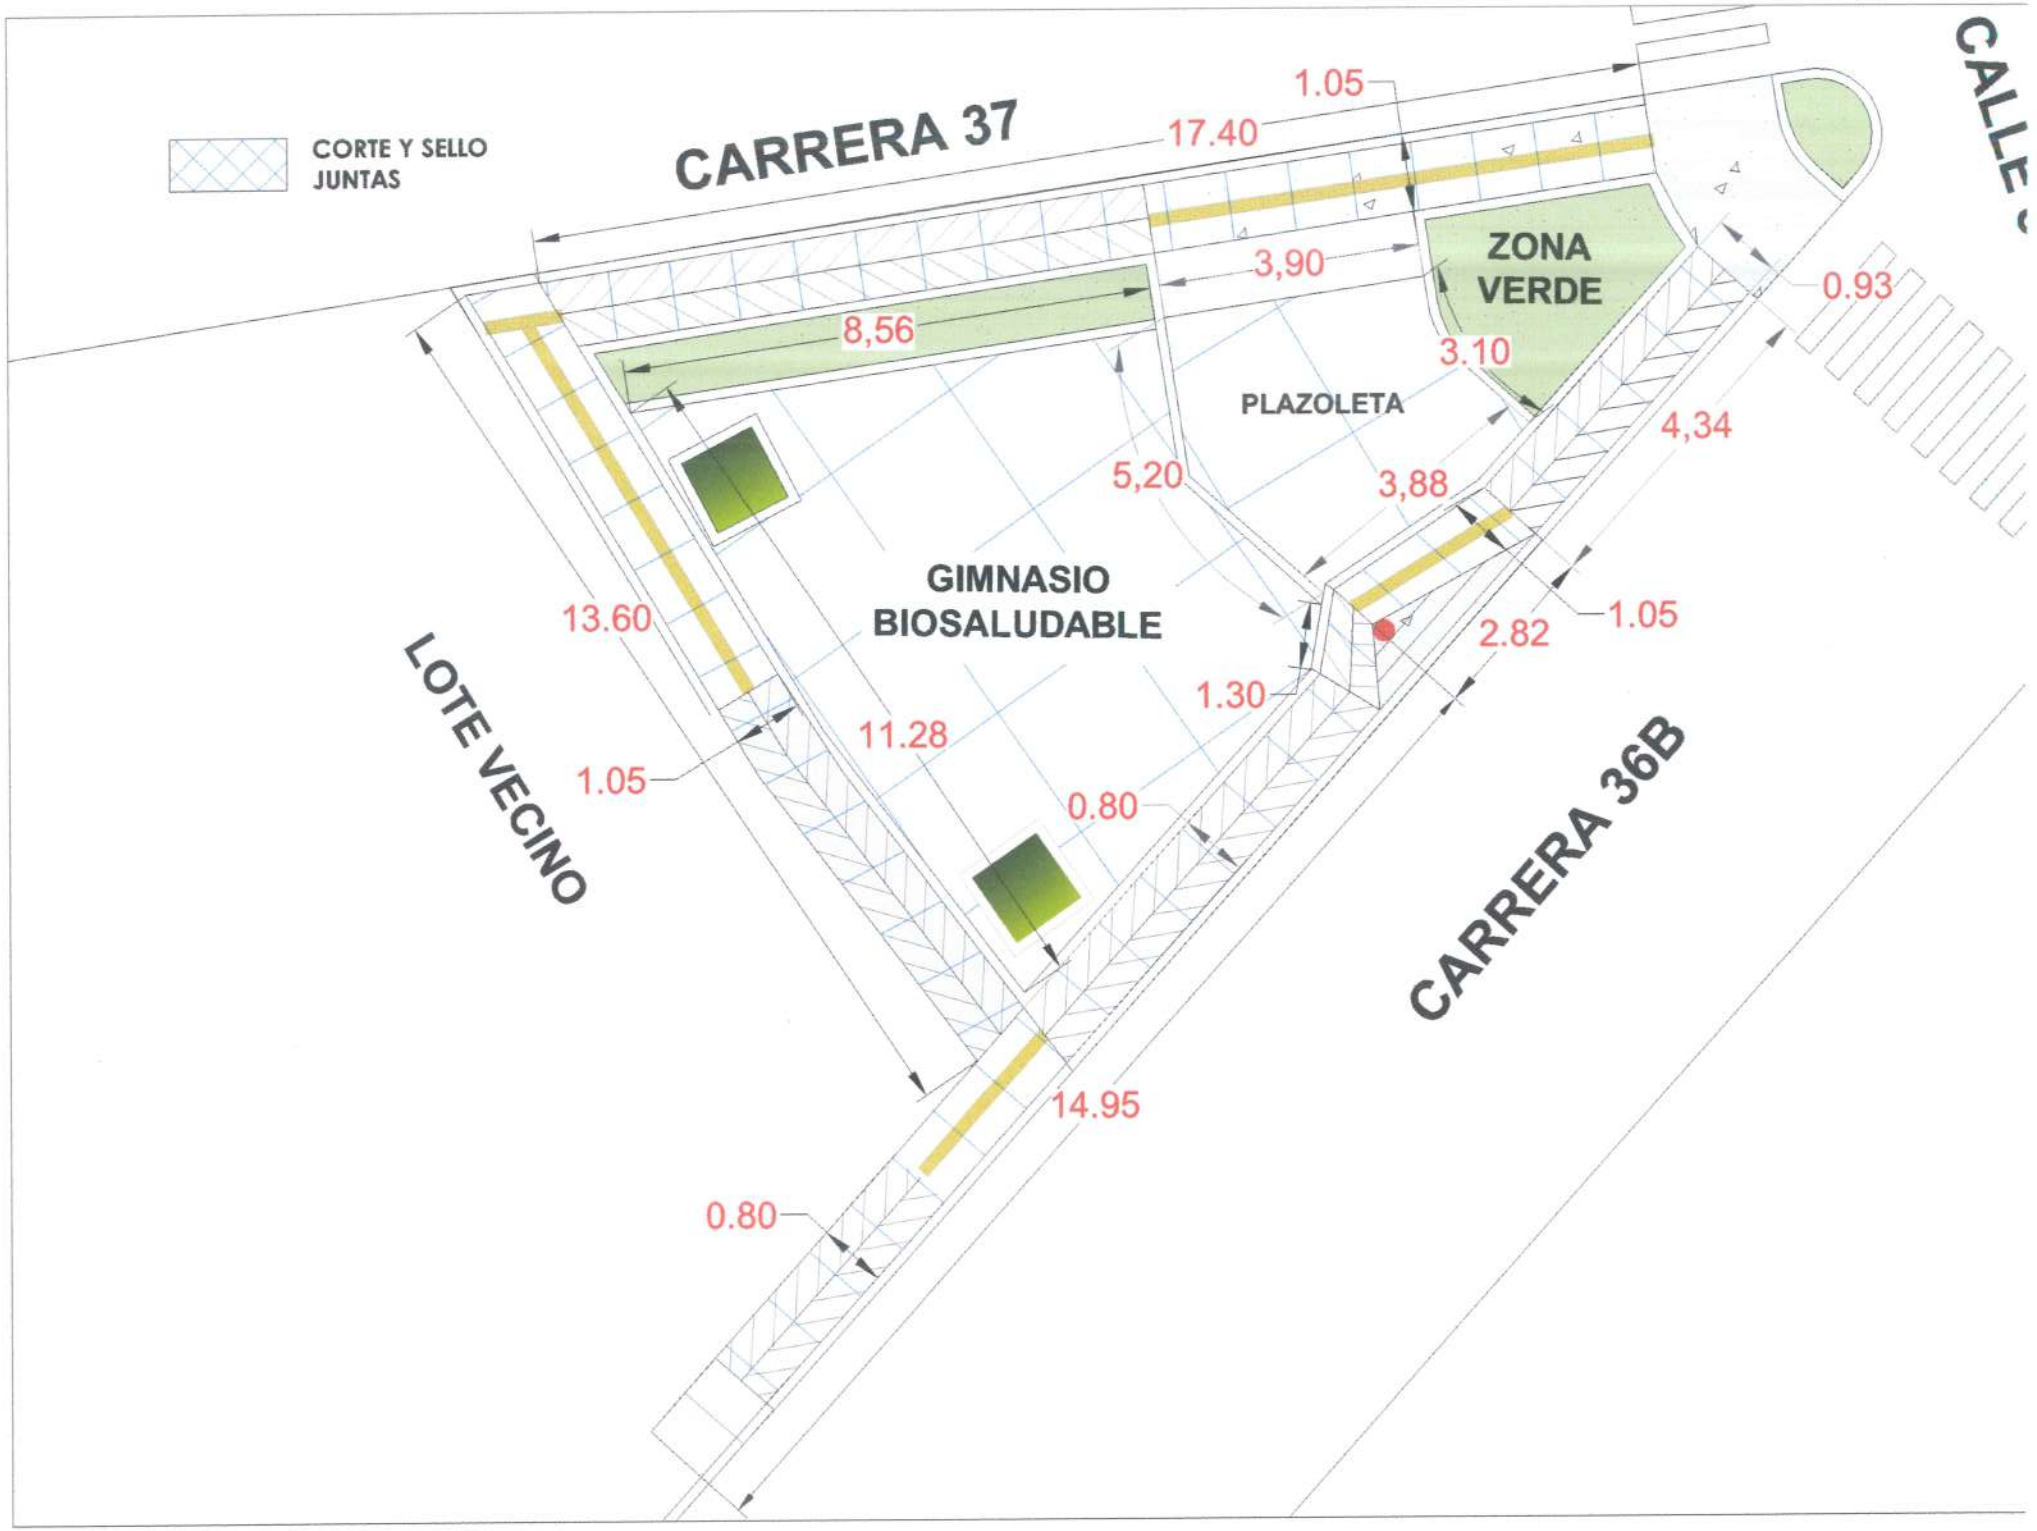
CORTE Y SELLO JUNTAS
CARRERA 37
CALLE
1.05
17.40
3,90
ZONA VERDE
0.93
8,56
3.10
PLAZOLETA
4,34
5,20
3,88
GIMNASIO BIOSALUDABLE
13.60
1.05
2.82
1.30
11.28
1.05
0.80
LOTE VECINO
CARRERA 36B
14.95
0.80

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0018	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESCALERAS Y GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PARQUE EL GUSANITO







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ESCALON - PLAZOLETA 2	6,70	0,21	0,20		1,00			0,28
TOTAL PRESENTE ACTA:								0,28

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2


CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0018	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESCALERAS Y GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	

PARQUE 5 ESTRELLAS









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ESCALERA CARRERA 37	3,90	0,45	0,15		2,00			0,53
ESCALERA CARRERA 36B	3,20	0,30	0,15		1,00			0,14
	2,40	0,30	0,20		0,50			0,07


Cantidad según modificativa 5	11,58
Acumulado anterior	10,56
Acumulado a presente acta	11,58
Obra por ejecutar	0,00


TOTAL PRESENTE ACTA:	0,74

OBSERVACIONES:


RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

NP 0018 - 5 ESTRELLAS (2)

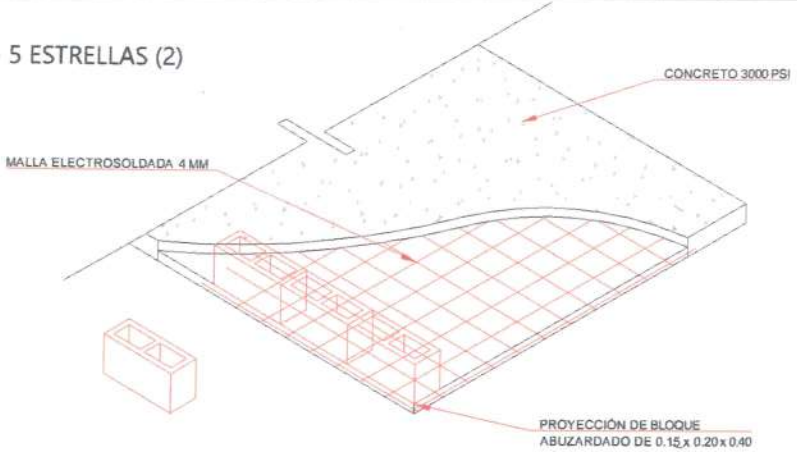


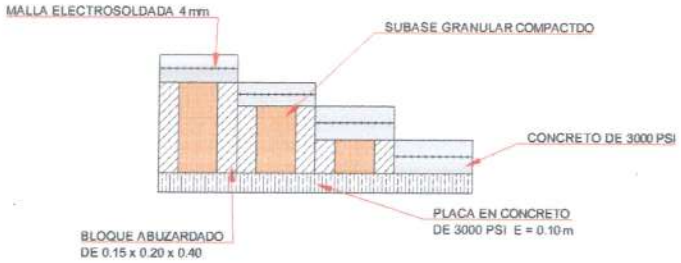

ESCALERA CARRERA 37

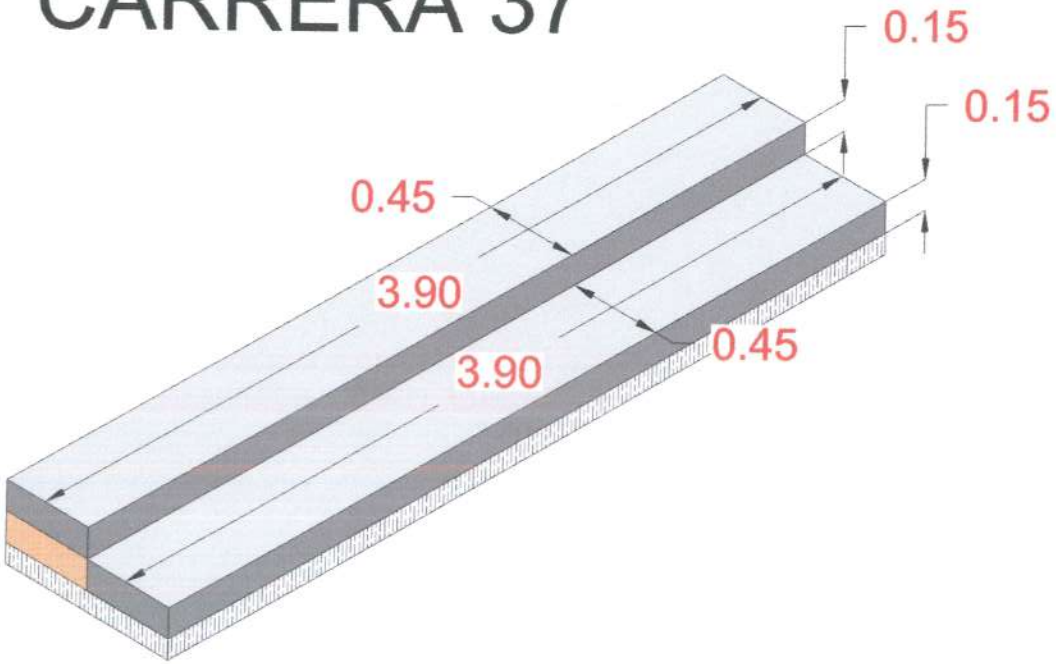

ESCALERA CARRERA 36B

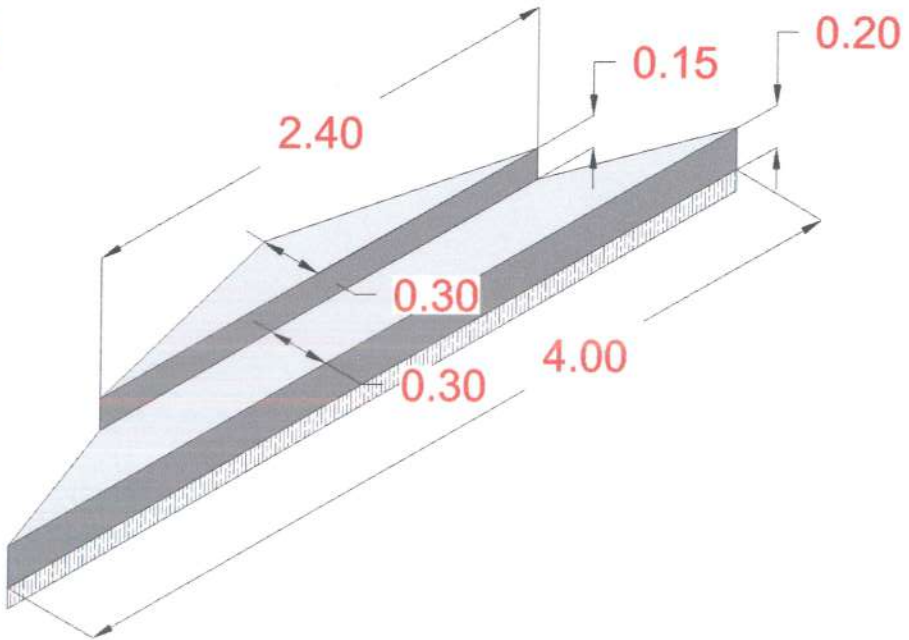

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0025	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO SINTETICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM TIPO TPV (TERMOPLASTICO VULCANIZADO)(10)

PARQUE EL GUSANITO



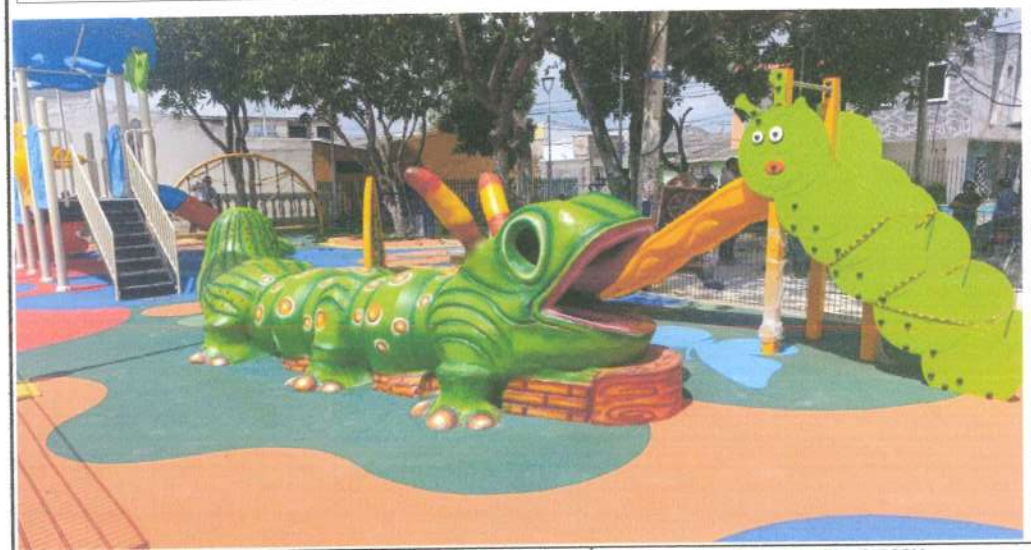

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
JUEGOS INFANTILES								
AREA 1	18.10	6.32			1.00		114.39	
AREA 2	2.08	10.83			1.00		22.53	
AREA 3	2.08	1.71			0.50		1.78	
DESCUENTO JARDINERAS								
JARDINERA VIGA - 1	1.10	1.40			-1.00		-1.54	
JARDINERA VIGA - 2	1.93	1.10			-1.00		-2.12	
JARDINERA BLOQUE - 1	1.65	2.07			-1.00		-3.42	

Cantidad según modificativa 5	771.44
Acumulado anterior	639.82
Acumulado a presente acta	771.44
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	131.62

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

8. CERTIFICADOS DE LABORATORIO

PISO DE CAUCHO.

Test Report

No.SDHL2207013169H Date: Aug 05, 2022

FOSHAN LX COMMERCIAL CO.,LTD
ROOM 2406,BLOCK 4,POLY DONGRUI PLAZA,LECONG COMMUNITY,FOHSAN NEWTOWN,SHUNDE DISTRICT,GUANGDONG PROVINCE .CHINA

Sample Description : TPV GRANULES SURFACE

Item No. : SF-1

As above test item and its relevant information regarding to the submission are provided and confirmed by the applicant. SGS is not liable to either the test item or its relevant information, in terms of the accuracy, suitability, reliability or/and integrity accordingly.

****

SGS Ref No. : CAN22-151008

Sample Receiving Date : Jul 05, 2022

Test Performing Date : Jul 13, 2022 to Aug 04, 2022

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant

Test Result Summary

No.	Test(s) Requested	Result(s)	Comments
1	VOCs	See Results	/
For further details, please refer to the following page(s)			

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shunde Branch

Peter Zhao
Authorized Signatory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention:To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone:(86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F,4 Building,European Industrial Park,No.1 Shunfe South Road,Wusha Section,Daliang Town,Shunde,Foshan,Guangdong,China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 e sgs.china@sgs.com

Test Result(s) :

Test Part Description :

SGS Sample ID	Description
CAN22-151008.001	"Edlantic Safety Surfacing"

Remarks :

(1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

VOCs

Test Method : With reference to ASTM D5116-17.
Testing was performed by Environmental Chamber (1m³), followed by sampling using Tenax-TA and DNPH tube, analysis using Thermodesorption System with Gas Chromatography Mass Spectrometry (TDS-GC/MS) and High Performance Liquid Chromatography-DAD (HPLC-DAD).

Test Item(s)	Unit	001
Test Condition		
Chamber Volume	m^3	0.06
Testing Temperature	℃	24.4
Testing Humidity	RH%	49.4
Air Exchange Rate	1/h	0.5
Sample loading	m^2/m^3	0.4
Tenax Sampling Flow	mL/min	200
Tenax Sampling Time	min	25
Tenax Sampling Volume	L	5
DNPH Sampling Flow	mL/min	300
DNPH Sampling Time	min	60
DNPH Sampling Volume	L	18
MDL	$\mu g/(m^2 \cdot h)$	2.5

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shunde Branch Hardware

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention:To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone:(86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
1/F, 3rd Building, European Industrial Park, No.1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 e sgs.china@sgs.com


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0028	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE CINTURA

PARQUE EL 5 Y 6

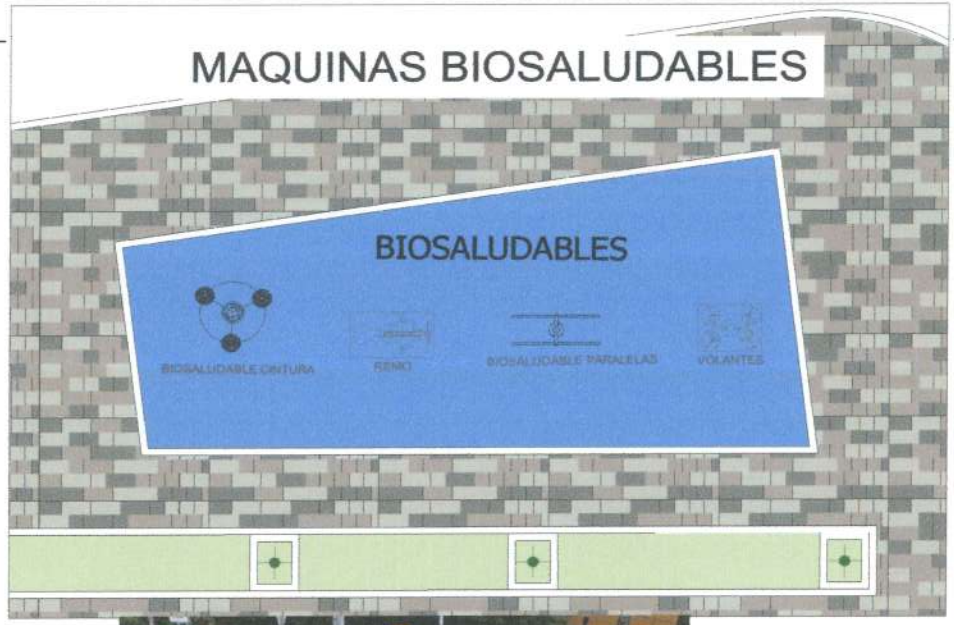



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BIOSALUDABLE CINTURA					1,00			
TOTAL PRESENTE ACTA:								**1,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


Test Item(s)	CAS NO.	Unit	*001*
		-	7th day
VOCs			
Benzene	71-43-2	μg/(m²·h)	ND
Toluene	108-88-3	μg/(m²·h)	ND
Ethylbenzene	100-41-4	μg/(m²·h)	ND
m/p-Xylene	108-38-3/106-42-3	μg/(m²·h)	ND
o-Xylene	95-47-6	μg/(m²·h)	ND
Styrene	100-42-5	μg/(m²·h)	ND
TVOC		μg/(m²·h)	23.0

Test Item(s)	CAS NO.	Unit	*001*
		-	7th day
Carbonyl Compounds			
Formaldehyde	50-00-0	μg/(m²·h)	ND
Acetaldehyde	75-07-0	μg/(m²·h)	ND

Notes :

μg/(m²·h) = micrograms per square metre and hour

Photo Appendix:

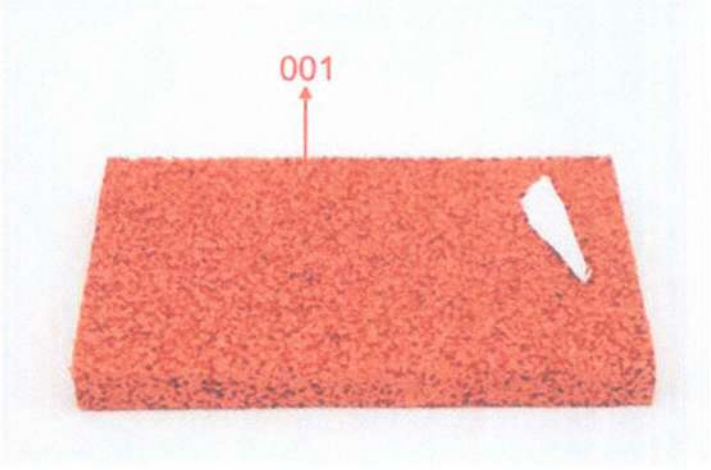

Remark: This test was subcontracted to SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch.

End of Report

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
1/F, 1st Building, European Industrial Park, No.1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 e sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0028	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE CINTURA	

PARQUE LOS TRUPILLOS

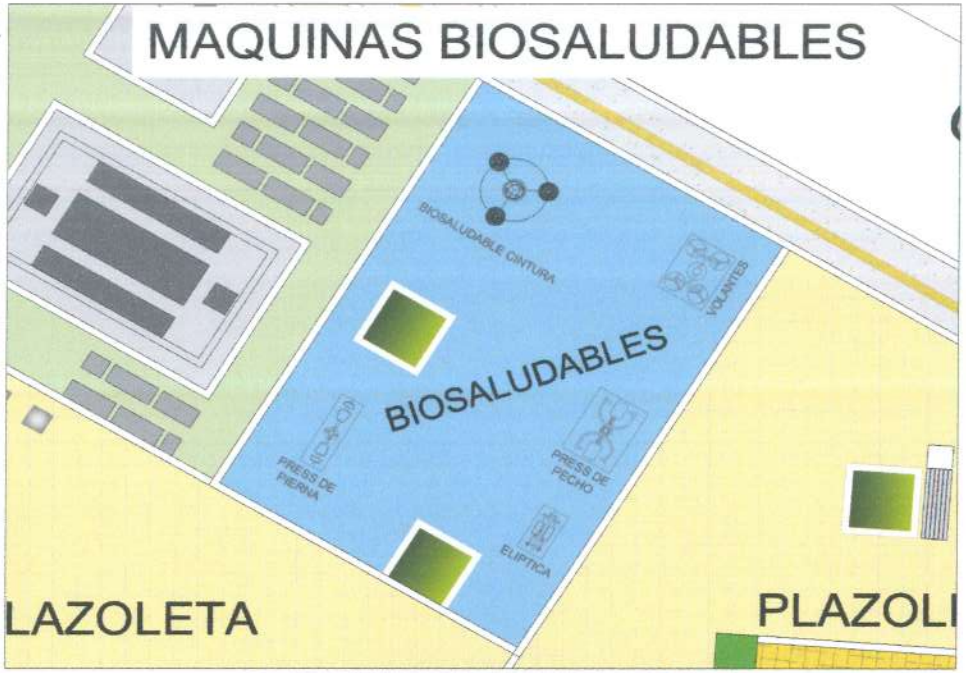



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BIOSALUDABLE CABALLO/ASCENSOR					1,00			

Cantidad según modificativa 5	5,00
Acumulado anterior	3,00
Acumulado a presente acta	5,00
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0030	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

PARQUE EL GUSANITO









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BANCAS PREFABRICADAS					3,00			

Cantidad según modificativa 5	11,00
Acumulado anterior	8,00
Acumulado a presente acta	11,00
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	3,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0031	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

PARQUE EL GUSANITO













LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CUBOS EN CONCRETO					12.00			
TOTAL PRESENTE ACTA:								12.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0031	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

PARQUE 5 ESTRELLAS







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CUBOS EN CONCRETO					4.00			

Cantidad según modificativa 5	47.00
Acumulado anterior	31.00
Acumulado a presente acta	47.00
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	4.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0033	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y PORTONES EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER

PARQUE EL GUSANITO

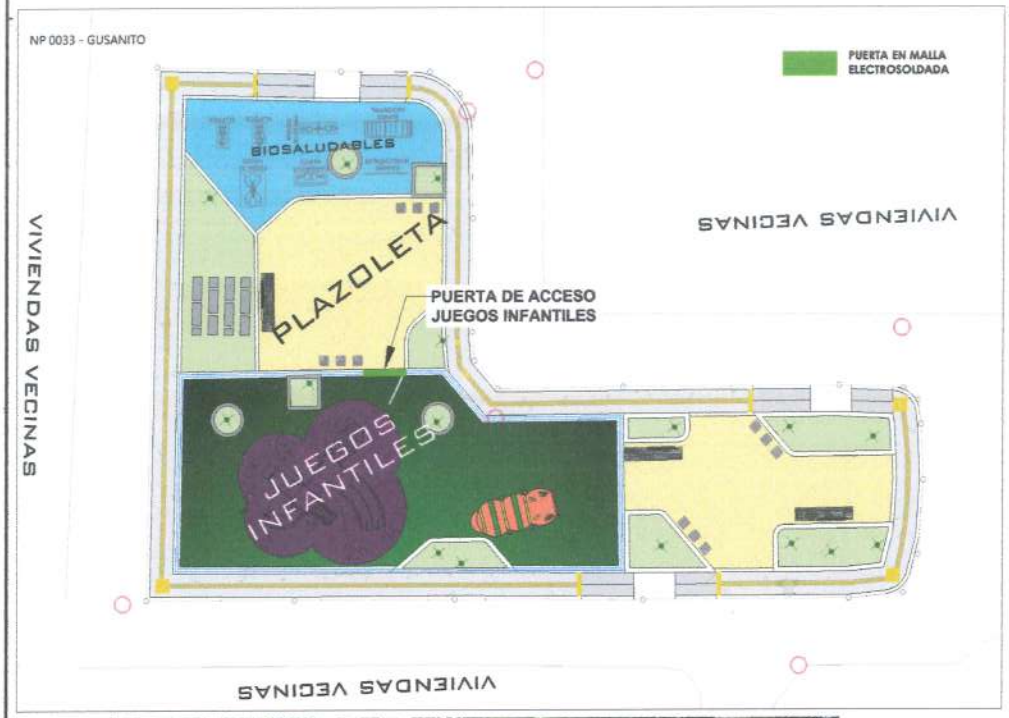



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
PUERTA JUEGOS INFANTILES	1.00	1.50			1.00		1.50	

Cantidad según modificativa 5	27.60
Acumulado anterior	26.10
Acumulado a presente acta	27.60
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 1.50

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0035	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL BAJO AGUA

PARQUE VILLA DEL CARMEN












LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
EXCAVACION PARQUE					1.00			736.00

Cantidad según modificativa 5	1202.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	736.00
Obra por ejecutar	466.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 736.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0041	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	

PARQUE EL GUSANITO

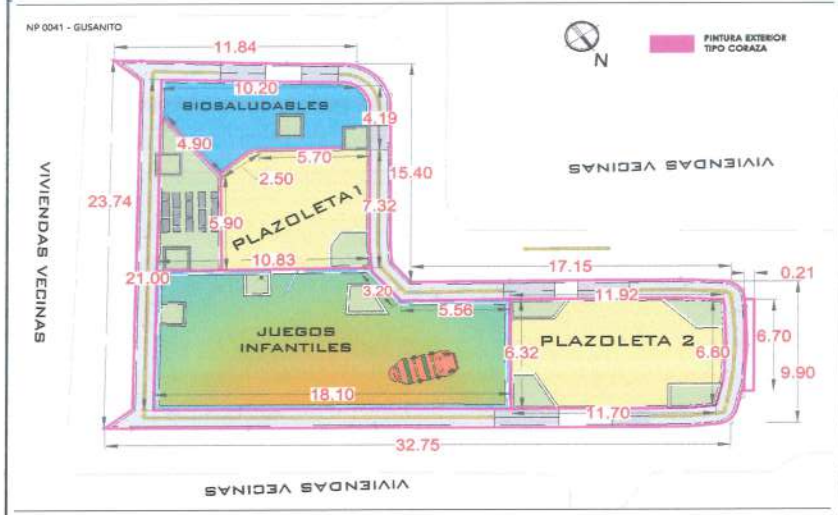




RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
BORDILLOS								
ANDENES - BORDILLO EXTERNO	32,75				2,00	65,50		
	9,90				2,00	19,80		
	15,40				2,00	30,80		
	17,15				2,00	34,30		
	11,84				2,00	23,68		
ANDENES - BORDILLO INTERNO	21,00				1,00	21,00		
	23,74				1,00	23,74		
VIGAS								
BIOSALUDABLES - VIGA INTERNA	10,20				1,00	10,20		
	4,19				1,00	4,19		
	4,90				1,00	4,90		
PLAZOLETA 1 - VIGA INTERNA	5,70				1,00	5,70		
	7,32				1,00	7,32		
	5,90				1,00	5,90		
	2,50				1,00	2,50		
JUEGOS INFANTILES - VIGA INTERNA	10,83				1,00	10,83		
	3,20				1,00	3,20		
	5,56				1,00	5,56		
	6,32				1,00	6,32		
	18,10				1,00	18,10		
PLAZOLETA 2 - VIGA INTERNA	11,92				1,00	11,92		
	6,60				1,00	6,60		
	11,70				1,00	11,70		
ESCALON - PLAZOLETA 2	6,70				2,00	13,40		
	0,21				2,00	0,42		
JARDINERAS - VIGAS								
JARDINERA VIGA - 1	1,40				2,00	2,80		
	1,10				2,00	2,20		
JARDINERA VIGA - 2	1,93				1,00	1,93		
	1,10				1,00	1,10		
JARDINERA VIGA - 3	1,12				1,00	1,12		
	1,08				2,00	2,16		
JARDINERA VIGA - 4	1,10				2,00	2,20		
	1,40				2,00	2,80		
JARDINERA VIGA - 5	0,90				2,00	1,80		
	1,28				1,00	1,28		
JARDINERA VIGA - 6	1,38				1,00	1,38		
	0,92				2,00	1,84		
JARDINERA VIGA - 7	1,50				1,00	1,50		
	2,73				1,00	2,73		
JARDINERAS - ALFAJIAS								
JARDINERA BLOQUE - 1	1,10				2,00	2,20		
	2,01				2,00	4,02		
	2,31				2,00	4,62		
	2,25				2,00	4,50		
JARDINERA BLOQUE - 2	1,56				2,00	3,12		
	2,47				2,00	4,94		
	1,31				2,00	2,62		
	3,36				2,00	6,72		
JARDINERA BLOQUE - 3	2,32				2,00	4,64		
	1,34				2,00	2,68		
	2,66				2,00	5,32		
	2,73				2,00	5,46		
JARDINERA BLOQUE - 4	3,06				2,00	6,12		
	1,61				2,00	3,22		
	3,52				2,00	7,04		
	2,16				2,00	4,32		
JARDINERA BLOQUE - 5	3,06				2,00	6,12		
	1,57				2,00	3,14		
	1,49				2,00	2,98		
	3,10				2,00	6,20		
TOTAL PRESENTE ACTA:						**464,40**		

OBSERVACIONES:

NP 0041 - GUSANITO

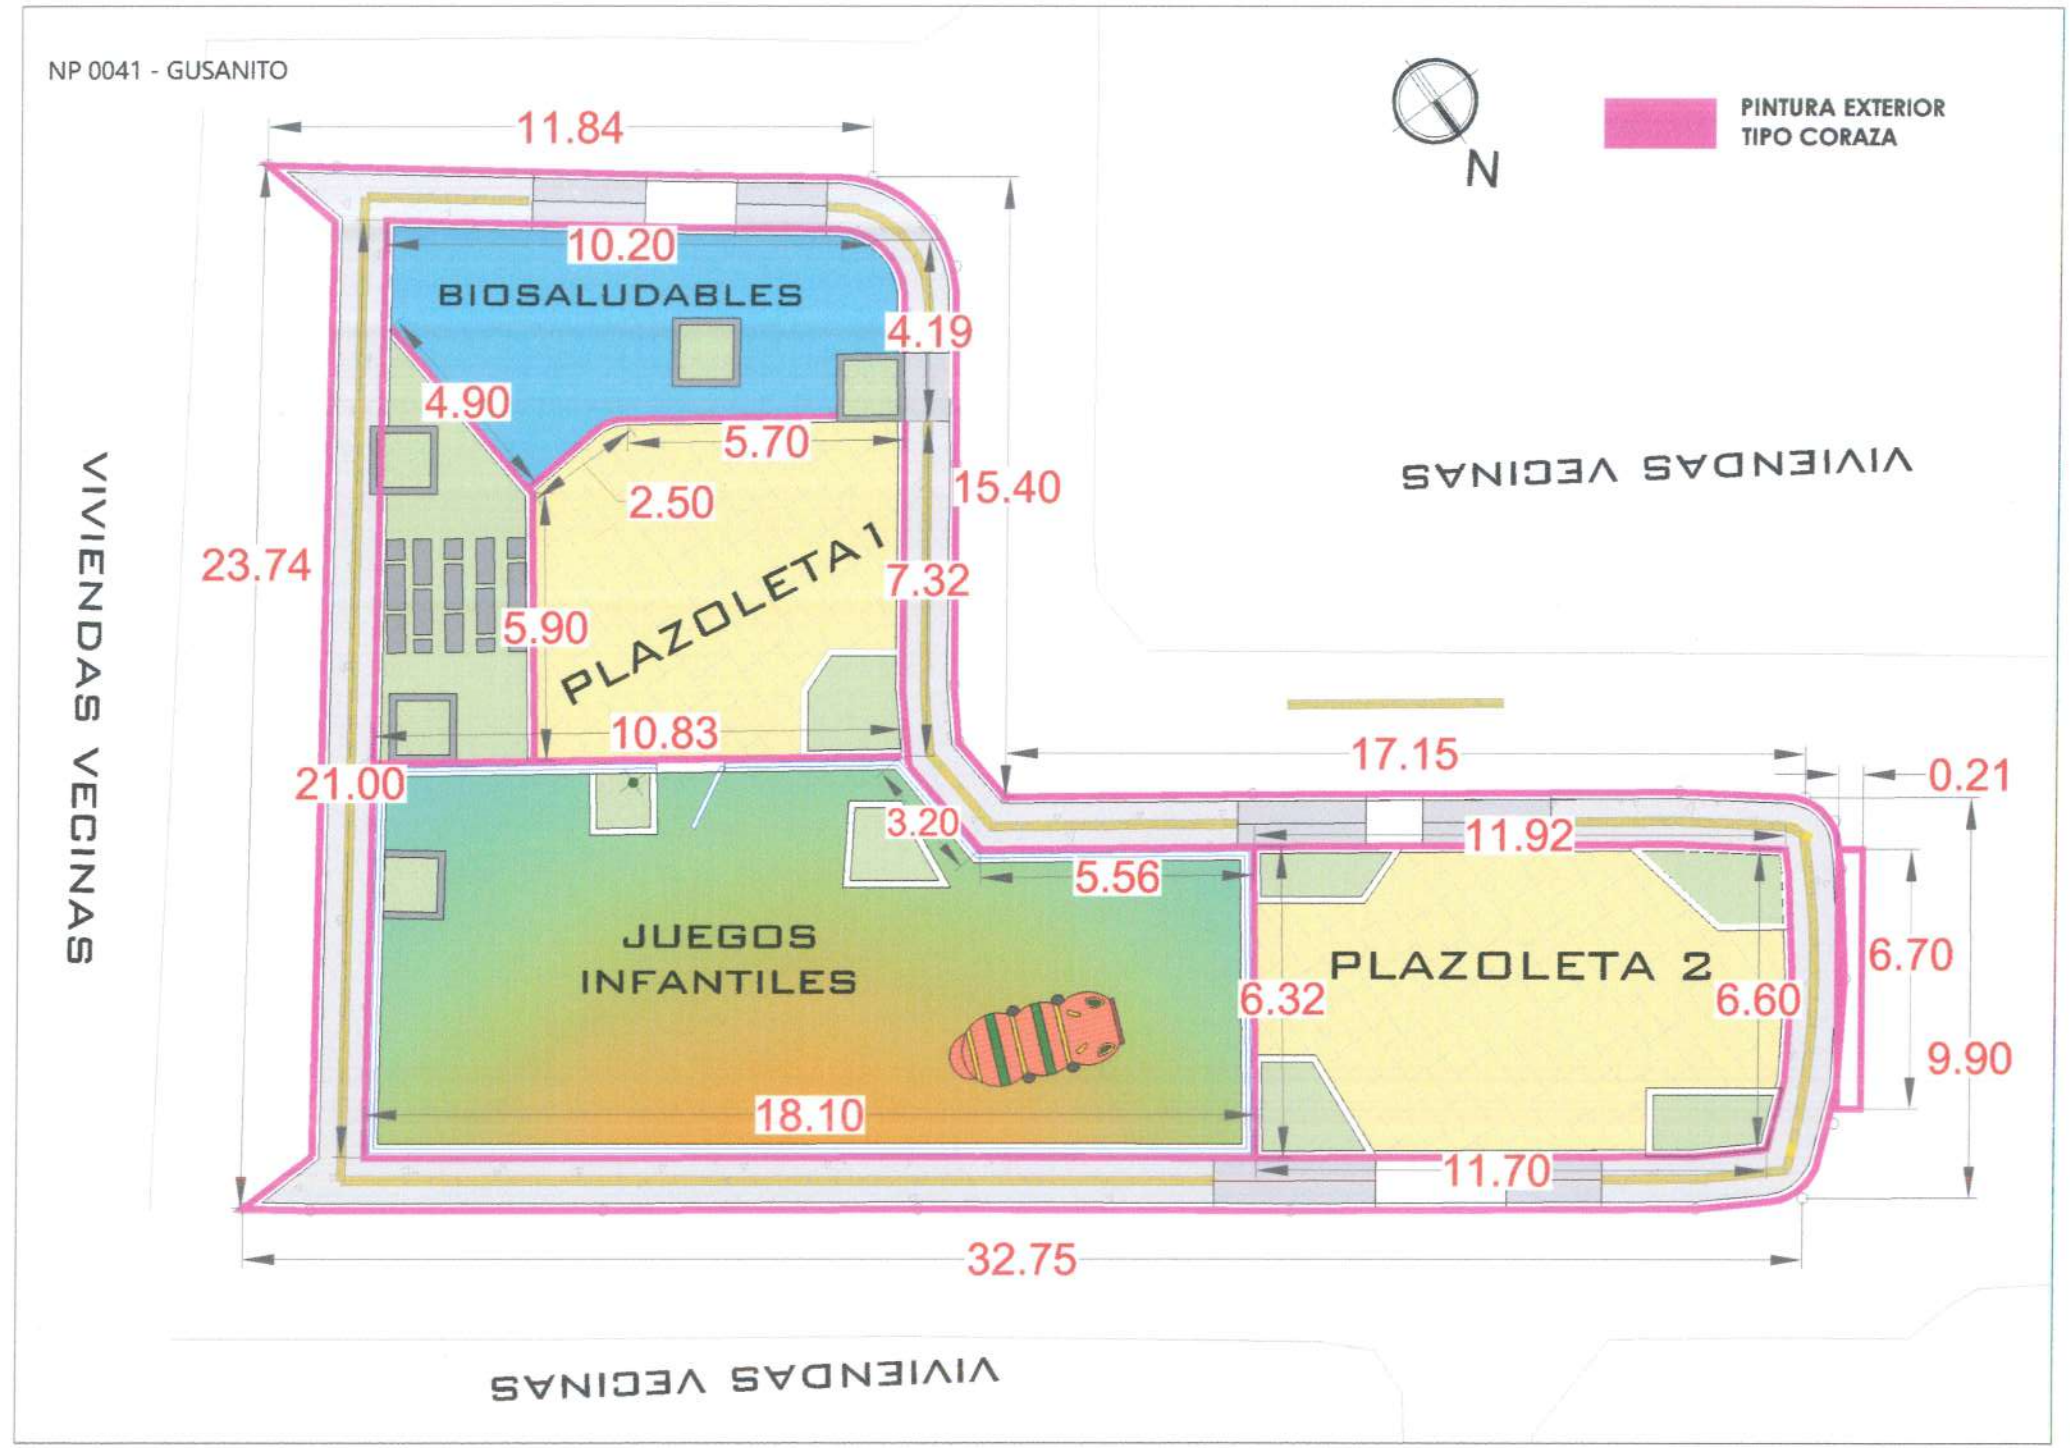

NP 0041 - GUSANITO (2)

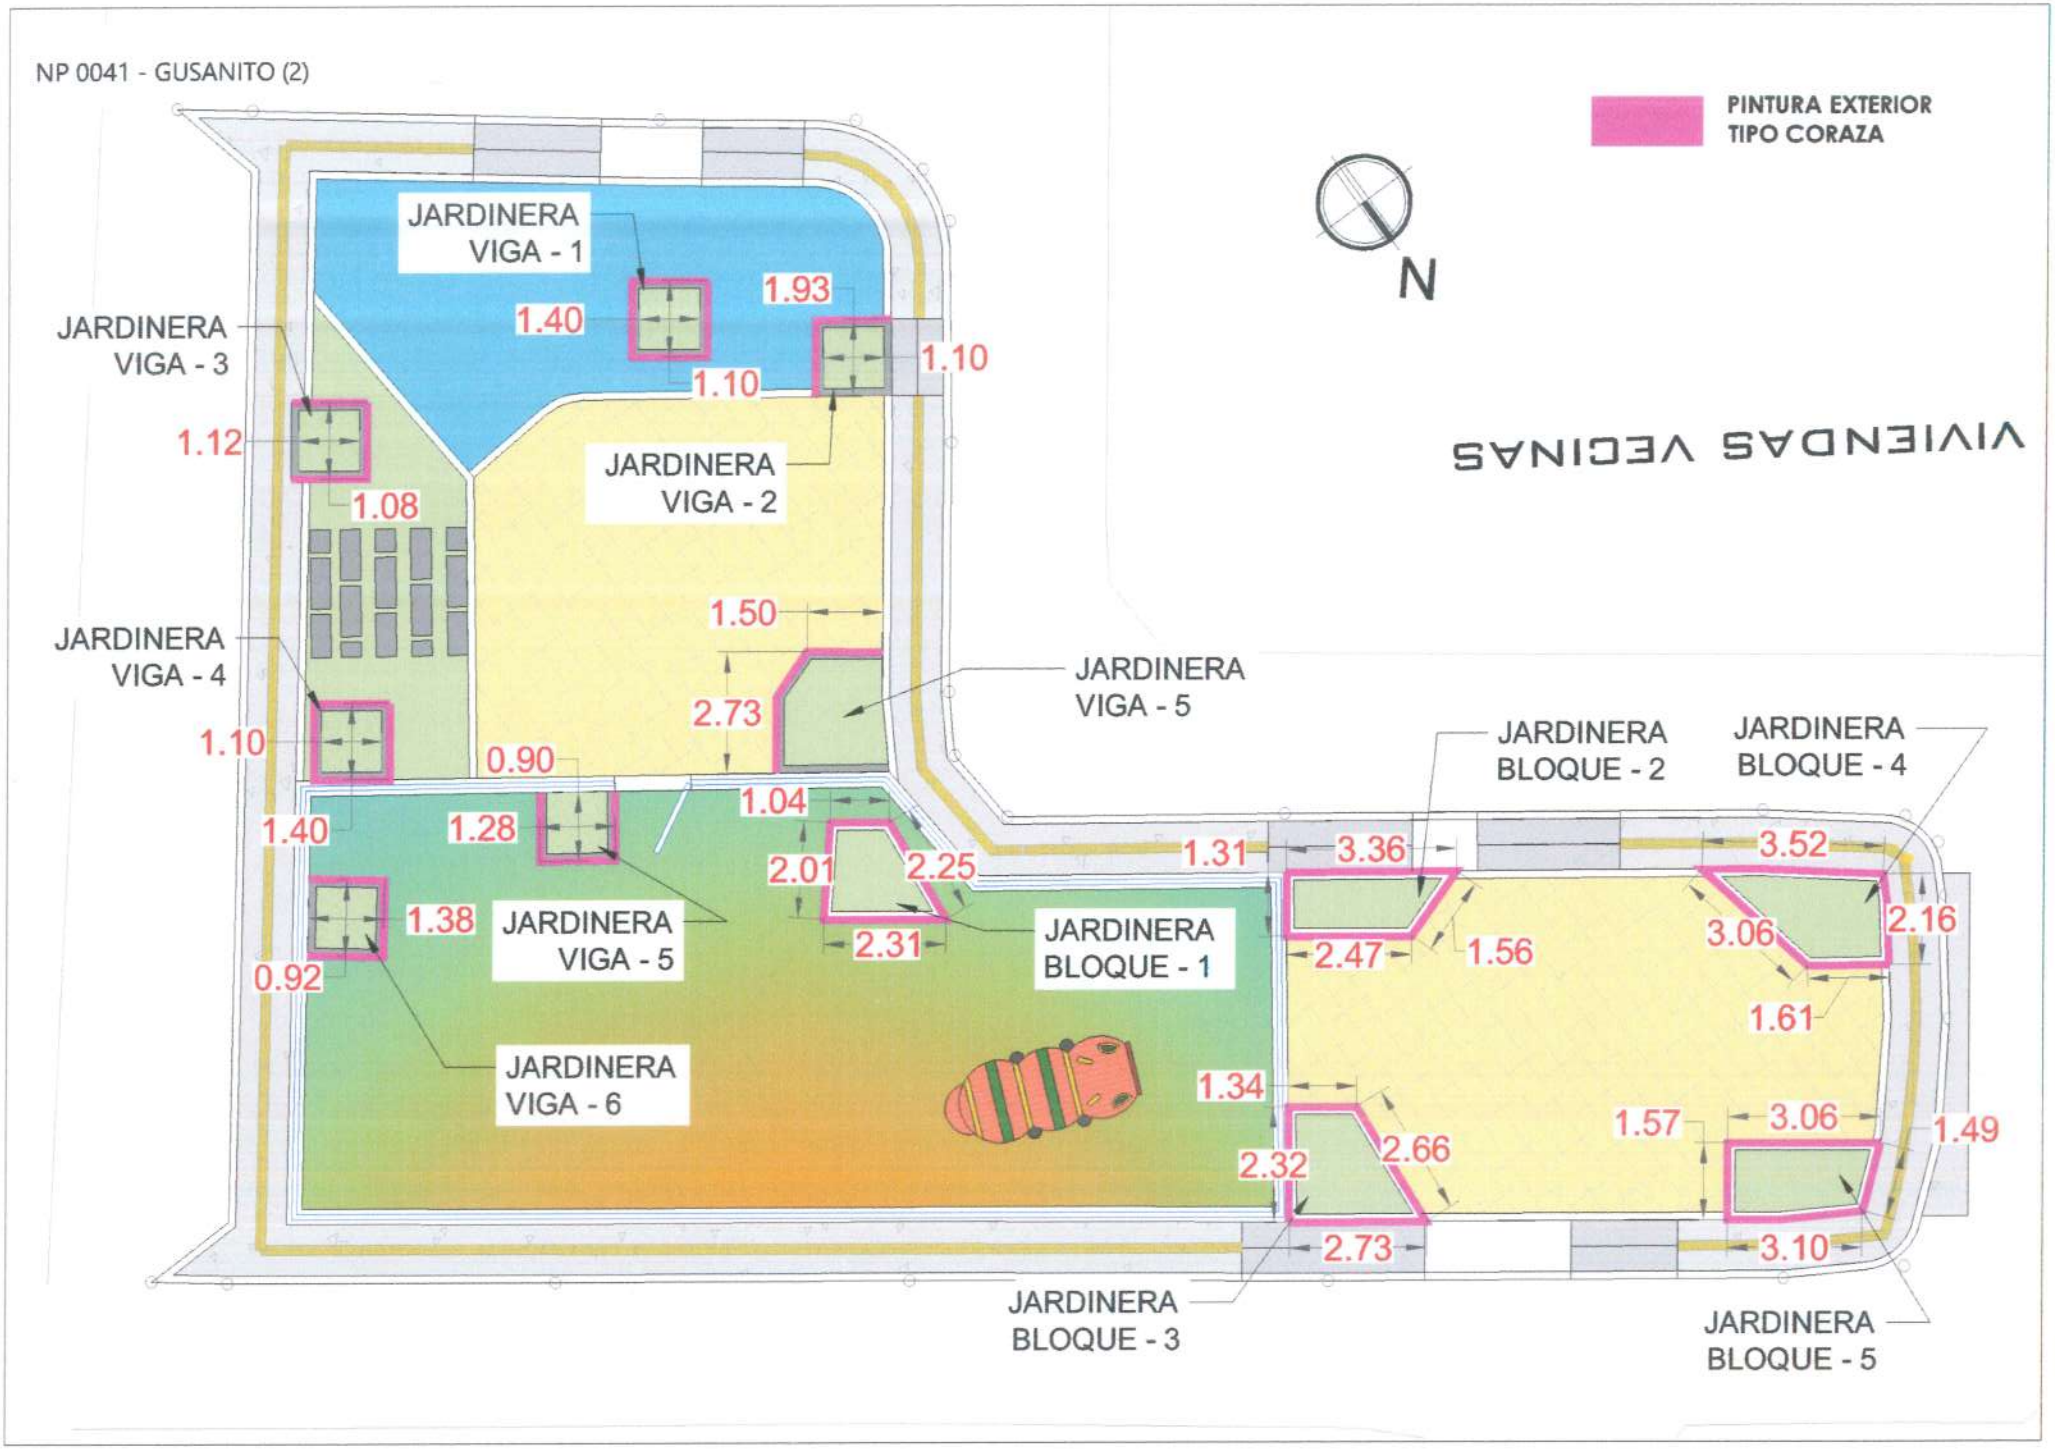

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0041	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS

PARQUE 5 ESTRELLAS





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BORDILLOS								
BORDILLO CARRERA 37	19,80				2,00	39,60		
BORDILLO CALLE 84B	5,54				2,00	11,08		
BORDILLO CARRERA 36B	22,11				2,00	44,22		
VIGAS								
BIOSALUDABLES	12,20				1,00	12,20		
	6,65				1,00	6,65		
	1,30				1,00	1,30		
	5,20				1,00	5,20		
	8,56				1,00	8,56		
JARDINERA 1 - BIOSALUDABLES	0,90				2,00	1,80		
	1,20				2,00	2,40		
JARDINERA 2 - BIOSALUDABLES	0,90				2,00	1,80		
	1,20				2,00	2,40		
PLAZOLETA	4,07				1,00	4,07		
	3,88				1,00	3,88		
ZONA VERDE	1,10				1,00	1,10		
	3,28				1,00	3,28		
	2,96				1,00	2,96		
ANDENES								
ANDEN CARRERA 37	16,80				1,00	16,80		
ANDEN CARRERA 36B	4,12				1,00	4,12		
	0,80				3,00	2,40		
ESCALERAS								
ESCALERA CARRERA 37	3,90				4,00	15,60		
ESCALERA CARRERA 36B	3,20				2,00	6,40		
	2,40				1,00	2,40		
COLUMNAS								
BIOSALUDABLES	0,41				11,00	4,51		

Cantidad según modificativa 5	3976,00
Acumulado anterior	3291,13
Acumulado a presente acta	3960,26
Obra por ejecutar	15,74

TOTAL PRESENTE ACTA:	204,73

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


PINTURA EXTERIOR
TIPO CORAZA
CARRERA 37
CALLE 84B
CARRERA 36B
LOTE VECINO
19,80
16,80
1,10
5,54
2.96
ZONA
VERDE
3,90
8,56
4.07
3.28
PLAZOLETA
0,90
1.20
5,20
3.88
2.82
GIMNASIO
BIOSALUDABLE
1.30
13,60
1.20
0.90
12,20
6.65
22.11
0,80

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0047	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES

PARQUE EL GUSANITO












LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
JARDINERAS								
JARDINERA BLOQUE - 1	1,04		0,31		2,00	0,62		
	1,95		0,31		3,00	0,93		
	2,25		0,31		4,00	1,24		
	2,19		0,31		4,00	1,24		
JARDINERA BLOQUE - 2	1,50		0,52		3,00	1,56		
	2,41		0,52		4,00	2,08		
	1,25		0,52		2,00	1,04		
	3,30		0,52		6,00	3,12		
JARDINERA BLOQUE - 3	2,26		0,52		4,00	2,08		
	1,28		0,52		2,00	1,04		
	2,60		0,52		4,00	2,08		
	2,67		0,52		4,00	2,08		
JARDINERA BLOQUE - 4	3,00		0,52		5,00	2,60		
	1,55		0,52		3,00	1,56		
	3,46		0,52		6,00	3,12		
	2,10		0,52		4,00	2,08		
JARDINERA BLOQUE - 5	3,00		0,52		5,00	2,60		
	1,51		0,52		3,00	1,56		
	1,43		0,52		2,00	1,04		
	3,04		0,52		5,00	2,60		
TOTAL PRESENTE ACTA:						**36,27**		

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

NP 0047 - GUSANITO

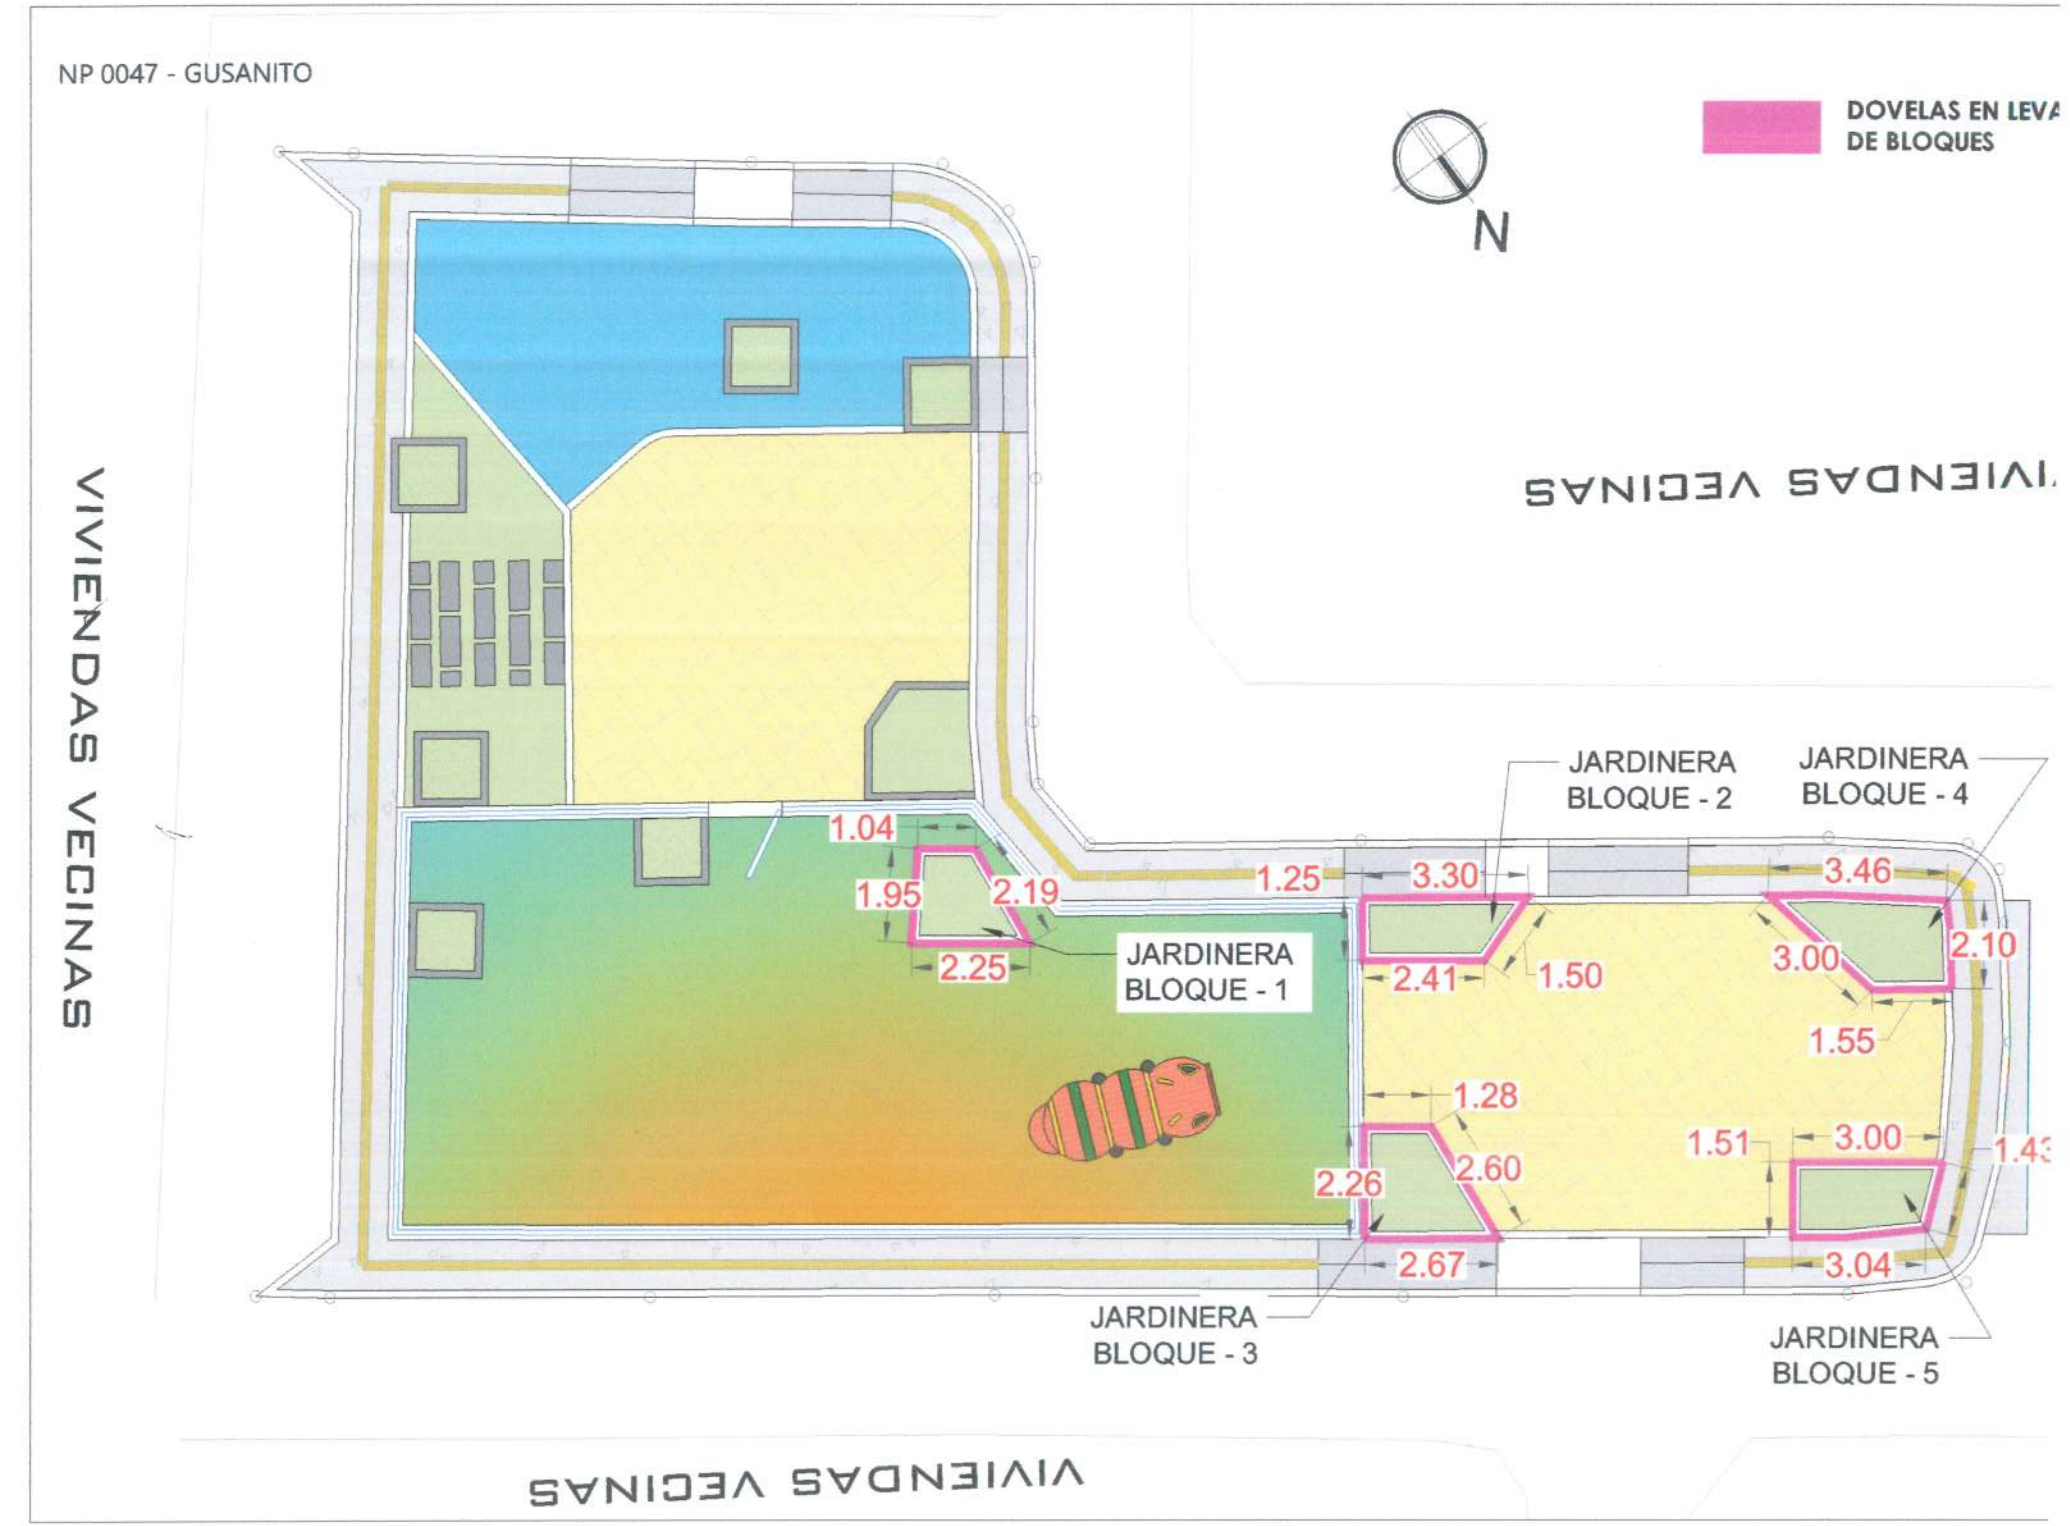

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0047	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES

PARQUE 5 ESTRELLAS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
MURO								
BIOSALUDABLES	5,10		0,88		9,00	7,92		
	6,65		0,88		11,00	9,68		
	1,30		0,88		2,00	1,76		
ANDEN CARRERA 36B	9,92		0,36		17,00	6,12		
	0,85		0,36		1,00	0,36		

Cantidad según modificativa 5	1915,76
Acumulado anterior	1473,75
Acumulado a presente acta	1535,86
Obra por ejecutar	379,90

TOTAL PRESENTE ACTA:	25,84

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0048	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PLASTICO COMO PROTECCION DE HUMEDAD EN LOSA DE CONCRETO

PARQUE EL GUSANITO

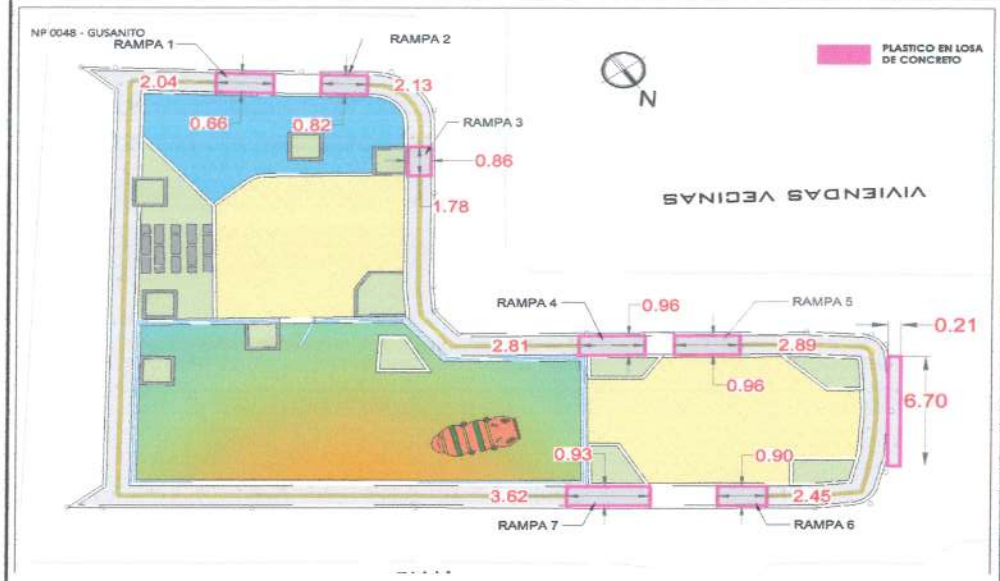



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
RAMPAS								
RAMPA 1	2,04	0,66			1,00		1,35	
RAMPA 2	2,13	0,82			1,00		1,75	
RAMPA 3	1,78	0,86			1,00		1,53	
RAMPA 4	2,81	0,96			1,00		2,70	
RAMPA 5	2,89	0,96			1,00		2,77	
RAMPA 6	2,45	0,90			1,00		2,21	
RAMPA 7	3,62	0,93			1,00		3,37	
ESCALON - PLAZOLETA 2	6,70	0,21			1,00		1,41	
TOTAL PRESENTE ACTA:							17,09	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0048	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PLASTICO COMO PROTECCION DE HUMEDAD EN LOSA DE CONCRETO

PARQUE 5 ESTRELLAS





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
RAMPAS								
RAMPA CARRERA 37	9,64	1,05			1,00		10,12	
RAMPAS CARRERA 36B	4,34	0,93			1,00		4,04	
	1,30	0,80			1,00		1,04	
	6,65	0,80			1,00		5,32	
	3,40	0,80			1,00		2,72	
RAMPA VIVIENDAS	5,50	1,05			1,00		5,78	
TOTAL PRESENTE ACTA:							**29,02**	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-30
Versión:	03
Fecha:	8/09/2021
Páginas:	3 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0048	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PLASTICO COMO PROTECCION DE HUMEDAD EN LOSA DE CONCRETO

PARQUE VILLA DEL CARMEN

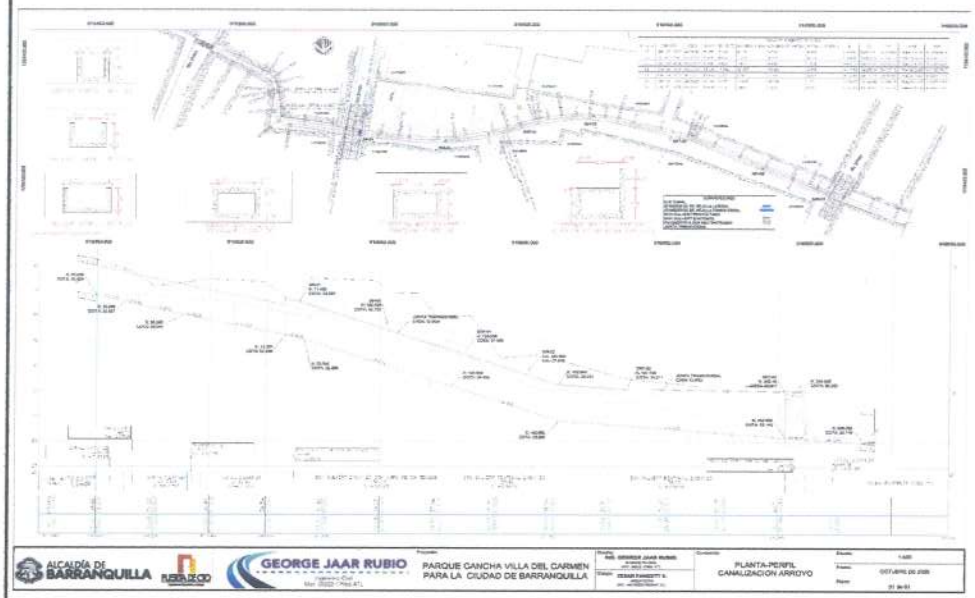

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
BOX PEATONAL								
TRAMO DE K0+70,9-K0+82,9								
LOSA DE FONDO	12,00	2,60			1,00		31,20	
LOSA SUPERIOR	12,00	2,60			1,00		31,20	






Cantidad según modificativa 5	2930,42
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	108,51
Obra por ejecutar	2821,91

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

TOTAL PRESENTE ACTA: 62,40

OBSERVACIONES:

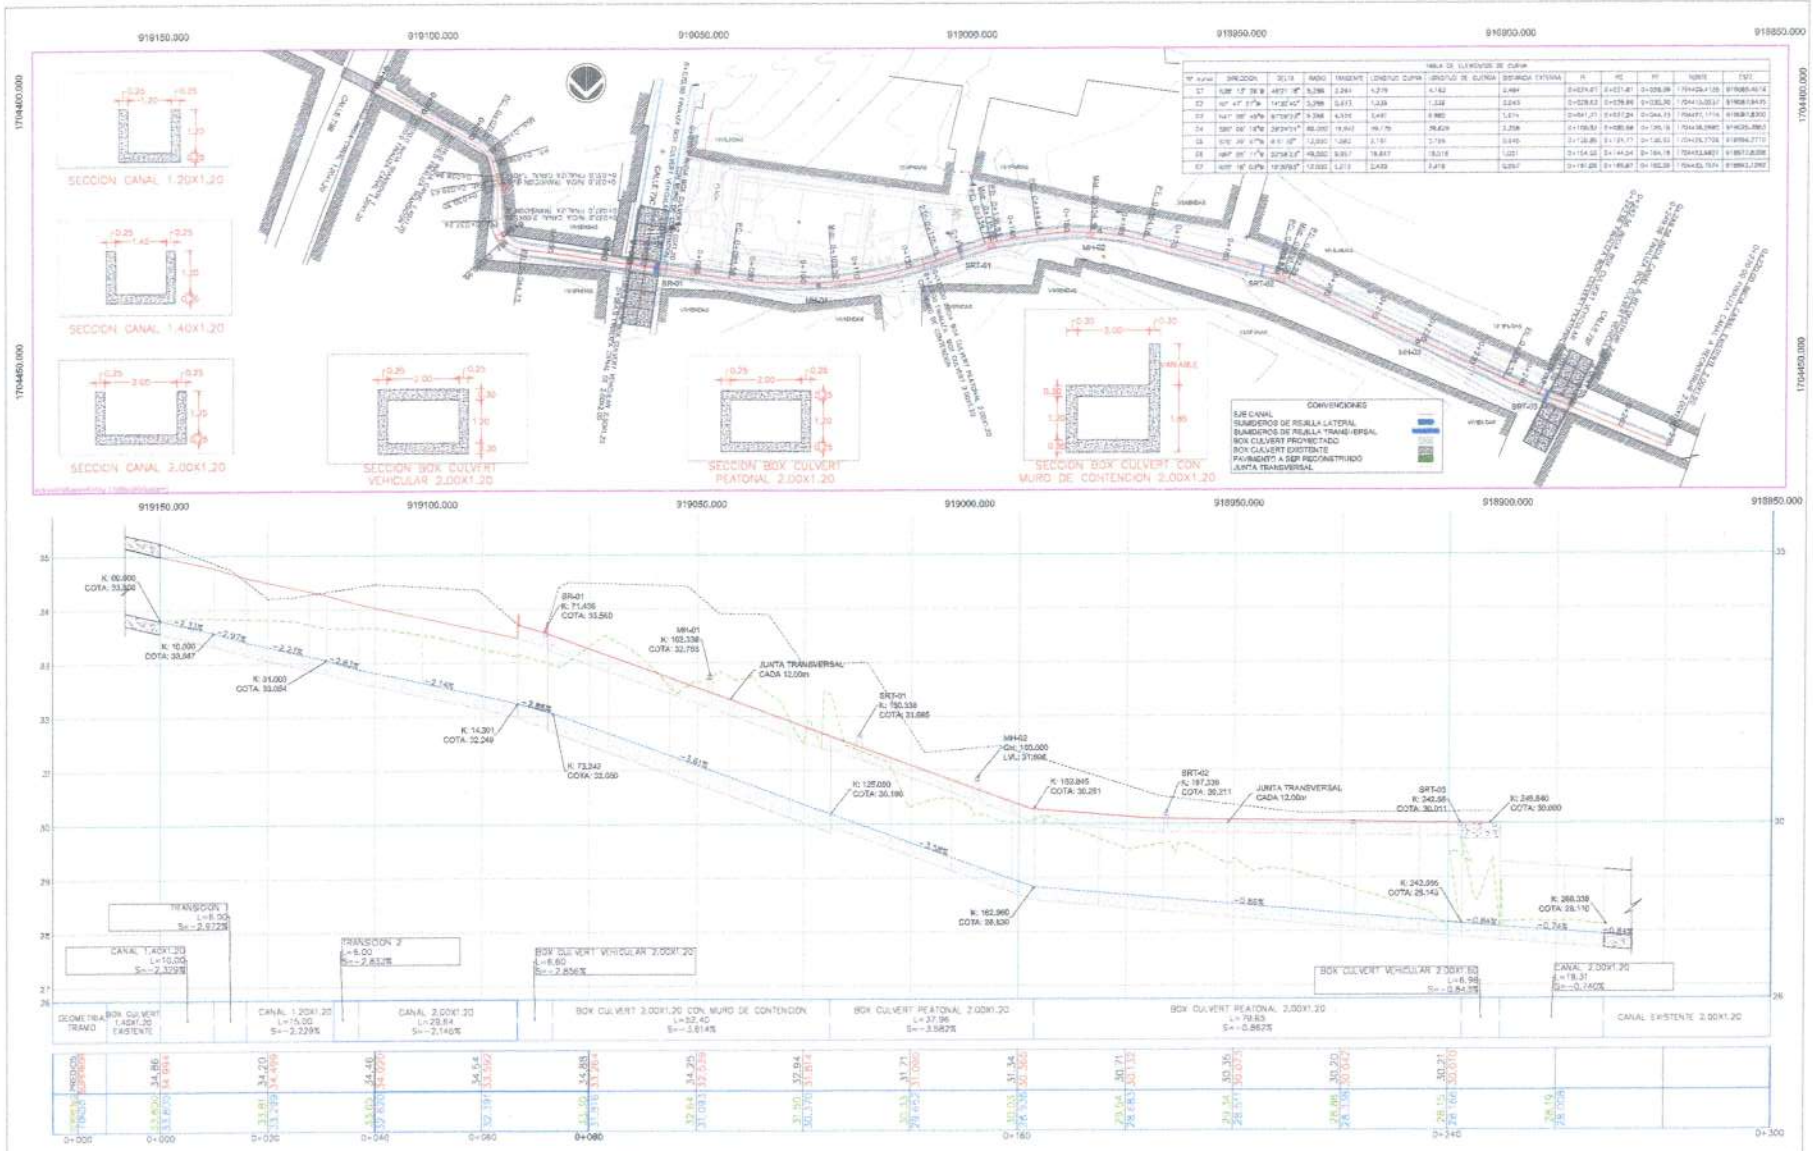

PUERTA DE ORO	GEORGE JAAR RUBIO Ingeniero Civil Mat. 08202-17966 ATL	Proyecto: PARQUE CANCHA VILLA DEL CARMEN PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	Diseñó: ING. GEORGE JAAR RUBIO. INGENIERO CIVIL MAT. 08202-17966 ATL Dibujó: CESAR FAWCETT V. ARQUITECTO MAT. 4401620134566481 ATL
Contenido: PLANTA-PERFIL CANALIZACION ARROYO	Escala: 1:500 Fecha: OCTUBRE DE 2025 Plano: 01 de 01		


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0056	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL - BLANCO O EL COLOR ESTABLECIDO EN LOS DISEÑOS DE 11,8 X 0.,95 MTS UPVC INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION

PARQUE LA PRADERA



DIAGONALES ESQUINEROS




DIAGONALES MEDIO




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CUBIERTA KIOSKO	3,90	8,03			0,50		15,66	
	3,90	7,96			0,50		15,52	
	3,90	8,03			0,50		15,66	
	3,90	7,96			0,50		15,52	
TOTAL PRESENTE ACTA:							62,36	

OBSERVACIONES:


RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA



DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO

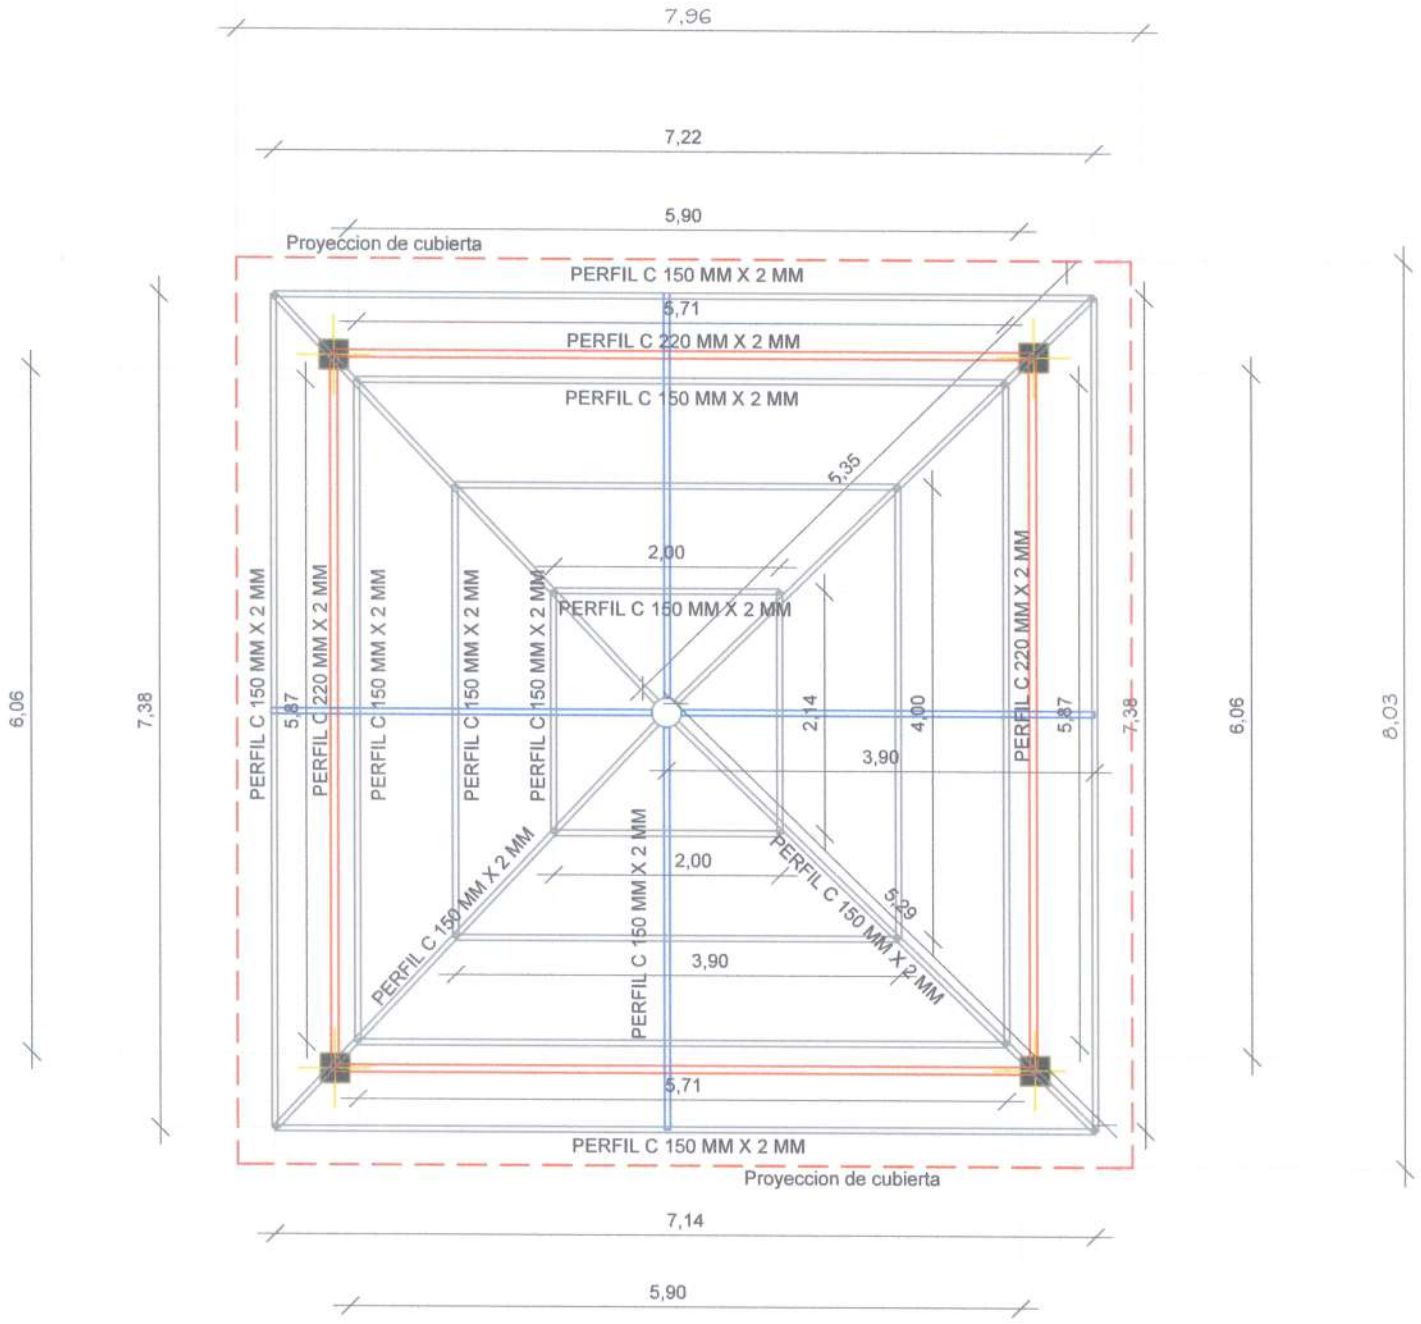

KIOSCO LA PRADERA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0056	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL - BLANCO O EL COLOR ESTABLECIDO EN LOS DISEÑOS DE 11,8 X 0.,95 MTS UPVC INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION

PARQUE JUAN MINA



DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO


LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CUBIERTA KIOSKO	3,85	7,58			0,50		14,59	
	3,85	7,58			0,50		14,59	
	3,85	7,58			0,50		14,59	
	3,85	7,58			0,50		14,59	
TOTAL PRESENTE ACTA:							58,36	






OBSERVACIONES:


RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA




DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO



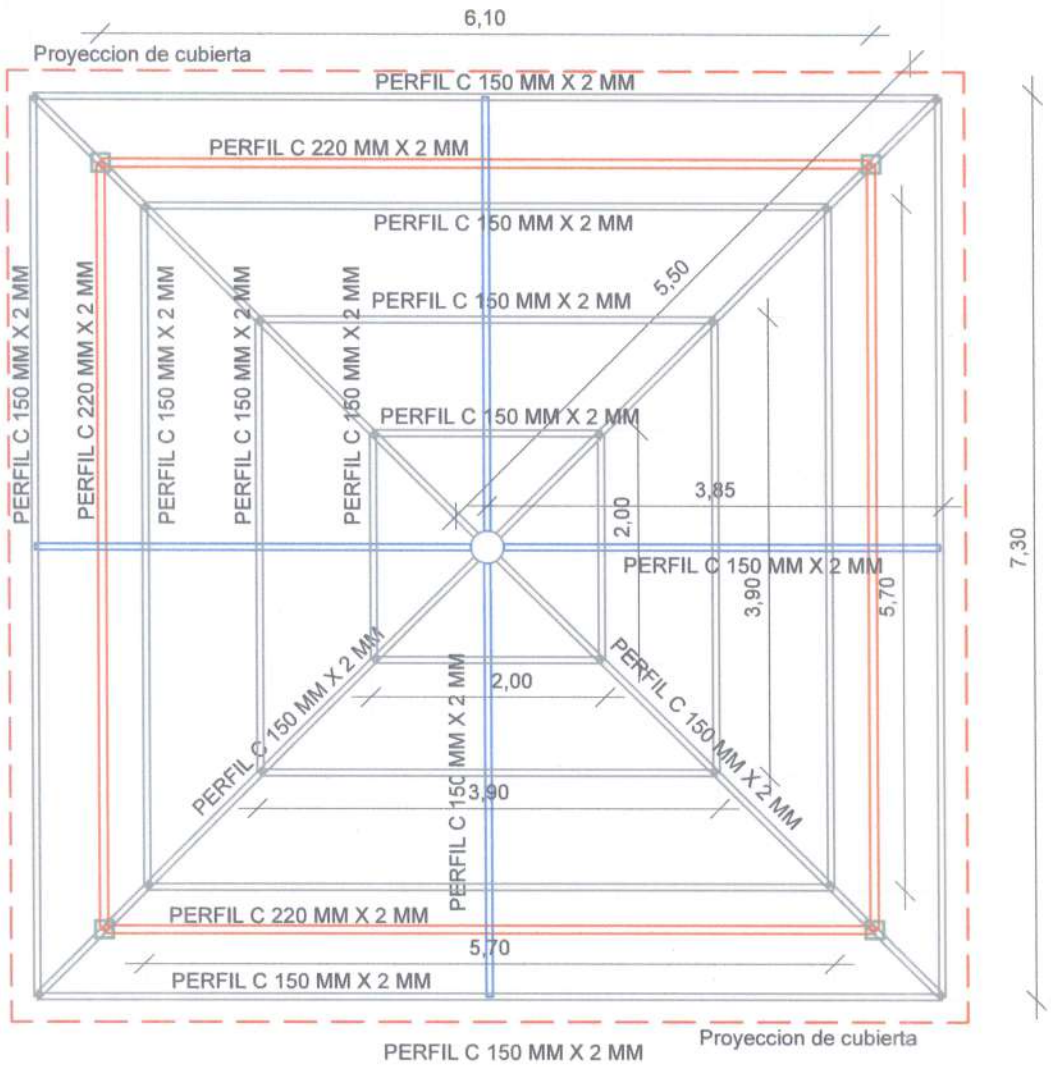

KIOSCO JUAN MINA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	3 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0056	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL - BLANCO O EL COLOR ESTABLECIDO EN LOS DISEÑOS DE 11,8 X 0.,95 MTS UPVC INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION

PARQUE LOS TRUPILLOS



DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CUBIERTA KIOSKO	3,85	7,58			0,50		14,59	
	3,85	7,58			0,50		14,59	
	3,85	7,58			0,50		14,59	
	3,85	7,58			0,50		14,59	

Cantidad según modificativa 5	179,08
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	179,08
Obra por ejecutar	0,00


TOTAL PRESENTE ACTA:	58,36

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA




DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO

7,58

7,30

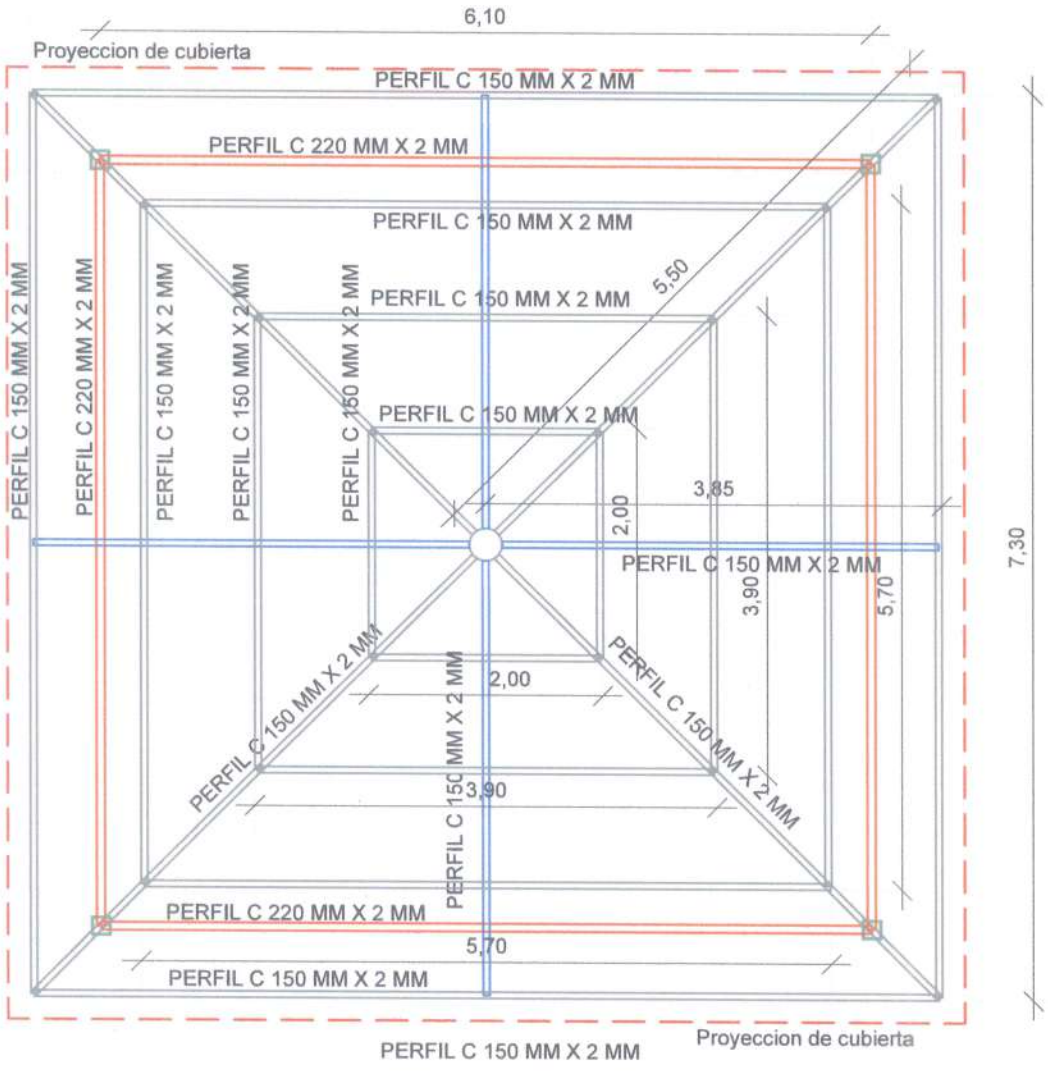

KIOSCO VIRGENCITA TRUPILLOS


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0057	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO LIMATESA UPVC INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION

PARQUE LA PRADERA



DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CUBIERTA KIOSKO	5,35				1,00	5,35		
	5,35				1,00	5,35		
	5,35				1,00	5,35		
	5,35				1,00	5,35		
TOTAL PRESENTE ACTA:						21,40		

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0057	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO LIMATESA UPVC INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION

PARQUE JUAN MINA



DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CUBIERTA KIOSKO	5,50				1,00	5,50		
	5,50				1,00	5,50		
	5,50				1,00	5,50		
	5,50				1,00	5,50		
TOTAL PRESENTE ACTA:								22,00

OBSERVACIONES:





RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	3 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0057	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO LIMATESA UPVC INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION	

PARQUE LOS TRUPILLOS



DIAGONALES ESQUINEROS



DIAGONALES MEDIO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CUBIERTA KIOSKO	5,50				1,00	5,50		
	5,50				1,00	5,50		
	5,50				1,00	5,50		
	5,50				1,00	5,50		

Cantidad según modificativa 5	65,40
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	65,40
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	22,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-PM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0058	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA

PARQUE JUAN MINA





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	CANT	TOTAL ML	KG/ML	TOTALES KG	M2	M3
ESTRUCTURA KIOSKO								
COLUMNAS TUBO CUADRADO DE 150 MM X 150 MM X 6 MM	2,65		4,00	10,60	27,46	291,08		
COLUMNAS FLANCHE DE 22 CM X 22 CM X ½"			4,00		5,00	20,00		
TOTAL PRESENTE ACTA:								311,08

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0058	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	

PARQUE LOS TRUPILLOS





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES CANT	TOTAL ML	KG/ML	TOTALES KG	TOTALES M2	TOTALES M3
ESTRUCTURA KIOSKO								
COLUMNAS TUBO CUADRADO DE 150 MM X 150 MM X 6 MM	2,65		4,00	10,60	27,46	291,08		
COLUMNAS FLANCHE DE 22 CM X 22 CM X ½"			4,00		5,00	20,00		

Cantidad según modificativa 5	622,16
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	622,16
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	311,08

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0059	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PINTURA ESTRUCTURA METALICA

PARQUE LA PRADERA

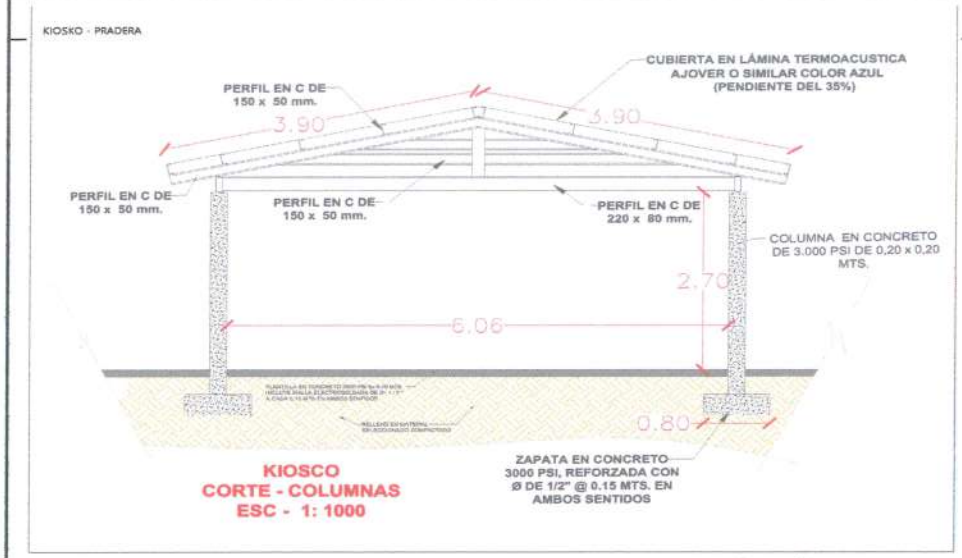



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ESTRUCTURA KIOSKO								
PERFIL C 220 X 80 MM CALIBRE -2 MM	5,90			6,00	2,00	70,80		
	6,06			6,00	2,00	72,72		
PERFIL C 150 MM X 50 MM CALIBRE 2 MM	5,35			6,00	4,00	128,40		
	3,90			6,00	4,00	93,60		
	7,22			6,00	2,00	86,64		
	7,38			6,00	2,00	88,56		
	5,87			6,00	2,00	70,44		
	5,71			6,00	2,00	68,52		
	4,00			6,00	2,00	48,00		
	3,90			6,00	2,00	46,80		
	2,14			6,00	2,00	25,68		
	2,00			6,00	2,00	24,00		
TOTAL PRESENTE ACTA:						824,16		

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0059	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PINTURA ESTRUCTURA METALICA	

PARQUE JUAN MINA

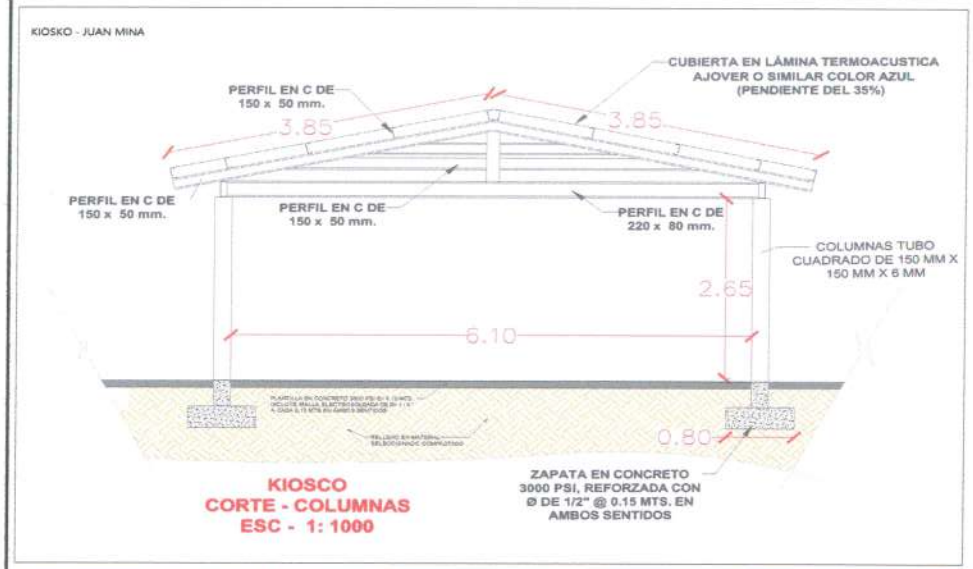





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ESTRUCTURA KIOSKO								
PERFIL C 220 X 80 MM CALIBRE -2 MM	6,10			6,00	4,00	146,40		
PERFIL C 150 MM X 50 MM CALIBRE 2 MM	5,50			6,00	4,00	132,00		
	3,85			6,00	4,00	92,40		
	7,30			6,00	4,00	175,20		
	5,70			6,00	4,00	136,80		
	3,90			6,00	4,00	93,60		
	2,00			6,00	4,00	48,00		
COLUMNAS TUBO CUADRADO DE 150 MM X 150 MM X 6 MM	2,65			4,00	4,00	42,40		
TOTAL PRESENTE ACTA:								866,80

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	3 de 3

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0059	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PINTURA ESTRUCTURA METALICA

PARQUE LOS TRUPILLOS

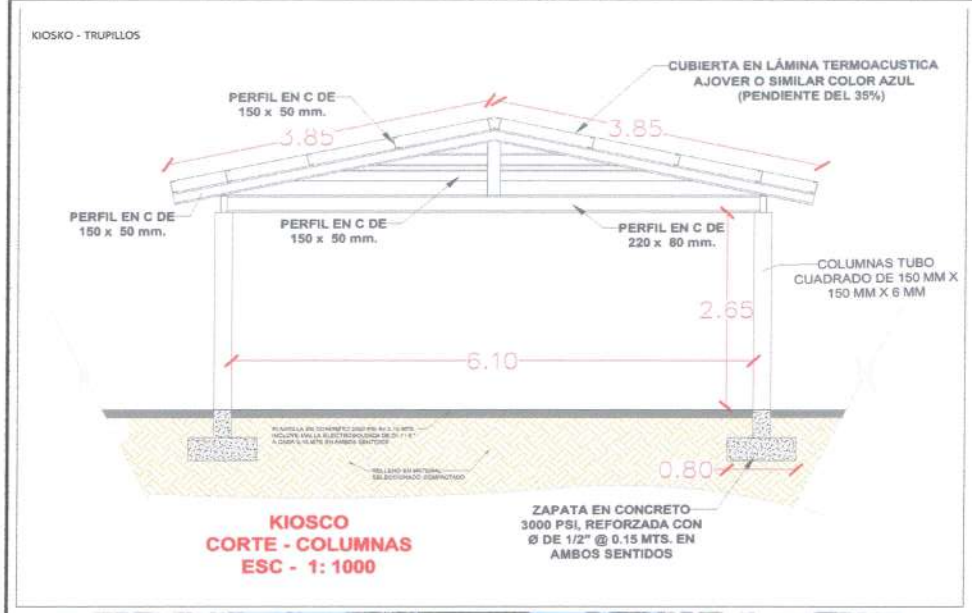



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ESTRUCTURA KIOSKO								
PERFIL C 220 X 80 MM CALIBRE -2 MM	6,10			6,00	4,00	146,40		
PERFIL C 150 MM X 50 MM CALIBRE 2 MM	5,50			6,00	4,00	132,00		
	3,85			6,00	4,00	92,40		
	7,30			6,00	4,00	175,20		
	5,70			6,00	4,00	136,80		
	3,90			6,00	4,00	93,60		
	2,00			6,00	4,00	48,00		
COLUMNAS TUBO CUADRADO DE 150 MM X 150 MM X 6 MM	2,65			4,00	4,00	42,40		

Cantidad según modificativa 5	2557,76
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	2557,76
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	866,80

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0060	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE H<2 MTS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE

PARQUE JUAN MINA

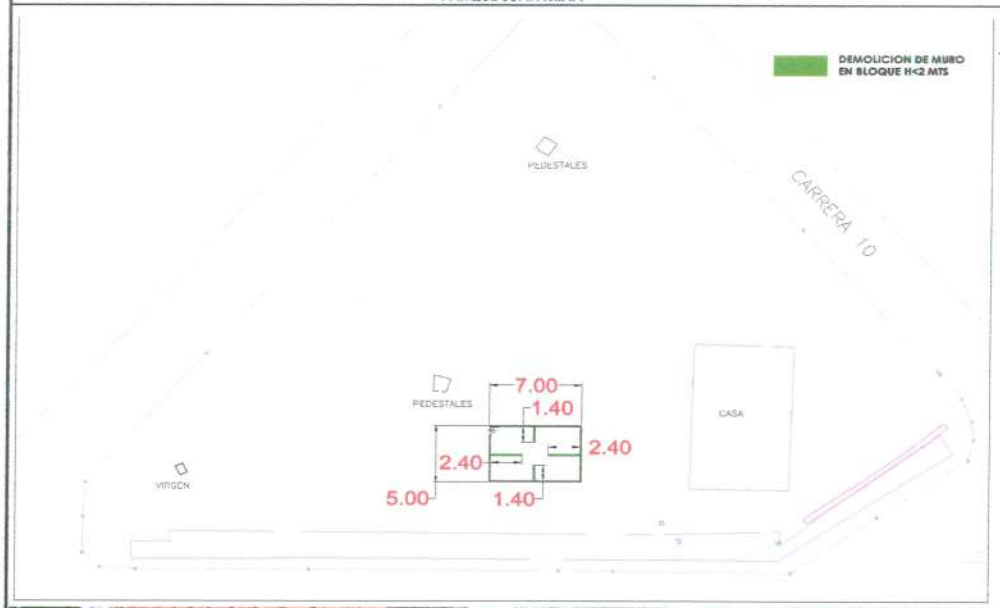




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CASETA EXISTENTE	5,00	2,50			2,00		25,00	
	7,00	2,50			2,00		35,00	
	2,40	2,50			2,00		12,00	
	1,40	2,50			2,00		7,00	
DESCUENTO								
PUERTAS	2,00	0,70			-2,00		-2,80	
TOTAL PRESENTE ACTA:							**76,20**	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0060	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE H<2 MTS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE

PARQUE LA PRADERA

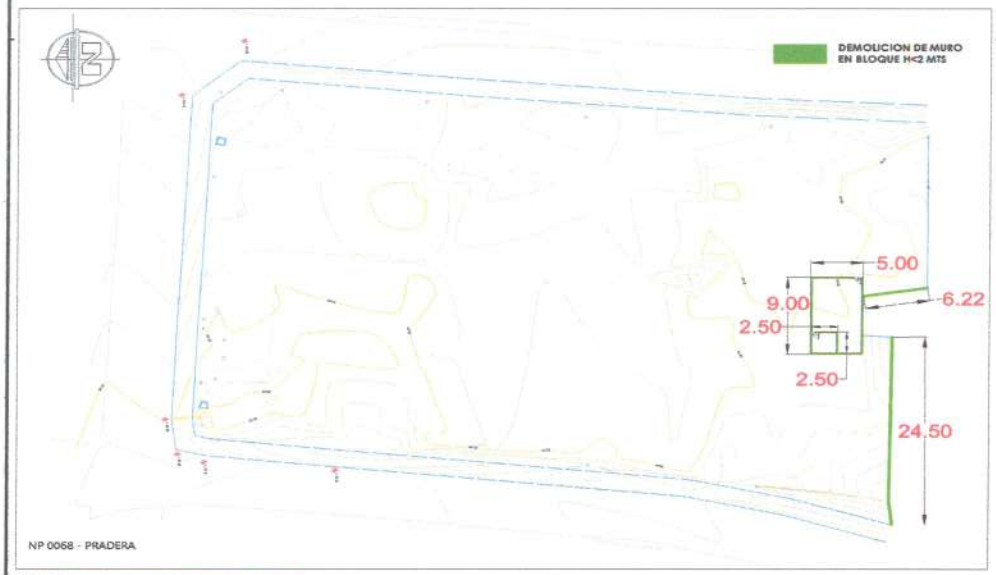











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
MURO LINDERO	6,22	2,50			1,00		15,55	
	24,50	2,50			1,00		61,25	
CASETA EXISTENTE	5,00	2,50			2,00		25,00	
	9,00	2,50			2,00		45,00	
	2,50	2,50			2,00		12,50	
DESCUENTO								
PUERTAS	2,00	0,70			-2,00		-2,80	

Cantidad según modificativa 5	232,70
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	232,70
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	156,50

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 2


CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0061	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO

PARQUE JUAN MINA







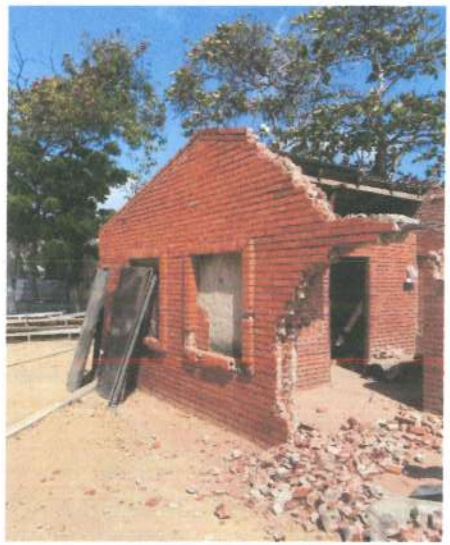

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CASETA EXISTENTE	5.00	7.00			1.00		35.00	
TOTAL PRESENTE ACTA:							35.00	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0061	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO

PARQUE LA PRADERA









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CASETA EXISTENTE	9.00	5.00			1.00		45.00	

Cantidad según modificativa 5	80.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	80.00
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	45.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 5

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0062	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO GROUT F´C 28 MPA RELLENO UNA CELDA	

PARQUE LOS TRUPILLOS











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1 Dovela @ 0.40 mts								
MURO ZONA VERDE	20,40		0,63		34,00	21,42		
JARDINERA	3,40		0,63		6,00	3,78		
	3,50		0,63		6,00	3,78		
ESCALERAS - PLAZOLETA	5,30		0,60		9,00	5,40		
	5,30		0,46		9,00	4,14		
	5,30		0,34		9,00	3,06		
	5,30		0,17		9,00	1,53		
	0,60		0,40		1,00	0,40		
	0,46		0,40		1,00	0,40		
	0,34		0,40		1,00	0,40		
	0,17		0,40					
GRADERIAS - PLAZOLETA - TRAMO 1	5,00		1,03		8,00	8,24		
	5,43		0,88		9,00	7,92		
	13,40		0,73		22,00	16,06		
	6,74		0,58		11,00	6,38		
	6,84		0,37		11,00	4,07		
	6,94		0,20		12,00	2,40		
	1,03		0,62		2,00	1,24		
	0,88		0,62		1,00	0,62		
	0,73		0,62		1,00	0,62		
	0,58		0,62		1,00	0,62		
	0,37		0,62		1,00	0,62		
	0,20		0,62					
GRADERIAS - PLAZOLETA - TRAMO 2	3,07		0,87		5,00	4,35		
	3,46		0,72		6,00	4,32		
	3,42		0,42		6,00	2,52		
	3,42		0,22		6,00	1,32		
	0,87		0,62		1,00	0,62		
	0,72		0,62		1,00	0,62		
	0,42		0,62		1,00	0,62		
	0,22		0,62					
RAMPA 1 - PLAZOLETA	11,60		0,42		19,00	7,98		
	7,75		0,42		13,00	5,46		
BALCON	1,50		0,42		3,00	1,26		
	4,50		0,42		8,00	3,36		
	1,50		0,42		3,00	1,26		
TOTAL PRESENTE ACTA:						**126,79**		

OBSERVACIONES:


RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


RELLENO DE CELDA CON CONCRETO GROUT
VIVIENDAS
CARRERA 21C
BIOSALUDABLES
5.30
PLAZOLETA
PLAZOLETA
KIOSKO
7.75
11.60
NICHO DE LA VIRGEN
ZONA VERDE
20.40
1.50
4.50
1.50
3.40
3.50
ZONA VERDE
CALLE 29

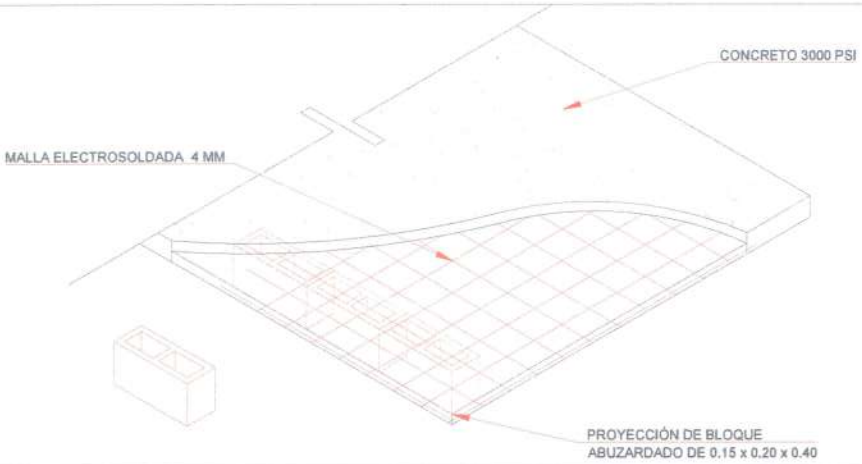


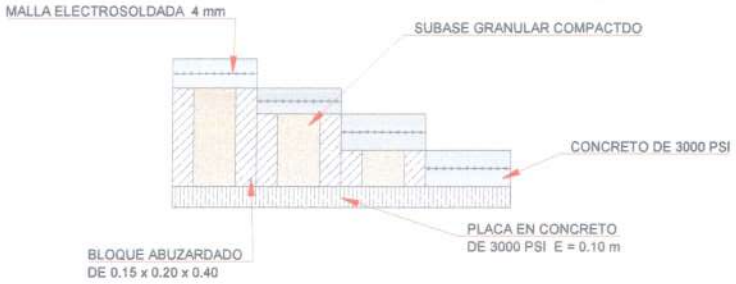


ESCALERA PLAZOLETA

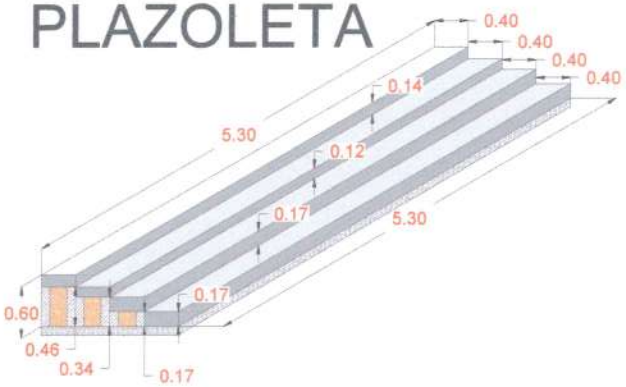

GRADERIAS PLAZOLETA

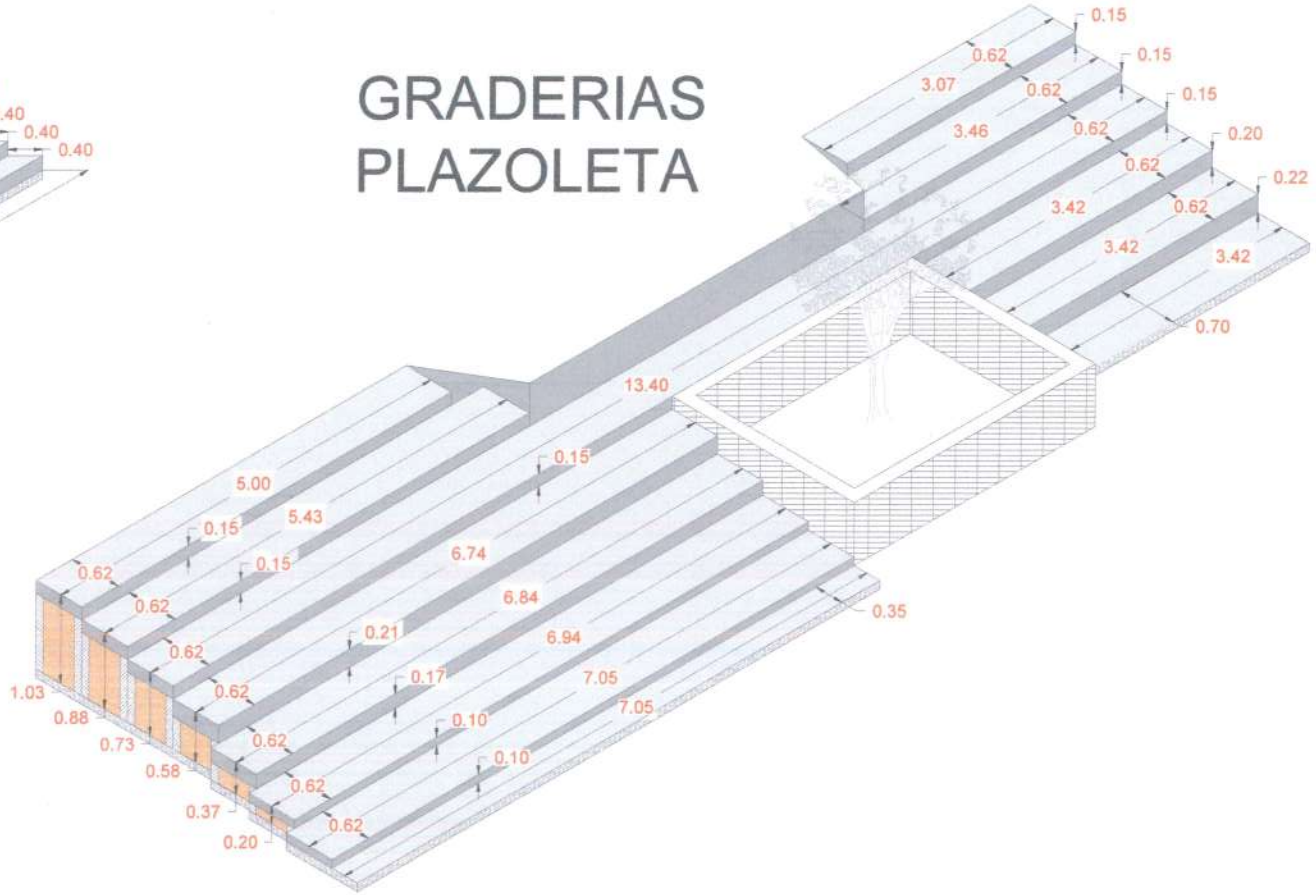

GRADERIAS PLAZOLETA - TRAMO 2 - VISTA PERFIL




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 5

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0062	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO GROUT F´C 28 MPA RELLENO UNA CELDA

PARQUE JUAN MINA

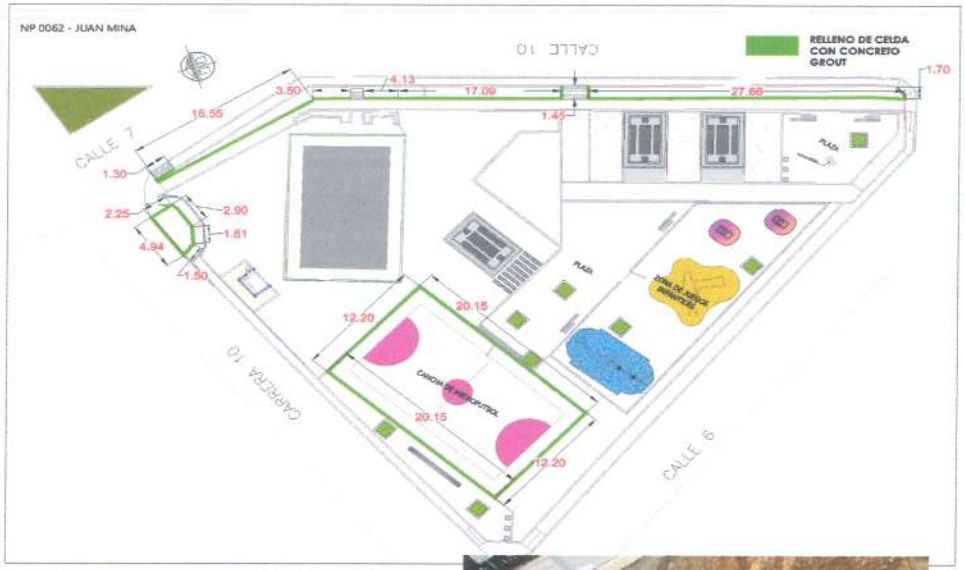










LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1 Dovela @ 0,40 mts								
JARDINERAS								
JARDINERA CALLE 7	16,55		0,42		28,00	11,76		
	1,30		0,42		2,00	0,84		
JARDINERA CARRERA 10	1,50		0,42		3,00	1,26		
	1,81		0,42		3,00	1,26		
	2,90		0,42		5,00	2,10		
	2,25		0,42		4,00	1,68		
	4,94		0,42		8,00	3,36		
JARDINERA CALLE 10	17,09		0,42		28,00	11,76		
	1,45		0,42		2,00	0,84		
	1,45		0,42		2,00	0,84		
	27,66		0,42		46,00	19,32		
	1,70		0,42		3,00	1,26		
JARDINERA CORREGIDURIA	3,50		0,42		6,00	2,52		
	4,13		0,42		7,00	2,94		
MURO								
CANCHA MICROFUTBOL	12,20		0,63		20,00	12,60		
	20,15		0,63		34,00	21,42		
	12,20		0,63		20,00	12,60		
	20,15		0,63		34,00	21,42		
TOTAL PRESENTE ACTA:								**129,78**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

NP 0062 - JUAN MINA

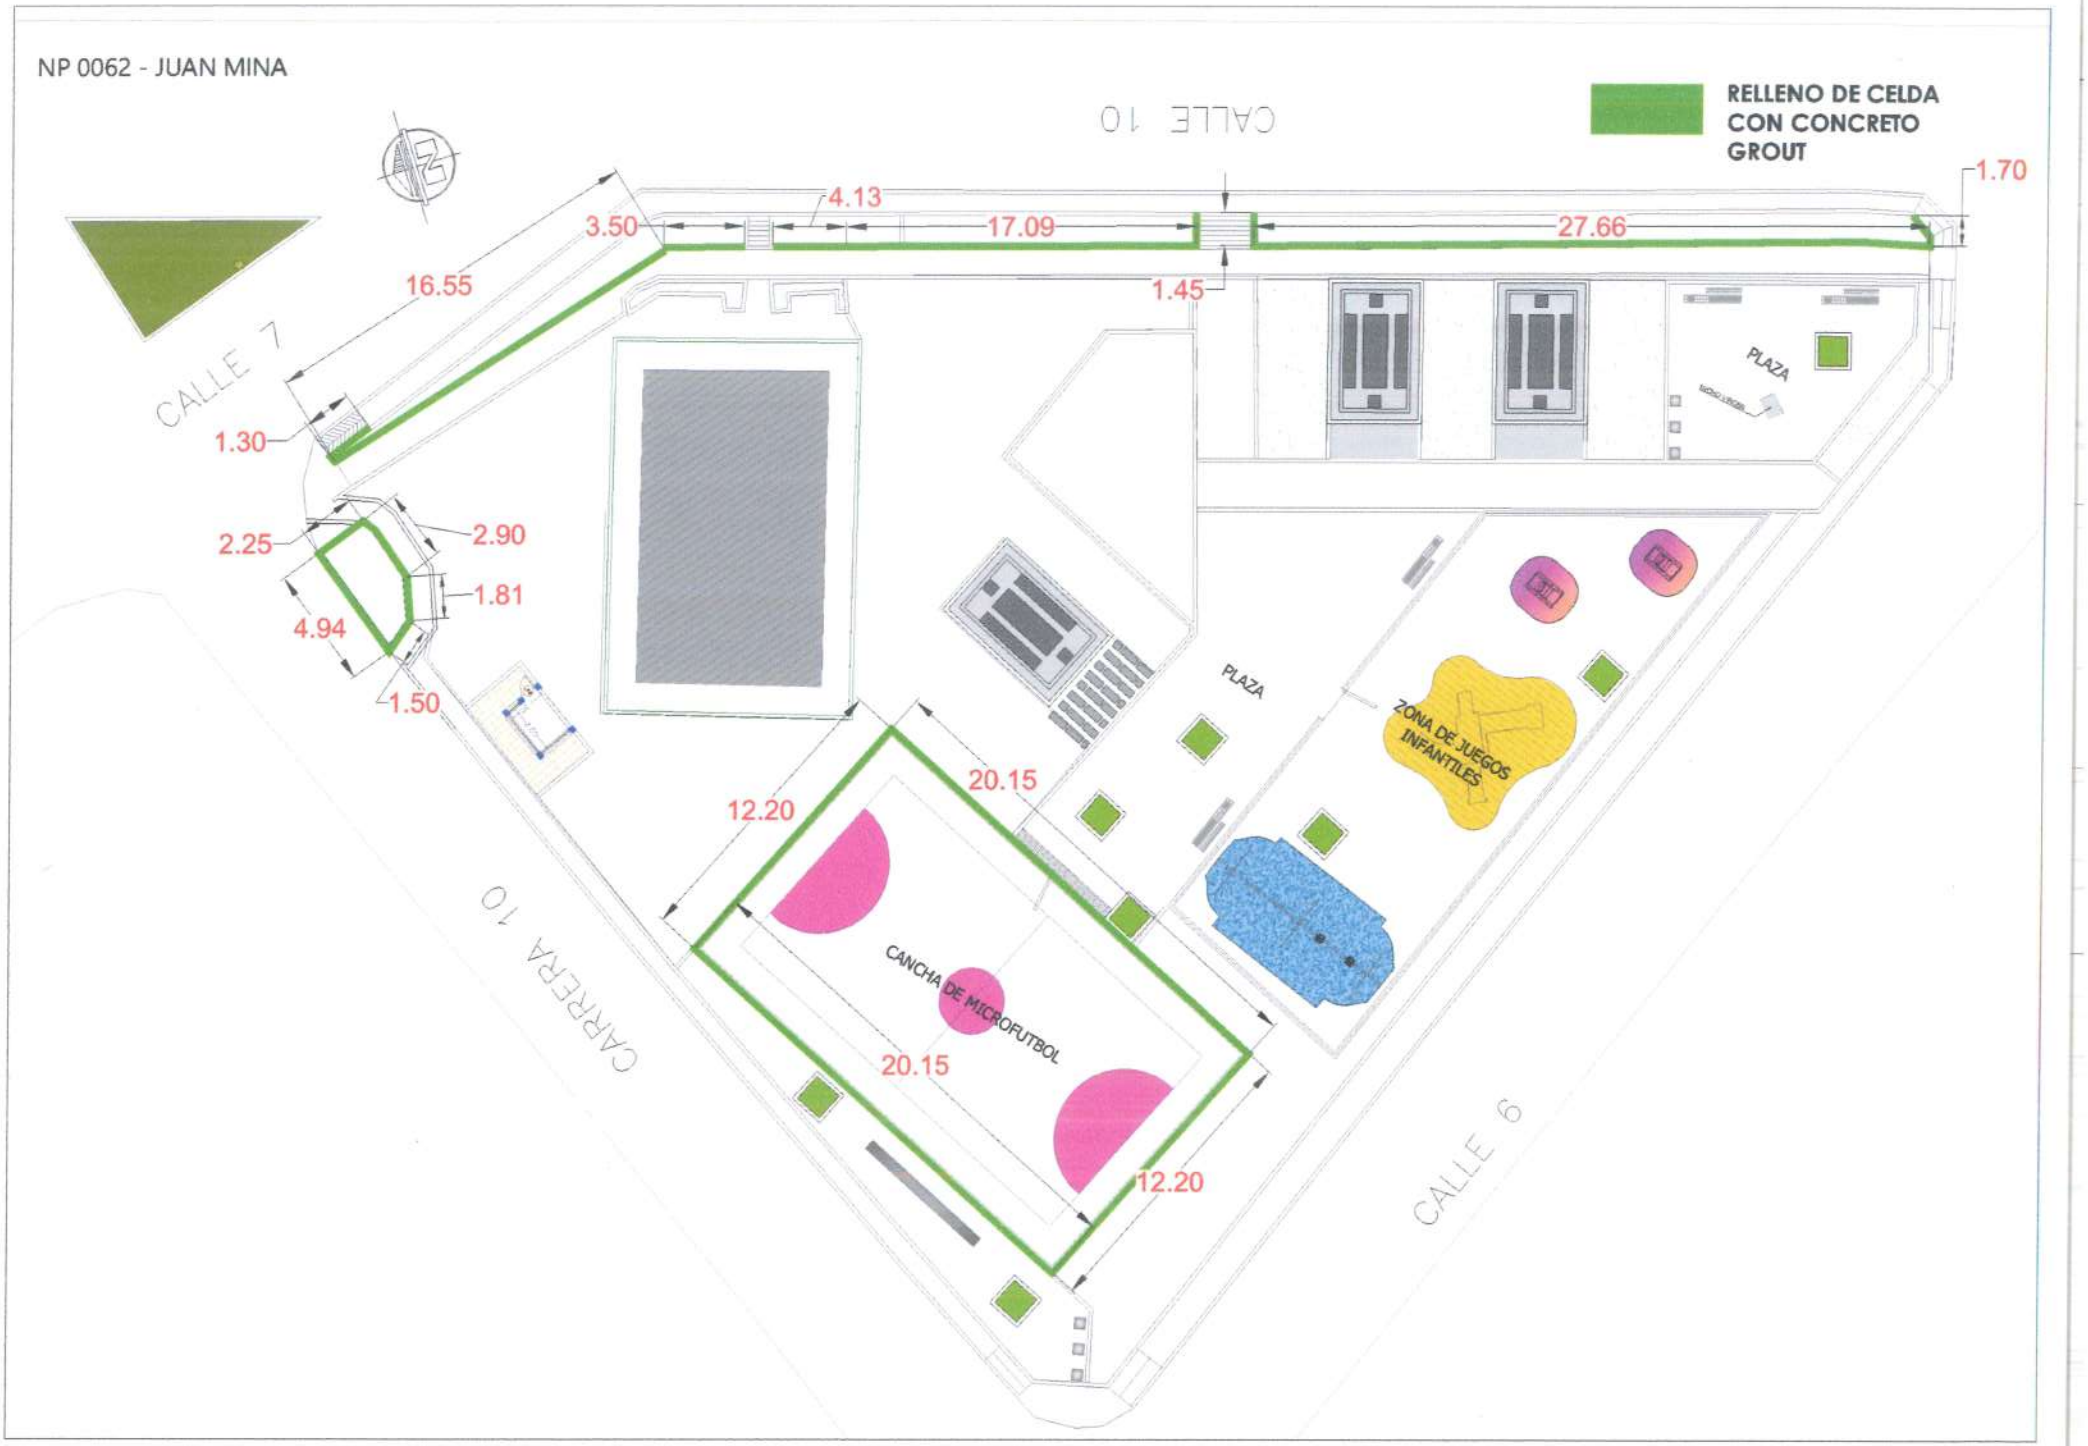

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	3 de 5

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0062	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO GROUT F´C 28 MPA RELLENO UNA CELDA

PARQUE EL GUSANITO









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1 Dovela @ 0,40 mts								
JARDINERAS								
JARDINERA BLOQUE - 1	1,04		0,21		2,00	0,42		
	1,95		0,21		3,00	0,63		
	2,25		0,21		4,00	0,84		
	2,19		0,21		4,00	0,84		
JARDINERA BLOQUE - 2	1,50		0,42		3,00	1,26		
	2,41		0,42		4,00	1,68		
	1,25		0,42		2,00	0,84		
	3,30		0,42		6,00	2,52		
JARDINERA BLOQUE - 3	2,26		0,42		4,00	1,68		
	1,28		0,42		2,00	0,84		
	2,60		0,42		4,00	1,68		
	2,67		0,42		4,00	1,68		
JARDINERA BLOQUE - 4	3,00		0,42		5,00	2,10		
	1,55		0,42		3,00	1,26		
	3,46		0,42		6,00	2,52		
	2,10		0,42		4,00	1,68		
JARDINERA BLOQUE - 5	3,00		0,42		5,00	2,10		
	1,51		0,42		3,00	1,26		
	1,43		0,42		2,00	0,84		
	3,04		0,42		5,00	2,10		
TOTAL PRESENTE ACTA:								**28,77**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	4 de 5

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0062	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO GROUT F´C 28 MPA RELLENO UNA CELDA	

PARQUE LA PRADERA











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1 Dovela @ 0,40 mts								
MURO LINDERO - VIVENDAS	24,50		2,50		41,00	102,50		
	3,39		2,50		6,00	15,00		
	19,48		2,50		32,00	80,00		
MURO - CANCHA MULTIPLE	21,99		0,63		37,00	23,31		
	3,39		0,63		6,00	3,78		
	23,48		0,63		39,00	24,57		
	21,77		0,63		36,00	22,68		
MURO - CANCHA SINTETICA	40,60		0,63		68,00	42,84		
	24,50		0,63		41,00	25,83		
	40,60		0,63		68,00	42,84		
	24,50		0,63		41,00	25,83		
JARDINERAS								
JARDINERA 1 - CALLE 114	2,24		0,21		12,00	2,52		
	2,23		0,21		12,00	2,52		
JARDINERA 2 - CALLE 114	1,55		0,21		8,00	1,68		
	1,00		0,21		6,00	1,26		
JARDINERA 1 - CALLE 115	0,75		0,21		2,00	0,42		
	33,75		0,21		84,00	17,64		
JARDINERA 2 - CALLE 115	1,80		0,21		5,00	1,05		
	6,65		0,21		17,00	3,57		
	1,26		0,21		3,00	0,63		
JARDINERA 3 - CALLE 115	2,30		0,21		12,00	2,52		
	1,90		0,21		5,00	1,05		
JARDINERA INTERNA BIOSALUDABLES	1,50		0,21		8,00	1,68		
	1,40		0,21		8,00	1,68		
ESQUINA CALLE 114	3,20		0,21		8,00	1,68		
BIOSALUDABLES	15,85		0,63		40,00	25,20		
1 Dovela @ 0,20 mts								
GRADERIAS	10,30		1,42		104,00	147,68		
	10,30		1,02		52,00	53,04		
	10,30		0,62		52,00	32,24		
	1,42		0,82		21,00	17,22		
	1,02		0,60		10,00	6,00		
	0,62		0,60		6,00	3,60		
DESCUENTOS								
PUERTAS								
PUERTA CANCHA SINTETICA	-2,40		0,63		-6,00	-3,78		
PUERTA CANCHA MULTIPLE	-2,40		0,63		-6,00	-3,78		
	-2,40		0,63		-6,00	-3,78		
TOTAL PRESENTE ACTA:								**722,72**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


CALLE 114
RELLENO DE CELDA CON CONCRETO GROUT
N
2.23
2.24
3.20
24.50
1.55
1.00
21.77
24.50
21.99
CANCHA MULTIPLE
JUEGOS INFANTILES
40.60
40.60
CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA
3.39
kioscos
CARRERA 31
10.30
23.48
19.48
1.40
1.50
24.50
KIOSKO
2.30
2.10
15.85
1.80
0.75
1.90
1.26
6.65
33.75
CALLE 115

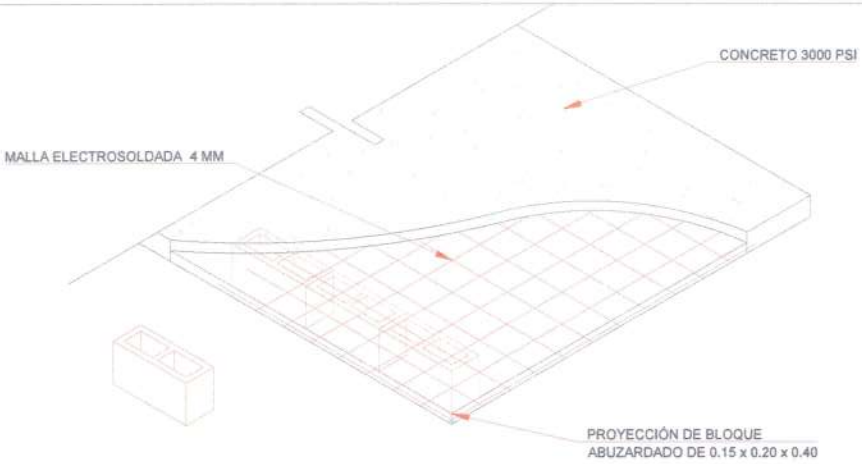


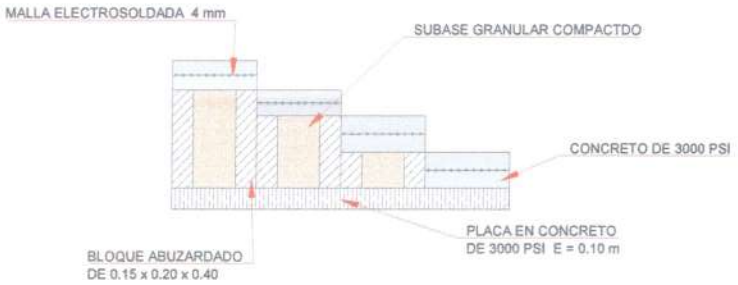

GRADERIAS

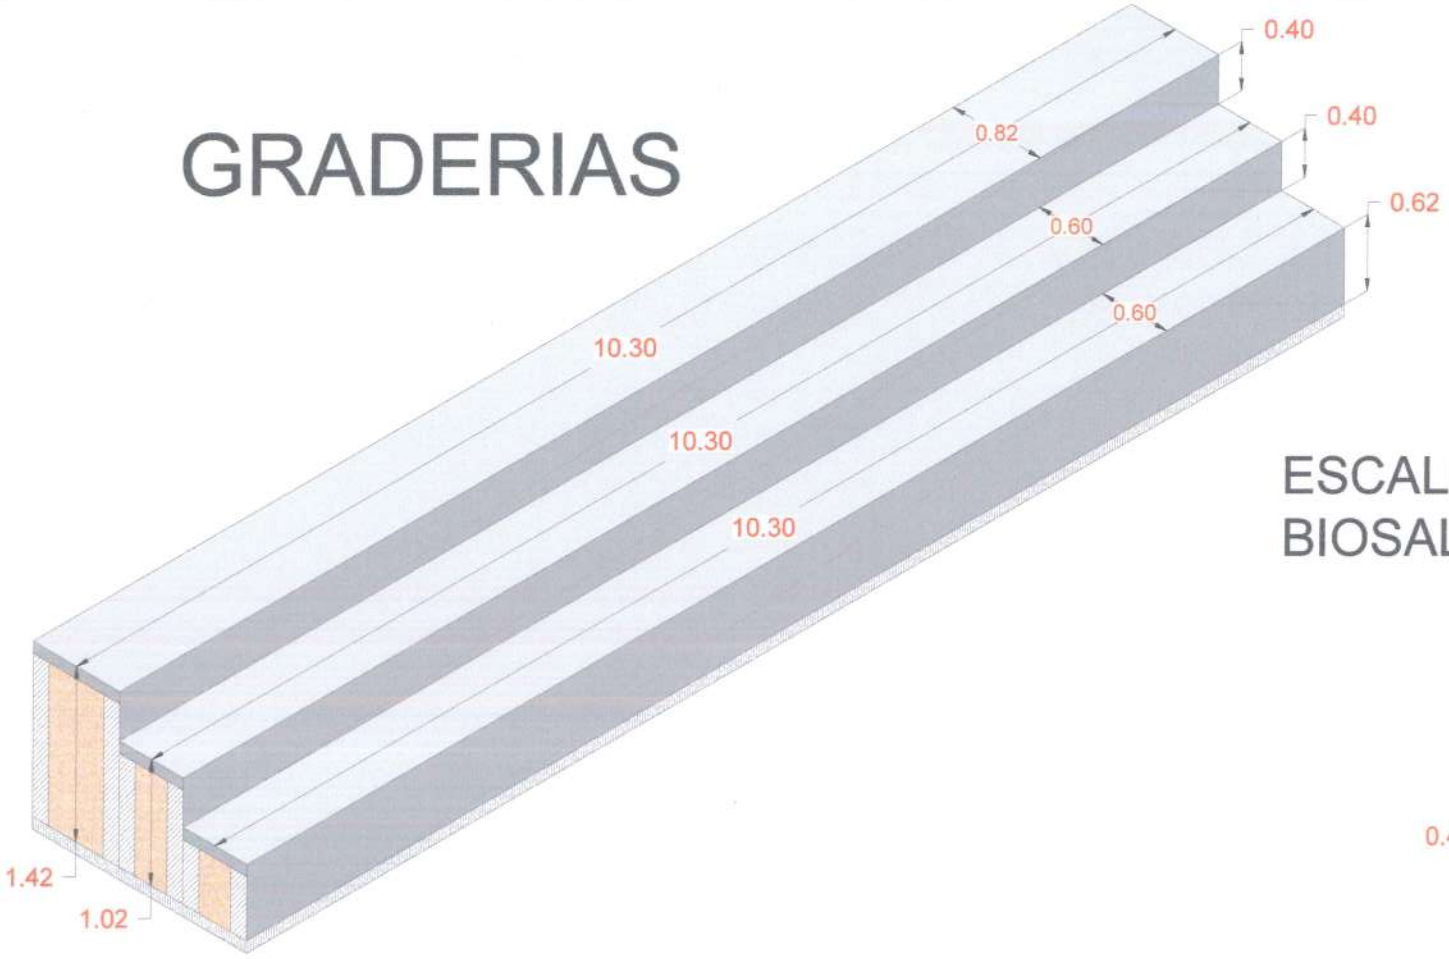

ESCALERA BIOSALUDABLES

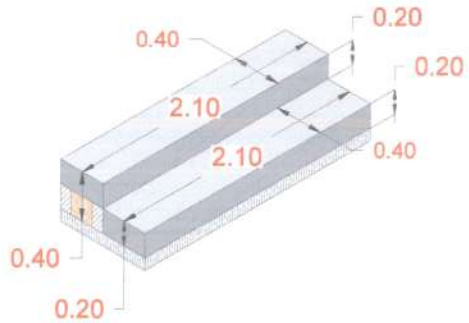

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	5 de 5

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V	
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0062	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO GROUT F´C 28 MPA RELLENO UNA CELDA	

PARQUE 5 ESTRELLAS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1 Doveia @ 0,40 mts								
MURO								
BIOSALUDABLES	5,10		0,63		9,00	5,67		
	6,65		0,63		11,00	6,93		
	1,30		0,63		2,00	1,26		
ANDEN CARRERA 36B	9,92		0,21		17,00	3,57		
	0,85		0,21		1,00	0,21		

Cantidad según modificativa 5	1030,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	1025,70
Obra por ejecutar	4,30

TOTAL PRESENTE ACTA:	17,64

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0065	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS DE CUBOS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A SITIOS AUTORIZADOS

PARQUE JUAN MINA

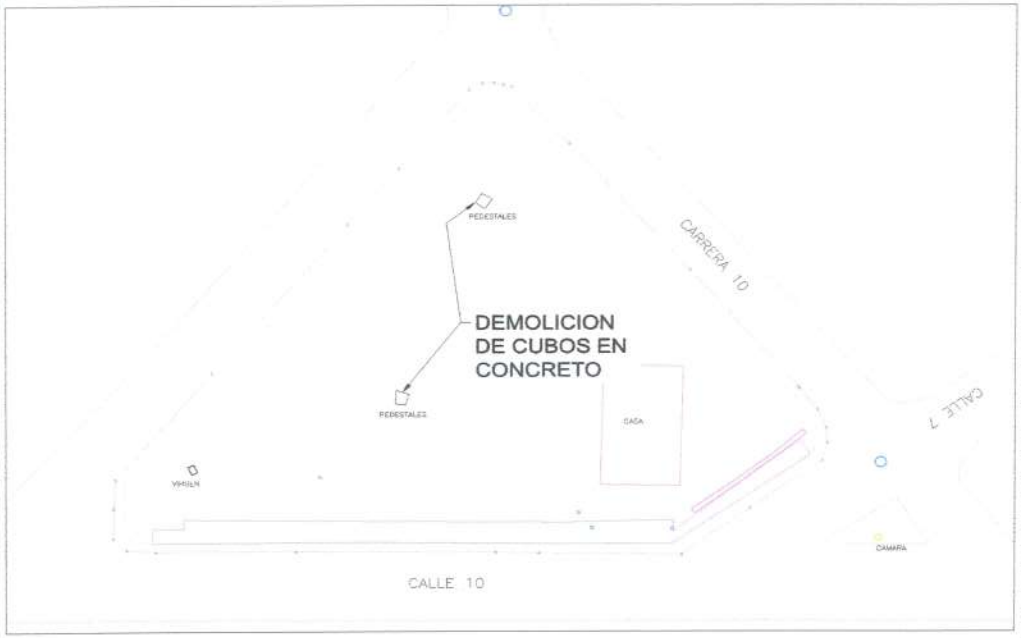









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
DEMOLICION DE CUBOS					2.00			

Cantidad según modificativa 5	2.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	2.00
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	2.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0066	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PEDESTAL EN CONCRETO 3500 PSI , NO INLCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE LOS TRUPILLOS







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
COLUMNAS KIOSKO	0.30	0.30	0.40		4.00			0.14

Cantidad según modificativa 5	0.14
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	0.14
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	0.14

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJIA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0073	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION KIOSKO DE VENTA DIMENSION VARIABLE ENTRE 1,5 X (2,00 A 2,5) MTS (INCLUYE ESTRUCTURA EN CONCRETO, MAMPOSTERIA,LOSA ALIGERADA CON METALDECK,INSTLACIONES ELECTRICCAS, ACABADO INTERNO,CARPINTERIA METALICA)

PARQUE JUAN MINA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
KISOKO DE VENTAS					1.00			
TOTAL PRESENTE ACTA:								**1.00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25		
CAPITULO: NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP 0073	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION KIOSKO DE VENTA DIMENSION VARIABLE ENTRE 1,5 X (2,00 A 2,5) MTS (INCLUYE ESTRUCTURA EN CONCRETO, MAMPOSTERIA,LOSA ALIGERADA CON METALDECK,INSTLACIONES ELECTRICCAS, ACABADO INTERNO,CARPINTERIA METALICA)

PARQUE LA PRADERA





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
KISOKO DE VENTAS					1.00			

Cantidad según modificativa 5	2.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	2.00
Obra por ejecutar	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	9/7/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0074	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 3000 PSI,CON ACBADO ESTRIADO, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ESPESOR DE 15 CMS.

PARQUE EL GUSANITO

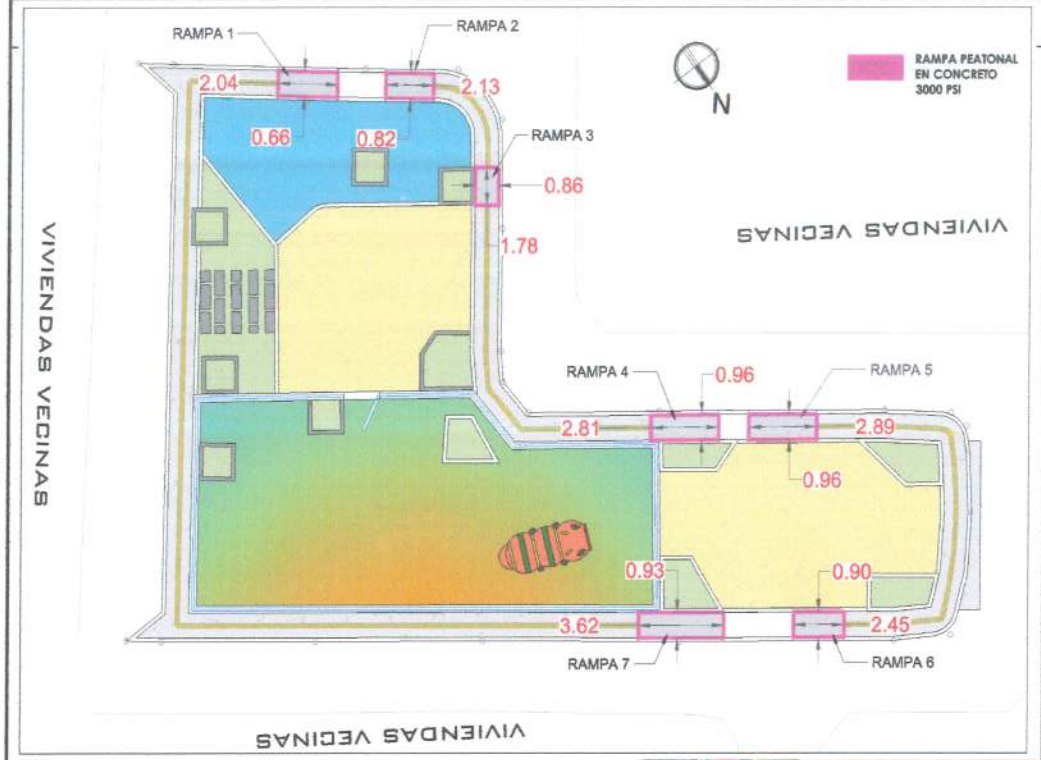









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
RAMPAS								
RAMPA 1	2.04	0.66			1.00		1.35	
RAMPA 2	2.13	0.82			1.00		1.75	
RAMPA 3	1.78	0.86			1.00		1.53	
RAMPA 4	2.81	0.96			1.00		2.70	
RAMPA 5	2.89	0.96			1.00		2.77	
RAMPA 6	2.45	0.90			1.00		2.21	
RAMPA 7	3.62	0.93			1.00		3.37	
TOTAL PRESENTE ACTA:							15.68	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102044-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 06

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO V
PERIODO:	DEL 31/07/25 AL 30/10/25				
CAPITULO:	NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 0074	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 3000 PSI,CON ACBADO ESTRIADO, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ESPESOR DE 15 CMS.

PARQUE 5 ESTRELLAS











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
RAMPAS								
RAMPA CARRERA 37	9,64	1,05			1,00		10,12	
RAMPAS CARRERA 36B	4,34	0,93			1,00		4,04	
	1,30	0,80			1,00		1,04	
	6,65	0,80			1,00		5,32	
	3,40	0,80			1,00		2,72	
RAMPA VIVIENDAS	5,50	1,05			1,00		5,78	

Cantidad según modificativa 5	44,70
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	44,70
Obra por ejecutar	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	29,02

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JOSE TORRES	HERMOGENES HEREIRA	JESUS MEJÍA	DIEGO RADA
