	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

FECHA 23/7/2025 (Día / Mes / Año)

AREA TOPOGRAFÍA

17/07/2025: Chequeo nivel de excavación para caisson 4 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15 a K11+281.22 margen derecha, la altura cumple diseño de 17.00 metros.

17/07/2025: Chequeo nivel de refuerzo instalado en caisson 8 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15 a K11+281.22 margen derecha, el nivel cumple diseño.

17/04/2025: En oficina se efectuó revisión documental referente a muro M7, elaboración cartera de campo para control de construcción.

18/07/2025: Las lluvias presentadas durante la jornada afectaron un 80% en el desarrollo de actividades.

21/07/2025: Nivelación entre abscisas: K11+200 a K11+430 para marcar cotas de control excavaciones en caissons números 1 y 2 localizados en muro M7 abscisas: K11+428.56 a K11+460.01 margen derecha.

21/07/2025: Chequeo excavación efectuada en caisson número 3 localizado en muro M4 abscisas: K11+240.15 a K11+281.22 margen derecha, la altura cumple con diseño de 17.00 metros.

21/07/2025: Acompañamiento recorrido a ingeniero residente y a especialista en hidráulica del C.R.P. entre abscisas: K10+520 a K11+430.

22/07/2025: Chequeo equipo de topografía utilizado en el proyecto: Estación total y nivel de precisión.

22/07/2025: Acompañamiento a ingeniero especialista en hidráulica del C.R.P. a recorrido entre abscisas: K8+300 a K11+430.

23/07/2025: Nivelación para chequeo cota refuerzo instalado en caisson 3 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15-K11+281.22 margen derecha.

23/07/2025: Verificación nivel de excavación caisson 7 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15-K11+281.22 margen derecha. Altura 17 metros.

23/07/2025: Acompañamiento a ingenieros: especialista en hidráulica de interventoria y del contratista a recorrido entre abscisas: K3+800 a K11+430.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

17/07/2025: Se realiza ensayo de clasificación de granular para subbase granular acopiado en planta

17/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 7 días del vástago, segunda elevación, Muro 2, Modulo 3 Km10+870, C. Der

18/07/2025: Se realiza toma de cilindros y asentamiento de concreto convencional para vástago, primera elevación, Muro 4, Modulo 2, Km11+030, C. Der

18/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 7 días del tremie para núcleo caisson, Muro 6, Caisson 10, modulo 4 Km11+260, C. Der

18/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 28 días de la viga cabezal muro 2 modulo 3. Km 10+870 lado derecho. Sector 3

19/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 3 días, del concreto acelerado para, dados en sitio, Talud 4, 10 unidades, talud 2, línea A#40,42, Línea B#43, Linea C#42, Línea D#21,25,31,41,43,45,47,49, Km 10+890, margen izquierda.

21/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 7 días, del concreto convencional para viga cabezal, Muro 4, Modulo 3 Km11+010, C. Der

22/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 7 días, del concreto tremie para núcleo caisson, Muro 6, Caisson 9, modulo 4 Km11+260, concreto tremie, C. Der

ESTUDIOS Y DISEÑOS

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-6855-25 del 16-07-2024 presenta No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y9.

Mediante comunicado Putumayo04-6856-25 del 16-07-2024 presenta, No Aprobación Diseño de Fundación muro Y7.

Mediante comunicado Putumayo04-6857-25 del 16-07-2024 presenta, No Aprobación Diseño de Fundación para los puentes Y6, Y7 y Y8.

Mediante comunicado Putumayo04-6859-25 del 16-07-2024 presenta, No Aprobación Diseño Estructural Puente Y9A.

Mediante comunicado Putumayo04-6875-25 del 19-07-2024 presenta, Aprobación a propuesta campaña Exploratoria del K14+400 al K22+706.

Mediante comunicado Putumayo04-6878-25 del 21-07-2024 presenta No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y10.

Mediante comunicado Putumayo04-6881-25 del 22-07-2024 presenta Aprobación Volúmenes XII y XIII.

Recibidos

- 312-001-20250714000269, Propuesta Campaña Exploración Geotécnica entre el K14.4 – K22.706
- 312-001-20250718000272, Puente Campucanita. Entrega Volumen IV Fundaciones y VIII Estructuras del Puente Campucanita.
- 312-168-20250718001882, Validación Estrato de Cimentación Caisson 2_4 y 6 Muro 6

REUNIONES Y RECORRIDOS:

* Revisión planos finales puente Campucanita

* Reunion presencial y recorrido sector 3-4-5 pares Esp. Hidraulicos Obra e Interventoria,.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS

• Obra Presenta Atención observaciones comunicado 311-168-20250619001750 (Putumayo04-6740-25), referente a la No aprobación del diseño Estructural del Muro.
• Obra presenta Propuesta Campaña Exploración Geotécnica entre el K14.4 – K22.706.
• Obra Presenta Puente Campucanita, Entrega Volumen IV Fundaciones y VIII Estructuras del Puente Campucanita.
• Obra Presenta, Validación Estrato de Cimentación Caisson 2_4 y 6 Muro 6.
• Interventoría emite No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y9.
• Interventoría emite No Aprobación Diseño de Fundación muro Y7.
• Interventoría emite No Aprobación Diseño de Fundación para los puentes Y6, Y7 y Y8.
• Interventoría emite No Aprobación Diseño Estructural Puente Y9A.
• Interventoría emite Aprobación a propuesta campaña Exploratoria del K14+400 al K22+706.
• Interventoría emite No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y10.
• Interventoría emite Aprobación Volúmenes XII y XIII del K10+600 al k11+600.
• Interventoría emite Concepto de revisión a sondeos del K13+600 al K14+400, presentados en reunión virtual del martes 15 de julio de 2025.

COMPONENTE	K10+600 K11+600	K11+600 K13+600	K13+600 K15+600	K15+600 K17+600	K17+600 K19+600	K19+600 21+600	K21+600 K25+571
ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO							
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL			NUEVA ALTERNATIVA, RESPONDIDO 27-01-2025 CON OBSERVACIONES, Putumayo04-6073-25				
ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA			A LA ESPERA QUE CONDOR PRESENTE DG FASE III, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES				
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION		EN REVISIÓN DE PRODUCTOS PRESENTADOS, YA SE ESTAN RESPONDIENDO CON OBSERVACIONES	AL MOMENTO QUE SE TENGA APROBADO CAPITULO DE GEOLOGIA, SE INICIA DISEÑO DE FUNDACIONES.				
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES		EN REVISIÓN DE PRODUCTOS PRESENTADOS, YA SE ESTAN RESPONDIENDO CON OBSERVACIONES	AL MOMENTO QUE SE TENGA APROBADO CAPITULO DE GEOLOGIA, SE INICIA DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES IDENTIFICADOS.				
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO							
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION							
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS							
COMPONENTE AMBIENTAL	CAMBIOS MENORES PRESENTADOS COMO CONTINGENCIAS		MODIFICACIÓN DE LICENCIA				
ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL	CAMBIOS MENORES						
ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA							
RESUMEN EJECUTIVO	OBSERVACIONES DE FORMA EN CIERRE						
EXPLORACION GEOTECNICA			EN EJECUCIÓN				

CONVENCIONES

APROBADO | EN EJECUCION | SIN PRESENTAR

ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

De acuerdo con el informe presentado por la coordinación de consultoría de Estudios y diseños del Contratista, la campaña exploratoria avanza como sigue:

Código	Coordenadas Inicial o Real	Coordenadas Inicial o Este	Obra asociada	Abscisa	Prof. Proyectada (m)	Prof. Ejecutada (m)	Estado	Codigo Condor
APU1-5	626,357.61	1,041,572.41	Puente Y10	K13+600	30	30	Terminada	PU 13-5
APU1-2	626,344.98	1,041,552.63	Puente Y10	K13+620	30	30	Terminada	PU 13-2
MU 13.6	626,344.74	1,041,530.48	Muro Y07	K13+638	20	20	Terminada	MU 13.6
APU1-1	626,333.21	1,041,522.54	Puente Y11	K13+655	30	30	Terminada	PU 13.7-1
APU1-2	626,320.65	1,041,505.48	Puente Y11	K13+674	30	30	Terminada	PU 13.7-2
ST32A	626290.447	1041490.042	Talud 32A	K13+700	15	--	Proyectada	
MU13	626,311.47	1,041,477.75	Muro Y6	K13+703	15	15	Terminada	MU-13.7B
APU1-3	626,296.03	1,041,469.41	Puente Y12	K13+741	30	30	Terminada	PU 13.7B-1
APU1-4	626,284.12	1,041,448.47	Puente Y12	K13+760	30	30	Terminada	PU 13.7B-2
MU12	626,281.782	1041,418.18	Muro Y5	K13+791	15	15	En ejecución	
ST33	626219.307	1041453.045	Talud 33	K13+830	35	35	Terminada	ST33
APU13-1	626202.923	1041467.952	Puente Y13	K13+862	25	25	Terminada	PU 13.87-1
APU13-2	626184.196	1041480.946	Puente Y13	K13+889	25	25	Terminada	PU 13.87-2
ST34	626155.272	1041505.952	Talud 34	K13+950	33	33	Terminada	ST34
TC-13.911	626165.068	1041330.739	Talud de Corte 1	K13+911	12	12	Terminada	TC-13.911
MU13-1	########	1,041,470.782	Muro Y8	K13+950	15	--	Proyectada	
APU14-1	626104.733	1041280.833	Puente Y14	K14+004	30	30	Terminada	
APU14-2	626103.943	1041253.849	Puente Y14	K14+022	30	30	Terminada	PU 14.7
APU15-1	626116.248	1041219.849	Puente Y15	K14+060	30	30	Terminada	SP6
APU15-2	626094.713	1041219.849	Puente Y15	K14+080	30	--	Proyectada	
APU13-3	626091.953	1041179.501	Puente Y15	K14+140	30	0.30	En ejecución	
APU13-4	626067.346	1041156.741	Puente Y15	K14+160	30	--	Proyectada	
ST35	626061.809	1041104.104	Talud 35	K14+200	15	--	Proyectada	
PU14-1	626090.670	1041060.622	Puente Y16	K14+252	30	--	Proyectada	SP15-1
PU14-2	626069.574	1041077.954	Puente Y16	K14+304	30	--	Proyectada	SP15-2
PU14-3	626061.093	1041059.742	Puente Y16	K14+372	30	--	Proyectada	SP15-3
PU14-4	626039.593	1041035.461	Puente Y16	K14+394	30	--	Proyectada	SP15-4
PE1-Y5	625929.299	1039969.67	PE. Yumbo 1	K14+330	60	--	Proyectada	
PE2-Y5	625927.487	1039939.98	PE. Yumbo 1	K14+390	60	--	Proyectada	
PE2-Y6	625911.048	1039773.48	PE. Yumbo 1	K14+594	60	--	Proyectada	
PE1-Y6	625905.67	1039752.53	PE. Yumbo 1	K14+575	60	--	Proyectada	
PE2-Y7	625824.73	1039776.82	PE. Yumbo 2	K14+810	60	--	Proyectada	
PE1-Y7	625845.67	1039802.46	PE. Yumbo 2	K14+845	60	--	Proyectada	
PE1-Y8	625934.73	1039824.69	PE. Yumbo 3	K15+050	60	--	Proyectada	
PE2-Y8	625935.97	1039853.58	PE. Yumbo 3	K15+006	60	--	Proyectada	
					1165	391.5		

AREA SOCIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-6885-25 del 21/07/2025 Se remite a Subdirección de Sostenibilidad-INVIAS; Asunto: Entrega de insumo para proyección de comunicado alternativa de acumulación de certificaciones de procedencia para trámite entre INVIAS y la DANCP

Mediante comunicado Putumayo04-6899-25 del 22/07/2025 Se remite a Subdirección de Sostenibilidad-INVIAS; Asunto: Rta Oficio 2025S-VBOG-049876 R.I 04- 6196-25 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-071859 (Putumayo04-6799-25).Remisión Pre acta mensual de inversión social No. 48 correspondiente al contrato de obra No. 964 de 2021.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7

FECHA	23/7/2025 (Día / Mes / Año)

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Se coordinó mesa de trabajo en la cual participaron contratista e interventoría, con el objetivo de definir alternativa sobre operatividad y funcionamiento de la Resolución 1188, teniendo como conclusión del espacio de trabajo la complementación de los actos administrativos y así mismo presentar a la SS y gestor técnico del proyecto insumo como apoyo a la proyección de comunicado que elaborará la SS dirigida a la DANCP.

Se asistió y participó en el comité de obra de seguieinto semanal No.146 al contrato No.964 de 2021, espacio en el cual se presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan ejecución de actividades.

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:

Se brindó apoyo a gestora social de la SS-INVIAS con relación a suministro de información aclaratoria sobre inquietudes presentadas ante la revisión del Derecho de petición radicado por el Señor Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy, información que permitió generar desde la SS-INVIAS alcance total al derecho petición.

Desarrollada última mesa de trabajo en la cual interventoría presentó a la SS-INVIAS postura a través de alternativa para definir alcances y operatividad de la Resolución ST-1188, por lo tanto la Ing. Karol Roca Pacheco-Subdirectora de red de modernización de carreteras-INVIAS y la Dra. Hilduara Berrera-Coordinadora social de la SS-INVIAS, solicitaron a interventoría documento que contenga insumo sobre la alternativa planteada, con el fin de apoyarse en dicho documento para la proyección de comunicado a radicarse ante la DANCP, con el fin de agilizar la atención a solicitud se envió insumo a través de correos electrónicos hbarrera@invias.gov.co y cbeltran@invias.gov.co.

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reprote semanal

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

A través de correo electrónico se envió a coordinadora social y gestora social de la SS-INVIAS hbarrera@invias.gov.co y cbeltran@invias.gov.co,informacion respectiva sobre la programación de reunión de coordinación y preparación con la DANCP, con el fin de garantizar su asistencia y participación la cual es requerida de manera indispensable para el desarrollo de este encuentro presencial.

Se actualizó Formato PS-F-010 Matriz de obligaciones contractuales a corte 15 de julio,matriz que permite actualizar trazabilidad relacioanda a las obligaciones contractuales de Consulta previa y Programa de Arqueología preventiva - Plan de Manejo Arqueológico

Se generó revision documental y se elaboró documentos para reprote de estado de avances de lo relacionado con Consulta previa y Programa de Arqueología,información objeto de cargue al Drive-Información entes de control.

AREA AMBIENTAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicación Putumayo04-6892-25 del 22 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Seguimiento de la ANLA a las contingencias del frente Mocoa. Como es de su conocimiento, en el Concepto Técnico 4801 del 02 de julio de 2025, el cual hace parte integral del Acta N°429 del 04 de julio de 2025, sobre las contingencias 1 (K10+518 al K10+600), 2 (K10+600 al K10+650) y 3 (K10+650 al K10+760), la ANLA señala: "6.5.3.8. Consideraciones al Radicado ANLA 20256200022412 del 8 de enero de 2025 La Sociedad mediante el radicado ANLA 20256200022412 del 8 de enero de 2025, solicitó el cierre de las contingencias con números VITAL 4100080021580722006, 4100080021580722007 y 4100080021580722008. Frente a lo anterior, esta Autoridad Nacional en la valoración del presente Concepto técnico a las contingencias mencionadas por la Sociedad, concluyó que los eventos de contingencia has sido atendidos, y no se continuará con el seguimiento a dichas contingencias." Ahora bien, aunque la ANLA manifiesta de manera expresa en el numeral 6.5.3.8 que no continuará con el seguimiento a las contingencias 1, 2 y 3, respecto a las contingencias 4 y 5, en las páginas 306 y 324 del C.T. 4801 la Autoridad Ambiental indica que considera que el evento de contingencia ha sido atendido, razón por la cual, no continuará haciendo seguimiento, adicionalmente recomienda continuar con el monitoreo topográfico de los taludes asociados a las contingencias y solicita reportar como medida de monitoreo del riesgo dentro de los ICA en cumplimiento de las medidas de la Ficha de Manejo MS-2 Manejo y recuperación de taludes de corte y terraplén. Por lo anterior, esta interventoría recomienda al Contratista solicitar a la ANLA confirmar si de acuerdo con lo señalado en el concepto técnico, no se requiere continuar con el reporte de los informes trimestrales de las contingencias 4 y 5. En cuanto a la Contingencia 6 (K10+518 al K11+600), en el mencionado concepto técnico, la ANLA establece lo siguiente: "Toda vez que en la visita realizada por esta Autoridad Nacional los días 15 y 16 de mayo de 2025, se evidenció el desarrollo de obras de estabilización del talud cerca del K11+600, se determina que la Sociedad debe realizar el los reportes parciales incluyendo las actividades ejecutadas hasta la finalización de la obra, así mismo, toda vez que existe una condición de riesgo inminente, la Sociedad debe presentar el informe de ejecución de las actividades geotecnias de control utilizadas, en este caso por análisis topográfico el cual fue el método adoptado por la Sociedad. Posterior a la finalización de la contingencia debe reportar de forma trimestral mediante reportes de recuperación ambiental los resultados del control geotécnico del talud al igual se incluirlos como medida de monitoreo del riesgo dentro de los informes de Cumplimiento Ambiental asociado a la ficha del Plan de Manejo Ambiental MS-2 Manejo y recuperacion de taludes de corte y terraplén. Adicionalmente, la Sociedad debe realizar los reportes parciales de las actividades ejecutadas mediante la plataforma VITAL utilizando el Formato Único para el reporte de contingencias ambientales en cumplimiento del artículo primero de la Resolución 1767 de 2016, al igual realizar estos reportes en los plazos establecidos en artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016. Conforme a la información remitida por la Sociedad esta Autoridad Nacional considera que el evento de contingencia se encuentra en atención, razón por la cual, se continuará haciendo seguimiento a la contingencia registrada con número VITAL 4100080021580723010 y radicado ANLA 20236200482422 del 15 de agosto de 2023." Por lo anterior, se solicita al Contratista informar a la Interventoría el procedimiento que llevará a cabo ante la ANLA, teniendo en cuenta que Construcciones El Cóndor ya había presentado un informe de cierre y un primer informe trimestral de la contingencia, mientras que la Autoridad Ambiental indica que evidenció el desarrollo de obras de estabilización del talud cerca del K11+600 y determina que se debe realizar los reportes parciales incluyendo las actividades ejecutadas hasta la finalización de la obra.

Mediante comunicación Putumayo04-6893-25 del 22 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Respuesta comunicado 312-168-20250709001867 (04-6179-25-M2). Gestión adelantada frente a la información del polígono licenciado y sustraído – Proyecto Variante Mocoa – San Francisco – Frente Mocoa. En respuesta a su comunicado del asunto, mediante el cual indica que con el propósito de dejar constancia de las gestiones realizadas por parte de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. como titular de la Licencia Ambiental en el frente Mocoa relaciona la trazabilidad respecto a los actos administrativos de la Autoridad Ambiental y gestiones realizadas por parte del Contratista, nos permitimos manifestar tal como es de su entero conocimiento el pasado 11 de julio de 2025, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, Interventoría y Contratista, en la cual la Interventoría presentó la trazabilidad de la localización del comodor sustraído por la DBBSE y el publicado en la plataforma AGIL de la ANLA, enfatizando en que hace más de un año fue radicado al INVIAS el documento con la aclaración del sistema de coordenadas, de acuerdo con el compromiso adquirido por la Interventoría y el Contratista en junio de 2024. Como conclusión de la reunión el área jurídica de la Subdirección de Sostenibilidad evaluará la estrategia para abordar con el MADS esta definición que es prioritaria para el desarrollo del proyecto. Cabe anotar que en la reunión del 11 de julio, el Contratista manifestó que solicitó a la DBBSE el pronunciamiento respecto al polígono sustraído y cuya copia fue solicitada por la unidad ejecutora del INVIAS, sin que a la fecha haya sido recibido por parte de esta Interventoría, por lo que le solicitamos remitir este soporte.

Mediante comunicación Putumayo04-6894-25 del 22 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Reporte de contingencia de riesgo inminente en el K10+950. Teniendo en cuenta que en la mesa de trabajo efectuada el 21 de julio de 2025, con participación del Contratista e Interventoría, se analizó el evento ocurrido en el K10+950 por fuera del polígono ambiental y el Contratista se comprometió a reportar el evento como contingencia de riesgo inminente ante la ANLA, Corpoamazonia, oficina de gestión del riesgo municipal y la DBBSE del MADS, aclarando que este evento se generó por el aprovechamiento forestal realizado por un tercero en predios por fuera de la franja ambiental y por las alta precipitaciones en la zona, solicitamos se remitan los soportes del reporte ante las diferentes entidades.

Mediante comunicación Putumayo04-6895-25 del 22 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Incumplimiento de la ficha MC-5 Manejo de vertimientos y MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción. En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, durante la inspección rutinaria realizada en los frentes de obra, la Interventoría evidenció que en el K10+370, los residuos de combustibles y aceites generados en el taller de mantenimiento de equipos menores en el sector Campucana, no están siendo captados y controlados adecuadamente. Igualmente, se observan estructuras expuestas a la intemperie por periodos prolongados, lo que puede provocar su oxidación y deterioro. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se requiere a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A proceder de forma inmediata con la implementación de las medidas correctivas necesarias. Para tal efecto, se concede un plazo perentorio de tres (3) días calendario al recibo del presente comunicado, para que se remita a la Interventoría, la relación de las medidas implementadas, sin perjuicio del cumplimiento a las obligaciones establecidas en el PMA y en la Licencia Ambiental, las cuales son de entera responsabilidad del Contratista.

Mediante comunicación Putumayo04-6896-25 del 22 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Incumplimiento de la ficha MH – 1 Manejo Escorrentía Superficial. En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, durante la inspección rutinaria realizada en los frentes de obra, la Interventoría evidenció que en el K10+390 margen derecha puente Campucana, las aguas provenientes de escorrentía superficial no cuentan con un sistema de control que permita la disipación de energía y la adecuada retención de sedimentos antes de su descarga, lo cual puede generar procesos de erosión, afectación de cuerpos receptores y colmatación de estructuras de drenaje aguas abajo donde se encuentra ubicada la quebraba Campucana. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se requiere a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A proceder de forma inmediata con la implementación de las medidas correctivas necesarias. Para tal efecto, se concede un plazo perentorio de tres (3) días calendario al recibo del presente comunicado, para que se remita a la Interventoría, la relación de las medidas implementadas, sin perjuicio del cumplimiento a las obligaciones establecidas en el PMA y en la Licencia Ambiental, las cuales son de entera responsabilidad del Contratista.

Mediante comunicación Putumayo04-6897-25 del 22 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Seguimiento de la ANLA a la Ficha MC-6 Manejo sistemas de abastecimiento de agua. Como es de su conocimiento, en el Concepto Técnico 4801 del 02 de julio de 2025, el cual hace parte integral del Acta N°429 del 04 de julio de 2025, la ANLA indica que: "Se indica por parte de profesionales de la empresa que el agua se lleva a la obra por carrotanques de un lago ubicado en el predio Vijagua, de la vereda Pueblo Viejo, del Municipio de Mocoa, el cual Construcciones El Cóndor como contratista del INVIAS, cuenta con la Resolución 0794 de 2022 de CORPOAMAZONIA, la cual otorgó permiso de concesión de aguas superficiales para el desarrollo vial del Putumayo cuyos usos autorizados corresponden al: industrial (Humectación de vías, Mezcla de materiales granulares, elaboración de concretos, lavado de vías, actividades de compactación y conformación de las estructuras que conforman la vía, instalación y colocación de mezcla asfáltica, servicios de unidades sanitarias entre otros) y doméstico. Sin embargo, es importante exaltar el PARAGRAFO del ARTICULO 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, donde menciona qué: "Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere a Construcciones el Cóndor utilizar las concesiones de aguas establecidas en el artículo segundo de la Resolución ANLA No. 1106 del 30 de mayo de 2003." Por lo anterior, se recomienda a Construcciones El Cóndor evaluar la sugerencia emitida por la ANLA sobre utilizar las concesiones de aguas establecidas en el artículo segundo de la Resolución ANLA No. 1106 del 30 de mayo de 2003.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

El 17 de julio del 2025, se realizó una mesa de trabajo entre las áreas predial y ambiental del Contratista e Interventoría con participación del gestor predial de la SS-INVIAS, en la cual la Interventoría manifestó que de la información predial presentada por el Contratista sobre los predios de la inversión forzosa de no menos del 1%, solo hace falta incluir los certificados de libertad y tradición. En cuanto a los sobrevuelos de los predios para la caracterización de cobertura vegetal, se han realizado 2 y se encuentran pendientes 3, los cuales se realizarán tan pronto las condiciones climáticas lo permitan.

El 21 de julio de 2025, se realizará una mesa de trabajo entre las áreas técnica y ambiental de Contratista e Interventoría, con el fin de revisar lo relacionado con el deslizamiento ocurrido en el K10+950 y la recomendación de la Interventoría de reportar este evento como una contingencias de riesgo inminente ante la ANLA.

ACTIVIDADES DEL AREA AMBIENTAL

- Se actualizó el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz Cumplimiento Ambiental Actos Administrativos, teniendo en cuenta lo señalado en el Acta de oralidad ANLA No. 429 del 04 de julio de 2025.
- El 21 de julio de 2025, el Contratista radicó en VITAL la contingencia de riesgo inminente del K10+950 al 11+000.
- Se solicitó al Contratista informar a la Interventoría el procedimiento que llevará a cabo ante la ANLA respecto a la Contingencia de riesgo inminente del K10+518 al K11+600, teniendo en cuenta que Construcciones El Cóndor ya había presentado un informe de cierre y un primer informe trimestral de la contingencia, mientras que la Autoridad Ambiental indica que evidenció el desarrollo de obras de estabilización del talud cerca del K11+600 y determina que se debe realizar los reportes parciales incluyendo las actividades ejecutadas hasta la finalización de la obra.
- Se remitieron al Contratista unas observaciones sobre el incumplimiento de la fichas del PMA MC-5 Manejo de vertimientos, MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción y MH – 1 Manejo escorrentía superficial.
- Se recomendó al Contratista evaluar la sugerencia emitida por la ANLA sobre utilizar las concesiones de aguas establecidas en el artículo segundo de la Resolución ANLA No. 1106 del 30 de mayo de 2003.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

MC – 3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción
- Se realizó mantenimiento de los diques de acopio de sustancias peligrosas.
- Se realizó la construcción de diques para cambio y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos.

MC – 4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales
- Se realizó la recolección de residuos sólidos en la vía desde el K9+900 hasta el K11+800, se retiraron los residuos de los puntos ecológicos y se realizó el debido cambio de bolsas de acuerdo al código de colores de cada recipiente.
- La empresa Emas realizó la recolección de residuos sólidos acopiado en el planta Mocoa para su disposición final.

MS-1 Manejo ambiental de las zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación – ZODMES
- Se verificó que el material se cargue directamente en el volcó del vehiculo que lo transporta y que no exceda el límite permitido para evitar derrames del material sobre la vía.
- Se inspecciona que las volquetas que transportan el material realicen el carpado previo a su desplazamiento a la ZODME, para evitar la dispersión de particulas en la vía.

MS-4 Manejo ambiental de explosivos y voladuras
- Previo a las voladuras realizadas a cielo abierto en el K11+000 - K11+400, se realizó un recorrido de verificación y revisión de la presencia de fauna que se pudiera verse afectada por la actividad.

MH-1 Manejo de escorrentía superficial
- Se realizó limpieza y descolmatación de cunetas y obras hidraulicas existentes en los K9+800-K10+500.

B-2 Salvamento de especies valiosa epifitas vasculares
- Se realizaron actividades de busqueda de epifitas vasculares en el K11+600.

B-5 Control ambiental de la remoción vegetal, descapote y disposición de desechos vegetales
- Se realizaron actividades de repique de material vegetal en el talud K11+600.

B-10 Ahuyentamiento y rescate de fauna
- Se realizó el ahuyentamiento de fauna mediante puntos de olor con recipientes de creolina y se realizo uso de vuvuzelas en el K11+600.

AREA SST

COMUNICACIONES:

Mediante comunicación Putumayo04-6863-25 del 17 de julio del 2025, se radica a contratista, APREMIO 1– Incumplimiento normativo en actividad de voladura y no atención de requerimientos previos

Mediante comunicación Putumayo04-6872-25 del 18 de julio del 2025, Se emite a contratista Solicitud de asignación de Auxiliar de SST – Frente de trabajo Trampolín

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Durante la semana del 17 de Julio al 23 de julio de 2025, la Interventoría realizó recorridos en obra para verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en el Contrato de Obra No. 964-2021, así como el seguimiento a acciones correctivas y preventivas.
Estas actividades se desarrollaron en el marco del Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.33, que obliga al empleador a definir e implementar acciones correctivas y preventivas con base en los resultados del SG-SST.

ACTIVIDADES DEL AREA SST

El dia 17 de julio se elaboró y envió un comunicado a la contratista Construcciones en Cóndor, solicitando la asignación de auxiliar SST para el frente de trabajo del Trampolín.

El dia 17 de julio se participó en una reunión de seguimiento a la gestión SST convocada por la empresa Interdiseños, en la cual se reiteró la importancia de subir la documentación al Drive institucional.

El dia 17 de julio En visita a obra se evidenció que los trabajadores estaban ejecutando actividades bajo fuertes lluvias, y además, que se estaba descendiendo un equipo por una pendiente sin acceso adecuado al talud. Se realizaron las respectivas recomendaciones a la auxiliar y al residente SST de la contratista.

El dia 21 de julio en el recorrido se evidencia que se va a realizar actividad de voladura. Durante la verificación, se identifica que el conductor encargado del transporte de explosivos no cuenta con el certificado de capacitación del SENA requerido para dicha labor.Se emite la recomendación correspondiente al Residente SST de la contratista, quien manifiesta que actualmente están capacitando a un trabajador para esta actividad.

El dia 21 de julio Se realiza observación al Residente SST sobre el uso de chalecos por parte de personal de la contratista Cóndor, los cuales ya no están aprobados ni autorizados para su uso dentro del proyecto.

El dia 22 de julio Se realiza revisión de la documentación del personal asignado a labores nocturnas por parte del proveedor Villalobos, evaluando el cumplimiento de requisitos legales, formativos y de seguridad.

El dia 22 de julio Se identifican frentes de trabajo (realización de "quesones") con deficiencias en ventilación e iluminación. Se realizan las observaciones respectivas al Auxiliar SST de la contratista y a la Auxiliar SST del proveedor Sermar para la pronta corrección de dichas condiciones.

El dia 22 de julio Se realiza inspección en sitio de vehículos utilizados en obra.

Por parte de la contratista continúa implementando pausas activas antes del inicio de las actividades diarias, se evidencia la entrega adecuada de elementos de protección personal (EPP) por parte de la contratista.

Por parte de la contratista, se mantienen en ejecución las inspecciones programadas según el cronograma de seguridad.

AREA PREDIAL

COMUNICACIONES:

Mediante comunicación Putumayo04-6898-25 del 22 de julio del 2025, se remite a Construcción el Condor Respuesta a comunicados; 312-168-20250204001692 (04-5691-25), 312-168-20250304001725 (04-5786-25), 312-168-20250404001759 (04-5863-25), 312-168-20250505001780 (04-5921-25), 312-168-20250605001815 (04-6063-25) y 312-168-20250704001856 (04-6151). Entrega - Informes mensuales de Gestión Predial-Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio-2025.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

se realiza mesa de seguimiento predial al contrato 964 contratista e interventoria

ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL

313-I-T4-CMMVSFM: (Predio requerido para la Estabilización del talud K3+100 - sector4) el 23/05/2025 la SS de INVIAS remite la oferta formal de compra 2025S-VBOG-033354 y el 10/06/2025 Notificación personal de la oferta de compra, misma que fue aceptada por los propietarios, en inscripción de oferta y en elaboración minuta de escritura.

315 I-T4-CMMVSFM: (Predio requerido para la Estabilización del talud K3+100 - sector4), el 13/05/2025 la SS de INVIAS remite la oferta formal de compra 2025S-VBOG-029468 y el 10/06/2025 Notificación personal de la oferta de compra, misma que fue aceptada por los propietarios, en inscripción de oferta y en elaboración minuta de escritura.

001-M-ID-T3-CMMVSFM: El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 2025S-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, se devuleve insumo con observaciones para ser complementado (Diagnóstico jurídico).

002-M-ID-T3-CMMVSFM: El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 2025S-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, se devuleve insumo con observaciones para ser complementado (diagnóstico jurídico).

• Están pendientes de dirección por parte del componente ambiental para definición la gestión pertinente sobre los 5 predios seleccionados por la corporación ambiental que cumplen con la cuota ambiental en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas, inversión forzosa de no menos del 1% para el proyecto. Se egeneró actualizacion jurídica y verificación por parte del consorcio.

No.	PROPIETARIO	CONCEPTO TÉCNICO	MATRICULA INMOBILIARIA	DIRECCIÓN/ NOMBRE	ÁREA PREDIO	CONDICIONES
1	EFREN NEMECIO BRAVO ARAUJO	CT-DTP-0965-23	440-11848	San Isidro	10 Ha + 0000 M2	Presenta área mínima, puede requerir gestiones adicionales para cumplir con áreas mínimas requeridas. Dentro de zona de resguardo indígena.
2	MARINA EULOGIA BRAVO ARAUJO	CT-DTP-0966-23	440-31230	San Isidro	42 Ha + 9500 M2	No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena.
3	LAURENCIO GELPUT PEJENDINO - MARCIANA URBANO RUIZ	CT-DTP-0967-23	440-1991	Finca 3	15 Ha + 0000 M2	L No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena. Puede requerir áreas adicionales para cumplir con mínimos requeridos.
4	JOSE IVAN GELPUT URBANO	CT-DTP-0968-23	440-57022	San Martin	30 Ha + 0000 M2	No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena.
5	MERCEDES ARAUJO DE BRAVO	CT-DTP-0969-23	440-13280	San Martin	9 Ha + 1125 M2	No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena.

• Se cuenta con la aprobación del diseño Geométrico del Km 10+600 al Km 11+600 de los siguientes volúmenes: I ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO, II ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, III ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA, V ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES, VI ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO, VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION Y XI VIAS INDUSTRIALES. Los Volúmenes IX ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y X ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado	% avance Anterior	% avance actual
1	260-ID-T4-CMMVSFM	440-16413	K10+021.90 I	K10+035.70 I	0 Ha+ 500,67 m²	Minuta de escritura con vistos buenos de conformidad por la territorial de INVIAS Putumayo	73%	73%
2	264-SP-ID	440-14323	K9+315,65 I	K9+715,82 I	0 Ha + 5802.01 m²	Escrituras Pública de Compraventa No. 1122 del 02-09-2024 - Registrada a favor de la Entidad - En trámite de pago, se radico ante el IGAC solicitud asignación cedula catastral independiente	96%	96%
3	264A-ID-T4-CMMVSFM	440-66137	K9+286.83 I	K9+315.65 I	0 Ha + 0536.20 m²	Publicada en la página web de la entidad la notificación por aviso de la Resolución de Expropiación número 1712 DEL 20-MAY-2024	62%	62%
4	264B-T4-CMMVSFM	N.A	K9+315,65	K9+407.93	N.A	Mejoras adquiridas a favor de INVIAS y pagadas	100%	100%
5	285-SP-I	440-49052	K 7+133,33 I	7+484,40 I	0 Ha + 4186.27 m²	Escrituras Pública de Compraventa No. 1125 del 02-09-2024 -Registrada a favor de la Entidad. En trámite de pago	96%	96%
6	286-SP-ID	440-52636	K 6+539,63 D	K 7+066,67 I	1Ha +2661.23 m²	Oferta formal de compra notificada y aceptada, en inscripcion de oferta, y en elaboración minuta de escritura.	54%	54%
7	288-SP-ID	440-3969	K 6+300,51 I	K 6+538,84 I	0 Ha +2002.92 m²	Escrituras Pública de Compraventa No. 1154 del 06-09-2024 - Registrada a favor de la Entidad. En trámite de pago, se radico ante el IGAC solicitud asignación cedula catastral independiente	96%	96%
8	314-ID-T4-CMMVSFM	440-35538	K3+116,83 D	K3+129,28 D	0 Ha +0255.77 m2	En publicación de la página web de la entidad la notificación por aviso de la Resolución de Expropiación.	62%	62%
9	338-D	440- 8790	K2+339.71 D	K2+378.48 D	0 Ha +0431.63 m²	Minuta de escritura con vistos buenos de conformidad por la territorial de INVIAS Putumayo	73%	73%
10	355D	440-17395	k2+117.09	k2+167.64	0 Ha +00356.66 m²	El 13/05/2025 la SS de INVIAS remite el alcance a la oferta formal de compra, se remitió a la Gobernación citación para notificación de Oferta Formal de Compra. (Recibido Radicado PQRD - 20250610-E-003300)	46%	46%

Para el Sector 3 se requieren 22 predios de los cuales 18 corresponden a predios sin antecedentes registrales y 4 predios con titularidad plena, acorde con la gestión adelantada hasta la fecha los predios se encuentran en el siguiente estado:

Se cuenta con la aprobación del diseño Geométrico del Km 10+600 al Km 11+600 de los siguientes volúmenes: I ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO, II ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, III ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA, V ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES, VI ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO, VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION Y XI VIAS INDUSTRIALES. Los Volúmenes IX ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y X ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL

001-M-ID-T3-CMMVSFM: El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 2025S-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, se revisaron ya aprobaron los inumos juridicosa 002-M-ID-T3-CMMVSFM

13 predios cuentan con permisos de Intervención Voluntario: 001-M-ID-T3-CMMVSFM, 002-M-ID-T3-CMMVSFM, 003-M-ID-T3-CMMVSFM, 004-M-ID-T3-CMMVSFM, 005-M-ID-T3-CMMVSFM, 006-M-ID-T3-CMMVSFM, 007-M-ID-T3-CMMVSFM, 008-M-ID-T3-CMMVSFM, 009-M-ID-T3-CMMVSFM, 010-M-ID-T3-CMMVSFM, 011-M-ID-T3-CMMVSFM, 012-M-ID-T3-CMMVSFM Y 015-M-ID-T3-CMMVSFM.


Dos (2) Predios cuentan con la no objeción de los Informes de Avalúo Comercial elaborados por parte de la Lonja De Propiedad Raíz De Nariño Y Putumayo y las Ofertas Formales de Compra radicadas en interventoria para su revisión y aprobación de los predios 313-I-T4-CMMVSFM y 315 I-T4-CMMVSFM.

Se requiere genearar los avalúos comeciales de los predios aprobados para continuar con las gestiones pertinentes de compra de mejoras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar atención de emergencias de la via existente Mocoa – San Francisco Trampolin de la biodiversidad.
* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K10+600 a K11+580 en margen izquierda y desde K10+600 a K11+360 margen derecha.
* Explanación y perfilamiento de taludes entre K11+360 a mayores margen izquierda
* Construcción de Muro 1 K10+792.36/835.03 MD
* Construcción de Muro 2 K10+855,44/884,61 MD
* Construcción de Muro 3 K10+956,26/989,78 MD
* Construcción de Muro 4 K10+999,64/11+049,45 MD
* Construcción de Muro 6 K11+240,14/281,22 MD
* Construcción de Muro 7 K11+430,62/460,01 MD
* Exploración geotécnica en sector 3
*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.
*Atención a observaciones de interventoría a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.
*Culminar Recorrido en Obra, Mesa de trabajo, Hidraulica e Hidrologia sector No.3
*Revisión de resultados exploración Geotecnica, según nuevas perforaciones.
* Revisión documental
* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra
• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• El 24 de julio del 2025, se realizará una reunión con la gestora ambiental de la SS-INVIAS, Contratista e Interventoría, con el fin de revisar el requerimiento 4 del Acta N°429 del 04 de julio de 2025, sobre la ZOOME Guaduales y las acciones que se van a implementar para su cumplimiento.
• El 24 de julio del 2025, se realizará una mesa de trabajo entre las áreas predial y ambiental del Contratista e Interventoría con participación del gestor predial de la SS-INVIAS, con el fin de revisar el avance en los sobrevuelos a los predios de la inversión forzosa de no menos del 1% y el análisis de la cobertura vegetal de los mismos.
* Realizar recorridos de campo.
* Verificación de cumplimiento a los estándares de seguridad contrato de obra 964-2021.
*Inspeccion de sistemas de proteccion contra caidas.
* Inspeccion de equipos y herramientas.
* Ejecución por parte del contratista de capacitaciones en trabajo seguro en alturas para el personal operativo.
* Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

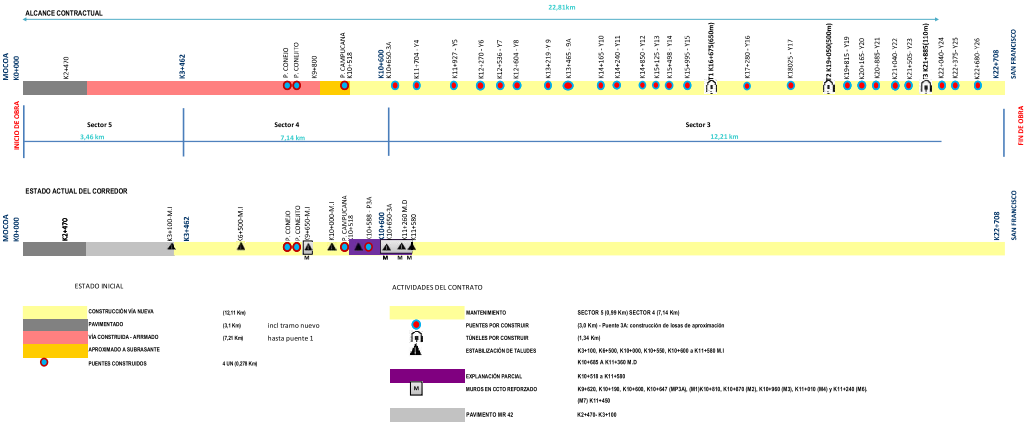

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento vía existente El Pepino - San Francisco - remoción de derrumbes



Muro 4 K10+999/11+049 M.D: Módulo 4: fundición de viga cabezal



Talud 3 K10+79/870 MI: talud mixto anclajes activos y pernos autoperforantes en la terraza 2



Talud 7 M.D K11+145/245 prueba de carga a anclaje C#9 en terreno natural



Talud 9A (K11+445/535) MI: estabilización terraza 2 línea C

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realizan requerimientos permanentes al Contratista al respecto del avance de las actividades contractuales.	
Se emiten comunicaciones permanentes al contratista encaminadas a reiterar las obligaciones contractuales y se hace seguimiento a lo pertinente.	
Se programa y coordina los comités de seguimiento semanal con el Contratista y se generan compromisos cuyo cumplimiento se evalúa en la semana siguiente.	
Seguimiento y control de la calidad de los materiales utilizados en las actividades realizadas en obra de acuerdo con las Normas establecidas por INVIAS	FIRMA
Seguimiento y supervisión permanente a las actividades de obra desde las áreas técnica, ambiental, social, predial y SST	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Seguimiento, medición y control de calidad permanente en campo de las actividades en ejecución.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 30/7/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 213 (Numeración consecutiva) del 24/7/2025 al 30/7/2025 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 12,97 Km de vía nueva que contemplan 31 puentes con una longitud total de 2,39 Km y 2 túneles en una longitud total de 0,33 Km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Intervención para terminación de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 10,5 Km entre la abscisa K0+000 al K10+518 incluyendo 3 puentes correspondiente al Sector 4. Durante el presente contrato se ejecutó la terminación de explanación y estabilización de talud K10+518 - K10+600 del sector 4 (Talud Campucana). Pendientes por construir el tramo comprendido entre el K10+600 al K23+571,17 que corresponden al sector 3, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 -K11+600. la propuesta indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+811 con una longitud total de 12.211,20 m que contempla 7.770,50 m de intervención a cielo abierto; 24 puentes de longitud sumada 3.180,50 m y 3 túneles de longitud sumada 1.260, 00 m.

Una vez desarrollada la propuesta radicada y previa revisión de Interventoria se ajusta el alineamiento al tramo K10+598 - K22+708 con una longitud total de 12.11 m que contempla 7.770 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 2.998,5 m y 3 túneles de longitud sumada 1.342,00 m.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A – 100%

CONTRATO No.	964 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 541.389.953.817,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 541.389.953.817,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 8.030.482.547,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 2.068.059.346,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.962.423.201,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%
CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%
GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.000	$ 63.144.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.001	$ 62.906.720.914
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 237.279.086
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ -	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63.168.000.000	$ 63.192.000.000	$ 67.680.000.000	$ 63.168.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3.993.387.435			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 59.174.612.565			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.600.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.885.109.518			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.714.890.482			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 54.144.000.000	$ 94.752.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 130.869.335.568,00
(Indicar valores en pesos) 23.307.281.180,00 = $ 114.964.471,00

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (INICIAL) (A)	$ 483,413,463,218.00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.5:	$ 347,184,964,001.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.535.039.584,00	23,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113.562.054.388,00	23,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (972.985.196,00)	-0,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños)	$ 23.422.145.651,00	40,40%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 144.228.541.844,82	26,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 136.984.200.039,00	25,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.244.341.805,82)	-1,34%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 996.967.139,75	0,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.352.707.246,00	0,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Julio de 2025
VALOR FACTURA: $ 3,371,199,258,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Acta de Obra No.49 se encuentra en proceso de revisión y conciliación con contratista

Mediante comunicado Putumayo04-6873-25 de 18/07/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de ajustes definitiva No. 47 mayo 2025 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa, la cual día entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-078549 de fecha 18 de julio de 2025

** Datos de costos programados ajustados según reprogramación No 8 (noviembre de 2024) trasladó recursos bolsa obra básica a ajustes*

Inversión total programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	julio 30 de 2025	$	144.228.541.844,82	26,64%
Inversión total ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	julio 30 de 2025	$	136.984.200.039,00	25,30%
Inversión de obra programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	julio 30 de 2025	$	114.535.039.584,00	23,69%
Inversión en obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	julio 30 de 2025	$	113.562.054.388,00	23,49%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a junio de 2025: $ 133.079.638.966,00 — 24,58%
Valor programado acumulado a junio de 2025: $ 138.500.042.511,62 — 25,58%

NOTA: El valor facturado acumulado corresponde al valor acumulado hasta acta de Obra No.48 junio 2025 más el acta de ajustes definitiva de abril 2025

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.875.955.961	41,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.896.309.512	41,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 152,826,774	0,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 152,826,774	0,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE No.62 de 23/07/2025 Acta de Costos No.48 Junio 2025

PERIODO FACTURADO: junio 2025
VALOR FACTURA: $ 632,896,740

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-6900-25 de 22/07/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 48 junio de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-080045 de fecha 22 de julio de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	julio 30 de 2025	$	19.875.955.961,06	41,41%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	julio 30 de 2025	$	19.896.309.511,61	41,45%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a junio de 2025: $ 19.264.648.867 — 40,13%
Valor facturado acumulado junio de 2025: $ 19.285.002.418 — 40,18%

Nota 1: El valor programado acumulado a Diciembre de 2024 se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 6 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-6108-25 con fecha 30 de enero de 2025, Radicado 2025E-VUVRAZ-009997

ANTICIPOS	
Otorgado $	8.030.482.547,00
Amortizado $	2.068.059.346,00
Saldo $	5.962.423.201,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,19
Acumulado:	0,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 23,69% (Inversión programada en obra básica)
Meta Física Ejecutada %: 23,49% (Inversión ejecutada en obra básica)
Avance o Atraso Físico %: -0,20%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo 3	Tramo 4	Corredor	Total	%
EXPLANACIONES	km	7,85	0,65	0,33	Prog	7,77	0,08		7,85	
					Ejec	0,90	0,08		0,98	12,51%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	km	20,34	0,63		Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec	0	0,63		0,63	3,09%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (pavimento hidraulico)	km	20,34	0,63		Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec		0,63		0,63	3,09%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	km	12,21			Prog	12,211			12,21	
					Ejec				0,00	0,00%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	km	20,34			Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec				0,00	0,00%
OBRAS VARIAS	km	20,34			Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec				0,00	0,00%
TRANSPORTES	km	12,39	0,650	0,430	Prog	12,211	0,18		12,39	
					Ejec	0,9	0,18		1,08	8,73%
PUENTES	km	3,21	0,500	0,500	Prog	3,18	0,03		3,21	
					Ejec		0,03		0,03	0,84%
TÚNELES	km	1,26			Prog	1,26	0,00		1,26	
					Ejec		0,00		0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+462 - K10+600
TRAMO Y/O SECTOR 3: K10+600 hacia mayores

Nota: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 3 es de 12.11 Km. (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.19 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto	1	1
Planta de asfalto	1	
Perforador jumbo (3 brazos)	2	
Formaleta para revestimiento tuneles	3	
Andamios para instalación impermeab.	3	
Carro de avance	2	
Perforador jumbo (2 brazos)	3	
Bomba inyección lechada	4	3
Robot de lanzado	4	
Trituradora 80 Ton	1	
Excavadora de orugas	2	2
Compactador neumático	2	
Terminadora de Asfalto	1	
Motoniveladora	2	1
Vibrocompactador	2	1
Volquetas:	10	3
Retrocargador		1
Camioneta		4
Camiones		1
Carro taller		1
Camión combustible		1
Carrotanque de agua		1
Bomba para concreto		1
Buldozer		1
Minicargadores		2
Compresor		5
Generador Eléctrico		2
Planta de generación de energía		4
Equipo para tensionamiento (anclajes)		1
Compactador manual (Canguro)		2
Vibrador manual para Concreto		2
Perforadoras T46 (oruga)		2
Perforadoras T19 (Colgantes)		4
Perforadoras Everdigm		2
Autobomba		
Perforadoras petty (sondeos)		5
Equipo de topografía		2
Equipo para tensionamiento (anclajes)		1
Unidad perforadora con canasta		2
TOTAL		58

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MOCOA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

Se cuenta con Autorización Temporal de materiales de construcción No. 502328 sobre el Río Mocoa, autorizada mediante Resolución 210-4291 del 20 de octubre de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Minería y con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0746 del 26 de mayo de 2023 emitida por CORPOAMAZONIA. Actualmente, se encuentra en proceso el trámite de cesión de la Autorización Temporal por parte del Consorcio CM Putumayo a Construcciones El Cóndor S.A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

La Licencia Ambiental concedida mediante Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008 otorga los permisos de sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, zonas industrial, campamentos, concesión de aguas superficiales, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ocupación de cauce y zonas de disposición final de material sobrante (ZODME).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**364**	**20**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	214	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	150	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	198	11

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 384

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Av.Colombia Cra 9 N. 21 - 108.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	22
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A.
AVALÚOS APROBADOS:	N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A.

OBSERVACIONES:

Las gestiones identificadas preliminarmente, corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. En proceso de elaboración de informe de sostenibilidad de julio de 2025 por parte de la interventoría.
2. En proceso de revisión de informes de marzo, abril y mayo 2025 con la implementación del nuevo formato de cálculo de emisiones.
3. En proceso de elaboración del informe trimestral

AREA TÉCNICA

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-6904-25 de 24/07/2025 Interventoría se permite requerir al Contratista la presentación formal del diseño de prueba de carga para el puente Campucanita (K10+585 – K10+614), cuya ejecución terminó a finales del año anterior y está desarrollando su etapa operativa bajo permanente monitoreo topográfico sin presentar novedad a la fecha. En el mismo sentido se hace necesario en principio homogeneizar el diseño solicitado para implementarlo en los puentes a construir en el tramo K11+600 – K13+480 cuyas longitudes y especificaciones de construcción resultan similares, por tratarse de obras soportadas mediante cimentación profunda con superestructuras en vigas postensadas de luz no mayor a 100 m, de acuerdo con el listado adjunto tomado del informe de diseño geométrico de dicho sub sector:

PUENTE	INICIO	FIN	LONGITUD
Pte Y4	K11+683	K11+728	45
Pte Y5	K11+898	K11+956	58
Pte Y6	K12+259	K12+283	24
Pte Y7	K12+525	K12+548	23
Pte Y8	K12+593	K12+617	24
Pte Y9	K13+188	K13+247	59
Pte Y9A	K13+456	K13+480	24

Se requiere la presentación del mencionado diseño a la mayor brevedad, a fin de coordinar su implementación previo aval del especialista en estructuras de Interventoría, de acuerdo con lo estipulado en la normativa aplicable.

Mediante comunicado Putumayo04-6906-25 del 24/07/2025, Se remite a la Subdirección de modernización de carreteras nacionales Informes semanales No.212 correspondiente al periodo entre el 17 de julio al 23 de Julio 2025 de los contratos de obra 964 y 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-6922-25 de 28/07/2025, se remite respuesta a Construcciones el cóndor de comunicado 312-168-20250725001890 Preocupación retraso en la aprobación del otrosí de la bolsa ambiental requerido para los estudios correspondientes a la modificación de la Licencia Ambiental y Sustracción de reserva forestal. R.I. 04-6222-25 M2.

Mediante comunicado Putumayo04-6923-25 de 28/07/2025, se remite respuesta a Construcciones el cóndor de comunicado 312-168-20250704001857 R.I. 04-6153-25-M2. Afectaciones al Programa de Ejecución de Obras del Proyecto Variante San Francisco - Mocoa, debido a lluvias extraordinarias.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Interventoría desarrolla recorridos permanentes al sitio de las obras a fin de verificar el estado de la obra en los diferentes frentes activos.

El día 23 de julio de 2025 se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra No. 146 con participación de Gestor del proyecto, Contratista Construcciones el Cóndor S.A, Interventoría Consorcio Reactivación Putumayo.

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
1. Radicación solicitud revisión fórmula modelo financiero uso de opción Construcciones el Cóndor S.A.	31/07/2025	Contratista	Dentro del plazo
2. Mesa de trabajo conjunta para revisión estado planos definitivos puente Campucanita	16/07/2025	Contratista - Interventoría	Cumplido
3. Radicación documentación ajustada solicitud creación bolsa ambiental	18/07/2025	Contratista - Interventoría	Cumplido
4. Remisión informe sondeos K14+000 tramo 3 para evaluación de geólogo especialista Interventoría	16/07/2025	Contratista	Cumplido
5. Inspección conjunta muestras material exploración geotécnica K14 a mayores	11/08/2025	Contratista - Interventoría	Dentro del plazo
6. Revisión Precio Unitario Espejos Seguiridad Vial	24/07/2025	Contratista - Interventoría	Dentro del plazo
7. Remisión atención a observaciones taludes T16 a T20	1/08/2025	Contratista	Dentro del plazo
8. Remisión conceptos con observaciones taludes 13 y 13N	24/07/2025	Interventoría	Dentro del plazo
9. Atención observaciones taludes 13 y 13N	1/08/2025	Contratista	Dentro del plazo
10. Remisión observaciones estructuras y fundaciones puentes Y4, Y5 y Y6.	24/07/2025	Interventoría	Dentro del plazo
11. Atención observaciones estructuras y fundaciones puentes Y4, Y5 y Y6	1/08/2025	Contratista	Dentro del plazo
12. Mesa de Trabajo revisión y concertación propuesta técnica y financiera atención afectación punto crítico PR75+400	24/07/2025	Contratista - Interventoría	Dentro del plazo
13. Remisión volumenes socio predial y ambiental primer km tramo 3	21/07/2025	Contratista	Pendiente
14. Mesa de trabajo revisión reporte de contingencia externa evento K10+950	21/07/2025	Contratista - Interventoría	Cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Verificación Cumplimiento de compromisos

2. Avance de las obras

VARIOS

DESARROLLO DEL COMITÉ

Presentación de los profesionales presentes en el comité por parte de Contratista, Interventoría e INVIAS.

1. Verificación cumplimiento de compromisos

1. Radicación solicitud revisión fórmula modelo financiero uso de opción Construcciones el Cóndor S.A.

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

2. Mesa de trabajo conjunta para revisión estado planos definitivos puente Campucanita

Cumplido. Se revisó los planos radicados, los cuales se encuentran en trámite de firma.

3. Radicación documentación ajustada solicitud creación bolsa ambiental

Cumplido. Documentos ajustados radicados ante la SMCN previa suscripción por parte de director territorial INVIAS Putumayo.

4. Remisión informe sondeos K14+000 tramo 3 para evaluación de geólogo especialista Interventoría

Cumplido. Informe en revisión por parte de especialista en geotecnia de Interventoría.

5. Inspección conjunta muestras material exploración geotécnica K14 a mayores

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

6. Revisión Precio Unitario Espejos Seguiridad Vial

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

7. Remisión atención a observaciones taludes T16 a T20

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

8. Remisión conceptos con observaciones taludes 13 y 13N

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

9. Atención observaciones taludes 13 y 13N

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

10. Remisión observaciones estructuras y fundaciones puentes Y4, Y5 y Y6.

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

	FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

11. Atención observaciones estructuras y fundaciones puentes Y4, Y5 y Y6

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

12. Mesa de Trabajo revisión y concertación propuesta técnica y financiera atención afectación punto crítico PR75+400

El compromiso se encuentra dentro del plazo.

13. Remisión volumenes socio predial y ambiental primer km tramo 3

Pendiente cumplimiento. El Contratista indica que remitirá lo pertinente antes del 26/07/25.

14. Mesa de trabajo revisión reporte de contingencia externa evento K10+950

Cumplido. Como producto de la mesa de trabajo, el Contratista se comprometió a reportar la contingencia según la recomendación de Interventoría. Se reportó lo indicado a la ANLA con copia al MADS. Profesional Ambiental de Interventoría solicita que se remita copias de los radicados al CRP.

PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

AREA TÉCNICA

Talud K 10+600-K10660 Talud 1

Talud 1, Km 10+600

Estabilización de talud, terraza 2.

- Perforación anclajes activos, autoperforantes.

Talud K10+820-K10+870 Talud 3

Talud 3, Km 10+840

Estabilización de talud, terraza 2:

- Perforación anclajes y pernos autoperforantes.

Talud K10+870-K10+970 Talud 4

Talud 4, Km 10+910

Estabilización de talud

- Vaciado de dados in situ e instalación de formaleta para construcción de dados, terreno natural, margen derecha+
- Excavación y perfilación terraza 2.

Talud K10+970-K11+010 Talud 5

Talud 5, Km 11+010

Estabilización de talud, terraza 1:

- Vaciado de dados en sitio.

Talud K11+360-K11+445 Talud 8

Talud 8b, Km11+400

Estabilización de talud, terraza 4, que comprende actividades de:

- Perforación de drenes horizontales.
- Construcción dados in situ

Talud K11+445-K11+580 Talud 9

Talud 9, Km11+500

Estabilización de talud, terraza 2, terreno natural:

- Perforación anclajes activos
- Inyección, construccion dados in situ y tensionamiento

Muro 2 K10+855.44-K10+884.61

Muro 2, Km10+870

Sistema de contención:

- Instalación de material seleccionado para relleno módulo 2 y 3.

Muro 4 K10+999.64-K10+049.45

Muro 4, Km11+010

Sistema de contención:

- Vaciado de vástago, primera etapa módulo 2.
- Instalación de acero de refuerzo viga cabezal módulo 4.

Muro 6 K11+240.15-K11+281.22

Muro 6, Km11+260

Sistema de contención:

- Construcción cimentación profunda, avance en Caisson.
- Vaciado de núcleo Caisson 9 y 8

Muro 7 K11+428.56-K11+459.99

Muro 7 Km11+360

Sistema de contención:

- Construcción cimentación profunda, avance en Caisson.

OBRAS TRAMPOLIN

CONSTRUCCION DE BOX CULVERT VIA ALTERNA SANTIAGO

Ø Limpieza y arreglo de alambrados afectados durante mantenimiento de vía alterna

Ø Demolición de Box Culvert existente afectado tráfico de vehículos pesados durante la habilitación de vía alterna

Ø Solado para colocación de módulos Box Culvert

Ø Colocación de módulos prefabricados Box Culvert de 1.5x1.5 metros

Ø Excavación para construcción de aletas de encole-Canalización de aguas para aletas

Ø Atención a emergencia en Santiago Putumayo de vía alterna, retiro de material contaminado. Adición de material en puntos críticos. Conformación de vía alterna en Santiago Putumayo

Remoción de derrumbe: PR77+312 - PR77+290 - PR103+050 - PR76+050 - PR103+200 - PR110+800 - PR76+000 - PR76+800

Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Valor total programado	Valor programado a la fecha	Valor ejecutado a la fecha	Porcentaje programado	porcentaje ejecutado	% ATRASO/ ADELANTO
Talud Campucana K10+810-K10+600	17/06/2025	23/07/2025	$ 177.767.961,59	$174.988.471,70	$177.767.961,59	98%	100%	2%
Talud K10+600-K10+660 Talud 1	22/04/2025	29/07/2025	$ 563.563.418,92	$545.748.165,49	$568.665.517,92	97%	99%	2%
Talud K10+820-K10+870 Talud 3 parte 2	17/06/2025	25/09/2025	$ 2.307.515.285,25	$472.296.457,13	$477.335.145,29	20,5%	21%	0,4%
Talud K10+870-K10+970 Talud 4	22/04/2025	19/07/2025	$ 692.563.296,71	$692.563.296,26	$688.957.950,63	100%	99,5%	-0,5%
Talud K10+970-K11+010 Talud 5	22/04/2025	23/07/2025	$ 426.880.367,42	$424.274.566,95	$426.880.367,42	99%	100%	1%
Talud K11+010-K11+145 Talud 6	09/05/2025	01/09/2025	$ 11.900.485,00	$7.727.536,17	$11.900.485,00	65%	100,0%	35%
Talud K11+145-K11+275 Talud 7	22/04/2025	11/08/2025	$ 732.789.769,16	$703.257.368,50	$693.780.105,16	96%	81%	-15%
Talud K11+275-K11+360 Talud 8 Parte 1	05/05/2025	22/11/2025	$ 1.676.697.739,59	$655.099.683,58	$1.626.809.855,25	39%	97%	58%
Talud K11+360-K11+445 Talud 8 Parte 2	05/05/2025	24/11/2025	$ 2.087.173.734,20	$913.217.819,58	$2.022.971.731,75	44%	97%	53%
Talud K11+445-K11+580 Talud 9	11/06/2025	18/12/2025	$ 13.625.406.103,47	$2.961.229.223,61	$1.547.050.267,36	22%	11%	-10%
Talud K11+580-K11+680 Talud 10	30/07/2025	22/12/2025	$ 8.673.510.964,68	$0,00	$0,00	0%	0%	0%
Talud K11+720-K11+800 Talud 11	05/09/2025	16/12/2025	$ 736.530.669,39	$0,00	$0,00	0%	0%	0%
Puente campucana K30+580-K30+610	22/04/2025	25/07/2025	$ 420.974.911,08	$417.968.340,95	$417.968.340,00	99%	99%	0%
Puente Y4	29/10/2025	22/12/2025	$ 562.034.846,91	$0,00	$0,00	0%	0%	0%
Muro 2 K09+762,36--K09+835,63	25/04/2025	10/12/2025	$ 277.379.382,84	$48.486.125,04	$147.217.531,20	17%	53%	36%
Muro 2 K09+855,44--K09+884,61	03/06/2025	12/11/2025	$ 347.895.731,65	$166.719.969,55	$168.137.632,49	48%	48,3%	0,4%
Muro 4 K09+999,64--K10+049,45	10/07/2025	15/11/2025	$ 573.934.912,45	$47.059.204,56	$132.567.806,23	8%	23%	15%
Muro 6 K11+240,15--k11+281,22	06/09/2025	18/12/2025	$ 1.315.340.736,81	$0,00	$421.984.474,20	0%	32%	32%
Muro 7 K11+428,56--K11+459,99	19/10/2025	10/12/2025	$ 336.008.960,16	$0,00	$15.948.015,60	0%	5%	5%
Muro 8 K11+530,26--K11+587,23	26/08/2025	12/12/2025	$ 487.166.239,26	$0,00	$0,00	0%	0%	0%
Obras varias trampolin	07/01/2025	22/12/2025	$ 4.991.111.563,92	$2.752.230.244,80	$2.835.191.677,80	56%	57%	1%
Actividades explanaciones	16/04/2025	27/12/2025	$ 3.269.112.387,00	$1.229.586.857,68	$1.304.090.921,20	38%	40%	2%
Total			$ 45.233.420.264,00	$12.489.067.149,48	$14.250.086.087,69	27,61%	31,50%	3,89%

Gestor de proyecto solicita a Interventoría hacer seguimiento particular a los frentes de obra que presentan atraso tales como las fases 7 y 9.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Seguimiento Cronograma actividades E&D

Versión actualizada en revisión

TRAMO 2. K13+600

– K23+000

* %Avance Programado (07/07/2025) :25%

* %Avance Ejecutado (15/07/2025) :21,39%

AVANCE AMBIENTAL

REPORTE DE CONTINGENCIAS

- Riesgo Inminente de Erosión, Movimientos en Masa y deslizamiento entre los kilómetros 10+950 y 11+00 se presentó bajo radicado Vital 4100089092244725007 del 21/07/2025.
- Radicada en CAZ bajo número 7887 del 22/07/2025.
- Radicada por correo electrónico en el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
- Reporte parcial de la contingencia 8 (Km8+300 al Km 8+330) con radicado 7300089092244725034 del 22/07/2025.
- Reporte trimestral de la contingencia N°4 con radicado 20256200845632 del 21/07/2025
- Reporte trimestral de la contingencia N°5 con radicado 20256200845692 del 21/07/2025.

SOCIAL

PQRS 98: Rta Carlos Córdoba

PQRS 99: visita predio Roberto Ordoñez

Avance G. Predial Carlos Córdoba.

CONSULTA PREVIA

FECHA: 30/7/2025 (Día / Mes / Año)

RUTA METODOLOGICA

Comunidad Indígena Kamentsá Biya de Sibundoy.

Reunión 24/07/2025: Reunión con el Gobernador del Cabildo, para verificar avance frente a la validación con la asamblea de la RM.

Comunidad Indígena Kamentsá Inga de San Francisco. Reunión para presentación de Ruta Metodológica por parte del Contratista

18/07/2025: reunión SS, INVIAS, Interventoría, contratista revisión de certificaciones procedencia de CP. Operatividad

Reunión de coordinación y preparación: 29 de julio de 2025-indispensable representante del Invias.

Se registró compromiso de enviar comunicado por parte del INVIAS a la DANCP frente a la operatividad de la resolución 1188 de 2022 y CP. Solicitando la reunión de coordinación para ambas resoluciones. (22/07/2025)

ARQUEOLOGIA

Se llevó a cabo actividades de monitoreo y verificación arqueológica durante las diferentes excavaciones y remociones de suelos en los siguientes sectores:

- Entre el Km10+850 al Km10+860 excavación para perfilación de talud.
- Entre el Km11+490 al Km11+520 se realizó excavación para adecuación de la terraza.
- Entre el Km11+430 se realizó excavación manual para la construcción de los caisson del muro 7.

Para este periodo, dentro del programa de arqueología pública, se han adelantado actividades relacionadas con las inducciones al personal que ingreso nuevo a la obra.

GESTIÓN PREDIAL

PREDIOS DERIVADOS DE LOS PASIVOS PREDIALES DEL CONTRATO N° 407 DEL 2010

Dando cumplimiento a las directrices impartidas por El Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la interventoría del proyecto CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO, para el cierre del proceso de adquisición de los pasivos prediales derivados del Contrato No 407 del 2010, a la fecha se tiene que los 10 informes de avalúo comercial corporativo elaborados por la Lonja de propiedad raiz de Nariño y Putumayo, cuentan con la no objeción por parte de la SS de INVIAS, por lo tanto fueron expedidas las ofertas formales de compra.

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado	% avance Anterior	% avance actual
1	260-ID-T4-CMMVSFM	440-16413	K10+021.90 I	K10+035.70 I	0 Ha+ 500,67 m²	Minuta de escritura con vistos buenos de conformidad por la territorial de INVIAS Putumayo	73%	73%
2	264-SP-ID	440-14323	K9+315,65 I	K9+715,82 I	0 Ha +5802.01 m²	Predio Adquirido A Favor De INVIAS Mediante Escrituras Pública De Compraventa No. 1122 del 02-09-2024 Y Pagado El 100%, Se Radico Ante El IGAC Solicitud Asignación Cedula Catastral Independiente	100%	100%
3	264A-ID-T4-CMMVSFM	440-66197	K9+286.83 I	K9+315.65 I	0 Ha +0536.20 m²	Publicada en la página web de la entidad la notificación por aviso de la Resolución de Expropiación número 1712 DEL 20-MAY-2024 , a la espera de constancia de ejecutoria.	62%	62%
4	264B-T4-CMMVSFM	N.A	K9+315.65	K9+407.93	N.A	Mejoras Adquiridas A Favor De INVIAS Y Pagado El 100%	100%	100%
5	285-SP-I	440-49052	K 7+133,33 I	7+484,40 I	0 Ha +4186.27 m²	Predio Adquirido A Favor De INVIAS Mediante Escrituras Pública De Compraventa No. 1125 Del 02-09-2024 Y Pagado El 100%, Se Radico Ante El IGAC Solicitud Asignación Cedula Catastral Independiente	100%	100%
6	286-SP-ID	440-52636	K 6+539,63 D	K 7+066,67 I	1 Ha +2661.23 m²	Oferta formal de compra notificada, aceptada y con inscripción anota ORIP, Minuta de escritura en revision de Interventoria radicado 312-081-2025071680002 70.	54%	58%
7	288-SP-ID	440-3969	K 6+300,51 I	K 6+538,84 I	0 Ha +2002.92 m²	Predio Adquirido A Favor De INVIAS Mediante Escrituras Pública De Compraventa No. 1154 del 06-09-2024 Y Pagado El 100%, Se Radico Ante El IGAC Solicitud Asignación Cedula Catastral Independiente	100%	100%
8	314-ID-T4-CMMVSFM	440-35538	K3+116,83 D	K3+129,28 D	0 Ha +0255.77 m2	En publicación de la página web de la entidad la notificación por aviso de la Resolución de Expropiación, a la espera de constancia de ejecutoria.	62%	62%
9	338-D	440- 8790	K2+339.71 D	K2+378.48 D	0 Ha +0431.63 m²	Minuta de escritura con vistos buenos de conformidad por la Territorial de INVIAS Putumayo, en espera de Paz y Salvo Impuesto predial para radicar a Notaria.	73%	73%
10	3550	440-17395	k2+117.09	k2+167.64	0 Ha +00356.66 m²	El 13/05/2025 la SS de INVIAS remite el aicance a la oferta formal de compra, se remitió a la Gobernación citación para notificación de Oferta Formal de Compra. (Recibido Radicado PQRD-20250610-E-003300) , en Notificación por aviso	46%	46%

Gestor de proyecto consulta acerca del caso particular del predio del señor Carlos Córdoba ubicado en el tramo 3, quien ha presentado quejas por la excesiva demora en el trámite de adquisición de mejoras. Contrartista indica que está pendiente el trámite de concepto de registro en la oficina de Instrumentos Públicos. De otra parte se inició la instalación de plástico sobre el talud expuesto en el mencionado predio.

PREDIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 964 DEL 2021

En consideración el diseño Geométrico PRELIMINAR se adelanta el cumplimiento de las siguientes actividades:

ü Verificación de planchas del IGAC para determinar cédulas catastrales

ü Determinación de Matrícula Inmobiliaria y recopilación de información jurídica

ü Determinación y verificación de: usos de suelo, áreas, propietarios y estado de la titulación.

ü Mediante comunicado 2024S-VBOG-001768 del 17 de enero de 2023, la SS de INVIAS emitió el visto bueno de no objeción AL ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO PREDIAL Y ESTUDIO DEL SECTOR DEL TRAMO 3.

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado
1	313-I-T4-CMMVSFM:	440-78570	K3+126.33 I	K3+133,50 I	0.003142	Oferta formal de compra notificada y aceptada, en inscripcion de oferta, y en elaboración minuta de escritura.
2	315-I-T4-CMMVSFM:	440-78569	K3+102.56 I	K3+126,33 I	0.026867	Oferta formal de compra notificada y aceptada, en inscripción de oferta, y en elaboración minuta de escritura.
3	001-ID-T3-CMMVSFM	N.A	10+504.48 I	10+751.99 I	1.999545	El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado No. 20255-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, el 03-70-2025 Interventoría remite observaciones a los insumos jurídicos (Diagnostico Jurídico)
4	002-ID-T3-CMMVSFM	N.A	10+753.63 I	11+101.14 I	1.986527	El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado No. 20255-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, el 03-70-2025 Interventoría remite observaciones a los insumos jurídicos (Diagnostico Jurídico)

ACTIVIDADES SST

- Inspección equipos para atención de emergencias
- Pausas activas en frentes de obra
- Charlas SST al personal de obra.
- Inducciones en seguridad y salud en el trabajo
- Entrega de elementos de protección personal
- Etiquetado de SQ
- Acompañamiento y supervisión en tareas de alto riesgo

VARIOS

VISITA A CAMPO ESPECIALISTAS EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

Interventoría informa a la Entidad acerca de la visita que se está desarrollando durante la presente semana por parte de especialistas en hidráulica, hidrología y socavación de Contratista e Interventoría, a fin de evaluar en sitio el estado actual de las estructuras de drenaje de los sectores 4 y 5, y sus posibilidades de modificación o repotenciación, además de visitar la zona de depósito Guaduales y el objetivo principal de evaluar la solución técnica más viable al manejo de aguas de escorrentía sobre el sub sector intervenido a la fecha entre el K10+600 y el K11+600, considerando las obras de captación, disipación y entrega a las fuentes de agua aledañas.

Director territorial INVIAS Putumayo y gestor de proyecto solicitanmesa de trabajo presencial con especialistas en hidráulica para el día 23/07/25 en horas de la tarde. Confirmado.

COMITÉ AREA AMBIENTAL

Profesional ambiental de Interventoría indica que se programó comité con gestor ambiental para el día 24/07/25 a las 9:00 a.m. Tema principal : Requerimientos de ANLA según acta de oralidad.

REUNIÓN PRESENCIAL CON MINISTERIO DEL INTERIOR

Se confirma la mesa de trabajo programada con el Ministerio del Interior para tratar es tema de la acumulación de resoluciones. Gestor de Proyecto solicita que se ajuste el insumo presentado por interventoría donde se requiere el concepto de la interventoría técnico y jurídico donde se justifica porque se recomienda la acumulación de resoluciones. Interventoria revisará y ajustará el comunicado según lo requerido a la mayor brevedad.

CRONOGRAMA MODIFICACIÓN ARQUEOLOGÍA

Gestor de proyecto indaga acerca del cronograma de modificación de licencia ante el ICANH. Arqueologa presentará lo solicitado en el siguiente comité.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS TRAMO 4

Interventoría reitera el requerimiento expreso en el sentido de que es necesario adelantar la limpieza manual de obras de drenaje transversal colmatadas en el sector 4, las cuales presentan obstrucción total por cuenta de la intensa ola invernal y los eventos extremos ocurridos durante la primera semana de julio. Contratista indica que no ha intervenido por la condición de seguridad del personal, pero adelantará lo requerido una vez mejoren las condiciones climáticas.

COORDINACIÓN ATENCIÓN EMERGENCIAS VÍA EXISTENTE EL PEPINO - SAN FRANCISCO

La Entidad Contratante solicita mejorar la coordinación logística para atención simultánea de derrumbes y emergencias sobre la via existente El Pepino - San Francisco, por parte de los contratistas Construcciones El Cóndor S.A. y Consorcio San Francisco, particularmente durante la temporada invernal que se está presentando. Se espera que se distribuyan los equipos disponibles a lo largo del corredor en mención y se disponga de operadores en todo momento, siempre priorizando la seguridad de los mismos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Radicación solicitud revisión fórmula modelo financiero uso de opción Construcciones el Cóndor S.A.	31/07/2025	Contratista
2. Inspección conjunta muestras material exploración geotécnica K14 a mayores	11/08/2025	Contratista - Interventoría
3. Revisión Precio Unitario Espejos Seguridad Vial	24/07/2025	Contratista - Interventoría
4. Remisión atención a observaciones taludes T16 a T20	1/08/2025	Contratista
5. Remisión conceptos con observaciones taludes 13 y 13N	24/07/2025	Interventoría
6. Atención observaciones taludes 13 y 13N	1/08/2025	Contratista
7. Remisión observaciones estructuras y fundaciones puentes Y4, Y5 y Y6.	24/07/2025	Interventoría
8. Atención observaciones estructuras y fundaciones puentes Y4, Y5 y Y6	1/08/2025	Contratista
9. Mesa de Trabajo revisión y concertación propuesta técnica y financiera atención afectación punto crítico PR75+400	24/07/2025	Contratista - Interventoría
10. Remisión volumenes socio predial y ambiental primer km tramo 3	26/07/2025	Contratista
11. Mesa de trabajo presencial en INVIAS con especialistas en hidráulica, hidrología y socavación de Contratista e Interventoría. Participa director territorial y gestor de proyecto.	23/07/2025	Contratista - Interventoría - INVIAS
12. Comité ambiental tema : acta de oralidad ANLA.	24/07/2025	Contratista - Interventoría - INVIAS
13. Mesa de Trabajo con MININTERIOR. Tema: Acumulación de resoluciones de procedencia.	29/07/2025	Contratista - Interventoría - INVIAS
14. Remisión concepto Interventoría Acumulación de resoluciones de procedencia ajustado según requerimiento de la Entidad.	23/07/2025	Interventoría
15. Socialización cronograma modificación ante ICANH área Arqueología	30/07/2025	Contratista

FRENTES DE OBRA ACTIVOS

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad):

• Como atención a la emergencia presentada por la pérdida del estribo No.2 del puente sobre río negro PR48+960 ruta 1003 (Vía Nacional), Construcciones el Cóndor es la encargada de realizar el mantenimiento del tramo 1 vía alterna entre Puente Quinchoa, Puente PTAR, Puente 14 • Construcciones el Cóndor continúa los trabajos de entrega del tramo 1 vía alterna entre Puente Quinchoa, Puente PTAR, Puente 14 Balsayaco - (6 Km) y del tramo 2 vereda Bujuyuy hasta el puente El cascajo (2,2 Km), para tal efecto adelanta trabajos de mantenimiento de la vía mediante adición de material granular, conformación y compactación. Construcción de box culvert prefabricado como reemplazo a alcantarillas existentes.

	FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

• PR 80+105 continúa las actividades de excavación manual, nivelación en cidópeo y la construcción de muro en gaviones.

• Remoción de derrumbes PR72+700, PR73+500, PR72+000, PR72+600

Sector 5 (K0+000 a K3+462):

• K0+000 a K3+090 Se realizó la demarcación horizontal (corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento). Este tramo queda en observación por parte de interventoría con el fin de verificar la calidad de la pintura utilizada. Pendiente instalación de señalización vertical.

Sector 4 (K3+462 a K10+600):

• Puente Campucanita K10+588,62 – K10+617,4: Terminado

• Localización de puntos para perforación e instalación de drenes en talud adjunto a calzada (22 drenes, separación 5 metros) y en talud intermedio (11 drenes, separación 8 metros) abscisas: K9+922 a K10+026 margen izquierda.

• Muro de acompañamiento puente campucana K10+530 MD: se realiza localización de caissons y se inicia excavación de los caissons #2, #3, #4, se funde primer anillo. Observación: El caisson #2 presenta asentamiento de anillo fundido hacia margen derecha, se solicita a contratista de manera verbal tomar acciones para la continuidad de actividad.

• Localización de eje para caisson 2, 4 y 6 sobre excavación para armado primera formaleta en muro de contención adjunto a eje 4 puente Campucana abscisa: K10+530 margen derecha.

Sector 3 (K10+600 a K22+511):

• Muro 3A (K10+640/706) MD: Muro terminado con barrera de protección tipo New Jersey h=1,17m, Pendiente diseño de muro de cierre del K10+706 a mayores.

• Muro 1 K10+792.36/835.03 MD: módulo 3 L=9,15 m. Instalado material de relleno en módulos 1, 2, 3 y se instaló tubería de alcantarillo. Pendiente construcción de módulo 4 y new jersey. Nota: corregir tubería instalada en carril derecho por incumplimiento de alineación.

• Muro 2 K10+855,94 – K10+884,61 M,D: Módulos #2 y #3 lleno estructural conformación y compactación material a nivel de viga cabezal, capa 4 de 0,30 espesor por un ancho promedio 3 m

• Muro 3 K10+956,29 – K10+98978 M,D: Sin actividad

• Muro 4 K10+999,64 - K11+049,45 M.D: **Módulo 2 (tipo M8 L=9,15 m):** se realiza la fundición de la segunda elevación de vástago y se realiza la instalación de acero de new jersey. **Módulo 3 (tipo M8 L=9,15 m):** fundida la viga cabezal y se realiza la fundición de primera elevación de vástago. **Módulo 4 (tipo M6 L=9,15 m):** fundida la viga cabezal, se instalan acero de vástago. **Módulo 5 (CS tipo M6 L=12,15 m),** se realiza la excavación, nivelación de piso, se instala solado, se arman acero de dentellón y se funde en concreto de 28 Mpa

• Muro 6 K11+240,15 – K11+281,22 M,D: Caissons h=17 m – ø 1.50 m

Caisson #1: inicia figuración y amarre acero refuerzo fuste
Caisson #2: fundición de fuste h=17 m en concreto de 28 Mpa
Caisson #3: fundición de fuste h=17 m en concreto de 28 Mpa
Caisson #4: inicia figuración y amarre acero refuerzo fuste
Caisson #5: h.excavación=17,00 m (excavación, voladura)
Caisson #6: h.excavación=18,65 m (finaliza excavación)
Caisson #7: h.excavación=17,56 m (finaliza excavación)
Caisson #8: fundición de fuste h=17 m en concreto de 28 Mpa
Caisson #9: Fundido fuste h=17 m en concreto de 28 Mpa
Caisson #10: Fundido fuste h=17 m en concreto de 28 Mpa

• Muro 7 K11+430,62 – K11+460,01 M,D: Se avanza con la excavación manual para construcción de anillos de los caissons, diam= 1,50 m en el módulo 1

Caisson #1: h.excavación=8,0 m, sin actividad
Caisson #2: h.excavación=8,2 m, sin actividad

• Talud 1 K10+600/680 MI terraza 2 – Continúa la instalación de pernos autoperforantes y anclajes activos en zona adyacente a puente campucanita – adicional al diseño. Terraza 2: llenado concreto (lechada) anclajes activos línea B#1,2 línea C#1,2

• Talud 3 K10+790 - K10+870 M.I: (talud mixto) Terraza 2 - pernos autoperforantes (L=25 m) línea A #6-8-10-11-12-14-16-18, línea B # 1-3-5-6-8-10-12-14- 22-20-22-24 línea C # 2-4-6-8-10-11-12-14-16-26-28-30. Perforación anclajes activos (L=30 m): línea A # 3-5-7-9-13-15-17-, línea B # 2-4-7-9-11-13-15-21-23-25, línea C # 1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-27-29. concreto 280 kg/cm2 hormigonado dados en sitio línea A#7,9,13,15,17– línea C#1,3,5,7,9,13,15,17 (dados de 1,20*1,10*0,30--,0,40*0,40*0,25)

• Talud 3 K10+790 – K10+870 M,D: terreno natural - se instalan canstas de acero y formaleta metálica para la construcción de dados en sitio línea A#1 - línea B#1 - línea C#1,2, 6,7,8,9,10,11 - línea D#5,6,7,8,9,10 - línea E#5,6,7,8,9 - línea F# 1 al 9

• Talud 4 (K10+870/970-) MI Talud inferior mixto: se llevan a cabo labores de colocación concreto 280kg/cm2 hormigonado dados en sitio Terraza #2- Línea D#21,25,31,45,47 - Línea C#2 - Línea A#40 / Terraza #1 - Línea F#40

• Talud 4 (K10+853/956-) MD Talud terreno natural: Pendiente terminar tensionamiento de anclajes de 40 Ton L=30 m

• Talud 5 (K10+970-K11+010) MI (talud inferior mixto): Continúan actividad de instalación de pernos autoperforantes (se instalan platinas) y anclajes activos, En sector de área ODT se realiza fundición de dados en sitio en las líneas A y B, y el posicionamiento del anclaje C4, Se realiza la intalación acero refuerzo canastilla para dados en sitio línea G#1,3,5,7

• Talud 6 (K11+010/145) MI Talud inferior: talud terminado

• Talud 7 (K11+145/245) MI: Terraza 2. Terminado. En margen derecha terreno natural se realiza tensionamiento de anclajes en línea C

• Talud 7 (K11+245/275) MI: Terraza 2. Terminado

• Talud 8A (K11+270/360) MI: Terraza 4. Andajes activos L=30 m- terminado instalación de andajes y drenes.

• Talud 8B (K11+360/450) MI: terraza 4, Andajes activos de 40 ton (L=30). Fundición de dados en sitio E#4,7,8,9,13 línea D#16,17,18,19,29,30 línea C#21.

• Talud 9A K11+445 - K11+535 M.I: (Andajes activos L=30 m) - Terreno natural: perforación e instalación de anclajes línea A#1-2-3-4-5-6-7-23-24-25-26-27-28 línea C #2-3-4-5-6-7-24-25-26-27-28-29-30, línea D#2-3-4-5-6-7-8-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 línea E#3-4-5-6-7-8-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 Terraza 1: Sin actividad. Terraza 2: Línea A del #1 al #15 terminados. Línea B: dados fundidos del #1 al #11, Línea C: instalada formaleta del #1 al #11. Instalado torón del #12 al #16. tensionamiento de anclaje activos línea B#1,2,3,4,5,6,7

• Talud 9B K 11+535- K 11+580 MI: Terraza 2, sin actividad

• Explanación y perfilado talud adjunto a calzada entre abscisas: K10+870 a K10+890, traslado de materiales a ZODME Guaduales.

• Explanación vía industrial de acceso a sector 3 abscisas: K11+580 a K10+590, cargue de materiales y transporte hasta abscisa: K11+430 utilizando mini cargadores.

• Localización de ejes de caissons 1 al 6 en muro adjunto a puente Campucana abscisa: K10+430 margen derecha.

• Localización de puntos para perforación e instalación de barras autoperforantes fila E (16 a 48) abscisas: K10+900 a K10+960

• Explanación parcial terraza 2 en talud 9A abscisas: K11+470 a K11+510.

• Replanteo paramentos para terminado de vástago módulo 2 en muro M4 abscisas: K10+999,64 a K10+049,45 margen derecha.

• Replanteo de puntos para excavación módulo 5 en muro M4 y control de excavación.

• Control excavación y replanteo de puntos para fundición solado limpieza módulo 5 en muro M4 abscisas: K10+999,64 a K10+049,45 margen derecha.

• Localización de puntos para perforación e instalación de andajes activos fila C (12 a 18) y fila D (1 a 12) talud 9A terraza 2 abscisas: K11+470 a K11+510.

• Explanación parcial calzada entre abscisas: K10+820 a K10+850, cargue y transporte a ZODME Guaduales.

• Explanación parcial en talud 9A terraza 2 abscisas: K11+470 a K11+500. Repaleo hasta abscisa de cargue K11+430, se efectuó demolición de rocas en esta terraza.

• Localización de eje para caisson 2, 4 y 6 sobre excavación para armado primera formaleta en muro de contención adjunto a eje 4 puente Campucana abscisa: K10+530 margen derecha.

• Localización descole O,D,T, Abscisa: K11+020 sobre vástago muro de contención M6 modulo 4.

• Instalación de mojones para control construcción puente Y4 abscisa: K11+680.

• Explanación parcial en talud 9A terraza 2 abscisas: K11+470 a K11+500. Repaleo hasta abscisa de cargue K11+430, se efectuó demolición de rocas en esta terraza.

AREA TOPOGRAFÍA

24/07/2025: Verificación nivel de excavación caissons 1 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15-K11+281.22 margen derecha. Altura 17 metros.

24/07/2025: En oficina se efectuó revisión de cantidades para pre acta correspondiente al mes de julio de 2025 con topógrafo del Contratista.

25/07/2025: Verificación nivel de refuerzo instalado en caisson 3 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15-K11+281.22 margen derecha.

25/07/2025: Revisión documental referente a muro de contención adjunto a puente Campucana abscisas: K10+530 margen derecha.

25/07/2025: Se digitó formatos de chequeo equipos (bimestral), se entrega información en medio magnético a auxiliar de ingeniería del C.R.P.

26/07/2025: Revisión geometría de zarpa localizada en muro 4 modulo 5 previo a fundición solado de limpieza, se efectuó ajustes en la localización para cumplir con curvatura paramentos de vástago.

28/07/2025: Revisión de eje y geometría primera formaleta caissons 2, 3 y 4 localizados en muro adjunto a puente Campucana abscisa: K10+530 margen derecha.

28/07/2025: Chequeo nivel de solado de limpieza modulo 5 en muro M4 abscisas: K10+999,64 a K10+049.45 margen derecha.

29/07/2025: Nivelación y marcación de cotas sobre formaleta inicial de caissons 3 y 4 en muro adjunto a puente Campucana abscisa: K10+530 para control de excavación.

29/07/2025: Monitoreo puntos ubicados sobre puente Campucanita abscisas: K10+585.45 a K10+614.25, no se evidencia desplazamiento vertical de estructura.

29/07/2025: Nivelación para chequeo cota refuerzo instalado en caisson 1 localizado en muro M6 abscisas: K11+240.15 a K11+281.22, nivel cumple diseño.

30/07/2025: Se colectó información de campo referente a avance de perforaciones e instalación de torones en terreno natural arriba corona de talud 9 abscisas: K11+440 a 11+580 margen izquierda, se entregó esta información a auxiliar de ingeniería del C.R.P.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

24/07/2025: Se realiza toma de cilindros y asentamiento de concreto tremie para el núcleo caisson, Muro 6, Caisson 2, modulo 1 Km11+260, concreto tremie, C. Der

24/07/2025: Se realiza toma de cilindros y asentamiento de concreto convencional para el vástago, segunda elevación, Muro 4, Modulo 2, Km11+030, C. Der

24/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 28 días del concreto acelerado para dados vaciados en sitio, talud 4, terreno natural, fila B,C,D, Km 10+890

24/07/2025: se realiza ensayo de compresión de núcleos de concreto lanzado K11+500/450, terraza 2, talud 9, fila B entre anclajes B1 al B16. lado izq

25/07/2025: Se realizan ensayos de dasificación a los agregados finos " arena, dasificada, triturado y mixta", utilizada en los concretos

25/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 28 días, concreto convencional para el vástago, segunda elevación, Muro 2, Modulo 2 Km10+870.

25/07/2025: se realiza ensayo de compresión de cilindros de concreto a 7 días, del Concreto convencional para vástago, primera elevación, Muro 4, Modulo 2, Km11+030, C. Der

28/07/2025: Se realizan ensayos de dasificación al agregado fino " arena dasificada", utilizada en los concretos.

28/07/2025: Se realiza desgaste en máquina de los ángeles del agregado grueso "triturado de 19mm" y equivalentes de arena al agregado fino "arena dasificada", utilizada en los concretos. Ensayos realizados en el laboratorio externo

29/07/2025: Se realiza toma de cilindros y asentamiento del concreto para dentellón muro superficial, Muro 4, Modulo 5 Km11+010, C. Der.

	FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

29/07/2025: Se realiza toma de cilindros y asentamiento del concreto para, Dados en sitio, Talud 3, terraza 2,7 unidades, , linea C#7,9,13,15,17, Linea C#1,3 Linea D#31, Talud 5, monotalud, linea G, margen izquierda.

30/07/2025: Se realizan ensayos de clasificación al agregado grueso "triturado de 19mm", utilizada en los concretos.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

COMUNICACIONES

Enviados

- mediante comunicado Putumayo04-6875-25 del 19-07-2024 presenta, Aprobación a propuesta campaña Exploratoria del K14+400 al K22+706.

- mediante comunicado Putumayo04-6878-25 del 21-07-2024 presenta No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y10.

- mediante comunicado Putumayo04-6881-25 del 22-07-2024 presenta Aprobación Volúmenes XII y XIII.

- mediante comunicado Putumayo04-6925-25 del 29-07-2024 presenta No Aprobación Diseño de Fundación muro cierre Puente Campucana.

- mediante comunicado Putumayo04-6926-25 del 30-07-2024 presenta, Aprobación Diseño Estructural Puente Y4.

Recibidos

- 312-168-20250722001886, Validación Estrato de Cimentación Caisson 3 Muro 6

- 312-001-20250724000275, VOL II Diseño Geométrico K14+400 – K22+708 V2, Atención comunicado 311-168-20250619001746 (Putumayo 04-6733-25) correspondiente a observaciones realizadas al diseño geométrico Fase III del tramo comprendido entre el K14.4 – K22+708 V2.

- 312-001-20250725000276, VOL II Diseño Geométrico K11+600 a K13+600, Atención observaciones 311- 168-20250221001594 (Putumayo04-6237-25) Actualización Diseño Geométrico K11+600 – K13+600,

- 312-001-20250725000277, VOL IV Fundaciones Puente Y5 V2, Atención comunicado 311-168-20250301001607 (Putumayo04-6269-25) correspondiente a observaciones realizadas al diseño de las fundaciones del Puente Y5 V2 K11+895 – k11+960.

- 312-168-20250729001900, Atención a su comunicado Putumayo04-6789-25 del 02/07/2025 con asunto: Solicitud entrega del Volumen IX Estudio Impacto Ambiental y Volumen X Estudio Socio Predial del K10+600 al K11+600.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

*Revisión planos finales puente Campucanita

*Reunion presencial y recorrido sector 3-4-5 pares Esp. Hidraulicos Obra e Interventoria,.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS


• Obra Presenta Validación Estrato de Cimentación Caisson 3 Muro 6.
• Obra presenta VOL II Diseño Geométrico K14+400 – K22+708 V2, Atención comunicado 311-168-20250619001746 (Putumayo 04-6733-25) correspondiente a observaciones realizadas al diseño geométrico Fase III del tramo comprendido entre el K14.4 – K22+708 V2.
• Obra Presenta VOL II Diseño Geométrico K11+600 a K13+600, Atención observaciones 311- 168-20250221001594 (Putumayo04-6237-25) Actualización Diseño Geométrico K11+600 – K13+600,
• Obra Presenta, VOL IV Fundaciones Puente Y5 V2, Atención comunicado 311-168-20250301001607 (Putumayo04-6269-25) correspondiente a observaciones realizadas al diseño de las fundaciones del Puente Y5 V2 K11+895 – k11+960.
• Interventoria emite No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y10.
• Interventoria emite No Aprobación Diseño de fundación para el Muro Y10.
• Interventoria emite Aprobación Volúmenes XII y XIII.
• Interventoria emite Concepto de revisión a sondeos del K13+600 al K14+400, presentados en reunion virtual del martes 15 de julio de 2025.

COMPONENTE	K10+600 K11+600	K11+600 K13+600	K13+600 K15+600	K15+600 K17+600	K17+600 K19+600	K19+600 O1+600	K21+600 K23+917
ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO							
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL			NUEVA ALTERNATIVA, RESPONDIDO 27-01-2025 CON OBSERVACIONES, Putumayo04-6073-25				
ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA			A LA ESPERA QUE CONDOR PRESENTE DG FASE III, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES				
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION		EN REVISIÓN DE PRODUCTOS PRESENTADOS, YA SE ESTAN RESPONDIENDO CON OBSERVACIONES	AL MOMENTO QUE SE TENGA APROBADO CAPITULO DE GEOLOGIA, SE INICIA DISEÑO DE FUNDACIONES.				
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES		EN REVISIÓN DE PRODUCTOS PRESENTADOS, YA SE ESTAN RESPONDIENDO CON OBSERVACIONES	AL MOMENTO QUE SE TENGA APROBADO CAPITULO DE GEOLOGIA, SE INICIA DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES IDENTIFICADOS.				
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO							
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION							
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS							
COMPONENTE AMBIENTAL	CAMBIOS MENORES PRESENTADOS COMO CONTINGENCIAS		MODIFICACIÓN DE LICENCIA				
ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL	CAMBIOS MENORES						
ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA							
RESUMEN EJECUTIVO	OBSERVACIONES DE FORMA EN CIERRE						
EXPLORACION GEOTECNICA			EN EJECUCIÓN				

CONVENCIONES: APROBADO | EN EJECUCION | SIN PRESENTAR

ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

De acuerdo con el informe presentado por la coordinación de consultoría de Estudios y diseños del Contratista, la campaña exploratoria avanza como sigue:

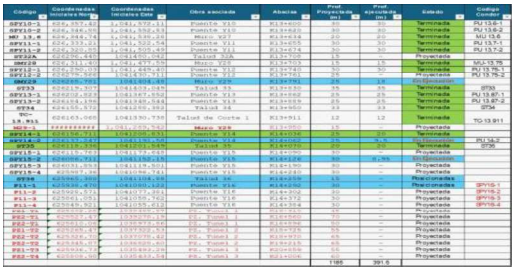

Código	Coordenadas Iniciales Este	Coordenadas Iniciales Este	Obra asociada	Abscisa	Prof. Proyectada (m)	Prof. ejecutada (m)	Estado	Código Condor
APU1-2	624,417.60	1,041,377.83	Puente Y10	K13+000	30	30	Terminada	PU 13.6
APU1-3	624,388.68	1,041,392.63	Puente Y10	K13+020	30	30	Terminada	PU 13.6-2
MU 13.6	624,414.74	1,041,396.08	Muro Y37	K13+034	20	20	Terminada	MU 13.6
APU1-5	624,333.23	1,041,322.54	Puente Y11	K13+055	30	30	Terminada	PU 13.7-1
APU1-6	624,320.05	1,041,309.49	Puente Y11	K13+076	30	30	Terminada	PU 13.7-2
SM23A	624290.440	1041450.942	Talud 33A	K13+105	15	-	Proyectada	
SM23B	624,311.40	1,041,477.59	Muro Y26	K13+109	15	15	Terminada	MU-13.75
APU1-1	624,290.03	1,041,449.40	Puente Y10	K13+140	30	30	Terminada	PU 13.75.1
APU1-2	624,290.03	1,041,449.40	Puente Y10	K13+140	30	-	Proyectada	PU 13.75-2
SM23B	624290.701	1041308.149	Muro Y39	K13+191	25	18	Terminada	
ST33	624219.307	1041439.049	Talud 33	K13+230	35	35	Terminada	ST33
APU1-3	624202.929	1041347.950	Puente Y13	K13+262	25	25	Terminada	PU 13.87-3
APU1-4	624184.478	1041357.584	Puente Y13	K13+283	25	25	Terminada	PU 13.87-4
ST34	624165.572	1041339.992	Talud 34	K13+303	33	33	Terminada	ST34
13.911	624163.049	1041330.730	Talud de Corte 1	K13+911	12	12	Terminada	TC-13.911
MU-1	##########	1.051.230.160	Muro Y39	K13+350	15	-	Proyectada	
APU1-1	624196.731	1041208.133	Puente Y14	K14+000	25	12	Terminada	
APU1-2	624153.847	1041245.943	Puente Y14	K14+020	25	9.5	En ejecución	PU 14-2
SP35	624139.346	1041231.946	Talud 35	K14+050	20	20	Terminada	SP35
APU1-3	624115.743	1041179.049	Puente Y15	K14+090	30	-	Proyectada	
APU1-4	624096.732	1041196.715	Puente Y15	K14+126	30	21.75	En ejecución	
APU1-5	624083.853	1041179.501	Puente Y15	K14+160	30	-	Proyectada	
APU1-6	624067.750	1041194.741	Puente Y15	K14+210	30	-	Proyectada	
SP36	623965.300	1041108.139	Talud 36	K14+239	45	-	Programada	
APU1-1	624,041.67	1041077.328	Puente Y16	K14+300	30	-	Proyectada	SP15-1
P13-2	624041.053	1041039.740	Puente Y16	K14+322	30	-	Proyectada	SP15-2
P13-3	624049.053	1041039.740	Puente Y16	K14+372	30	-	Proyectada	SP15-3
P13-4	624049.501	1041039.413	Puente Y16	K14+394	30	-	Proyectada	SP15-4
P02-S1	625007.67	1039779.82	PD. Tunel 1	K13+910	30	-	Proyectada	
P02-S2	625007.67	1039779.82	PD. Tunel 1	K13+930	30	-	Proyectada	
P02-S1	625161.04	1039972.84	PD. Tunel 1	K13+958	30	-	Proyectada	
P01-T2	625161.67	1039972.84	PD. Tunel 1	K13+976	30	-	Proyectada	
P02-T2	625184.73	1039779.82	PD. Tunel 2	K13+970	45	-	Proyectada	
P02-T2	625184.67	1039980.84	PD. Tunel 2	K13+914	45	-	Proyectada	
P01-T3	625194.73	1039992.29	PD. Tunel 3	K13+958	30	-	Proyectada	
P02-T3	625210.92	1039832.58	PD. Tunel 3	K13+976	30	-	Proyectada	
					1185	391.5		

AREA SOCIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicación Putumayo04-6921-25 del 28 de julio del 2025, Se remite a la Subdirección de Sostenibilidad Concepto Interventoría Acumulación Resoluciones de procedencia de Consulta previa proyecto Variante San Francisco Mocoa

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Se asistió y participó en encuentro formal con el equipo base del cabildo inga responsable de la implementación de la propuesta para elaboración de ruta metodológica, con el fin de conocer productos del trabajo realizado con la comunidad en este periodo transcurrido a partir de la firma del acta de acuerdo, como objetivo principal de este último avance se tenía previsto recibir la ruta metodológica producto final entregable por parte del equipo base al contratista, resultado que no fue posible, ya que la coordinadora del equipo base del cabildo refirió la necesidad de más tiempo y recurso para lograr tal fin, por lo tanto consultora e interventoría de manera unánime expresan que el acta de acuerdo contiene clausulas, las cuales fueron objeto de revisión exhaustiva por parte del cabildo y condicionan un último desembolso equivalen al 30% del valor total a la entrega final del producto entregable, además de precisar que de requerirse más tiempo (2 meses) para el desarrollo de actividades el valor ya concertado no sufriría modificaciones o de desarrollarse las acciones en menos de dos meses aplicaría el mismo valor a desembolsarse; desde la consultoría encargada de liderar proceso se solicitó al Gobernador del cabildo trasladar toda la información suministrada en la reunión a la asamblea para toma de decisiones y así mismo el equipo social de obra e interventoría queda atento al pronunciamiento respectivo.

Se asistió y participó en el comité operativo de interventoría contrato No.977 de 2021, espacio en el cual profesionales y especialistas de interventoría presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan ejecución de actividades.

Se asistió a mesa de dialogo con el Gobernador Taita Justo Juagibioy-Resguardo indígena Kamentsá Biya, con quien se concluyó que el día martes 29 de julio daría reporte al contratista sobre la validación del acuerdo para implementación de ruta metodológica, ya que esta sería presentada en asamblea para validación el día domingo 27 de julio.

Se desarrolló por parte de profesional social de obra, capacitación al personal vinculado desarrollándose el tema: Paternidad responsable, actividad desarrollada en el frente de obra-Vereda campucana

Se coordinó y asistió a comité de gestión social en la cual participaron Gestora social SS-INVIAS, profesionales sociales de Interventoría y contratista, con el objetivo de presentar el estado actual del proceso de gestión social de los tramos 2 y 3 de los contratos de obra 1111 y 964 a la gestora social del proyecto.

Se asistió a reunión de coordinación y preparación liderada por personal de la DANCP,reunión adelantada en el marco del proceso del proceso consultivo para avanzar en la fase de pre consulta con las comunidades certificadas,teneinedo como asistentes tanto presenciales como virtuales a personal jurídico,ambiental y social de la Subdirección de sostenibilidad,interventoria y obra.

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reprote semanal

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

Se apoyó en revisión de concepto tecnico jurídico ajustado y validado por el area jurídica de interventoria con destino a la Subdireccion de Modernización de carreteras-INVIAS a solicitud de la misma,insumo que tiene por objetivo emitir por parte de Interventoría concepto relacionado a la viabilidad de Acumulación de Resoluciones de procedencia de Consulta previa proyecto Variante San Francisco Mocoa.

Consulta previa: Comunidad kamentsa Biya e Inga de los municipios de Sibundoy San Francisco,en la fase de aprestamiento para el proceso consultivo,teniendo como actos administrativos aplicables vigentes las resoluciones ST 1188 del 2021 y SY 0172 del 2025,para esta anualidad el liderazgo de los resguardos tanto Biya como Inga estan siendo asumidos por los Gobernadores Taitas Justo Juagibioy Jamioy y Luis Alberto Jamioy respectivamente,con el resguardo Biyá a la fecha se encuentra en proceso de firma del convenio para implementacion de ruta metodológica,documento que está siendo sometido a sanción y aprobación por asamblea y gabinete del resguardo,dicho convenio ya cuenta con ajustes tanto en costo como actividades y tiene a la fecha validación y aprobación por parte de la subdirección de sostenibilidad e interventoria,el objetivo con la firma del convenio es la implementacion de ruta metodologica con corte final 15 de diciembre y por ende avanzar con la protocolización de acuerdos,es válido resgistrar como antecedente que esta ruta cuenta con origen de su construcción desde el año 2023 ademas de una linea base,productos que son el resultado de una inversión en recursos significativos provenientes del PIS; Por otro lado con el resguardo Kamentsá Inga,se tiene a la fecha preliminar de ruta metodológica con una antesala de inversion de recursos para implementacion de propuesta para elaboración de ruta,la cual fue efectiva en los meses de junio y julio,a la fecha objeto de reporte el equipo base del resguardo inga responsable de liderar acciones en funcion del lograr esta fase del poceso consultivo se encuentra en proceso interno de atender acontecimientos propios del cabildo y asumió compromisode trasladar informacion presentada por las partes asistentes el dia jueves 24 de julio a dicha asamblea para toma de decisiones relacionadas con el proceder como comunidad en el proceso consultivo destinado a realizarse con el resguardo,tal cual lo define el certificado de procedencia.

AREA AMBIENTAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicación Putumayo04-6903-25 del 24 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%. Como es de su conocimiento, en el Concepto Técnico 4801 del 02 de julio de 2025, el cual hace parte integral del Acta N°429 del 04 de julio de 2025, la ANLA señala lo siguiente: "ACEPTAR el valor parcial de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% a costo histórico de acuerdo con lo señalado en el Artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, que corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.293.706.178), liquidado sobre la base de liquidación de CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($129.370.617.808), proyecto "Variante Mocoa – San Francisco – "Frente Mocoa", para el periodo 21 de septiembre del 2023 al 31 de diciembre del 2024," Teniendo en cuenta que para aceptar el valor parcial de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% para el periodo 21 de septiembre del 2023 al 31 de diciembre del 2024, la ANLA realizó la suma de todas las certificaciones radicadas por Construcciones El Cóndor, dos para el año 2023 y una para el 2024, que además incluyen costos como estudios y diseños y otros que no corresponden a ítems que deben ser tenidos en cuenta en la liquidación, solicitamos al Contratista efectuar la aclaración ante la ANLA, con el fin de que se corrija el valor señalado en el C.T. 4801 de 2025 . Lo anterior, teniendo en cuenta que estos valores son objeto de pago a través del plan de inversión ambiental y deben corresponder a la realidad de los costos ejecutados en el proyecto.

Mediante comunicación Putumayo04-6913-25 del 25 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Regularización de obras y actividades realizadas en el marco de la atención de las contingencias del frente Mocoa. Como es de su conocimiento, en el Concepto Técnico 4801 del 02 de julio de 2025, el cual hace parte integral del Acta N°429 del 04 de julio de 2025, respecto a la regularización de las obras y actividades ejecutadas para la atención de las contingencias presentadas en el proyecto la ANLA refiere lo siguiente: Página 493 del C.T. 4801 de 2025: En la página 495 del C.T. 4801 de 2025, la ANLA da respuesta al oficio remitido por el INVIAS respecto a la consulta de cuál es el trámite que se debe aplicar para regularizar las obras y actividades en el marco de la atención de las contingencias, de lo cual la ANLA manifiesta lo siguiente: Igualmente en la página 542 del C.T. 4801 de 2025, la ANLA menciona lo siguiente: Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al Contratista definir el instrumento ambiental ante ANLA y la DBBSE del MADS para regularizar las obras y actividades ejecutadas en el marco de la atención de las contingencias.

FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

Mediante comunicación Putumayo04-6914-25 del 25 de julio del 2025, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Formación de promotores de la comunidad para coadyuvar en la gestión ambiental de las cuencas, frente Mocoa.
Como es de su conocimiento, en el Concepto Técnico 4801 del 02 de julio de 2025, el cual hace parte integral del Acta N°429 del 04 de julio de 2025, la ANLA emite sus consideraciones sobre el radicado N°20246201193192 del 16 de octubre de 2024, mediante el cual Construcciones El Cóndor solicitó aprobación de la propuesta técnica para dar cumplimiento a la obligación de la inversión forzosa de no menos del 1% en el marco de la línea de inversión de "Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad". Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al Contratista atender de manera oportuna lo solicitado por la ANLA en el numeral 6.6.1.1. del C.T. 4801 de 2025 y remitir nuevamente la propuesta para aprobación de la Autoridad Ambiental.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

El 24 de julio del 2025, se realizó una reunión con la gestora ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad, Contratista e Interventoría, con el fin de revisar el requerimiento 4 del Acta N°429 del 04 de julio de 2025 (relacionado con la ZODME Guaduales) y las acciones que se van a implementar para su cumplimiento.

El 24 de julio del 2025, se realizó una mesa de trabajo entre las áreas predial y ambiental del Contratista e Interventoría con participación del gestor predial de la Subdirección de Sostenibilidad, con el fin de revisar el avance en los sobrevuelos a los predios de la inversión forzosa de no menos del 1% y el análisis de la cobertura vegetal de los mismos.

ACTIVIDADES DEL AREA AMBIENTAL

• La Interventoría le solicitó al Contratista efectuar la aclaración ante la ANLA sobre el valor parcial de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% aprobado en el Concepto Técnico 4801 del 2 de julio de 2025, teniendo en cuenta que la Autoridad Ambiental realizó la suma de dos certificaciones para el año 2023 y una para el 2024, que además incluyen costos como estudios y diseños y otros que no corresponden a ítems de la liquidación.
• La Interventoría le solicitó al Contratista definir el instrumento ambiental ante la ANLA y la DBBSE del MADS para regularizar las obras y actividades ejecutadas en el marco de la atención de las contingencias.
• La Interventoría le solicitó al Contratista atender las observaciones que la ANLA a través del Concepto Técnico 4801 del 2025 realizó a la propuesta técnica para dar cumplimiento a la obligación de la inversión forzosa de no menos del 1% en el marco de la línea de inversión de "Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad".

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

MC – 3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción
• Se realizo inspecciones de los kits anti-derrames.
• Se realizó la construcción de diques para cambio y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos.

MC – 4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales
• Se realizó la recolección de residuos solidos en la via desde el K9+900 hasta el K11+800, se retiraron los residuos de los puntos ecológicos y se realizó el debido cambio de bolsas de acuerdo al código de colores de cada recipiente.
• Se realizó la recolección de mangueras y chatarra desde el K10+000 al K11+800.

MC-5 Manejo de vertimientos
• Se realizó la recolección de aguas residuales domésticas, lavado y aseo de las unidades sanitarias portátiles.

MS-1 Manejo ambiental de las zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación – ZODMES
• Se verificó que el material se cargue directamente en el volcó del vehículo que lo transporta y que no exceda el límite permitido para evitar derrames del material sobre la vía.
• Se inspeccione que las volquetas que transportan el material realicen el carpado previo a su desplazamiento a la ZODME, para evitar la dispersión de particulas en la vía.

MH-1 Manejo de escorrentía superficial
• Se realizó limpieza y descolmatación de cunetas y obras hidráulicas existentes en los K9+800-K10+600.

B-2 Salvamento de especies valiosa epifitas vasculares
• Se realizaron actividades de búsqueda de epifitas vasculares en el K11+600.

B-5 Control ambiental de la remoción vegetal, descapote y disposición de desechos vegetales
• Se realizaron actividades de repique de material vegetal en el talud K11+600.

B-10 Ahuyentamiento y rescate de fauna
• Se realizó el ahuyentamiento de fauna mediante puntos de ojar con recipientes de creolina y se realizo uso de vuvuzelas en el K11+600.

AREA SST

COMUNICACIONES:

No se generan comunicaciones durante el periodo objeto de reporte.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Durante la presente semana, se llevaron a cabo diversas actividades de seguimiento, control y verificación en el marco del proyecto, destacando tanto acciones ejecutadas por la Interventoría como por parte de la contratista.

ACTIVIDADES DEL AREA SST

El dia 28 de julio se efectuó recorrido en obra con el fin de realizar verificación del preoperacional para trabajos en alturas, garantizando que el personal contara con los permisos, certificaciones y condiciones técnicas necesarias para ejecutar dichas labores. Se dejaron observaciones sobre el uso adecuado de líneas de vida y puntos de anclaje.

El dia 28 de julio tambien en otro punto del recorrido, se verificó el estado del acceso al camino Sachamate, evaluando sus condiciones de transitabilidad y la seguridad para el paso del personal y maquinaria.

El dia 28 de julio se realizaron observaciones al proveedor Sermar en relación con la señalización y adecuación del frente de trabajo actual. Se recomendó mejorar la delimitación de zonas de tránsito y fortalecer la señalización preventiva.

El dia 30 de julio se efectuó recorrido en obra por parte del equipo de Interventoría, con el fin de verificar el desarrollo seguro de las labores programadas. En este recorrido se inspeccionó una actividad de trabajo en alturas, comprobando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos seguros y el uso adecuado de los elementos de protección colectiva e individual. Adicionalmente,

El dia 30 de julio se realizó observación a la actividad de voladura, prestando especial atención a los protocolos de seguridad, señalización y delimitación del área de intervención.

El dia 25 de julio por parte de la contratista realizó socializacion del pon de crescientes subitas enfocada en emergencias de origen invernal, dirigida a su personal de la brigada de emergencia. Dicha capacitación incluyó temáticas relacionadas con la prevención, identificación de riesgos, planes de acción y protocolos de respuesta ante situaciones derivadas de lluvias intensas, deslizamientos o crecientes súbitas, con el propósito de fortalecer la preparación del personal ante estas eventualidades.

Por parte de la contratista se continua con la inspección diaria de los vehiculos utilizados en el proyecto, verificando condiciones mecánicas, documentación al día y elementos de seguridad vial requeridos.

La contratista se mantuvo la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores, acompañada de la verificación del uso adecuado en campo. Esta labor se realiza de manera periódica como parte del compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

Por parte de la contratista se llevaron a cabo charlas de seguridad todas las mañanas antes del inicio de la jornada laboral, como parte del programa de inducción diaria. Estas charlas han sido clave para reforzar comportamientos seguros y recordar los procedimientos establecidos para cada actividad.

AREA PREDIAL

COMUNICACIONES:

Mediante comunicación Putumayo04-6902-25 del 24 de julio del 2025, se remite a la Subdirección de Sostenibilidad pre-acta de gestión predial No 48 del contrato 964 de 2021, con los anexos revisados y aprobados por la interventoría, de acuerdo con lo remitido por el Contratista mediante comunicado 04-6200-25-M2-(312-168-20250717001877). Se remite a fin de obtener el correspondiente memorando de aprobación necesario para incluir el cobro en el acta de obra correspondiente.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

se realiza mesa de seguimiento predial al contrato 964 contratista e interventoria

ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL

313-I-T4-CMMVSFM: (Predio requerido para la Estabilización del talud K3+100 - sector4) el 23/05/2025 la SS de INVIAS remite la oferta formal de compra 2025S-VBOG-033354 y el 10/06/2025 Notificación personal de la oferta de compra, misma que fue aceptada por los propietarios, en inscripción de oferta y en elaboración minuta de escritura.

315 I-T4-CMMVSFM: (Predio requerido para la Estabilización del talud K3+100 - sector4), el 13/05/2025 la SS de INVIAS remite la oferta formal de compra 2025S-VBOG-029468 y el 10/06/2025 Notificación personal de la oferta de compra, misma que fue aceptada por los propietarios, en inscripción de oferta y en elaboración minuta de escritura.

001-M-ID-T3-CMMVSFM: El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 2025S-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, se devuleve insumo con observaciones para ser complementado (Diagnóstico jurídico).

002-M-ID-T3-CMMVSFM: El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 2025S-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, se devuleve insumo con observaciones para ser complementado (diagnóstico jurídico).

• Están pendientes de dirección por parte del componente ambiental para definición la gestión pertinente sobre los 5 predios seleccionados por la corporación ambiental que cumplen con la cuota ambiental en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas, inversión forzosa de no menos del 1% para el proyecto. Se egeneró actualizacion juridica y verificación por parte del consorcio.

No.	PROPIETARIO	CONCEPTO TÉCNICO	MATRICULA INMOBILIARIA	DIRECCIÓN/ NOMBRE	ÁREA PREDIO	CONDICIONES
1	EFREN NEMECIO BRAVO ARAUJO	CT-DTP-0965-23	440-11848	San Isidro	10 Ha + 0000 M2	Presenta área mínima, puede requerir gestiones adicionales para cumplir con áreas mínimas requeridas. Dentro de zona de resguardo indígena.
2	MARINA EULOGIA BRAVO ARAUJO	CT-DTP-0968-23	440-31230	San Isidro	42 Ha + 9500 M2	No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena.
3	LAURENCIO GELPUT PEJENDINO - MARCIANA URBANO RUIZ	CT-DTP-0967-23	440-1991	Finca 3	15 Ha + 0000 M2	L No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena. Puede requerir áreas adicionales para cumplir con mínimos requeridos.
4	JOSE IVAN GELPUT URBANO	CT-DTP-0968-23	440-57022	San Martin	30 Ha + 0000 M2	No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena.
5	MERCEDES ARAUJO DE BRAVO	CT-DTP-0969-23	440-13280	San Martin	9 Ha + 1125 M2	No formado catastralmente, por estar dentro de la zona de resguardo indígena.

• Se cuenta con la aprobación del diseño Geométrico del Km 10+600 al Km 11+600 de los siguientes volúmenes: I ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO, II ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, III ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA, V ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES, VI ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO, VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION Y XI VIAS INDUSTRIALES. Los Volúmenes IX ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y X ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado	% avance Anterior	% avance actual
1	260-ID-T4-CMMVSFM	440-16413	K10+021,90 I	K10+035.70 I	0 Ha+ 500,67 m²	Minuta de escritura con vistos buenos de conformidad por la territorial de INVIAS Putumayo	73%	73%
2	264-SP-ID	440-14323	K9+315,65 I	K9+715,82 I	0 Ha + 5802.01 m²	Escrituras Pública de Compraventa No. 1122 del 02-09-2024 - Registrada a favor de la Entidad - En trámite de pago, se radico ante el IGAC solicitud asignación cedula catastral independiente	96%	96%
3	264A-ID-T4-CMMVSFM	440-66137	K9+286,83 I	K9+315.65 I	0 Ha + 0536.20 m²	Publicada en la página web de la entidad la notificación por aviso de la Resolución de Expropiación número 1712 DEL 20-MAY-2024	62%	62%
4	264B-T4-CMMVSFM	N.A	K9+315.65	K9+407.93	N.A	Mejoras adquiridas a favor de INVIAS y pagadas	100%	100%
5	285-SP-I	440-49052	K 7+133,33 I	7+484,40 I	0 Ha + 4186.27 m²	Escrituras Pública de Compraventa No. 1125 del 02-09-2024 -Registrada a favor de la Entidad. En trámite de pago	96%	96%
6	286-SP-ID	440-52636	K 6+539,63 D	K 7+066,67 I	1Ha +2661.23 m²	Oferta formal de compra notificada y aceptada, en inscripcion de oferta, y en elaboración minuta de escritura.	54%	54%
7	288-SP-ID	440-3969	K 6+300,51 I	K 6+538,84 I	0 Ha +2002.92 m²	Escrituras Pública de Compraventa No. 1154 del 06-09-2024 - Registrada a favor de la Entidad. En trámite de pago, se radico ante el IGAC solicitud asignación cedula catastral independiente	96%	96%
8	314-ID-T4-CMMVSFM	440-35538	K3+116,83 D	K3+129,28 D	0 Ha +0255.77 m2	En publicación de la página web de la entidad la notificación por aviso de la Resolución de Expropiación.	62%	62%
9	338-D	440- 8790	K2+339.71 D	K2+378.48 D	0 Ha +0431.63 m²	Minuta de escritura con vistos buenos de conformidad por la territorial de INVIAS Putumayo	73%	73%
10	355D	440-17395	k2+117.09	k2+167.64	0 Ha +00356.66 m²	El 13/05/2025 la SS de INVIAS remite el alcance a la oferta formal de compra, se remitió a la Gobernación citación para notificación de Oferta Formal de Compra. (Recibido Radicado PQRD - 20250610-E-003300)	46%	46%

Para el Sector 3 se requieren 22 predios de los cuales 18 corresponden a predios sin antecedentes registrales y 4 predios con titularidad plena, acorde con la gestión adelantada hasta la fecha los predios se encuentran en el siguiente estado:

Se cuenta con la aprobación del diseño Geométrico del Km 10+600 al Km 11+600 de los siguientes volúmenes: I ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO, II ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, III ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA, V ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES, VI ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO, VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION Y XI VIAS INDUSTRIALES. Los Volúmenes IX ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y X ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL

001-M-ID-T3-CMMVSFM: El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 2025S-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, se revisaron ya aprobaron los inumos juridicosa 002-M-ID-T3-CMMVSFM

13 predios cuentan con permisos de Intervención Voluntario: 001-M-ID-T3-CMMVSFM, 002-M-ID-T3-CMMVSFM, 003-M-ID-T3-CMMVSFM, 004-M-ID-T3-CMMVSFM, 005-M-ID-T3-CMMVSFM, 006-M-ID-T3-CMMVSFM, 007-M-ID-T3-CMMVSFM, 008-M-ID-T3-CMMVSFM, 009-M-ID-T3-CMMVSFM, 010-M-ID-T3-CMMVSFM, 011-M-ID-T3-CMMVSFM, 012-M-ID-T3-CMMVSFM Y 015-M-ID-T3-CMMVSFM.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8

FECHA	30/7/2025 (Día / Mes / Año)

Dos (2) Predios cuentan con la no objeción de los Informes de Avalúo Comercial elaborados por parte de la Lonja De Propiedad Raíz De Nariño Y Putumayo y las Ofertas Formales de Compra radicadas en interventoria para su revisión y aprobación de los predios 313-I-T4-CMMVSFM y 315 I-T4-CMMVSFM.

Se requiere generar los avalúos comeciales de los predios aprobados para continuar con las gestiones pertienentes de compra de mejoras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar atención de emergencias de la via existente Mocoa – San Francisco Trampolin de la biodiversidad.

* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K10+600 a K11+580 en margen izquierda y desde K10+600 a K11+360 margen derecha.

* Explanación y perfilamiento de taludes entre K11+360 a mayores margen izquierda

* Construcción de Muro 1 K10+792.36/835.03 MD

* Construcción de Muro 2 K10+855,44/884,61 MD

* Construcción de Muro 3 K10+956,26/989,78 MD

* Construcción de Muro 4 K10+999,64/11+049,45 MD

* Construcción de Muro 6 K11+240,14/281,22 MD

* Construcción de Muro 7 K11+430,62/460,01 MD

* Exploración geotécnica en sector 3

*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.

*Atención a observaciones de interventoria a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.

*Culminar Recorrido en Obra, Mesa de trabajo, Hidraulica e Hidrologia sector No.3

* Interventoria emitira concepto a DG FASE III del 14+400 al K22+807

* Revisión documental

* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra

• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• El 31 de julio del 2025, se realizará una reunión entre Contratista e Interventoria, con el fin de revisar las compensaciones a realizar por el frente Mocoa.
• El 04 de agosto del 2025, se tiene programada una reunión con la DBBSE del MADS para tratar los temas pendientes relacionados con la sustracción de reserva forestal del proyecto.

* Realizar recorridos de campo.

* Verificación de cumplimiento a los estándares de seguridad contrato de obra 964-2021.


*Inspeccion de sistemas de proteccion contra caidas.

* Inspeccion de equipos y herramientas.

* Ejecución por parte del contratista de capacitaciones en trabajo seguro en alturas para el personal operativo.

* Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

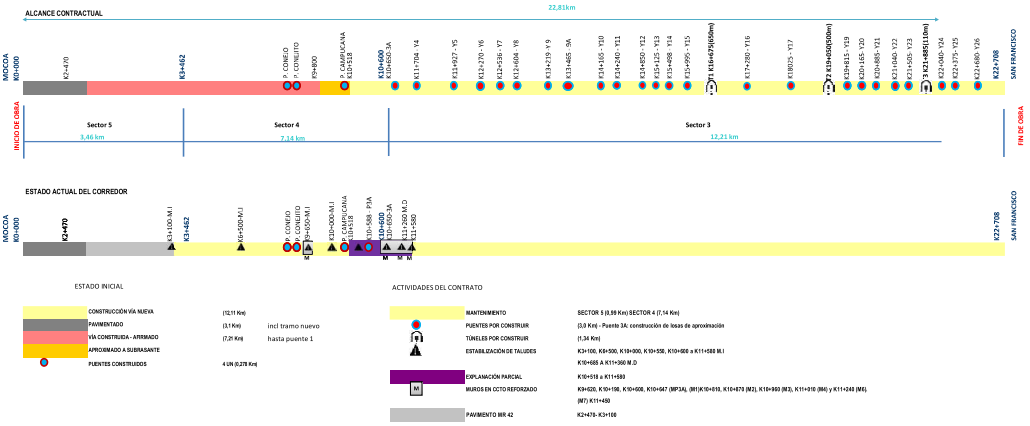

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Atención de emergencias: construcción de box culvert prefabricado vía alterna en Santiago Putumayo



Muro 4 K10+999/11+049 M.D: Módulo 3: fundición de primera sección vástago.



Talud 3 K10+79/870 MI: talud mixto, fundición de dados en sitio



Muro 6 M.D K11+240/281 hormigonado en concreto de 28 Mpa para pilote #3



Talud 9A (K11+445/535) MI: terraza 2 encofrado de dados linea C

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
Se realizan requerimientos permanentes al Contratista al respecto del avance de las actividades contractuales.
Se emiten comunicaciones permanentes al contratista encaminadas a reiterar las obligaciones contractuales y se hace seguimiento a lo pertinente.
Se programa y coordina los comités de seguimiento semanal con el Contratista y se generan compromisos cuyo cumplimiento se evalúa en la semana siguiente.
Seguimiento y control de la calidad de los materiales utilizados en las actividades realizadas en obra de acuerdo con las Normas establecidas por INVIAS
Seguimiento y supervisión permanente a las actividades de obra desde las áreas técnica, ambiental, social, predial y SST
Seguimiento, medición y control de calidad permanente en campo de las actividades en ejecución.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
FIRMA	
NOMBRE:	JOSÉ IGNACIO CADENA LOPEZ
Matrícula Profesional No.:	25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO No. 964-2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JULIO 2025																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA 4X4 ADM	NISSAN	VL 179	MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIONETA 4X4 ADM	CHEVROLET		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIONETA 4X4 RES	NISSAN		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIONETA 4X4 RES	NISSAN		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMION	FOTON	5 TON	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETRO CARGADOR	JCB		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	CATERPILLAR	CAT320	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	DOOSAN	DX225	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
EXCAVADORA	JONHN DEERE	130GLC	MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A
EXCAVADORA	JONHN DEERE	130GLC	MOCOA	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EXCAVADORA	KOBELCO	SK210	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
EXCAVADORA	HYUNDAI	HX60S	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
BUS			MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MINICARGADOR	CASE 2017		MOCOA	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MINICARGADOR	NEW HOLLAND 2014		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
MINICARGADOR	CATERPILLAR		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
MINICARGADOR	HYUNDAI		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
MINICARGADOR	BOBCAT S330		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
MINICARGADOR	CASE 220B		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I
MINICARGADOR	CASE 220B		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
MIXER	KENWORTH		MOCOA	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	I
MIXER	INTERNATIONAL		MOCOA	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	A	I
MIXER	INTERNATIONAL		MOCOA	I	A	A	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR			MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL		MOCOA	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL		MOCOA	A	A	I	A	A	I	I	I	A	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL		MOCOA	A	A	I	A	A	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I
PERFORADORA T46	BERETTA		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PERFORADORA T46	BERETTA		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	R	R	R	R	I	A	A	A	A
AUTOBOMBA	SANY	40 M	MOCOA	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R
BOMBA DE INYECCIÓN	STA 2022		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
BOMBA DE INYECCIÓN	STA 2022		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
BOMBA DE INYECCIÓN	STA 2022		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	KAESER		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	KAESER		MOCOA	A	A	A	A	R	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	KAESER		MOCOA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	A	A	A
CARROTANQUE DE AGUA	HINO		MOCOA	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I
CAMIÓN LUBRICADOR	CHEVROLET NPR		MOCOA	A	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	A	A	I
CARRO COMBUSTIBLE	HINO 2016		MOCOA	I	I	A	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	I	I
PERFORADORA ROCKDRILL	ROCKDRILL	D7 (1)	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA	SOILMEC	D7 (2)	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA	EVERDIGM	ECD-35 E (1)	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA 31/07/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 - 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	57121	C-2401-0600-123	54	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27.049.209.066,00	
2022	98222	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 18.020.744.751,00	
2023	105923	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27.072.000.000,00	
2024	194824	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 63.144.000.000,00	$ 237.279.086,00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 63.168.000.000,00	$ 59.174.612.565,00
			TOTAL				$ 59.411.891.651,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 541.389.953.817,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		JULIO 2021		-	-	$ -	$ -	$ -	416021	$ 27.049.209.066	$ 541.389.953.817	N/A			
2	EYD	AGOSTO 2021	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.883.489.666	$ 541.224.234.417	105030-08/11/2021			
3	EYD	SEPTIEMBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.800.629.966	$ 541.141.374.717	107910-16/11/2021			
4	EYD	OCTUBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.717.770.266	$ 541.058.515.017	107916-16/11/2021			
5	EYD	NOVIEMBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.634.910.566	$ 540.975.655.317	123300-21/12/2021			
6	EYD	DICIEMBRE 2021	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.469.191.166	$ 540.809.935.917	123307-20/12/2021			
6	OBRA	DICIEMBRE 2021	$ 55.859.945,00	$ 408.207,00	$ 56.268.152,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.412.923.014	$ 540.753.667.765	123291-20/12/2021			
6	AJUSTE PROV	DICIEMBRE 2021	$ 462.683,00	$ 3.381,00	$ 466.064,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.412.456.950	$ 540.753.201.701	39820-21/04/2022			
7	OBRA	ENERO 2022	$ 75.092.930,00	$ 548.756,00	$ 75.641.686,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.357.560.015	$ 540.677.560.015	16414-22/02/2022			
8	OBRA	FEBRERO 2022	$ 73.339.891,00	$ 535.945,00	$ 73.875.836,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.283.684.179	$ 540.603.684.179	39867-21/04/2022			
6	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2021	$ 365.400,00	$ 2.670,00	$ 368.070,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.283.316.109	$ 540.603.316.109	39820-21/04/2022			
7	AJUSTE DEF	ENERO 2022	$ 1.348.382,00	$ 9.854,00	$ 1.358.236,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.281.957.873	$ 540.601.957.873	39817-21/04/2022			
8	AJUSTE DEF	FEBRERO 2022	$ 1.395.866,00	$ 10.201,00	$ 1.406.067,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.280.551.806	$ 540.600.551.806	39812-21/04/2022			
9	OBRA	MARZO 2022	$ 225.834.892,00	$ 1.650.332,00	$ 227.485.224,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.053.066.582	$ 540.373.066.582	39862-21/04/2022			
9	AJUSTE DEF	MARZO 2022	$ 3.042.588,00	$ 22.234,00	$ 3.064.822,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.050.001.760	$ 540.370.001.760	39808-21/04/2022			
10	OBRA	ABRIL 2022	$ 285.079.790,00	$ 2.083.275,00	$ 287.163.065,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.762.838.695	$ 540.082.838.695	52444-20/05/2022			
10	AJUSTE DEF	ABRIL 2022	$ 4.402.488,00	$ 32.172,00	$ 4.434.660,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.758.404.035	$ 540.078.404.035	52334-20/05/2022			
11	OBRA	MAYO 2022	$ 308.192.392,00	$ 2.252.175,00	$ 310.444.567,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.447.959.468	$ 539.767.959.468	80790-01/08/2022			
11	COVID	MAYO 2022	$ 4.624.997,00	$ 21.433,00	$ 4.646.430,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.443.313.038	$ 539.763.313.038				
11	AJUSTE DEF	MAYO 2022	$ 5.475.323,00	$ 40.012,00	$ 5.515.335,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.437.797.703	$ 539.757.797.703	88274-19/08/2022			
12	OBRA	JUNIO 2022	$ 684.521.446,00	$ 5.002.272,00	$ 689.523.718,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.748.273.985	$ 539.068.273.985	80702-01/08/2022			
12	AJUSTE DEF	JUNIO 2022	$ 18.263.826,00	$ 133.466,00	$ 18.397.292,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.729.876.693	$ 539.049.876.693	88267-19/08/2022			
13	OBRA	JULIO 2022	$ 703.410.625,00	$ 5.140.308,00	$ 708.550.933,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.021.325.760	$ 538.341.325.760	89779-23/08/2022			
13	COVID	JULIO 2022	$ 44.661.920,00	$ 206.970,00	$ 44.868.890,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41.976.456.870	$ 538.296.456.870				
13	AJUSTE DEF	JULIO 2022	$ 24.344.468,00	$ 177.902,00	$ 24.522.370,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41.951.934.500	$ 538.271.934.500	90129-24/08/2022			
14	OBRA	AGOSTO 2022	$ 1.718.250.335,00	$ 12.556.445,00	$ 1.730.806.780,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 40.221.127.720	$ 536.541.127.720				
15	OBRA	SEPTIEMBRE 2022	$ 4.052.110.391,00	$ 29.611.576,00	$ 4.081.721.967,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 36.139.405.753	$ 532.459.405.753				
16	OBRA	OCTUBRE 2022	$ 5.615.470.858,00	$ 41.036.133,00	$ 5.656.506.991,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.482.898.762	$ 526.802.898.762				
14	AJUSTE DEF	AGOSTO 2022	$ 78.496.491,00	$ 573.628,00	$ 79.070.119,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.403.828.643	$ 526.723.828.643				
15	AJUSTE DEF	SEPTIEMBRE 2022	$ 265.831.878,00	$ 1.942.618,00	$ 267.774.496,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.136.054.147	$ 526.456.054.147				
16	AJUSTE DEF	OCTUBRE 2023	$ 474.489.337,00	$ 3.467.422,00	$ 477.956.759,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 29.658.097.388	$ 525.978.097.388				
17	OBRA	NOVIEMBRE 2022	$ 3.965.485.350,00	$ 28.978.547,00	$ 3.994.463.897,00	$ -	$ -	$ 8.030.482.547,00	416021	$ 17.633.150.944	$ 521.983.633.491				
	AJUSTE DEF	NOVIEMBRE 2022	$ 371.195.806,00	$ 2.712.585,00	$ 373.908.391,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 17.259.242.553	$ 521.609.725.100				
18	OBRA	DICIEMBRE 2022	$ 2.022.462.312,00	$ 14.779.532,00	$ 2.037.241.844,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15.222.000.709	$ 519.572.483.256				
18	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2022	$ 219.429.208,00	$ 1.603.521,00	$ 221.032.729,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15.000.967.980	$ 519.351.450.527				
19	OBRA	ENERO 2023	$ 2.741.733.650,00	$ 20.035.746,00	$ 2.761.769.396,00	$ 47.486.827,00	$ 2.714.282.569,00	$ 7.982.995.720,00	98222	$ 39.358.685.411	$ 516.589.681.131				
19	AJUSTE DEF	ENERO 2023	$ 305.821.563,00	$ 2.234.850,00	$ 308.056.413,00	$ -	$ -	$ 7.982.995.720,00	98222	$ 39.050.628.998	$ 516.281.624.718				
20	OBRA	FEBRERO 2023	$ 3.060.514.380,00	$ 22.365.297,00	$ 3.082.879.677,00	$ 53.008.109,00	$ 3.029.871.568,00	$ 7.929.987.611,00	98222	$ 36.020.757.430	$ 513.198.745.041				
21	OBRA	MARZO 2023.	$ 1.795.007.105,00	$ 13.117.360,00	$ 1.808.124.465,00	$ 31.091.250,00	$ 1.777.033.215,00	$ 7.898.896.361,00	98222	$ 34.243.724.215	$ 511.390.620.576				
22	OBRA	ABRIL 2023.	$ 2.140.453.154,00	$ 15.641.773,00	$ 2.156.094.927,00	$ 37.074.703,00	$ 2.119.020.224,00	$ 7.861.821.658,00	98222	$ 32.124.703.991	$ 509.234.525.649				
23	OBRA	MAYO 2023.	$ 2.001.851.600,00	$ 14.628.916,00	$ 2.016.480.516,00	$ 34.672.070,00	$ 1.981.808.446,00	$ 7.827.149.588,00	98222	$ 30.142.895.545	$ 507.218.045.133				
24	OBRA	JUNIO 2023.	$ 959.719.607,00	$ 7.013.336,00	$ 966.732.943,00	$ 16.660.732,00	$ 950.072.211,00	$ 7.810.488.856,00	98222	$ 29.192.823.334	$ 506.251.312.190				
24	AMBIENTAL	JUNIO 2023.	$ 137.141.805,00	$ 85.805,00	$ 137.227.610,00	$ -	$ 137.227.610,00	$ 7.810.488.856,00	98222	$ 29.055.595.724	$ 506.114.084.580				
25	OBRA	JULIO 2023.	$ 10.833.834.337,00	$ 79.170.328,00	$ 10.913.004.665,00	$ 187.642.011,00	$ 10.725.362.654,00	$ 7.622.846.845,00	98222	$ 18.330.233.070	$ 495.201.079.915				
26	OBRA	AGOSTO 2023.	$ 1.555.433.375,00	$ 11.366.629,00	$ 1.566.800.004,00	$ 37.330.401,00	$ 1.529.469.603,00	$ 7.585.516.444,00	105923	$ 16.800.763.467	$ 493.634.279.911				
26	EYD	AGOSTO 2023.	$ 462.184.874,00	$ 87.815.126,00	$ 550.000.000,00	$ -	$ 550.000.000,00	$ 7.585.516.444,00	105923	$ 16.250.763.467	$ 493.084.279.911				
27	OBRA	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.653.144.449,00	$ 19.388.363,00	$ 2.672.532.812,00	$ 63.675.467,00	$ 2.608.857.345,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.641.906.122	$ 490.411.747.099				
27	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2023.	$ 167.548.195,00	$ 776.443,00	$ 168.324.638,00	$ -	$ 168.324.638,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.473.581.484	$ 490.243.422.461				

20	AJUSTES DEF	FEBRERO 2023	$ 357.822.597,00	$ 2.614.857,00	$ 360.437.454,00	$ -	$ 360.437.454,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.113.144.030	$ 489.882.985.007			
21	AJUSTES DEF	MARZO 2023.	$ 221.603.238,00	$ 1.619.408,00	$ 223.222.646,00	$ -	$ 223.222.646,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.889.921.384	$ 489.659.762.361			
22	AJUSTES DEF	ABRIL 2023.	$ 241.746.853,00	$ 1.766.612,00	$ 243.513.465,00	$ -	$ 243.513.465,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.646.407.919	$ 489.416.248.896			
23	AJUSTES DEF	MAYO 2023.	$ 205.704.595,00	$ 1.503.226,00	$ 207.207.821,00	$ -	$ 207.207.821,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.439.200.098	$ 489.209.041.075			
24	AJUSTES DEF	JUNIO 2023.	$ 103.348.079,00	$ 755.236,00	$ 104.103.315,00	$ -	$ 104.103.315,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.335.096.783	$ 489.104.937.760			
25	AJUSTES DEF	JULIO 2023.	$ 1.626.525.089,00	$ 11.886.145,00	$ 1.638.411.234,00	$ -	$ 1.638.411.234,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 10.696.685.549	$ 487.466.526.526			
28	OBRA	OCTUBRE 2023	$ 2.465.104.732,00	$ 18.014.227,00	$ 2.483.118.959,00	$ 59.162.514,00	$ 2.423.956.445,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 8.272.729.104	$ 484.983.407.567			
28	SOCIAL	OCTUBRE 2023	$ 212.789.054,00	$ 986.095,00	$ 213.775.149,00	$ -	$ 213.775.149,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 8.058.953.955	$ 484.769.632.418			
28	EYD	OCTUBRE 2023	$ 83.812.645,00	$ 15.924.403,00	$ 99.737.048,00	$ -	$ 99.737.048,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.959.216.907	$ 484.669.895.370			
26	AJUSTES DEF	AGOSTO 2023	$ 293.691.475,00	$ 2.146.207,00	$ 295.837.682,00	$ -	$ 295.837.682,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.663.379.225	$ 484.374.057.688			
27	AJUSTES PROV	SEPTIEMBRE 2023	$ 511.288.189,00	$ 3.736.337,00	$ 515.024.526,00		$ 515.024.526,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.148.354.699	$ 483.859.033.162			
27	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2023	$ 85.719,00	$ 626,00	$ 86.345,00		$ 86.345,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.148.268.354	$ 483.858.946.817			
29	OBRA	NOVIEMBRE 2023	$ 2.623.299.514,00	$ 19.170.266,00	$ 2.642.469.780,00	$ 62.959.188,00	$ 2.579.510.592,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.568.757.762	$ 481.216.477.037			
29	EYD	NOVIEMBRE 2023	$ 57.734.250,00	$ 10.969.508,00	$ 68.703.758,00		$ 68.703.758,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.500.054.004	$ 481.147.773.279			
29	SOCIAL	NOVIEMBRE 2023	$ 32.257.712,00	$ 149.487,00	$ 32.407.199,00		$ 32.407.199,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.467.646.805	$ 481.115.366.080			
30	OBRA	DICIEMBRE 2023	$ 2.905.511.612,00	$ 21.232.585,00	$ 2.926.744.197,00	$ 69.732.279,00	$ 2.857.011.918,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 1.610.634.887	$ 478.188.621.883			
28	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2023	$ 468.040.332,00	$ 3.420.295,00	$ 471.460.627,00		$ 471.460.627,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 1.139.174.260	$ 477.717.161.256			
29	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2023	$ 483.142.394,00	$ 3.530.656,00	$ 486.673.050,00		$ 486.673.050,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 652.501.210	$ 477.230.488.206			
30	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2023	$ 550.024.083,00	$ 4.019.407,00	$ 554.043.490,00		$ 554.043.490,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 98.457.720	$ 476.676.444.716			
31	OBRA	ENERO 2024	$ 3.196.887.790,00	$ 23.361.872,00	$ 3.220.249.662,00	$ 76.725.307,00	$ 3.143.524.355,00	$ 7.253.261.689,00	105923	$ 51.098.933.365	$ 473.456.195.054			
31	SOCIAL	ENERO 2024	$ 102.523.146,00	$ 475.107,00	$ 102.998.253,00		$ 102.998.253,00	$ 7.253.261.689,00	105923	$ 50.995.935.112	$ 473.353.196.801			
32	OBRA	FEBRERO 2024	$ 3.048.150.378,00	$ 22.274.945,00	$ 3.070.425.323,00	$ 76.203.759,00	$ 2.994.221.564,00	$ 7.177.057.930,00	194824	$ 48.001.713.548	$ 470.282.771.478			
32	SOCIAL	FEBRERO 2024	$ 21.738.920,00	$ 100.741,00	$ 21.839.661,00		$ 21.839.661,00	$ 7.177.057.930,00	194824	$ 47.979.873.887	$ 470.260.931.817			
33	OBRA	MARZO 2024	$ 2.331.734.130,00	$ 17.039.596,00	$ 2.348.773.726,00	$ 58.293.353,00	$ 2.290.480.373,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.689.393.514	$ 467.912.158.091			
33	SOCIAL	MARZO 2024	$ 89.190.951,00	$ 413.324,00	$ 89.604.275,00		$ 89.604.275,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.599.789.239	$ 467.822.553.816			
30	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2023	$ 932.075,00	$ 6.811,00	$ 938.886,00		$ 938.886,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.598.850.353	$ 467.821.614.930			
31	AJUSTES DEF	ENERO 2024	$ 602.576.233,00	$ 4.403.442,00	$ 606.979.675,00		$ 606.979.675,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.991.870.678	$ 467.214.635.255			
32	AJUSTES PROV	FEBRERO 2024	$ 604.230.610,00	$ 4.415.531,00	$ 608.646.141,00		$ 608.646.141,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.383.224.537	$ 466.605.989.114			
32	AJUSTES DEF	FEBRERO 2024	$ 2.489.384,00	$ 18.192,00	$ 2.507.576,00		$ 2.507.576,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.380.716.961	$ 466.603.481.538			
33	AJUSTES PROV	MARZO 2024	$ 532.064.850,00	$ 3.888.166,00	$ 535.953.016,00		$ 535.953.016,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 43.844.763.945	$ 466.067.528.522			
34	OBRA	ABRIL 2024	$ 3.402.329.906,00	$ 24.863.180,00	$ 3.427.193.086,00	$ 85.058.248,00	$ 3.342.134.838,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.502.629.107	$ 462.640.335.436			
34	EYD	ABRIL 2024	$ 253.204.150,00	$ 48.108.789,00	$ 301.312.939,00		$ 301.312.939,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.201.316.168	$ 462.339.022.497			
34	SOCIAL	ABRIL 2024	$ 22.615.252,00	$ 104.802,00	$ 22.720.054,00		$ 22.720.054,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.178.596.114	$ 462.316.302.443			
33	AJUSTE DEF	MARZO 2024	$ 217.405,00	$ 1.589,00	$ 218.994,00		$ 218.994,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.178.377.120	$ 462.316.083.449			
34	AJUSTES PROV	ABRIL 2024	$ 789.047.932,00	$ 5.766.120,00	$ 794.814.052,00		$ 794.814.052,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 39.383.563.068	$ 461.521.269.397			
35	OBRA	MAYO 2024	$ 6.520.666.125,00	$ 47.651.022,00	$ 6.568.317.147,00	$ 163.016.653,00	$ 6.405.300.494,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 32.978.262.574	$ 454.952.952.250			
35	SOCIAL	MAYO 2024	$ 21.615.229,00	$ 100.168,00	$ 21.715.397,00		$ 21.715.397,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 32.956.547.177	$ 454.931.236.853			
35	AJUSTES PROV	MAYO 2024	$ 1.471.693.766,00	$ 10.754.685,00	$ 1.482.448.451,00		$ 1.482.448.451,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 31.474.098.726	$ 453.448.788.402			
36	OBRA	JUNIO 2024	$ 5.542.838.046,00	$ 40.505.355,00	$ 5.583.343.401,00	$ 138.570.951,00	$ 5.444.772.450,00	$ 6.732.118.725,00	194824	$ 26.029.326.276	$ 447.865.445.001			
36	AJUSTES PROV	JUNIO 2024	$ 1.244.283.613,00	$ 9.092.842,00	$ 1.253.376.455,00		$ 1.253.376.455,00	$ 6.732.118.725,00	194824	$ 24.775.949.821	$ 446.612.068.546			
37	OBRA	JULIO 2024	$ 4.607.308.161,00	$ 33.668.790,00	$ 4.640.976.951,00	$ 115.182.704,00	$ 4.525.794.247,00	$ 6.616.936.021,00	194824	$ 20.250.155.574	$ 441.971.091.595			
37	SOCIAL	JULIO 2024	$ 44.191.912,00	$ 204.792,00	$ 44.396.704,00		$ 44.396.704,00	$ 6.616.936.021,00	194824	$ 20.205.758.870	$ 441.926.694.891			
38	OBRA	AGOSTO 2024	$ 4.774.121.564,00	$ 34.887.811,00	$ 4.809.009.375,00	$ 119.353.039,00	$ 4.689.656.336,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.516.102.534	$ 437.117.685.516			
38	SOCIAL	AGOSTO 2024	$ 23.143.108,00	$ 107.249,00	$ 23.250.357,00		$ 23.250.357,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.492.852.177	$ 437.094.435.159			
38	EYD	AGOSTO 2024	$ 102.033.464,00	$ 19.386.358,00	$ 121.419.822,00		$ 121.419.822,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.371.432.355	$ 436.973.015.337			
37	AJUSTES PROV	JULIO 2024	$ 1.009.245.934,00	$ 7.375.259,00	$ 1.016.621.193,00		$ 1.016.621.193,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 14.354.811.162	$ 435.956.394.144			
39	OBRA	SEPTIEMBRE 2024	$ 7.693.070.181,00	$ 56.218.590,00	$ 7.749.288.771,00	$ 192.326.755,00	$ 7.556.962.016,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 6.797.849.146	$ 428.207.105.373			
39	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2024	$ 21.612.619,00	$ 100.156,00	$ 21.712.775,00		$ 21.712.775,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 6.776.136.371	$ 428.185.392.598			
38	AJUSTES DEF	AGOSTO 2024	$ 1.047.458.004,00	$ 7.654.501,00	$ 1.055.112.505,00		$ 1.055.112.505,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 5.721.023.866	$ 427.130.280.093			
40	OBRA	OCTUBRE 2024	$ 3.074.634.977,00	$ 22.468.486,00	$ 3.097.103.463,00	$ 76.865.874,00	$ 3.020.237.589,00	$ 6.228.390.353,00	194824	$ 2.700.786.277	$ 424.033.176.630			
41	OBRA	NOVIEMBRE 2024	$ 76.788.734,00	$ 561.148,00	$ 77.349.882,00	$ 1.919.718,00	$ 75.430.164,00	$ 6.226.470.635,00	194824	$ 2.625.356.113	$ 423.955.826.748			
39	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2024	$ 1.721.881.255,00	$ 12.582.978,00	$ 1.734.464.233,00		$ 1.734.464.233,00	$ 6.226.470.635,00	194824	$ 890.891.880	$ 422.221.362.515			
42	OBRA	DICIEMBRE 2024	$ 145.839.144,00	$ 1.065.748,00	$ 146.904.892,00	$ 3.645.979,00	$ 143.258.913,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.747.632.967	$ 422.074.457.623			
40	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2024	$ 684.369.106,00	$ 5.001.159,00	$ 689.370.265,00		$ 689.370.265,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.058.262.702	$ 421.385.087.358			
41	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2024	$ 17.756.094,00	$ 129.756,00	$ 17.885.850,00		$ 17.885.850,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.040.376.852	$ 421.367.201.508			
42	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2024	$ 33.722.833,00	$ 246.436,00	$ 33.969.269,00		$ 33.969.269,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.006.407.583	$ 421.333.232.239			
43	OBRA	ENERO 2025	$ 3.356.318.232,00	$ 24.526.941,00	$ 3.380.845.173,00	$ 83.907.956,00	$ 3.296.937.217,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.877.470.366	$ 417.952.387.066			
43	EYD	ENERO 2025	$ 98.548.618,00	$ 18.724.237,00	$ 117.272.855,00		$ 117.272.855,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.760.197.511	$ 417.835.114.211			
43	SOCIAL	ENERO 2025	$ 68.433.671,00	$ 317.132,00	$ 68.750.803,00		$ 68.750.803,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.691.446.708	$ 417.766.363.408			
43	AMBIENTAL	ENERO 2025	$ 353.737.713,00	$ 15.170.477,00	$ 368.908.190,00		$ 368.908.190,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.322.538.518	$ 417.397.455.218			
43	PREDIAL	ENERO 2025	$ 118.923.000,00	$ 22.595.370,00	$ 141.518.370,00		$ 141.518.370,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.181.020.148	$ 417.255.936.848			
41	AJUSTES DEF	NOVIEMBRE 2024			$ -		$ -	$ 6.138.916.700,00	194824	$ 68.181.020.148	$ 417.255.936.848			
42	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2024	$ 37.981,00	$ 278,00	$ 38.259,00		$ 38.259,00	$ 6.138.916.700,00	194824	$ 68.180.981.889	$ 417.255.898.589			
44	OBRA	FEBRERO 2025	$ 250.461.260,00	$ 1.830.294,00	$ 252.291.554,00	$ 6.261.532,00	$ 246.030.022,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 67.934.951.867	$ 417.003.607.035			
44	EYD	FEBRERO 2025	$ 172.650.588,00	$ 32.803.612,00	$ 205.454.200,00		$ 205.454.200,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 67.729.497.667	$ 416.798.152.835			
43	AJUSTES DEF	ENERO 2025	$ 858.334.871,00	$ 6.272.447,00	$ 864.607.318,00		$ 864.607.318,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 66.864.890.349	$ 415.933.545.517			
44	AJUSTES DEF	FEBRERO 2025	$ 69.269.197,00	$ 506.198,00	$ 69.775.395,00		$ 69.775.395,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 66.795.114.954	$ 415.863.770.122			
45	OBRA	MARZO 2025	$ 698.848.636,00	$ 5.106.971,00	$ 703.955.607,00	$ 17.471.216,00	$ 686.484.391,00	$ 6.115.183.952,00	194824	$ 66.108.630.563	$ 415.159.814.515			
46	OBRA	ABRIL 2025	$ 1.130.835.705,00	$ 8.263.799,00	$ 1.139.099.504,00	$ 28.270.893,00	$ 1.110.828.611,00	$ 6.086.913.059,00	194824	$ 64.997.801.952	$ 414.020.715.011			
45	AJUSTES DEF	MARZO 2025	$ 180.461.789,00	$ 1.318.759,00	$ 181.780.548,00		$ 181.780.548,00	$ 6.086.913.059,00	194824	$ 64.816.021.404	$ 413.838.934.463			
47	OBRA	MAYO 2025	$ 1.986.225.421,00	$ 14.514.724,00	$ 2.000.740.145,00	$ 49.655.636,00	$ 1.951.084.509,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.864.936.895	$ 411.838.194.318			
47	EYD	MAYO 2025	$ 193.164.314,00	$ 36.701.221,00	$ 229.865.535,00		$ 229.865.535,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.635.071.360	$ 411.608.328.783			
46	AJUSTES DEF	ABRIL 2025	$ 275.854.708,00	$ 2.015.861,00	$ 277.870.569,00		$ 277.870.569,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.357.200.791	$ 411.330.458.214			
48	OBRA	JUNIO 2025	$ 2.993.368.864,00	$ 21.874.619,00	$ 3.015.243.483,00	$ 74.834.222,00	$ 2.940.409.261,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.416.791.530	$ 408.315.214.731			
48	SOCIAL	JUNIO 2025	$ 4.877.278,00	$ 22.602,00	$ 4.899.880,00		$ 4.899.880,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.411.891.650	$ 408.310.314.851			
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 235.557.703,00	$ 1.721.383,00	$ 237.279.086,00		$ 237.279.086,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.174.612.564	$ 408.073.035.765			
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 293.934.745,00	$ 2.147.985,00	$ 296.082.730,00		$ 296.082.730,00	$ 5.962.423.201,00	108025	$ 58.878.529.834	$ 407.776.953.035			
49	OBRA	JULIO 2025	$ 3.210.908.462,00	$ 23.464.331,00	$ 3.234.372.793,00	$ 80.272.712,00	$ 3.154.100.081,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 55.724.429.753	$ 404.838.662.972			
49	SOCIAL	JULIO 2025	$ 136.195.316,00	$ 631.149,00	$ 136.826.465,00		$ 136.826.465,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 55.587.603.288	$ 404.701.836.507			
TOTALES			**135.613.427.127,00**	**1.370.772.912,00**	**136.984.200.039,00**	**2.148.332.058,00**		**$ 5.882.150.489,00**		**$ 55.587.603.288**	**$ 404.701.836.507**			

FECHA 31/07/2025
(Día) (Mes) (Año)

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 113.562.054.388,00	$ 829.876.551,00	$ 114.391.930.939,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 18.512.808.038,00	$ 135.285.905,0	$ 18.648.093.943,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.910.742.903,00	$ 363.041.154,00	$ 2.273.784.057,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 118.923.000,00	$ 22.595.370,00	$ 141.518.370,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 968.732.363,00	$ 4.489.247,00	$ 973.221.610,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 490.879.518,00	$ 15.256.282,00	$ 506.135.800,00
PROTOCOLO COVID (PREACTA)	$ 49.286.917,00	$ 228.403,00	$ 49.515.320,00
VALOR TOTAL	$ 135.613.427.127,00	$ 1.370.772.912,00	$ 136.984.200.039,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANA MARÍA JALLER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No.: 05202-46129 ANT

Firma
Nombre: JOSÉ IGNACIO CADENA LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 25202-31528 CND

VoBo.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ZONA SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2025 **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CESAR AUGUSTO GOMEZ ROJAS	91252330	PROFESIONAL EN GEOLOGIA	$ 6,000,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JOYCO CONSULTORES S.A.S	$ 6,000,000	$ 417,600	V	EPS SURA	9488669401	$ 240,000	PORVENIR	9488669401	$ 960,000	$ 240,000	$ -	$ -	
2	MARIO ALEJANDRO BEDOYA MUÑOZ	18130466	RESIDENTE SST	$ 2,500,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JOYCO CONSULTORES S.A.S	$ 2,500,000	$ 174,000	V	NUEVA E.P.S.	9488669401	$ 100,000	COLPENSIONES	9488669401	$ 400,000	$ 100,000	$ -	$ -	
3	EDWIN ARLEY RIVERA DE LA CRUZ	1085304987	OPERADOR BOMBA DE CONCRETO	$ 2,000,000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ			V	EMSSANAR			PORVENIR				NA	NA	INGRESO 10-07-2025
4	CARLOS ANDRES TIMANA	1130950157	OPERADOR MULTIPLE DE MAQUINARIA	$ 2,000,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 2,000,000	$ 139,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 250,000	PORVENIR	1645641886	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
5	JHONY SNEIDER BUESAQUILLO	1127078899	AYUDANTE PRACTICO DE OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,568,945	$ 109,199	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 196,118	PORVENIR	1645641886	$ 251,031	$ 62,758	$ -	$ -	
6	TANIA VANESSA CUELLAR SOLARTE	1083910472	INSPECTORA SST	$ 1,800,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,878,261	$ 130,727	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 234,783	PORVENIR	1645641886	$ 300,522	$ 75,130	$ -	$ -	
7	MILTON ALEXIS DELGADO	1006845378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			VILLALOBOS S.A.S	$ 1,553,472	$ 108,122	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 194,184	PORVENIR	1645641886	$ 248,556	$ 62,139	$ -	$ -	
8	ANDRES GEOVANNY ISOTO	1006948219	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,948,492	$ 135,615	V	EMSSANAR	1645641886	$ 70,700	PORVENIR	1645641886	$ 282,600	$ 77,940	$ -	$ -	
9	JAVIER DAVID DELGADO BENAVIDES	1085326271	INGENIERO RESIDENTE	$ 2,200,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 2,200,000	$ 153,120	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 88,000	PORVENIR	1645641886	$ 352,000	$ 88,000	$ -	$ -	
10	JHON ESNEIDER CAICEDO	1006842060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			VILLALOBOS S.A.S	$ 1,599,890	$ 111,352	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 20,900	PORVENIR	1645641886	$ 83,600	$ 63,996	$ -	$ -	
11	KENER FERNEY MONTEALEGRE	1007432555	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,943,077	$ 135,238	V	EMSSANAR	1645641886	$ 73,900	PORVENIR	1645641886	$ 295,600	$ 77,723	$ -	$ -	
12	BRAYAN ALEXANDER PEREZ	1004217460	CONDUCTOR	$ 1,240,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							VILLALOBOS S.A.S	$ 1,801,033	$ 125,352	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 43,400	PORVENIR	1645641886	$ 173,600	$ 72,041	$ -	$ -	
13	JESUS ELADIO GUERRERO	98136689	OPERADOR BOMBA CONCRETO	$ 266,666		X	X	X	X	X																									VILLALOBOS S.A.S	$ 1,600,000	$ 111,360	V	SANITAS	1645641886	$ 10,700	PORVENIR	1645641886	$ 42,700	$ 64,000	$ -	$ -	
14	LUIS SEBATIAN VILLALOBOS	1085296567	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2,847,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 2,847,000	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 533,900	PORVENIR	1645641886	$ 683,300	$ -	$ -	$ -	
15	OMAR MUÑOZ ORTIZ	87248262	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,600,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,600,000	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 82,200	PORVENIR	1645641886	$ 328,700	$ 64,000	$ -	$ -	
16	SANTIAGO DARIO BENAVIDES NARVAEZ	87061603	SUPERVISOR OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,423,500	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 57,000	PORVENIR	1645641886	$ 277,800	$ 56,940	$ -	$ -	
17	FERNANDO ELIECER CABRERA	1004543171	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,750,000	$ 198,200	V	SANITAS	1645641886	$ 70,000	PORVENIR	1645641886	$ 280,000	$ 70,000	$ -	$ -	
18	OSCAR OVIDIO VALLEJO	1087007392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,750,000	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 70,000	PORVENIR	1645641886	$ 280,000	$ 70,000	$ -	$ -	
19	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1087217460	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	c	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,750,000	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 76,100	PORVENIR	1645641886	$ 304,400	$ 70,000	$ -	$ -	
20	LUIS CARLOS GUERRERO	1086222887	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,600,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	v	c	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,600,000	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 64,000	PORVENIR	1645641886	$ 256,000	$ 64,000	$ -	$ -	
21	YEMIR MEJIA TREJOS	1113675423	ALMACENISTA	$ 1,423,500		X																													VILLALOBOS S.A.S	$ 427,050	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 2,400	PORVENIR	1645641886	$ 9,400	$ 17,082	$ -	$ -	
22	WILMER CEBALLOS	1006946442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500																				v	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 684,415	$ 47,700	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 27,400	PORVENIR	1645641886	$ 109,600	$ 27,400	$ -	$ -	
23	WILMER LAURIDO CEDEÑO	1123331879	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500																				v	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 715,360	$ 49,800	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 28,700	PORVENIR	1645641886	$ 114,500	$ 28,700	$ -	$ -	
24	JAIME WILSON ASCUANTAR	13071025	AYUDANTE DE OBRA	$ 788,083																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 788,083	$ 54,900	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 31,600	PORVENIR	1645641886	$ 126,100	$ 31,600	$ -	$ -	
25	JEISON TRIGO NOVA	1090478070	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 733,334	$ 51,100	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 29,400	PORVENIR	1645641886	$ 117,400	$ 29,400	$ -	$ -	
26	LUIS ALEJANDRO IBARRA	1085266849	AYUDANTE DE IBRA	$ 1,423,500		x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,800,000	$ 125,300	V	SANITAS	1645641886	$ 72,000	PORVENIR	1645641886	$ 288,000	$ 72,000	$ -	$ -	
27	JAIRSINIO POZO ROBLES	13850682	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 3,422,500	$ 238,300	V	SANITAS	1645641886	$ 136,900	PORVENIR	1645641886	$ 547,600	$ 136,900	$ -	$ -	
28	FRANY ANCIZAR CEBALLOS PATIÑO	1112219584	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,748,945	$ 121,800	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 70,000	COLPENSIONES	1645641886	$ 279,900	$ 70,000	$ -	$ -	
29	JERIMIS ENRIQUE CARABALLO PUINCHE	5077578	AYUDANTE DE IBRA	$ 1,423,500			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 1,922,241	$ 133,800	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 76,900	COLPENSIONES	1645641886	$ 307,600	$ 76,900	$ -	$ -	
30	RONAL ADOLFO MORENO HIDALGO	6435330	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS S.A.S	$ 2,002,699	$ 139,400	V	NUEVA E.P.S.	1645641886	$ 80,200	COLPENSIONES	1645641886	$ 320,500	$ 80,200	$ -	$ -	
31	JOSE OMAR CARRILLO	80750019	INGENIERO DE CAMPO	$ 2,156,522													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									INGENIERIA CORREA CORREA SAS	$ 717,392	$ 50,000	V	Nueva EPS	87629450	$ 89,700	Colpensiones	87629450	$ 114,800	$ 28,700	$ 14,400	$ 21,600	RETIRO 22-6-25
32	EDUAR OCTAVIO PEREZ	1051266846	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,865,500													X	X	X	X	X	X	X	X	X										INGENIERIA CORREA CORREA SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	Comepensar	87629450	$ 178,000	Colpensiones	87629450	$ 227,800	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	RETIRO 22-06-25
33	OSCRA RAMIRO LUQUE	3199968	TECNICO DE CAMPO	$ 1,865,500																		X	X	X	X	X									INGENIERIA CORREA CORREA SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	Famisanar	87629450	$ 178,000	Proteccion	87629450	$ 227,800	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	RETIRO 22-06-25
34	SOFIA VALENTINA GAMBOA NAVARRO	1070927612	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2,700,000																							X	X	X	X	X				WLG.INGENIERIA SAS	$ 1,400,000	$ 83,000	V	COMPENSAR EPS	87591154	$ 178,000	PORVENIR	87591154	$ 227,800	$ 8,700	N/A	N/A	RETIRO 27-06-25
35	OSCAR GREGORIO GARZON AGUILERA	80073110	COORDINADOR DE PROYECTOS/ SUPERVISOR	$ 3,500,000		X	X	X																											SGI SAS	$ 3,500,000	$ 348,000	V	SANITAS	NA	$ 625,000	PORVENIR	NA	$ 800,000	$ 200,000	$ 100,000	$ 150,000	
36	VICTOR ANDRES TORRADO PEREZ	1091667661	TECNICO DE CAMPO/ CONDUCTOR	$ 2,000,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SGI SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	NUEVA EPS	NA	$ 250,000	PORVENIR	NA	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
37	EDWIN FERNANDO TRUJILLO VELA	1012416305	TECNICO DE CAMPO/ CONDUCTOR	$ 2,000,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SGI SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	FAMISANAR	NA	$ 250,000	PORVENIR	NA	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
38	LUIS ALBERTO MANRIQUE PENAGOS	1075313317	PROFESIONAL BIOLOGO	$ 3,750,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	SGI SAS	$ 3,750,000	$ 100,000	V	NUEVA EPS	NA	$ 100,000	PROTECCION	NA	$ 128,000	$ 4,800	NA	NA	RETIRO 15-07-25
39	VLADIMIR ANDRES TRVADO BELTRAN	1098785504	PROFESIONAL BIOLOGO	$ 3,750,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	SGI SAS	$ 3,750,000	$ 100,000	V	SALUD TOTAL	NA	$ 112,500	PROTECCION	NA	$ 144,000	$ 5,400	NA	NA	RETIRO 15-07-25
40	CRISTIAN ADOLFO ACUÑA MARTINEZ	1054093750	TECNICO DE CAMPO	$ 2,200,000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SGI SAS	$ 2,200,000	$ 174,000	V	NUEVA EPS	NA	$ 100,000	PORVENIR	NA	$ 400,000	$ 100,000	$ 40,000	$ 60,000	Ingresó en Julio 16-07-25
41	MIGUEL ANGEL GONZALEZ REQUINIVA	1121906807	TECNICO DE CAMPO/ CONDUCTOR	$ 2,086,987																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SGI SAS	$ 2,086,987	$ 140,500	V	SANITAS	NA	$ 80,700	PORVENIR	NA	$ 322,800	$ 80,700	$ 40,000	$ 60,000	Ingresó en Julio 16-07-25
42	ANTONIO MARIA CERA	12627143	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,600,000	$ 8,400	V	SALUD TOTAL	88379264	$ 200,000	PORVENIR	88379264	$ 256,000	$ 57,000	NA	NA	RETIRO 3-07-25
43	ARBEY NIETO NIETO	17703882	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	88379264	$ 178,000	COLPENSIONES	88379264	$ 227,800	$ 57,000	NA	NA	RETIRO 3-07-25
44	BRAYAN FELIPE MOERNO LOPEZ	1006665923	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	FAMISANAR	88379264	$ 178,000	PROTECCION	88379264	$ 227,800	$ 57,000	NA	NA	RETIRO 3-07-25
45	DIEGO YARID DIAZ	1124848575	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 36,400	V	SALUD TOTAL	88379264	$ 65,300	PORVENIR	88379264	$ 83,600	$ 10,500	NA	NA	RETIRO 3-07-25
46	JERMISON ADRIAN HOYOS SANCHEZ	1127072045	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 36,400	V	FAMISANAR	88379264	$ 65,300	PORVENIR	88379264	$ 83,600	$ 10,500	NA	NA	RETIRO 3-07-25
47	JHEISON FREIDER ROSALES MELO	1120067496	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 36,400	V	SANITAS	88379264	$ 65,300	PORVENIR	88379264	$ 83,600	$ 10,500	NA	NA	RETIRO 3-07-25
48	JHONATAN MUÑOZ MAZO	1006962119	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 36,400	V	SANITAS	88379264	$ 65,300	PORVENIR	88379264	$ 83,600	$ 10,500	NA	NA	RETIRO 3-07-25
49	MAURO ARNOLDO ESPAÑA GUERRA	18144358	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 36,400	V	ASMETSALUD EPS	88379264	$ 65,300	COLPENSIONES	88379264	$ 83,600	$ 10,500	NA	NA	RETIRO 3-07-25
50	MERY DALLANA ERLINDA OJEDA	1123331221	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1,623,500		X	X	X																											NAGEIA	$ 1,423,500	$ 36,400	V	NUEVA EPS	88379264	$ 65,300	PORVENIR	88379264	$ 83,600	$ 10,500	NA	NA	RETIRO 3-07-25

| | | |

| | | |
