1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OM-2025	
IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): 901972420-9	
No. DE CONTRATO: CPS - 2218 de 2025	Mayor cuantía ____X____ Menor Cuantía _____ Mínima cuantía_____
OBJETO DEL CONTRATO:	RTVC REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA QUE CONFORMA LA RED DE TRASMISIÓN A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN ANALÓGICA, TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) Y ESTACIONES DE RADIO AM/FM.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	05 de agosto de 2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2025 o hasta agotar recursos
PRORROGAS:	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RESOL 0016/25 COBERT DE LA TDT PUB NAC Y REG – **VALOR A PAGAR** - **($ 4.512.869.607,20)** RESOL 0016/25 COBERT DE LA TDT PUB NAC Y REG – **VALOR AMORTIZAR 20% ($ 1.128.217.401,80)** Los valores 20% aquí amortizados incluyen el IVA
PERIODO CERTIFICADO:	Noviembre de 2025
NUMERO DE PAGO:	PAGO # 4

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	**Cuenta de cobro No. 04 de noviembre de 2025 - Factura FV 7 - Dic 17 de 2025**

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	**GASTOS DE VIAJE____**
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____	**COMISIÓN____**
ANTICIPO: ___	**PAGO ANTICIPADO: _____**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Durante el periodo de noviembre de 2025 se evidencia la entrega de la documentación requerida al contratista que permite soportar la ejecución a la fecha. A continuación, se relaciona la documentación entregada a RTVC:

Anexo 1. Informe de Gestión – Noviembre 2025
Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica
Anexo 3. RUTA VISITA TÉCNICA OM MES NOVIEMBRE MES 3
Anexo 4. Servicios_Recuperados_Estaciones Nov-31
Anexo 5 - Control PQRSD Noviembre
Anexo 6. Componente eléctrico - Noviembre
Anexo 7. Cronograma noviembre CAN
Anexo 8. Soportes actividades CAN Noviembre 2025
Anexo 9. Informe de Gestión Ambiental
Anexo 10. Soportes actividades ambientales
Anexo 11. Resumen de actividades correctiva Noviembre
Anexo 12. SST NOVIEMBRE 2025

Anexo 13. Informe estaciones de radio RTVC Noviembre
Anexo 14. Información custodios llaves
Anexo 15. CG CDF 3824 RTNC VICTOR TORRES 1-11-2025
Anexo 16. Informes de visitas de levantamiento Civil
Anexo 17. Certificación combustibles Noviembre
Anexo 18. Certificación operarios estaciones principales Nov.
Anexo 19. Facturación noviembre bolsa
Anexo 20. Intervención de Estación Leticia / Francisco de Paula Santander

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS:

Durante el periodo certificado a la fecha se tiene que el contrato se inició de acuerdo a lo establecido, adelantando lo relacionado a la **CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato es por la suma de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($25.725.653.989**), IVA incluido, amparados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3823 y 3833, expedidos el 19 de junio de 2025.

Que con fecha 8 de noviembre de 2025 se realizó la **ADICION No. 1** al contrato **RTVC-CPS-2218-2025 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE $ $2.708.436.834**, IVA incluido, amparados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. CDP No. 4824 de 24/10/2025 - ($1.931.008.634) y CDP No. 4825 de 24/10/2025 - ($777.428.200), para un **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MC/TE $28.434.090.823,** IVA incluido. Con el fin de dar cumplimiento con la ejecución de las necesidades de financiar el proyecto de "Fortalecimiento de la Radio Pública en el Territorio Nacional", el cual comprende la instalación de cinco nuevos estudios de radio, ubicados en Medellín (2), Leticia, Tunja y Cartagena, así como la adecuación y dotación completa de infraestructura técnica y tecnológica.

En virtud de lo aprobado por el MinTIC, RTVC estableció asegurar la **implementación y puesta en funcionamiento de la Estación de Radio Leticia, la cual requiere la ampliación del alcance y recursos del contrato RTVC-CPS-2218-2025**, dado que este contrato concentra la capacidad operativa, logística y técnica que asegura la instalación, configuración, integración y mantenimiento de las estaciones de la red nacional. Cubriendo de esta manera los costos de infraestructura y adecuación física en la **sede de Leticia** con el objetivo de disponer de una Infraestructura técnica y física que permita realizar producción y transmisión de producciones realizadas dentro y fuera de la entidad, para de esta forma, aumentar la eficiencia de la prestación del servicio de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, Adquirir e instalar equipos de transmisión, audio y sistemas de respaldo energético específicos para el fortalecimiento, mejora y optimización de la estación leticia, fortalecer la capacidad técnica y operativa del contratista, al dotarlo de los recursos necesarios para atender contingencias de manera integral y oportuna, prevenir mayores costos futuros derivados de la atención tardía de fallas estructurales y técnicas, promover la descentralización de la producción y transmisión de contenidos desde regiones apartadas, fortaleciendo la identidad cultural y la presencia institucional de RTVC en zonas de frontera. Desde la supervisión se considera viable realizar las adecuaciones correctivas y de fortalecimiento tecnológicas y físicas necesarias y soportas bajo Informe presentado por el CONSORCIO OM-2025.

Se suscribió el Acta de Inicio de la ejecución contractual y aprobados también por RTVC.

ITEM	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO
1	Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su liquidación, cuando sea necesario.	Si
2	Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC.	Si
3	Atender y cumplir con los lineamientos, directrices, observaciones y requerimientos emanadas por el supervisor y/o interventor del contrato, o a quien este delegue, e informar a este en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la ejecución del contrato.	Si
4	Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada. Esto incluye la reserva de obras o contenidos inéditos, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o uso indebido que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros.	Si
5	Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución de este hasta su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.	Si
6	Cumplir de manera estricta todas y cada una de las medidas y/o protocolos que se adopten en el marco de los programas de promoción y prevención del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por -RTVC S.A.S.	Si
7	Entregar al supervisor y/o interventor del contrato al inicio del contrato y cada que sea requerido por el supervisor y/o interventor del contrato, copia del documento que acredite el cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en su empresa.	Si

8	Asistir a las reuniones que se programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato.	Si
9	Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus actividades, respetando las instrucciones internas de seguridad y convivencia de la Entidad, y manteniendo el buen trato con los demás Contratista es, servidores y funcionarios de -RTVC S.A.S. - bajo los principios de buena conducta ética y Página 4 de 14 moral, a fin de cumplir con el objeto contractual establecido en el presente negocio jurídico.	Si
10	Informar por escrito al supervisor y/o interventor del contrato las novedades relativas a cesión, suspensión o terminación anticipada del contrato, con mínimo ocho (8) días de antelación a la fecha de suscripción del acta que contenga la novedad.	Si
11	Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, teniendo como referente los principios de calidad en los tiempos de ejecución establecidos.	Si
12	Cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas del Servicio y conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral de la presente contratación.	Si
13	Conocer y aplicar las políticas y protocolos de protección implementadas a través de la Circular No. 007 del 22 de marzo de 2023, o aquella que la modifique, sustituya o adicione, las cuales corresponden al protocolo para el manejo del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en RTVC S.A.S.	Si
14	Custodiar y velar por la seguridad de las instalaciones y el personal requerido para el cumplimiento del contrato, cuando sea necesario y bajo su propio riesgo sin que esto represente un costo adicional para la Entidad. RTVC no se hará responsable por pérdida total o parcial de los equipos, esta responsabilidad recaerá únicamente en cabeza del CONTRATISTA, a quien podrá serle descontado el valor del daño a cargo de la contraprestación que habrá de recibir.	Si
15	Cumplir con los lineamientos contemplados en el Manual de Contratación de -RTVC-, referente al Conflicto de Interés.	Si
16	Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.	Si

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en EJECUCIÓN, con un porcentaje de avance del **79,31%.**

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el normal desarrollo del contrato.

La supervisión reconoce que existen factores externos y heredados que limitan el desempeño óptimo de los indicadores globales de disponibilidad. Los focos de atención prioritaria son:

- Limitaciones Energéticas: Estaciones sin suministro eléctrico o con sistemas de respaldo obsoletos, lo que impacta la continuidad del servicio de manera heterogénea.
- Restricciones de Acceso: Persisten estaciones siniestradas o en zonas de difícil acceso que impiden la intervención inmediata.
- Deterioro de Infraestructura Física: El diagnóstico civil revela fallas generalizadas en cubiertas y cerramientos. La supervisión toma nota de que la solución definitiva depende de la aprobación de recursos y partidas presupuestales por parte de la entidad (RTVC).

A pesar de los puntos críticos mencionados, el contratista demuestra un alto nivel de desempeño operativo, sustentado en las siguientes métricas:

- **Efectividad en Campo:** Un cumplimiento del 98,29% en el cronograma de visitas técnicas, lo que asegura presencia institucional en la red.
- **Control de Información:** Se destaca la carga sistemática en el sistema SIGMA, garantizando la trazabilidad y la transparencia en la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos.
- **Insumos Estratégicos:** La entrega oportuna del diagnóstico civil se clasifica como un logro administrativo clave, ya que proporciona a RTVC la base técnica necesaria para la planeación de inversiones futuras.
- El mayor valor de este periodo no es solo la reparación de equipos, sino la documentación exhaustiva de la red. Contar con puntos críticos "plenamente identificados y priorizados" permite que la supervisión de RTVC pase de una actitud reactiva a una planificación estratégica de largo plazo.
- **Rigor Administrativo**: El cumplimiento casi total del cronograma de visitas (98,29%) y la actualización de bitácoras e inventarios reflejan un consorcio comprometido con la excelencia operativa y el orden institucional.
- **Transparencia en la Comunicación**: El hecho de que el contratista identifique claramente qué intervenciones dependen de la entidad (como los recursos para obras civiles) facilita una coordinación armónica y una delimitación clara de responsabilidades, asegurando que el contrato avance bajo principios de eficiencia y honestidad técnica

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el articulo ARTÍCULO 2.2.4.2.2.13., del decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes, conforme a las siguientes consideraciones:

Número de Planilla:	Certificado de revisor fiscal
Periodo cotizado:	Noviembre de 2025

2.5 GARANTIAS: (Si el contrato no tiene garantías deje el numeral, registre N/A y elimine los cuadros. Para el caso en que el contrato tiene garantías debe especificar el tipo de garantía y las diferentes características En caso de realizarse modificaciones, se deben relacionar igualmente los respectivos anexos expedidos para las pólizas)

Póliza No. **33-45-101138565**
33-40-101086566

Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

			Vigencia	
Amparo	**Porcentaje amparado**	**Valor**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
CUMPLIMIENTO - BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100%	$5.145.130.797,80	1/08/2025	31/12/2025
CUMPLIMIENTO	30%	$8.530.227.246,90	1/08/2025	2/05/2026
PAGO DE SALARIOS	5%	$1.421.704.541,15	1/08/2025	31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$5.686.818.164,60	1/08/2025	2/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 2.847.000.000	1/08/2025	31/12/2025

2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS: (En este orden y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Supervisión, en lo que respecta a las funciones de la supervisión, se debe estipular la totalidad de actividades realizadas en el marco de cada uno de los siguientes aspectos)

El presente informe tiene como finalidad evidenciar las actividades ejecutadas por el CONSORCIO OM 2025 bajo contrato **RTVC-CPS-2218-2025**, orientadas a mostrar la distribución de recursos, la estrategia implementada para la atención, seguimiento y control de solicitudes e incidentes, así como las rutinas de mantenimiento realizadas en las estaciones de RTVC. Estas acciones comprenden la gestión integral de diferentes sistemas que deben administrarse de manera óptima para garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de radio y televisión pública a nivel nacional.

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Durante el periodo certificado a la fecha se tiene que el contrato se inició de acuerdo a lo establecido.

El contratista está cumpliendo con los procedimientos administrativos establecidos y contenidos en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contrato, presenta los informes mensuales de actividades dentro de los plazos establecidos en el Contrato No. 2218-2025, así mismo, se adjuntó informe mensual correspondiente.

ITEM	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIEN-TO
1	Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su liquidación, cuando sea necesario.	Si
2	Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC.	Si
3	Atender y cumplir con los lineamientos, directrices, observaciones y requerimientos emanadas por el supervisor y/o interventor del contrato, o a quien este delegue, e informar a este en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la ejecución del contrato.	Si
4	Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada. Esto incluye la reserva de obras o contenidos inéditos, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o uso indebido que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros.	Si

5	Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución de este hasta su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.	Si
6	Cumplir de manera estricta todas y cada una de las medidas y/o protocolos que se adopten en el marco de los programas de promoción y prevención del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por -RTVC S.A.S.	Si
7	Entregar al supervisor y/o interventor del contrato al inicio del contrato y cada que sea requerido por el supervisor y/o interventor del contrato, copia del documento que acredite el cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en su empresa.	Si
8	Asistir a las reuniones que se programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato.	Si
9	Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus actividades, respetando las instrucciones internas de seguridad y convivencia de la Entidad, y manteniendo el buen trato con los demás Contratista es, servidores y funcionarios de -RTVC S.A.S. - bajo los principios de buena conducta ética y Página 4 de 14 moral, a fin de cumplir con el objeto contractual establecido en el presente negocio jurídico.	Si
10	Informar por escrito al supervisor y/o interventor del contrato las novedades relativas a cesión, suspensión o terminación anticipada del contrato, con mínimo ocho (8) días de antelación a la fecha de suscripción del acta que contenga la novedad.	Si
11	Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, teniendo como referente los principios de calidad en los tiempos de ejecución establecidos.	Si
12	Cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas del Servicio y conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral de la presente contratación.	Si
13	Conocer y aplicar las políticas y protocolos de protección implementadas a través de la Circular No. 007 del 22 de marzo de 2023, o aquella que la modifique, sustituya o adicione, las cuales corresponden al protocolo para el manejo del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en RTVC S.A.S.	Si
14	Custodiar y velar por la seguridad de las instalaciones y el personal requerido para el cumplimiento del contrato, cuando sea necesario y bajo su propio riesgo sin que esto represente un costo adicional para la Entidad. RTVC no se hará responsable por pérdida total o parcial de los equipos, esta responsabilidad recaerá únicamente en cabeza del CONTRATISTA, a quien podrá serle descontado el valor del daño a cargo de la contraprestación que habrá de recibir.	Si
15	Cumplir con los lineamientos contemplados en el Manual de Contratación de -RTVC-, referente al Conflicto de Interés.	Si
16	Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.	Si

2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS

Las actividades ejecutadas por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato y las obligaciones especificas a su cargo fueron realizadas dentro de los parámetros requeridos durante el periodo certificado.

Link documentos técnicos soportes mes de noviembre de 2025:

https://rtvc365.sharepoint.com/sites/DTC-2.GOBIERNOTI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDTC%2D2%2EGOBIERNOTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%2E%20GOBIERNO%20TO%2F2%2E6%20Contratacion%2F2%2E6%2E4%2E%20Coordinaci%C3%B3n%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Red%2F2%2E6%2E9%20OM%20CTO%202218%20%2D%202025%2F2%2E6%2E9%2E3%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E6%2E9%2E3%2E1%20Informes%20de%20mantenimiento&viewid=5aeaec84%2D8cbc%2D4428%2Db20b%2D49757cd09093

Desde la óptica de la supervisión de RTVC Sistema de Medios Públicos, el mes de noviembre de 2025 representa un periodo de consolidación operativa y madurez contractual por parte del Consorcio OM-2025. El informe refleja que la ejecución del contrato de operación, mantenimiento y gestión integral ha pasado de una fase de diagnóstico a una de estabilización activa.

Eficiencia Técnica: Se destaca un cumplimiento sobresaliente del **98,29%** en el cronograma de mantenimiento preventivo (172 visitas), lo cual es fundamental para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía a través de la señal pública.

Gestión de Infraestructura: La supervisión recibe con éxito el diagnóstico integral de las **45 estaciones primarias**. Este insumo es vital para la planeación financiera y técnica de RTVC, ya que permite identificar fallas en cubiertas, drenajes y cerramientos bajo una hoja de ruta clara.

Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo: Se observa un avance riguroso en los componentes **Ambiental** (gestión de residuos peligrosos y PCBs) y **SST** (100% de cobertura en exámenes médicos), asegurando que RTVC cumpla con los estándares legales y de responsabilidad social.

Seguridad: La estabilidad operativa del **96%** en seguridad física, pese al incidente reportado en Bojayá, demuestra un control efectivo sobre los activos críticos de la nación en zonas de difícil acceso.

La gestión del Consorcio OM-2025 durante este periodo no solo cumple con el objeto contractual, sino que aporta un **valor agregado institucional** que debe ser resaltado. El desempeño exhibido se fundamenta en tres pilares de excelencia:

Es notable cómo el contratista ha logrado transformar "limitaciones estructurales heredadas" en oportunidades de mejora. La recuperación de múltiples servicios afectados y la tendencia positiva en el componente eléctrico —pasando de un estado crítico a uno "operativo con restricciones" pero estable— evidencian una **gestión técnica responsable**. No se trata solo de reparar, sino de estabilizar el sistema para prevenir futuras caídas de señal.

Uno de los mayores logros de este mes es la culminación del levantamiento preliminar de las estaciones primarias. Para la supervisión de RTVC, contar con una **caracterización técnica detallada y documentada** es un activo invaluable. El Consorcio no solo está operando la red, sino que está entregando a la entidad "verdad procesal" sobre el estado de sus activos, lo que facilita una toma de decisiones basada en datos y no en suposiciones.

La finalización de obras civiles en el **CAN (Estudio 1)** y el avance del **70,12% en la estación de Leticia** demuestran una capacidad logística robusta, considerando la complejidad geográfica de las estaciones. Asimismo, el cumplimiento total en los indicadores de Salud en el Trabajo refleja un compromiso ético con el talento humano, lo cual se traduce en una menor rotación y una mayor eficacia en las labores de campo.

Conclusión: El informe de noviembre ratifica que el Consorcio OM-2025 ha superado la curva de aprendizaje inicial, posicionándose como un aliado estratégico de RTVC. La sinergia entre los componentes técnico, ambiental y civil garantiza no solo la continuidad del servicio de radio y televisión, sino también la preservación del patrimonio tecnológico del Estado colombiano.

- Se presentaron los documento y evidencias en los términos señalados y dentro del formato correspondiente, así como aportando certificación de afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social (Salud, pensión, ARL), parafiscales y la documentación exigida por la Entidad para el presente pago.

Se anexan:

Anexo 1. Informe de Gestión – Noviembre 2025
Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica
Anexo 3. RUTA VISITA TÉCNICA OM MES NOVIEMBRE MES 3
Anexo 4. Servicios_Recuperados_Estaciones Nov-31
Anexo 5 - Control PQRSD Noviembre
Anexo 6. Componente eléctrico - Noviembre
Anexo 7. Cronograma noviembre CAN
Anexo 8. Soportes actividades CAN Noviembre 2025
Anexo 9. Informe de Gestión Ambiental
Anexo 10. Soportes actividades ambientales
Anexo 11. Resumen de actividades correctiva Noviembre
Anexo 12. SST NOVIEMBRE 2025
Anexo 13. Informe estaciones de radio RTVC Noviembre
Anexo 14. Información custodios llaves
Anexo 15. CG CDF 3824 RTNC VICTOR TORRES 1-11-2025
Anexo 16. Informes de visitas de levantamiento Civil
Anexo 17. Certificación combustibles Noviembre
Anexo 18. Certificación operarios estaciones principales Nov.
Anexo 19. Facturación noviembre bolsa
Anexo 20. Intervención de Estación Leticia / Francisco de Paula Santander

Durante el mes de noviembre el contratista CONSORCIO OM-2025 participó en las reuniones que se relacionan a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD (SESIÒN)	FECHA
1	SEGUIMIENTO OPERATIVO CTO 2218-2025	4/11/2025
2	Revisión indicadores generales - OM	5/11/2025
3	SEGUIMIENTO OPERATIVO CTO 2218-2025	11/11/2025
4	SEGUIMIENTO OPERATIVO CTO 2218-2025	18/11/2025
5	Revisión casos - estaciones siniestradas	19/11/2025
6	Revisión estudios de radio - actualización	24/11/2025

7	SEGUIMIENTO OPERATIVO CTO 2218-2025	25/11/2025
8	Reunión OM e Interventoría	25/11/2025

Informar y presentar las principales actividades desarrolladas durante el mes de noviembre, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el marco del contrato vigente.

Indicador de operatividad general de las estaciones

CONDICIONES DEL SERVICIO				
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL	REAL	CONTRACTUAL	MAYOR A	Nivel de disponibilidad de la red
ESTACIÓN AM	92,40%	100,00%	99,72%	9,24%
ESTACIÓN AM + ANALÓGICA	100,00%	100,00%	99,97%	10,00%
CAN	100,00%	100,00%	99,80%	15,00%
ESTACIÓN MICROONDAS	100,00%	100,00%	99,80%	0,00%
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	83,08%	100,00%	99,80%	4,15%
ESTACIÓN PRIMARIA TDT	74,89%	100,00%	99,80%	3,74%
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + TDT	94,96%	100,00%	99,80%	4,75%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	73,89%	100,00%	99,80%	3,69%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	61,97%	100,00%	99,80%	3,10%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	74,56%	100,00%	99,80%	1,60%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	66,55%	100,00%	99,80%	1,43%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	56,84%	100,00%	99,80%	1,22%
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	58,31%	100,00%	99,80%	1,25%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	78,27%	100,00%	99,80%	1,68%
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	72,73%	100,00%	99,80%	1,56%
ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	88,96%	100,00%	99,80%	1,91%
ESTUDIO RADIO	100,00%	100,00%	99,80%	5,00%
ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	100,00%	100,00%	99,80%	5,00%
CABECERA REGIONAL TDT	100,00%	100,00%	99,80%	15,00%
TOTAL PONDERADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 6 - MINTIC				89,31%

COBERTURA	REAL		
COBERTURA RED TELEVISIÓN	43.212.621	52.999.918	81,53%
	CONTRACTUAL		
	52.999.918	52.999.918	100,00%

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL TDT	REAL	CONTRACTUAL
SERVICIOS TDT	74,40%	100,00%

COBERTURA	REAL			POBLACIÓN COLOMBIANA 2025	% COBERTURA POBLACIÓN COLOMBIA
COBERTURA RED TELEVISIÓN TDT	48.876.896	50.469.461	96,84%	53.110.000	92,03%
	CONTRACTUAL				
	50.469.461	50.469.461	100,00%	53.110.000	95,03%

2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

El pago que se certifica está de acuerdo con lo establecido en el contrato y los requisitos establecidos para el mismo. Igualmente es validado de acuerdo al % de ejecución a corte de 30 de noviembre de 2025.

En atención a las obligaciones que le asisten a la supervisión, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad, se realizaron las siguientes actividades:

- **Validación de actividades para pagos por Ejecución Mensual:** Se realizo la validación por parte de la supervisión para proceder con el pago asociado al mes de noviembre que se realiza sobre la base del corte mensual de actividades, que dependen de los mantenimientos preventivos, correctivos y demás servicios ejecutados durante el periodo objeto de cobro, que para este mes es noviembre de 2025, lo anterior aplicando los valores ofertados por el contratista.

- Para el mes de noviembre de 2025 **NO SE APLICARON DESCUENTOS O LAS PENALIZACIONES**, de acuerdo con el comportamiento de los Servicios prestados durante el período de noviembre de 2025, según Niveles de Servicio, ANS, previo acuerdo entre las partes, con fundamento en los términos establecidos en el contrato 2218 de 2025 y sus anexos.


- Se realiza amortización del 20% incluido el IVA del valor facturado.

BASE FINANCIERA CONTRATO											EJECUCIÓN MES: NOVIEMBRE				
ITEM	CARACTERISTICAS	CANTIDAD Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	TOTAL SERVICIOS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	TOTAL PROPUESTA	CANTIDAD SERVICIOS	VALOR UNITARIO (Antes de IVA)	VALOR TOTAL (Antes de IVA)	IVA	VALOR TOTAL (Con IVA)
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLAN Y POR DEMANDA	ESTUDIO DE RADIO	30	UNITARIO	2	60	$ 6.525.400	$ 1.239.826	$ 7.765.226	$ 465.913.560		17	$ 6.525.400	$ 110.931.800	$ 21.077.042	$ 132.008.842
	ESTACIONES PRIMARIAS	42	UNITARIO	2	84	$ 12.955.300	$ 2.461.507	$ 15.416.807	$ 1.295.011.788		31	$ 12.955.300	$ 401.614.300	$ 76.306.717	$ 477.921.017
	ESTACIONES SECUNDARIAS	255	UNITARIO	2	510	$ 4.550.250	$ 864.548	$ 5.414.798	$ 2.761.546.725		109	$ 4.550.250	$ 495.977.250	$ 94.235.678	$ 590.212.928
	ESTACIONES AM	7	UNITARIO	2	14	$ 13.860.430	$ 2.633.482	$ 16.493.912	$ 230.914.764	$ 9.074.783.372	6	$ 13.860.430	$ 83.162.580	$ 15.800.890	$ 98.963.470
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ESTUDIO DE RADIO	9	UNITARIO	6	54	$ 6.525.400	$ 1.239.826	$ 7.765.226	$ 419.322.204		12	$ 6.525.400	$ 78.304.800	$ 14.877.912	$ 93.182.712
	ESTACIONES PRIMARIAS	13	UNITARIO	6	78	$ 12.955.300	$ 2.461.507	$ 15.416.807	$ 1.202.510.946		68	$ 12.955.300	$ 880.960.400	$ 167.382.476	$ 1.048.342.876
	ESTACIONES SECUNDARIAS	77	UNITARIO	6	462	$ 4.550.250	$ 864.548	$ 5.414.798	$ 2.501.636.445		69	$ 4.550.250	$ 313.967.250	$ 59.653.778	$ 373.621.028
	ESTACIONES AM	2	UNITARIO	6	12	$ 13.860.430	$ 2.633.482	$ 16.493.912	$ 197.926.940		14	$ 13.860.430	$ 194.046.020	$ 36.868.744	$ 230.914.764
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	ESTACIÓN CAN - SEDE CENTRAL - RTVC	1	UNITARIO	6	6	$ 295.970.430	$ 56.234.382	$ 352.204.812	$ 2.113.228.871	$ 2.113.228.871	1	$ 295.970.430	$ 295.970.430	$ 56.234.382	$ 352.204.812
OPERADORES	OPERADORES (VIVIENTES) EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES QUE SE LISTAN EN 2. ANEXO TECNICO_V3 - TABLA 1 - INFRAESTRUCTURA - COLUMNA E (SIEMPRE Y CUANDO LAS ESTACIONES SE ENCUENTREN EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN VALIDADA POR RTVC Y/O EL IN TERVENTOR), DE FORMA PERMANENTE (7 DÍAS A LA SEMANA, 24 HORAS AL DÍA), CON EL FIN DE REALIZAR TODAS LAS LABORES OPERATIVAS REQUERIDAS EN ESAS ESTACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ESTE PERSONAL DEBEN HABITAR EN 45 ESTACIONES PRIMARIAS EQUIVALENTES A UN TOTAL DE 90 PERSONAS QUE DEBEN CUMPLIR CON TURNOS ROTATIVOS, DE CADA 15 DÍAS CALENDARIO (CONTINUOS).	90	OPERADORES	6	540	$ 8.285.400	$ 1.574.226	$ 9.859.626	$ 5.324.198.040	$ 5.324.198.040	90	$ 8.285.400	$ 745.686.000	$ 141.680.340	$ 887.366.340
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA DE LAS ESTACIONES	VIGILANCIA Y CUSTODIA 24/7 CON ARMA DE FUEGO	9	PUESTOS DE TRABAJO	6	54	$ 7.650.340	$ 1.453.565	$ 9.103.905	$ 491.610.848	$ 491.610.848	0	$ 7.650.340	$ -	$ -	$ -
	SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO	30	PUESTOS DE TRABAJO	6	180	$ 6.835.000	$ 1.298.650	$ 8.133.650	$ 1.464.057.000	$ 1.464.057.000	30	$ 6.835.000	$ 205.050.000	$ 38.959.500	$ 244.009.500
	SERVICIO DE CUSTODIO DE ESTACION	249	PUESTOS DE TRABAJO	6	1494	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	$ 746.701.200	$ 746.701.200	249	$ 420.000	$ 104.580.000	$ 19.870.200	$ 124.450.200
SERVICIO DE ANALISIS DE RED	SE REQUIERE PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RED EL SUMINISTRO Y ALQUILER DEL EQUIPO PARA REALIZAR EL RESPECTIVO ANÁLISIS DE LA RED ELÉCTRICA, CON EL FIN DE DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE CONSUMO ELÉCTRICO.	25	SEMANAL	25	625	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	$ 2.231.250.000	$ 2.231.250.000	25	$ 12.000.000	$ 300.000.000	$ 57.000.000	$ 357.000.000
HERRAMIENTA DE GESTION Y SISTEMAS DE INFORMACION	SUMINISTRO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN) A LA MEDIDA REQUERIDAS COMO PARTE INTEGRAL DE LAS ADMINISTRACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A NIVEL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON EL FIN PERMITIR REGISTRAR, GESTIONAR Y ATENDER OPORTUNAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES, REQUERIMIENTOS, INCIDENTES, ESCALAMIENTOS, PROBLEMAS RELACIONADOS CON TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA RED DE TELEVISIÓN ANALÓGICA, TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT), ESTUDIOS Y ESTACIONES DE RADIO AM/FM DE RTVC.	3	UNITARIO	1	3	$ 250.000.000	$ 47.500.000	$ 297.500.000	$ 892.500.000	$ 892.500.000	1	$ 250.000.000	$ 250.000.000	$ 47.500.000	$ 297.500.000
PERSONAL DE MESA DE SERVICIOS	EL OFERENTE DEBE CONTEMPLAR EN SU OFERTA LA DISPOSICIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO DOS (2) (AGENTES DE MESA O PERSONAL DE MESA DE SERVICIO) CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA GESTIÓN DE CASOS (MESA DE AYUDA) DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ESCALADOS A LA MESA DE SERVICIO DE NIVEL I, II, III. EL PERSONAL DE MESA DE SERVICIO ASIGNADO DEBERÁ ESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, ESTACIÓN CAN Y OPERARÁ EN JORNADA CONTINUA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM.	6	OPERARIOS	6	36	$ 23.500.000	$ 4.465.000	$ 27.965.000	$ 1.006.740.000	$ 1.006.740.000	6	$ 23.500.000	$ 141.000.000	$ 26.790.000	$ 167.790.000
BOLSA INTEGRAL	BOLSA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y TECNOLÓGICOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ESTACIONES DE LA RTVC	1	BOLSA	1	1	$ 641.456.583	$ 121.876.751	$ 763.333.333	$ 763.333.333	$ 763.333.333	0	$ -	$ -	$ -	$ -
BOLSA SUMINISTRO DE ACPM Y TRANSPORTE	BOLSA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACPM PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ESTACIONES Y CAN QUE TIENEN RESPALDO ELÉCTRICO POR PLANTA ELECTRICA	1	BOLSA	1	1	$ 532.212.885	$ 101.120.448	$ 633.333.333	$ 633.333.333	$ 633.333.333	1	$ 47.195.982	$ 47.195.982	$ 8.967.237	$ 56.163.219
BOLSA ADECUACIONES OPERATIVAS, EMBELLECIMIENTO Y ORNATO	ADECUACIONES OPERATIVAS, EMBELLECIMIENTO Y ORNATO, SERVICIO DE ROCERIA Y EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ESTACIONES DE LA RTVC	1	BOLSA	1	1	$ 638.655.462	$ 121.344.538	$ 760.000.000	$ 760.000.000	$ 760.000.000	1	$ 91.962.438	$ 91.962.438	$ 17.472.863	$ 109.435.302
										$ 25.501.735.998	$ 730	$ 819.602.351	$ 4.740.409.251	$ 900.677.758	$ 5.641.087.009

DETALLE DE ITEMS

ESTACIONES – MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2025

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - NOVIEMBRE			
Estacion	Cuenta de Short_Code	Suma de VALOR (ANTES DE IVA)	Suma de VALOR (CON IVA)
ESTACIÓN PRIMARIA	31	$ 401.614.300,00	$ 477.921.017,00
ESTUDIO DE RADIO	17	$ 110.931.800,00	$ 132.008.842,00
ESTACIÓN SECUNDARIA	109	$ 495.977.250,00	$ 590.212.927,50
ESTACIÓN AM	6	$ 83.162.580,00	$ 98.963.470,20
Total general	**163**	**$ 1.091.685.930,00**	**$ 1.299.106.256,70**

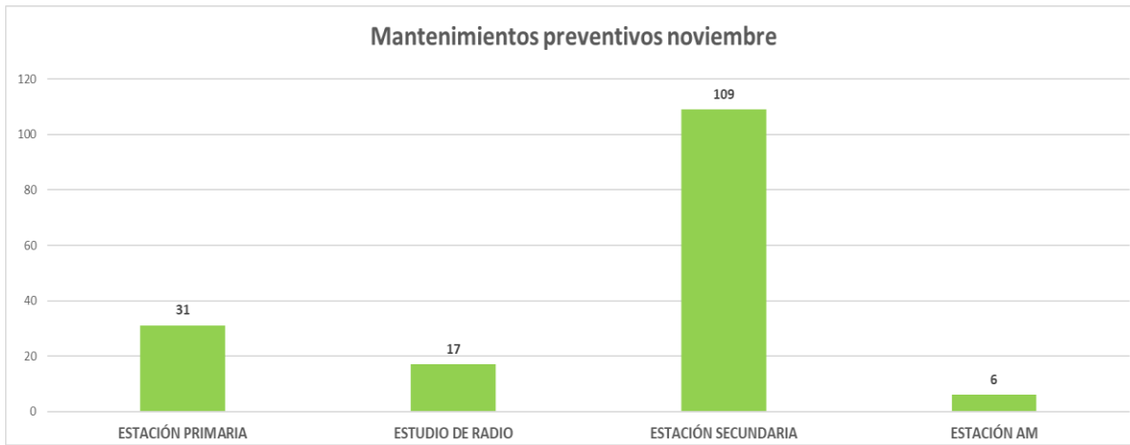


Ítem	Short_Code	NOMBRE DE ESTACION	ESTADO GENERAL FAC	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Fecha de ejecución	Estado	VALOR (ANTES DE IVA)	VALOR (CON IVA)
1	18	LAPOPA	ESTACIÓN PRIMARIA	BOLIVAR	CARTAGENA	17-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
2	277	ESTUDIO SAN JACINTO	ESTUDIO DE RADIO	BOLIVAR	SAN JACINTO	12-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
3	99	SAN JACINTO	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOLIVAR	SAN JACINTO	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
4	24	MONTERIA	ESTACIÓN PRIMARIA	CORDOBA	CIÉNAGA DE ORO	10-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
5	294	ESTUDIO SAN ANDRES	ESTUDIO DE RADIO	SAN ANDRES	SAN ANDRÉS	19-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
6	43	SIMONBOLIVAR	ESTACIÓN PRIMARIA	SAN ANDRES	SAN ANDRÉS	20-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
7	222	MARACAIBO	ESTACIÓN SECUNDARIA	SAN ANDRES	PROVIDENCIA	24-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
8	223	BUENAVISTA	ESTACIÓN SECUNDARIA	SAN ANDRES	PROVIDENCIA	23-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
9	225	CASABAJA 02	ESTACIÓN SECUNDARIA	SAN ANDRES	PROVIDENCIA	22-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
10	224	CASABAJA	ESTACIÓN SECUNDARIA	SAN ANDRES	PROVIDENCIA	22-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
11	276	ESTUDIO BARRANQUILLA	ESTUDIO DE RADIO	ATLANTICO	BARRANQUILLA	17-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
12	98	LOS NOGALES	ESTACIÓN SECUNDARIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	16-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
13	2	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	ATLANTICO	SABANAGRANDE	16-11-2025	Ejecutado	$ 13.860.430,00	$ 16.493.911,70
14	34	CERROKENNEDY	ESTACIÓN PRIMARIA	MAGDALENA	SANTA MARTA	29-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
15	281	ESTUDIO VALLEDUPAR	ESTUDIO DE RADIO	CESAR	VALLEDUPAR	10-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
16	23	ALGUACIL	ESTACIÓN PRIMARIA	CESAR	PUEBLO BELLO	9-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
17	218	OCAÑA	ESTACIÓN SECUNDARIA	N DE SANTANDER	OCAÑA	21-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
18	219	SALAZAR_DE_LAS_PALMAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	N DE SANTANDER	SALAZAR DE LAS PALMAS	17-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
19	38	CERROTASAJERO	ESTACIÓN PRIMARIA	N DE SANTANDER	CÚCUTA	15-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
20	221	TOLEDO	ESTACIÓN SECUNDARIA	N DE SANTANDER	TOLEDO	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
21	39	CERROORIENTE	ESTACIÓN PRIMARIA	N DE SANTANDER	MUTISCUA	20-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
22	245	SILOS	ESTACIÓN SECUNDARIA	N DE SANTANDER	SILOS	18-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
23	184	FONSECA	ESTACIÓN SECUNDARIA	LA GUAJIRA	FONSECA	28-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
24	284	ESTUDIO FONSECA	ESTUDIO DE RADIO	LA GUAJIRA	FONSECA	26-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
25	146	MARIANGOLA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CESAR	VALLEDUPAR	30-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
26	145	ATANQUEZ	ESTACIÓN SECUNDARIA	CESAR	VALLEDUPAR	24-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
27	295	ESTUDIO BUCARAMANGA	ESTUDIO DE RADIO	SANTANDER	BUCARAMANGA	8-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
28	236	CARCASI	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	CARCASI	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
29	237	CERRITO	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	CERRITO	14-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
30	45	MALAGA	ESTACIÓN PRIMARIA	SANTANDER	MÁLAGA	16-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
31	244	SANANDRES	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	SAN ANDRES	17-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
32	248	TONA	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	TONA	9-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
33	239	CHARTA	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	CHARTA	23-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
34	44	LEBRIJA	ESTACIÓN PRIMARIA	SANTANDER	LEBRIJA	12-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
35	246	SURATA	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	SURATA	24-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
36	241	COROMORO	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	COROMORO	20-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
37	240	CONTRATACION	ESTACIÓN SECUNDARIA	SANTANDER	CONTRATACION	18-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
38	26	BOQUERON	ESTACIÓN PRIMARIA	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	9-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
39	173	QUETAME	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	QUETAME	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
40	165	GUAYABETAL	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	GUAYABETAL	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
41	35	ELTIGRE	ESTACIÓN PRIMARIA	META	EL CALVARIO	13-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
42	289	ESTUDIO VILLAVICENCIO	ESTUDIO DE RADIO	META	VILLAVICENCIO	12-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
43	288	ESTUDIO MESETAS	ESTUDIO DE RADIO	META	MESETAS	11-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
44	197	MESETAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	META	MESETAS	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
45	29	MANJUI	ESTACIÓN PRIMARIA	CUNDINAMARCA	ZIPACÓN	19-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
46	5	ELROSAL	ESTACIÓN AM	CUNDINAMARCA	EL ROSAL	20-11-2025	Ejecutado	$ 13.860.430,00	$ 16.493.911,70
47	27	EL CABLE (*****)	ESTACIÓN PRIMARIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	25-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
48	25	CALATRAVA	ESTACIÓN PRIMARIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	26-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
49	157	CRUZ VERDE	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	27-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
50	178	SUESCA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	SUESCA	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
51	160	CUCUNUBA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	CUCUNUBA	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
52	163	GUACHETA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	GUACHETA	21-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
53	161	GACHETA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	GACHETA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
54	162	GAMA(CERROALEGRIA)	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	GAMA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
55	3	LARUMBA	ESTACIÓN AM	BOYACA	OICATÁ	20-11-2025	Ejecutado	$ 13.860.430,00	$ 16.493.911,70
56	19	LARUSIA	ESTACIÓN PRIMARIA	BOYACA	DUITAMA	18-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
57	102	BELENCITO	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	BELENCITO - NOBSA	20-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
58	180	TENA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	TENA	25-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
59	164	GUADUAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	GUADUAS	26-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
60	168	LAVEGA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CUNDINAMARCA	LA VEGA	27-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
61	105	CUCAITA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	CUCAITA	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
62	118	RAQUIRA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	RAQUIRA	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
63	119	SAMACA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	SAMACÁ	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50

64	123	UMBITA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	UMBITA	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
65	113	NUEVOCOLON	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	NUEVO COLON	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
66	124	VILLADELEYVA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	VILLA DE LEYVA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
67	101	BELEN	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	BELEN	18-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
68	117	PAZDERIO	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	PAZ DE RIO	18-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
69	**103**	BOAVITA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	BOAVITA	19-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
70	112	MONIQUIRA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	MONIQUIRÁ	21-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
71	114	OTANCHE	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	OTANCHE	25-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
72	116	PAUNA	ESTACIÓN SECUNDARIA	BOYACA	PAUNA	25-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
73	7	JAMUNDI	ESTACIÓN AM	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	11-11-2025	Ejecutado	$ 13.860.430,00	$ 16.493.911,70
74	298	ESTUDIO FLORIDA	ESTUDIO DE RADIO	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	11-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
75	262	CRISTOREY	ESTACIÓN SECUNDARIA	VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
76	297	ESTUDIO CALI	ESTUDIO DE RADIO	VALLE DEL CAUCA	CALI	13-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
77	267	TRESCRUCES	ESTACIÓN SECUNDARIA	VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	17-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
78	261	BUENAVENTURA	ESTACIÓN SECUNDARIA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	18-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
79	314	ESTUDIO B/VENTURA	ESTUDIO DE RADIO	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	19-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
80	50	VERSALLES	ESTACIÓN PRIMARIA	VALLE DEL CAUCA	TORO	20-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
81	41	PLANADAS	ESTACIÓN PRIMARIA	QUINDIO	CALARCÁ	28-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
82	231	GENOVA	ESTACIÓN SECUNDARIA	QUINDIO	GÉNOVA	28-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
83	17	PADREAMAYA	ESTACIÓN PRIMARIA	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	16-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
84	13	BELLO	ESTACIÓN PRIMARIA	ANTIOQUIA	BELLO	18-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
85	76	LACEJA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	LA CEJA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
86	81	RIONEGRO	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	RIONEGRO	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
87	72	HELICONIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	HELICONIA	24-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
88	70	GRANADA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	GRANADA	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
89	85	SANCARLOS	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	SANCARLOS	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
90	1	MARINILLA	ESTACIÓN AM	ANTIOQUIA	MARINILLA	12-11-2025	Ejecutado	$ 13.860.430,00	$ 16.493.911,70
91	53	ALEJANDRIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	ALEJANDRIA	20-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
92	65	CONCEPCION	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	CONCEPCION	25-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
93	274	ESTUDIO MEDELLIN	ESTUDIO DE RADIO	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	21-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
94	16	ITAGUI	ESTACIÓN PRIMARIA	ANTIOQUIA	SABANETA	22-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
95	59	CALDAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	CALDAS	26-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
96	83	SALGAR	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	SALGAR	26-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
97	278	ESTUDIO MANIZALES	ESTUDIO DE RADIO	CALDAS	MANIZALES	10-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
98	127	CERVANTES	ESTACIÓN SECUNDARIA	CALDAS	MANIZALES	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
99	126	CHINCHINA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CALDAS	CHINCHINÁ	26-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
100	235	EL NUDO	ESTACIÓN SECUNDARIA	RISARALDA	PEREIRA	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
101	125	MADROÑO	ESTACIÓN SECUNDARIA	RISARALDA	BELALCAZAR	20-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
102	234	LACELIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	RISARALDA	LA CELIA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
103	129	SALAMINA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CALDAS	SALAMINA	16-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
104	4	LAENEA	ESTACIÓN AM	CALDAS	MANIZALES	19-11-2025	Ejecutado	$ 13.860.430,00	$ 16.493.911,70
105	331	ALTO BAUDÓ	ESTACIÓN SECUNDARIA	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	22-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
106	42	MONTEZUMA	ESTACIÓN PRIMARIA	RISARALDA	PUEBLO RICO	25-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
107	21	ELRUIZ	ESTACIÓN PRIMARIA	CALDAS	VILLAMARÍA	29-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
108	58	BELMIRA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	BELMIRA	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
109	67	ENTRERRIOS	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
110	69	GOMEZPLATA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	GOMEZ PLATA	15-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
111	71	GUADALUPE	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	GUADALUPE	17-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
112	56	ANGOSTURA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	ANGOSTURA	17-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
113	93	YARUMAL	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	YARUMAL	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
114	15	CERRO AZUL (*****)	ESTACIÓN PRIMARIA	ANTIOQUIA	YARUMAL	13-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
115	91	TOLEDO	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	TOLEDO	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
116	273	ESTUDIO ITUANGO	ESTUDIO DE RADIO	ANTIOQUIA	ITUANGO	11-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
117	73	ITUANGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	ITUANGO	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
118	68	FRONTINO	ESTACIÓN SECUNDARIA	ANTIOQUIA	FRONTINO	19-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
119	14	CHIGORODO	ESTACIÓN PRIMARIA	ANTIOQUIA	CAREPA	18-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
120	191	PITALITO	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	PITALITO	10-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
121	196	TIMANA	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	TIMANA	8-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
122	192	SANAGUSTIN	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	SAN AGUSTIN	9-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
123	286	ESTUDIO ALGECIRAS	ESTUDIO DE RADIO	HUILA	ALGECIRAS	11-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
124	187	ALGECIRAS 02	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	ALGECIRAS	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
125	186	ALGECIRAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	ALGECIRAS	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
126	30	BUENAVISTA	ESTACIÓN PRIMARIA	HUILA	AGRADO	14-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
127	40	MIRADOR	ESTACIÓN PRIMARIA	PUTUMAYO	MOCOA	20-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
128	229	SIBUNDOY	ESTACIÓN SECUNDARIA	PUTUMAYO	SIBUNDOY	19-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
129	226	ORITO	ESTACIÓN SECUNDARIA	PUTUMAYO	ORITO	21-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
130	31	GABINETE	ESTACIÓN PRIMARIA	HUILA	GUADALUPE	25-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
131	253	CAJAMARCA	ESTACIÓN SECUNDARIA	TOLIMA	CAJAMARCA	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
132	258	SANANTONIO	ESTACIÓN SECUNDARIA	TOLIMA	SAN ANTONIIO	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
133	339	RIOBLANCO 02	ESTACIÓN SECUNDARIA	TOLIMA	RIOBLANCO	15-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
134	255	LAHERRERA	ESTACIÓN SECUNDARIA	TOLIMA	RIOBLANCO INSPECCION LA HERRERA	16-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
135	252	SANTIAGO PEREZ	ESTACIÓN SECUNDARIA	TOLIMA		19-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
136	121	SANTAMARIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	SANTAMARIA	20-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
137	32	CERRONEIVA	ESTACIÓN PRIMARIA	HUILA	NEIVA	25-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
138	193	SANANDRESDETELLO	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	CORREG. DE SAN ANDRES - TELLO	21-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
139	188	COLOMBIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	COLOMBIA	22-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
140	189	ARGENTINA	ESTACIÓN SECUNDARIA	HUILA	LA PLATA (BELÉN)	27-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
141	290	ESTUDIO PASTO	ESTUDIO DE RADIO	NARIÑO	PASTO	11-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
142	210	SANDONA	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	SANDONÁ	12-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
143	203	ELTAMBO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	EL TAMBO	27-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
144	36	GALERAS (**)	ESTACIÓN PRIMARIA	NARIÑO	GALERAS	10-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
145	208	RICAURTE	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	RICAURTE	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
146	207	CERROAMARILLO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	MALLAMA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
147	209	SAMANIEGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	SAMANIEGO	17-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
148	198	ALDANA	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	ALDANA	15-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
149	200	CONTADERO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	CONTADERO	15-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
150	214	TANGUA	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	TANGUA	11-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
151	94	ARAUCA	ESTACIÓN SECUNDARIA	ARAUCA	ARAUCA	13-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
152	12	LETICIA (****)	ESTACIÓN PRIMARIA	AMAZONAS	LETICIA	18-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
153	51	PUERTONARIÑO	ESTACIÓN SECUNDARIA	AMAZONAS	Puerto Nariño	20-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
154	22	MUNCHIQUE	ESTACIÓN PRIMARIA	CAUCA	EL TAMBO	25-11-2025	Ejecutado	$ 12.955.300,00	$ 15.416.807,00
155	138	ELTAMBO	ESTACIÓN SECUNDARIA	CAUCA	EL TAMBO	27-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
156	280	ESTUDIO ELTAMBO	ESTUDIO DE RADIO	CAUCA	EL TAMBO	27-11-2025	Ejecutado	$ 6.525.400,00	$ 7.765.226,00
157	144	SILVIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	CAUCA	SILVIA	28-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
158	142	ROSAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	CAUCA	ROSAS	28-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
159	137	BOLIVAR	ESTACIÓN SECUNDARIA	CAUCA	BOLIVAR	28-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
160	212	SANPABLO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	SAN PABLO	29-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
161	204	LACRUZ	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	LA CRUZ	30-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
162	201	ELROSARIO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	EL ROSARIO	30-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
163	213	TAMINANGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	NARIÑO	TAMINANGO	27-11-2025	Ejecutado	$ 4.550.250,00	$ 5.414.797,50
								$ 1.091.685.930,00	**$ 1.299.106.256,70**

ESTACIONES – MANTENIMIENTO CORRECTIVOS NOVIEMBRE 2025

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - NOVIEMBRE

Estaciones	Suma de Cantidad de Equipos Intervenidos	Suma de VALOR (ANTES DE IVA)	Suma de VALOR TOTAL (CON IVA)
ESTACIÓN SECUNDARIA	69	$ 300.316.500	$ 373.621.028
ESTACIÓN PRIMARIA	68	$ 880.960.400	$ 1.048.342.876
ESTACIÓN AM	14	$ 194.046.020	$ 230.914.764
ESTUDIO DE RADIO	12	$ 78.304.800	$ 93.182.712
Total general	**163**	**$ 1.453.627.720**	**$ 1.746.061.379**

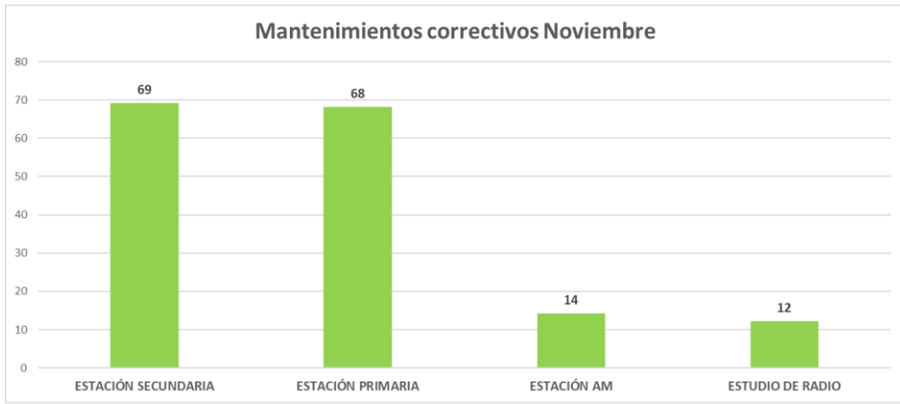

Nº	ESTACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Fac	Fecha de ejecución	TIPO	Cantidad de Equipos Intervenidos	Estado	VALOR (ANTES DE IVA)	VALOR (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
14	CHIGORODO	ANTIOQUIA	CAREPA	ESTACIÓN PRIMARIA	1/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
20	SABOYA	BOYACA	SABOYA	ESTACIÓN PRIMARIA	1/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
96	FORTUL	ARAUCA	FORTUL	ESTACIÓN SECUNDARIA	1/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
185	SANJOSEDELGUAVIARE	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ESTACIÓN SECUNDARIA	1/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
185	SANJOSEDELGUAVIARE	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	ESTACIÓN SECUNDARIA	1/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
267	TRESCRUCES	VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN SECUNDARIA	1/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
290	ESTUDIO PASTO	NARIÑO	PASTO	ESTUDIO DE RADIO	1/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
68	FRONTINO	ANTIOQUIA	FRONTINO	ESTACIÓN SECUNDARIA	2/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
290	ESTUDIO PASTO	NARIÑO	PASTO	ESTUDIO DE RADIO	2/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
263	DAGUA	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	ESTACIÓN SECUNDARIA	3/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
2	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	4/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
2	SABANAGRANDE	ATLANTICO	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	5/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
7	JAMUNDI	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	ESTACIÓN AM	5/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
17	PADREAMAYA	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN PRIMARIA	5/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
205	LAFLORIDA	NARIÑO	LA FLORIDA	ESTACIÓN SECUNDARIA	5/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
109	VALLEDETENZAI	BOYACA	SUTATENZA	ESTACIÓN SECUNDARIA	5/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
76	LACEJA	ANTIOQUIA	LA CEJA	ESTACIÓN SECUNDARIA	5/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
2	SABANAGRANDE	ATLANTICO	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	6/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
2	SABANAGRANDE	ATLANTICO	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	6/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
2	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	6/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
40	MIRADOR	PUTUMAYO	MOCOA	ESTACIÓN PRIMARIA	6/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
18	LA POPA	BOLIVAR	CARTAGENA	ESTACIÓN PRIMARIA	7/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
12	LETICIA	AMAZONAS	LETICIA	ESTACIÓN PRIMARIA	7/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
23	ALGUACIL	CESAR	PUEBLO BELLO	ESTACIÓN PRIMARIA	7/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
230	LAHORMIGA	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	ESTACIÓN SECUNDARIA	7/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
230	LAHORMIGA	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	ESTACIÓN SECUNDARIA	7/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
210	SANDONA	NARIÑO	SANDONÁ	ESTACIÓN SECUNDARIA	7/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
261	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ESTACIÓN SECUNDARIA	7/11/2025	Energía - Correctivo	2	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 10.829.595
261	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ESTACIÓN SECUNDARIA	7/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	MAGDALENA	FUNDACIÓN	ESTUDIO DE RADIO	7/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
209	SAMANIEGO	NARIÑO	SAMANIEGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	8/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
83	SALGAR	ANTIOQUIA	SALGAR	ESTACIÓN SECUNDARIA	8/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
74	JARDIN	ANTIOQUIA	JARDIN	ESTACIÓN SECUNDARIA	9/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	MAGDALENA	FUNDACIÓN	ESTUDIO DE RADIO	9/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
47	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	9/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
15	CERRO AZUL (*****)	ANTIOQUIA	YARUMAL	ESTACIÓN PRIMARIA	10/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
173	QUETAME	Cundinamarca	QUETAME	ESTACIÓN SECUNDARIA	10/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
189	ARGENTINA	HUILA	LA PLATA	ESTACIÓN SECUNDARIA	10/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
213	TAMINANGO	NARIÑO	TAMINANGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	10/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
80	PUERTO BERRIO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	ESTACIÓN SECUNDARIA	10/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
7	JAMUNDI	Valle del Cauca	JAMUNDÍ	ESTACIÓN AM	11/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
2	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	11/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
196	TIMANA	HUILA	TIMANA	ESTACIÓN SECUNDARIA	11/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
28	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	11/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807

48	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	11/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
49	AZALEA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	ESTACIÓN PRIMARIA	12/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
16	ITAGUI	ANTIOQUIA	SABANETA	ESTACIÓN PRIMARIA	12/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
73	ITUANGO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	12/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
191	PITALITO	HUILA	PITALITO	ESTACIÓN SECUNDARIA	12/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
236	CARCASI	Santander	CARCASI	ESTACIÓN SECUNDARIA	13/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
138	ELTAMBO	CAUCA	EL TAMBO	ESTACIÓN SECUNDARIA	13/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
167	LACALERA	CUNDINAMARCA	LA CALERA	ESTACIÓN SECUNDARIA	13/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
201	ELROSARIO	NARIÑO	EL ROSARIO	ESTACIÓN SECUNDARIA	13/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
273	ESTUDIO ITUANGO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ESTUDIO DE RADIO	13/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
37	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	13/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
1	MARINILLA	ANTIOQUIA	MARINILLA	ESTACIÓN AM	14/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
30	BUENAVISTA	Huila	AGRADO	ESTACIÓN PRIMARIA	14/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
31	GABINETE	HUILA	GUADALUPE	ESTACIÓN PRIMARIA	14/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
13	BELLO	ANTIOQUIA	BELLO	ESTACIÓN PRIMARIA	14/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
15	CERRO AZUL	ANTIOQUIA	YARUMAL	ESTACIÓN PRIMARIA	14/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
210	SANDONA	NARIÑO	SANDONÁ	ESTACIÓN SECUNDARIA	14/11/2025	Energía - Correctivo	2	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 10.829.596
232	BELENDEUMBRIA	Risaralda	BELÉN DE UMBRIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	14/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
17	PADRE AMAYA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	ESTACIÓN PRIMARIA	15/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
50	VERSALLES	VALLE DEL CAUCA	TORO	ESTACIÓN PRIMARIA	15/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
2	SABANAGRANDE	Atlantico	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	16/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
126	CHINCHINA	CALDAS	CHINCHINA	ESTACIÓN SECUNDARIA	16/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
126	CHINCHINA	CALDAS	CHINCHINA	ESTACIÓN SECUNDARIA	16/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
274	ESTUDIO MEDELLIN	ANTIOQUIA	MEDELLIN	ESTUDIO DE RADIO	16/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
291	ESTUDIO TUMACO	NARIÑO	TUMACO	ESTUDIO DE RADIO	16/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
12	LETICIA (****)	AMAZONAS	LETICIA	ESTACIÓN PRIMARIA	17/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
215	TUMACO	NARIÑO	TUMACO	ESTACIÓN SECUNDARIA	17/11/2025	Energía - Correctivo	2	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 10.829.596
215	TUMACO	NARIÑO	TUMACO	ESTACIÓN SECUNDARIA	17/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
49	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	17/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
4	LAENEA	CALDAS	MANIZALES	ESTACIÓN AM	18/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
7	JAMUNDI	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	ESTACIÓN AM	18/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
23	ALGUACIL	CESAR	PUEBLO BELLO	ESTACIÓN PRIMARIA	18/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
180	TENA	CUNDINAMARCA	TENA	ESTACIÓN SECUNDARIA	18/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
14	CHIGORODO	ANTIOQUIA	CAREPA	ESTACIÓN PRIMARIA	19/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
38	CERROTASAJERO	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN PRIMARIA	19/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
227	PUERTOLEGUÍZAMO	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	ESTACIÓN SECUNDARIA	19/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
158	CHOACHI	CUNDINAMARCA	CHOACHI	ESTACIÓN SECUNDARIA	19/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
232	BELENDEUMBRIA	RISARALDA	BELEN DE UMBRIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	19/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
232	BELENDEUMBRIA	RISARALDA	BELEN DE UMBRIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	19/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
136	AGUAZUL	CASANARE	AGUAZUL	ESTACIÓN SECUNDARIA	19/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
135	NUNCHÍA	CASANARE	NUNCHIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	19/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
293	ESTUDIO PUERTOLEGUIZAMO	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	ESTUDIO DE RADIO	19/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
17	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	19/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
22	MUNCHIQUE	CAUCA	EL TAMBO	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
30	BUENAVISTA	HUILA	AGRADO	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
32	CERRONEIVA	HUILA	NEIVA	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
36	GALERAS (**)	NARIÑO	GALERAS	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
39	CERROORIENTE	NORTE DE SANTANDER	MUTISCUA	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
40	MIRADOR	PUTUMAYO	MOCOA	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
42	MONTEZUMA	RISARALDA	PUEBLO RICO	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
48	MARTINICA (***)	TOLIMA	IBAGUÉ	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
25	CALATRAVA	CALATRAVA	BOGOTÁ	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
26	BOQUERON	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	ESTACIÓN PRIMARIA	20/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
53	ALEJANDRIA	ANTIOQUIA	ALEJANDRIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	20/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
121	SANTAMARIA	HUILA	SANTAMARIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	20/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
125	MADROÑO	RISARALDA	BELALCAZAR	ESTACIÓN SECUNDARIA	20/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
149	ACANDÍ	CHOCO	ACANDI	ESTACIÓN SECUNDARIA	20/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
229	SIBUNDOY	PUTUMAYO	SIBUNDOY	ESTACIÓN SECUNDARIA	20/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
20	SABOYA	BOYACA	SABOYÁ	ESTACIÓN PRIMARIA	21/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
35	ELTIGRE	META	EL CALVARIO	ESTACIÓN PRIMARIA	21/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
44	LEBRIJA	SANTANDER	LEBRIJA	ESTACIÓN PRIMARIA	21/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
49	AZALEA	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ESTACIÓN PRIMARIA	21/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807

41	PLANADAS	QUINDIO	CALARCA	ESTACIÓN PRIMARIA	21/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
163	GUACHETA	CUNDINAMARCA	GUACHETA	ESTACIÓN SECUNDARIA	21/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
112	MONIQUIRA	BOYACÁ	MONIQUIRÁ	ESTACIÓN SECUNDARIA	21/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
178	SUESCA	CUNDINAMARCA	SUESCA	ESTACIÓN SECUNDARIA	21/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
3	LARUMBA	BOYACA	OICATÁ	ESTACIÓN AM	22/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
43	SIMON BOLIVAR	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES	ESTACIÓN PRIMARIA	22/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
18	LAPOPA	BOLIVAR	CARTAGENA	ESTACIÓN PRIMARIA	22/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
19	LARUSIA	BOYACA	DUITAMA	ESTACIÓN PRIMARIA	22/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
43	SIMON BOLIVAR	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES	ESTACIÓN PRIMARIA	22/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
188	COLOMBIA	HUILA	COLOMBIA	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
218	OCAÑA	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
181	CERROCRISTALES(UBALA)	CUNDINAMARCA	UBALA	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
331	ALTO BAUDÓ	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
233	CAUCHOS	RISARALDA	GUATICA	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
174	QUININI	CUNDINAMARCA	TIBACUY	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
133	CHAMEZA 01	CASANARE	CHÁMEZA	ESTACIÓN SECUNDARIA	22/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
294	ESTUDIO SAN ANDRES	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES	ESTUDIO DE RADIO	22/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
46	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	22/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
221	TOLEDO	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	ESTACIÓN SECUNDARIA	23/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
134	CHAMEZA 02	CASANARE	CHÁMEZA	ESTACIÓN SECUNDARIA	23/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
29	MANJUI	CUNDINAMARCA	ZIPACÓN	ESTACIÓN PRIMARIA	24/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
41	PLANADAS	QUINDIO	CALARCÁ	ESTACIÓN PRIMARIA	24/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
277	ESTUDIO SAN JACINTO	BOLIVAR	SAN JACINTO	ESTUDIO DE RADIO	24/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	MAGDALENA	FUNDACIÓN	ESTUDIO DE RADIO	24/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
20	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	24/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
47	LAPITA	SUCRE	OVEJAS	ESTACIÓN PRIMARIA	25/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
21	EL RUIZ	CALDAS	VILLAMARÍA	ESTACIÓN PRIMARIA	25/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
33	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	ESTACIÓN PRIMARIA	25/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
21	ELRUIZ	CALDAS	VILLAMARÍA	ESTACIÓN PRIMARIA	26/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
37	JURISDICCIONES	NORTE DE SANTANDER	ABREGO	ESTACIÓN PRIMARIA	26/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
22	MUNCHIQUE	MUNCHIQUE	EL TAMBO	ESTACIÓN PRIMARIA	26/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
28	TIBITOC	CUNDINAMARCA	SOPÓ	ESTACIÓN PRIMARIA	26/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
59	CALDAS	ANTIOQUIA	CALDAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	26/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
164	GUADUAS	CUNDINAMARCA	GUADUAS	ESTACIÓN SECUNDARIA	26/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
5	ELROSAL	CUNDINAMARCA	EL ROSAL	ESTACIÓN AM	27/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 13.860.430	$ 16.493.912	$ 16.493.912
24	MONTERIA	CORDOBA	CIÉNAGA DE ORO	ESTACIÓN PRIMARIA	27/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
31	GABINETE	HUILA	GUADALUPE	ESTACIÓN PRIMARIA	27/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
43	SIMONBOLIVAR	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRÉS	ESTACIÓN PRIMARIA	27/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
33	BAÑADEROS (*****)	LA GUAJIRA	HATO NUEVO	ESTACIÓN PRIMARIA	27/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
50	VERSALLES	VALLE DEL CAUCA	TORO	ESTACIÓN PRIMARIA	27/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
33	BAÑADEROS (*****)	BAÑADEROS (*****)	HATO NUEVO	ESTACIÓN PRIMARIA	27/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
168	LAVEGA	CUNDINAMARCA	LA VEGA	ESTACIÓN SECUNDARIA	27/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
189	ARGENTINA	HUILA	LA PLATA (BELÉN)	ESTACIÓN SECUNDARIA	27/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
25	CALATRAVA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN PRIMARIA	28/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
34	CERROKENNEDY	MAGDALENA	SANTA MARTA	ESTACIÓN PRIMARIA	28/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
45	MALAGA	SANTANDER	MÁLAGA	ESTACIÓN PRIMARIA	28/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
184	FONSECA	LA GUAJIRA	FONSECA	ESTACIÓN SECUNDARIA	28/11/2025	Transmisión	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
27	EL CABLE (*****)	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN PRIMARIA	29/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
235	EL NUDO	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN SECUNDARIA	29/11/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
235	EL NUDO	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN SECUNDARIA	29/11/2025	Visita integral de energía	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
46	SANGIL	SANTANDER	SAN GIL	ESTACIÓN PRIMARIA	30/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
26	BOQUERON	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	ESTACIÓN PRIMARIA	30/11/2025	Civil	1	Ejecutado	$ 12.955.300	$ 15.416.807	$ 15.416.807
73	ITUANGO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ESTACIÓN SECUNDARIA	3/12/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 4.550.250	$ 5.414.798	$ 5.414.798
273	ESTUDIO ITUANGO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ESTUDIO DE RADIO	3/12/2025	Energía - Correctivo	1	Ejecutado	$ 6.525.400	$ 7.765.226	$ 7.765.226
									$ 1.453.627.720	**$ 1.729.816.987**	**$ 1.746.061.379**

SEGURIDAD – CUSTODIOS – 249

No.	ESTACION	CÓDIGO	TIPO	OPERADOR(ES) PERMANENTES (vivientes)	ESTADO ACTUAL 2025	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	VALOR (ANTES DE IVA)	VALOR (CON IVA)
51	PUERTONARIÑO	SEC-AMAZ-Puer-PUERTO-051	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
52	ABRIAQUI	SEC-ANTI-Abri-ABRIAQ-052	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
53	ALEJANDRIA	SEC-ANTI-Alej-ALEJAN-053	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
54	AMALFI	SEC-ANTI-Amal-AMALFI-054	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
55	ANDES	SEC-ANTI-Ande-ANDES-055	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
56	ANGOSTURA	SEC-ANTI-Ango-ANGOST-056	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
57	ARBOLETES	SEC-ANTI-Arbo-ARBOLE-057	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
58	BELMIRA	SEC-ANTI-Belm-BELMIR-058	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
59	CALDAS	SEC-ANTI-Cald-CALDAS-059	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
60	CAÑASGORDAS	SEC-ANTI-Caña-CAÑASG-060	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
61	CAROLINA	SEC-ANTI-Caro-CAROLI-061	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
62	CAUCASIA	SEC-ANTI-Cauc-CAUCAS-062	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
63	CISNEROS	SEC-ANTI-Cisn-CISNER-063	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
64	CIUDADBOLIVAR	SEC-ANTI-Ciud-CIUDAD-064	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
65	CONCEPCION	SEC-ANTI-Conc-CONCEP-065	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
66	DABEIBA	SEC-ANTI-Dabe-DABEIB-066	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
67	ENTRERRIOS	SEC-ANTI-Entr-ENTRER-067	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
68	FRONTINO	SEC-ANTI-Fron-FRONTI-068	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
69	GOMEZPLATA	SEC-ANTI-Gome-GOMEZP-069	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
70	GRANADA	SEC-ANTI-Gran-GRANAD-070	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
71	GUADALUPE	SEC-ANTI-Guad-GUADAL-071	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
72	HELICONIA	SEC-ANTI-Heli-HELICO-072	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
73	ITUANGO	SEC-ANTI-Itua-ITUANG-073	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
74	JARDIN	SEC-ANTI-Jard-JARDIN-074	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
75	JERICO	SEC-ANTI-Jeri-JERICO-075	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
76	LACEJA	SEC-ANTI-LaCe-LACEJA-076	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
77	LIBORINA	SEC-ANTI-Libo-LIBORI-077	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
78	MUTATA	SEC-ANTI-Muta-MUTATA-078	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
80	PUERTO BERRIO	SEC-ANTI-Puer-PUERTO-080	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
81	RIONEGRO	SEC-ANTI-Rion-RIONEG-081	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
82	SABANALARGA	SEC-ANTI-Saba-SABANA-082	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
83	SALGAR	SEC-ANTI-Salg-SALGAR-083	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
84	SANANDRESDEQUERQUIA	SEC-ANTI-Salg-SANAND-084	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
85	SANCARLOS	SEC-ANTI-SanC-SANCAR-085	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
86	SANJOSEDELAMONTAÑA	SEC-ANTI-SanJ-SANJOS-086	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
87	SANJUANDEURABA	SEC-ANTI-SanJ-SANJUA-087	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
88	SONSON	SEC-ANTI-Sons-SONSON-088	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
89	TAMESIS	SEC-ANTI-Tame-TAMESI-089	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
90	TARAZA	SEC-ANTI-Tara-TARAZA-090	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
91	TOLEDO	SEC-ANTI-Tole-TOLEDO-091	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
92	URRAO	SEC-ANTI-Urra-URRAO-092	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
93	YARUMAL	SEC-ANTI-Yaru-YARUMA-093	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
94	ARAUCA	SEC-ARAU-Arau-ARAUCA-094	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
95	ARAUQUITA	SEC-ARAU-Arau-ARAUQU-095	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
96	FORTUL	SEC-ARAU-Fort-FORTUL-096	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
97	SARAVENA	SEC-ARAU-Sara-SARAVE-097	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
98	LOS NOGALES	SEC-ATLA-Barr-LOSNOG-098	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
99	SAN JACINTO	SEC-BOLI-Sanj-SANJAC-099	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
100	ARCABUCO	SEC-BOYA-Arca-ARCABU-100	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
101	BELEN	SEC-BOYA-Bele-BELEN-101	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
102	BELENCITO	SEC-BOYA-Bele-BELENC-102	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
103	BOAVITA	SEC-BOYA-Boav-BOAVIT-103	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
104	CHITA-JERICÓ	SEC-BOYA-Chit-CHITA-104	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
105	CUCAITA	SEC-BOYA-Cuca-CUCAIT-105	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
106	ELCOCUY	SEC-BOYA-ElCo-ELCOCU-106	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
107	ELESPINO	SEC-BOYA-ElEs-ELESPI-107	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
108	VALLEDETENZAII	SEC-BOYA-Guat-VALLED-108	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
109	VALLEDETENZAI	SEC-BOYA-LaCa-VALLED-109	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
110	LENGUPA	SEC-BOYA-Leng-LENGUP-110	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
111	MIRAFLORES	SEC-BOYA-Mira-MIRAFL-111	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
112	MONIQUIRA	SEC-BOYA-Moni-MONIQU-112	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
114	OTANCHE	SEC-BOYA-Otan-OTANCH-114	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
115	PACHAVITA	SEC-BOYA-Pach-PACHAV-115	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
116	PAUNA	SEC-BOYA-Paun-PAUNA-116	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
117	PAZDERIO	SEC-BOYA-Pazd-PAZDER-117	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
118	RAQUIRA	SEC-BOYA-Raqu-RAQUIR-118	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
119	SAMACA	SEC-BOYA-Sama-SAMACA-119	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
120	SANLUISDEGACENO	SEC-BOYA-SanL-SANLUI-120	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
121	SANTAMARIA	SEC-BOYA-Sant-SANTAM-121	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
122	SATIVANORTE	SEC-BOYA-Sati-SATIVA-122	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
123	UMBITA	SEC-BOYA-Umbi-UMBITA-123	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
124	VILLADELEYVA	SEC-BOYA-Vill-VILLAD-124	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
125	MADROÑO	SEC-CALD-Bela-MADROÑ-125	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
126	CHINCHINA	SEC-CALD-Chin-CHINCH-126	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
127	CERVANTES	SEC-CALD-Mani-CERVAN-127	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
128	ARAUCA	SEC-CALD-Pale-ARAUCA-128	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
129	SALAMINA	SEC-CALD-Sala-SALAMI-129	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
130	SANVICENTE	SEC-CAQU-SanV-SANVIC-130	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
131	ELDONCELLO	SEC-CAQU-ElDo-ELDON-131	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
132	YOPAL	SEC-CASA-Yopa-YOPAL-132	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800

133	CHAMEZA 01	SEC-CASA-Cham-CHAM1-133	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
134	CHAMEZA 02	SEC-CASA-Cham-CHAM2-134	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
135	NUNCHÍA	SEC-CASA-Nunc-NUNCHI-135	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
136	AGUAZUL	SEC-CASA-Agua-AGUAZ-136	ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
137	BOLIVAR	SEC-CAUC-Boli-BOLIVA-137	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
138	ELTAMBO	SEC-CAUC-Elta-ELTAMB-138	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
139	INZA	SEC-CAUC-Inza-INZA-139	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
140	LAVEGA	SEC-CAUC-LaVe-LAVEGA-140	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
141	PAEZ	SEC-CAUC-Paez-PAEZ-141	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
142	ROSAS	SEC-CAUC-Rosa-ROSAS-142	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
143	SANSEBASTIAN	SEC-CAUC-SanS-SANSEB-143	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
144	SILVIA	SEC-CAUC-Silv-SILVIA-144	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
145	ATANQUEZ	SEC-CESA-Atan-ATANQU-145	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
146	MARIANGOLA	SEC-CESA-Mari-MARIAN-146	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
147	PAILITAS	SEC-CESA-Pail-PAILIT-147	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
148	BADILLO	SEC-CESA-Vall-BADILL-148	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
149	ACANDÍ	SEC-CHOC-Acan-ACANDÍ-149	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
150	BAHIASOLANO	SEC-CHOC-Bahi-BAHIAS-150	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
151	CARMENDEATRATO	SEC-CHOC-Carm-CARMEN-151	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
152	ISTMINA	SEC-CHOC-Istm-ISTMIN-152	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
153	JURADO	SEC-CHOC-Jura-JURADO-153	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
154	PUERTOESCONDIDO	SEC-CORD-Puer-PUERTO-154	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
155	PUERTO LIBERTADOR	SEC-CORD- Libe-LIBER- 155	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
157	CRUZ VERDE	SEC-CUND-Bogo-CRUZVE-157	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
158	CHOACHI	SEC-CUND-Choa-CHOACH-158	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	NO OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
159	CHOCONTA	SEC-CUND-Choc-CHOCON-159	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
160	CUCUNUBA	SEC-CUND-Cucu-CUCUNU-160	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
161	GACHETA	SEC-CUND-Gach-GACHET-161	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
162	GAMA(CERROALEGRIA)	SEC-CUND-Gama-GAMA-162	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
163	GUACHETA	SEC-CUND-Guac-GUACHE-163	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
164	GUADUAS	SEC-CUND-Guad-GUADUA-164	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
165	GUAYABETAL	SEC-CUND-Guay-GUAYAB-165	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
166	JUNIN(CERROALEMANIA)	SEC-CUND-Juni-JUNIN-166	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
167	LACALERA	SEC-CUND-LaCa-LACALE-167	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
168	LAVEGA	SEC-CUND-LaVe-LAVEGA-168	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
169	MAMBITA	SEC-CUND-Mamb-MAMBIT-169	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
170	NEMOCON	SEC-CUND-Nemo-NEMOCO-170	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
171	PACHO	SEC-CUND-Pach-PACHO-171	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
172	PANDI	SEC-CUND-Pand-PANDI-172	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
173	QUETAME	SEC-CUND-Quet-QUETAM-173	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
174	QUININI	SEC-CUND-Quin-QUININ-174	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
175	SANFRANCISCO	SEC-CUND-SanF-SANFRA-175	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
176	GRANADA	SEC-CUND-Siba-GRANAD-176	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
177	SIMIJACA	SEC-CUND-Simi-SIMIJA-177	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
179	TABIO	SEC-CUND-Tabi-TABIO-179	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
180	TENA	SEC-CUND-Tena-TENA-180	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
181	CERROCRISTALES(UBALA)	SEC-CUND-Ubal-CERROC-181	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
182	VILLAPINZON	SEC-CUND-Vill-VILLAP-182	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
183	PUERTOINIRIDA	SEC-GUAI-Inir-PUERTO-183	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
184	FONSECA	SEC-GUAJ-Fons-FONSEC-184	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
185	SANJOSEDELGUAVIARE	SEC-GUAV-SanJ-SANJOS-185	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
186	ALGECIRAS	SEC-HUIL-Alge-ALGECI-186	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
187	ALGECIRAS 02	SEC-HUIL-Alge-ALGEC2-187	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
188	COLOMBIA	SEC-HUIL-Colo-COLOMB-188	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
189	ARGENTINA	SEC-HUIL-LaPl-ARGENT-189	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
190	TESALIA	SEC-HUIL-Nata-TESALI-190	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
191	PITALITO	SEC-HUIL-Pita-PITALI-191	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
192	SANAGUSTIN	SEC-HUIL-SanA-SANAGU-192	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
193	SANANDRESDETELLO	SEC-HUIL-SanA-SANAND-193	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
194	SANTAMARIA	SEC-HUIL-Sant-SANTAM-194	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
195	TERUEL	SEC-HUIL-Teru-TERUEL-195	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
196	TIMANA	SEC-HUIL-Tima-TIMANA-196	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
197	MESETAS	SEC-META-Mese-MESETA-197	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
198	ALDANA	SEC-NARI-Alda-ALDANA-198	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
199	CHACHAGUI	SEC-NARI-Chac-CHACHA-199	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
200	CONTADERO	SEC-NARI-Cont-CONTAD-200	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
201	ELROSARIO	SEC-NARI-ElRo-ELROSA-201	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
202	ELTABLÓNDEGÓMEZ	SEC-NARI-ElTa-ELTABL-202	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
203	ELTAMBO	SEC-NARI-ElTa-ELTAMB-203	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
204	LACRUZ	SEC-NARI-LaCr-LACRUZ-204	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
205	LAFLORIDA	SEC-NARI-LaFl-LAFLOR-205	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
206	CHIMAYOI	SEC-NARI-LaUn-CHIMAY-206	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
207	CERROAMARILLO	SEC-NARI-Mall-CERROA-207	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
208	RICAURTE	SEC-NARI-Rica-RICAUR-208	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
209	SAMANIEGO	SEC-NARI-Sama-SAMANI-209	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
210	SANDONA	SEC-NARI-Sand-SANDON-210	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
211	SANLORENZO	SEC-NARI-SanL-SANLOR-211	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
212	SANPABLO	SEC-NARI-SanP-SANPAB-212	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
213	TAMINANGO	SEC-NARI-Tami-TAMINA-213	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
214	TANGUA	SEC-NARI-Tang-TANGUA-214	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
215	TUMACO	SEC-NARI-Tuma-TUMACO-215	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
216	CONVENCION	SEC-NORT-Conv-CONVEN-216	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
217	ELCARMEN	SEC-NORT-ElCa-ELCARM-217	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
218	OCAÑA	SEC-NORT-Ocañ-OCAÑA-218	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
219	SALAZARDELASPALMAS	SEC-NORT-Sala-SALAZA-219	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
220	SARDINATA	SEC-NORT-Sard-SARDIN-220	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
221	TOLEDO	SEC-NORT-Tole-TOLEDO-221	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
222	MARACAIBO	SEC-PROV-Mara-MARACA-222	ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
223	BUENAVISTA	SEC-PROV-Prov-BUENAV-223	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
224	CASABAJA	SEC-PROV-Prov-CASABA-224	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
225	CASABAJA 02	SEC-PROV-Prov-CASABA-225	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
226	ORITO	SEC-PUTU-Orit-ORITO-226	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
227	PUERTOLEGUÍZAMO	SEC-PUTU-Puer-PUERTO-227	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
228	SANMIGUEL	SEC-PUTU-SanM-SANMIG-228	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
229	SIBUNDOY	SEC-PUTU-Sibu-SIBUND-229	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
230	LAHORMIGA	SEC-PUTU-Vall-LAHORM-230	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
231	GENOVA	SEC-QUIN-Geno-GENOVA-231	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
232	BELENDEUMBRIA	SEC-RISA-Bele-BELEND-232	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
233	CAUCHOS	SEC-RISA-Guat-CAUCHO-233	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
234	LACELIA	SEC-RISA-LaCe-LACELI-234	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
235	EL NUDO	SEC-RISA-Pere-ELNUDO-235	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
236	CARCASI	SEC-SANT-Carc-CARCAS-236	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
237	CERRITO	SEC-SANT-Cerr-CERRIT-237	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
238	CHARALA	SEC-SANT-Char-CHARAL-238	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
239	CHARTA	SEC-SANT-Char-CHARTA-239	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
240	CONTRATACION	SEC-SANT-Cont-CONTRA-240	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
241	COROMORO	SEC-SANT-Coro-COROMO-241	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800

242	LOSSANTOS	SEC-SANT-Mesa-LOSSAN-242	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
243	OIBA	SEC-SANT-Oiba-OIBA-243	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
244	SANANDRES	SEC-SANT-SanA-SANAND-244	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
245	SILOS	SEC-SANT-Silo-SILOS-245	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
246	SURATA	SEC-SANT-Sura-SURATA-246	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
247	BABEGA	SEC-SANT-Tole-BABEGA-247	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
248	TONA	SEC-SANT-Tona-TONA-248	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
250	GUARANDA	SEC-SUCR-Guar-GUARAN-250	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
251	SAN MARCOS	SEC-SUCR-Sanm-SANMAR-251	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
252	SANTIAGOPEREZ	SEC-TOLI-Atac-SANTIA-252	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
253	CAJAMARCA	SEC-TOLI-Caja-CAJAMA-253	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
254	VILLARICA	SEC-TOLI-Cund-VILLAR-254	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
255	LAHERRERA	SEC-TOLI-LaHe-LAHERR-255	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
256	RIOBLANCO	SEC-TOLI-RioB-RIOBLA-256	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
257	RIOPRADO	SEC-TOLI-RioP-RIOPRA-257	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
258	SANANTONIO	SEC-TOLI-SanA-SANANT-258	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
259	VEGALARGA	SEC-TOLI-Vega-VEGALA-259	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
260	ARGELIA	SEC-VALL-Arge-ARGELI-260	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
261	BUENAVENTURA	SEC-VALL-Buen-BUENAV-261	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
262	CRISTOREY	SEC-VALL-Cali-CRISTO-262	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
263	DAGUA	SEC-VALL-Dagu-DAGUA-263	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
264	ELDOVIO	SEC-VALL-ElDo-ELDOVI-264	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
265	FLORIDA	SEC-VALL-Flor-FLORID-265	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
266	TENERIFE	SEC-VALL-Tene-TENERI-266	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
267	TRESCRUCES	SEC-VALL-Tres-TRESCR-267	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
268	LAMARINA	SEC-VALL-Tulu-LAMARI-268	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
269	VERSALLES	SEC-VALL-Vers-VERSAL-269	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
270	MITU	SEC-VAUP-Mitu-MITU-270	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
271	CASUARITO	SEC-VICH-Casu-CASUAR-271	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
272	PUERTOCARREÑO	SEC-VICH-Puer-PUERTO-272	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
305	CHOCONTA 02	SEC-CUND-Choc-CHOCO2-305	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
306	EL CAIRO	SEC-VALL-Elca-ELCAIR-306	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
307	SASAIMA	SEC-CUND-Sasa-SASAIM-307	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
308	QUIBDÓ	SEC-CHOC-Quib-QUIBDO-308	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
309	LAUNIÓN	SEC-NARI-Laun-LAUNIO-309	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
310	MONSERRATE	SEC-CALD-Agua-MONSER-310	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
311	SUPÍA	SEC-CALD-Supi-SUPIA-311	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
316	CODAZZI	SEC-CESA-Coda-CODAZZ-316	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
318	SOTAVENTO-TUCHÍN	SEC-CORD-Sana-SOTAVE-318	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
319	SAN AGUSTÍN 02	SEC-HUIL-Sana-SANAGU-319	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
320	EL AGUILA	SEC-VALL-Elag-ELAGUI-320	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
322	NAZARETH	SEC-GUAJ-Naza-NAZARE-322	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
323	TAME	SEC-ARAU-Tame-TAME-323	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
324	LURUACO	SEC-ATLA-Luru-LURUAC-324	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
325	MORELIA	SEC-CAQU-More-MORELI-325	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
326	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	SEC-CAQU-Sanj-SANJOS-326	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
327	LÓPEZ DE MICAY	SEC-CAUC-Lope-LOPEZD-327	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
328	BADILLO 02	SEC-CESA-Valle-BADILL-328	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
329	CURUMANÍ	SEC-CESA-Curu-CURUMA-329	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
330	EL COPEY	SEC-CESA-Elco-ELCOPE-330	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
331	ALTO BAUDÓ	SEC-CHOC-Alto-ALTOBA-331	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
332	JUNIN 02	SEC-CUND-Juni-JUNIN-332	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
333	SAN JUAN DE RIOSECO	SEC-CUND-Sanj-SANJUA-333	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
334	VILLAPINZON 02	SEC-CUND-Villa-VILLAP-334	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
335	GIGANTE	SEC-HUIL-Giga-GIGANT-335	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
336	BARBACOAS	SEC-NARI-Barb-BARBAC-336	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
337	SANTA ROSA DE CABAL	SEC-RISA-Sant-SANTAR-337	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
338	HONDA	SEC-TOLI-Hond-HONDA-338	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
339	RIOBLANCO 02	SEC-TOLI-Riob-RIOBLA-339	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
340	ROVIRA	SEC-TOLI-Rovi-ROVIRA-340	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
341	LAFLORIDA		ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	$ 420.000	$ 499.800
							$ 104.580.000	**$ 124.450.200**

SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO 30 ESTACIONES

No.	ESTACION	CÓDIGO	TIPO	OPERADOR(ES) PERMANENTES (vivientes)	ESTADO ACTUAL 2025	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	VALOR (ANTES DE IVA)	VALOR (CON IVA)
273	ESTUDIO ITUANGO	EST-ANTI-Itua-ITUAN-273	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
274	ESTUDIO MEDELLIN	EST-ANTI-Mede-MEDELL-274	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
275	ESTUDIO ARAUQUITA	EST-ARAU-Arau-ARAUQU-275	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
276	ESTUDIO BARRANQUILLA	EST-ATLA-Barr-BARRAN-276	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
277	ESTUDIO SAN JACINTO	EST-BOLI-Sanj-SANJAC-277	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
278	ESTUDIO MANIZALES	EST-CALD-Mani-MANIZA-278	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
279	ESTUDIO SANVICENTE	EST-CAQU-SanV-SANVIC-279	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
280	ESTUDIO ELTAMBO	EST-CAUC-ElTa-ELTAMB-280	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
281	ESTUDIO VALLEDUPAR	EST-CESA-Vall-VALLE-281	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
282	ESTUDIO BOJAYA	EST-CHOC-Boja-BOJAYA-282	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
283	ESTUDIO QUIBDO	EST-CHOC-Quib-QUIBD-283	ESTUDIO RADIO	NO	SIN ENERGÍA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
284	ESTUDIO FONSECA	EST-GUAJ-Fons-FONSEC-284	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
285	ESTUDIO SANJOSEDELGUAVIARE	EST-GUAV-SanJ-SANJOS-285	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
286	ESTUDIO ALGECIRAS	EST-HUIL-Alge-ALGECI-286	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	EST-MAGD-Fund-FUNDAC-287	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
288	ESTUDIO MESETAS	EST-META-Mese-MESETA-288	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
289	ESTUDIO VILLAVICENCIO	EST-META-Vill-VILLAO-289	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
290	ESTUDIO PASTO	EST-NARI-Past-PASTO-290	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
291	ESTUDIO TUMACO	EST-NARI-Tuma-TUMACO-291	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
292	ESTUDIO CONVENCIÓN	EST-NORT-Conv-CONVEN-292	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
293	ESTUDIO PUERTOLEGUIZAMO	EST-PUTU-Puer-PUERTO-293	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
294	ESTUDIO SAN ANDRES	EST-SANA-Sana-SANAN-294	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
295	ESTUDIO BUCARAMANGA	EST-SANT-Buca-BUCARA-295	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
296	ESTUDIO CHAPARRAL	EST-TOLI-Chap-CHAPA-296	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
297	ESTUDIO CALI	EST-VALL-Cali-CALI-297	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
298	ESTUDIO FLORIDA	EST-VALL-Flor-FLORID-298	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
312	ESTUDIO CODAZZI	EST-CESA-Coda-CODAZZ-312	ESTUDIO RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
313	ESTUDIO TIERRALTA	EST-CORD-Tier-TIERRA-313	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
314	ESTUDIO BUENAVENTURA	EST-VALL-Buen-BUENAV-314	ESTUDIO RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
315	ESTUDIO RIOSUCIO	EST-CHOC-Rios-RIOSUC-315	ESTUDIO RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	$ 6.835.000	$ 8.133.650
							$ 205.050.000	**$ 244.009.500**

REPORTE SUMINISTRO DE ACPM

No.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	F. SOLICITUD	F LLEGADA	ORDEN DE SERVICIO	SOLCITUD (Gal)	VALOR GALÓN A FACTURAR	VALOR FLETE A FACTURAR	VALOR TOTAL A FACTURAR (INC. IVA)
2	SABANAGRANDE	18/11/2025	20/11/2025	38	250	$ 17.707	$ 666.667	$ 5.093.417
21	ELRUIZ	4/11/2025	7/11/2025	36	600	$ 18.627	$ 3.600.000	$ 14.776.200
157	CRUZ VERDE	25/11/2025	29/11/2025	40	245	$ 20.613	$ 3.600.000	$ 8.650.185
235	EL NUDO	20/11/2025	21/11/2025	39	250	$ 18.627	$ 2.266.667	$ 6.923.417
38	CERROTASAJERO	4/11/2025	4/11/2025	35	1000	$ 19.760	$ 960.000	$ 20.720.000
TOTAL								**$ 56.163.219**

PANTALLAZO RADICACION FACTURA – ABACO



3.1 EJECUCION BOLSA INTEGRAL

a. **Bolsa de Suministro e instalación de repuestos nuevos, servicio de reparación de partes de elementos eléctricos y tecnológicos y la prestación de servicios para el alquiler de equipos eléctricos y tecnológicos necesarios para la operación y funcionamiento de todas las estaciones de la RTVC.**

BOLSA INTEGRAL DE REPUESTOS Y EQUIPOS				
Mes	Total, bolsa	Porcentaje ejecutado (operación)	Valor ejecutado	Saldo
ago-25	$ 763.333.333	0%	$ 0	$ 763.333.333
sep-25	$ 763.333.333	0%	$ 0	$ 763.333.333
oct-25	$ 763.333.333	21%	$ 159.290.532	$ 604.042.801
nov-25	$ 763.333.333	0%	$ 0	$ 604.042.801

b. **Bolsa suministro de ACPM y transporte:** Este servicio para RTVC comprende el aseguramiento del suministro y transporte ininterrumpido de ACPM (Aceite Combustible Para Motores) para las plantas eléctricas (grupo electrógeno) que respaldan a nivel energético las estaciones de RTVC en todo el territorio nacional.

BOLSA DE COMBUSTIBLE				
Mes	Total, bolsa	Porcentaje ejecutado (operación)	Valor ejecutado	Saldo
ago-25	$ 633.333.333	22%	$ 142.316.500	$ 491.016.833
sep-25	$ 633.333.333	31%	$ 199.155.276	$ 291.861.557
oct-25	$ 633.333.333	22%	$ 137.436.933	$ 154.424.624
nov-25	$ 633.333.333	19%	$ 56.163.219	$ 98.261.405

c. **Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato:** Bolsa de productos para adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato, servicio de rocería y el servicio de suministro de recarga de extintores, para la operación y funcionamiento de todas las estaciones de la RTVC

BOLSA ADECUACIONES OPERATIVAS, EMBELLECIMIENTO Y ORNATO				
Mes	Total, bolsa	Porcentaje ejecutado (operación)	Valor ejecutado	Saldo
ago-25	$ 760.000.000	0%	$ 0	$ 760.000.000
sep-25	$ 760.000.000	0%	$ 0	$ 760.000.000
oct-25	$ 760.000.000	0%	$ 0	$ 760.000.000
nov-25	$ 760.000.000	14%	$ 109.435.302	$ 650.564.698

- Se realiza la revisión de los documentos que soportan los valores establecidos por servicio.
- Se realiza la revisión de factura generada por el CONSORCIO OM – 2025 y de los documentos que soportan el cobro del periodo de noviembre de 2025.
- Se lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato 2218 de 2025 Consorcio OM-2025.
- Se realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.
- Se ha verificado el pago de los aportes de seguridad social por parte del contratista Consorcio OM-2025

Link documentos soportes mes de noviembre de 2025:

https://rtvc365.sharepoint.com/sites/DTC-2.GOBIERNOTI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDTC%2D2%2EGOBIERNOTI%2FDocumentos%20compartidos%2F2%2E%20GOBIERNO%20TO%2F2%2E6%20Contratacion%2F2%2E6%2E4%2E%20Coordinaci%C3%B3n%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Red%2F2%2E6%2E9%20OM%20CTO%202218%20%2D%202025%2F2%2E6%2E9%2E3%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E6%2E9%2E3%2E1%20Informes%20de%20mantenimiento&viewid=5aeaec84%2D8cbc%2D4428%2Db20b%2D49757cd09093

2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

Para el periodo certificado el contrato se ejecutó bajo las condiciones contractuales establecidas, sin contar a la fecha con reporte de situación en contrario. El contrato se está ejecutando bajo las condiciones jurídicas establecidas, la vigencia y los amparos de las garantías exigidas, están acordes a lo solicitado en el contrato, tal y como consta en los documentos de aprobación de la póliza.

- Se han mantenido vigentes las garantías pactadas conforme a los montos, vigencias y demás características contenidas en el contrato 2218 de 2025.
- Durante la ejecución del Contrato se ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se generen con relación al contrato 2218 de 2025.
- Durante la ejecución del Contrato se ha verificado que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo y vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.
- La supervisión ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.
- Se verificó que el contratista CONSORCIO OM-2025, mantuvo el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e idoneidad mínima establecidas en el contrato.

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *_____ NO ___X___

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA (En caso de aplicar para informe de interventoría; de lo contrario, omitir esta sección.)

No. de Informe	Fecha	Folios

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *_____ NO _____
(*En caso de SI Diligenciar formato M-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)

1. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 25.725.653.989,00**
ADICIONES No 1:	**$ 2.708.436.834,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 28.434.090.823,00**

REDUCCIONES:	N/A.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	**$ 15.836.613.677,40**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 8.084.607.538,40**
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	**$ 5.145.130.797,00**
AMORTIZACIÓN # 1 (20%) mes de Agosto:	***$ 345.158.614,20***
AMORTIZACIÓN # 2 (20%) mes de Sept:	***$ 1.173.570.875,40***
AMORTIZACIÓN # 3 (20%) mes de Oct:	***$ 1.154.141.230,40***
AMORTIZACIÓN # 4 (20%) mes de Nov - con esta cuenta	***$ 1.128.217.401,80***
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	**$ 4.512.869.607,20**

Certifico que el valor autorizado para pago de noviembre de 2025 está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	**SI: _X_** **NO APLICA: ___**

OBSERVACIONES ADICIONALES:	El contrato se ha desarrollado de manera normal durante el período certificado, sin inconvenientes de tipo jurídico, financiero, contable o técnico. El contratista cumplió con las obligaciones generales establecidas en el contrato.

2. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el valor a pagar con esta cuenta.

Se aclara que el 20% de la amortización incluye el valor del IVA

Se anexa documentos enviados por el contratista para el trámite de pago # 4 correspondiente, el cual ha sido aprobado y se encuentra disponible en el sistema Orfeo.

La presente se firma a los **17** días del mes **diciembre** de **2025**.

RODRIGUEZ PENAGOS ALEJANDRO ISIDORO

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ PENAGOS ALEJANDRO ISIDORO
Nombre de reconocimiento (DN): c=CO, ou=RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S., 2.5.4.97=#0c0000309b, ou=DIRECCION DE TECNOLOGIAS CONVERGENTES, title=DIRECTOR DE TECNOLOGIAS, givenName=ALEJANDRO ISIDORO, sn=RODRIGUEZ PENAGOS, l=BOGOTA, D.C., st=BOGOTA, D.C., street=CR 45 26 33, 3 EA 7 A1 17 TORA 3D 11=CC, serialNumber=1032148892, cn=RODRIGUEZ PENAGOS ALEJANDRO ISIDORO, 2.5.4.5=CERTIFICACION FUNCION PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.
Fecha: 2025.12.17 15:46:17 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE: Alejandro I. Rodríguez Penagos
CARGO: Director Tecnologías Convergente

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 16 93 78 OF 604 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3157650414
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Cliente	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S - PRINCIPAL		
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C ó NIT**	900,002,583-6
País	COLOMBIA	**Zona**	
Teléfono	2200700	**Celular**	
Vendedor		**Email**	facturacion@rtvc.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº FV-7

Fecha	16/12/2025 08:47:31 PM
Vence	15/01/2026
Pago	Credito a 30 Días

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTUDIO DE RADIO	6,525,400.00	17.00	0.00	19.00	0.00	110,931,800.00
2	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACION PRIMARIA	12,955,300.00	31.00	0.00	19.00	0.00	401,614,300.00
3	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACION SECUNDARIA	4,550,250.00	109.00	0.00	19.00	0.00	495,977,250.00
4	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES AM	13,860,430.00	6.00	0.00	19.00	0.00	83,162,580.00
5	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTUDIO DE RADIO	6,525,400.00	12.00	0.00	19.00	0.00	78,304,800.00
6	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES PRIMARIAS	12,955,300.00	68.00	0.00	19.00	0.00	880,960,400.00
7	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES SECUNDARIAS	4,550,250.00	69.00	0.00	19.00	0.00	313,967,250.00
8	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES AM	13,860,430.00	14.00	0.00	19.00	0.00	194,046,020.00
9	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ESTACION CAN	Y295,970,430.00	1.00	0.00	19.00	0.00	295,970,430.00

Despacho a	RADIO TELEVISION
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33
Teléfono	2200700
Ciudad	BOGOTA
Departamento	D.C.

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO

SUBTOTAL	**0.00**
-Descuento	0.00
-Otros Dsctos	0.00
BASE GRAVABLE	**0.00**
+IVA	0.00
+ImpoConsumo	0.00
-ReteFuente	0.00
-ICA Retenido	0.00
-IVA Retenido	0.00
TOTAL NETO	**$ 0.00**

Observaciones: AMORTIZAR ANTICIPO 20% DEL TOTAL DE LA FACTURA $1,128,217,402 CONTRATO RTVC-CPS-2218-2025 TERCER MES

SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses
- **contratacion@itecoconsultores.com**

CUFE:
fda871b5b369e04ca641dab190facb9bbccde7b02ca6499db5b107cef894059388ba6af38255390dbfece1bc1a4fe879



Aceptada y Recibido

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 16 93 78 OF 604 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3157650414
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Cliente	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S - PRINCIPAL		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-7**
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C ó NIT** 900,002,583-6	**Fecha** 16/12/2025 08:47:31 PM
País	COLOMBIA	**Zona**	**Vence** 15/01/2026
Teléfono	2200700	**Celular**	**Pago** Credito a 30 Días
Vendedor		**Email** facturacion@rtvc.gov.co	

10	001	OPERADORES VIVIENTES EN ESTACIONES PRINCIPALES	8,285,400.00	90.00	0.00	19.00	0.00	745,686,000.00
11	001	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA MONITOREO	6,835,000.00	30.00	0.00	19.00	0.00	205,050,000.00
12	001	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CUSTODIO	420,000.00	249.00	0.00	19.00	0.00	104,580,000.00
13	001	SERVICIO ANALISIS DE RED ALQUILER EQUIPO ANALISIS RED ELECTRICA	12,000,000.00	25.00	0.00	19.00	0.00	300,000,000.00
14	001	SERVICIO DE INFORMACION HERRAMIENTA DE GESTION DE INFORMACION	250,000,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	250,000,000.00
15	001	MESA DE AYUDA	23,500,000.00	6.00	0.00	19.00	0.00	141,000,000.00
16	001	BOLSA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACPM	47,195,982.00	1.00	0.00	19.00	0.00	47,195,982.00
17	001	BOLSA DE OBRAS CIVILES ADECUACIONES MENORES ROSERIA	91,962,439.26	1.00	0.00	19.00	0.00	91,962,439.26

Despacho a	RADIO TELEVISION
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33
Teléfono	2200700
Ciudad	BOGOTA
Departamento	D.C.

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
4,740,409,251.26	19.00	0.00	900,677,757.74

SUBTOTAL	**4,740,409,251.26**
-Descuento	0.00
-Otros Dsctos	0.00
BASE GRAVABLE	**4,740,409,251.26**
+IVA	900,677,757.74
+ImpoConsumo	0.00
-ReteFuente	0.00
-ICA Retenido	0.00
-IVA Retenido	0.00
TOTAL NETO	**$ 5,641,087,009.00**

Observaciones: AMORTIZAR ANTICIPO 20% DEL TOTAL DE LA FACTURA $1,128,217,402 CONTRATO RTVC-CPS-2218-2025 TERCER MES

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses - **contratacion@itecoconsultores.com**

CUFE:
fda871b5b369e04ca641dab190facb9bbccde7b02ca6499db5b107cef894059388ba6af38255390dbfece1bc1a4fe879

Aceptada y Recibido


Código Integridad -...
INTRANET
CASOS MESA
Ábaco 3.0
Ábaco 3.0
Correo: Milena Sar...
DTC - 1. ESTRATEGI...
2.6.9 OM CTO 2218...
RUTA VISITA TECNI...
RTVC PLAY
Subgerencia de Televisión
Canal Señal Colombia
Canal Institucional
Canal Institucional - Producción Televisión
Coordinación Gestión de Emisión TV
Subgerencia de Radio
Radio Nacional
Documentos Dirección Tecnologías Covergentes
Fecha de recepción
Número de documento
Tipo de documento
Nombre de remitente
NIT
Total de la factura
Estado
Recibido a satisfacción
diciembre 17, 2025
DENC134
Nota crédito
GEARCOMMS SAS
900462907
9520000.00 COP
CREADO, NO ADMITE EVENTOS
diciembre 16, 2025
FV7
Factura
consorcio om-2025
901972420
5641087009.00 COP
ACEPTADO

CONSORCIO OM-2025	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FO-21
	CERTIFICACION	Versión No.01
		Emisión: 08-08-2025

Bogotá, 16 de diciembre de 2025

Señores
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Ciudad

Los suscritos, Representante Legal y Contador del **CONSORCIO OM 2025,** identificado con NIT No. **901.972.420-9.**

CERTIFICAMOS

1. Que el día 16 de diciembre de 2025, conforme con lo establecido en el contrato, se emitió factura de venta No. FV-7 por concepto de TERCER PAGO del contrato CPS No. 2218 de 2025, por un valor total de cinco mil seiscientos cuarenta y un millones ochenta y siete mil nueve. m/cte con 00/100 M/L **($5.641.087.009,00)** incluido IVA.

2. Que en la factura No. FV-7 no incluye concepto de obra civil, ni de ingresos de activos

Cordialmente,

GISELLE ANDREA CARDENAS VILLALBA
Representante Legal
C.C. 53.072.062 Bogotá

WILLIAM HUMBERTO RODRIGUEZ
Contador
T.P No 145135 – T


CONSORCIO
OM-2025

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES


Yo, **WILLIAM HUMBERTO RODRIGUEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.727.981 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal del CONSORCIO OM 2025, identificada con Nit. 901.972.420-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá certifico el pago y el cumplimiento de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicione, complementen o modifiquen, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Dada en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente,



WILLIAM RODRIGUEZ OSORIO
CONTADOR PUBLICO
C.C. N° 79.727.981 de Bogotá
T.P. N° 145135-T



GISELLE ANDREA CARDENAS VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 53.072262 de Bogotá

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 79.727.981

Apellidos
RODRIGUEZ OSORIO

Nombres
WILLIAM HUMBERTO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.74

Sexo
M

Fecha de nacimiento
12 MAR 1979

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
12 NOV 1997, BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
25 ENE 2034

.CO

038239481

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL038239481215001<<<<<<<<<<<
7903122M3401251COL79727981<<<3
RODRIGUEZ<OSORIO<<WILLIAM<HUMB

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

145135-T



WILLIAM HUMBERTO
RODRIGUEZ OSORIO
C.C. 79727981
RESOLUCION INSCRIPCION 274 **FECHA 15/10/2009**
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155683

69369

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7528ACC0FA8C4F5B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIAM HUMBERTO RODRIGUEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79727981 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145135-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Informe de seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de estaciones de la red de radio y televisión nacional de RTVC

Período: Del 1 de Noviembre 2025 al 30 de Noviembre 2025

RTVC Sistema de Medios Públicos

CONSORCIO OM-2025

Contrato: RTVC-CPS-2218-2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1. Alcance de informe 4
1.2. Objetivo 4
2. RESUMEN EJECUTIVO 4
2.1. Principales hallazgos y resultados 4
2.2. Conclusiones clave 4
3. INDICADORES 4
3.1. Indicadores de medición de disponibilidad 4
3.2. Mejora de infraestructura eléctrica 10
3.3. Mejora de Stock de repuestos 11
4. DESARROLLO DE COMPONENTES 13
4.1. Componente técnico (Transmisión) 13
4.1.1. Visitas de levantamiento de inventario y mantenimiento preventivo de equipos de transmisión 14
4.1.2. Mantenimientos correctivos del componente técnico (Transmisión) 15
4.1.3. Mesa de ayuda 16
4.2. Componente eléctrico 17
4.2.1. Mantenimientos preventivos y correctivos 17
4.3. CAN 23
4.3.1. Actividades Ejecutadas 23
4.4. Componente civil 27
4.4.1. Estado de infraestructura física (edificaciones, pisos, techos, áreas críticas) 27
4.5. Componente ambiental 35
4.6. Componente SST 37
4.7. Componente seguridad y vigilancia 47
4.8. Componente Herramienta de gestión y sistema de información 48
4.9.1. Bolsa integral de repuesto, equipos nuevos y alquiler 57
4.9.2. Bolsa suministro de acpm y transporte 57
4.9.3. Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato 57
4.10. Componente de Sistemas de Información SIGMA 57
SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGMA 57
A. Desarrollo y Optimización de la Plataforma Tecnológica (SIGMA) 58
B. Capacitación y Creación de Usuarios 59
C. Gestión Documental y Carga de Informes (Cumplimiento de Entregables) 59
2. MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGMA 60

I. Resumen Ejecutivo del Estado del Proyecto SIGMA 65
II. Análisis Detallado del Cumplimiento de Requerimientos y Desarrollo (Módulos) 65
B. Módulos Pendientes 66
III. Evaluación de Avances en Capacitación y Transferencia de Conocimiento 67
A. Cumplimiento Proporcional en Entrega de Conocimiento 67
B. Transferencia de Tecnología 67
Entregables Programados para el Hito Final 67
3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS DEL PERIODO ANTERIOR 68
5.1. Evaluación global de los componentes 71
5.2. Puntos críticos identificados 72
5.3. Grado de cumplimiento de requisitos 72
ANEXOS **73**

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Alcance de informe

El presente informe tiene como finalidad evidenciar las actividades ejecutadas por el CONSORCIO OM 2025, orientadas a mostrar la distribución de recursos, la estrategia implementada para la atención, seguimiento y control de solicitudes e incidentes, así como las rutinas de mantenimiento realizadas en las estaciones de RTVC. Estas acciones comprenden la gestión integral de diferentes sistemas que deben administrarse de manera óptima para garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de radio y televisión pública a nivel nacional.

1.2. Objetivo

Informar y presentar las principales actividades desarrolladas durante el mes de octubre, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el marco del contrato vigente.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Principales hallazgos y resultados

Durante el mes de noviembre de 2025, el consorcio OM-2025 avanzó de manera significativa en la operación, mantenimiento, seguimiento técnico, gestión integral de las estaciones de radio y televisión de RTVC. Las actividades ejecutadas abarcaron los componentes técnicos, eléctricos, civil, ambiental, SST, seguridad y vigilancia, y sistema de información, consolidando así un progreso transversal en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En el componente técnico se realizaron 172 visitas de mantenimiento preventivo, logrando un cumplimiento del 98,29% del cronograma y la recuperación de múltiples servicios afectados. El análisis de los indicadores de disponibilidad evidenció mejoras parciales, aunque persisten retos en estaciones siniestradas o sin energía, que impactan el desempeño global. En el componente eléctrico se complementaron 60 mantenimientos preventivos y 31 actividades correctivas en 15 estaciones, mejorando la estabilidad operativa pese a la presencia de puntos críticos que requieren intervención prioritaria.

En el ámbito civil, se finalizaron las obras en CAN – Estudio 1 y se avanzó un 70,12% en la adecuación integral de la estación Francisco de Paula Santander en Leticia. Las visitas realizadas a las 45 estaciones primarias permitieron identificar fallas recurrentes en cubiertas, fachadas, sistemas de drenaje y cerramientos que requieren aprobación para iniciar acciones correctivas.

Desde el componente ambiental se fortaleció la gestión de residuos peligrosos, PCBs, pozos sépticos, control de vectores y permisos ambientales, logrando avances claves como la recolección de transformadores, la atención en estaciones ubicadas en áreas protegidas y el diagnóstico nacional de pozos sépticos. En SST se alcanzó el 100% de cobertura de exámenes médicos, se avanzó en la actualización del SG-SST, se realizaron inspecciones y se identificaron necesidades de mejora en extintores, botiquines y señalización.

Desde el componente ambiental se fortaleció la gestión de residuos peligrosos, PCBs, pozos sépticos, control de vectores y permisos ambientales, logrando avances claves como la recolección de transformadores, la atención en estaciones ubicadas en áreas protegidas y el diagnóstico nacional de pozos sépticos. En SST se alcanzó el 100 % de cobertura de exámenes médicos, se avanzó en la actualización del SG-SST, se realizaron inspecciones y se identificaron necesidades de mejora en extintores, botiquines y señalización.

El monitoreo de seguridad y vigilancia reportó estabilidad operativa en el 96% de las estaciones supervisadas, con un único evento de riesgo por acceso no autorizado en Bojayá.

En conjunto, el mes de noviembre refleja un fortalecimiento operativo, técnico y administrativo del proyecto, con avances concretos en cada componente y una caracterización más precisa del estado real de la infraestructura, orientando las acciones correctivas y preventivas hacia los puntos críticos identificados a nivel nacional.

3. INDICADORES

3.1. Indicadores de medición de disponibilidad

El control y seguimiento de los indicadores de disponibilidad en las estaciones principales (Primarias y AM) se realiza con el apoyo de los operadores residentes en cada estación, quienes cumplen turnos de 7 x 24 durante periodos de 15 días, dada la relevancia y cobertura de estas estaciones dentro de la red de RTVC. Al finalizar cada periodo, se efectúa el relevo correspondiente, garantizando la continuidad del monitoreo permanente de las indisponibilidades que presenten estas estaciones.

El reporte de los indicadores se elabora diariamente a través de la bitácora de reporte de las estaciones primarias y de las sedes visitas, para este periodo se realizó la visita, levantamiento de inventario y mantenimiento preventivo de los equipos de transmisión en 175 estaciones. Esta información se consolida en el **Anexo 1. Informe de Gestión – Noviembre 2025**, donde se analiza la información recopilada para determinar los indicadores de medición de disponibilidad.

TIPO DE ESTACIÓN	TOTAL	nov-25	nov-25
		A OPERAR	OPERADAS
ESTACIÓN AM	6	6	6
ESTACIÓN AM + ANALÓGICA	1	0	0
CAN	1	1	1
ESTACIÓN MICROONDAS	3	1	1
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	31	31	31
ESTACIÓN PRIMARIA TDT	4	4	4
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + TDT	4	4	4
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	12	6	6
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	135	65	65
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	25	16	16
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	13	5	5
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	9	6	6
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	45	7	7

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	3	2	2
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	11	3	3
ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	2	1	1
ESTUDIO RADIO	27	17	17
ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	3	0	0
CABECERA REGIONAL TDT	6	0	0
TOTAL	341	175	175

Durante el periodo evaluado, los indicadores de servicio de la red de televisión y radio evidencian un desempeño por debajo de los niveles contractuales establecidos, situación que refleja la necesidad de priorizar acciones correctivas y de mantenimiento.

Fórmula de cálculo de indicadores medición de disponibilidad

$$Indicador\ de\ Disponibilidad\ = \frac{(Tiempo\ total\ de\ servicio - Tiempo\ total\ de\ indisponibilidad)}{Cantidad\ de\ días\ evaluados}$$

CONDICIONES DEL SERVICIO				
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL	**REAL**	**CONTRACTUAL**	**MAYOR A**	**Nivel de disponibilidad de la red**
ESTACIÓN AM	92,40%	100,00%	99,72%	9,24%
ESTACIÓN AM + ANALÓGICA	100,00%	100,00%	99,97%	10,00%
CAN	100,00%	100,00%	99,80%	15,00%
ESTACIÓN MICROONDAS	100,00%	100,00%	99,80%	0,00%
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	83,08%	100,00%	99,80%	4,15%
ESTACIÓN PRIMARIA TDT	74,89%	100,00%	99,80%	3,74%
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + TDT	94,96%	100,00%	99,80%	4,75%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	73,89%	100,00%	99,80%	3,69%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	61,97%	100,00%	99,80%	3,10%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	74,56%	100,00%	99,80%	1,60%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	66,55%	100,00%	99,80%	1,43%

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	56,84%	100,00%	99,80%	1,22%
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	58,31%	100,00%	99,80%	1,25%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	78,27%	100,00%	99,80%	1,68%
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	72,73%	100,00%	99,80%	1,56%
ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	88,96%	100,00%	99,80%	1,91%
ESTUDIO RADIO	100,00%	100,00%	99,80%	5,00%
ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	100,00%	100,00%	99,80%	5,00%
CABECERA REGIONAL TDT	100,00%	100,00%	99,80%	15,00%
TOTAL PONDERADO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 6 - MINTIC				**89,31%**

COBERTURA	REAL		
COBERTURA RED TELEVISIÓN	43.212.621	**52.999.918**	81,53%
	CONTRACTUAL		
	52.999.918	52.999.918	100,00%

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL TDT	REAL	CONTRACTUAL
SERVICIOS TDT	74,40%	100,00%

COBERTURA	REAL			POBLACIÓN COLOMBIANA 2025	% COBERTURA POBLACIÓN COLOMBIA
COBERTURA RED TELEVISIÓN TDT	48.876.896	**50.469.461**	96,84%	53.110.000	92,03%
	CONTRACTUAL				
	50.469.461	50.469.461	100,00%	53.110.000	95,03%

Indicadores cualitativos de disponibilidad por tipo de estaciones

Estaciones de Radio AM – Disponibilidad: 92,4%

Estas estaciones operan de forma estable y continua, sin mayores inconvenientes en su infraestructura. No obstante, a principios de mes, la Estación 2 -

Sabanagrande experimentó una afectación debido al daño de un transformador residencial. Se gestionó el mantenimiento en media tensión, pero la falta de una planta eléctrica de respaldo impidió el restablecimiento inmediato del servicio, que se logró finalmente el día 15 de noviembre. Se implementaron acciones correctivas para garantizar la funcionalidad de la infraestructura de respaldo y asegurar la continuidad del servicio.

Estaciones AM + Analógicas – Disponibilidad: 0%
La estación de Uribia permanece siniestrada, ya que fue tomada por comunidades indígenas antes del inicio del proyecto, y a la fecha no se ha recibido directriz sobre su manejo o atención.

Estaciones Microondas – Disponibilidad: 0%
En cuanto a las estaciones de microondas (El Piojo, Lastinas y Gavilanes), se encuentran siniestradas, lo que impacta significativamente el indicador ponderado de disponibilidad, considerando que estas representan el 10% del total de la disponibilidad de acuerdo a la resolución 6 y actualmente no es posible restablecer su operación.

CAN – Disponibilidad: 100%
Gracias a la ejecución de actividades predictivas y mantenimientos preventivos, la infraestructura se conserva en óptimas condiciones de funcionamiento y totalmente operativa.

Estaciones Primarias TDT – Disponibilidad: 84,31%
De las 39 estaciones que componen el grupo (Estaciones Primarias TDT, Primarias Analógicas + TDT, y Primarias Analógicas + Radio + TDT), únicamente la estación de Bañaderos estuvo fuera de servicio durante todo el mes. Aunque se llevó a cabo un mantenimiento correctivo de energía eléctrica en el que se logró restablecer el fluido eléctrico, la estación se apagó completamente debido a la falta del equipo de regulación de tensión necesario para la protección de los equipos de transmisión.

A pesar de una ligera mejora en la disponibilidad respecto al mes anterior, persisten los desafíos relacionados con la puesta en marcha de los equipos de generación de energía. Estos equipos continúan fuera de servicio debido a su uso prolongado sin el mantenimiento adecuado previo al inicio del contrato, así como a la carencia de componentes en algunos sistemas. Esta situación limita significativamente la capacidad de respaldo eléctrico ante fallas del servicio comercial.

Las estaciones restantes experimentaron interrupciones parciales en uno o varios servicios durante el mes de octubre, sin que esto resultara en una inoperancia total de la estación.

Estaciones Analógicas Secundarias – Disponibilidad: 67,93%
Durante el mes de noviembre, se registró una afectación a la disponibilidad del servicio del 5,24%.

Es importante destacar que este indicador sigue siendo impactado negativamente por 52 estaciones que se encuentran en estado de "sin energía" o "siniestradas". La intervención en estas estaciones ha sido imposible debido a restricciones de acceso o a su comprometido estado estructural, lo que incide directamente en el resultado global del indicador. Entre las estaciones reportadas como siniestradas ante la entidad se incluyen, a modo de ejemplo, la 63 - Cisneros, 128 - Arauca, 150 - Bahía Solano y 224 - Casa Baja.

A pesar de las mencionadas restricciones y novedades, se sigue manteniendo en gran manera el porcentaje de mejora en el rendimiento del sistema. Esto demuestra el impacto positivo de las acciones de verificación, diagnóstico y normalización que se llevaron a cabo durante el periodo.

Estaciones Secundarias TDT – Disponibilidad: 70,89%
En el caso de las Estaciones Secundarias TDT, se observa una disminución del 3.96% en el indicador de disponibilidad, esto debido a novedades con daño en los LNBs, inconvenientes con equipos de transmisión y recepción las cuales se encuentran cotización con el fabricante o ya han sido remitidas a la entidad para evaluación y aprobación. Como resultado de este proceso de verificación, se identificaron 27 estaciones en condición “sin energía”, sobre las cuales se están concentrando los esfuerzos operativos para su restablecimiento y normalización del servicio.

Esta pequeña disminución en el indicador es resultado de la verificación a detalle de la infraestructura por lo que el estado general de la operatividad se tiene identificado y las actividades se centrarán en las soluciones y puntuales sobre cada uno de los activos con novedad.

La actualización integral realizada en noviembre permite contar con una caracterización técnica más precisa y completa del sistema, reflejando con mayor exactitud las condiciones operativas actuales y orientando las acciones de

recuperación hacia los puntos críticos identificados.La disponibilidad de las Estaciones Secundarias de Televisión Digital Terrestre (TDT) experimentó una leve disminución del 3.96% durante noviembre. Este descenso se atribuye a diversas incidencias, incluyendo daños en los LNBs y problemas en los equipos de transmisión y recepción. Las soluciones para estos inconvenientes se están gestionando a través de cotizaciones con el fabricante o mediante la remisión de los equipos a la entidad para su evaluación y aprobación.

Como parte de un proceso de verificación exhaustivo, se identificaron 27 estaciones que actualmente están "sin energía". Los esfuerzos operativos se están concentrando en el restablecimiento de estas estaciones para normalizar el servicio.

Esta ligera baja en el indicador es un resultado directo de la verificación detallada de la infraestructura, lo que ha permitido obtener una identificación precisa del estado operativo general. Las próximas actividades se enfocarán en soluciones específicas y puntuales para cada activo.

La actualización integral realizada en noviembre ha sido crucial, proporcionando una caracterización técnica más precisa y completa del sistema. Esto no solo refleja con mayor exactitud las condiciones operativas actuales, sino que también orienta de manera efectiva las acciones de recuperación hacia los puntos críticos previamente identificados.

Estudios de Radio – Disponibilidad: 96,7%
El indicador se aproxima al nivel contractual exigido; sin embargo, durante el mes de noviembre se vio impactado por fallas presentadas en el estudio de Fonseca, el cual se encuentra fuera de servicio y ha generando impactos directos en la disponibilidad general del servicio. Adicionalmente, durante este periodo se llevaron a cabo diversas intervenciones programadas orientadas a asegurar la continuidad operativa y a mitigar riesgos asociados al estado de los equipos.

Cabeceras Regionales – Disponibilidad: 100%
Estas estaciones no fueron visitadas durante el periodo evaluado y mantienen el estado reportado en el Anexo Técnico V4 entregado por la entidad.

3.2. Mejora de infraestructura eléctrica

Durante el periodo reportado se evidencia una tendencia plana del indicador, el cual se mantiene 85,57% a 85.79%, lo que no refleja las actividades correctivas realizadas en medio las visitas de atención integral de infraestructura eléctrica

iniciada en el mes octubre, Ya que en medio de las visitas especializadas se han identificado nuevas novedades pero a su vez se han corregido las identificadas previamente y las que se pueden subsanar en el mismo instante, reflejando el impacto de las acciones ejecutadas en campo y la actualización del estado real de cada sitio. Este avance corresponde, en gran medida, a la realización de 31 actividades correctivas en 15 estaciones, orientadas a la estabilización operativa de los sistemas eléctricos de las estaciones de RTVC.

A pesar del progreso alcanzado, el sistema aún se clasifica en condición “operativo con restricciones”, debido a la persistencia de puntos críticos que requieren intervenciones adicionales para lograr una infraestructura plenamente confiable. Actualmente, de las 231 estaciones evaluadas, 186 (80,52%) se encuentran en estado confiable, 37 (16,45%) en condición operativa con restricciones, y 7 (3,03%) permanecen clasificadas como críticas.

Las estaciones identificadas como críticas, que demandan atención prioritaria para mitigar riesgos operativos y asegurar la continuidad del servicio, corresponden a:

- 32-CERRO NEIVA
- 53-ALEJANDRÍA
- 63-CISNEROS
- 66-DABEIBA
- 84-SAN ANDRÉS DE QUERQUERQUÍA
- 244-SAN ANDRÉS
- 267-TRES CRUCES

La mejora del indicador demuestra una tendencia positiva hacia la normalización y confiabilidad del sistema eléctrico; sin embargo, se mantiene un enfoque operativo sobre las estaciones en condición crítica y aquellas con restricciones, con el fin de avanzar progresivamente hacia un nivel de infraestructura plenamente estable y segura. Esta información se encuentra en el Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica.

3.3. Mejora de Stock de repuestos

Para atender los requerimientos escalados por la entidad y priorizar la puesta en marcha y estabilización de la red de radio y televisión de RTVC, se procedió con la adquisición e instalación de los elementos identificados como necesarios durante los diagnósticos realizados.

Entre los elementos adquiridos se destacan baterías de arranque y cargadores para las plantas eléctricas, gas refrigerante R-410 para los aires acondicionados, y la gestión de compra de 14 LNBs adicionales para mantener un stock. Si bien la compra se realizó oportunamente, se decidió no adquirirlos de forma anticipada, ya que aún no se ha logrado una estandarización de los repuestos requeridos. Además, considerando la limitación de recursos, no se ha establecido una estrategia para la adquisición de un stock general de repuestos.

A continuación, se detallan algunas de las actividades en las que se utilizaron estos repuestos o suministro de equipos:

NOMBRE DE ESTACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
235 - EL NUDO	29/11/2025	Cambio de batería de encendido 1150P/31H 12V
232 - BELÉN DE UMBRÍA	19/11/2025	Cambio de batería de encendido 1150P/31H 12V
126 - CHINCHINÁ	16/11/2027	Cambio de batería de encendido 31H1250MC
126 - CHINCHINÁ	27/11/2025	Verificación de aires acondicionado, recarga de gas refrigerante a aire 2 y cambio de baterías en control
274 - ESTUDIO MEDELLÍN	17/11/2025	Cambio de baterías para Ups 3kVA
17 - PADRE AMAYA	15/11/2025	Cambio de tarjeta AVR MX321
17 - PADRE AMAYA	15/11/2025	Tendido de cableado para llave conmutadora de transferencia
17 - PADRE AMAYA	15/11/2025	Cambio de batería de arranque en planta Perkins 100 kVA

261 - BUENAVENTURA	7/11/2025	Reparación de circuito de gas refrigerante recarga a dos aires
267 - TRES CRUCES	1/11/2025	Cambio de cargador y baterías
290 - ESTUDIO PASTO	1/11/2025	Cambio de carburador
290 - ESTUDIO PASTO	14/11/2025	recarga de dos aires acondicionados
210 - SANDONÁ	14/11/2025	Cambio de 2 contactores AC3 25A 110VAC Chint de aires acondicionado
215 - TUMACO	17/11/2025	Cambio de DPS de 220V y recarga de gas refrigerante de aire de 12,000BTU
230 - LA HORMIGA	7/11/2025	cambio de baterías de UPS de 6kVA
230 - LA HORMIGA	7/11/2025	Cambio de baterías de UPS 10kVA
2 - SABANAGRANDE	5/11/2025	Reparación de circuito de refrigeración de dos Aires acondicionados, recarga de gas refrigerante, cambio de contactor 30 Amp 2 polos 24V, cambio de rubatex, transformador 220 VA 24 VOL
287 - ESTUDIO FUNDACIÓN	7/11/2025	Cambio de baterías para UPS
287 - ESTUDIO FUNDACIÓN	7/11/2025	Cambio de batería de arranque de planta
287 - ESTUDIO FUNDACIÓN	7/11/2025	reposición de luminarias
287 - ESTUDIO FUNDACIÓN	7/11/2025	Correctivo en aires acondicionados
43 - SIMÓN BOLÍVAR	22/11/2025	Reparación de circuito de refrigeración de dos aires de 60,000BTU y recarga de gas refrigerante

185 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	1/11/2025	Cambio de válvula de baja en daño, se cambia y se realiza recarga de aire acondicionado

4. DESARROLLO DE COMPONENTES

4.1. Componente técnico (Transmisión)


El Componente Técnico contempla la planeación, organización y ejecución de las actividades orientadas a garantizar la operación, confiabilidad y sostenibilidad de la red de estaciones de RTVC a nivel nacional enfatizando en la intervención de los equipos de transmisión.

4.1.1. Visitas de levantamiento de inventario y mantenimiento preventivo de equipos de transmisión

Durante el mes de octubre se realizó la visita de 166 estaciones con el personal de mantenimiento asignado a los cuatro Centros Operativos en los que se ha dividido la red de RTVC. En total, se realiza ruta de mantenimiento con catorce (14) ingenieros de mantenimiento y dos (2) Jefes de Zona, responsables de la atención de las 335 estaciones que conforman la red.

Estas visitas se desarrollaron de acuerdo al cronograma entregado y aprobado por RTVC en el mes de septiembre y de la cual se ejecutó con un cumplimiento del 98,19% con la novedad de 3 estaciones que no fue posible completar su intervención.

En dichas visitas se atienden estaciones secundarias, alcanzando un total de 163 de las 166 estaciones programadas para noviembre de acuerdo al cronograma en **Anexo 3. RUTA VISITA TÉCNICA OM MES NOVIEMBRE MES 3**. Es importante resaltar que en cada visita se realiza el levantamiento del inventario técnico y se ejecutaron las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo, conforme a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato.

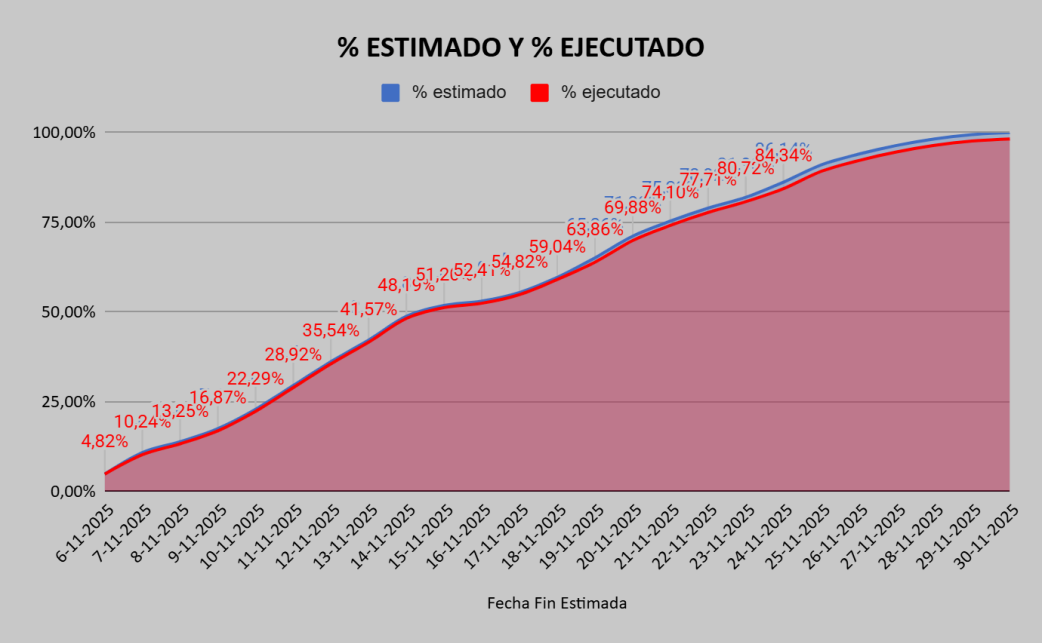



Durante este mes de noviembre se recuperaron varios servicios en diferentes estaciones, los cuales se detallan en el archivo denominado Anexo 4. Servicios_Recuperados_Estaciones Nov-31.

Se relaciona las estaciones programadas y que no fue posible realizar la visita con su debida justificación:

- 139-Inza
- 322-Nazareth
- 183-Puerto Inirida

4.1.2. Mantenimientos correctivos del componente técnico (Transmisión)

Como parte de la gestión del componente técnico, se llevaron a cabo veinte (26) mantenimientos correctivos sobre la infraestructura de transmisión y recepción en el mes de referencia. Estas actividades fueron ejecutadas sobre estaciones secundarias, atendiendo incidencias puntuales reportadas en servicio, y aplicando correctivos sobre elementos, equipos y ajustes que inciden directamente en la disponibilidad del sistema de radiodifusión. La intervención permitió restituir operación, corregir fallas identificadas en campo y estabilizar condiciones técnicas en los sitios intervenidos, reafirmando la capacidad de respuesta operacional y la efectividad del esquema táctico para la recuperación del servicio cuando se cuenta con acceso físico y condiciones mínimas habilitantes en sitio.

Nº	*ESTACIÓN*	*DEPARTAMENTO*	*MUNICIPIO*	*TP*	Fecha de ejecución
47	LAPITA	SUCRE	OVEJAS	ESTACIONES PRIMARIAS	9/11/2025
173	QUETAME	Cundinamarca	QUETAME	ESTACIONES SECUNDARIAS	10/11/2025
7	JAMUNDI	Valle del Cauca	JAMUNDÍ	ESTACIONES AM	11/11/2025
28	TIBITOC	CUNDINAMARCA	SOPÓ	ESTACIONES PRIMARIAS	11/11/2025
48	MARTINICA (***)	TOLIMA	IBAGUÉ	ESTACIONES PRIMARIAS	11/11/2025
236	CARCASI	Santander	CARCASI	ESTACIONES SECUNDARIAS	13/11/2025
37	JURISDICCIONES	NORTE DE SANTANDER	ABREGO	ESTACIONES PRIMARIAS	13/11/2025
30	BUENAVISTA	Huila	AGRADO	ESTACIONES PRIMARIAS	14/11/2025
232	BELENDEUMBRIA	Risaralda	BELÉN DE UMBRIA	ESTACIONES SECUNDARIAS	14/11/2025
2	SABANAGRANDE	Atlantico	SABANAGRANDE	ESTACIONES AM	16/11/2025
49	AZALEA	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ESTACIONES PRIMARIAS	17/11/2025

17	PADREAMAYA	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIONES PRIMARIAS	19/11/2025
53	ALEJANDRIA	ANTIOQUIA	ALEJANDRIA	ESTACIONES SECUNDARIAS	20/11/2025
121	SANTAMARIA	HUILA	SANTAMARIA	ESTACIONES SECUNDARIAS	20/11/2025
163	GUACHETA	CUNDINAMARCA	GUACHETA	ESTACIONES SECUNDARIAS	21/11/2025
112	MONIQUIRA	BOYACÁ	MONIQUIRÁ	ESTACIONES SECUNDARIAS	21/11/2025
188	COLOMBIA	HUILA	COLOMBIA	ESTACIONES SECUNDARIAS	22/11/2025
331	ALTO BAUDÓ	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	ESTACIONES SECUNDARIAS	22/11/2025
174	QUININI	CUNDINAMARCA	TIBACUY	ESTACIONES SECUNDARIAS	22/11/2025
46	SANGIL	SANTANDER	SAN GIL	ESTACIONES PRIMARIAS	22/11/2025
20	SABOYA	BOYACA	SABOYÁ	ESTACIONES PRIMARIAS	24/11/2025
33	BAÑADEROS (*****)	LA GUAJIRA	HATO NUEVO	ESTACIONES PRIMARIAS	25/11/2025
59	CALDAS	ANTIOQUIA	CALDAS	ESTACIONES SECUNDARIAS	26/11/2025
168	LAVEGA	CUNDINAMARCA	LA VEGA	ESTACIONES SECUNDARIAS	27/11/2025
189	ARGENTINA	HUILA	LA PLATA (BELÉN)	ESTACIONES SECUNDARIAS	27/11/2025
184	FONSECA	LA GUAJIRA	FONSECA	ESTACIONES SECUNDARIAS	28/11/2025


4.1.3. Mesa de ayuda

Las actividades atendidas por la mesa de ayuda durante el mes de noviembre se listan a continuación:

- Revisión y consolidación de las bitácoras diarias en los formatos correspondientes remitidas por los 45 Operadores que atienden las 39 Estaciones Primarias más las seis (6) estaciones AM actualmente operativas.

- Revisión y consolidación de los Reportes de Mantenimiento correspondientes a las visitas programadas y ejecutadas por los Ingenieros de campo durante el mes.
- Entrega y consolidación de toda la información requerida para el informe mensual de indicadores que se entrega a RTVC.
- Atención y respuesta de los PQRSD en la medida en que han sido entregados por parte de RTVC.
- Recibir, organizar y clasificar documentos de acuerdo con los requerimientos particulares por parte de RTVC, tales como las bitácoras diarias y los reportes de mantenimientos preventivos, los cuales son cargados al Sistema de Información
- Verificar que la documentación diligenciada cumpla con los requisitos contractuales.

En la ejecución de estas actividades de atención de PQRSD, en la gráfica a continuación se pueden apreciar los indicadores correspondientes al mes de noviembre, el detalle de estos indicadores se encuentran en el **Anexo 5. Control PQRSD Noviembre.**



4.2. Componente eléctrico

El Componente Eléctrico tiene dos frentes en desarrollo simultáneo; uno es el mantenimiento preventivo que se caracteriza por la planeación, organización de rutas y ejecución de las rutinas propias del mantenimiento preventivo para los grupos electrógenos, UPS y equipos de aire acondicionado. El segundo frente obedece a la atención de mantenimientos correctivos los cuales se planean y ejecutan en aras de restablecer el servicio de cualquiera de los equipos del componente eléctrico, esto es de plantas eléctricas, UPS, tableros eléctricos, transferencias, equipos de aire acondicionado, subestaciones y/o transformadores y la estructura de media tensión que alimenta la estación.

Estas actividades están orientadas a mejorar la confiabilidad, garantizar la operación y sostenibilidad de la red de transmisores e infraestructura de RTVC a nivel nacional.

4.2.1. Mantenimientos preventivos y correctivos

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Estrategia para la gestión integral de la infraestructura energética

De acuerdo al plan para la atención y mantenimiento de infraestructura energética de la red de televisión y radio de RTVC se continúa con las actividades desarrolladas por los dos equipos a nivel nacional para la atención integral de estos dispositivos, el primer equipo esta compuesto por personal especializado en mantenimiento preventivo y diagnósticos con el que se recopiló la información de todos los equipos en las estaciones en donde se cuenta con equipos de energía (Plantas eléctricas, UPS y aires acondicionados). Entre el 1 al 30 noviembre se habían ejecutado 60 intervenciones. Anexo 6. Soportes actividades Energía - 1. Mantenimientos Preventivos.

A continuación, se detallan las estaciones completadas durante el mes de noviembre.

Nº	*ESTACIÓN*	*DEPARTAMENTO*	*MUNICIPIO*	*TP*	*Tipo de Estación*
7	JAMUNDÍ	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	ESTACIONES AM	ESTACIÓN AM
2	SABANAGRANDE	ATLANTICO	SABANAGRANDE	ESTACIONES AM	ESTACIÓN AM
41	PLANADAS	QUINDIO	CALARCA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
21	EL RUIZ	CALDAS	VILLAMARÍA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
14	CHIGORODÓ	ANTIOQUIA	CAREPA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT

49	AZALEA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
40	MIRADOR	PUTUMAYO	MOCOA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
18	LA POPA	BOLÍVAR	CARTAGENA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
43	SIMON BOLIVAR	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SAN ANDRÉS	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
31	GABINETE	HUILA	GUADALUPE	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
12	LETICIA	AMAZONAS	LETICIA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
20	SABOYA	BOYACA	SABOYA	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
23	ALGUACIL	CESAR	PUEBLO BELLO	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
26	BOQUERÓN	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + TDT
50	VERSALLES	VALLE DEL CAUCA	TORO	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA TDT
15	CERRO AZUL	ANTIOQUIA	YARUMAL	ESTACIONES PRIMARIAS	ESTACIÓN PRIMARIA TDT
125	MADROÑO	RISARALDA	BELALCÁZAR	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA
149	ACANDÍ	CHOCÓ	ACANDI	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA
205	LAFLORIDA	NARIÑO	LA FLORIDA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA

221	TOLEDO	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA
180	TENA	CUNDINAMARCA	TENA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA
96	FORTUL	ARAUCA	FORTUL	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA
138	EL TAMBO	CAUCA	EL TAMBO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO
215	TUMACO	NARIÑO	TUMACO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO
73	ITUANGO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
209	SAMANIEGO	NARIÑO	SAMANIEGO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
230	LA HORMIGA	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
185	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
227	PUERTO LEGUÍZAMO	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT
235	EL NUDO	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)

68	FRONTINO	ANTIOQUIA	FRONTINO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
83	SALGAR	ANTIOQUIA	SALGAR	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
74	JARDÍN	ANTIOQUIA	JARDÍN	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
210	SANDONÁ	NARIÑO	SANDONÁ	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
229	SIBUNDOY	PUTUMAYO	SIBUNDOY	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
218	OCAÑA	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
189	ARGENTINA	HUILA	LA PLATA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
196	TIMANA	HUILA	TIMANA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
158	CHOACHÍ	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
178	SUESCA	CUNDINAMARCA	SUESCA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
164	GUADUAS	CUNDINAMARCA	GUADUAS	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
167	LA CALERA	CUNDINAMARCA	LA CALERA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
181	CERROCRISTALES(UBALA)	CUNDINAMARCA	UBALA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT

109	VALLE TENZAI	BOYACA	SUTATENZA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT
232	BELÉN DE UMBRÍA	RISARALDA	BELEN DE UMBRIA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)
126	CHINCHINÁ	CALDAS	CHINCHINÁ	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)
76	LA CEJA	ANTIOQUIA	LA CEJA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)
261	BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)
213	TAMINANGO	NARIÑO	TAMINANGO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)
191	PITALITO	HUILA	PITALITO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)
136	AGUAZUL	CASANARE	AGUAZUL	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT
233	CAUCHOS	RISARALDA	GUÁTICA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT
80	PUERTO BERRÍO	ANTIOQUIA	PUERTO BERRÍO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT
263	DAGUA	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT
201	EL ROSARIO	NARIÑO	EL ROSARIO	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT

135	NUNCHÍA	CASANARE	NUNCHIA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)
133	CHAMEZA 01	CASANARE	CHÁMEZA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)
134	CHAMEZA 02	CASANARE	CHÁMEZA	ESTACIONES SECUNDARIAS	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	MAGDALENA	FUNDACIÓN	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO
273	ESTUDIO ITUANGO	ANTIOQUIA	ITUANGO	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO RADIO
277	ESTUDIO SAN JACINTO	BOLÍVAR	SAN JACINTO	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO RADIO
290	ESTUDIO PASTO	NARIÑO	PASTO	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO RADIO
291	ESTUDIO TUMACO	NARIÑO	TUMACO	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO RADIO
294	ESTUDIO SAN ANDRÉS	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SAN ANDRÉS	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO RADIO
293	ESTUDIO PUERTO LEGUIZAMO	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	ESTUDIO DE RADIO	ESTUDIO RADIO

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

Durante el mes de noviembre se realizaron 26 actividades correctivas por el componente de energía en 23 estaciones a nivel nacional, en la que se sigue encontrando los esfuerzos en la recuperación de las plantas eléctricas y en la atención de novedades que afecten los servicios, principalmente en las estaciones primarias y estudios de radio.

Tipo de Estación	Cantidad de estaciones intervenidas	Cantidad de correctivos ejecutados
ESTACIONES AM	4	4
ESTACIONES PRIMARIAS	5	5
ESTACIONES SECUNDARIAS	10	13
ESTUDIO DE RADIO	4	4
Suma total	**23**	**26**

4.3. CAN

4.3.1. Actividades Ejecutadas


Durante noviembre de 2025, se llevaron a cabo 92 actividades para la estación CAN, con la siguiente distribución:
38 Energía
9 Gestión de Señales
6 Emisión
31 Producción y Postproducción
6 Radio
2 TI

Las actividades se encuentran relacionadas al cronograma aprobado de octubre referenciado en el **Anexo 7. Cronograma noviembre CAN**. A continuación se relacionan algunas de las actividades más relevantes dentro del periodo. El detalle de las actividades se puede evidenciar en el **Anexo 8. Soportes actividades CAN Noviembre 2025**.

A continuación se relacionan algunas actividades ejecutadas durante el periodo:

Adecuaciones eléctricas estudio 4 de televisión



Se realizó acompañamiento al personal técnico de la empresa Etincol SAS, en el montaje de una acometida a 220 VAC desde el cuarto técnico del estudio 4 de televisión, tablero regulado. Hacia una Power Box ubicada en el primer piso del estudio 4, dicha Power Box está alimentando la pantalla principal del estudio donde se van a transmitir los juegos Bolivarianos por Señal Colombia. Se utilizaron 40 metros de cable encauchetado 3x8 AWG, toma de sobreponer Levitón 40 amp macho y hembra, caja de 30 x 25, Breaker bipolar de sobreponer, 8 metros de tubo MTE con accesorios. La actividad se llevó a cabo sin ninguna novedad y obteniendo los resultados esperados

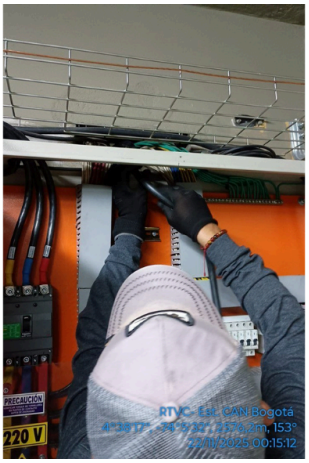
Ajuste mecánico neutral tablero principal CED

Se realizó la maniobra en el tablero principal de distribución de corriente regulada en el CED, en cuanto a la corrección del neutro flotante ocasionado por el torque inadecuado de un punto mecánico (tornillo) dentro del barraje de neutro.

Se realiza el cambio de dicho tornillo, se realiza ajuste, torque adecuado, y se soluciona el arco voltaico generado por el neutro flotante, no se afectó ningún servicio del proceso implicado.

Instalación y adecuación de tableros eléctricos 220VAC CED

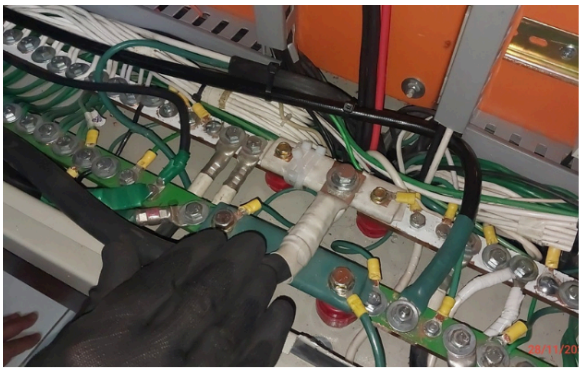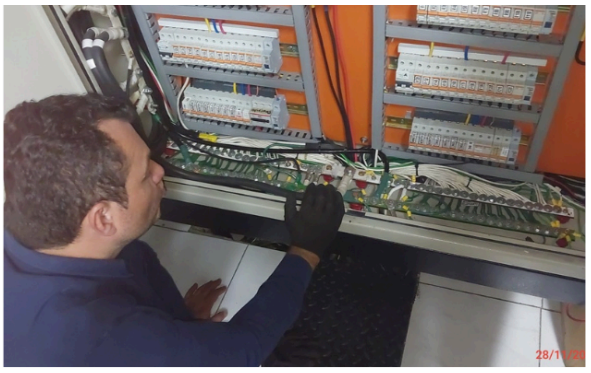Se realiza la adecuación de energía regulada a 220 VAC para alimentación de los servidores DALET de noticias, para esto se realiza:



La instalación de 2 tableros regulados de 4 circuitos cada uno, los cuales quedan ubicados dentro del máster para cada una de las fuentes de energía regulada

Se tienden 2 acometidas desde el tablero principal con cable # 8 para alimentar los tableros

Se elaboran 6 acometidas cortas desde los tableros hasta el rack 17 para alimentar los 3 servidores con conexión twist lock l5-30

Con acompañamiento del personal de NYL se realiza la energización de los equipos, los cuales se encuentran en este momento trabajando adecuadamente.

Queda pendiente la alimentación del rack #15 a 110 VAC desde los tableros secundarios, el cual se está alimentado temporalmente mediante una extensión desde el rack # 12 Y # 16. Se está realizando la gestión para la consecución del cable.

Instalación aire acondicionado sala conductores

Se realizó acompañamiento al personal técnico de la empresa Dynergy, en el montaje e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo comfort INVERTER de 12000 BTU. Acondicionamiento del sistema eléctrico con una acometida de aproximadamente 20 metros con tubería MT así como la tubería de refrigeración hasta la condensadora la cual quedó en la parte posterior de la edificación. El sistema quedó operando sin ninguna novedad.







Desmonte de techo Estudio 1

El proceso de desmonte del sistema Drywall se ejecutó mediante el retiro ordenado y seguro de las láminas, perfiles y elementos de apoyo, los cuales fueron clasificados y dispuestos conforme a los lineamientos ambientales vigentes. Todo el material resultante fue entregado a la empresa RECICLAMAS para su correcta gestión y disposición final, entidad que emite los certificados correspondientes que acrediten el manejo adecuado de residuos de Drywall y chatarra.El proceso de desmonte del sistema Drywall se llevó a cabo mediante el retiro organizado y seguro de las láminas, perfiles y elementos de soporte. Estos materiales fueron debidamente clasificados y dispuestos en estricto cumplimiento con los lineamientos ambientales vigentes. La totalidad del material resultante fue entregado a la empresa RECICLAMAS para su adecuada gestión y disposición final. Dicha entidad proporcionó los certificados que acreditan el manejo idóneo de los residuos de Drywall y chatarra.

El anexo incluye el certificado de disposición de residuos. **Anexo 16. CG CDF 3824 RTNC VICTOR TORRES 1-11-2025.**



Instalación ducteria Estudio 1

Se inicia con la instalación de la ducteria para el sistema de refrigeración del estudio de acuerdo al diseño HVAC entregado por el contratista. A la fecha se cuenta con un avance de aprox. El 80%. Para esto y dada la premura el contratista organizó un frente de trabajo con 3 cuadrillas, donde se efectuó inicialmente el armado y pegue de los ductos, posteriormente se efectuó la instalación de los ramales principales, esta semana se están cuadrando detalles en la instalación, como el diseño de los cuellos que va conectar los ductos ramales a los difusores. Ya de igual manera en la noche de ayer se realizó el corte de los travesaños que están impidiendo la comunicación de los ductos con el exterior. El día de hoy el contratista continuará con el modulado de la conexión y la fabricación en lámina en calibre 22 de la junta que va comunicar el auditorio con el exterior por la viga canal.







4.4. Componente civil

Este informe inicial se refiere exclusivamente a las actividades llevadas a cabo en el mes de noviembre del 2025.

4.4.1. Estado de infraestructura física (edificaciones, pisos, techos, áreas críticas)

Estudio de documentación y organización inicial.

Durante el mes de noviembre bajo el componente civil se realizó la visita técnica y diagnóstico integral de las 45 estaciones primarias definidas. Cada una de estas visitas fue documentada mediante su informe técnico respectivo, lo cual permitió obtener un panorama completo del estado real de la infraestructura a nivel nacional.

Los resultados de estas visitas permitieron establecer un orden de priorización, evidenciando que, de manera recurrente, las estaciones presentan deficiencias significativas en sus sistemas de cubiertas y fachadas a nivel general, elementos fundamentales para la protección estructural, la estanqueidad y la adecuada preservación de los equipos tecnológicos instalados.

Adicionalmente durante esta etapa se adelantó la visita preliminar al estudio de Fundación de acuerdo a la priorización por parte de la entidad, en las cuales se identificaron hallazgos críticos asociados al deterioro de cubiertas y fachadas, evidenciando filtraciones, afectaciones estructurales superficiales y pérdida de capacidad de protección. Estos hallazgos fueron catalogados como prioridad, dado que comprometen la conservación de los equipos de radiodifusión, su estabilidad operativa y la extensión de vida útil de la estructura de la estación.

Estos resultados refuerzan la necesidad de implementar acciones correctivas enfocadas en la mejora de la envolvente arquitectónica (cubiertas y fachadas), priorizando aquellas estaciones donde se identificó mayor riesgo para la infraestructura y los equipos estratégicos del sistema.

Estado de infraestructura física

A partir de las visitas preliminares llevadas a cabo en las estaciones, el componente civil concentró sus esfuerzos en la **consolidación de los diagnósticos e intervenciones prioritarias en las estaciones primarias**. Como resultado de este proceso, se presentaron a la Entidad los **presupuestos de intervención prioritaria** correspondientes a:

- CAN - Estudio 1
- CAN - Cuarto de máquinas
- Padre Amaya - Pozo septico.
- Estudio Fundación.

De estas solicitudes, únicamente se autorizó la ejecución del mantenimiento y ejecución en la estación CAN - Estudio 1, intervención que fue desarrollada en su totalidad y se encuentra ejecutada, terminada y entregada. Las demás estaciones continúan sin aprobación por parte de la entidad al cierre del presente periodo, lo cual limita la implementación oportuna de las acciones correctivas identificadas como prioritarias.

Obras menores o adecuaciones realizadas

Durante el mes de noviembre se ejecutaron las obras correspondientes a la estación CAN – Estudio 1, completando su intervención de manera satisfactoria. Paralelamente, se dio inicio a los trabajos de adecuación en la estación Francisco de Paula Santander – Leticia, Amazonas, la cual presenta un avance físico del 70,12%, reflejando un progreso significativo dentro del cronograma establecido para esta sede.Durante el mes de noviembre, se ejecutó la totalidad de las obras correspondientes a la estación CAN – Estudio 1, culminando su intervención de manera satisfactoria. Concomitantemente, se dio inicio a los trabajos de adecuación en la estación Francisco de Paula Santander – Leticia, Amazonas, la cual reporta un avance físico del 77,05%, lo que evidencia un progreso sustancial dentro del cronograma establecido para dicha sede.

CONTROL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL									
SEMANAS (S)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
% FINANCIERO PROGRAMADO	20,00%	30,00%			25,00%			25,00%	
% EJECUTADO	50,00%				75,00%			100,00%	
% FÍSICO PROGRAMADO	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	8,20%	11,49%	11,49%
% EJECUTADO	45,90%				77,05%			100,00%	

El proyecto consiste en la adecuación integral del estudio de radio y televisión de RTVC en la estación Francisco de Paula Santander, ubicada en Leticia, e involucra un conjunto de intervenciones de índole civil, arquitectónica y técnica, orientadas a la optimización de las condiciones físicas y operativas de la estación. El alcance contempla la reparación y el mejoramiento de cubiertas, fachadas, pisos, muros y acabados interiores; la intervención de redes y espacios complementarios necesarios para el soporte técnico; y el acondicionamiento especializado del estudio con el fin de garantizar condiciones idóneas para la grabación, la transmisión y la operación continua. Estas acciones buscan fortalecer la infraestructura ante las exigentes condiciones ambientales del Amazonas, proteger los equipos de radiodifusión, mejorar la funcionalidad y la seguridad de las instalaciones y asegurar la continuidad, la calidad y la estabilidad del servicio público que RTVC presta en esta zona estratégica del país.









RTVC




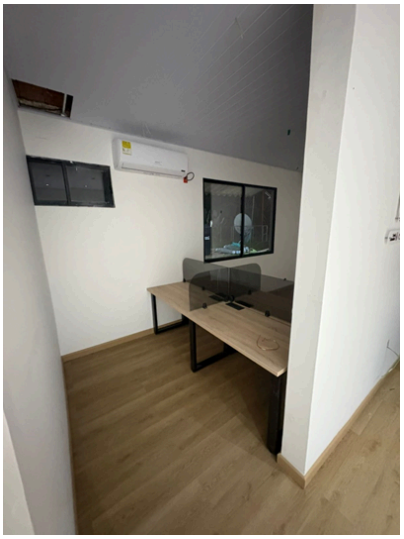


RTVC

Riesgos observados en la infraestructura

En las estaciones inventariadas el común denominador es el hallazgo por filtraciones por cubierta, en la mayoría de los casos se requiere reposición de cubiertas inclinadas cuyo material es en asbesto cemento, material además de nocivo descontinuado y la reposición de impermeabilización de cubiertas planas en las estructuras existentes que pueden afectar la estabilidad de los equipos en determinado momento.

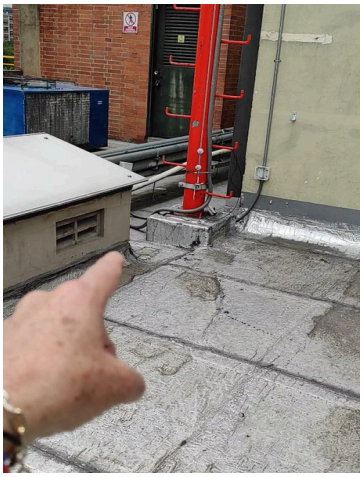







De igual manera, se evidencia en la mayoría de estaciones primarias deterioro en el cerramiento, muros externos e internos, ventanería, instalaciones sanitarias, se observa la falta de mantenimiento a los pozos sépticos, a los diques de los tanques de almacenamiento de ACPM, a los espacios verdes y vías de acceso.

Plan de acción para reparaciones necesarias

Iniciar inmediatamente el proceso de especificación, presupuesto y programación sobre el diagnóstico de cada estación visitada con el fin de obtener la autorización correspondiente por parte de la entidad y del comité de compras e iniciar la ejecución de su corrección.

Finalmente desde el componente civil se realizó un acercamiento especial a la estación MARINILLA, la cual está siendo afectada seriamente no solo por la situación ambiental a la que se está enfrentando, sino también por el componente civil de la misma porque con las obras que realizó el constructor vecino, al invadir el espacio público obstruye completamente el acceso principal a dicha estación, de hecho, por la condición de no tener fácil acceso para realizar mantenimientos preventivos, en última instancia se requiere realizar la intervención en la cuneta y adecuación del ingreso a la estación definitivo.





4.5. Componente ambiental

El Informe de Gestión Ambiental del Consorcio OM-2025 que corresponde al **Anexo 9. Informe de Gestión Ambiental**, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, presenta los avances y resultados en la implementación de las estrategias de manejo ambiental dentro del marco operativo del contrato con RTVC Sistema de Medios Públicos.

Durante el mes de Noviembre se ejecutó una gestión intensiva de residuos peligrosos acumulados por operadores anteriores y generados por el Consorcio OM 2025.

Entre los principales resultados se destacan:

- Se gestionó la entrega de RESPEL en las estaciones: El Ruiz, Calatrava, Planadas y Montezuma. Para esta última, debido a su ubicación dentro del área protegida RUNAP, fue necesario implementar una logística especial que incluyó el uso de un vehículo 4X4 acondicionado para manejo de contingencias y el cumplimiento de los protocolos ambientales aplicables.
- Se realizó la recolección del transformador SIEMENS libre de PCB en Calatrava, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por RTVC.
- Continúa la gestión para las estaciones de Manjui, La Enea, las cuales permanecen pendientes de programación por parte del gestor autorizado Litio SAS.
- Se verificó la marcación “Libre de PCB” o “No PCB” en los transformadores de las 45 estaciones principales, se actualizó la base de datos institucionales con fotografías recientes y trazabilidad requerida por RTVC.
- En cuanto a la gestión de pozos sépticos, durante el mes se completó el mantenimiento de la estación La Enea el 5 de noviembre de 2025. A nivel nacional, el diagnóstico realizado permitió identificar 12 estaciones con mantenimiento actualmente en trámite y 15 estaciones con acceso restringido que requieren estrategias logísticas especiales debido a su difícil ubicación. Se evidenció que la mayoría de los pozos no registran mantenimientos previos y que varias estaciones presentan daños, obstrucciones o colapsos que demandan intervención civil previa a cualquier labor ambiental, para las estaciones que sí permiten intervención inmediata, se gestionaron cotizaciones con los proveedores Veolia, Sepssa, Crudesan, con el fin de programar los mantenimientos necesarios.
- Se estructuró un contrato nacional con la empresa Colombiana de Fumigaciones y Aseos SAS para atención trimestral en 45 estaciones y 30 estudios de radio, se ejecutó aseo en 14 estudios de radio durante este mes.
- En permisos ambientales para intervenciones arbórea, se identificaron 14 estaciones que requieren actividades de poda o tala debido a riesgos operativos asociados a la infraestructura. Dentro de estas, las estación de Padre Amaya presenta una complejidad mayor, dado que se encuentra ubicada dentro de un distrito regional de manejo integrado (DRMI), lo que implica la necesidad de gestionar permisos especiales ante Corantioquia y cumplir con los lineamientos ambientales.

En términos generales, el informe demuestra un fortalecimiento notable del componente ambiental, así como una articulación efectiva entre las áreas técnica y

ambiental, reflejando un avance progresivo en los compromisos adquiridos con RTVC y en la gestión responsable de los recursos bajo parámetros sostenibles.

Las evidencias y soportes de las actividades realizadas están disponibles en el Anexo 10, denominado **"Soportes actividades ambientales"**.

4.6. Componente SST

Las actividades, el desempeño y el estado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Consorcio OM-2025 durante el período comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2025, da alcance al cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia (principalmente Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, entre otras) y requisitos establecidos en el contrato RTVC-CPS-2218-2025 y documentos asociados.

A través del presente informe, se consolidan las acciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales, promoción de la salud y control de condiciones inseguras en las operaciones técnicas y administrativas del proyecto que se detallan a continuación.

4.6.1. Pago seguridad social personal vinculado al proyecto

En la carpeta de anexos de SST se presenta el **Anexo 12. SST Noviembre 2025**, correspondiente a las planillas de pago del personal del mes de noviembre de 2025.

4.6.2. Exámenes Médicos Ocupacionales

Durante el mes de noviembre de 2025 se llevaron a cabo los exámenes médicos ocupacionales (incluidos paraclínicos y trabajo en alturas) de la población trabajadora faltante.

Tabla 2 Cobertura práctica exámenes médicos ocupacionales

No. Exámenes realizados personal contratista	Cobertura personal contratista %	No. Exámenes realizados personal directo	Cobertura personal directo %
58	**100%**	**93**	**100%**
Total cobertura personal contratista y directo			**100%**

Se programó a nivel nacional la realización de los exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular y paraclínicos de audiometría y visiometría; así como exámenes para personal de trabajo en alturas. La cobertura a corte del presente informe del total de la población trabajadora es del 100%.

4.6.2. Gestión Documental

En reunión con el área de calidad y SST de RTVC se acordó alinear la documentación para asegurar el cumplimiento de los lineamientos y requisitos legales aplicables al contrato así:

- Organización y control de documentos del SG-SST
- Actualización del listado maestro de documentos (procedimientos, instructivos, formatos y registros SST).
- Revisión y control de versiones de documentos normativos del sistema (Política SST, Matriz IPERC, Plan Anual SST, procedimientos de reporte de Incidentes, entre otros).
- Control de acceso y respaldo digital en el repositorio compartido del proyecto (Drive / SharePoint / servidor interno) del Consorcio OM-2025 y RTVC.
- Consolidación de registros de inspecciones planeadas, listas de chequeo y reportes de condiciones inseguras.
- Recepción, revisión y archivo de reportes de incidentes y accidentes de trabajo a través de la herramienta diseñada por el CONSORCIO OM-2025 y el correo definido para su reporte sst@consorcioom.com.
- Digitalización de registros físicos generados en campo (reportes de mantenimiento, actas de inspección, evidencias fotográficas).
- Categorización de carpetas electrónicas según estación, tipo de documento y periodo.
- Seguimiento a observaciones y hallazgos relacionados con las auditorías realizadas por Contraloría a RTVC.

En la carpeta de anexos de SST ver **Anexo 12. - 1. Formato Registro de Asistencia Capacitación CONSORCIO OM-2025** y la entrega de la dotación de los EPPC en el **Anexo 12. - 6. Anexo 6. GR-FO-18 ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Mario Fonseca V.1**.

4.6.2. Gestión de Peligros y Riesgos

Se acordó con el área SST de RTVC el cruce de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) conforme con la estructura de la matriz utilizada y basada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012, la cual se encuentra organizada por procesos (administrativos, operativos y de campo) e

incluye actividades rutinarias como mantenimiento preventivo y correctivo, desplazamientos, inspecciones, supervisión de trabajos subcontratados y manejo de equipos tecnológicos. Se enfatizó que dentro del enfoque integral de gestión se contemplan actividades de bienestar laboral, jornadas culturales y sociales, desplazamientos seguros (como conductor o pasajero) y la identificación de peligros derivados del entorno físico, eléctrico, ergonómico y psicosocial.

Se acordó que el CONSORCIO OM-2025 remitirá la matriz en formato editable para revisión y homologación con la estructura institucional de RTVC.

4.6.3. Actualización de extintores y botiquines

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025 se llevó a cabo la revisión y evaluación del estado de los extintores ubicados en las estaciones de radio y televisión operadas por RTVC a nivel nacional, incluyendo los siguientes aspectos:


- Verificación física del equipo.
- Vigencia de recarga.
- Condiciones de señalización y accesibilidad.
- Estado de soporte o pedestal.
- Registro de mantenimiento.

La inspección se realizó mediante recorridos visuales y verificación documental, utilizando el formato GI-FO-06 INSPECCIÓN Y CONTROL PARA REEMPLAZO Y/O REPOSICIÓN DE EXTINTORES PARA EL PROYECTO RTVC-CPS-2218-2025 que incluye registro fotográfico.

Tabla 3 Resumen estado de vencimiento extintores y botiquines

Total estaciones verificadas	Total extintores actualizados	Total extintores vencidos	Total Extintores
317	**143**	**259**	**402**
Total estaciones verificadas	**Total botiquines actualizados**	**Total botiquines con vencimiento**	**Total Botiquines**
317	**123**	**194**	**317**

Ilustración 1 Participación (%) vencimientos extintores y botiquines

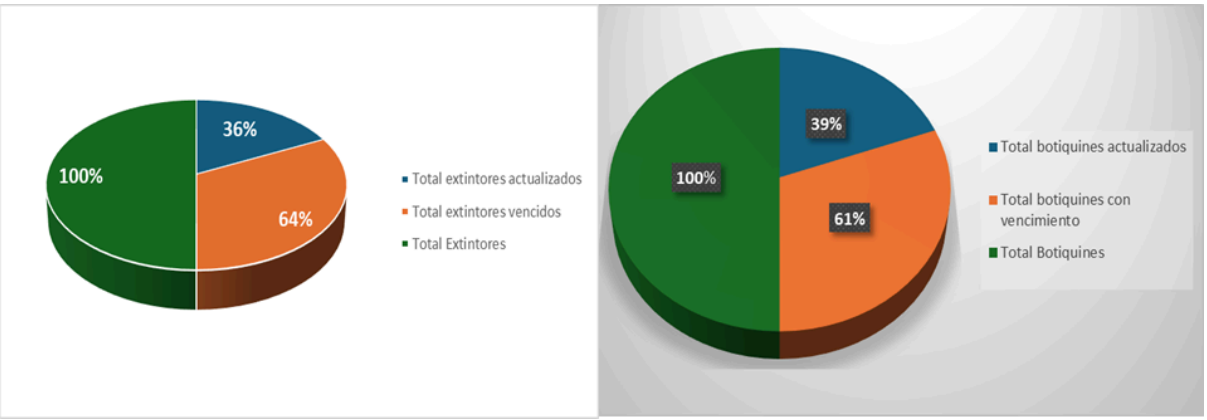

- El 36% de los extintores se encuentran en buen estado y vigentes.
- El 64% de los extintores requieren recarga inmediata o deben ser reemplazados por daño físico o vencimiento.
- Se identificó que de las 317 estaciones (35), que corresponde al 11,04%; presentan deficiencias en señalización o accesibilidad.
- El 39% de los botiquines se encuentran en buen estado y con los elementos vigentes.
- El 61% de los botiquines se encuentran deteriorados o con elementos vencidos.

4.6.3.1. Decisiones y Acciones

- Programar la recarga inmediata de los extintores con fecha vencida y próxima a vencerse.
- Sustituir los extintores o soportes deteriorados.
- Actualizar la señalización de puntos de extintores conforme a la NTC 1461.
- Garantizar la accesibilidad y despeje del área en todos los puntos críticos.
- Implementar un cronograma semestral de inspección preventiva.
- Se recomienda capacitar al personal de cada estación en el uso y manejo de extintores.
- Incluir en la base de datos de extintores, la capacidad de cada extintor y si es de piso, empotrado o en caso de extintores satélites (son soporte de ruedas).
- Los botiquines con elementos vencidos deben ser reemplazados por botiquines nuevos tipo A, conforme con la resolución 705 de 2007.

4.6.3.2. Conclusión extintores y botiquines

El estado general de los extintores y botiquines en las estaciones RTVC requieren acciones correctivas inmediatas, evidenciando la necesidad de fortalecer el mantenimiento preventivo, la gestión de recargas, actualización y control de

vencimientos de elementos del botiquín y la señalización para asegurar la respuesta efectiva ante emergencias.

En la carpeta de anexos SST se presenta el **Anexo 12 - 2. Movimiento extintores, botiquines y kit antiderrames nov 2025.** de Balance extintores y botiquines a octubre de 2025.

4.6.4. Encuesta de condiciones laborales de infraestructura y ambientes de trabajo

Con el fin de evaluar e identificar oportunidades de mejora que contribuyan al bienestar, la seguridad y la productividad del personal, en octubre de 2025 se llevó a cabo una encuesta sobre el bienestar, las condiciones físicas, ambientales y de infraestructura de los espacios de trabajo donde se labora.

Dicha encuesta fue aplicada a 78 estaciones adaptada al formato digital (Google Forms) dando prioridad a las estaciones primarias y la cual fue estructurada por secciones y pensada para evaluar las condiciones laborales, el ambiente de trabajo y los factores que pueden influir en la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores así:

- Condiciones generales del entorno
- Condiciones de seguridad industrial
- Condiciones locativas y estructurales
- Condiciones ambientales y ergonómicas
- Condiciones de bienestar y salud

Detalle en el **Anexo 12 - 5. Capacitaciones en SST**.

4.6.4.1. Conclusiones generales de la encuesta

En términos generales, las condiciones del entorno laboral en las estaciones y sedes de RTVC presentan un nivel adecuado para el desarrollo de las actividades operativas, administrativas y técnicas, evidenciándose un compromiso institucional con la mejora continua en materia de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. No obstante, se identifican algunos aspectos que requieren fortalecimiento para garantizar el cumplimiento integral de los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de la normatividad nacional aplicable.

En lo referente a las condiciones de seguridad industrial, se observa una gestión preventiva en los procesos de mantenimiento, operación técnica y actividades administrativas. Se cuenta con señalización, elementos de protección personal y

procedimientos de trabajo seguro en la mayoría de las áreas. Sin embargo, se recomienda reforzar la capacitación del personal en temas de control de riesgos eléctricos, manipulación de equipos, orden y limpieza, así como mantener actualizados los planes de emergencia y las rutas de evacuación.

Respecto a las condiciones locativas y estructurales, las instalaciones presentan un estado funcional y seguro, aunque se evidencian oportunidades de mejora en la iluminación, ventilación, orden en bodegas técnicas y mantenimiento preventivo de algunos espacios. Se sugiere continuar con el seguimiento a las condiciones de infraestructura en las estaciones regionales y puntos de transmisión para garantizar su adecuado estado y la seguridad de los trabajadores.

En cuanto a las condiciones ambientales y ergonómicas, el ambiente laboral es en general favorable, con adecuados niveles de confort térmico, iluminación y ruido. No obstante, se identifican algunos puestos de trabajo que requieren ajustes ergonómicos, especialmente en estaciones con espacios reducidos o donde se utilizan equipos de operación continua. Se recomienda mantener programas de pausas activas y seguimiento a las condiciones posturales del personal técnico y administrativo.

Sobre las condiciones de bienestar y salud, se destaca la implementación de estrategias de promoción y prevención orientadas al fortalecimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. No obstante, se deben implementar los programas de vigilancia epidemiológica, campañas de salud y actividades de integración para contribuir al fortalecimiento del clima organizacional. Así mismo, se sugiere mantener el acompañamiento psicosocial y ampliar las actividades que promuevan el autocuidado y la salud mental.

En conclusión, se mantiene un entorno laboral adecuado y seguro para el desarrollo de las actividades, reflejando un avance significativo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda continuar con el fortalecimiento de las acciones preventivas, la evaluación periódica de riesgos y la implementación de planes de mejora que garanticen el bienestar integral del talento humano y la sostenibilidad de las operaciones en todas las sedes y estaciones del sistema.

4.6.4.2. Recomendaciones Finales – Informe de Condiciones de Trabajo RTVC

- Reforzar las capacitaciones en control de riesgos eléctricos, trabajos en altura, uso de herramientas y manejo seguro de equipos.

- Actualizar y difundir los procedimientos seguros de trabajo en todas las áreas operativas y técnicas.
- Mantener verificados y actualizados los elementos de protección personal (EPP) y asegurar su uso adecuado por parte de todo el personal.
- Optimizar las condiciones locativas y estructurales:
- Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las sedes y estaciones, priorizando iluminación, ventilación, orden y limpieza.
- Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones eléctricas y sistemas de ventilación.
- Gestionar mejoras en la organización de bodegas y almacenamiento de equipos para garantizar espacios seguros y libres de obstrucciones.
- Mejorar las condiciones ambientales y ergonómicas:
- Realizar evaluaciones ergonómicas periódicas en los puestos de trabajo administrativos, técnicos y operativos.
- Ajustar los puestos de trabajo que lo requieran, incorporando mobiliario ergonómico, soportes de pantalla y adecuaciones posturales.
- Mantener el control de factores ambientales como ruido, temperatura e iluminación, mediante mediciones y ajustes regulares.
- Continuar promoviendo las pausas activas, campañas de salud y actividades de promoción del autocuidado.
- Fortalecer el acompañamiento psicosocial y la atención a factores de riesgo psicosocial derivados de la carga laboral o las condiciones de trabajo en campo.
- Consolidar estrategias de comunicación interna que fomenten la participación activa de los trabajadores en temas de salud y seguridad.
- Reforzar la gestión documental y el seguimiento del SG-SST.
- Asegurar que todas las inspecciones, mantenimientos y capacitaciones queden registradas con evidencias verificables.
- Actualizar los planes de emergencia y realizar simulacros periódicos de evacuación en las sedes.
- Dar continuidad al seguimiento de indicadores de accidentalidad, condiciones de trabajo y cumplimiento normativo, con el fin de establecer mejoras sostenidas.
- Fomentar la responsabilidad compartida entre empleador y trabajadores para mantener entornos seguros.
- Implementar campañas comunicativas que refuercen la cultura de prevención y el compromiso institucional con la salud y seguridad.

En la carpeta de anexos SST se presenta el **Anexo 12 - 3. ENCUESTA CONDICIONES DE ENTORNO LABORAL OM 2025-RTVC** de los resultados de la encuesta de condiciones del entorno realizada por el Consorcio OM-2025.

4.6.5. Inducción y Capacitación en SST

Durante el mes de octubre de 2025 se diseñaron los formularios formato digital (Google Forms) y eventos con la ARL SURA, para ser aplicados a toda la población trabajadora en el mes de noviembre de 2025 así:

- Inducción SG-SST
- Prácticas Seguras (coordinada con ARL SURA)
- Primeros Auxilios (coordinada con ARL SURA)
- Prevención de acoso laboral y promoción de la convivencia laboral (coordinada con ARL SURA)
- Ergonomía aplicada a los puestos de trabajo y manejo de cargas
- Condición insegura
- Investigación y análisis de accidente de trabajo y enfermedad laboral
- Seguridad con herramientas manuales
- Riesgo eléctrico enfocado a bloqueo y etiquetado (LOTO)
- Riesgo público.

4.6.6. Plan de Trabajo

En reunión con la ARL en el mes de octubre de 2025, se desarrolló plan de trabajo para el contrato del Consorcio OM-2025 con actividades de asesoría, inspecciones y capacitaciones en el marco del proyecto suscrito con RTVC.

En el **Anexo 12 - 4. Plan de trabajo Consorcio OM-2025** se presenta el Plan de Trabajo SG-SST del Consorcio OM-2025 junto con ARL SURA.

Durante el mes de noviembre se realiza diferentes capacitaciones en las que se encuentran las siguientes:

- Capacitación de trabajo en alturas
- Divulgación protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso secual y al acosos por razón de género
- Encuesta condiciones de entorno laboral
- Identificación de peligros y valoración de riesgos
- Tarjeta de observación preventiva NOV 2025

4.6.7. Estadísticas de accidentalidad y reporte

Para noviembre de 2025 no se presentaron reportes de accidentes de trabajo ni enfermedad laboral. No obstante, se presentó un incidente con un trabajador que se encontraba desplazándose hacia el aeropuerto en la ciudad de Leticia - Amazonas, con el fin de tomar un vuelo hacia Bogotá, cuando fue abordado por una persona que intentó hurtar su teléfono celular. Al oponer resistencia, no advirtió la presencia de un segundo individuo ubicado a un costado, quien lo agredió con un arma corto punzante, causándole una herida superficial en uno de los miembros superiores. Posteriormente, el trabajador se dirigió al centro médico más cercano, donde se valoró la lesión y se determinó que se trataba de un corte leve. Luego de recibir la atención correspondiente, el trabajador continuó con su itinerario de viaje hacia la ciudad de Bogotá, sin presentar complicación, este caso se cerró por parte de la ARL Sura al determinar que no es un accidente sino un incidente.

Tabla 4 Estadísticas de accidentalidad personal directo

TRABAJADORES DIRECTOS			
	ago-25	sep-25	oct-25
Numero Promedio Trabajadores	90	90	93
Horas Hombre Trabajadas	19800	19800	20460
Número promedio de días de trabajo programados en el mes	23	30	24
INCIDENTES DE TRABAJO			
No. de A.T. fatales	0	0	0
No. de A.T. con Invalidez	0	0	0
No. de A.T. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0
No. de A.T. graves de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007.	0	0	0
No. de A.T. con tiempo perdido	0	0	0
No. de A.T. sin tiempo perdido	1	0	0
Total de días perdidos por A.T.	0	0	0
No. de casos reportados por Casi - Accidente	0	0	0
ENFERMEDAD LABORAL			
No. de casos Nuevos de EL	0	0	0
No. de casos antiguos de EL	0	0	0
No. E.L. Fatales	0	0	0
No. E.L. con Invalidez	0	0	0
No. E.L. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0
No. de E.L. con tiempo perdido	0	0	0
No. de E.L. sin tiempo perdido	0	0	0
Total de días perdidos por E.L.	0	0	0
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA			
Total de días de ausencia por incapacidad laboral	0	0	0
Total de días de ausencia por incapacidad común	0	1	0

Tabla 5 Estadísticas de accidentalidad contratistas y subcontratistas

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
	ago-25	sep-25	oct-25
Numero Promedio Trabajadores	45	55	58
Horas Hombre Trabajadas	9900	12100	12760
Número promedio de días de trabajo programados en el mes	23	30	24
INCIDENTES DE TRABAJO			
No. de A.T. fatales	0	0	0
No. de A.T. con Invalidez	0	0	0
No. de A.T. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0
No. de A.T. graves de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007.	0	0	0
No. de A.T. con tiempo perdido	0	0	0
No. de A.T. sin tiempo perdido	0	1	0
Total de días perdidos por A.T.	0	0	0
No. de casos reportados por Casi - Accidente	0	0	1
ENFERMEDAD LABORAL			
No. de casos Nuevos de EL	0	0	0
No. de casos antiguos de EL	0	0	0
No. E.L. Fatales	0	0	0
No. E.L. con Invalidez	0	0	0
No. E.L. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0
No. de E.L. con tiempo perdido	0	0	0
No. de E.L. sin tiempo perdido	0	0	0
Total de días perdidos por E.L.	0	0	0
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA			
Total de días de ausencia por incapacidad laboral	0	0	0
Total de días de ausencia por incapacidad común	0	0	0

4.6.8. Riesgo público

Durante el periodo evaluado se presentó un incidente, amenaza o evento asociado al riesgo público con afectación leve a uno de nuestros ingenieros, el cual se detalla en el numeral de estadísticas de accidentalidad.

Así mismo, se presentó un hurto a la estación de Pacho-Cundinamarca, con afectación que se describe en el anexo No. 07 del presente informe.

Se deben establecer protocolos de seguridad y vigilancia en sedes y estaciones con monitoreo permanente por parte del área de Seguridad Física y SST; coordinando con autoridades locales en zonas de operación.

Se debe llevar a cabo revisión continua de medidas de seguridad en accesos y perímetros y comunicación permanente con contratistas y personal operativo sobre alertas de seguridad, así como hacer la actualización de los contactos de

emergencia y rutas de evacuación; capacitación en autoprotección y actuación ante situaciones de riesgo público.

4.6.10. Anexos SST

- Anexo 12 - 1 Actas de entrega de EPPC
- Anexo 12 - 2. Movimiento extintores, botiquines y kit antiderrames nov 2025
- Anexo 12 - 3. ENCUESTA CONDICIONES DE ENTORNO LABORAL OM2025-RTVC
- Anexo 12 - 4. Plan de trabajo Consorcio OM-2025
- Anexo 12 - 5. Capacitaciones en SST
- Anexo 12 - 6. 6. GR-FO-18 ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL V.1.pdf

4.7. Componente seguridad y vigilancia

Durante el mes de noviembre, se ejecutó el monitoreo remoto 24/7 de 30 estaciones de radio de RTVC, combinando video-revisión, análisis técnico de alarmas, verificación de conectividad y seguimiento de variaciones operativas.
En general, las estaciones mantuvieron un comportamiento estable, sin fallas técnicas relevantes, garantizando continuidad en la operación, estabilidad de enlaces y funcionamiento normal de cámaras, sensores y sistemas de alarma.

Durante el mes de noviembre, 28 de las estaciones monitoreadas operaron sin novedades, mostrando un comportamiento estable en todos los sistemas revisados. Las cámaras mantuvieron una transmisión continua, los sensores y paneles de alarma no registraron activaciones irregulares, la conectividad de las antenas Starlink se sostuvieron sin reconexiones forzadas y las salas de equipos se observaron en orden, sin evidencias de manipulación o movimientos no autorizados. Así mismo, las condiciones ambientales y de iluminación permanecieron dentro de los rangos normales.

La estación Bojayá (Chocó) presentó novedades al detectarse el ingreso de personas no autorizadas en varios días, quienes usaron las instalaciones eléctricas para cargar dispositivos. Esto generó riesgos de seguridad (acceso a zonas críticas, exposición de equipos, posibles desconexiones o sobrecargas) e incumplimiento de protocolos. Tras verificación inmediata, se confirmó que no hubo manipulación ni afectación técnica, manteniéndose la estación operativa. Se registró y trazó el evento. Se recomienda reforzar los controles de acceso para evitar su recurrencia.

En distintas estaciones como Buenaventura, Algeciras, Florida y Cali y Fundación se observaron técnicos realizando limpieza en los racks, una actividad que no representa novedad operativa pero que se registró dentro del monitoreo rutinario.

En general, el monitoreo remoto garantiza una trazabilidad continua de la operación y evidenció que la infraestructura de seguridad electrónica funcionó dentro de los parámetros esperados, con el 96 % de las estaciones libres de novedades. El único evento que requiere seguimiento corresponde al control de acceso en la estación de Bojayá.

El detalle de las actividades y registro fotográfico se encuentra en el Anexo 13.

4.8. Componente Herramienta de gestión y sistema de información

Durante el mes de noviembre de 2025, el enfoque principal de las actividades se centró en la salida a producción, implementación customización y capacitación del Sistema de Información y Gestión de Mantenimiento (SIGMA), así como en la consolidación y carga de la documentación de soporte (bitácoras e informes de preventivos) al Gestor Documental, Gestión de Tickets entre otros.

A. Desarrollo y Optimización de la Plataforma Tecnológica (SIGMA)

Se lograron avances significativos en la funcionalidad de los módulos de Gestión de Casos (Tickets) y Bitácoras:

- **Estandarización y Nomenclatura:** Se realizó la homogeneización del lenguaje corporativo, cambiando la terminología de "casos" a "tickets" en todas las pantallas del sistema.

- **Módulo de Bitácoras:**

    - Se efectuaron mesas de trabajo con los usuarios para ajustar el módulo e implementar los ajustes al formato de bitácoras, incluyendo la parametrización de campos y la automatización de cálculos para el estado de operación.

    - Se desarrollaron nuevas funcionalidades como el Explorador y Revisor de Bitácoras, y se configuró el sistema para mostrar los valores anteriores de la bitácora en gris y marcar en rojo las variaciones mayores al 10% en campos sensibles como las potencias de los transmisores.

- Se cargaron los valores de la última bitácora para permitir comparaciones dinámicas y generar las alertas mencionadas.

- **Módulo de Tiquetes (Casos):**

  - Se aceptó la implementación de mejoras para que la clasificación de casos (externo/interno) sea automática según la creación del usuario, eliminando la selección manual para evitar confusiones.

  - Se efectuaron ajustes para que reciban en el correo corporativo la información de los Tickets a los observadores, así como sus respectivos estados de acuerdo con la dinámica de esta actividad.

  - Se confirmó que la asignación automática de responsables al elegir una tipología de caso es posible mediante la gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

  - Se atendió la solicitud de ajustes al formulario de Definición de ANS para garantizar la consistencia de títulos y la aceptación de valores alfanuméricos en el campo "Tipo de Caso".

B. Capacitación y Creación de Usuarios

Se dio cumplimiento a las solicitudes de creación de usuarios para el acceso a la plataforma:

- **Capacitación en Gestión de Casos:** Se llevó a cabo una sesión de capacitación enfocada en la Gestión de Casos (CASOS/TICKETS) el 22 de noviembre de 2025, donde asistieron los ingenieros de zona, campo y mesa de ayuda, destacando la importancia del Sistema de Información para el manejo de casos y la necesidad de eficiencia.

- **Creación de Usuarios:**

  - Se efectuó la creación de usuarios para RTVC, y para el consorcio OM 2025.

  - Creación de 14 usuarios para los ingenieros de campo del consorcio OM 2025.

Carga de Inventarios: Durante el mes de noviembre de 2025, se cargó al Gestor Documental la información de inventario de la estación del CAN correspondiente a 440 registros.

4.8.1. Completado de los módulos del sistema de información SIGMA

Informe Técnico porcentaje de Avance de cumplimiento del Sistema de información SIGMA con corte al 30 de noviembre de 2025.

En el desarrollo de las actividades durante este periodo en lo referente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, presentamos el avance técnico detallado sobre el estado de avance del desarrollo del Sistema de Información SIGMA el cual se encuentra en el 50% con respecto a los 14 módulos establecidos contractualmente, donde se establecen porcentajes a los entregables identificados de forma integral en lo referente a los módulos, Programas fuentes, capacitación, transferencia del conocimiento y entrega de licencias de uso como se puede apreciar en siguiente cuadro:

ESTADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGMA CONSOLIDADO						
Concepto	**Peso**	**Mod/Prod.**	**Terminado**	**Avance %**	**Implementado**	**Impl. %**
Módulos	60%	14	10	42,90%	10	42,90%
Fuentes	20%	1	0	0,00%	0	0,00%
Capacitación	5%	14	10	3,60%	10	3,60%
Transferencia	5%	14	10	3,60%	10	3,60%
Licencias de Uso	10%	1	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	**100%**			**50,00%**		**50,00%**

*El avance da un porcentaje del 50.1 y lo aproximamos por defecto al 50%

En cuadro anterior se observa el peso y el avance del sistema de información SIGMA que corresponde al 50%

En el siguiente cuadro se presenta en forma detallada los porcentajes de avance por cada uno de los conceptos así:

ESTADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGMA
DETALLADO

Concepto	Detalle	Peso	Avance
		60%	**42,90%**
Módulos	a. Visitas	4,30%	4,30%
	b. Administrador de usuarios	4,30%	4,30%
	c. Técnico	4,30%	4,30%
	d. Control del Proyecto	4,30%	4,30%
	e. PQRSD	4,30%	4,30%
	f. Estaciones	4,30%	4,30%
	g. Informes Estados Estaciones	4,30%	4,30%
	h. Informes Fallas/Eventos Estaciones	4,30%	4,30%
	i. Reportes Avance Proyecto	4,30%	4,30%
	j. Inventario	4,30%	0,00%
	k. Servicios WEB	4,30%	0,00%
	l. Importar Información	4,30%	0,00%
	m. Compras o Adquisiciones	4,30%	0,00%
	n. ANS y Control	4,30%	4,30%

		5%	**3,60%**
Capacitación	a. Visitas	0,40%	0,40%
	b. Administrador de usuarios	0,40%	0,40%
	c. Técnico	0,40%	0,40%
	d. Control del Proyecto	0,40%	0,40%
	e. PQRSD	0,40%	0,40%
	f. Estaciones	0,40%	0,40%
	g. Informes Estados Estaciones	0,40%	0,40%
	h. Informes Fallas/Eventos Estaciones	0,40%	0,40%
	i. Reportes Avance Proyecto	0,40%	0,40%
	j. Inventario	0,40%	0,00%
	k. Servicios WEB	0,40%	0,00%
	l. Importar Información	0,40%	0,00%
	m. Compras o Adquisiciones	0,40%	0,00%
	n. ANS y Control	0,40%	0,40%
		5%	**3,60%**

Transferencia	a. Visitas	0,40%	0,40%
	b. Administrador de usuarios	0,40%	0,40%
	c. Técnico	0,40%	0,40%
	d. Control del Proyecto	0,40%	0,40%
	e. PQRSD	0,40%	0,40%
	f. Estaciones	0,40%	0,40%
	g. Informes Estados Estaciones	0,40%	0,40%
	h. Informes Fallas/Eventos Estaciones	0,40%	0,40%
	i. Reportes Avance Proyecto	0,40%	0,40%
	j. Inventario	0,40%	0,00%
	k. Servicios WEB	0,40%	0,00%
	l. Importar Información	0,40%	0,00%
	m. Compras o Adquisiciones	0,40%	0,00%
	. ANS y Control	0,40%	0,40%
Fuentes	**Entrega programas fuentes al final**	**20%**	**0%**
Licencias de Uso	**Entrega licencias al final**	**10%**	**0%**

TOTAL	**100%**	**50,00%**

4.8.2. Resumen Ejecutivo del Estado del Proyecto SIGMA

El proyecto SIGMA ha alcanzado un **Avance Consolidado Total del 50%** de su ponderación contractual al corte del 30 de noviembre de 2025. Este hito se sustenta principalmente en la finalización de la fase de desarrollo de la funcionalidad primaria del sistema.

Este avance refleja el éxito en la terminación de los módulos operativos. Diez (10) de los catorce (14) módulos requeridos contractualmente han sido completados, lo que representa el 71.4% de la funcionalidad base planificada. Este cumplimiento contribuye con el 42,9% al avance total del proyecto, siendo el desarrollo de Módulos la categoría con mayor peso que le corresponde el 60%. Además, se ha ejecutado el avance proporcional correspondiente en las actividades de Capacitación y Transferencia que corresponden a un 7.2%.

Es importante señalar que, si bien se registra un 50% de avance, el 30% restante de la ponderación total (correspondiente a los programas Fuentes y la entrega de las Licencias de Uso), la culminación se encuentra contractualmente programado para la entrega final del sistema, más Capacitación y Transferencia.

II. Análisis Detallado del Cumplimiento de Requerimientos y Desarrollo (Módulos)

El avance del 43% en la categoría Módulos se sustenta en la finalización de la arquitectura funcional que permite la gestión eficiente, transparente y el control en tiempo real del progreso del proyecto, cumpliendo con gran parte del alcance del servicio definido.

A. Logros Clave en Funcionalidad Operacional (42,9% de Avance)

Se han completado y desplegado diez (10) módulos, cada uno con un 4.3% de avance detallado. La finalización de estos componentes asegura que el sistema cumpla con el Requisito General 1 del contrato, permitiendo a la interventoría y/o supervisión generar los informes necesarios para evidenciar el progreso de la ejecución.

j. Módulo de Inventario: Se da inicio al cargue de información de los inventarios de la estación del CAN.

Los módulos ya operativos incluyen las funcionalidades esenciales para la gestión diaria y el cumplimiento normativo:

- **Gestión Operacional:** Módulo de Visitas (a), Módulo Técnico (c), y Módulo de Estaciones (f).
- **Gobernanza y Reporte:** Módulo de Administrador de usuarios (b), Módulo de Control del Proyecto (d), Módulo PQRSD (e), Módulo de Informes de estados de las estaciones en tiempo real (g), Módulo de Consultar informes de fallas y eventos de las estaciones (h), Módulo de Generar reportes personalizados sobre el avance del proyecto (i), y Módulo de ANS y Control (n).

La implementación de estas funcionalidades permite la toma de decisiones estratégicas informadas respecto al progreso del plan de trabajo y las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

B. Módulos Pendientes

Cuatro módulos que se encuentran con un buen estado de avance donde se está customizando y corresponden a un 17,1% restante de la ponderación de los módulos, así:

1. **k. Módulo de Servicios WEB**
2. **l. Módulo para Importar Información**
3. **m. Módulo de Compras o Adquisiciones**

III. Evaluación de Avances en Capacitación y Transferencia de Conocimiento

Las categorías de Capacitación y Transferencia de Conocimiento están progresando en estricta sincronía y en forma paralela con la entrega de la funcionalidad desarrollada.

A. Cumplimiento Proporcional en Entrega de Conocimiento

Tanto la Capacitación como la Transferencia (ambas con un peso total del 5%) han alcanzado un avance del 3,6**%** cada una. Este porcentaje corresponde a la ejecución de las actividades de entrega y formación para los 10 módulos que han sido terminados, cubriendo aproximadamente el 71.4% de las tareas planificadas en estas categorías.

El 1,4% de avance restante en cada categoría (equivalente a las actividades de 0.4% por cada módulo pendiente) está solicitado a la finalización, pruebas y aceptación de los módulos Inventario, Servicios WEB, Importar Información y Compras o Adquisiciones.

B. Transferencia de Tecnología

El consorcio OM 2025 mediante correo electrónico informó a RTVC sobre la infraestructura tecnológica, que debe tener para la transferencia del sistema de información denominado SIGMA.

Es importante tener en cuenta que la administración del sistema información SIGMA está bajo la responsabilidad del consorcio OM 2025 hasta la finalización del contrato.

La finalización de la Transferencia de Conocimiento es crucial, ya que debe incluir la puesta en funcionamiento de la base de datos. Esto asegura que RTVC podrá resguardar los datos transaccionales, cumpliendo con el requisito de garantizar la disponibilidad y acceso continuo a la información por parte de la entidad contratante.

IV. Justificación Contractual de Hitos de Cierre (30% del Peso Total)

Se requiere aclarar la situación de las dos categorías de mayor peso ponderado, las cuales se encuentran en un buen porcentaje de avance. Este estado se alinea con la estrategia de entregables de cierre del proyecto y no representa un retraso en la ejecución del cronograma.

C. Entregables Programados para el Hito Final

1. **Fuentes (Código Fuente):** Esta actividad representa un 20% del peso total. El avance es 0% debido a que la documentación contractual específica que la entrega de los programas fuente debe realizarse "al final**"** del proyecto. Esta práctica técnica garantiza que la versión entregada del código fuente sea la final y estable del sistema.

2. **Licencias de Uso:** Con un peso del 10%, el avance es 0%. De igual manera, la entrega de las licencias de uso o credenciales necesarias que permitan visualizar la correcta funcionalidad y operación de la solución. Está programado para el momento de la aceptación final del sistema ("Entrega licencias al final").

4.9. Bolsa de productos y servicios

4.9.1. Bolsa integral de repuesto, equipos nuevos y alquiler

Durante el período reportado, se realizaron varias actividades correctivas en las que se efectuó el proceso de aprobación por parte de actividad o se realizaron como correctivas y se encuentran pendientes por conciliar.

Entre las actividades mencionadas se encuentran las siguientes:

Nº	*ESTACIÓN*	*Tipo de Estación*	Fecha de ejecución	TIPO	Repuesto
7	JAMUNDÍ	ESTACIÓN AM	11/11/2025	Transmisión	LNB
2	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	5/11/2025	Energía - Correctivo	Gas refrigerante y contactor
2	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	4/11/2025	Energía - Correctivo	contactor
2	SABANAGRANDE	ESTACIÓN AM	6/11/2025	Energía - Correctivo	Cableado eléctrico y tableros eléctricos
30	BUENAVISTA	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	14/11/2025	Transmisión	LNB
17	PADRE AMAYA	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	15/11/2025	Energía - Correctivo	Cambio de tarjeta AVR MX321
43	SIMON BOLIVAR	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	22/11/2025	Energía - Correctivo	Gas refrigerante y contactor
22	MUNCHIQUE	ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	26/11/2025	Energía - Correctivo	TARJETA DE CONTROL DE ARRANQUE AUTO-STAR Y ALARMAS PCB PO86PARTE N.650-077 PLANTA FG WOLSON P160
173	QUETAME	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	10/11/2025	Transmisión	LNB

236	CARCASI	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	13/11/2025	Transmisión	LNB
53	ALEJANDRÍA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	20/11/2025	Transmisión	LNB
121	SANTAMARIA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	20/11/2025	Transmisión	LNB
163	GUACHETA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	21/11/2025	Transmisión	LNB
188	COLOMBIA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	22/11/2025	Transmisión	LNB
168	LAVEGA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	27/11/2025	Transmisión	LNB
215	TUMACO	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	17/11/2025	Energía - Correctivo	Cambio de DPS de 220V y recarga de gas refrigerante de aire
73	ITUANGO	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	3/12/2025	Energía - Correctivo	20 Baterías 12V 9Ah
230	LA HORMIGA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	7/11/2025	Energía - Correctivo	20 Baterías 12V 9Ah
185	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	1/11/2025	Energía - Correctivo	Cambio de válvula de baja y recarga de aire acondicionado
235	EL NUDO	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA +	29/11/2025	Energía - Correctivo	Batería de encendido 1150P/31H 12V

		RADIO + TDT (CON G.E)			
112	MONIQUIRA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	21/11/2025	Transmisión	LNB
189	ARGENTINA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	27/11/2025	Transmisión	LNB
210	SANDONÁ	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	14/11/2025	Energía - Correctivo	2 contactores AC3 25A 110VAC Chint
232	BELÉN DE UMBRÍA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	14/11/2025	Transmisión	LNB
232	BELÉN DE UMBRÍA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	19/11/2025	Energía - Correctivo	Batería de encendido 1150P/31H 12V
126	CHINCHINÁ	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	16/11/2025	Energía - Correctivo	Batería de encendido 31H1250MC
261	BUENAVENTURA	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	7/11/2025	Energía - Correctivo	Reparación de circuito de gas refrigerante recarga a dos aires
267	TRESCRUCES	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	1/11/2025	Energía - Correctivo	Cambio de cargador y baterías
331	ALTO BAUDÓ	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	22/11/2025	Transmisión	LNB

174	QUININI	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	22/11/2025	Transmisión	LNB
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	7/11/2025	Energía - Correctivo	Cambio de baterías
274	ESTUDIO MEDELLÍN	ESTUDIO RADIO	16/11/2025	Energía - Correctivo	6 baterías 12V 9Ah
273	ESTUDIO ITUANGO	ESTUDIO RADIO	3/12/2025	Energía - Correctivo	UPS 3kVA
290	ESTUDIO PASTO	ESTUDIO RADIO	1/11/2025	Energía - Correctivo	Cambio de carburador

4.9.2. Bolsa suministro de acpm y transporte

En el marco de las actividades desarrolladas, únicamente se realizó uso de la bolsa de ACPM y transporte, de acuerdo con la certificación contenida en el Anexo 17. Certificación de Combustibles – Noviembre, por un valor total de $56.163.219, correspondiente al suministro de combustible para la operación de las plantas eléctricas y el transporte a locaciones remotas durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025. Este consumo se efectuó en cumplimiento de las obligaciones contractuales y bajo los lineamientos técnicos establecidos por RTVC y el Consorcio OM 2025.

No.	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	F. SOLICITUD	F LLEGADA	OT	SOLICITUD EN (gal)
2	SABANAGRANDE	18/11/2025	20/11/2025	38	250
21	ELRUIZ	4/11/2025	7/11/2025	36	600
157	CRUZ VERDE	25/11/2025	29/11/2025	40	245
235	EL NUDO	20/11/2025	21/11/2025	39	250
38	CERRO TASAJERO	4/11/2025	4/11/2025	35	1000

4.9.3. Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato

En el mes de noviembre se realizaron actividades de cambio y recarga de extintores en 24 estaciones a las que se les dio prioridad que presentaban elementos del botiquín y extintores vencidos o próximos a vencer. Cómo detalle particular se realizó dotación de Kit antiderrames a la estación de Montezuma y con el cual se logró embalar los residuos Respel de tal forma que su transporte fuera lo más seguro posible. Detalle de la información en el Anexo 12 - 2. Movimiento extintores, botiquines y kit antiderrames nov 2025.

De acuerdo a las actividades de embellecimiento se adelantaron actividades en el CAN, que consto del desmonte de techo de auditorio 1 y disposición certificada de los residuos generados, actividad que se finalizó con éxito y del cual ya se entregó el certificado de disposición final relacionado en el Anexo 15. CG CDF 3824 RTNC VICTOR TORRES 1-11-2025.

Con respecto a las actividades de ornato se realiza la ejecución de aseos en 14 estudios de radio en el que se busca cumplir con la periodicidad propuesta de la entidad de actividades quincenales. La evidencia fotográfica se encuentra dentro del Anexo 10. Soportes de actividades ambientales “INFORME POR SERVICIO DE ASESO - VARIAS SEDES NHS”.

5. CONCLUSIONES

5.1. Evaluación global de los componentes

Durante el mes de noviembre se evidenció una consolidación operativa y un avance cualitativo respecto al periodo anterior, reflejando una gestión técnica, administrativa y estratégica más robusta por parte del Consorcio OM-2025. La ejecución articulada de los componentes técnico, eléctrico, civil, ambiental, SST, seguridad y sistemas de información permitió no solo mantener la continuidad del servicio, sino también mejorar la caracterización real del estado de la red y fortalecer la toma de decisiones.

En el componente técnico, la ejecución de 172 visitas de mantenimiento preventivo, con un cumplimiento del 98,29% del cronograma, permitió recuperar servicios afectados y avanzar en la estabilización operativa de múltiples estaciones. Este esfuerzo, complementado con mantenimientos correctivos focalizados, se tradujo en una mejora progresiva del servicio, aún en un contexto de limitaciones estructurales heredadas.

El componente eléctrico mostró un avance significativo en términos de gestión y control. La ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, así como las visitas especializadas de infraestructura eléctrica, permitió corregir múltiples novedades identificadas previamente, mejorar la confiabilidad de los sistemas energéticos y actualizar el estado real de las estaciones. Aunque el sistema se mantiene clasificado como “operativo con restricciones”, la tendencia es positiva y evidencia una gestión técnica responsable y orientada a la mitigación del riesgo.

El CAN mantuvo una operación estable y controlada, con una alta carga de actividades ejecutadas durante el mes, destacándose las adecuaciones eléctricas, mejoras en sistemas de refrigeración, ajustes de tableros y avances en obras civiles internas. Estas intervenciones fortalecen la continuidad operativa y reducen la probabilidad de eventos críticos, ratificando un entorno de operación confiable y técnicamente controlado.

Desde el componente ambiental, se fortaleció de manera sustancial la gestión de residuos peligrosos, PCBs, pozos sépticos y control de vectores, cumpliendo con los lineamientos normativos y atendiendo pasivos ambientales históricos. Las acciones ejecutadas durante noviembre reflejan una mejora tangible en las condiciones ambientales de las estaciones, especialmente en aquellas ubicadas en zonas de alta sensibilidad ecológica.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se alcanzó una cobertura del 100% en exámenes médicos, se avanzó en la actualización del SG-SST y se ejecutaron inspecciones en campo que permitieron identificar y corregir condiciones inseguras. Esto evidencia un entorno de trabajo más seguro, controlado y alineado con la normativa vigente, reduciendo riesgos para el personal operativo.

Finalmente, el componente civil cumplió con el levantamiento preliminar y diagnóstico integral de las 45 estaciones primarias, entregando a la entidad una caracterización técnica detallada del estado de la infraestructura física. Este hito constituye un avance clave frente al mes anterior, ya que permite priorizar intervenciones, estructurar presupuestos y planificar acciones correctivas con base en información real y documentada. Adicionalmente, se culminaron las obras en CAN – Estudio 1 y se avanzó significativamente en la adecuación de la estación Francisco de Paula Santander en Leticia, evidenciando capacidad de ejecución y cumplimiento.

5.2. Puntos críticos identificados

Si bien durante noviembre se registraron avances importantes frente a octubre, persisten puntos críticos de carácter estructural que continúan impactando los indicadores globales:

- Infraestructura eléctrica heredada con estaciones sin energía o con sistemas de respaldo deteriorados, que limita la mejora homogénea de la disponibilidad a nivel nacional.

- Estaciones siniestradas o con restricciones de acceso, que impiden la ejecución de intervenciones técnicas y eléctricas.

- Deterioro generalizado en cubiertas, fachadas y cerramientos de estaciones primarias, identificado a partir del levantamiento preliminar del componente civil, cuya intervención depende de la aprobación de recursos por parte de la entidad.

- Persistencia de estaciones secundarias con restricciones energéticas, que continúan afectando los indicadores de disponibilidad del servicio.

No obstante, a diferencia del mes anterior, estos puntos críticos se encuentran **plenamente identificados, priorizados y documentados**, lo que reduce la incertidumbre operativa y permite enfocar las acciones futuras de manera más eficiente.

5.3. Grado de cumplimiento de requisitos

Durante el mes de noviembre, el grado de cumplimiento de los requisitos contractuales y operativos se mantuvo en niveles satisfactorios y muestra una **mejora en la gestión integral del contrato**, destacándose:

- Cumplimiento del 98,29% del cronograma de visitas técnicas programadas.
- Ejecución sistemática de mantenimientos preventivos y correctivos en los componentes técnico y eléctrico.
- Cumplimiento en la actualización de bitácoras, inventarios, reportes técnicos y carga de información en el sistema SIGMA, fortaleciendo la trazabilidad y el control documental.
- Ejecución efectiva de actividades ambientales y de SST conforme a la normativa aplicable.

- Entrega oportuna del levantamiento preliminar y diagnóstico del componente civil, constituyéndose en un insumo estratégico para la planeación de intervenciones futuras.

En conjunto, las conclusiones de noviembre reflejan una **mejora sustancial frente al mes de octubre**, evidenciando una gestión técnica sólida, una administración responsable de los recursos y un enfoque claro hacia la estabilización progresiva de la red, lo que ratifica el buen desempeño y la adecuada gestión del Consorcio OM-2025.

ANEXOS

Anexo 1. Informe de Gestión – Noviembre 2025
Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica
Anexo 3. RUTA VISITA TÉCNICA OM MES NOVIEMBRE MES 3
Anexo 4. Servicios_Recuperados_Estaciones Nov-31
Anexo 5 - Control PQRSD Noviembre
Anexo 6. Componente eléctrico - Noviembre
Anexo 7. Cronograma noviembre CAN
Anexo 8. Soportes actividades CAN Noviembre 2025
Anexo 9. Informe de Gestión Ambiental
Anexo 10. Soportes actividades ambientales
Anexo 11. Resumen de actividades correctiva Noviembre
Anexo 12. SST NOVIEMBRE 2025
Anexo 13. Informe estaciones de radio RTVC Noviembre
Anexo 14. Información custodios llaves
Anexo 15. CG CDF 3824 RTNC VICTOR TORRES 1-11-2025
Anexo 16. Informes de visitas de levantamiento Civil
Anexo 17. Certificación combustibles Noviembre
Anexo 18. Certificación operarios estaciones principales Nov.
Anexo 19. Facturación noviembre bolsa
Anexo 20. Intervención de Estación Leticia / Francisco de Paula Santander
